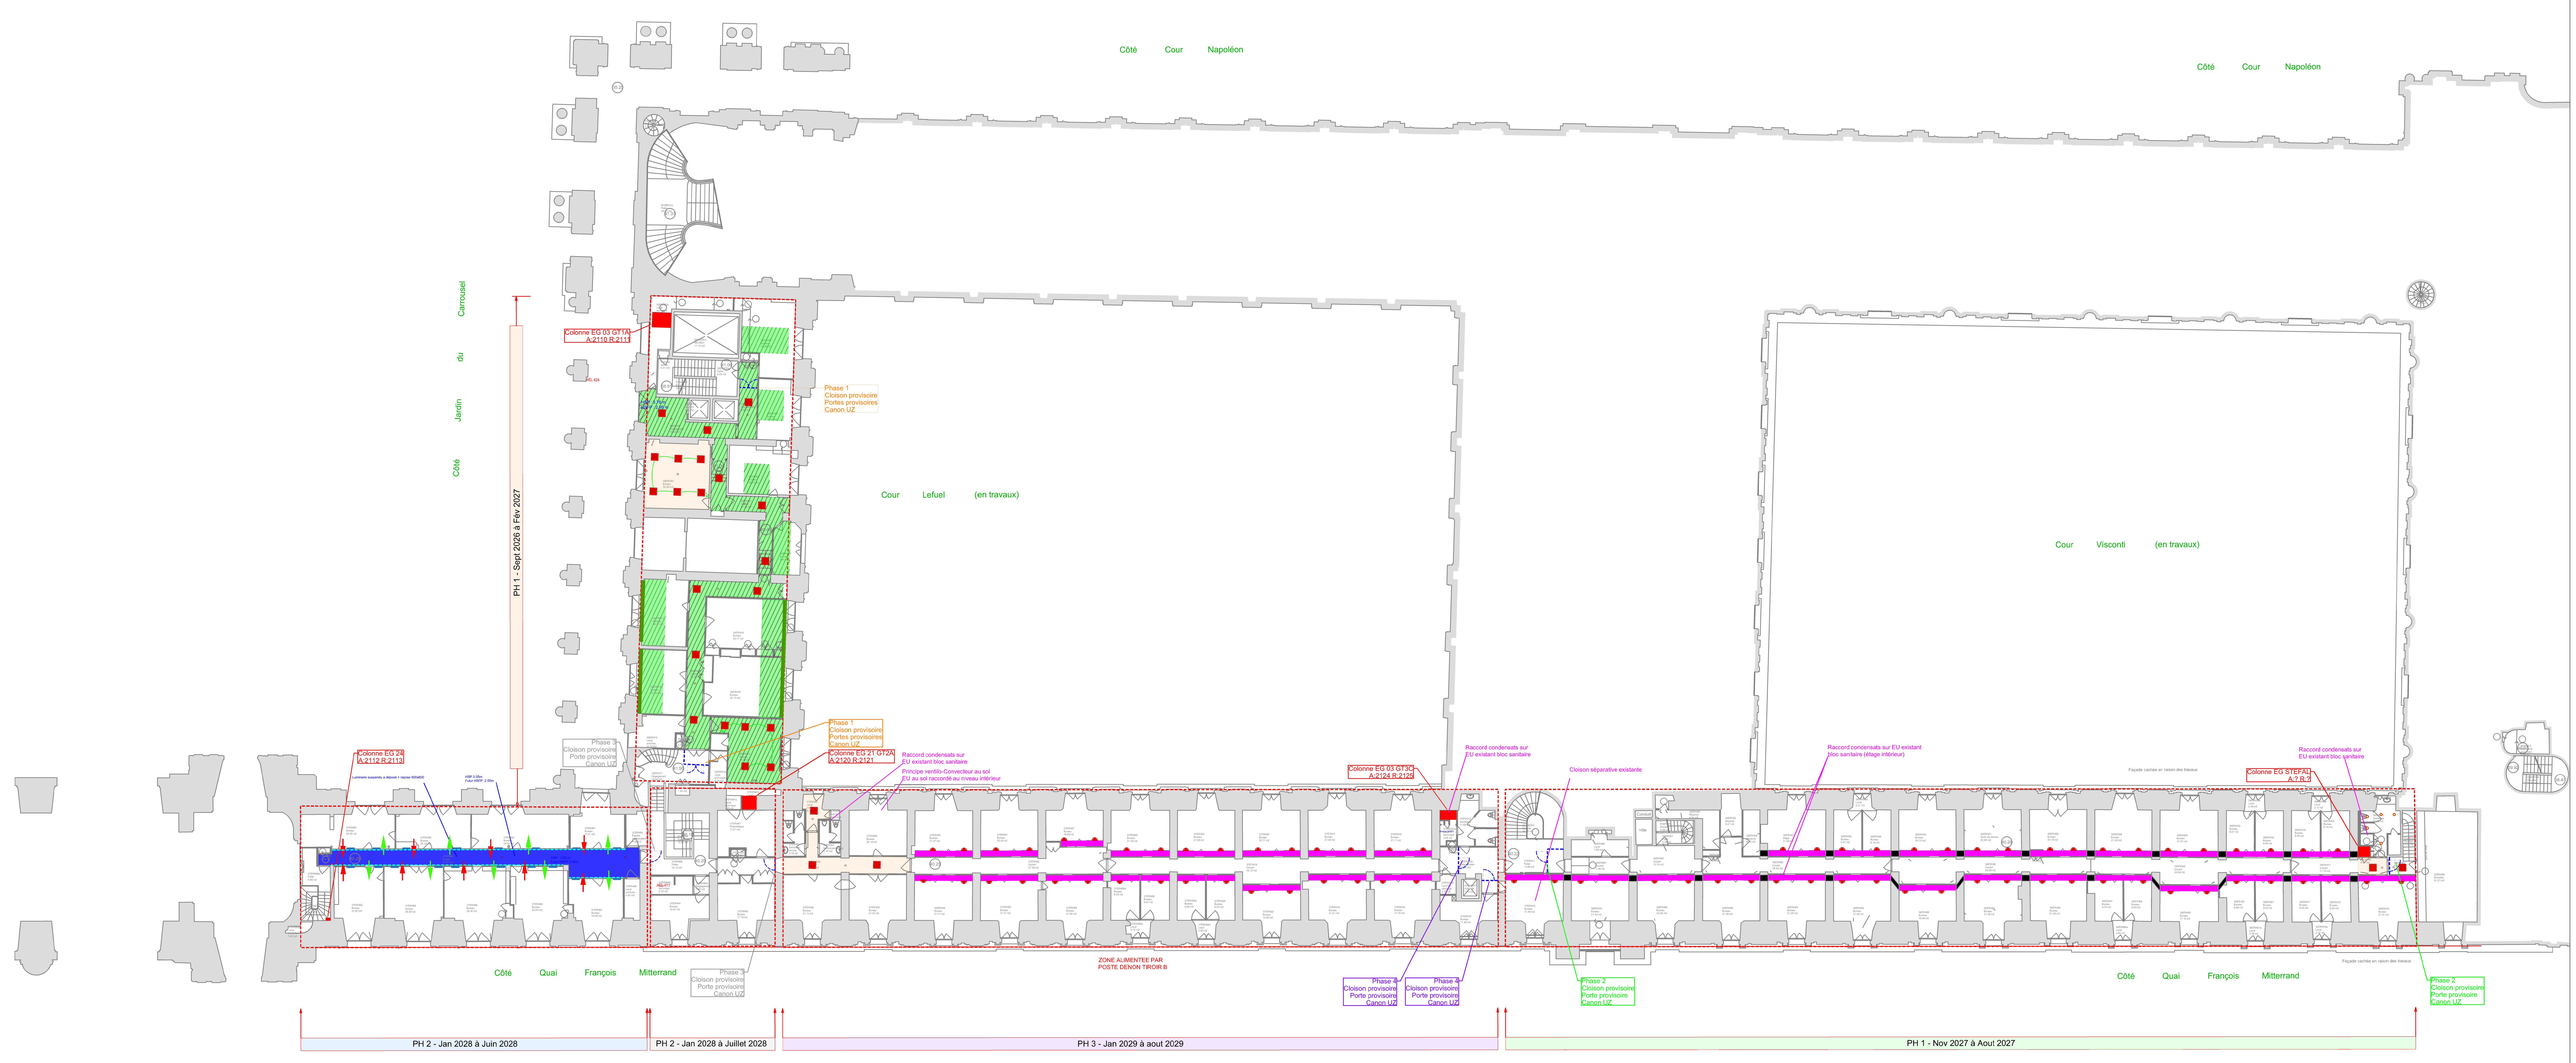

ENTRESOL

PHASAGE TRAVAUX

- PHASE 1 Sept 2026 à Fév 2027
- PHASE 1 Nov 2026 à Aout 2027
- PHASE 2 Jan 2028 à Juin 2028
- PHASE 2 Jan 2028 à Juillet 2028
- PHASE 3 Jan 2029 à Août 2029

LEGENDE

1-Projet VC MOLLIEN BDL -Dépose éclairage
2-Equipe maintenance Louvre - Dépose et repose de la Détection Incendie / camera / CA
3-Projet rénovation bureaux 2nd oeuvre - Dépose du Faux Plafond - F/P faux plafond
4-Projet VC MOLLIEN BDL - F/P éclairage

1-Projet VC MOLLIEN BDL Dépose et repose faux plafond 600x600 / éclairage
2-Equipe maintenance Louvre - Dépose et repose de la détection incendie/camera/CA

1-Equipe maintenance Louvre - Dépose et repose de la détection incendie/camera/CA
2-Projet rénovation bureaux 2nd oeuvre - Dépose du plafond et Création d'un faux plafond : F/P Faux plafond et éclairage
3-Projet rénovation bureaux 2nd oeuvre- Zones impactées par les cheminements verticaux avec remplacement des faux plafonds

1-Equipe maintenance Louvre - Dépose et repose de la détection incendie/camera/CA
2-Projet rénovation bureaux 2nd oeuvre - Création d'un faux plafond : F/P Faux plafond et éclairage

1-Projet VC MOLLIEN BDL - Dépose des coffrages bois démontables, dépose et pose à neuf des coffrages non démontables, Dépose et pose de nouvelles plinthes éléctriques
NOTA: la dépose /repose des coffret bois historiques seront à la charge du Projet Rénovation Bureau.
2-Projet VC MOLLIEN BDL - Dépose plinthes electriques

1- Projet VC MOLLIEN BDL - Ouverture plancher Colonne Change Over

1- Projet VC MOLLIEN BDL - Dépose du faux plafond BA13 et repose à neuf. Dépose et repose de l'éclairage(CFF)
2- Equipe maintenance louvre : Dépose et repose détection incendie/caméra/CA

Projet VC MOLLIEN BDL
2 Grilles en applique 1600 x 130mm par local cloisons sêches

Projet VC MOLLIEN BDL
Ouverture plancher haut existant 2Ø40 mm

Projet VC MOLLIEN BDL
Ouverture plancher bas existant 2Ø40 mm

1- Projet VC MOLLIEN BDL - Reprise plinthe

1 - Projet VC MOLLIEN BDL - Reprise encoffrement

1 - Projet VC MOLLIEN BDL - Dépose et repose caisson (caisson dalle 120x60)

1- Projet VC MOLLIEN BDL - Dépose plinthe, Reprise plinthe / moulure bois

Projet VC MOLLIEN BDL
Percements 4 carottages Ø200 mm par local

Projet VC MOLLIEN BDL
Percement cloison existant 2Ø40 mm

HORS PROJET VC MOLLIEN BDL

Projet VC MOLLIEN BDL
Remplacement des impostes en verre par une cloison BA 13
Compris renfort de cloison

Carottage Ø200 pour 2 passage Ø80

1- Projet rénovation bureaux 2nd oeuvre : Dépose repose des caissons historiques

1- Projet VC MOLLIEN BDL - Dépose des coffres bois
2- Projet rénovation 2nd oeuvre : Fourniture et pose de nouveau coffrage bois

- BAES existant
- Caméra existante
- Diffuseur sonore existant
- Downlight
- Eclairage en applique existant
- OP Détecteur incendie optique existant
- Luminaire encastré 600x600 LED
- Bouton poussoir Push DIM
- Armoire divisionnaire existante

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Maître d'ouvrage **Maître d'oeuvre**

LOUVRE

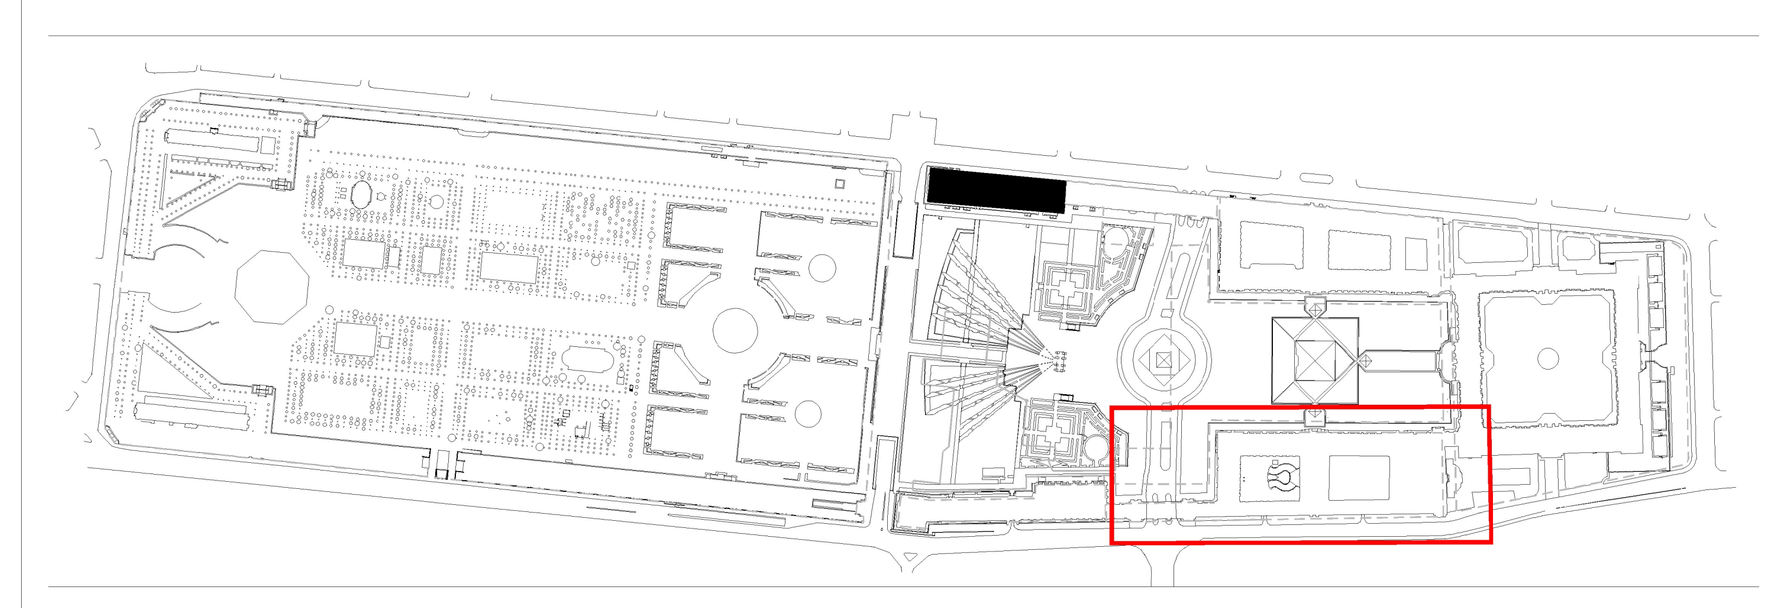

OPERATION

RÉNOVATION des VC BUREAUX MOLLIEN et BORD de L'EAU

Plan dressé par :

GLI
261 RUE DE PARIS 93200 MONTREUIL
01 84 86 07 00
contact@gli.fr

TIPEE
8 RUE ISABELLE AUTISSIER 17140 LAGORD
05 17 81 07 77
contact@plateforme-tipee.com

ILAO
88 RUE DES GREFFIERES 17140 LAGORD
05 46 31 31 13
contact@ilao.fr

AMIEX
127 RUE AMELOT 75011 PARIS
06 50 20 16 60
antoine.majoux@amiex-bet.fr

bâtiTECH
77 rue René CASSIN 02100 SAINT QUENTIN
03 23 64 72 30
contact@be-batitech.fr

INGELUX
1010 AVENUE PAUL MARCELIN 69120 VAULX EN VELIN
04 78 59 99 60
c.marty@ingelux.com

RÉNOVATION des VC BUREAUX MOLLIEN et BORD de L'EAU PLAN DE REPERAGE _ BORDS DE L'EAU ENTRESOL PHASES 1/2/3	DATE	N° Folio	Échelle
	14/04/2026	0112 / A0	1/200

Maître d'ouvrage	PROJET	Domaine	Spécialité	Type	Zone	NIVEAU	CODE	INDICE
EPML	22T08	04	SOE	LIV	BC	ERH	NN	C
