Life Ingénierie
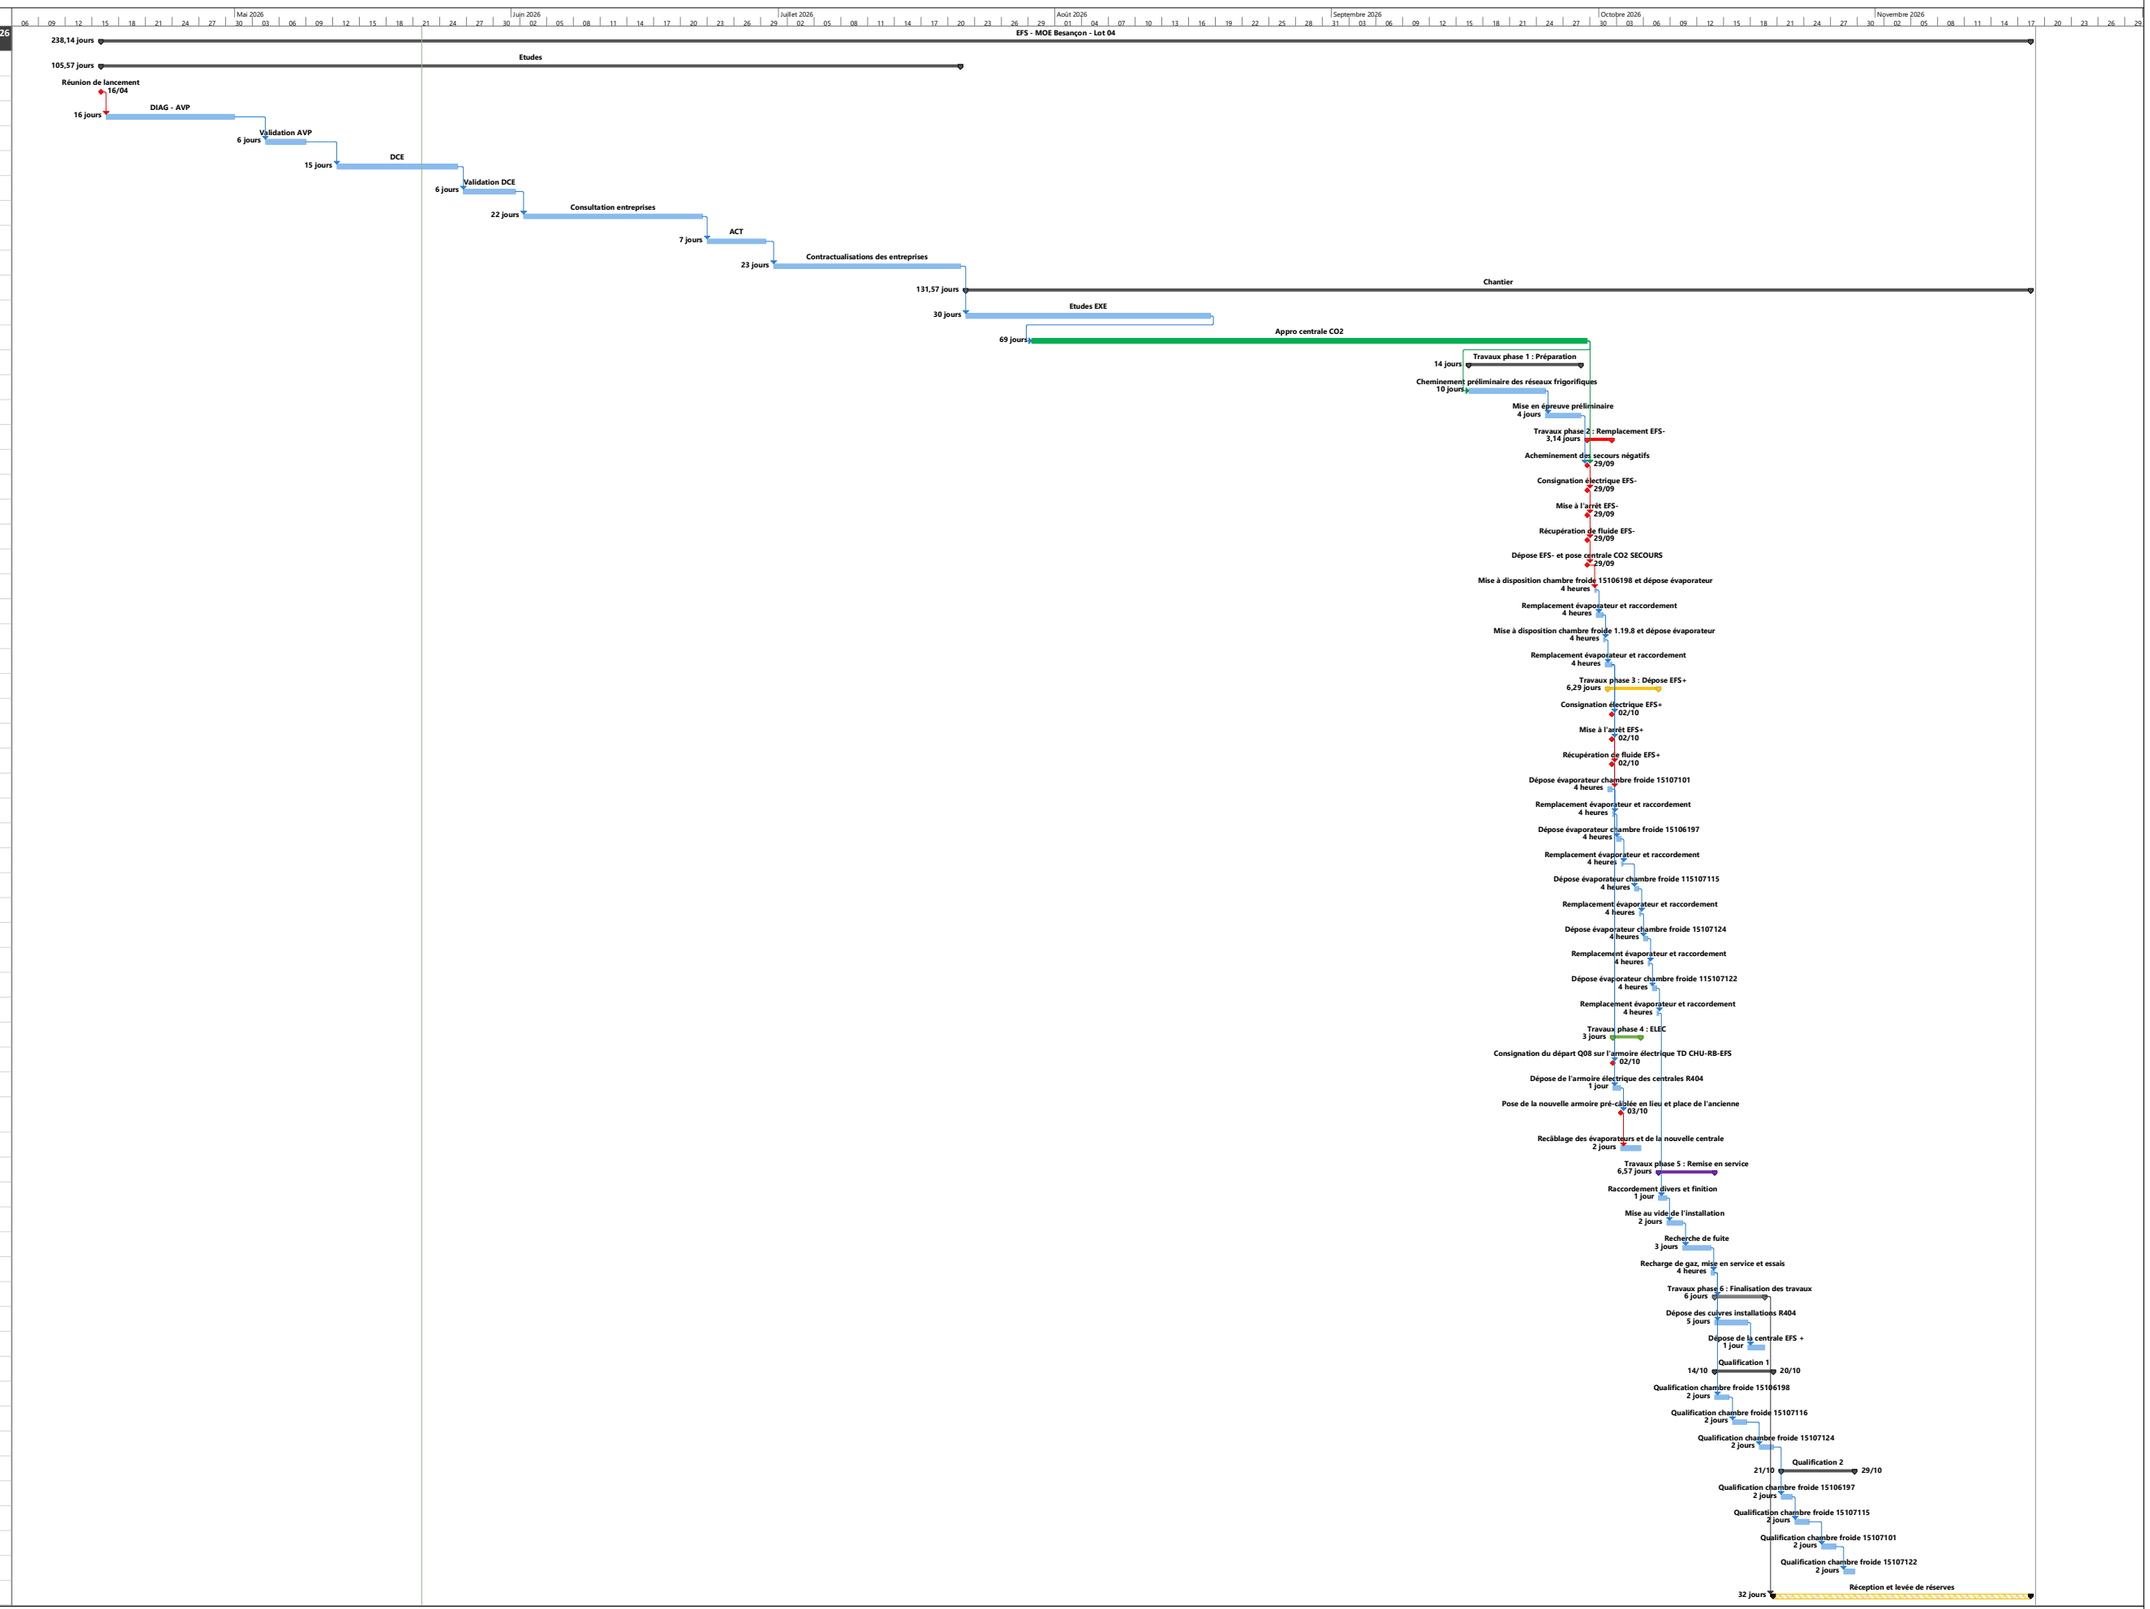
N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	**EFS - MOE Besançon - Lot 04**	**Jeu 16/04/26**	**Mer 18/11/26**
2	**Etudes**	**Jeu 16/04/26**	**Mar 21/07/26**
3	Réunion de lancement	Jeu 16/04/26	Jeu 16/04/26
4	DIAG - AVP	Jeu 16/04/26	Jeu 30/04/26
5	Validation AVP	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26
6	DCE	Mar 12/05/26	Lun 25/05/26
7	Validation DCE	Mar 26/05/26	Lun 01/06/26
8	Consultation entreprises	Mar 02/06/26	Lun 22/06/26
9	ACT	Mar 23/06/26	Lun 29/06/26
10	Contractualisations des entreprises	Mar 30/06/26	Mar 21/07/26
11	**Chantier**	**Mer 22/07/26**	**Mer 18/11/26**
12	Etudes EXE	Mer 22/07/26	Mar 18/08/26
13	Appro centrale CO2	Mer 29/07/26	Mar 29/09/26
14	**Travaux phase 1 : Préparation**	**Mer 16/09/26**	**Mar 29/09/26**
15	Cheminement préliminaire des réseaux frigorifiques	Mer 16/09/26	Jeu 24/09/26
16	Mise en épreuve préliminaire	Ven 25/09/26	Mar 29/09/26
17	**Travaux phase 2 : Remplacement EFS-**	**Mar 29/09/26**	**Ven 02/10/26**
18	Acheminement des secours négatifs	Mar 29/09/26	Mar 29/09/26
19	Consignation électrique EFS-	Mar 29/09/26	Mar 29/09/26
20	Mise à l'arrêt EFS-	Mar 29/09/26	Mar 29/09/26
21	Récupération de fluide EFS-	Mar 29/09/26	Mar 29/09/26
22	Dépose EFS- et pose centrale CO2 SECOURS	Mar 29/09/26	Mar 29/09/26
23	Mise à disposition chambre froide 15106198 et dépose évaporateur	Mer 30/09/26	Mer 30/09/26
24	Remplacement évaporateur et raccordement	Mer 30/09/26	Jeu 01/10/26
25	Mise à disposition chambre froide 1.19.8 et dépose évaporateur	Jeu 01/10/26	Jeu 01/10/26
26	Remplacement évaporateur et raccordement	Jeu 01/10/26	Ven 02/10/26
27	**Travaux phase 3 : Dépose EFS+**	**Ven 02/10/26**	**Mer 07/10/26**
28	Consignation électrique EFS+	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26
29	Mise à l'arrêt EFS+	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26
30	Récupération de fluide EFS+	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26
31	Dépose évaporateur chambre froide 15107101	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26
32	Remplacement évaporateur et raccordement	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26
33	Dépose évaporateur chambre froide 15106197	Sam 03/10/26	Sam 03/10/26
34	Remplacement évaporateur et raccordement	Sam 03/10/26	Sam 03/10/26
35	Dépose évaporateur chambre froide 115107115	Lun 05/10/26	Lun 05/10/26
36	Remplacement évaporateur et raccordement	Lun 05/10/26	Lun 05/10/26
37	Dépose évaporateur chambre froide 15107124	Mar 06/10/26	Mar 06/10/26
38	Remplacement évaporateur et raccordement	Mar 06/10/26	Mar 06/10/26
39	Dépose évaporateur chambre froide 115107122	Mer 07/10/26	Mer 07/10/26
40	Remplacement évaporateur et raccordement	Mer 07/10/26	Mer 07/10/26
41	**Travaux phase 4 : ELEC**	**Ven 02/10/26**	**Lun 05/10/26**
42	Consignation du départ Q08 sur l'armoire électrique TD	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26
43	Dépose de l'armoire électrique des centrales R404	Ven 02/10/26	Sam 03/10/26
44	Pose de la nouvelle armoire pré-câblée en lieu et place de l'ancienne	Sam 03/10/26	Sam 03/10/26
45	Recâblage des évaporateurs et de la nouvelle centrale	Sam 03/10/26	Lun 05/10/26
46	**Travaux phase 5 : Remise en service**	**Mer 07/10/26**	**Mar 13/10/26**
47	Raccordement divers et finition	Mer 07/10/26	Jeu 08/10/26
48	Mise au vide de l'installation	Jeu 08/10/26	Sam 10/10/26
49	Recherche de fuite	Sam 10/10/26	Mar 13/10/26
50	Recharge de gaz, mise en service et essais	Mar 13/10/26	Mar 13/10/26
51	**Travaux phase 6 : Finalisation des travaux**	**Mer 14/10/26**	**Lun 19/10/26**
52	Dépose des cuivres installations R404	Mer 14/10/26	Sam 17/10/26
53	Dépose de la centrale EFS +	Sam 17/10/26	Lun 19/10/26
54	**Qualification 1**	**Mer 14/10/26**	**Mar 20/10/26**
55	Qualification chambre froide 15106198	Mer 14/10/26	Jeu 15/10/26
56	Qualification chambre froide 15107116	Ven 16/10/26	Sam 17/10/26
57	Qualification chambre froide 15107124	Lun 19/10/26	Mar 20/10/26
58	**Qualification 2**	**Mer 21/10/26**	**Jeu 29/10/26**
59	Qualification chambre froide 15106197	Mer 21/10/26	Jeu 22/10/26
60	Qualification chambre froide 15107115	Ven 23/10/26	Sam 24/10/26
61	Qualification chambre froide 15107101	Lun 26/10/26	Mar 27/10/26
62	Qualification chambre froide 15107122	Mer 28/10/26	Jeu 29/10/26
63	**Réception et levée de réserves**	**Mar 20/10/26**	**Mer 18/11/26**
