Life Ingénierie
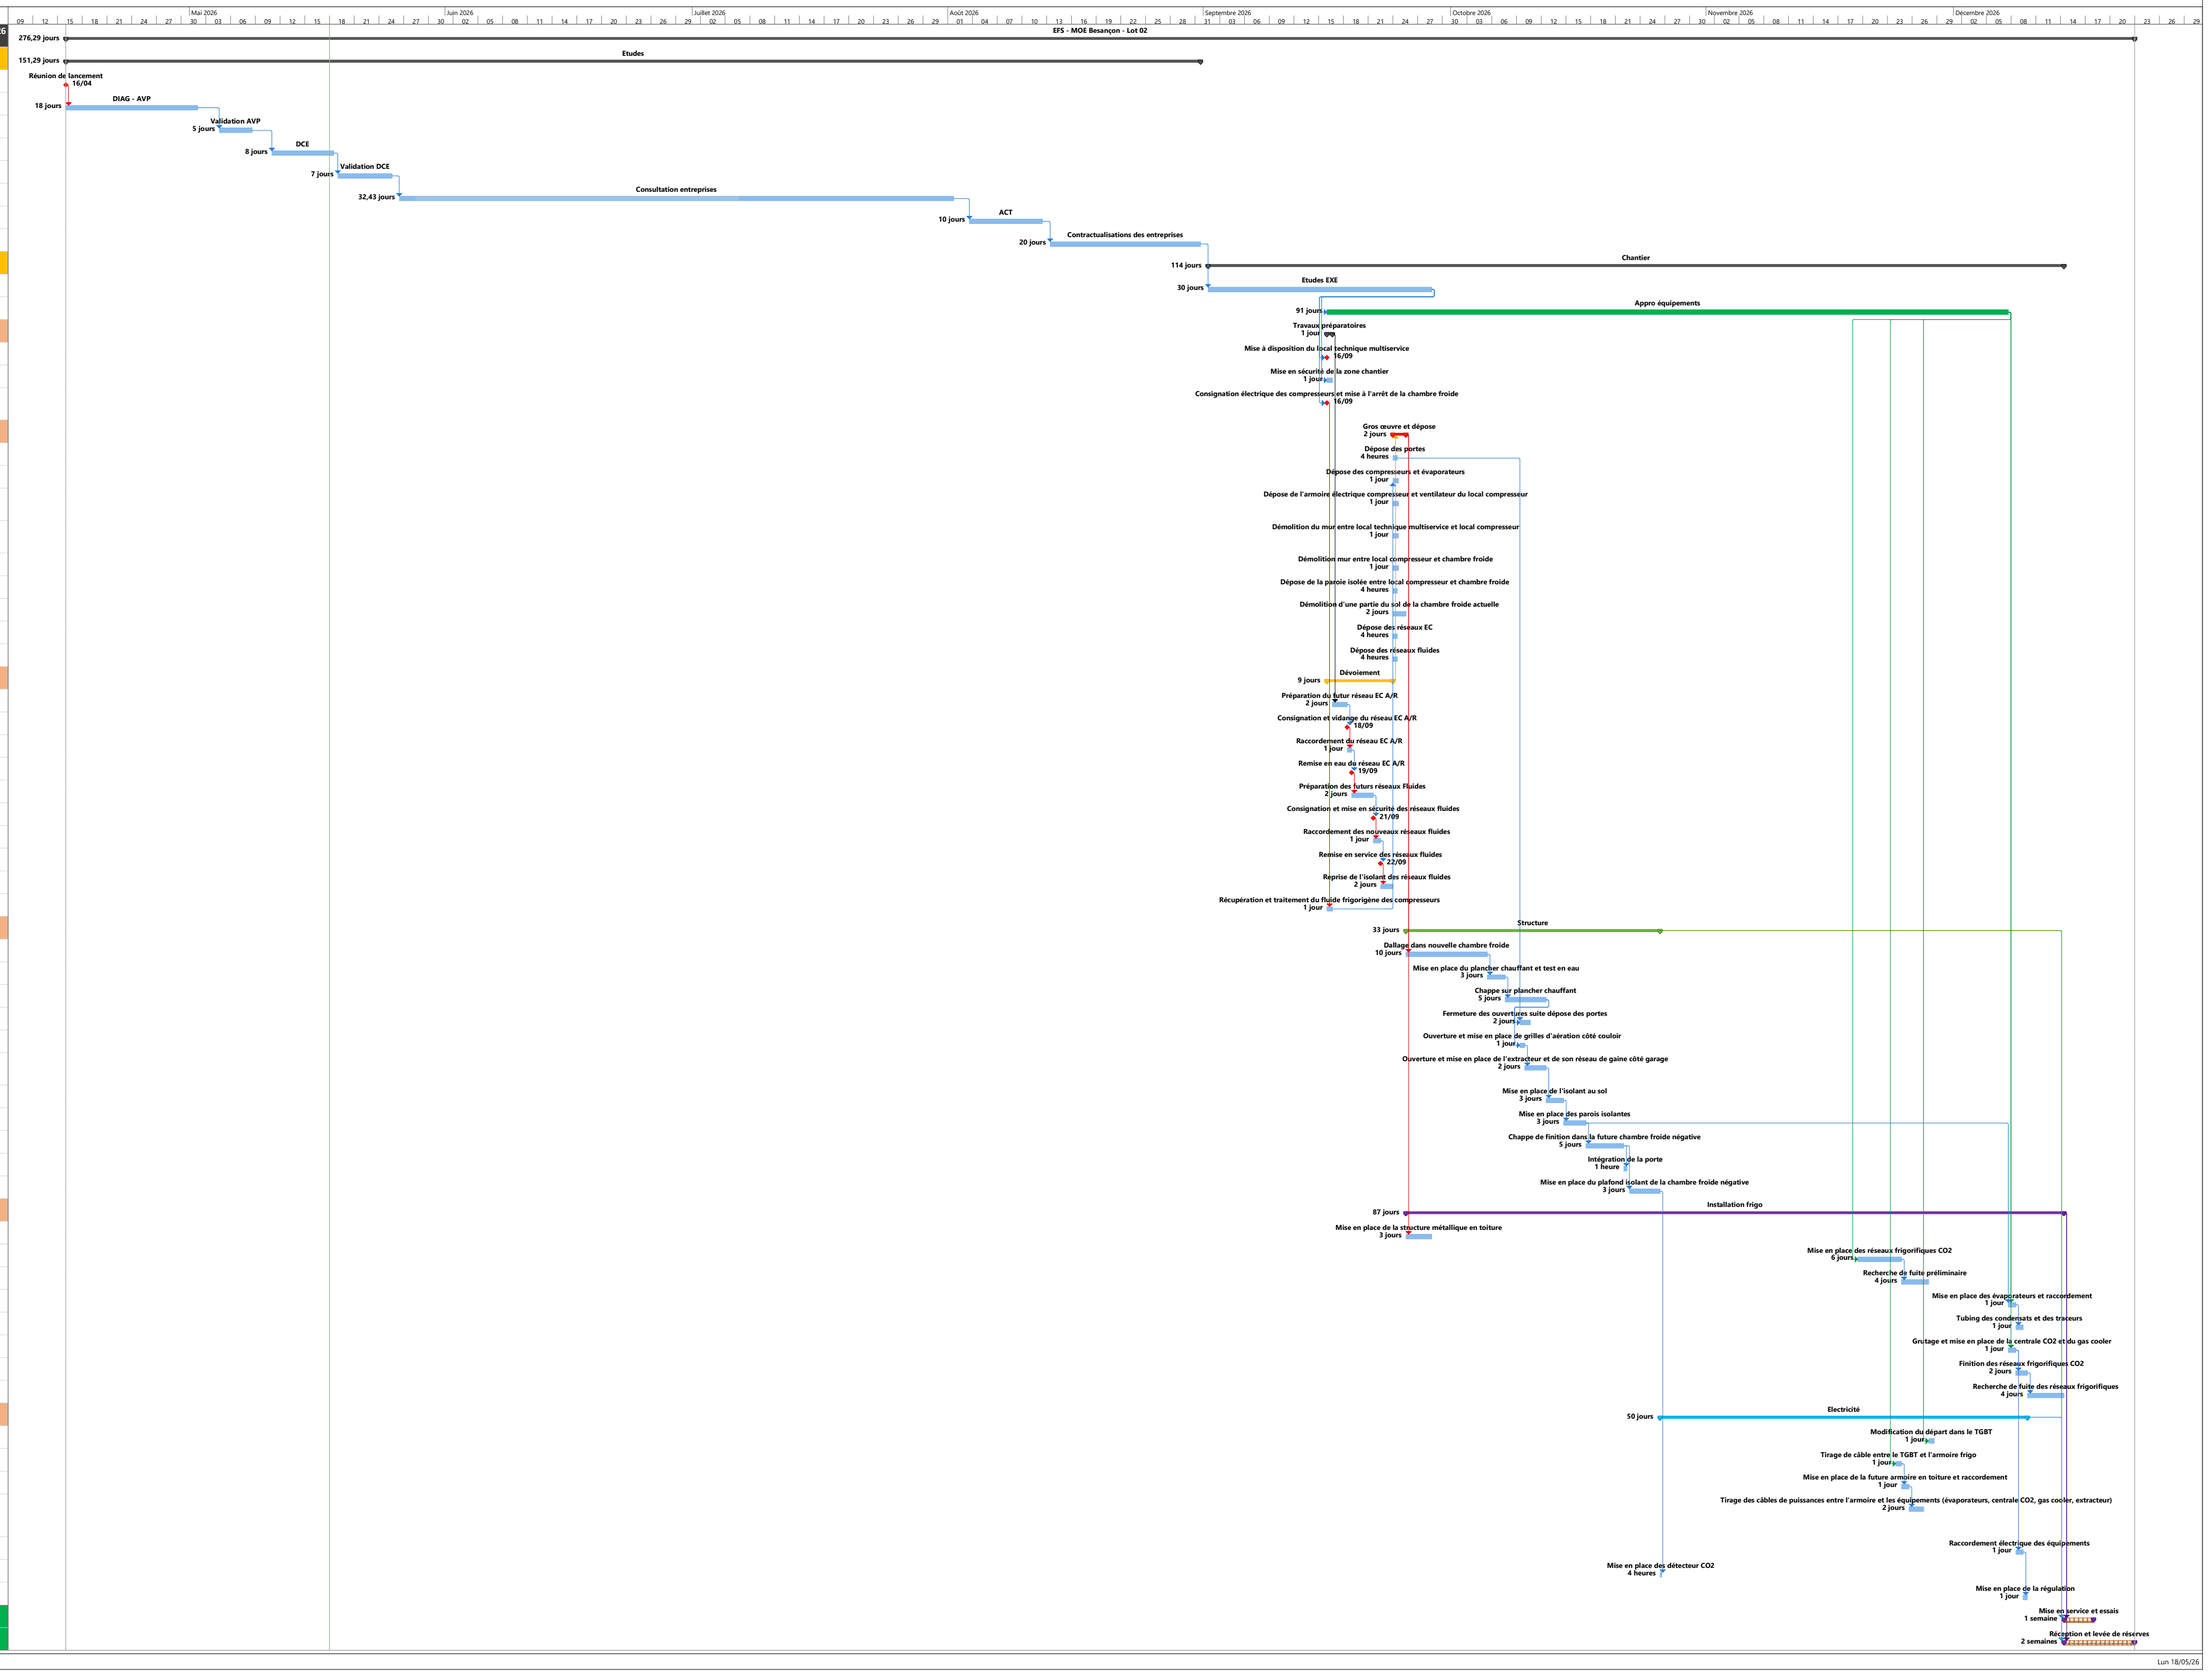
N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	**EFS - MOE Besançon - Lot 02**	**Jeu 16/04/26**	**Mar 22/12/26**
2	**Etudes**	**Jeu 16/04/26**	**Lun 31/08/26**
3	Réunion de lancement	Jeu 16/04/26	Jeu 16/04/26
4	DIAG - AVP	Jeu 16/04/26	Sam 02/05/26
5	Validation AVP	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26
6	DCE	Lun 11/05/26	Lun 18/05/26
7	Validation DCE	Mar 19/05/26	Lun 25/05/26
8	Consultation entreprises	Mar 26/05/26	Sam 01/08/26
9	ACT	Lun 03/08/26	Mer 12/08/26
10	Contractualisations des entreprises	Jeu 13/08/26	Lun 31/08/26
11	**Chantier**	**Mar 01/09/26**	**Lun 14/12/26**
12	Etudes EXE	Mar 01/09/26	Lun 28/09/26
13	Appro équipements	Mer 16/09/26	Lun 07/12/26
14	**Travaux préparatoires**	**Mer 16/09/26**	**Mer 16/09/26**
15	Mise à disposition du local technique multiservice	Mer 16/09/26	Mer 16/09/26
16	Mise en sécurité de la zone chantier	Mer 16/09/26	Mer 16/09/26
17	Consignation électrique des compresseurs et mise à l'arrêt de la chambre froide	Mer 16/09/26	Mer 16/09/26
18	**Gros œuvre et dépose**	**Jeu 24/09/26**	**Ven 25/09/26**
19	Dépose des portes	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26
20	Dépose des compresseurs et évaporateurs	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26
21	Dépose de l'armoire électrique compresseur et ventilateur du local compresseur	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26
22	Démolition du mur entre local technique multiservice et local compresseur	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26
23	Démolition mur entre local compresseur et chambre froide	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26
24	Dépose de la paroie isolée entre local compresseur et chambre	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26
25	Démolition d'une partie du sol de la chambre froide actuelle	Jeu 24/09/26	Ven 25/09/26
26	Dépose des réseaux EC	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26
27	Dépose des réseaux fluides	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26
28	**Dévoiement**	**Mer 16/09/26**	**Mer 23/09/26**
29	Préparation du futur réseau EC A/R	Mer 16/09/26	Ven 18/09/26
30	Consignation et vidange du réseau EC A/R	Ven 18/09/26	Ven 18/09/26
31	Raccordement du réseau EC A/R	Ven 18/09/26	Sam 19/09/26
32	Remise en eau du réseau EC A/R	Sam 19/09/26	Sam 19/09/26
33	Préparation des futurs réseaux Fluides	Sam 19/09/26	Lun 21/09/26
34	Consignation et mise en sécurité des réseaux fluides	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26
35	Raccordement des nouveaux réseaux fluides	Lun 21/09/26	Mar 22/09/26
36	Remise en service des réseaux fluides	Mar 22/09/26	Mar 22/09/26
37	Reprise de l'isolant des réseaux fluides	Mar 22/09/26	Mer 23/09/26
38	Récupération et traitement du fluide frigorigène des	Mer 16/09/26	Mer 16/09/26
39	**Structure**	**Ven 25/09/26**	**Lun 26/10/26**
40	Dallage dans nouvelle chambre froide	Ven 25/09/26	Lun 05/10/26
41	Mise en place du plancher chauffant et test en eau	Lun 05/10/26	Mer 07/10/26
42	Chappe sur plancher chauffant	Mer 07/10/26	Lun 12/10/26
43	Fermeture des ouvertures suite dépose des portes	Ven 09/10/26	Sam 10/10/26
44	Ouverture et mise en place de grilles d'aération côté couloir	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26
45	Ouverture et mise en place de l'extracteur et de son réseau de gaine côté garage	Sam 10/10/26	Lun 12/10/26
46	Mise en place de l'isolant au sol	Lun 12/10/26	Mer 14/10/26
47	Mise en place des parois isolantes	Mer 14/10/26	Sam 17/10/26
48	Chappe de finition dans la future chambre froide négative	Sam 17/10/26	Jeu 22/10/26
49	Intégration de la porte	Jeu 22/10/26	Jeu 22/10/26
50	Mise en place du plafond isolant de la chambre froide négative	Jeu 22/10/26	Lun 26/10/26
51	**Installation frigo**	**Ven 25/09/26**	**Lun 14/12/26**
52	Mise en place de la structure métallique en toiture	Ven 25/09/26	Lun 28/09/26
53	Mise en place des réseaux frigorifiques CO2	Jeu 19/11/26	Mar 24/11/26
54	Recherche de fuite préliminaire	Mar 24/11/26	Ven 27/11/26
55	Mise en place des évaporateurs et raccordement	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26
56	Tubing des condensats et des traceurs	Mar 08/12/26	Mer 09/12/26
57	Grutage et mise en place de la centrale CO2 et du gas cooler	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26
58	Finition des réseaux frigorifiques CO2	Mar 08/12/26	Jeu 10/12/26
59	Recherche de fuite des réseaux frigorifiques	Jeu 10/12/26	Lun 14/12/26
60	**Electricité**	**Lun 26/10/26**	**Jeu 10/12/26**
61	Modification du départ dans le TGBT	Sam 28/11/26	Sam 28/11/26
62	Tirage de câble entre le TGBT et l'armoire frigo	Mar 24/11/26	Mar 24/11/26
63	Mise en place de la future armoire en toiture et raccordement	Mar 24/11/26	Mer 25/11/26
64	Tirage des câbles de puissances entre l'armoire et les équipements (évaporateurs, centrale CO2, gas cooler,	Mer 25/11/26	Ven 27/11/26
65	Raccordement électrique des équipements	Mar 08/12/26	Mer 09/12/26
66	Mise en place des détecteur CO2	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26
67	Mise en place de la régulation	Mer 09/12/26	Jeu 10/12/26
68	**Mise en service et essais**	**Lun 14/12/26**	**Ven 18/12/26**
69	**Réception et levée de réserves**	**Lun 14/12/26**	**Mar 22/12/26**
