DRFIP
REINSTALLATION DES SERVICES ET REAMENAGEMENT DE LA COUR NTERIEURE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE STRASBOURG
35 avenue des Vosges 67 000 Strasbourg

PRINCIPE DE CALENDRIER D'EXECUTION

PHASE DCE-Ind0

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	**PHASE 2 - BUREAUX - ESPACE DETENTE ET AMENAGEMENTS DE COUR EXTERIEURE**				
2	PERMIS DE CONSTRUIRE	120 jrs	Lun 15/06/26	Ven 27/11/26	
3	OBTENTION DU PC - PURGE DES RECOURS	6 m	Lun 15/06/26	Ven 27/11/26	
4	**PREPATION DE CHANTIER**				
5	OS DE DEMARRAGE	1 jr	Mar 01/09/26	Mar 01/09/26	
6	**PREPARATION DE CHANTIER**	15 jrs	Mer 02/09/26	Mar 22/09/26	
7	Installations de chantier	2 sem.	Mer 02/09/26	Mar 15/09/26	5
8	Consignation des réseaux	1 sem.	Mer 16/09/26	Mar 22/09/26	7
9					
10	**SOUS-SOL TRAVAUX ESPACE COURRIER**				
11	DEPOSE DES CLOISONS ET ADAPTATION DES FAUX-PLAFOND AU DROIT DES CLOISONS DEPOSEES	3 jrs	Mer 23/09/26	Ven 25/09/26	8
12	**NOUVELLES CLOISONS**	9 jrs	Lun 28/09/26	Jeu 08/10/26	11
13	POSE DE L'OSSATURE ET 1ER PEAU	4 jrs	Lun 28/09/26	Jeu 01/10/26	
14	PASSAGE DES FOURREAUX ET RESEAUX DANS CLOISONS ET FAUX-PLAFOND	3 jrs	Ven 02/10/26	Mar 06/10/26	13
15	POSE DE LA 2EME PEAU	2 jrs	Mer 07/10/26	Jeu 08/10/26	14
16	POSE DE BLOCS-PORTES	1 jr	Mer 07/10/26	Mer 07/10/26	14
17	DEVOIEMENT DE RESEAUX EU/EC - EF	2 jrs	Jeu 08/10/26	Ven 09/10/26	16
18	DEPLACEMENT DE RADIATEUR Y COMPRIS MODIFICATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE AR	2 jrs	Lun 12/10/26	Mar 13/10/26	17
19	INTERVENTION SUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - POSTE DE TRAVAIL - ECLAIRAGE - SECURITE INCENDIE ET BAES	5 jrs	Mer 14/10/26	Mar 20/10/26	18
20	INTERVENTION SUR FAUX-PLAFONDS	4 jrs	Mer 21/10/26	Lun 26/10/26	19
21	MISE EN PEINTURE DES LOCAUX	5 jrs	Mar 27/10/26	Lun 02/11/26	20
22	REFECTION DES SOLS	5 jrs	Mar 03/11/26	Lun 09/11/26	21
23	FINITIONS PEINTURE	3 jrs	Mar 10/11/26	Jeu 12/11/26	22
24	ESSAIS ET MISES EN SERVICE	1 jr	Ven 13/11/26	Ven 13/11/26	23
25	OPR	1 jr	Lun 16/11/26	Lun 16/11/26	24
26	LEVEES DES RESERVES	3 jrs	Mar 17/11/26	Jeu 19/11/26	25
27	LIBERATION DE LA ZONE	1 jr	Ven 20/11/26	Ven 20/11/26	26
28					
29	**RDC - BUREAUX THUS**				
30	DEMOLITION - CURAGE	2 jrs	Mer 30/09/26	Jeu 01/10/26	8
31	**NOUVELLES CLOISONS**	9 jrs	Ven 02/10/26	Mer 14/10/26	30
32	POSE DE L'OSSATURE ET 1ER PEAU	4 jrs	Ven 02/10/26	Mer 07/10/26	
33	PASSAGE DES FOURREAUX ET RESEAUX DANS CLOISONS ET FAUX-PLAFOND	3 jrs	Jeu 08/10/26	Lun 12/10/26	32
34	POSE DE LA 2EME PEAU	2 jrs	Mar 13/10/26	Mer 14/10/26	33
35	POSE DE BLOCS-PORTES ET ENSEMBLES MENUISES INTERIEURES	3 jrs	Jeu 15/10/26	Lun 19/10/26	34
36	DEVOIEMENT DE RESEAUX EU/EC - EF	2 jrs	Mar 20/10/26	Mer 21/10/26	35
37	DEPLACEMENT DE RADIATEUR Y COMPRIS MODIFICATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE AR	2 jrs	Jeu 22/10/26	Ven 23/10/26	36
38	VENTILATION DES LOCAUX A POLLUTION SPECIFIQUE	20 jrs	Lun 26/10/26	Ven 20/11/26	37
39	INTERVENTION SUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - POSTE DE TRAVAIL - ECLAIRAGE - SECURITE INCENDIE ET BAES	20 jrs	Lun 26/10/26	Ven 20/11/26	37
40	MISE EN PEINTURE DES LOCAUX - PREPARATION DES SUPPORTS	15 jrs	Mar 20/10/26	Lun 09/11/26	35
41	FAUX-PLAFONDS	5 jrs	Mar 10/11/26	Lun 16/11/26	40
42	REFECTION DES SOLS	5 jrs	Mar 17/11/26	Lun 23/11/26	41
43	FINITION PEINTURE	10 jrs	Mar 24/11/26	Lun 07/12/26	42
44	ESSAIS ET MISES EN SERVICE	1 jr	Mar 08/12/26	Mar 08/12/26	43
45	OPR	1 jr	Mer 09/12/26	Mer 09/12/26	44
46	LEVEES DES RESERVES	2 jrs	Jeu 10/12/26	Ven 11/12/26	45
47	LIBERATION DE LA ZONE	1 jr	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26	46
48					
49	**R+1- BUREAUX**				
50	DEMOLITION - CURAGE	1 jr	Lun 05/10/26	Lun 05/10/26	11
51	DEPLACEMENT DE RADIATEUR Y COMPRIS MODIFICATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE AR	1 jr	Mar 06/10/26	Mar 06/10/26	50
52	VENTILATION DES LOCAUX A POLLUTION NON SPECIFIQUE	15 jrs	Mer 07/10/26	Mar 27/10/26	51
53	INTERVENTION SUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - POSTE DE TRAVAIL - ECLAIRAGE - SECURITE INCENDIE ET BAES	15 jrs	Mer 07/10/26	Mar 27/10/26	51
54	MISE EN PEINTURE DES LOCAUX - PREPARATION DES SUPPORTS	15 jrs	Mer 28/10/26	Mar 17/11/26	53
55	FAUX-PLAFONDS	7 jrs	Mer 18/11/26	Jeu 26/11/26	54
56	REFECTION DES SOLS	5 jrs	Ven 27/11/26	Jeu 03/12/26	55
57	FINITION PEINTURE	10 jrs	Ven 04/12/26	Jeu 17/12/26	56
58	ESSAIS ET MISES EN SERVICE	1 jr	Ven 18/12/26	Ven 18/12/26	57
59	OPR	1 jr	Lun 21/12/26	Lun 21/12/26	58
60	LEVEES DES RESERVES	2 jrs	Mar 22/12/26	Mer 23/12/26	59
61	LIBERATION DE LA ZONE	1 jr	Jeu 24/12/26	Jeu 24/12/26	60
62					
63	**SOUS-SOL - TRAVAUX LOCAL MENAGE - SANITAIRE PMR - ESPACE DETENTE - LOCAL ARCHIVES - LOCAL CTA - DEGAGEMENT 9**				
64	DEMOLITION - CURAGE	4 jrs	Ven 18/12/26	Mer 23/12/26	27
65	REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES (pm : plans d'exécution et frabication à engager dès la diffusion de l'OS de démarrage)	3 jrs	Jeu 24/12/26	Lun 28/12/26	64
66	**INTERVENTION LOCAL CTA**	12 jrs	Mar 29/12/26	Mer 13/01/27	
67	MUR PARPAING CF1H LOCAL CTA	10 jrs	Mar 29/12/26	Lun 11/01/27	65
68	POSE DE BLOC-PORTE	1 jr	Mar 12/01/27	Mar 12/01/27	67
69	INTERVENTIONS ELECTRIQUES - SSI	1 jr	Mer 13/01/27	Mer 13/01/27	68
70	**NOUVELLES CLOISONS**	9 jrs	Jeu 24/12/26	Mar 05/01/27	64
71	POSE DE L'OSSATURE ET 1ER PEAU	4 jrs	Jeu 24/12/26	Mar 29/12/26	
72	PASSAGE DES FOURREAUX ET RESEAUX DANS CLOISONS ET FAUX-PLAFOND	3 jrs	Mer 30/12/26	Ven 01/01/27	71
73	POSE DE LA 2EME PEAU	2 jrs	Lun 04/01/27	Mar 05/01/27	72
74	FLOCAGE ACOUSTIQUE - THERMIQUE ET COUPE-FEU DES LOCAUX	1 jr	Mer 06/01/27	Mer 06/01/27	73
75	MISE EN PEINTURE DES LOCAUX - PREPARATION DES SUPPORTS	15 jrs	Jeu 07/01/27	Mer 27/01/27	74
76	REFECTION DES SOL	5 jrs	Jeu 28/01/27	Mer 03/02/27	75
77	POSE DE BLOCS-PORTES ET ENSEMBLES MENUISES INTERIEURES	3 jrs	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	76
78	DEVOIEMENT DE RESEAUX EU/EC - EF	2 jrs	Mar 09/02/27	Mer 10/02/27	77
79	DEPLACEMENT DE RADIATEUR Y COMPRIS MODIFICATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE AR	2 jrs	Jeu 11/02/27	Ven 12/02/27	78
80	VENTILATION DES LOCAUX A POLLUTION SPECIFIQUE	2 jrs	Lun 15/02/27	Mar 16/02/27	79
81	INTERVENTION SUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - POSTE DE TRAVAIL - ECLAIRAGE - SECURITE INCENDIE ET BAES	5 jrs	Mer 17/02/27	Mar 23/02/27	80
82	FAUX - PLAFONDS	5 jrs	Mer 24/02/27	Mar 02/03/27	81
83	INSTALLATION DU MOBILIER INTERIEUR	3 jrs	Mer 03/03/27	Ven 05/03/27	82
84	FAIENCE DE CREDENCE ET SANITAIRES	4 jrs	Lun 08/03/27	Jeu 11/03/27	83
85	FINITION PEINTURE	5 jrs	Ven 12/03/27	Jeu 18/03/27	84
86	ESSAIS ET MISES EN SERVICE	1 jr	Ven 19/03/27	Ven 19/03/27	85
87	OPR	1 jr	Lun 22/03/27	Lun 22/03/27	86
88	LEVEES DES RESERVES	3 jrs	Mar 23/03/27	Jeu 25/03/27	87
89	LIBERATION DE LA ZONE	1 jr	Ven 26/03/27	Ven 26/03/27	88
90					
91	**TRAVAUX EXTERIEURS - VRD - RAVALEMENTS DE FACADE**		Lun 30/11/26		3
92	RAVALEMENTS DE FACADE / SERRURERIE	47 jrs	Lun 30/11/26	Mar 02/02/27	3
93	Travaux de ravalement	47 jrs	Lun 30/11/26	Mar 02/02/27	
94	Mise en place des échafaudages	2 jrs	Lun 30/11/26	Mar 01/12/26	
95	Dégarnissage des façades	2 jrs	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26	94DD+5 jrs
96	Travaux de ravalements	2 m	Mer 09/12/26	Mar 02/02/27	95
97	ETUDE DE SOL ET FOUILLES ARCHEOLOGIQUES	15 jrs	Mer 02/09/26	Ven 23/10/26	5
98	**TRAVAUX EXTERIEURS - VRD**	83 jrs?	Lun 30/11/26	Mer 24/03/27	
99	TERRASSEMENTS	10 jrs	Lun 30/11/26	Ven 11/12/26	3
100	**EPMR**	51 jrs	Lun 14/12/26	Lun 22/02/27	99
101	GAINE BETON EPMR EXTERIEUR	10 jrs	Lun 14/12/26	Ven 25/12/26	
102	FABIRCATION EPMR	6 sem.	Lun 28/12/26	Ven 05/02/27	101
103	MISE EN PLACE EPMR	10 jrs	Lun 08/02/27	Ven 19/02/27	102
104	ESSAIS ET MISES EN SERVICE	1 jr	Lun 22/02/27	Lun 22/02/27	103
105	TERRASSE EN BETON - FACON DE GRADIN ET EMMARCHEMENTS EXTERIEURS	2 m	Lun 14/12/26	Ven 05/02/27	99
106	LOCAUX EXTERIEURS - CHEMINEMENTS - ECLAIRAGE	2 m	Lun 14/12/26	Ven 05/02/27	99
107	PLANTATIONS	10 jrs	Lun 08/02/27	Ven 19/02/27	106
108	RECEPTION DES TRAVAUX				
109	OPR	5 jrs	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27	107;103
110	Levée des réserves	10 jrs	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27	109DD
111	Vérification des levées de réserves	1 jr	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27	110FF
112					
113	**PHASE DE RECEPTION FINALE DU CHANTIER**	13 jrs	Lun 08/03/27	Mer 24/03/27	
114	OPR	2 jrs	Lun 08/03/27	Mar 09/03/27	111
115	LEVEES DES RESERVES	5 jrs	Mer 10/03/27	Mar 16/03/27	114
116	VERIFICATION DES LEVEES DE RESERVES	5 jrs	Mer 17/03/27	Mar 23/03/27	115
117	RECEPTION	1 jr	Mer 24/03/27	Mer 24/03/27	116

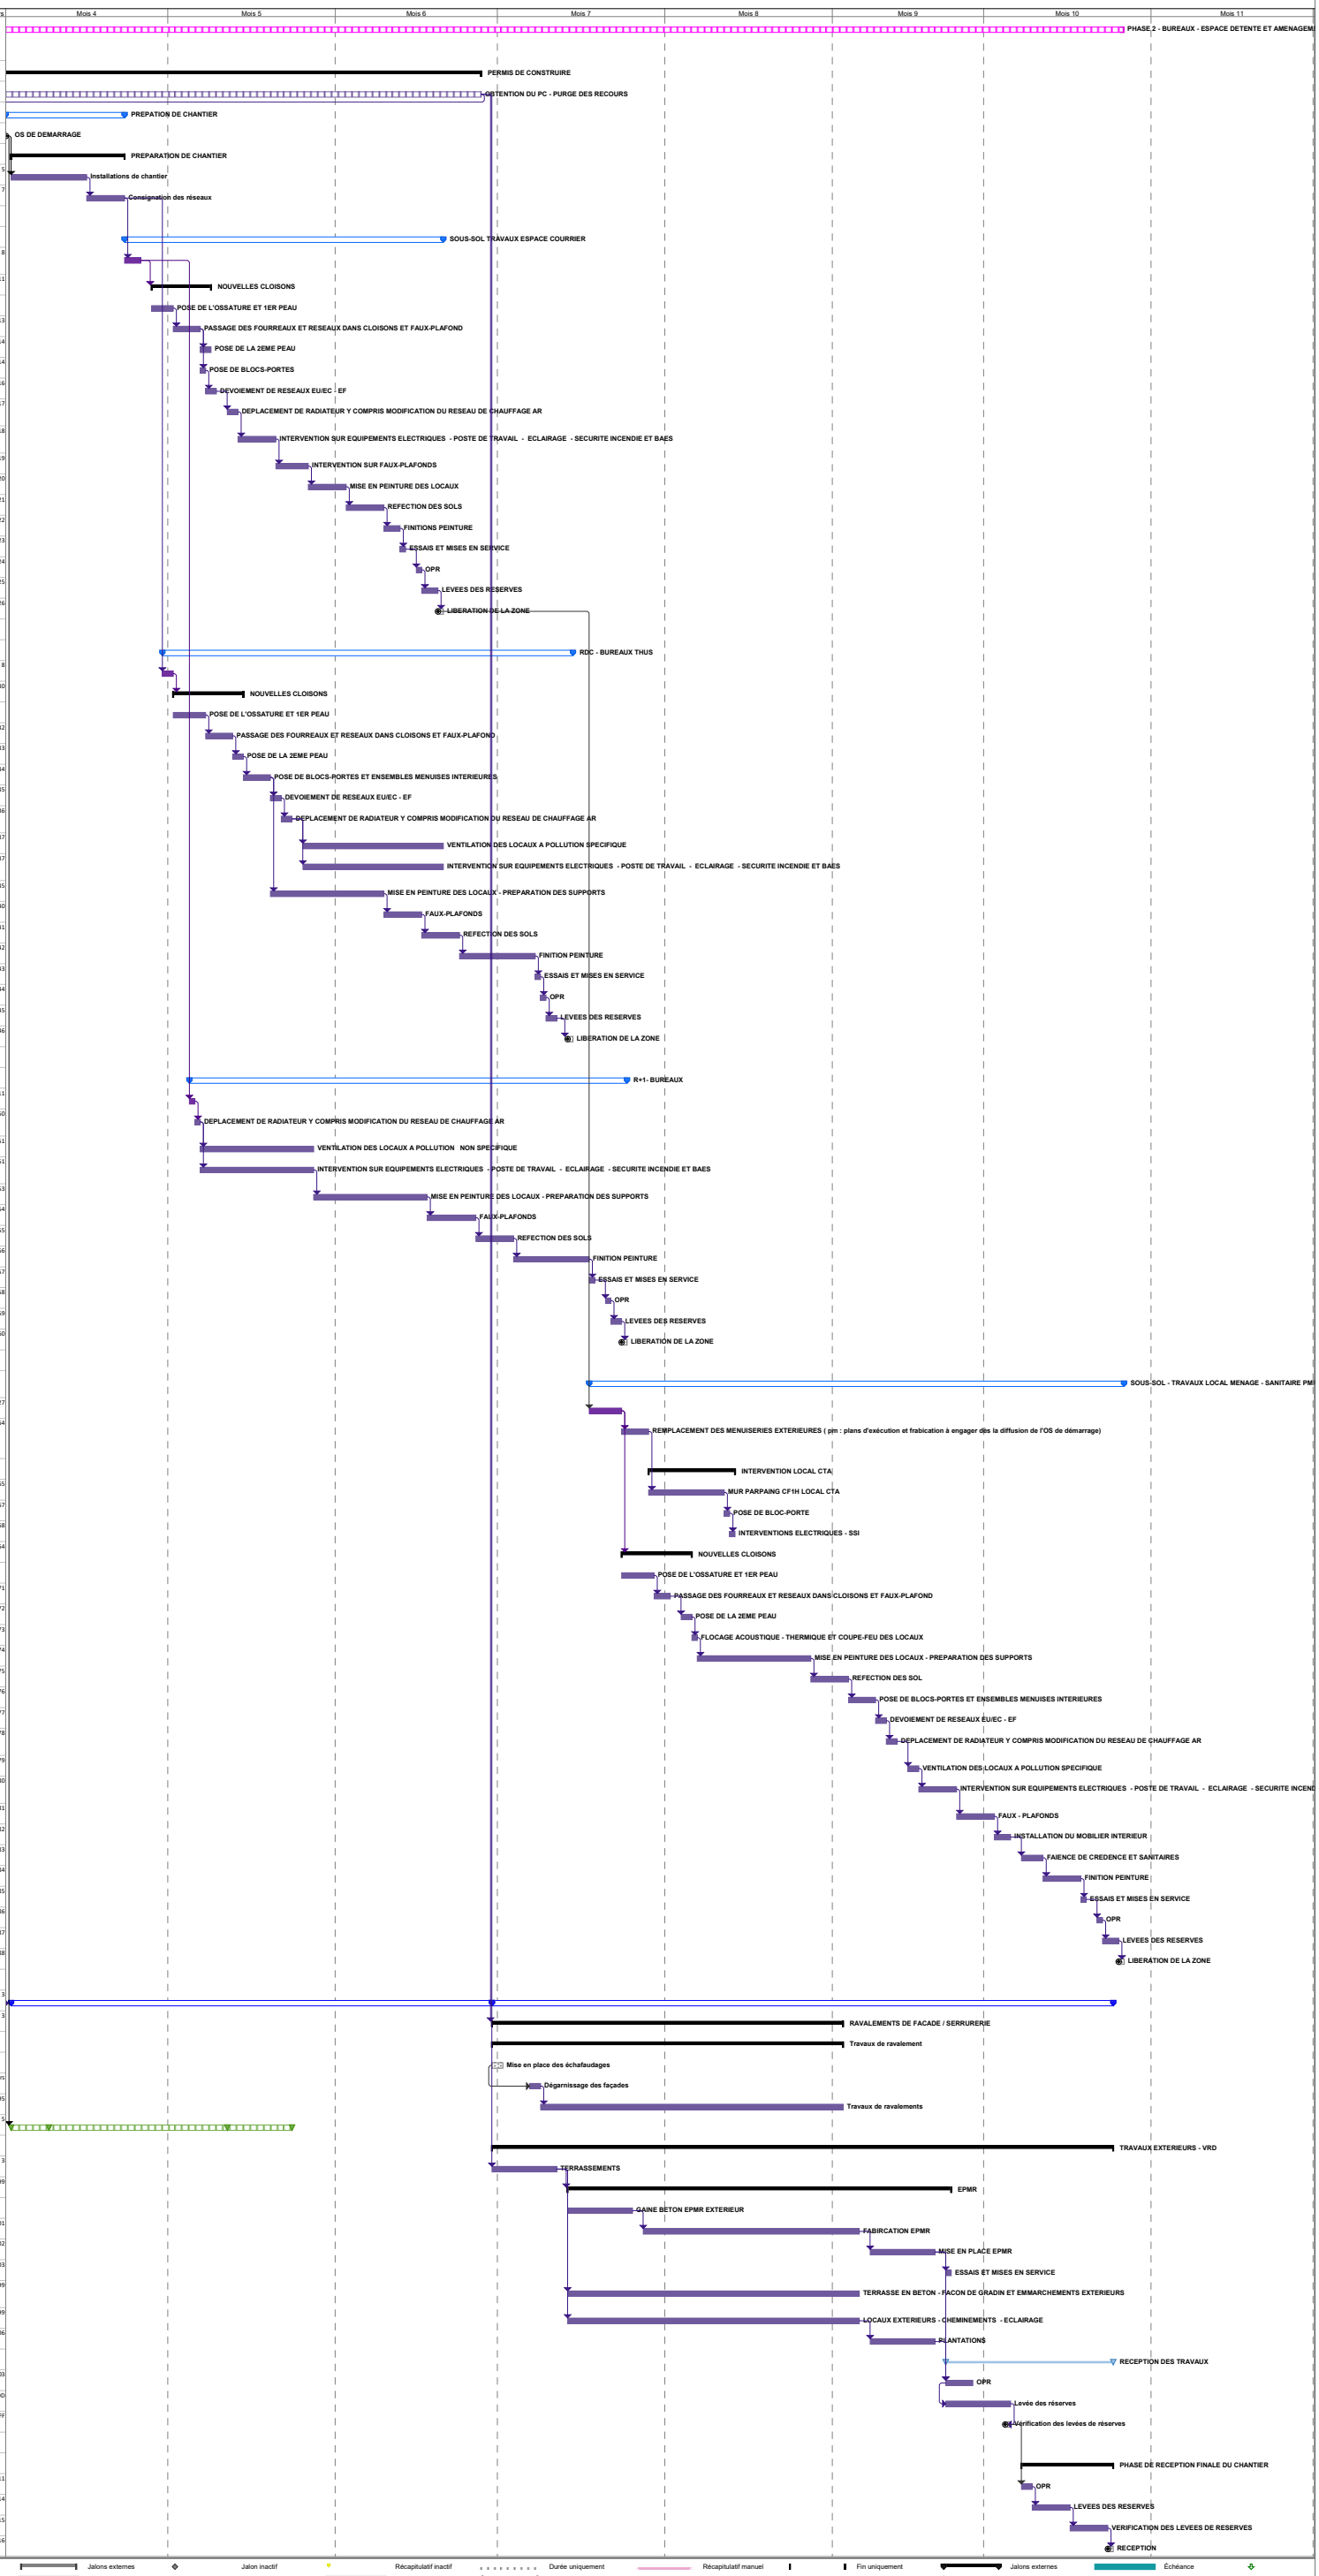

Projet : PLANNING VOSGES_35-PRO
Date : Mar 09/06/26

Tâche, Fractionnement, Jalon, Récapitulative, Récapitulatif du projet, Tâches externes, Jalons externes, Tâche inactive, Jalon inactif, Jalon inactif, Récapitulatif inactif, Tâche manuelle, Durée uniquement, Report récapitulatif manuel, Récapitulatif manuel, Début uniquement, Fin uniquement, Tâches externes, Jalons externes, Avancement, Échéance
