CNSMD - CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION - ETUDES ET TRAVAUX

DÉTAIL TRAVAUX ANTICIPES
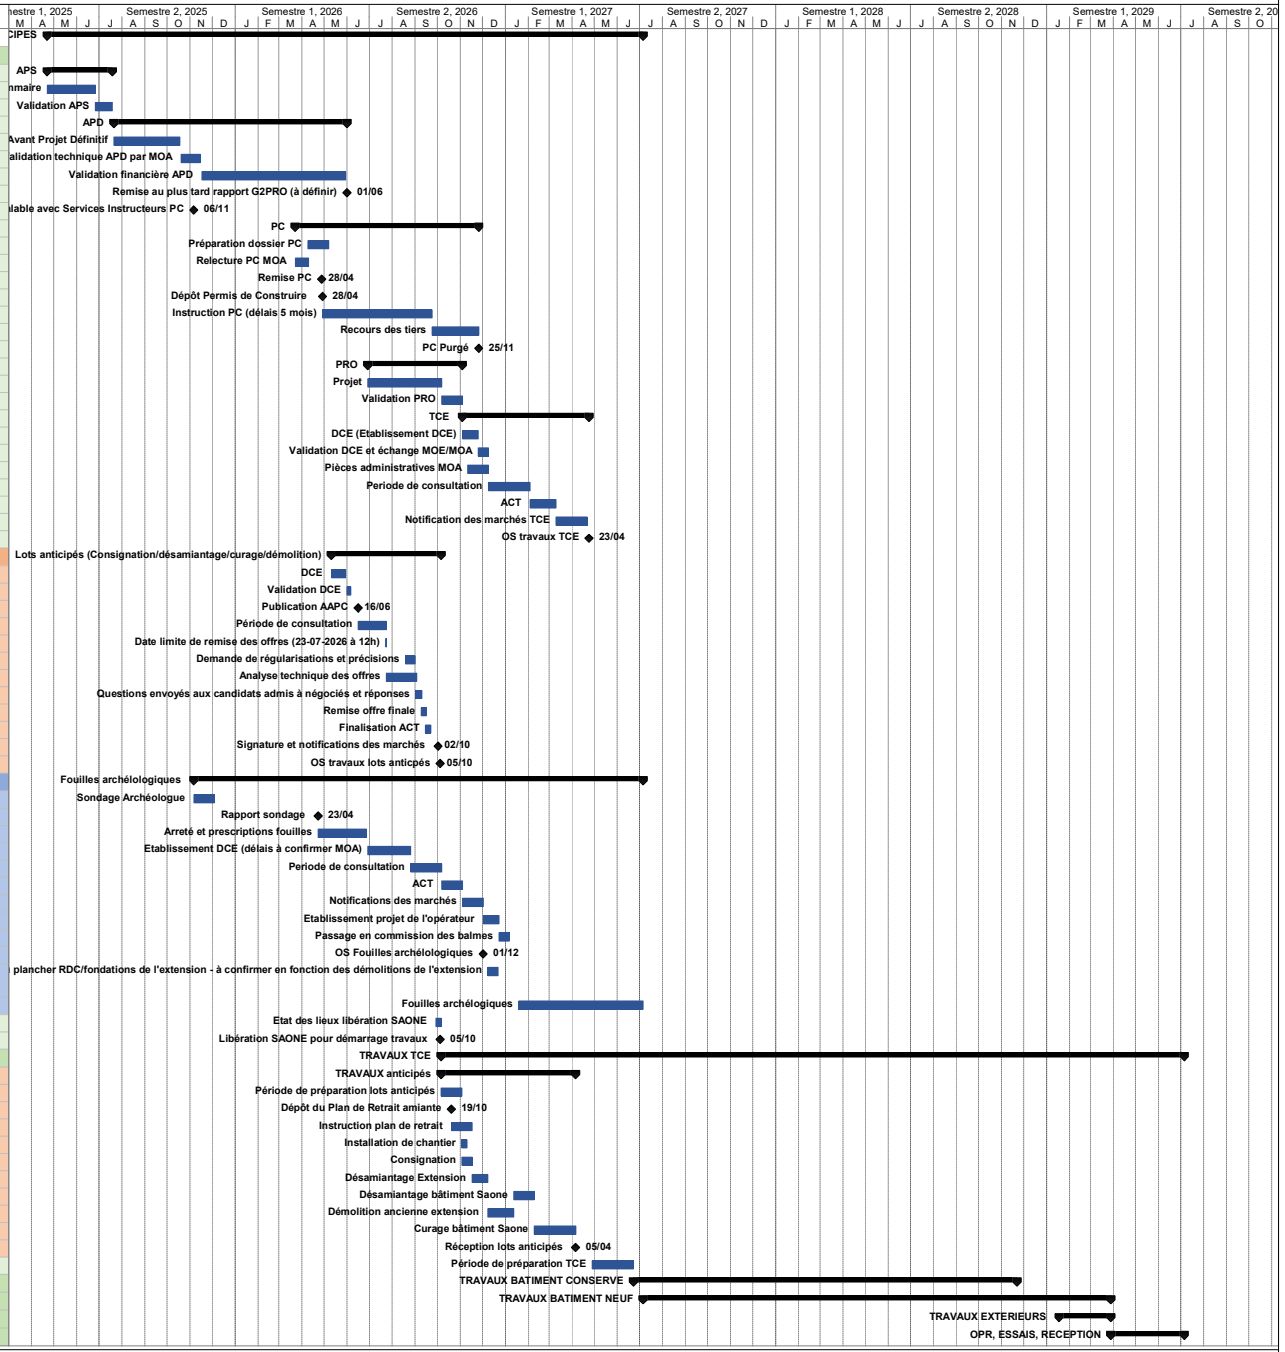
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	% achevé
1	**ETUDES - CONSULTATIONS - FOUILLES - TRAVAUX ANTICIPES**	**26,65 m**	**Mar 22/04/25**	**Lun 05/07/27**		**14%**
2	**ETUDES**	**24,1 m**	**Mar 22/04/25**	**Ven 23/04/27**		**21%**
3	APS	3,2 m	Mar 22/04/25	Ven 18/07/25		100%
4	Avant Projet Sommaire	47 jrs	Mar 22/04/25	Mer 25/06/25		100%
5	Validation APS	3,4 sem.	Jeu 26/06/25	Ven 18/07/25	4	100%
6	APD	10 m	Lun 21/07/25	Lun 01/06/26		45%
7	Avant Projet Définitif	10 sem.	Lun 21/07/25	Ven 17/10/25	5	100%
8	Validation technique APD par MOA	4 sem.	Lun 20/10/25	Ven 14/11/25	7	100%
9	Validation financière APD	26 sem.	Lun 17/11/25	Ven 29/05/26	8	15%
10	Remise au plus tard rapport G2PRO (à définir)	0 jr	Lun 01/06/26	Lun 01/06/26	21DD	100%
11	Rencontre et atelier préalable avec Services Instructeurs PC	0 jr	Jeu 06/11/25	Jeu 06/11/25		0%
12	PC	8,3 m	Lun 23/03/26	Mer 25/11/26		0%
13	Préparation dossier PC	4 sem.	Jeu 09/04/26	Mer 06/05/26	7FD+11 jrs	0%
14	Relecture PC MOA	14 jrs	Lun 23/03/26	Jeu 09/04/26		0%
15	Remise PC	1 jr	Mar 28/04/26	Mar 28/04/26		0%
16	Dépôt Permis de Construire	0 jr	Mar 28/04/26	Mar 28/04/26	15	0%
17	Instruction PC (délais 5 mois)	18,8 sem.	Mer 29/04/26	Mer 23/09/26	16	0%
18	Recours des tiers	9 sem.	Jeu 24/09/26	Mer 25/11/26	17	0%
19	PC Purgé	0 jr	Mer 25/11/26	Mer 25/11/26	18	0%
20	PRO	4 m	Lun 29/06/26	Mar 03/11/26		0%
21	Projet	12 sem.	Lun 29/06/26	Mar 06/10/26	9	0%
22	Validation PRO	4 sem.	Mer 07/10/26	Mar 03/11/26	21	0%
23	TCE	5,9 m	Mer 04/11/26	Ven 23/04/27		0%
24	DCE (Etablissement DCE)	3 sem.	Mer 04/11/26	Mar 24/11/26	22	0%
25	Validation DCE et échange MOE/MOA	2 sem.	Mer 25/11/26	Mar 08/12/26	24	0%
26	Pièces administratives MOA	4 sem.	Mer 11/11/26	Mar 08/12/26	25FF	0%
27	Periode de consultation	7 sem.	Mer 09/12/26	Mar 02/02/27	26;33	0%
28	ACT	5 sem.	Mer 03/02/27	Mar 09/03/27	27	0%
29	Notification des marchés TCE	6 sem.	Mer 10/03/27	Mar 20/04/27	28	0%
30	OS travaux TCE	0 jr	Ven 23/04/27	Ven 23/04/27	29FD+3 jrs	0%
31	**Lots anticipés (Consignation/désamiantage/curage/démolition)**	**4,7 m**	**Lun 11/05/26**	**Lun 05/10/26**		**0%**
32	DCE	15 jrs	Lun 11/05/26	Ven 29/05/26	16FD-1 jr	0%
33	Validation DCE	1 sem.	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26	32	0%
34	Publication AAPC	1 jr	Mar 16/06/26	Mar 16/06/26	33	0%
35	Période de consultation	5,6 sem.	Mar 16/06/26	Jeu 23/07/26	34FD-1 jr	0%
36	Date limite de remise des offres (23-07-2026 à 12h)	1 jr	Jeu 23/07/26	Jeu 23/07/26	35FF	0%
37	Demande de régularisations et précisions	9 jrs	Mer 19/08/26	Lun 31/08/26		0%
38	Analyse technique des offres	3,4 sem.	Ven 24/07/26	Mer 02/09/26	36	0%
39	Questions envoyés aux candidats admis à négociés et réponses	6 jrs	Mer 02/09/26	Mer 09/09/26	38FD-1 jr	0%
40	Remise offre finale	5 jrs	Mer 09/09/26	Mar 15/09/26	39FD-1 jr	0%
41	Finalisation ACT	5 jrs	Mar 15/09/26	Lun 21/09/26	40FD-1 jr	0%
42	Signature et notifications des marchés	1 jr	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26	41	0%
43	OS travaux lots anticpés	1 jr	Lun 05/10/26	Lun 05/10/26	42	0%
44	**Fouilles archélologiques**	**20,3 m**	**Jeu 06/11/25**	**Lun 05/07/27**		**0%**
45	Sondage Archéologue	1 m	Jeu 06/11/25	Mer 03/12/25	11DD	0%
46	Rapport sondage	0 jr	Jeu 23/04/26	Jeu 23/04/26		0%
47	Arreté et prescriptions fouilles	9,4 sem.	Jeu 23/04/26	Ven 26/06/26	46	0%
48	Etablissement DCE (délais à confirmer MOA)	6 sem.	Lun 29/06/26	Mar 25/08/26	47	0%
49	Periode de consultation	6 sem.	Mer 26/08/26	Mar 06/10/26	48	0%
50	ACT	4 sem.	Mer 07/10/26	Mar 03/11/26	49	0%
51	Notifications des marchés	4 sem.	Mer 04/11/26	Mar 01/12/26	50	0%
52	Etablissement projet de l'opérateur	3 sem.	Mer 02/12/26	Mar 22/12/26	51	0%
53	Passage en commission des balmes	1 sem.	Mer 23/12/26	Mar 05/01/27	52	0%
54	OS Fouilles archélologiques	0 jr	Mar 01/12/26	Mar 01/12/26	51	0%
55	Surveillance durant démolition du plancher RDC/fondations de l'extension - à confirmer en fonction des démolitions de l'extension	10 jrs	Mar 08/12/26	Lun 21/12/26	68FF-10 jrs	0%
56	Fouilles archélogiques	24 sem.	Mar 19/01/27	Lun 05/07/27	68FD+5 jrs	0%
57	Etat des lieux libération SAONE	5 jrs	Mar 29/09/26	Lun 05/10/26	58DD-4 jrs	0%
58	Libération SAONE pour démarrage travaux	0 m	Lun 05/10/26	Lun 05/10/26	61DD-1 jr	0%
59	**TRAVAUX TCE**	**34,65 m?**	**Mar 06/10/26**	**Jeu 05/07/29**		**0%**
60	TRAVAUX anticipés	6,25 m	Mar 06/10/26	Lun 05/04/27		0%
61	Période de préparation lots anticipés	4 sem.	Mar 06/10/26	Lun 02/11/26	43	0%
62	Dépôt du Plan de Retrait amiante	0 jr	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26	61DD+10 jrs	0%
63	Instruction plan de retrait	4 sem.	Mar 20/10/26	Lun 16/11/26	62	0%
64	Installation de chantier	1 sem.	Mar 03/11/26	Lun 09/11/26	61	0%
65	Consignation	10 jrs	Mar 03/11/26	Lun 16/11/26	61	0%
66	Désamiantage Extension	3 sem.	Mar 17/11/26	Lun 07/12/26	63	0%
67	Désamiantage bâtiment Saone	4 sem.	Mar 12/01/27	Lun 08/02/27	68	0%
68	Démolition ancienne extension	4 sem.	Mar 08/12/26	Lun 11/01/27	66	0%
69	Curage bâtiment Saone	8 sem.	Mar 09/02/27	Lun 05/04/27	67	0%
70	Réception lots anticipés	0 jr	Lun 05/04/27	Lun 05/04/27	69	0%
71	Période de préparation TCE	8 sem.	Mer 28/04/27	Mar 22/06/27	30FD+2 jrs	0%
72	**TRAVAUX BATIMENT CONSERVE**	**17,5 m**	**Mer 23/06/27**	**Mar 21/11/28**		**0%**
82	**TRAVAUX BATIMENT NEUF**	**21,6 m?**	**Mar 06/07/27**	**Mer 28/03/29**		**0%**
104	**TRAVAUX EXTERIEURS**	**2,5 m**	**Jeu 18/01/29**	**Jeu 29/03/29**		**0%**
111	**OPR, ESSAIS, RECEPTION**	**3,55 m**	**Jeu 29/03/29**	**Jeu 05/07/29**		**0%**
