Hôpital Albert Chenevier - Bâtiment BOURGUIGNON

Planning prévisionnel des études et des travaux

Version 2 - 09/03/2026
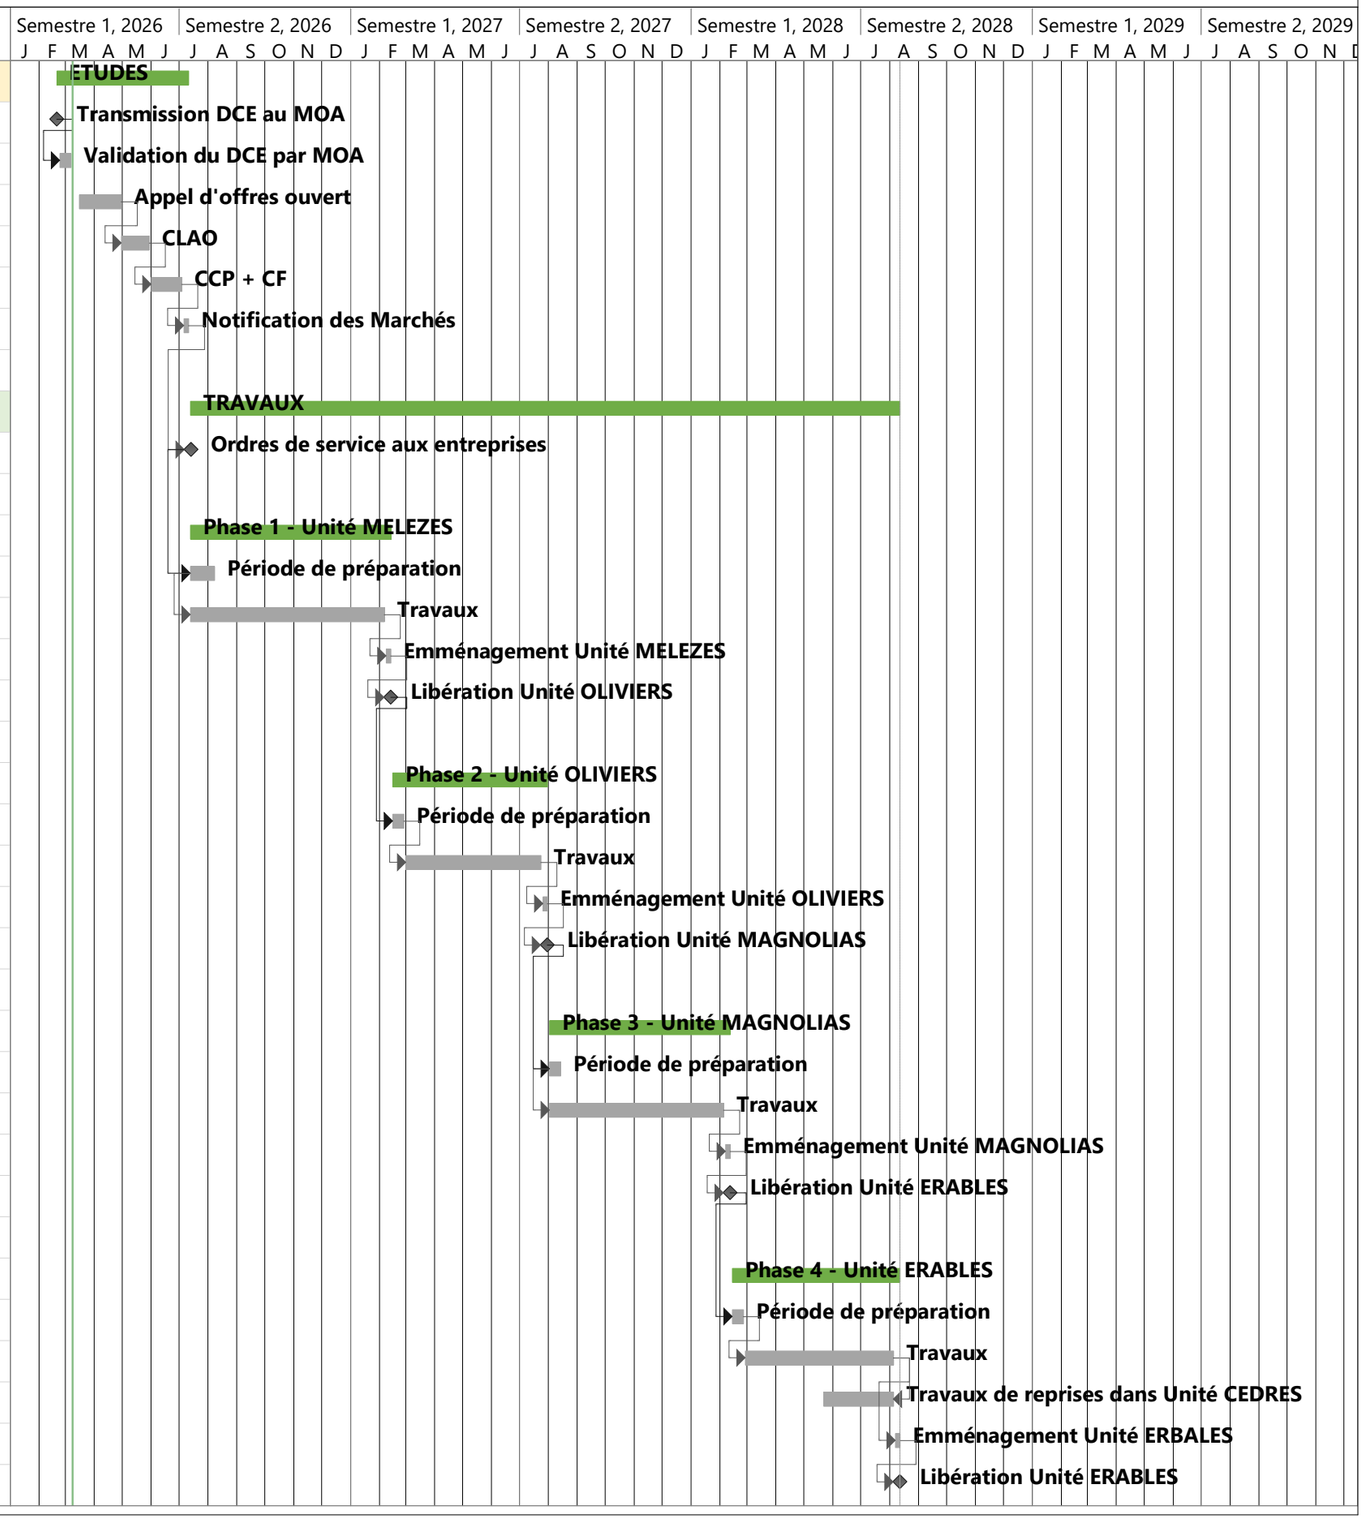
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**ETUDES**	**101 jours**	**Ven 20/02/26**	**Ven 10/07/26**
2	Transmission DCE au MOA	0 jour	Ven 20/02/26	Ven 20/02/26
3	Validation du DCE par MOA	10 jours	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26
4	Appel d'offres ouvert	33 jours	Lun 16/03/26	Mer 29/04/26
5	CLAO	22 jours	Jeu 30/04/26	Ven 29/05/26
6	CCP + CF	25 jours	Lun 01/06/26	Ven 03/07/26
7	Notification des Marchés	5 jours	Lun 06/07/26	Ven 10/07/26
8				
9	**TRAVAUX**	**540 jours**	**Lun 13/07/26**	**Ven 11/08/28**
10	Ordres de service aux entreprises	0 jour	Lun 13/07/26	Lun 13/07/26
11				
12	**Phase 1 - Unité MELEZES**	**150 jours**	**Lun 13/07/26**	**Ven 12/02/27**
13	Période de préparation	20 jours	Lun 13/07/26	Ven 07/08/26
14	Travaux	145 jours	Lun 13/07/26	Ven 05/02/27
15	Emménagement Unité MELEZES	5 jours	Lun 08/02/27	Ven 12/02/27
16	Libération Unité OLIVIERS	0 jour	Ven 12/02/27	Ven 12/02/27
17				
18	**Phase 2 - Unité OLIVIERS**	**120 jours**	**Lun 15/02/27**	**Ven 30/07/27**
19	Période de préparation	10 jours	Lun 15/02/27	Ven 26/02/27
20	Travaux	105 jours	Lun 01/03/27	Ven 23/07/27
21	Emménagement Unité OLIVIERS	5 jours	Lun 26/07/27	Ven 30/07/27
22	Libération Unité MAGNOLIAS	0 jour	Ven 30/07/27	Ven 30/07/27
23				
24	**Phase 3 - Unité MAGNOLIAS**	**140 jours**	**Lun 02/08/27**	**Ven 11/02/28**
25	Période de préparation	10 jours	Lun 02/08/27	Ven 13/08/27
26	Travaux	135 jours	Lun 02/08/27	Ven 04/02/28
27	Emménagement Unité MAGNOLIAS	5 jours	Lun 07/02/28	Ven 11/02/28
28	Libération Unité ERABLES	0 jour	Ven 11/02/28	Ven 11/02/28
29				
30	**Phase 4 - Unité ERABLES**	**130 jours**	**Lun 14/02/28**	**Ven 11/08/28**
31	Période de préparation	10 jours	Lun 14/02/28	Ven 25/02/28
32	Travaux	115 jours	Lun 28/02/28	Ven 04/08/28
33	Travaux de reprises dans Unité CEDRES	55 jours	Lun 22/05/28	Ven 04/08/28
34	Emménagement Unité ERBALES	5 jours	Lun 07/08/28	Ven 11/08/28
35	Libération Unité ERABLES	0 jour	Ven 11/08/28	Ven 11/08/28
