
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**LOT 01 : DEMOLITION – GROS OEUVRE – CHARPENTE – COUVERTURE - FACADES**	1 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
2		Démarrage	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
3		Etudes d'exécution	44 jours	Lun 04/01/27	Jeu 04/03/27
4		Installation chantier	44 jours	Lun 04/01/27	Jeu 04/03/27
5					
6		**DEMOLITIONS**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
7		Travaux préparatoire désamianta	44 jours	Lun 08/03/27	Jeu 06/05/27
8		Désamiantage	45 jours	Ven 07/05/27	Jeu 08/07/27
9		Curage	45 jours	Ven 09/07/27	Jeu 09/09/27
10		Démolitions intérieur du bâtiment	45 jours	Ven 10/09/27	Jeu 11/11/27
11		Démolitions extérieur du bâtimer	30 jours	Ven 10/09/27	Jeu 21/10/27
12					
13		**GROS-ŒUVRE**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
14		Ensemble des travaux de gros-oeuvre	160 jours	Ven 12/11/27	Jeu 22/06/28
15					
16		**CHARPENTE**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
17		Travaux de charpente et couverture	90 jours	Lun 13/12/27	Ven 14/04/28
18		Travaux de zinguerie et ouvrages divers	30 jours	Lun 17/04/28	Ven 26/05/28
19					
20		**FACADES**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
21		Travaux préparatoires	30 jours	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27
22		Travaux de finition	30 jours	Lun 29/05/28	Ven 07/07/28
23					
24		**LOT 02 : ETANCHEITE**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
25		Etudes d'exécution	30 jours	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27
26		Curage d'étanchéité en coordination avec le LOT 01	35 jours	Lun 15/11/27	Ven 31/12/27
27		Travaux d'étanchéité, y compris zinguerie et accessoires	30 jours	Lun 03/01/28	Ven 11/02/28
28					
29		**LOT 03 : MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES – SERRURERIE - METALLERIE**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
30		Etudes d'exécution	30 jours	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27
31		Travaux de dépose coordination avec le LOT 01	60 jours	Lun 15/11/27	Ven 04/02/28
32		Travaux de menuiseries extérieures métalliques, fenêtres, châssis composés et portes extérieures	60 jours	Lun 07/02/28	Ven 28/04/28
33		Ensemble des travaux de serrurerie	100 jours	Lun 01/05/28	Ven 15/09/28
34					
35		**LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
36		Etudes d'exécution	30 jours	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27
37		Travaux de dépose coordination avec le LOT 01	70 jours	Lun 15/11/27	Ven 18/02/28
38		Travaux de menuiseries extérieures bois neuves	40 jours	Lun 21/02/28	Ven 14/04/28
39		Travaux de menuiseries extérieures bois à rénover	45 jours	Lun 21/02/28	Ven 21/04/28
40		Occultation / Stores intérieurs	26 jours	Lun 25/09/28	Lun 30/10/28
41					
42		**LOT 05 : PLÂTRERIE – MENUISERIES INTERIEURES – REVETEMENTS DE SOLS - PEINTURES**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
43		Etudes d'exécution	30 jours	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27
44					
45		**PLATRERIE**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
46		Ensemble des travaux de plâtrerie	99 jours	Lun 14/02/28	Jeu 29/06/28
47					
48		**MENUISERIES INTÉRIEURES**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
49		Ensemble des travaux de menuiseries intérieures	61 jours	Lun 10/04/28	Lun 03/07/28
50					
51		**REVÊTEMENTS DE SOLS**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
52		Ensemble des travaux de revêtement de	60 jours	Ven 30/06/28	Jeu 21/09/28
53					
54		**PEINTURES**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
55		Ensemble des travaux de peinture	54 jours	Lun 31/07/28	Jeu 12/10/28
56		Nettoyage 3 passes	10 jours	Ven 13/10/28	Jeu 26/10/28
57					
58		**LOT 06 : CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION - PLOMBERIE**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
59		Etudes d'exécution	30 jours	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27
60		Ensemble des travaux de CVC - Plomberie : Réservations primaires	70 jours	Lun 15/11/27	Ven 18/02/28
61		Ensemble des travaux de CVC - Plomberie : Réservations secondaires	70 jours	Lun 21/02/28	Ven 26/05/28
62		Ensemble des travaux de CVC - Plomberie : Equipement	250 jours	Lun 15/11/27	Ven 27/10/28
63					
64		**LOT 07 : COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES - SSI**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
65		Etudes d'exécution	30 jours	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27
66		Ensemble des travaux de Cfo/Cfa - SSI : Réservations primaires	70 jours	Ven 12/11/27	Jeu 17/02/28
67		Ensemble des travaux de Cfo/Cfa - SSI : Réservations secondaires	70 jours	Ven 18/02/28	Jeu 25/05/28
68		Ensemble des travaux de Cfo/Cfa - SSI : Equipements	250 jours	Lun 15/11/27	Ven 27/10/28
69					
70		**LOT 08 : APPAREIL ELEVATEUI**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
71		Etudes d'exécution	30 jours	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27
72		Ensemble des travaux d'installation des appareils élévateurs	60 jours	Lun 24/01/28	Ven 14/04/28
73					
74		**OPR - RECEPTION**	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
75					
76		Opérations préalables à la réception	20 jours	Ven 27/10/28	Jeu 23/11/28
77		Réception des travaux	5 jours	Ven 24/11/28	Jeu 30/11/28
78		Levée des réserves	20 jours	Ven 01/12/28	Jeu 28/12/28

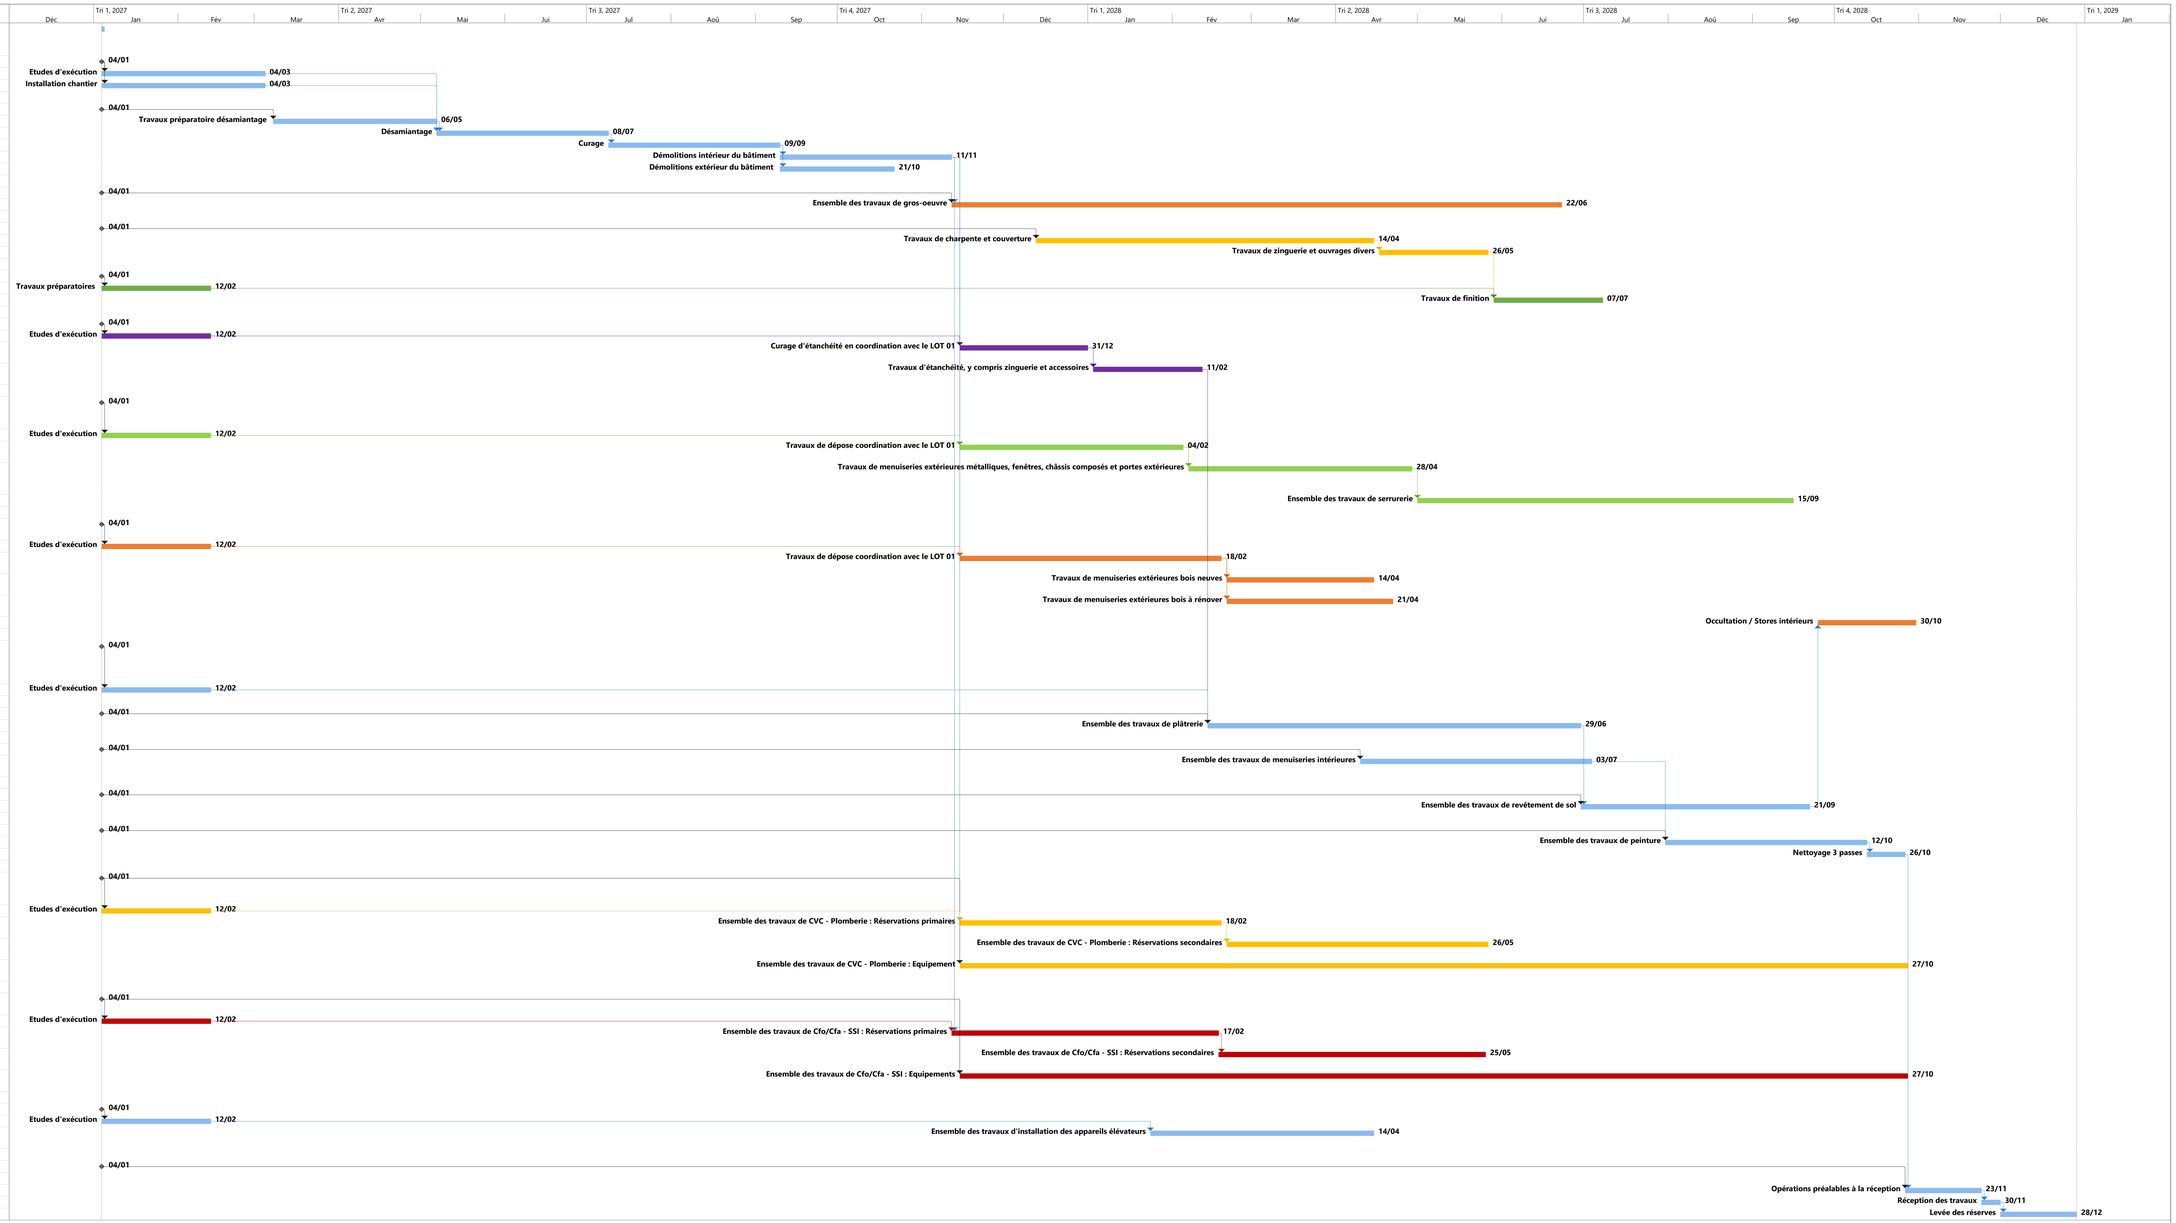

Projet : planning V1
Date : Ven 05/06/26

Tâche | Jalon | Récapitulatif du projet | Jalon inactif | Tâche manuelle | Report récapitulatif manuel | Début uniquement | Tâches externes | Échéance | Progression manuelle
Fractionnement | Récapitulative | Tâche inactive | Récapitulatif inactif | Durée uniquement | Récapitulatif manuel | Fin uniquement | Jalons externes | Avancement
