Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à l'arrêté du 24 Décembre 2021, l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, ainsi qu'à la norme NF X46 - 020 d'août 2017(2ème tirage).



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON

Référence client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K

Désignation : Campus porte des Alpes - Bâtiment K

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS (COMUE)
90, RUE PASTEUR
69007 LYON 7EME

Donneur d'ordre :
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS (COMUE)
90, RUE PASTEUR
69007 LYON 7EME

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SABRE Mathieu

Accompagnateur : Mickael Lourenço (0 800 400 100)

Date de repérage 19/02/2026

Numéro attestation : CPDI4978

Délivré le : 02/08/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 03/03/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 03/03/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Pre-Rapport

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

Pre-Rapport

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Niveau 0 - Vol 1	Niveau 0 - Vol 2
Niveau 0 - Vol 3	Niveau 0 - Vol 4
Niveau 0 - Vol 5	Niveau 0 - Vol 6
Niveau 0 - Vol 7	Niveau 0 - Vol 8
Niveau 0 - Vol 9	Niveau 0 - Vol 10
Niveau 0 - Vol 11	Niveau 0 - Vol 12
Niveau 0 - Vol 13	Niveau 0 - Vol 14
Niveau 0 - Vol 15	Niveau 0 - Vol 16
Niveau 0 - Vol 17	Niveau 0 - Vol 18
Niveau 0 - Vol 19	Niveau 0 - Vol 20
Niveau 0 - Vol 21	Niveau 0 - Vol 22
Niveau 0 - Vol 23	Niveau 0 - Vol 24
Niveau 0 - Vol 25	Niveau 0 - Vol 26
Niveau 0 - Vol 27	Niveau 0 - Vol 28

Niveau 0 - Vol 29	Niveau 0 - Vol 30
Niveau 0 - Vol 31	Niveau 0 - Vol 32
Niveau 0 - Vol 33	Niveau 0 - Vol 34
Niveau 0 - Vol 35	Niveau 0 - Vol 36
Niveau 0 - Vol 37	Niveau 0 - Vol 38
Niveau 0 - Vol 39	Niveau 0 - Vol 40
Niveau 0 - Vol 41	Niveau 0 - Vol 42
Niveau 0 - Vol 43	Niveau 0 - Vol 44
Niveau 0 - Vol 45	Niveau 0 - Vol 46
Niveau 0 - Vol 47	Niveau 0 - Vol 48
Niveau 0 - Vol 49	Niveau 0 - Vol 50
Niveau 0 - Vol 51	Niveau 0 - Vol 52
Niveau 0 - Vol 53	Niveau 1 - Vol 54
Niveau 1 - Vol 55	Niveau 1 - Vol 56
Niveau 1 - Vol 57	Niveau 1 - Vol 58
Niveau 1 - Vol 59	Niveau 1 - Vol 60
Niveau 1 - Vol 61	Niveau 1 - Vol 62
Niveau 1 - Vol 63	Niveau 1 - Vol 64
Niveau 1 - Vol 65	Niveau 1 - Vol 66
Niveau 1 - Vol 67	Niveau 1 - Vol 68
Niveau 1 - Vol 69	Niveau 1 - Vol 70
Niveau 1 - Vol 71	Niveau 1 - Vol 72
Niveau 1 - Vol 73	Niveau 1 - Vol 74
Niveau 1 - Vol 75	Niveau 1 - Vol 76
Niveau 1 - Vol 77	Niveau 1 - Vol 78
Niveau 1 - Vol 80	Niveau 1 - Vol 82
Niveau 1 - Vol 83	Niveau 1 - Vol 84
Niveau 1 - Vol 85	Niveau 1 - Vol 86
Niveau 1 - Vol 87	Niveau 1 - Vol 88
Niveau 1 - Vol 89	Toiture - Vol 90
Toiture - Vol 91	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
Façades - Vol 93 (Façades NORD)	

Pre-Rapport

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Vol 44 - Niveau 0	Risque sanitaire ou physique avéré	Plénum Pièce occupée par les utilisateurs
Vol 39 - Niveau 0	Moyen investigation non mis a disposition	Sous la trappe Trappe scellée non manipulable
Vol 42 - Niveau 0	Risque sanitaire ou physique avéré	Gaines techniques Pièce occupée par les utilisateurs

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la santé publique.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Déconstruction du bâtiment.

MaJ 28/04/25 : Levée de certains volumes non-visités, Prélèvements sur filasse de radiateurs et compléments sur enduits ciment de poteaux.

MaJ Fevrier 2026: Compléments de prélèvements à la demande du donneur d'ordre.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux volumes identifiés sur le schéma de repérage, à la demande du donneur d'ordre.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Eléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	

Pre-Rapport

Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux.	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

Pre-Rapport

8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans objet.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans objet.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans objet.

Pré-Rapport

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferraillage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

Pre-Rapport

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

Pre-Rapport

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°2
Vol 20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°2
Vol 18	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°2
Vol 17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°2
Vol 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°2
Vol 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°2
Vol 18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15

Pre-Rapport

Vol 30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°15
Vol 18	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 10	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 6	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 8	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 12	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 14	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 15	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 16	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 17	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 23	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 24	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 25	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 26	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17

Pre-Rapport

Vol 27	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 28	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 35	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 31	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 30	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 29	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 21	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 22	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°17
Vol 15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°22
Vol 5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23

Pre-Rapport

Vol 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°23
Vol 35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°25 Phase 2
Vol 34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002BM002401 n°27
Vol 33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002BM002401 n°27
Vol 32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002BM002401 n°27
Vol 31	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°29
Vol 30	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°29
Vol 29	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°29
Vol 28	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°29
Vol 27	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°29
Vol 26	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°29
Vol 24	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°29
Vol 23	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°29
Vol 35	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°29
Vol 22	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°29
Vol 24	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°30

Pre-Rapport

Vol 22	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°30
Vol 35	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°30
Vol 23	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°30
Vol 25	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°30
Vol 26	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°30
Vol 27	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°30
Vol 28	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°30
Vol 29	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°30
Vol 30	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°30
Vol 31	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°30
Vol 42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1
Vol 51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 1

Pre-Rapport

Vol 42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°32 Phase 2
Vol 41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 44	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 53	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 46	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 49	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2

Pre-Rapport

Vol 50	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°33 Phase 2
Vol 39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°34 Phase 1
Vol 39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 44	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 50	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 49	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 46	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°36
Vol 44	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 39	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 37	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 36	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 45	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 46	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 47	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 48	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1

Pre-Rapport

Vol 49	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 50	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 51	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 43	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 40	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°44 Phase 1
Vol 53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint gris	002BM002401 n°47
Vol 70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint gris	002BM002401 n°47
Vol 53	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°49
Vol 82	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°57
Vol 82	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°58
Vol 82	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 65	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 66	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 80	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 60	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 59	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61

Pre-Rapport

Vol 57	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 58	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 56	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 54	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 55	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 61	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 62	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 63	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 86	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 64	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 69	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 68	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 67	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 87	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°61
Vol 62	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°67
Vol 61	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°67
Vol 55	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°67
Vol 54	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°67
Vol 63	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°67
Vol 82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002BM002401 n°68
Vol 57	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°69
Vol 58	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°69
Vol 59	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°69
Vol 60	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°69
Vol 80	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°69
Vol 56	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°69

Pre-Rapport

Vol 65	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°70
Vol 64	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°70
Vol 87	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°70
Vol 67	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°71
Vol 68	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°71
Vol 69	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°71
Vol 66	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°71
Vol 70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 77	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°74
Vol 70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 77	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1

Pre-Rapport

Vol 83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 1
Vol 70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 77	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 2
Vol 70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 77	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4
Vol 83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002BM002401 n°75 Phase 4

Pre-Rapport

Vol 70	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°77 Phase 1
Vol 83	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°77 Phase 1
Vol 70	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°79
Vol 72	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°79
Vol 71	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002BM002401 n°79
Vol 84	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°81
Vol 70	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°84
Vol 84	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°84
Vol 75	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°84
Vol 72	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°84
Vol 71	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002BM002401 n°84
Vol 73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°86
Vol 74	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°86
Vol 75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°86
Vol 78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°86
Vol 72	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°86
Vol 71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°86
Vol 76	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	002BM002401 n°86
Vol 77	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 1
Vol 73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 1
Vol 74	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 1
Vol 89	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 1
Vol 75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 1
Vol 78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 1
Vol 72	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 1
Vol 71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 1

Pre-Rapport

Vol 77	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 4
Vol 73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 4
Vol 74	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 4
Vol 89	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 4
Vol 75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 4
Vol 78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 4
Vol 72	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 4
Vol 71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	002BM002401 n°89 Phase 4
Vol 77	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002BM002401 n°92
Vol 93 (Façades NORD)	Façades	Bardages	Joint entre élement	002BM002401-1 n°102
Vol 92 (Façades SUD)	Façades	Bardages	Joint entre élement	002BM002401-1 n°102
Vol 93 (Façades NORD)	Façades	Bardages	Plaques fibres	002BM002401-1 n°103
Vol 92 (Façades SUD)	Façades	Bardages	Plaques fibres	002BM002401-1 n°103
Vol 92 (Façades SUD)	Façades	Panneaux-sandwichs	Plaques	P139
Vol 93 (Façades NORD)	Façades	Panneaux-sandwichs	Plaques	P139
Vol 92 (Façades SUD)	Façades	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéïté	P140
Vol 92 (Façades SUD)	Façades	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéïté	P141
Vol 92 (Façades SUD)	Façades	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéïté	P144
Vol 92 (Façades SUD)	Façades	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéïté	P145
Vol 92 (Façades SUD)	Façades	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéïté	P147
Vol 52	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P148
Vol 53	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P149
Vol 93 (Façades NORD)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P153
Vol 92 (Façades SUD)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P154
Vol 53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P156
Vol 70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P156
Vol 39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2

Pre-Rapport

Vol 53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 77	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158 Phase 2
Vol 39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159

Pre-Rapport

Vol 76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 77	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 77	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160
Vol 82	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1

Pre-Rapport

Vol 86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1

Pre-Rapport

Vol 31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 1
Vol 82	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2

Pre-Rapport

Vol 25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163 Phase 2
Vol 82	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164
Vol 32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164

Pre-Rapport

Vol 82	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165
Vol 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P165

Pre-Rapport

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composant ou partie de composant non inspecté, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la Santé Publique. Des investigations complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux / parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Vol 42	Mastics	Procéder au démontage du faux plafond		
Vol 44 - Niveau 0		Risque sanitaire ou physique avéré	Plénum Pièce occupée par les utilisateurs	
Vol 39 - Niveau 0		Moyen investigation non mis a disposition	Sous la trappe Trappe scellée non manipulable	
Vol 42 - Niveau 0		Risque sanitaire ou physique avéré	Gaines techniques Pièce occupée par les utilisateurs	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Voir les impossibilités techniques du présent repérage.
Les dalles, planchers et murs n'ont pas fait l'objet d'investigations sur la totalité de leur épaisseur.
Les conduits et réseaux enterrés potentiels ne peuvent être repérables sans travaux de terrassement lourd.
L'intérieur des gaines maçonnées et encoffrées ne peuvent être investigué sans sondage destructif lourd.
Les plénums n'ont pu être repérés dans leurs intégralités.

Pre-Rapport

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Voies et réseaux divers

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 77	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P96	Réalisation d'un prélevement	Laine minérale sur faux-plafond	002BM 00240 1 n°96 - 1	002BM 00240 1 n°96	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Laine minérale sur faux-plafond	002BM 00240 1 n°96 - 1	002BM 00240 1 n°96	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 89	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Laine minérale sur faux-plafond	002BM 00240 1 n°96 - 1	002BM 00240 1 n°96	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Laine minérale sur faux-plafond	002BM 00240 1 n°96 - 1	002BM 00240 1 n°96	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 88	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Laine minérale sur faux-plafond	002BM 00240 1 n°96 - 1	002BM 00240 1 n°96	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 78	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Laine minérale sur faux-plafond	002BM 00240 1 n°96 - 1	002BM 00240 1 n°96	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Laine minérale sur faux-plafond	002BM 00240 1 n°96 - 1	002BM 00240 1 n°96	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74 - Vol 89 - Vol 75 - Vol 88 - Vol 78 - Vol 76	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S153 - S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Laine minérale sur faux-plafond	002BM 00240 1 n°96 - 1	002BM 00240 1 n°96	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P105	Réalisation d'un prélevement	Revêtement bitumeux d'étanchéité couche supérieure	002BM 00240 1-2 n °105 - 1	002BM 00240 1-2 n °105	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P106	Réalisation d'un prélevement	Isolant 7cm laine de roche	002BM 00240 1-2 n °106 - 1	002BM 00240 1-2 n °106	Matériau Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P107	Réalisation d'un prélevement	Revêtement bitumeux d'étanchéité inférieur sur dalle BA	002BM 00240 1-2 n °107 - 1	002BM 00240 1-2 n °107	Matériau Effritable Fibreux Marron Matériau Bitumineux Noir Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S267	Réalisation d'un prélevement	Relevé étanchéité	002BM 00240 1-2 n °108 - 1	002BM 00240 1-2 n °108	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108	Relevé étanchéité	002BM 00240 1-2 n °108 - 1	002BM 00240 1-2 n °108	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P109	Réalisation d'un prélevement	Relevé étanchéité sur acrotère	002BM 00240 1-2 n °109 - 1	002BM 00240 1-2 n °109	Bande Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 90	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P110	Réalisation d'un prélevement	Revêtement bitumeux d'étanchéité supérieure 3 couches	002BM 00240 1-2 n °110 - 1	002BM 00240 1-2 n °110	Bande Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 90	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P111	Réalisation d'un prélevement	Revêtement bitumeux d'étanchéité intermédiaire	002BM00240 1-2 n °111 - 1	002BM00240 1-2 n °111	Matériau Effritable Fibreux Jaune Matériau Souple Translucide Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 90	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P112	Réalisation d'un prélevement	Revêtement bitumeux d'étanchéité inférieure	002BM00240 1-2 n °112 - 1	002BM00240 1-2 n °112	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Fibreux Bitumineux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 90	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P113	Réalisation d'un prélevement	Isolant laine de roche	002BM00240 1-2 n °113 - 1	002BM00240 1-2 n °113	Laine Fibreux Souple Gris Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 90	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P114	Réalisation d'un prélevement	Relevé étanchéité sur acrotère	002BM00240 1-2 n °114 - 1	002BM00240 1-2 n °114	Bande Bitumineux Fibreux Noir Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 90	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S268	Réalisation d'un prélevement	Relevé étanchéité sur acrotère	002BM00240 1-2 n °115 - 1	002BM00240 1-2 n °115	Matériau Bitumineux Noir Bande Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 90	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115	Relevé étanchéité sur acrotère	002BM 00240 1-2 n °115 - 1	002BM 00240 1-2 n °115	Matériau Bitumineux Noir Bande Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P116	Réalisation d'un prélevement	Relevé étanchéité Noir	002BM 00240 1-2 n °116 - 1	002BM 00240 1-2 n °116	Matériau Bitumineux Noir Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Eléments ponctuels	Conduit	S266	Réalisation d'un sondage		S266 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Toiture	Vol 91	Eléments ponctuels	Conduit	S266	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S266		S266 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Toiture	Vol 90	Eléments ponctuels	Conduit	S266	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S266		S266 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P122	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu" ardoisé sur lanternaux	002BM 00240 1-4 n °122 - 1 - 002BM 00240 1-4 n °122 - 2	P122	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P123	Réalisation d'un prélevement	Etanchéité bitumeuse	002BM 00240 1-4 n °123 - 1	P123	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P124	Réalisation d'un prélevement	Pare-vapeur	002BM 00240 1-4 n °124 - 1	P124	Matériau bitumineux noir avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P125	Réalisation d'un prélevement	Etanchéité bitumeuse supérieure	002BM 00240 1-4 n °125 - 1	P125	Matériau bitumineux noir avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P126	Réalisation d'un prélevement	Etanchéité bitumeuse inférieure	002BM 00240 1-4 n °126 - 1	P126	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P127	Réalisation d'un prélevement	Pare-vapeur	002BM 00240 1-4 n °127 - 1	P127	Matériau bitumineux noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 91	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P128	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002BM 00240 1-4 n °128 - 1 - 002BM 00240 1-4 n °128 - 2	P128	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 90	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P129	Réalisation d'un prélevement	Etanchéité bitumeuse	002BM 00240 1-4 n °129 - 1	P129	Matériau bitumineux noir avec gravillons non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 76	Bardages	Isolant sous bardage	P101	Réalisation d'un prélevement	Laine minéral marron	002BM 00240 1-1 n °101 - 1	002BM 00240 1-1 n °101	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 74	Bardages	Isolant sous bardage	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Laine minéral marron	002BM 00240 1-1 n °101 - 1	002BM 00240 1-1 n °101	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Bardages	Isolant sous bardage	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Laine minéral marron	002BM 00240 1-1 n °101 - 1	002BM 00240 1-1 n °101	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Bardages	Isolant sous bardage	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Laine minéral marron	002BM 00240 1-1 n °101 - 1	002BM 00240 1-1 n °101	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Bardages	Isolant sous bardage	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Laine minéral marron	002BM 00240 1-1 n °101 - 1	002BM 00240 1-1 n °101	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Bardages	Isolant sous bardage	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Laine minéral marron	002BM 00240 1-1 n °101 - 1	002BM 00240 1-1 n °101	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Bardages	Isolant sous bardage	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Laine minéral marron	002BM 00240 1-1 n °101 - 1	002BM 00240 1-1 n °101	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Bardages	Isolant sous bardage	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Laine minéral marron	002BM 00240 1-1 n °101 - 1	002BM 00240 1-1 n °101	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 74 - Vol 73 - Vol 72 - Vol 71 - Vol 75 - Vol 78	Bardages	Isolant sous bardage	S251 - S252 - S253 - S254 - S255 - S256 - S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Laine minéral marron	002BM 00240 1-1 n °101 - 1	002BM 00240 1-1 n °101	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Bardages	Bac fibres	S262	Réalisation d'un sondage		S262 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Bardages	Bac fibres	S262	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S262		S262 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Bardages	Bac fibres	S262	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S262		S262 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Bardages	Joint entre élement	P102	Réalisation d'un prélevement	Jointbresineux blanc entre panneaux fibre-ciment et armature	002BM 00240 1-1 n °102 - 1	002BM 00240 1-1 n °102	Mastic Résineux Fibreux Gris Peinture Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Bardages	Joint entre élement	P102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Jointbresineux blanc entre panneaux fibre-ciment et armature	002BM00240 1-1 n °102 - 1	002BM00240 1-1 n °102	Mastic Résineux Fibreux Gris Peinture Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Bardages	Joint entre élement	S263 (P102)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102	Jointbresineux blanc entre panneaux fibre-ciment et armature	002BM00240 1-1 n °102 - 1	002BM00240 1-1 n °102	Mastic Résineux Fibreux Gris Peinture Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Bardages	Plaques fibres	P103	Réalisation d'un prélevement	Bardage fibre-ciment peint en beige	002BM00240 1-1 n °103 - 1	002BM00240 1-1 n °103	Peinture Effritable Blanc Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Bardages	Plaques fibres	P103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Bardage fibre-ciment peint en beige	002BM00240 1-1 n °103 - 1	002BM00240 1-1 n °103	Peinture Effritable Blanc Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Bardages	Plaques fibres	S264 (P103)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Bardage fibre-ciment peint en beige	002BM00240 1-1 n °103 - 1	002BM00240 1-1 n °103	Peinture Effritable Blanc Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Bardages	Mastic sur visserie	P104	Réalisation d'un prélevement	Mastic sur vis de fixation du bardage	002BM 00240 1-1 n °104 - 1	002BM 00240 1-1 n °104	Joint Souple Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Bardages	Mastic sur visserie	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Mastic sur vis de fixation du bardage	002BM 00240 1-1 n °104 - 1	002BM 00240 1-1 n °104	Joint Souple Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Bardages	Mastic sur visserie	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Mastic sur vis de fixation du bardage	002BM 00240 1-1 n °104 - 1	002BM 00240 1-1 n °104	Joint Souple Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD) - Vol 93 (Façades NORD)	Bardages	Mastic sur visserie	P104 - S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Mastic sur vis de fixation du bardage	002BM 00240 1-1 n °104 - 1	002BM 00240 1-1 n °104	Joint Souple Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Bardages	Peinture	P138	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur panneaux sandwich	002BM 00240 1-4 n °138 - 1	P138	Peinture en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Panneaux-sandwichs	Plaques	P139	Réalisation d'un prélevement	Plaques fibre ciment	002BM00240 1-4 n °139 - 1	P139	Matériau fibreux blanc avec poussières non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles non séparable + couche plâtreuse rose en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Panneaux-sandwichs	Plaques	S280 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Plaques fibre ciment	002BM00240 1-4 n °139 - 1	P139	Matériau fibreux blanc avec poussières non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles non séparable + couche plâtreuse rose en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Panneaux-sandwichs	Plaques	S281 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Plaques fibre ciment	002BM00240 1-4 n °139 - 1	P139	Matériau fibreux blanc avec poussières non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles non séparable + couche plâtreuse rose en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Panneaux-sandwichs	Plaques	S282 (P139)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Plaques fibre ciment	002BM00240 1-4 n °139 - 1	P139	Matériau fibreux blanc avec poussières non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles non séparable + couche plâtreuse rose en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéïté	P140	Réalisation d'un prélevement	Autour des vis sur rails	002BM00240 1-4 n °140 - 1	P140	Peinture non séparable + matériau mou gris non séparable + matériau souple incolore avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéïté	P140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140	Autour des vis sur rails	002BM00240 1-4 n °140 - 1	P140	Peinture non séparable + matériau mou gris non séparable + matériau souple incolore avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéïté	P141	Réalisation d'un prélevement	Autour de plaques	002BM00240 1-4 n °141 - 1	P141	Peinture en faible quantité non séparable + matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéité	P141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Autour de plaques	002BM00240 1-4 n °141 - 1	P141	Peinture en faible quantité non séparable + matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Bardages	Peinture	P143	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur bas de panneaux sandwich	002BM00240 1-4 n °143 - 1	P143	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Bardages	Peinture	P143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P143	Peinture sur bas de panneaux sandwich	002BM00240 1-4 n °143 - 1	P143	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéité	P144	Réalisation d'un prélevement	Autour de plaques	002BM00240 1-4 n °144 - 1	P144	Matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéité	P145	Réalisation d'un prélevement	En pied de plaques	002BM00240 1-4 n °145 - 1	P145	Matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéité	P145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	En pied de plaques	002BM00240 1-4 n °145 - 1	P145	Matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Menuiseries	Joint vitrier	P146	Réalisation d'un prélevement		002BM 00240 1-4 n °146 - 1	P146	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéïté	P147	Réalisation d'un prélevement	Autour de vitres	002BM 00240 1-4 n °147 - 1	P147	Matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Panneaux-sandwichs	Joints d'étanchéïté	P147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Autour de vitres	002BM 00240 1-4 n °147 - 1	P147	Matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 52	Menuiseries	Mastic vitrier	P148	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier résineux	002BM 00240 1-4 n °148 - 1	P148	Peinture non séparable + matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 52	Menuiseries	Mastic vitrier	P148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148	Mastic vitrier résineux	002BM 00240 1-4 n °148 - 1	P148	Peinture non séparable + matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Menuiseries	Mastic vitrier	P149	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002BM 00240 1-4 n °149 - 1	P149	Peinture non séparable + matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Menuiseries	Mastic vitrier	P151	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier résineux sur vitre battante	002BM 00240 1-4 n °151 - 1	P151	Matériau mou gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Menuiseries	Mastic vitrier	P151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151	Mastic vitrier résineux sur vitre battante	002BM 00240 1-4 n °151 - 1	P151	Matériau mou gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Menuiseries	Mastic vitrier	P152	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier résineux sur vitre battante	002BM 00240 1-4 n °152 - 1	P152	Matériau mou gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Menuiseries	Mastic vitrier	P152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Mastic vitrier résineux sur vitre battante	002BM 00240 1-4 n °152 - 1	P152	Matériau mou gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Menuiseries	Mastic vitrier	P153	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier résineux sur vitre fixe	002BM 00240 1-4 n °153 - 1	P153	Matériau souple gris avec poussières + matériau mou gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Menuiseries	Mastic vitrier	P153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153	Mastic vitrier résineux sur vitre fixe	002BM00240 1-4 n °153 - 1	P153	Matériau souple gris avec poussières + matériau mou gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Menuiseries	Mastic vitrier	S283	Réalisation d'un sondage		S283 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureJoint à lèvre caoutchouc
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Menuiseries	Mastic vitrier	S284	Réalisation d'un sondage		S284 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureJoint à lèvre mousse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Menuiseries	Mastic vitrier	P154	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier résineux	002BM 00240 1-4 n °154 - 1	P154	Matériau mou gris avec poussières	Positif	Présen ce sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Menuiseries	Mastic vitrier	P154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154	Mastic vitrier résineux	002BM 00240 1-4 n °154 - 1	P154	Matériau mou gris avec poussières	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P2	Réalisation d'un prélevement	En partie haute de cloisons	002BM 00240 1 n°2 - 1	002BM 00240 1 n°2	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S1 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	En partie haute de cloisons	002BM 00240 1 n°2 - 1	002BM 00240 1 n°2	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 20	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S1 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	En partie haute de cloisons	002BM 00240 1 n°2 - 1	002BM 00240 1 n°2	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 18	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S11 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	En partie haute de cloisons	002BM 00240 1 n°2 - 1	002BM 00240 1 n°2	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S42 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	En partie haute de cloisons	002BM 00240 1 n°2 - 1	002BM 00240 1 n°2	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S42 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	En partie haute de cloisons	002BM 00240 1 n°2 - 1	002BM 00240 1 n°2	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S42 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	En partie haute de cloisons	002BM 00240 1 n°2 - 1	002BM 00240 1 n°2	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S42 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	En partie haute de cloisons	002BM 00240 1 n°2 - 1	002BM 00240 1 n°2	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 1	Murs et cloisons	Joint de scellement	P3	Réalisation d'un prélevement	Joint de béton cellulaire	002BM 00240 1 n°3 - 1	002BM 00240 1 n°3	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Béton cellulaire Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 1	Murs et cloisons	Joint de scellement	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de béton cellulaire	002BM 00240 1 n°3 - 1	002BM 00240 1 n°3	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Béton cellulaire Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 20	Murs et cloisons	Joint de scellement	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de béton cellulaire	002BM 00240 1 n°3 - 1	002BM 00240 1 n°3	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Béton cellulaire Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Joint de scellement	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de béton cellulaire	002BM 00240 1 n°3 - 1	002BM 00240 1 n°3	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Béton cellulaire Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 1 - Vol 20 - Vol 19	Murs et cloisons	Joint de scellement	P3 - S3 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Joint de béton cellulaire	002BM 00240 1 n°3 - 1	002BM 00240 1 n°3	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Béton cellulaire Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 1	Murs et cloisons	Flocages	P5	Réalisation d'un prélèvement	En partie haute	002BM 00240 1 n°5 - 1	002BM 00240 1 n°5	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Flocages	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	En partie haute	002BM 00240 1 n°5 - 1	002BM 00240 1 n°5	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 1	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P6	Réalisation d'un prélevement	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°6 - 1	002BM00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°6 - 1	002BM00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 13	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°6 - 1	002BM00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°6 - 1	002BM00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 15	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°6 - 1	002BM00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 16	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°6 - 1	002BM00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°6 - 1	002BM00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°6 - 1	002BM00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°6 - 1	002BM00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 33	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°6 - 1	002BM00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 34	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1 n°6 - 1	002BM 00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 21	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1 n°6 - 1	002BM 00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18 - Vol 13 - Vol 12 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 35 - Vol 31 - Vol 33 - Vol 34 - Vol 21	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S9 - P6 - S17 - S47 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1 n°6 - 1	002BM 00240 1 n°6	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 1	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 1	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 7	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 7	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 1	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 7	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°7 - 1	002BM 00240 1 n°7 Phase 7	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Plot de colle	P9	Réalisation d'un prélevement	Entre béton cellulaire et BA13	002BM 00240 1 n°9 - 1	002BM 00240 1 n°9	Matériau Dur Blanc Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Murs et cloisons	Isolant intérieur	P11	Réalisation d'un prélevement	Pare-vapeur avec laine minérale	002BM 00240 1 n°11 - 1	002BM 00240 1 n°11	Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	P14	Réalisation d'un prélevement	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 15	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 13	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 8	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 29	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 30	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 27	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 24	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 21	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 13 - Vol 12 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 35 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 24 - Vol 21	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S10 - S20 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Laine minérale	002BM 00240 1 n°14 - 1	002BM 00240 1 n°14	Laine Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P18	Réalisation d'un prélevement	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 6	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 7	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 15	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 14	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 11	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 8	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 17	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 27	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 26	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 23	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 22	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 29	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 32	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 6 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 7 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 12 - Vol 18 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 17 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 24 - Vol 23 - Vol 35 - Vol 22 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 32	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S12 - S13 - S35 - S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 6	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P18	Réalisation d'un prélevement	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 4	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 15	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 18	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 9	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 8	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 2	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 27	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 24	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 22	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 29	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 31	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 32	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 6 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 7 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 12 - Vol 18 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 17 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 24 - Vol 23 - Vol 35 - Vol 22 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 32	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S12 - S13 - S35 - S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°18 - 1	002BM 00240 1 n°18 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Murs et cloisons	Isolant intérieur	P19	Réalisation d'un prélèvement	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 8	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 5	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 12	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 15	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 27	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 22	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 29	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 30	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 9 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 18 - Vol 12 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 24 - Vol 23 - Vol 35 - Vol 22 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S36 - S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°19 - 1	002BM 00240 1 n°19	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélèvement	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 2	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 7	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 8	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 11	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 15	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 27	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 26	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 35	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 22	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 29	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 30	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 32	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 18 - Vol 12 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 24 - Vol 23 - Vol 35 - Vol 22 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 32	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37 - S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	002BM 00240 1 n°20 - 1	002BM 00240 1 n°20	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P21	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°21 - 1	002BM 00240 1 n°21 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 18	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°21 - 1	002BM 00240 1 n°21 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°21 - 1	002BM 00240 1 n°21 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°21 - 1	002BM 00240 1 n°21 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 18 - Vol 12 - Vol 14	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°21 - 1	002BM 00240 1 n°21 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P21	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°21 - 1	002BM 00240 1 n°21 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°21 - 1	002BM 00240 1 n°21 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 12	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°21 - 1	002BM 00240 1 n°21 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°21 - 1	002BM 00240 1 n°21 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18 - Vol 12 - Vol 14	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°21 - 1	002BM 00240 1 n°21 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 15	Menuiseries	Mastic vitrier	P22	Réalisation d'un prélevement	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 14	Menuiseries	Mastic vitrier	S39 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Menuiseries	Mastic vitrier	S39 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Menuiseries	Mastic vitrier	S39 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Menuiseries	Mastic vitrier	S39 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Menuiseries	Mastic vitrier	S39 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 8	Menuiseries	Mastic vitrier	S39 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Menuiseries	Mastic vitrier	S39 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 5	Menuiseries	Mastic vitrier	S40 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Menuiseries	Mastic vitrier	S40 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Menuiseries	Mastic vitrier	S40 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Menuiseries	Mastic vitrier	S40 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	S40 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Menuiseries	Mastic vitrier	S40 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Menuiseries	Mastic vitrier	S40 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°22 - 1	002BM 00240 1 n°22	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 5	Menuiseries	Mastic vitrier	P23	Réalisation d'un prélevement	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 8	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 9	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 15	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 17	Menuiseries	Mastic vitrier	S41 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°23 - 1	002BM 00240 1 n°23	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 33	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 34	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 32	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 34 - Vol 32	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 33	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 2	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 34	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 2	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 32	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 2	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 34 - Vol 32	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 2	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 33	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 5	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 34	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 5	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 32	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 5	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 34 - Vol 32	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°28 - 1	002BM 00240 1 n°28 Phase 5	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Menuiseries	Mastic vitrier	P29	Réalisation d'un prélevement	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°29 - 1	002BM 00240 1 n°29	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 31	Menuiseries	Mastic vitrier	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°29 - 1	002BM 00240 1 n°29	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Menuiseries	Mastic vitrier	S62 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°29 - 1	002BM 00240 1 n°29	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 29	Menuiseries	Mastic vitrier	S62 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°29 - 1	002BM 00240 1 n°29	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Menuiseries	Mastic vitrier	S62 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°29 - 1	002BM 00240 1 n°29	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 27	Menuiseries	Mastic vitrier	S62 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°29 - 1	002BM 00240 1 n°29	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 26	Menuiseries	Mastic vitrier	S62 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°29 - 1	002BM 00240 1 n°29	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Menuiseries	Mastic vitrier	S62 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°29 - 1	002BM 00240 1 n°29	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Menuiseries	Mastic vitrier	S62 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°29 - 1	002BM 00240 1 n°29	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Menuiseries	Mastic vitrier	S62 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°29 - 1	002BM 00240 1 n°29	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 22	Menuiseries	Mastic vitrier	S62 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°29 - 1	002BM 00240 1 n°29	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Menuiseries	Mastic vitrier	P30	Réalisation d'un prélevement	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°30 - 1	002BM 00240 1 n°30	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 22	Menuiseries	Mastic vitrier	S63 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°30 - 1	002BM 00240 1 n°30	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Menuiseries	Mastic vitrier	S63 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°30 - 1	002BM 00240 1 n°30	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Menuiseries	Mastic vitrier	S63 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°30 - 1	002BM 00240 1 n°30	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Menuiseries	Mastic vitrier	S63 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°30 - 1	002BM 00240 1 n°30	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Menuiseries	Mastic vitrier	S63 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°30 - 1	002BM 00240 1 n°30	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 27	Menuiseries	Mastic vitrier	S63 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°30 - 1	002BM 00240 1 n°30	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Menuiseries	Mastic vitrier	S63 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°30 - 1	002BM 00240 1 n°30	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 29	Menuiseries	Mastic vitrier	S63 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°30 - 1	002BM 00240 1 n°30	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Menuiseries	Mastic vitrier	S63 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°30 - 1	002BM 00240 1 n°30	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Menuiseries	Mastic vitrier	S63 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°30 - 1	002BM 00240 1 n°30	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P33	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S69 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 47	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S70 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S71 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S85 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S189 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S191 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 46	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S208 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 45	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S209 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 47	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S210 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 48	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S211 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S212 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S213 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S214 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 38	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S215 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 41	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P33	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 37	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S69 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S70 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S71 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 53	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S85 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S189 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S191 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 46	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S208 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 45	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S209 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S210 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 48	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S211 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S212 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S213 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 51	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S214 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 38	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S215 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P33	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 41	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S69 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 47	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S70 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S71 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S85 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 36	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S189 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S191 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 46	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S208 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 45	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S209 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S210 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 48	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S211 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 49	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S212 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S213 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S214 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 38	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S215 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	002BM 00240 1 n°33 - 1	002BM 00240 1 n°33 Phase 5	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 39	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P34	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°34 - 1	002BM 00240 1 n°34 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 39	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P34	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°34 - 1	002BM 00240 1 n°34 Phase 3	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 42	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	P35	Réalisation d'un prélevement	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 42	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 37	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 42	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 45	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 46	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 48	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 42	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 39	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 38	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 42 - Vol 37 - Vol 44 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 39 - Vol 38 - Vol 40	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	P35 - S72 - S75 - S216 - S217 - S218 - S219 - S220 - S221 - S222 - S223 - S224 - S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Sur poteaux métallique	002BM 00240 1 n°35 - 1	002BM 00240 1 n°35	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 39	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P36	Réalisation d'un prélevement	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S73 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S74 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 52	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S84 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S186 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S226 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 43	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S227 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S228 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S229 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 49	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S230 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 48	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S231 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S232 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 46	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S233 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 45	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S234 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Panneaux de doublage en fibre-ciment	002BM 00240 1 n°36 - 1	002BM 00240 1 n°36	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 42	Murs et cloisons	Joint de scellement	P37	Réalisation d'un prélevement	Joint de béton cellulaire	002BM 00240 1 n°37 - 1	002BM 00240 1 n°37	Enduit Effritable Beige Béton cellulaire Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P38	Réalisation d'un prélevement	Sur lattis vertical en partie haute	002BM 00240 1 n°38 - 1	002BM 00240 1 n°38	Peinture Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Sur lattis vertical en partie haute	002BM 00240 1 n°38 - 1	002BM 00240 1 n°38	Peinture Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Sur lattis vertical en partie haute	002BM 00240 1 n°38 - 1	002BM 00240 1 n°38	Peinture Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Sur lattis vertical en partie haute	002BM 00240 1 n°38 - 1	002BM 00240 1 n°38	Peinture Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 42 - Vol 53	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S78 - S81 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Sur lattis vertical en partie haute	002BM 00240 1 n°38 - 1	002BM 00240 1 n°38	Peinture Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Menuiseries	Mastic vitrier	P44	Réalisation d'un prélèvement	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 39	Menuiseries	Mastic vitrier	S79 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Menuiseries	Mastic vitrier	S80 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Menuiseries	Mastic vitrier	S190 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 45	Menuiseries	Mastic vitrier	S235 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 46	Menuiseries	Mastic vitrier	S236 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Menuiseries	Mastic vitrier	S237 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 48	Menuiseries	Mastic vitrier	S238 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Menuiseries	Mastic vitrier	S239 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Menuiseries	Mastic vitrier	S240 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Menuiseries	Mastic vitrier	S241 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 43	Menuiseries	Mastic vitrier	S242 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 40	Menuiseries	Mastic vitrier	S243 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 1	Mastic Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Menuiseries	Mastic vitrier	P44	Réalisation d'un prélevement	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 39	Menuiseries	Mastic vitrier	S79 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Menuiseries	Mastic vitrier	S80 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Menuiseries	Mastic vitrier	S190 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 45	Menuiseries	Mastic vitrier	S235 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 46	Menuiseries	Mastic vitrier	S236 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 47	Menuiseries	Mastic vitrier	S237 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 48	Menuiseries	Mastic vitrier	S238 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Menuiseries	Mastic vitrier	S239 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Menuiseries	Mastic vitrier	S240 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Menuiseries	Mastic vitrier	S241 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 43	Menuiseries	Mastic vitrier	S242 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Menuiseries	Mastic vitrier	S243 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Mastic gris	002BM 00240 1 n°44 - 1	002BM 00240 1 n°44 Phase 2	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 39	Menuiseries	Mastic vitrier	P45	Réalisation d'un prélevement	Joint souple blanc	002BM 00240 1 n°45 - 1	002BM 00240 1 n°45	Joint Souple Blanc Matériau Effritable Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Murs et cloisons	Flocages	P48	Réalisation d'un prélevement	Flocage ciment sur éléments métallique	002BM 00240 1 n°48 - 1	002BM 00240 1 n°48	Peinture Effritable Gris Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Murs et cloisons	Flocages	P48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48	Flocage ciment sur éléments métallique	002BM 00240 1 n°48 - 1	002BM 00240 1 n°48	Peinture Effritable Gris Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Menuiseries	Mastic vitrier	P49	Réalisation d'un prélevement	Mastic noir sur partie basse de menuiserie	002BM 00240 1 n°49 - 1	002BM 00240 1 n°49	Mastic Effritable Gris Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Menuiseries	Mastic vitrier	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Mastic noir sur partie basse de menuiserie	002BM 00240 1 n°49 - 1	002BM 00240 1 n°49	Mastic Effritable Gris Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 85	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P51	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°51 - 1	002BM 00240 1 n°51 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 85	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°51 - 1	002BM 00240 1 n°51 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 85	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P51	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°51 - 1	002BM 00240 1 n°51 Phase 4	Carton Fibreux Souple Vert Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 85	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	002BM 00240 1 n°51 - 1	002BM 00240 1 n°51 Phase 4	Carton Fibreux Souple Vert Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 85	Murs et cloisons	Isolant intérieur	P53	Réalisation d'un prélevement	Pare-vapeur avec laine minérale	002BM 00240 1 n°53 - 1	002BM 00240 1 n°53	Carton Fibreux Souple Marron Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 85	Murs et cloisons	Joint de scellement	P55	Réalisation d'un prélevement	Joint de béton cellulaire	002BM 00240 1 n°55 - 1	002BM 00240 1 n°55	Béton cellulaire Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Joint de scellement	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Joint de béton cellulaire	002BM 00240 1 n°55 - 1	002BM 00240 1 n°55	Béton cellulaire Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 85	Murs et cloisons	Flocages	P56	Réalisation d'un prélevement	En partie haute	002BM 00240 1 n°56 - 1	002BM 00240 1 n°56	Flocage Fibreux Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Flocages	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	En partie haute	002BM 00240 1 n°56 - 1	002BM 00240 1 n°56	Flocage Fibreux Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P58	Réalisation d'un prélevement	En partie haute de cloisons	002BM 00240 1 n°58 - 1	002BM 00240 1 n°58	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	P59	Réalisation d'un prélevement	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 57	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 59	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 80	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 69	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 86	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 54	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 80 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 65 - Vol 86 - Vol 63 - Vol 62 - Vol 61 - Vol 55 - Vol 54	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Laine minérale	002BM 00240 1 n°59 - 1	002BM 00240 1 n°59	Laine Souple Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P63	Réalisation d'un prélèvement	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1 n°63 - 1	002BM 00240 1 n°63	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1 n°63 - 1	002BM 00240 1 n°63	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1 n°63 - 1	002BM 00240 1 n°63	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 54	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°63 - 1	002BM00240 1 n°63	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 61 - Vol 55 - Vol 54	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S91 - S93 - S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Sur poteaux métalliques	002BM00240 1 n°63 - 1	002BM00240 1 n°63	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P64	Réalisation d'un prélevement	Doublage en plaque BA13	002BM00240 1 n°64 - 1	002BM00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM00240 1 n°64 - 1	002BM00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 56	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 59	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 80	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 66	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 69	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 64	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 62	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 80 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 65 - Vol 64 - Vol 62 - Vol 61 - Vol 55 - Vol 82	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 1	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P64	Réalisation d'un prélèvement	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 56	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 59	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 80	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 69	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 65	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 64	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 80 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 65 - Vol 64 - Vol 62 - Vol 61 - Vol 55 - Vol 82	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 4	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P64	Réalisation d'un prélèvement	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 57	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 59	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 80	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 68	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 69	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 64	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 80 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 65 - Vol 64 - Vol 62 - Vol 61 - Vol 55 - Vol 82	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Doublage en plaque BA13	002BM 00240 1 n°64 - 1	002BM 00240 1 n°64 Phase 6	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Murs et cloisons	Isolant intérieur	P65	Réalisation d'un prélèvement	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 61	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 59	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 80	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 66	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 69	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 64	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 56 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 80 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 65 - Vol 64 - Vol 82	Murs et cloisons	Isolant intérieur	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Entre doublages et façades	002BM 00240 1 n°65 - 1	002BM 00240 1 n°65	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P66	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 87	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 61 - Vol 56 - Vol 54 - Vol 87 - Vol 82	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S89 - S103 - S104 - S161 - S162 - S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 1	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P66	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 3	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 61	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 3	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 3	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 3	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 3	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 3	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 3	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 61 - Vol 56 - Vol 54 - Vol 87 - Vol 82	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S89 - S103 - S104 - S161 - S162 - S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°66 - 1	002BM 00240 1 n°66 Phase 3	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Menuiseries	Mastic vitrier	P67	Réalisation d'un prélevement	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°67 - 1	002BM 00240 1 n°67	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Menuiseries	Mastic vitrier	S90 (P67)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°67 - 1	002BM 00240 1 n°67	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Menuiseries	Mastic vitrier	S92 (P67)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°67 - 1	002BM 00240 1 n°67	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Menuiseries	Mastic vitrier	S108 (P67)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°67 - 1	002BM 00240 1 n°67	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 63	Menuiseries	Mastic vitrier	S184 (P67)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°67 - 1	002BM 00240 1 n°67	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P68	Réalisation d'un prélevement	Enduit crépi sur puis de lumière métallique	002BM 00240 1 n°68 - 1	002BM 00240 1 n°68	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit crépi sur puis de lumière métallique	002BM 00240 1 n°68 - 1	002BM 00240 1 n°68	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S98 (P68)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit crépi sur puis de lumière métallique	002BM 00240 1 n°68 - 1	002BM 00240 1 n°68	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Menuiseries	Mastic vitrier	P69	Réalisation d'un prélevement	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°69 - 1	002BM 00240 1 n°69	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Menuiseries	Mastic vitrier	S94 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°69 - 1	002BM 00240 1 n°69	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 59	Menuiseries	Mastic vitrier	S95 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°69 - 1	002BM 00240 1 n°69	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Menuiseries	Mastic vitrier	S96 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°69 - 1	002BM 00240 1 n°69	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 80	Menuiseries	Mastic vitrier	S97 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°69 - 1	002BM 00240 1 n°69	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Menuiseries	Mastic vitrier	S105 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°69 - 1	002BM 00240 1 n°69	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Menuiseries	Mastic vitrier	P70	Réalisation d'un prélevement	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°70 - 1	002BM 00240 1 n°70	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Menuiseries	Mastic vitrier	P70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°70 - 1	002BM 00240 1 n°70	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 64	Menuiseries	Mastic vitrier	S106 (P70)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°70 - 1	002BM 00240 1 n°70	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 87	Menuiseries	Mastic vitrier	S160 (P70)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°70 - 1	002BM 00240 1 n°70	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Menuiseries	Mastic vitrier	P71	Réalisation d'un prélevement	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°71 - 1	002BM 00240 1 n°71	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Menuiseries	Mastic vitrier	S99 (P71)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°71 - 1	002BM 00240 1 n°71	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 69	Menuiseries	Mastic vitrier	S102 (P71)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°71 - 1	002BM 00240 1 n°71	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Menuiseries	Mastic vitrier	P71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	002BM 00240 1 n°71 - 1	002BM 00240 1 n°71	Mastic Résineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Murs et cloisons	Joint de scellement	P72	Réalisation d'un prélevement	Joint de carreaux de plâre	002BM 00240 1 n°72 - 1	002BM 00240 1 n°72	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 67	Murs et cloisons	Joint de scellement	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Joint de carreaux de plâre	002BM 00240 1 n°72 - 1	002BM 00240 1 n°72	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Murs et cloisons	Joint de scellement	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Joint de carreaux de plâre	002BM 00240 1 n°72 - 1	002BM 00240 1 n°72	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 67 - Vol 82	Murs et cloisons	Joint de scellement	S100 - S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Joint de carreaux de plâre	002BM 00240 1 n°72 - 1	002BM 00240 1 n°72	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P73	Réalisation d'un prélevement	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1 n°73 - 1	002BM 00240 1 n°73	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1 n°73 - 1	002BM 00240 1 n°73	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 86	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1 n°73 - 1	002BM 00240 1 n°73	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1 n°73 - 1	002BM 00240 1 n°73	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 66 - Vol 86 - Vol 70	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P73 - S107 - S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1 n°73 - 1	002BM 00240 1 n°73	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	P76	Réalisation d'un prélevement	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°76 - 1	002BM 00240 1 n°76	Peinture Effritable Gris Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	P76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°76 - 1	002BM 00240 1 n°76	Peinture Effritable Gris Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P77	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S127 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S130 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 83	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S261 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P77	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 4	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 4	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S127 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 4	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S130 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 4	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 83	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S261 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 4	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P77	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 7	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 7	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S127 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 7	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S130 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 7	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 83	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S261 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°77 - 1	002BM 00240 1 n°77 Phase 7	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Joint de scellement	P78	Réalisation d'un prélevement	Joint de carreaux de plâre	002BM 00240 1 n°78 - 1	002BM 00240 1 n°78	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Menuiseries	Mastic vitrier	P79	Réalisation d'un prélevement	Mastic bitumineux	002BM 00240 1 n°79 - 1	002BM 00240 1 n°79	Mastic Résineux Noir Gris Matériau Effritable Beige Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Menuiseries	Mastic vitrier	S174 (P79)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Mastic bitumineux	002BM 00240 1 n°79 - 1	002BM 00240 1 n°79	Mastic Résineux Noir Gris Matériau Effritable Beige Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Menuiseries	Mastic vitrier	S177 (P79)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Mastic bitumineux	002BM 00240 1 n°79 - 1	002BM 00240 1 n°79	Mastic Résineux Noir Gris Matériau Effritable Beige Marron	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 84	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélevement	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°80 - 1	002BM 00240 1 n°80	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°80 - 1	002BM 00240 1 n°80	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 88	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°80 - 1	002BM 00240 1 n°80	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 88	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°80 - 1	002BM 00240 1 n°80	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70 - Vol 88	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S131 - P80 - S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°80 - 1	002BM 00240 1 n°80	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 84	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P81	Réalisation d'un prélevement	En panneau sandwichs et allège	002BM 00240 1 n°81 - 1	002BM 00240 1 n°81	Peinture Effritable Beige Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P86	Réalisation d'un prélevement	En panneau sandwichs et allège	002BM 00240 1 n°86 - 1	002BM 00240 1 n°86	Peinture Effritable Multicolore Fibres-ciment Effritable Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S136 (P86)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	En panneau sandwichs et allège	002BM 00240 1 n°86 - 1	002BM 00240 1 n°86	Peinture Effritable Multicolore Fibres-ciment Effritable Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S137 (P86)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	En panneau sandwichs et allège	002BM 00240 1 n°86 - 1	002BM 00240 1 n°86	Peinture Effritable Multicolore Fibres-ciment Effritable Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S137 (P86)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	En panneau sandwichs et allège	002BM 00240 1 n°86 - 1	002BM 00240 1 n°86	Peinture Effritable Multicolore Fibres-ciment Effritable Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 78	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S138 (P86)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	En panneau sandwichs et allège	002BM 00240 1 n°86 - 1	002BM 00240 1 n°86	Peinture Effritable Multicolore Fibres-ciment Effritable Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S168 (P86)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	En panneau sandwichs et allège	002BM 00240 1 n°86 - 1	002BM 00240 1 n°86	Peinture Effritable Multicolore Fibres-ciment Effritable Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S178 (P86)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	En panneau sandwichs et allège	002BM 00240 1 n°86 - 1	002BM 00240 1 n°86	Peinture Effritable Multicolore Fibres-ciment Effritable Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S247 (P86)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	En panneau sandwichs et allège	002BM 00240 1 n°86 - 1	002BM 00240 1 n°86	Peinture Effritable Multicolore Fibres-ciment Effritable Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P87	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 1	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 1	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 75	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 1	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 1	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 1	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74 - Vol 75 - Vol 78 - Vol 76	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P87 - S139 - S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 1	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P87	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 3	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 3	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 75	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 3	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 3	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 3	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74 - Vol 75 - Vol 78 - Vol 76	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P87 - S139 - S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	002BM 00240 1 n°87 - 1	002BM 00240 1 n°87 Phase 3	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P88	Réalisation d'un prélevement	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°88 - 1	002BM 00240 1 n°88	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°88 - 1	002BM 00240 1 n°88	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°88 - 1	002BM 00240 1 n°88	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°88 - 1	002BM 00240 1 n°88	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°88 - 1	002BM 00240 1 n°88	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 89	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°88 - 1	002BM 00240 1 n°88	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 87	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°88 - 1	002BM 00240 1 n°88	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 77 - Vol 74 - Vol 78 - Vol 89 - Vol 87	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S140 - S141 - S142 - S144 - S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sur cloison brique	002BM 00240 1 n°88 - 1	002BM 00240 1 n°88	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P89	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 73	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 89	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 75	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S157 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 72	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S171 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S181 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P89	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 89	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 78	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S157 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S171 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S181 (P89)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	002BM 00240 1 n°89 - 1	002BM 00240 1 n°89 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 77	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	P90	Réalisation d'un prélevement	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°90 - 1	002BM 00240 1 n°90	Peinture Effritable Gris Bleu Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	P90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°90 - 1	002BM 00240 1 n°90	Peinture Effritable Gris Bleu Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	P91	Réalisation d'un prélevement	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°91 - 1	002BM 00240 1 n°91	Peinture Effritable Vert Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	P91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°91 - 1	002BM 00240 1 n°91	Peinture Effritable Vert Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°91 - 1	002BM 00240 1 n°91	Peinture Effritable Vert Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°91 - 1	002BM 00240 1 n°91	Peinture Effritable Vert Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 73	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°91 - 1	002BM 00240 1 n°91	Peinture Effritable Vert Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°91 - 1	002BM 00240 1 n°91	Peinture Effritable Vert Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°91 - 1	002BM 00240 1 n°91	Peinture Effritable Vert Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°91 - 1	002BM 00240 1 n°91	Peinture Effritable Vert Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°91 - 1	002BM 00240 1 n°91	Peinture Effritable Vert Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74 - Vol 75 - Vol 78 - Vol 73 - Vol 72 - Vol 71 - Vol 76 - Vol 77	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages	P91 - S146 - S147 - S148 - S175 - S176 - S258 - S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Flocage ciment	002BM 00240 1 n°91 - 1	002BM 00240 1 n°91	Peinture Effritable Vert Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P92	Réalisation d'un prélevement	Enduit crépi sur puis de lumière bois	002BM 00240 1 n°92 - 1	002BM 00240 1 n°92	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S154 (P92)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92	Enduit crépi sur puis de lumière bois	002BM 00240 1 n°92 - 1	002BM 00240 1 n°92	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Joint de scellement	P93	Réalisation d'un prélevement	Joint de béton cellulaire	002BM 00240 1 n°93 - 1	002BM 00240 1 n°93	Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Murs et cloisons	Joint de scellement	P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93	Joint de béton cellulaire	002BM 00240 1 n°93 - 1	002BM 00240 1 n°93	Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Menuiseries	Mastic vitrier	P98	Réalisation d'un prélevement	Mastic bitumineux	002BM 00240 1 n°98 - 1	002BM 00240 1 n°98	Joint Souple Blanc Peinture Effritable Bleu Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 38	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P100	Réalisation d'un prélevement	Tirant métalique en croix	002BM 00240 1-1 n °100 - 2	002BM 00240 1-1 n °100	Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 39	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Tirant métalique en croix	002BM 00240 1-1 n °100 - 2	002BM 00240 1-1 n °100	Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 42	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	P118	Réalisation d'un prélevement	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1-3 n °118 - 1	002BM 00240 1-3 n °118	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	P119	Réalisation d'un prélevement	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1-3 n °119 - 1	002BM 00240 1-3 n °119	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	P120	Réalisation d'un prélevement	Sur poteaux métalliques	002BM 00240 1-3 n °120 - 1	002BM 00240 1-3 n °120	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P131	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur poteaux extérieurs	002BM 00240 1-4 n °131 - 1	P131	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Peinture sur poteaux extérieurs	002BM 00240 1-4 n °131 - 1	P131	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P132	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur croix st andré	002BM 00240 1-4 n °132 - 1	P132	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132	Peinture sur croix st andré	002BM 00240 1-4 n °132 - 1	P132	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P133	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur structure horizontale	002BM 00240 1-4 n °133 - 1	P133	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133	Peinture sur structure horizontale	002BM 00240 1-4 n °133 - 1	P133	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P134	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur poteaux extérieurs	002BM 00240 1-4 n °134 - 1	P134	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134	Peinture sur poteaux extérieurs	002BM 00240 1-4 n °134 - 1	P134	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P135	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur croix st andré	002BM 00240 1-4 n °135 - 1	P135	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135	Peinture sur croix st andré	002BM 00240 1-4 n °135 - 1	P135	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P136	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur structure horizontale	002BM 00240 1-4 n °136 - 1	P136	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136	Peinture sur structure horizontale	002BM 00240 1-4 n °136 - 1	P136	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P137	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur bac acier	002BM 00240 1-4 n °137 - 1	P137	Peintures multiples en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 92 (Façades SUD)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P142	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur poteaux extérieurs	002BM 00240 1-4 n °142 - 1	P142	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P150	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur croix st andré	002BM 00240 1-4 n °150 - 1	P150	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Murs et cloisons	Flocages	P155	Réalisation d'un prélevement	Flocage ciment sur éléments métallique	002BM 00240 1-4 n °155 - 1	P155	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 39	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture intumescente	P162	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur croix st andré	002BM00240 1-4 n°162 - 1	P162	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	P166	Réalisation d'un prélevement	Laine sur rails de cloison	002BM00240 1-4 n°166 - 1	P166	Matériau fibreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquées	Pied de cloison	S288	Réalisation d'un sondage		S288 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 20	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13	002BM00240 1 n°4 - 1	002BM00240 1 n°4 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 20	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°4 - 1	002BM 00240 1 n°4 Phase 4	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P12	Réalisation d'un prélevement	Plaque fibreuse	002BM 00240 1 n°12 - 1	002BM 00240 1 n°12	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 1	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	P13	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 2	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 8	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 5	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 15	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 13	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 10	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 29	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 32	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 33	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 34	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 27	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 21	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 22	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 4 - Vol 18 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 5 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 30 - Vol 29 - Vol 35 - Vol 31 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 34 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S8 - S18 - S19 - S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°13 - 1	002BM 00240 1 n°13	Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 18	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P16	Réalisation d'un prélevement	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 15	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 13	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 8	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 3	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 27	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 29	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 32	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 33	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 34	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 21	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 22	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 14 - Vol 13 - Vol 12 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 34 - Vol 35 - Vol 25 - Vol 24 - Vol 23 - Vol 21 - Vol 22	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25 - S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°16 - 1	002BM 00240 1 n°16	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 18	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P17	Réalisation d'un prélevement	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S26 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S27 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S28 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S29 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S29 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S30 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 6	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S30 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S30 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 8	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S31 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S31 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 13	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S31 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S31 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S31 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 15	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S33 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S34 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S55 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S57 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S57 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 27	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S57 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S57 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S57 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S58 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S58 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 29	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S58 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 21	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S58 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 22	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S58 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°17 - 1	002BM 00240 1 n°17	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P26	Réalisation d'un prélevement	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 27	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 29	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 30	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 21	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 22	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 24	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Dalle minérale avec couche grise	002BM 00240 1 n°26 - 1	002BM 00240 1 n°26	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 32	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P31	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°31 - 1	002BM 00240 1 n°31 Phase 1	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 33	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°31 - 1	002BM 00240 1 n°31 Phase 1	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 34	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°31 - 1	002BM 00240 1 n°31 Phase 1	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 33 - Vol 34	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°31 - 1	002BM 00240 1 n°31 Phase 1	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 32	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P31	Réalisation d'un prélevement	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°31 - 1	002BM 00240 1 n°31 Phase 4	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 33	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°31 - 1	002BM 00240 1 n°31 Phase 4	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 34	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°31 - 1	002BM 00240 1 n°31 Phase 4	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 33 - Vol 34	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Calicot avec enduit sur BA13	002BM 00240 1 n°31 - 1	002BM 00240 1 n°31 Phase 4	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 42	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P39	Réalisation d'un prélevement	Plaque fibreuse 20X20	002BM 00240 1 n°39 - 1	002BM 00240 1 n°39	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 39	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Plaque fibreuse 20X20	002BM 00240 1 n°39 - 1	002BM 00240 1 n°39	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Plaque fibreuse 20X20	002BM 00240 1 n°39 - 1	002BM 00240 1 n°39	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 39 - Vol 37	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Plaque fibreuse 20X20	002BM 00240 1 n°39 - 1	002BM 00240 1 n°39	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 41	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P40	Réalisation d'un prélevement	Plaque fibreuse beige 50X50	002BM 00240 1 n°40 - 1	002BM 00240 1 n°40	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P41	Réalisation d'un prélevement	Plaque fibreuse marron 50X50	002BM 00240 1 n°41 - 1	002BM 00240 1 n°41	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Plaque fibreuse marron 50X50	002BM 00240 1 n°41 - 1	002BM 00240 1 n°41	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 45	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Plaque fibreuse marron 50X50	002BM 00240 1 n°41 - 1	002BM 00240 1 n°41	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 43	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Plaque fibreuse marron 50X50	002BM 00240 1 n°41 - 1	002BM 00240 1 n°41	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 46	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Plaque fibreuse marron 50X50	002BM 00240 1 n°41 - 1	002BM 00240 1 n°41	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Plaque fibreuse marron 50X50	002BM 00240 1 n°41 - 1	002BM 00240 1 n°41	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 48	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Plaque fibreuse marron 50X50	002BM 00240 1 n°41 - 1	002BM 00240 1 n°41	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Plaque fibreuse marron 50X50	002BM 00240 1 n°41 - 1	002BM 00240 1 n°41	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Plaque fibreuse marron 50X50	002BM 00240 1 n°41 - 1	002BM 00240 1 n°41	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 51	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Plaque fibreuse marron 50X50	002BM 00240 1 n°41 - 1	002BM 00240 1 n°41	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 36 - Vol 45 - Vol 43 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S185 - S194 - S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Plaque fibreuse marron 50X50	002BM 00240 1 n°41 - 1	002BM 00240 1 n°41	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 85	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P54	Réalisation d'un prélevement	Plaque fibreuse	002BM 00240 1 n°54 - 1	002BM 00240 1 n°54	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P60	Réalisation d'un prélevement	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 80	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 59	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 61	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 69	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 65	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 86	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 64	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 60 - Vol 80 - Vol 59 - Vol 58 - Vol 57 - Vol 56 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 65 - Vol 86 - Vol 64	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Isolant de plaque métallique	002BM 00240 1 n°60 - 4	002BM 00240 1 n°60	Laine Souple Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P61	Réalisation d'un prélevement	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S114 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 66	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S115 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 80	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S116 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S116 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 59	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S117 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S118 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S118 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S119 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 54	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S120 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S120 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S120 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S120 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S120 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 86	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S121 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 64	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S121 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 69	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S122 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S122 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S122 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Au dessus du faux plafond métallique	002BM 00240 1 n°61 - 1	002BM 00240 1 n°61	Matériau Effritable Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	P62	Réalisation d'un prélevement	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 59	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 60	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 80	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 69	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 86	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 64	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 56	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 85	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 80 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 65 - Vol 86 - Vol 64 - Vol 63 - Vol 62 - Vol 61 - Vol 55 - Vol 54 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 85	Poutres et charpentes	Peinture intumescente	S112 - S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Peinture sur support bac acier	002BM 00240 1 n°62 - 2	002BM 00240 1 n°62	Peinture Effritable Violet	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P82	Réalisation d'un prélevement	Plaque fibreuse 20X20	002BM 00240 1 n°82 - 1	002BM 00240 1 n°82	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 75	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Plaque fibreuse 20X20	002BM 00240 1 n°82 - 1	002BM 00240 1 n°82	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Plaque fibreuse 20X20	002BM 00240 1 n°82 - 1	002BM 00240 1 n°82	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Plaque fibreuse 20X20	002BM 00240 1 n°82 - 1	002BM 00240 1 n°82	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 75 - Vol 72 - Vol 71	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S151 - S172 - S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Plaque fibreuse 20X20	002BM 00240 1 n°82 - 1	002BM 00240 1 n°82	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 84	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P83	Réalisation d'un prélevement	Plaque fibreuse 50X50	002BM 00240 1 n°83 - 1	002BM 00240 1 n°83	Peinture Effritable Jaune Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 70	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P84	Réalisation d'un prélevement	Plaque fibre-ciment sur faux-plafond	002BM00240 1 n°84 - 1	002BM00240 1 n°84	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 84	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132 (P84)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Plaque fibre-ciment sur faux-plafond	002BM00240 1 n°84 - 1	002BM00240 1 n°84	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S152 (P84)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Plaque fibre-ciment sur faux-plafond	002BM00240 1 n°84 - 1	002BM00240 1 n°84	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S173 (P84)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Plaque fibre-ciment sur faux-plafond	002BM00240 1 n°84 - 1	002BM00240 1 n°84	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S183 (P84)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Plaque fibre-ciment sur faux-plafond	002BM00240 1 n°84 - 1	002BM00240 1 n°84	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Plafonds	Béton	S133	Réalisation d'un sondage		S133 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 77	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P94	Réalisation d'un prélevement	Plaque fibreuse rectangulaire	002BM 00240 1 n°94 - 1	002BM 00240 1 n°94	Peinture Effritable Beige Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Plaque fibreuse rectangulaire	002BM 00240 1 n°94 - 1	002BM 00240 1 n°94	Peinture Effritable Beige Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Plaque fibreuse rectangulaire	002BM 00240 1 n°94 - 1	002BM 00240 1 n°94	Peinture Effritable Beige Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 89	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Plaque fibreuse rectangulaire	002BM 00240 1 n°94 - 1	002BM 00240 1 n°94	Peinture Effritable Beige Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Plaque fibreuse rectangulaire	002BM 00240 1 n°94 - 1	002BM 00240 1 n°94	Peinture Effritable Beige Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 76	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Plaque fibreuse rectangulaire	002BM 00240 1 n°94 - 1	002BM 00240 1 n°94	Peinture Effritable Beige Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 78 - Vol 74 - Vol 89 - Vol 75 - Vol 76	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S149 - S150 - S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Plaque fibreuse rectangulaire	002BM 00240 1 n°94 - 1	002BM 00240 1 n°94	Peinture Effritable Beige Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P95	Réalisation d'un prélevement	Plaque fibreuse rectangulaire granuleuse	002BM 00240 1 n°95 - 2	002BM 00240 1 n°95	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P97	Réalisation d'un prélevement	Plaque fibreuse 40X40	002BM 00240 1 n°97 - 1	002BM 00240 1 n°97	Peinture Effritable Gris Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Plaque fibreuse 40X40	002BM 00240 1 n°97 - 1	002BM 00240 1 n°97	Peinture Effritable Gris Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 33	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S276	Réalisation d'un sondage		S276 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Niveau 0	Vol 34	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S276	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S276		S276 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Niveau 0	Vol 32	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S276	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S276		S276 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Niveau 0	Vol 39	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S276	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S276		S276 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 1	Revêtement de sol	Dalles gravillonnée	P1	Réalisation d'un prélevement	Sue terre plein	002BM00240 1 n°1 - 1	002BM00240 1 n°1	Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 20	Revêtement de sol	Dalles gravillonnée	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sue terre plein	002BM 00240 1 n°1 - 1	002BM 00240 1 n°1	Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P8	Réalisation d'un prélevement	Colle grise	002BM 00240 1 n°8 - 1	002BM 00240 1 n°8	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P15	Réalisation d'un prélevement	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 8	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 4	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 13	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 12	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S43 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 21	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S44 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 22	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S44 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S44 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S44 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S44 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S44 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 29	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S44 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S45 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 27	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S45 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S45 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S45 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 34	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S46 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 33	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S46 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 32	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S46 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°15 - 1	002BM 00240 1 n°15	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P25	Réalisation d'un prélevement	Dalle souple avec colle jaune	002BM 00240 1 n°25 - 1	002BM 00240 1 n°25 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 35	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P25	Réalisation d'un prélevement	Dalle souple avec colle jaune	002BM 00240 1 n°25 - 1	002BM 00240 1 n°25 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 34	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélevement	Avec colle jaune	002BM 00240 1 n°27 - 1	002BM 00240 1 n°27	Moquette Souple Fibreux Gris Sous-couche Bitumineux Noir Matériau Souple Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 33	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S50 (P27)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Avec colle jaune	002BM 00240 1 n°27 - 1	002BM 00240 1 n°27	Moquette Souple Fibreux Gris Sous-couche Bitumineux Noir Matériau Souple Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 32	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S50 (P27)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Avec colle jaune	002BM 00240 1 n°27 - 1	002BM 00240 1 n°27	Moquette Souple Fibreux Gris Sous-couche Bitumineux Noir Matériau Souple Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 42	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P32	Réalisation d'un prélevement	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 39	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S65 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S65 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S66 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S67 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S68 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S82 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S187 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 38	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S188 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S192 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 43	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S193 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 45	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S202 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 46	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S203 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 48	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S204 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S205 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S206 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S207 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 42	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P32	Réalisation d'un prélevement	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 39	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S65 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 37	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S65 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S66 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S67 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S68 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S82 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S187 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 38	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S188 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S192 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 43	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S193 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 45	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S202 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 46	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S203 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 48	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S204 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S205 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S206 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 51	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S207 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°32 - 1	002BM 00240 1 n°32 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Joint gris	P47	Réalisation d'un prélevement	Joint entre partie métallique et pierre de l'escalier	002BM 00240 1 n°47 - 1	002BM 00240 1 n°47	Matériau Résineux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Joint gris	S285 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Joint entre partie métallique et pierre de l'escalier	002BM 00240 1 n°47 - 1	002BM 00240 1 n°47	Matériau Résineux Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 85	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P50	Réalisation d'un prélevement	Colle grise	002BM 00240 1 n°50 - 1	002BM 00240 1 n°50	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P57	Réalisation d'un prélevement	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 56	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 61	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 59	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 80	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 67	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 69	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 86	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 64	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S158 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Dalle avec colle noir	002BM 00240 1 n°57 - 1	002BM 00240 1 n°57	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P74	Réalisation d'un prélevement	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 84	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S128 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S134 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S135 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S155 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S155 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 89	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S155 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 88	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S155 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S155 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S155 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S169 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 71	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S179 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S245 (P74)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Dalle grise supérieur colle jaune	002BM 00240 1 n°74 - 1	002BM 00240 1 n°74	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P75	Réalisation d'un prélevement	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 84	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S129 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 89	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S159 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S170 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S180 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 76	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S246 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 83	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S260 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 1	Revêtement Dur Rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P75	Réalisation d'un prélevement	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 84	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S129 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 89	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 74	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S159 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S170 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S180 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S246 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 83	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S260 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 2	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P75	Réalisation d'un prélevement	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 84	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S129 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 77	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 89	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 73	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S159 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S170 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S180 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 76	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S246 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 83	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S260 (P75)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Dalle rouge inférieur colle noir	002BM 00240 1 n°75 - 1	002BM 00240 1 n°75 Phase 4	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P85	Réalisation d'un prélevement	Dalle avec colle beige et ragéage et résidu de colle noir	002BM 00240 1 n°85 - 1	002BM 00240 1 n°85 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P85	Réalisation d'un prélevement	Dalle avec colle beige et ragéage et résidu de colle noir	002BM 00240 1 n°85 - 1	002BM 00240 1 n°85 Phase 2	Colle Souple Jaune Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Nez de marche	P156	Réalisation d'un prélevement		002BM 00240 1-4 n °156 - 1	P156	Revêtement cassant noir avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Nez de marche	S286 (P156)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002BM 00240 1-4 n °156 - 1	P156	Revêtement cassant noir avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Plancher	P157	Réalisation d'un prélevement	Marches en granito	002BM 00240 1-4 n °157 - 1	P157	Matériau compact blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Plancher	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Marches en granito	002BM 00240 1-4 n °157 - 1	P157	Matériau compact blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 39	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 38	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 37	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 45	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 46	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 48	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 49	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 43	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 75	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 88	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 89	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 84	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 83	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 1	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 39	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 38	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 37	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 45	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 46	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 48	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 43	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présen ce sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 74	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 88	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 89	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 72	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 84	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 83	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 39	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 38	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 45	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 46	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 47	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 48	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 50	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 43	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 40	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 88	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 89	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 84	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 83	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S303 (P158)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Dalles plastiques semi dure rouge	002BM 00240 1-4 n °158 - 1	P158 Phase 3	Poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 39	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 38	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 45	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 46	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 48	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 50	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 43	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S295 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S304 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S301 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S301 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S302 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 88	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S302 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 78	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S302 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 89	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S302 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S302 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S302 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 84	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S302 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 71	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S302 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S302 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S302 (P159)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °159 - 1	P159	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 39	Revêtement de sol	Ragréage	P160	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 38	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 37	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 36	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 53	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 45	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 46	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 47	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 48	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 50	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 51	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 44	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 43	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 40	Revêtement de sol	Ragréage	S294 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 35	Revêtement de sol	Ragréage	S305 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 74	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 76	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 75	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 88	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 78	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 77	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 89	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 72	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 73	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 71	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 70	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 83	Revêtement de sol	Ragréage	S300 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °160 - 1	P160	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 64	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 86	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 69	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 80	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 59	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 55	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 13	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 8	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 22	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 27	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présen ce sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 29	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 21	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 1	Dalle dure cassante marron	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163	Réalisation d'un prélèvement	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 64	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 86	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 69	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 80	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 59	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 55	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 13	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 8	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 22	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 27	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 29	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 0	Vol 21	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 64	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 86	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 66	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 69	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 68	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 80	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 59	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 55	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S293 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 18	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 13	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 8	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 6	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 22	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 27	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 29	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 21	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S299 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles plastiques semi dure marron	002BM 00240 1-4 n °163 - 1	P163 Phase 3	Matériau mousse jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 82	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P164	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 64	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 86	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 66	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 69	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 80	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 60	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 59	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 58	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 57	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 56	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S291 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 54	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S292 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 55	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S292 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 61	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S292 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 62	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S292 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 63	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S292 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 29	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 30	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 35	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 27	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 25	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 24	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 23	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 21	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 22	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 34	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 33	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 32	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S298 (P164)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °164 - 1	P164	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 82	Revêtement de sol	Ragréage	P165	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 86	Revêtement de sol	Ragréage	S289 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 64	Revêtement de sol	Ragréage	S289 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 65	Revêtement de sol	Ragréage	S289 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 87	Revêtement de sol	Ragréage	S289 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 69	Revêtement de sol	Ragréage	S289 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 68	Revêtement de sol	Ragréage	S289 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 67	Revêtement de sol	Ragréage	S289 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 66	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 80	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 60	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 59	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 58	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 57	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 56	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 54	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 55	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 61	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 1	Vol 62	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 1	Vol 63	Revêtement de sol	Ragréage	S290 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 18	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 16	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 15	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 14	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 12	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 13	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 10	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 8	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 6	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 4	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 2	Revêtement de sol	Ragréage	S297 (P165)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165	Colle noire + ragréage	002BM 00240 1-4 n °165 - 1	P165	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 19	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement	Colle beige	002BM 00240 1 n°10 - 1	002BM 00240 1 n°10	Colle Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 19	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Colle beige	002BM 00240 1 n°10 - 1	002BM 00240 1 n°10	Colle Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P24	Réalisation d'un prélèvement	Colle beige	002BM 00240 1 n°24 - 1	002BM 00240 1 n°24	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 39	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P42	Réalisation d'un prélevement	Colle beige	002BM 00240 1 n°42 - 1	002BM 00240 1 n°42	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P52	Réalisation d'un prélevement	Colle beige	002BM 00240 1 n°52 - 1	002BM 00240 1 n°52	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Colle beige	002BM 00240 1 n°52 - 1	002BM 00240 1 n°52	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P99	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune	002BM 00240 1 n°99 - 1	002BM 00240 1 n°99	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 87	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99	Colle jaune	002BM 00240 1 n°99 - 1	002BM 00240 1 n°99	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 82	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99	Colle jaune	002BM 00240 1 n°99 - 1	002BM 00240 1 n°99	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 1	Vol 87 - Vol 82	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P99 - S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99	Colle jaune	002BM 00240 1 n°99 - 1	002BM 00240 1 n°99	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Pre-Rapport

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 19	Conduit eau	Conduit	S6	Réalisation d'un sondage		S6 - 1				Négatif sur document
Niveau 1	Vol 85	Conduit eau	Conduit	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6		S6 - 1				Négatif sur document
Niveau 0	Vol 13	Conduit air	Conduit	S38	Réalisation d'un sondage		S38 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Niveau 0	Vol 42	Conduit eau	Calorifugeage	P43	Réalisation d'un prélevement	Laine minérale	002BM00240 1 n°43 - 1	002BM00240 1 n°43	Laine Souple Fibreux Jaune Rose Matériau Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Conduit air	Mastics	P46	Réalisation d'un prélevement	Sur conduit de ventilation métallique	002BM00240 1 n°46 - 1	002BM00240 1 n°46	Peinture Effritable Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 42	Conduit air	Mastics	I1	Mastic marron						Procéder au démontage du faux plafond

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 42	Conduit eau	Tresses	P117	Réalisation d'un prélevement	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °117 - 1	002BM 00240 1-3 n °117	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Beige Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 41	Conduit eau	Tresses	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °117 - 1	002BM 00240 1-3 n °117	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Beige Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 49	Conduit eau	Tresses	S269	Réalisation d'un sondage		S269 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de filasse sr radiateur

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 36	Conduit eau	Tresses	S269	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S269		S269 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de filassesr radiateur
Niveau 0	Vol 37	Conduit eau	Tresses	S269	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S269		S269 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de filassesr radiateur

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 38	Conduit eau	Tresses	S269	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S269		S269 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de filasse sr radiateur
Niveau 0	Vol 39	Conduit eau	Tresses	S269	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S269		S269 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de filasse sr radiateur

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 45	Conduit eau	Tresses	S269	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S269		S269 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de filasse sr radiateur
Niveau 0	Vol 46	Conduit eau	Tresses	S269	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S269		S269 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de filasse sr radiateur

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 47	Conduit eau	Tresses	S269	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S269		S269 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de filasse sr radiateur
Niveau 0	Vol 48	Conduit eau	Tresses	S269	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S269		S269 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de filasse sr radiateur

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 50	Conduit eau	Tresses	S269	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S269		S269 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de filassesr radiateur
Niveau 0	Vol 51	Conduit eau	Tresses	S269	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S269		S269 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de filassesr radiateur
Niveau 0	Vol 35	Conduit eau	Tresses	P121	Réalisation d'un prélevement	Filasse sur radiateur double	002BM00240 1-3 n °121 - 1	002BM00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 35	Conduit eau	Tresses	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 35	Conduit eau	Tresses	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 23	Conduit eau	Tresses	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 25	Conduit eau	Tresses	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 26	Conduit eau	Tresses	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 27	Conduit eau	Tresses	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 28	Conduit eau	Tresses	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 29	Conduit eau	Tresses	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 30	Conduit eau	Tresses	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 31	Conduit eau	Tresses	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 1	Conduit eau	Tresses	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 17	Conduit eau	Tresses	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 9	Conduit eau	Tresses	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 10	Conduit eau	Tresses	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 11	Conduit eau	Tresses	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 12	Conduit eau	Tresses	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 15	Conduit eau	Tresses	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 14	Conduit eau	Tresses	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 8	Conduit eau	Tresses	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 7	Conduit eau	Tresses	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 6	Conduit eau	Tresses	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 5	Conduit eau	Tresses	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 4	Conduit eau	Tresses	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 3	Conduit eau	Tresses	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Niveau 0	Vol 2	Conduit eau	Tresses	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM 00240 1-3 n °121 - 1	002BM 00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 35 - Vol 23 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 1 - Vol 17 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 5 - Vol 4	Conduit eau	Tresses	S271 - S272 - S273 - S274 - S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Filasse sur radiateur double	002BM00240 1-3 n °121 - 1	002BM00240 1-3 n °121	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 90	Conduit eau	Conduit	S278	Réalisation d'un sondage		S278 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage
Toiture	Vol 90	Conduit eau	Conduit	S279	Réalisation d'un sondage		S279 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePoinçonnage

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Niveau 0	Vol 41	Conduit eau	Tresses	P161	Réalisation d'un prélevement	Filasse	002BM 00240 1-4 n °161 - 1	P161	Matériau fibreux beige + matériau mou noir avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P130	Réalisation d'un prélevement			P130 Phase 1	agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 93 (Façades NORD)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P130	Réalisation d'un prélevement			P130 Phase 2	agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Façades				
002BM002401-1 n°102	Bardages	Mastic Résineux Fibreux Gris Peinture Effritable Blanc	Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD)	176,96 m		270,74 m²	7 unité(s)
002BM002401-1 n°103	Bardages	Peinture Effritable Blanc Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD)	169,55 m		268,68 m²	6 unité(s)
P139	Panneaux-sandwichs	Matériau fibreux blanc avec poussières non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles non séparable + couche plâtreuse rose en vrac non séparable	Vol 92 (Façades SUD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD)	154,05 m		194,24 m²	

Pre-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Façades				
P140	Panneaux-sandwichs	Peinture non séparable + matériau mou gris non séparable + matériau souple incolore avec poussières non séparable	Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD)	161,62 m		246,43 m²	
P141	Panneaux-sandwichs	Peinture en faible quantité non séparable + matériau mou gris avec poussières	Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD)	173,88 m		255,38 m²	
P144	Panneaux-sandwichs	Matériau mou gris avec poussières	Vol 92 (Façades SUD)	4,51 m		1,25 m²	
P145	Panneaux-sandwichs	Matériau mou gris avec poussières	Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD)	1,55 m		1,25 m²	
P147	Panneaux-sandwichs	Matériau mou gris avec poussières	Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD)	18,37 m		10,55 m²	
P153	Menuiseries	Matériau souple gris avec poussières + matériau mou gris en faible quantité non séparable	Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD) - Vol 93 (Façades NORD)	34,61 m		8,85 m²	
P154	Menuiseries	Matériau mou gris avec poussières	Vol 92 (Façades SUD) - Vol 92 (Façades SUD)	16,36 m		5,69 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 0				

Pré-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 0				
002BM0024 01 n°2	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige	Vol 1 - Vol 1 - Vol 20 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 3 - Vol 2	66,53 m			8 unité(s)
002BM0024 01 n°15	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir	Vol 18 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 13 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 35 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 31 - Vol 30 - Vol 29 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 34 - Vol 33 - Vol 32	556,63 m		539 m²	32 unité(s)
002BM0024 01 n°17	Faux plafonds	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Vol 18 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 13 - Vol 12 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 35 - Vol 31 - Vol 30 - Vol 29 - Vol 21 - Vol 22	523,71 m		518,08 m²	32 unité(s)
002BM0024 01 n°22	Menuiseries	Mastic Résineux Noir	Vol 15 - Vol 14 - Vol 12 - Vol 11 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 5 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 16 - Vol 17	32,54 m			18 unité(s)

Pré Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 0				
002BM0024 01 n°23	Menuiseries	Mastic Résineux Noir	Vol 5 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 12 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 17	33,45 m			20 unité(s)
002BM0024 01 n°25 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige Blanc	Vol 35	57,84 m		71,3 m²	1 unité(s)
002BM0024 01 n°27	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Gris Sous-couche Bitumineux Noir Matériau Souple Fibreux Gris	Vol 34 - Vol 33 - Vol 32	34,92 m		24,4 m²	3 unité(s)
002BM0024 01 n°29	Menuiseries	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune	Vol 31 - Vol 31 - Vol 30 - Vol 29 - Vol 29 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 26 - Vol 24 - Vol 23 - Vol 23 - Vol 35 - Vol 22 - Vol 22	38 m			15 unité(s)
002BM0024 01 n°30	Menuiseries	Mastic Résineux Noir	Vol 24 - Vol 22 - Vol 22 - Vol 35 - Vol 23 - Vol 23 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 31	36,37 m			15 unité(s)
002BM0024 01 n°32 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron	Vol 42 - Vol 39 - Vol 37 - Vol 37 - Vol 44 - Vol 47 - Vol 53 - Vol 53 - Vol 36 - Vol 38 - Vol 40 - Vol 43 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51	384,35 m		483,37 m²	18 unité(s)

PreRapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 0				
002BM0024 01 n°32 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Vol 42 - Vol 39 - Vol 37 - Vol 37 - Vol 44 - Vol 47 - Vol 53 - Vol 53 - Vol 36 - Vol 38 - Vol 40 - Vol 43 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51	384,35 m		483,37 m²	18 unité(s)
002BM0024 01 n°33 Phase 2	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Vol 41 - Vol 41 - Vol 41 - Vol 37 - Vol 37 - Vol 37 - Vol 47 - Vol 47 - Vol 44 - Vol 53 - Vol 36 - Vol 36 - Vol 40 - Vol 46 - Vol 45 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 38	237,52 m			21 unité(s)
002BM0024 01 n°34 Phase 1	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc	Vol 39	12,11 m			1 unité(s)
002BM0024 01 n°36	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune	Vol 39 - Vol 37 - Vol 44 - Vol 52 - Vol 52 - Vol 52 - Vol 52 - Vol 36 - Vol 36 - Vol 36 - Vol 40 - Vol 43 - Vol 51 - Vol 50 - Vol 49 - Vol 49 - Vol 49 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 46 - Vol 46 - Vol 45 - Vol 45	54,64 m			23 unité(s)
002BM0024 01 n°44 Phase 1	Menuiseries	Mastic Effritable Gris	Vol 44 - Vol 39 - Vol 37 - Vol 37 - Vol 36 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 43 - Vol 40	60,77 m			14 unité(s)
002BM0024 01 n°47	Revêtement de sol	Matériau Résineux Gris	Vol 53 - Vol 70	27,55 m		22,94 m²	1 unité(s)

Pré-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 0				
002BM002401 n°49	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Beige	Vol 53 - Vol 53	7,76 m			2 unité(s)
P149	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau mou gris avec poussières	Vol 53	1,92 m			
P156	Revêtement de sol	Revêtement cassant noir avec fibres visibles	Vol 53 - Vol 70	24,88 m		19,32 m²	
P158 Phase 2	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge	Vol 39 - Vol 38 - Vol 37 - Vol 36 - Vol 53 - Vol 41 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 44 - Vol 43 - Vol 40 - Vol 74 - Vol 76 - Vol 75 - Vol 88 - Vol 78 - Vol 77 - Vol 89 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 71 - Vol 70 - Vol 84 - Vol 83	780,66 m		1134,01 m²	
P159	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Vol 39 - Vol 38 - Vol 37 - Vol 36 - Vol 41 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 44 - Vol 43 - Vol 40 - Vol 53 - Vol 18 - Vol 74 - Vol 76 - Vol 75 - Vol 88 - Vol 78 - Vol 78 - Vol 89 - Vol 77 - Vol 70 - Vol 84 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73	862,9 m		1401,52 m²	

Pré-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 0				
P160	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Vol 39 - Vol 38 - Vol 37 - Vol 36 - Vol 53 - Vol 41 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 44 - Vol 43 - Vol 40 - Vol 35 - Vol 74 - Vol 76 - Vol 75 - Vol 88 - Vol 78 - Vol 77 - Vol 89 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 71 - Vol 70 - Vol 83	842,63 m		1397,21 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 1				
002BM002401 n°57	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Vol 82 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 80 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 65 - Vol 86 - Vol 64 - Vol 87	552,39 m		785,26 m²	20 unité(s)
002BM002401 n°58	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau Effritable Fibreux Beige	Vol 82	10,39 m			1 unité(s)
002BM002401 n°61	Faux plafonds	Matériau Effritable Fibreux Beige	Vol 82 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 80 - Vol 60 - Vol 59 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 56 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 86 - Vol 64 - Vol 69 - Vol 68 - Vol 67 - Vol 87	558,04 m		792,25 m²	20 unité(s)
002BM002401 n°67	Menuiseries	Mastic Résineux Noir	Vol 62 - Vol 61 - Vol 55 - Vol 54 - Vol 54 - Vol 63	9,54 m			6 unité(s)

Pre-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 1				
002BM0024 01 n°68	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Vol 82 - Vol 82 - Vol 82	14,14 m			3 unité(s)
002BM0024 01 n°69	Menuiseries	Mastic Résineux Noir	Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 80 - Vol 56	9,23 m			6 unité(s)
002BM0024 01 n°70	Menuiseries	Mastic Résineux Noir	Vol 65 - Vol 65 - Vol 65 - Vol 65 - Vol 64 - Vol 87	9,7 m			6 unité(s)
002BM0024 01 n°71	Menuiseries	Mastic Résineux Noir	Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 66	6,01 m			4 unité(s)
002BM0024 01 n°74	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Vol 70 - Vol 84 - Vol 77 - Vol 77 - Vol 75 - Vol 74 - Vol 89 - Vol 88 - Vol 78 - Vol 73 - Vol 72 - Vol 71 - Vol 76	402,43 m		645,79 m²	13 unité(s)
002BM0024 01 n°75 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Rouge	Vol 70 - Vol 84 - Vol 78 - Vol 77 - Vol 89 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 73 - Vol 87 - Vol 72 - Vol 71 - Vol 76 - Vol 83	414,17 m		671,59 m²	13 unité(s)
002BM0024 01 n°75 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune	Vol 70 - Vol 84 - Vol 78 - Vol 77 - Vol 89 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 73 - Vol 87 - Vol 72 - Vol 71 - Vol 76 - Vol 83	414,17 m		671,59 m²	13 unité(s)
002BM0024 01 n°75 Phase 4	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Vol 70 - Vol 84 - Vol 78 - Vol 77 - Vol 89 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 73 - Vol 87 - Vol 72 - Vol 71 - Vol 76 - Vol 83	414,17 m		671,59 m²	13 unité(s)

Pré-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 1				
002BM0024 01 n°77 Phase 1	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Vol 70 - Vol 70 - Vol 70 - Vol 83	37,61 m			5 unité(s)
002BM0024 01 n°79	Menuiseries	Mastic Résineux Noir Gris Matériau Effritable Beige Marron	Vol 70 - Vol 72 - Vol 71	12,42 m			3 unité(s)
002BM0024 01 n°81	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Jaune Fibres-cimen t Dur Fibreux Gris	Vol 84	1,6 m			1 unité(s)
002BM0024 01 n°84	Faux plafonds	Fibres-cimen t Dur Fibreux Gris	Vol 70 - Vol 84 - Vol 75 - Vol 72 - Vol 71	122,1 m		182,36 m²	5 unité(s)
002BM0024 01 n°86	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Fibres-cimen t Effritable Fibreux Gris	Vol 73 - Vol 74 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 75 - Vol 75 - Vol 78 - Vol 78 - Vol 78 - Vol 72 - Vol 72 - Vol 71 - Vol 71 - Vol 76	46,18 m			14 unité(s)
002BM0024 01 n°89 Phase 1	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Vol 77 - Vol 77 - Vol 77 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 89 - Vol 75 - Vol 77 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 72 - Vol 71	99,25 m			12 unité(s)
002BM0024 01 n°89 Phase 4	Murs et cloisons	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Vol 77 - Vol 77 - Vol 77 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 89 - Vol 75 - Vol 77 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 72 - Vol 71	99,25 m			12 unité(s)

Pré-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 1				
002BM002401 n°92	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc	Vol 77 - Vol 77	9,81 m			2 unité(s)
P163 Phase 1	Revêtement de sol	Dalle dure cassante marron	Vol 82 - Vol 65 - Vol 64 - Vol 86 - Vol 66 - Vol 87 - Vol 69 - Vol 68 - Vol 67 - Vol 80 - Vol 60 - Vol 59 - Vol 58 - Vol 57 - Vol 56 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 35 - Vol 21	1081,59 m		1299,95 m²	

Pré-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 1				
P163 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	Vol 82 - Vol 65 - Vol 64 - Vol 86 - Vol 66 - Vol 87 - Vol 69 - Vol 68 - Vol 67 - Vol 80 - Vol 60 - Vol 59 - Vol 58 - Vol 57 - Vol 56 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 35 - Vol 21	1081,59 m		1299,95 m²	
P164	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Vol 82 - Vol 65 - Vol 64 - Vol 86 - Vol 66 - Vol 87 - Vol 69 - Vol 69 - Vol 67 - Vol 80 - Vol 60 - Vol 59 - Vol 58 - Vol 57 - Vol 56 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 35 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 24 - Vol 23 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 34 - Vol 33 - Vol 32	828,68 m		1044 m²	

Pré-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Niveau 1				
P165	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Vol 82 - Vol 86 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 87 - Vol 69 - Vol 68 - Vol 67 - Vol 66 - Vol 80 - Vol 60 - Vol 59 - Vol 58 - Vol 57 - Vol 56 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2	851,37 m		1067,72 m²	

Pre-Rapport


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Niveau 0	Niveau 0 - Plan de repérage - Actions menées
	Niveau 0	Niveau 0 - MPCA Toutes catégories confondues
	Niveau 0	Niveau 0 - MPCA Façades
	Niveau 0	Niveau 0 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Niveau 0	Niveau 0 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Niveau 0	Niveau 0 - MPCA Revêtement de sol
	Niveau 0	Niveau 0 - MPCA Dalles plastiques
	Niveau 0	Niveau 0 - MPCA Colle bitumineuse
	Niveau 0	Niveau 0 - MPCA Ragréages
	Niveau 1	Niveau 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Niveau 1	Niveau 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Niveau 1	Niveau 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Niveau 1	Niveau 1 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Niveau 1	Niveau 1 - MPCA Revêtement de sol
	Niveau 1	Niveau 1 - MPCA Dalles de sol
	Niveau 1	Niveau 1 - MPCA Colle bitumineuse
	Niveau 1	Niveau 1 - MPCA Ragréages
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Façades	Façades - Plan de repérage - Actions menées
	Façades	Façades - MPCA Toutes catégories confondues
	Façades	Façades - MPCA Façades

Pre-Rapport

NIVEAU 0 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002BM002401-4

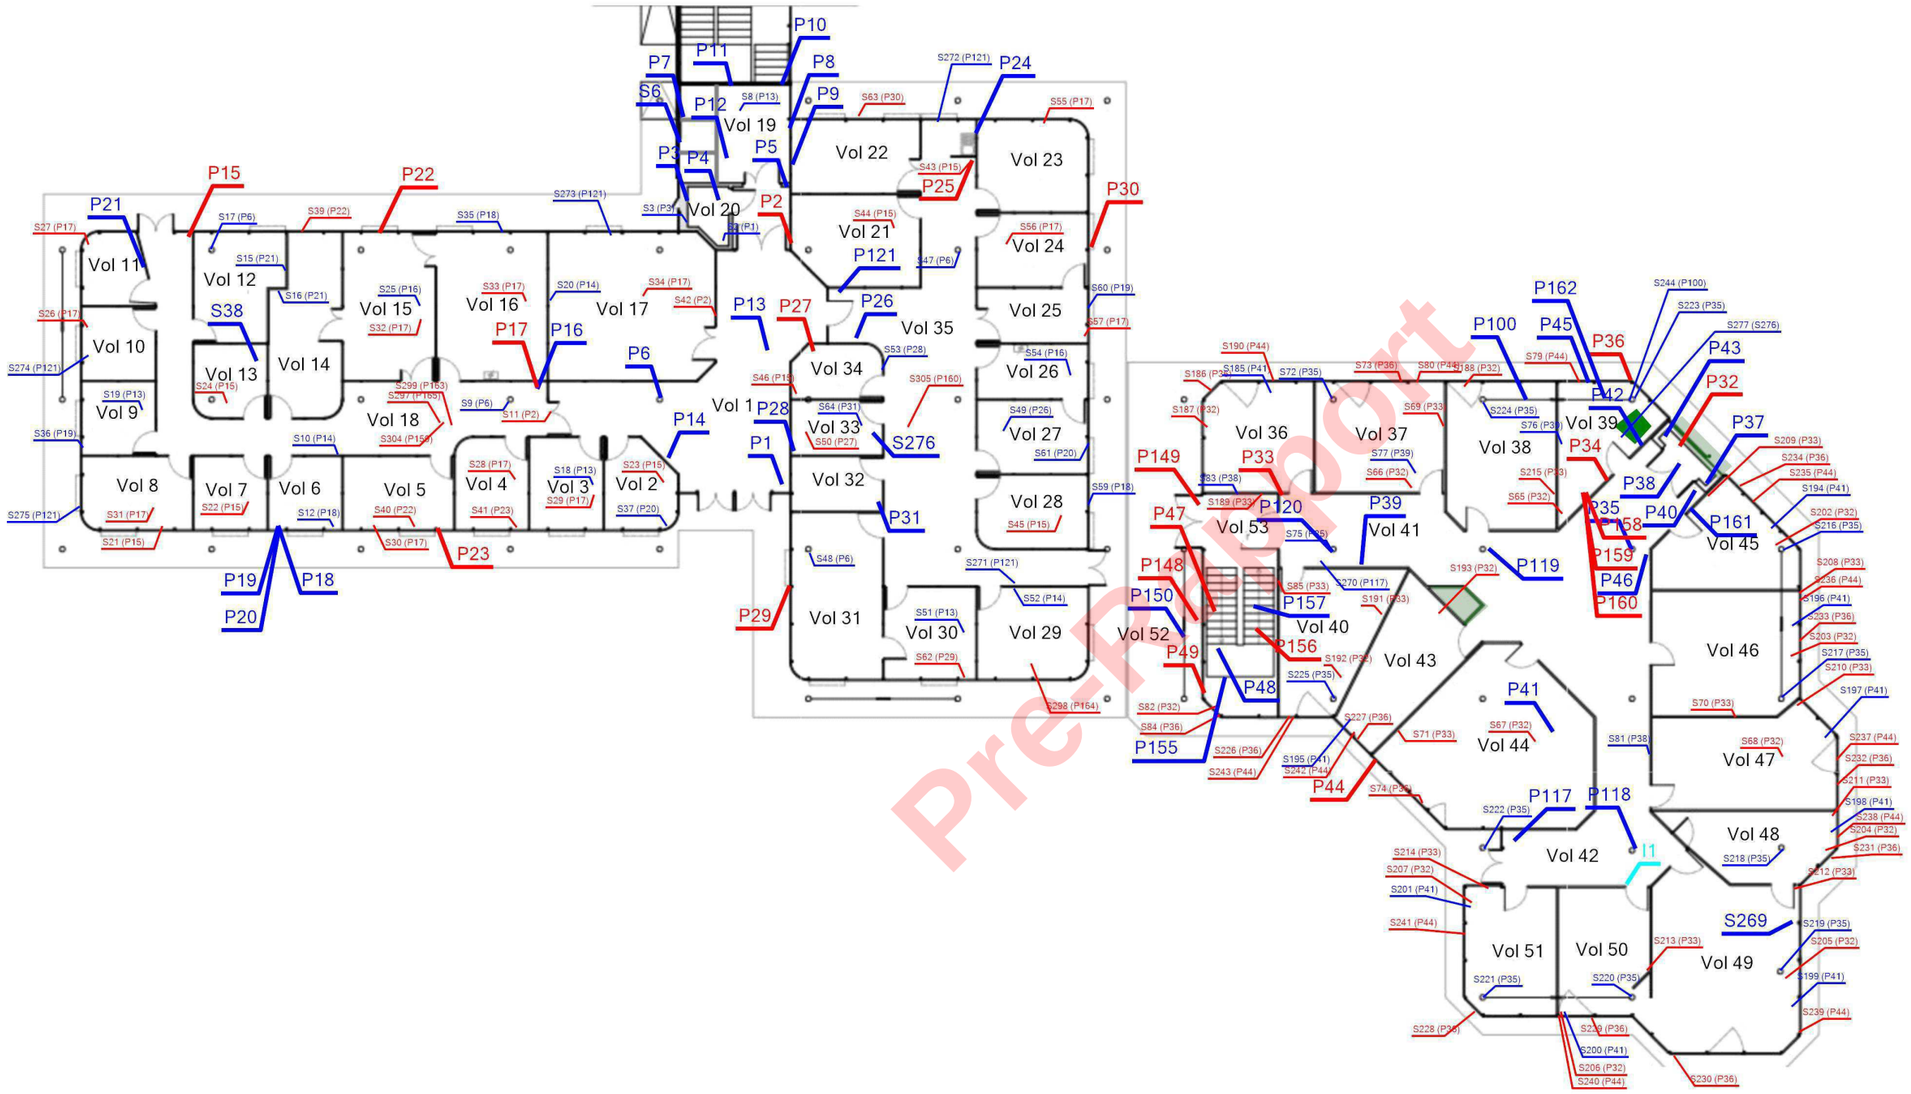

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Gaines techniques

Pré-rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 0 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002BM002401-4

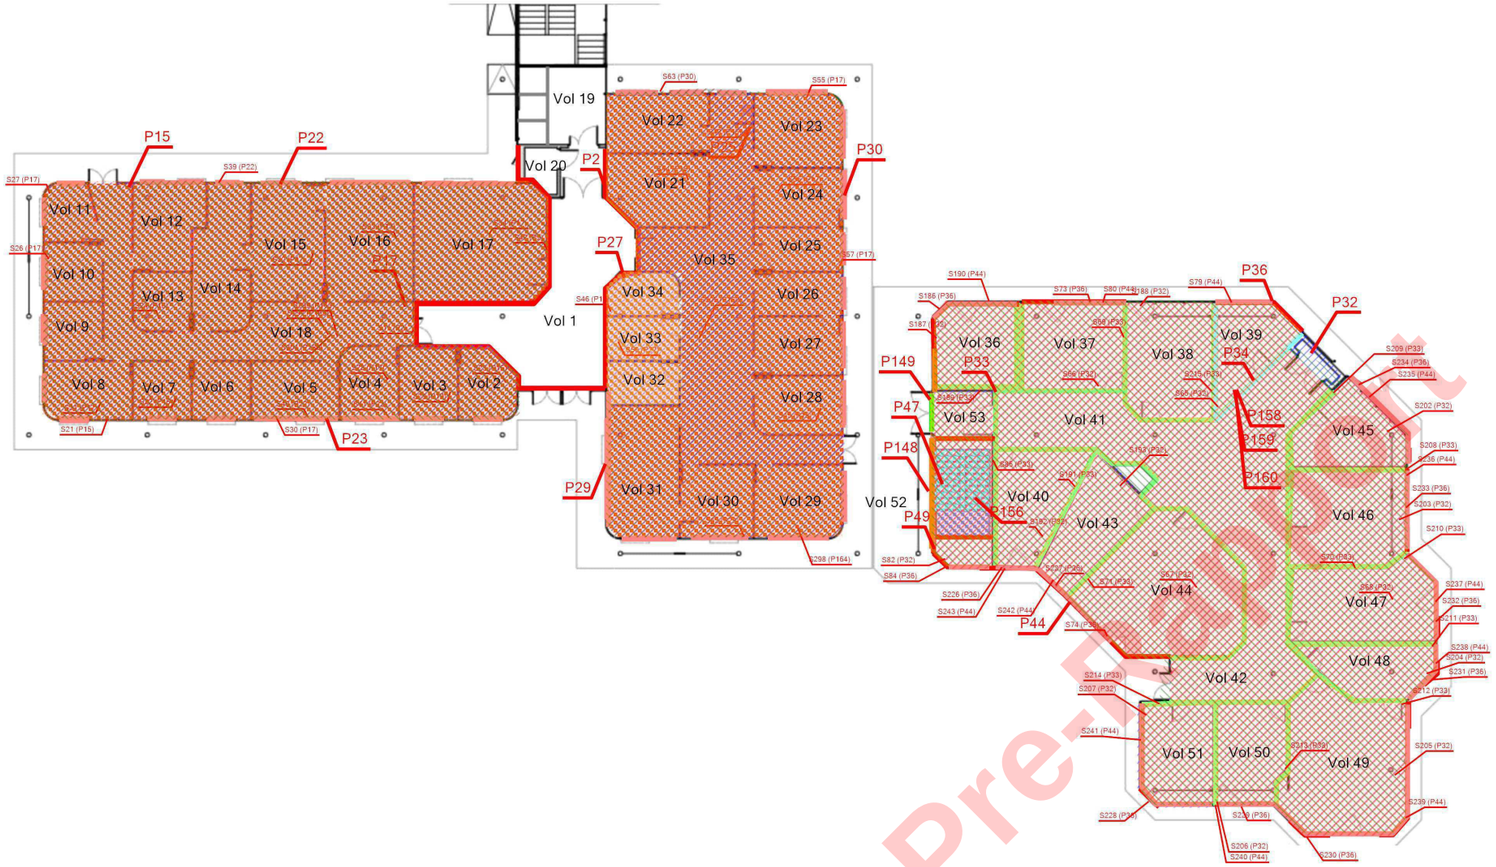

Légende

	P156 : Nez de marche		P22 : Mastic vitrier
	P34 : Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc		P17 : Panneaux et plaques
	P23 : Mastic vitrier		P149 : Mastic vitrier
	P165 : Ragréage		P15 : Dalles plastiques
	P148 : Mastic vitrier		P49 : Mastic vitrier
	P25 : Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige Blanc		P159 : Colle bitumeuse
	P29 : Mastic vitrier		P158 : Dalle dure cassante rouge
	P2 : Plaques planes en fibres-ciment		P44 : Mastic Effritable Gris
	P47 : Joint gris		P163 : Dalle dure cassante marron, Colle bitumineuse noire
	P32 : Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris		P30 : Mastic vitrier
	P33 : Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige		P36 : Plaques planes en fibres-ciment
	P164 : Colle bitumeuse		P27 : Moquettes avec sous-couche
			P160 : Ragréage


Pre-Rapport

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 0 - MPCA FAÇADES

Référence:
002BM002401-4

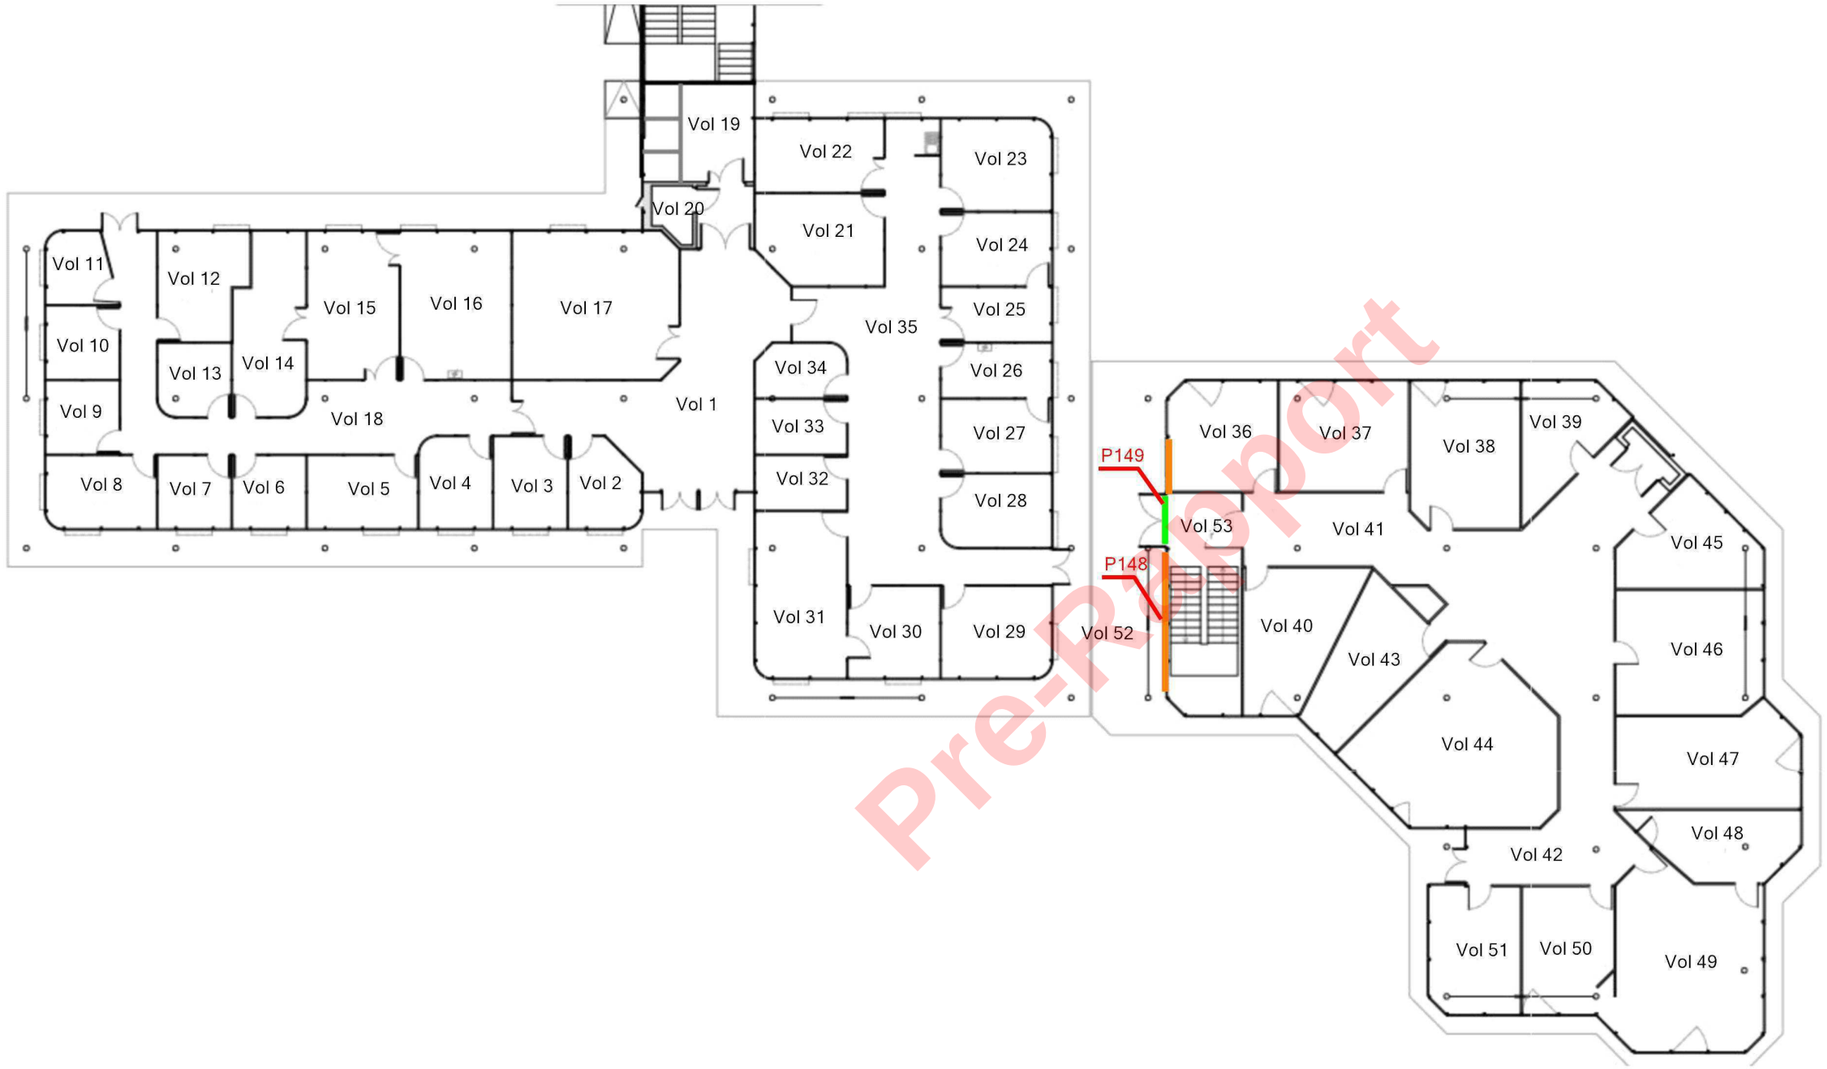

Pre-Rapport


Légende

	P149 : Mastic vitrier
	P148 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 0 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002BM002401-4

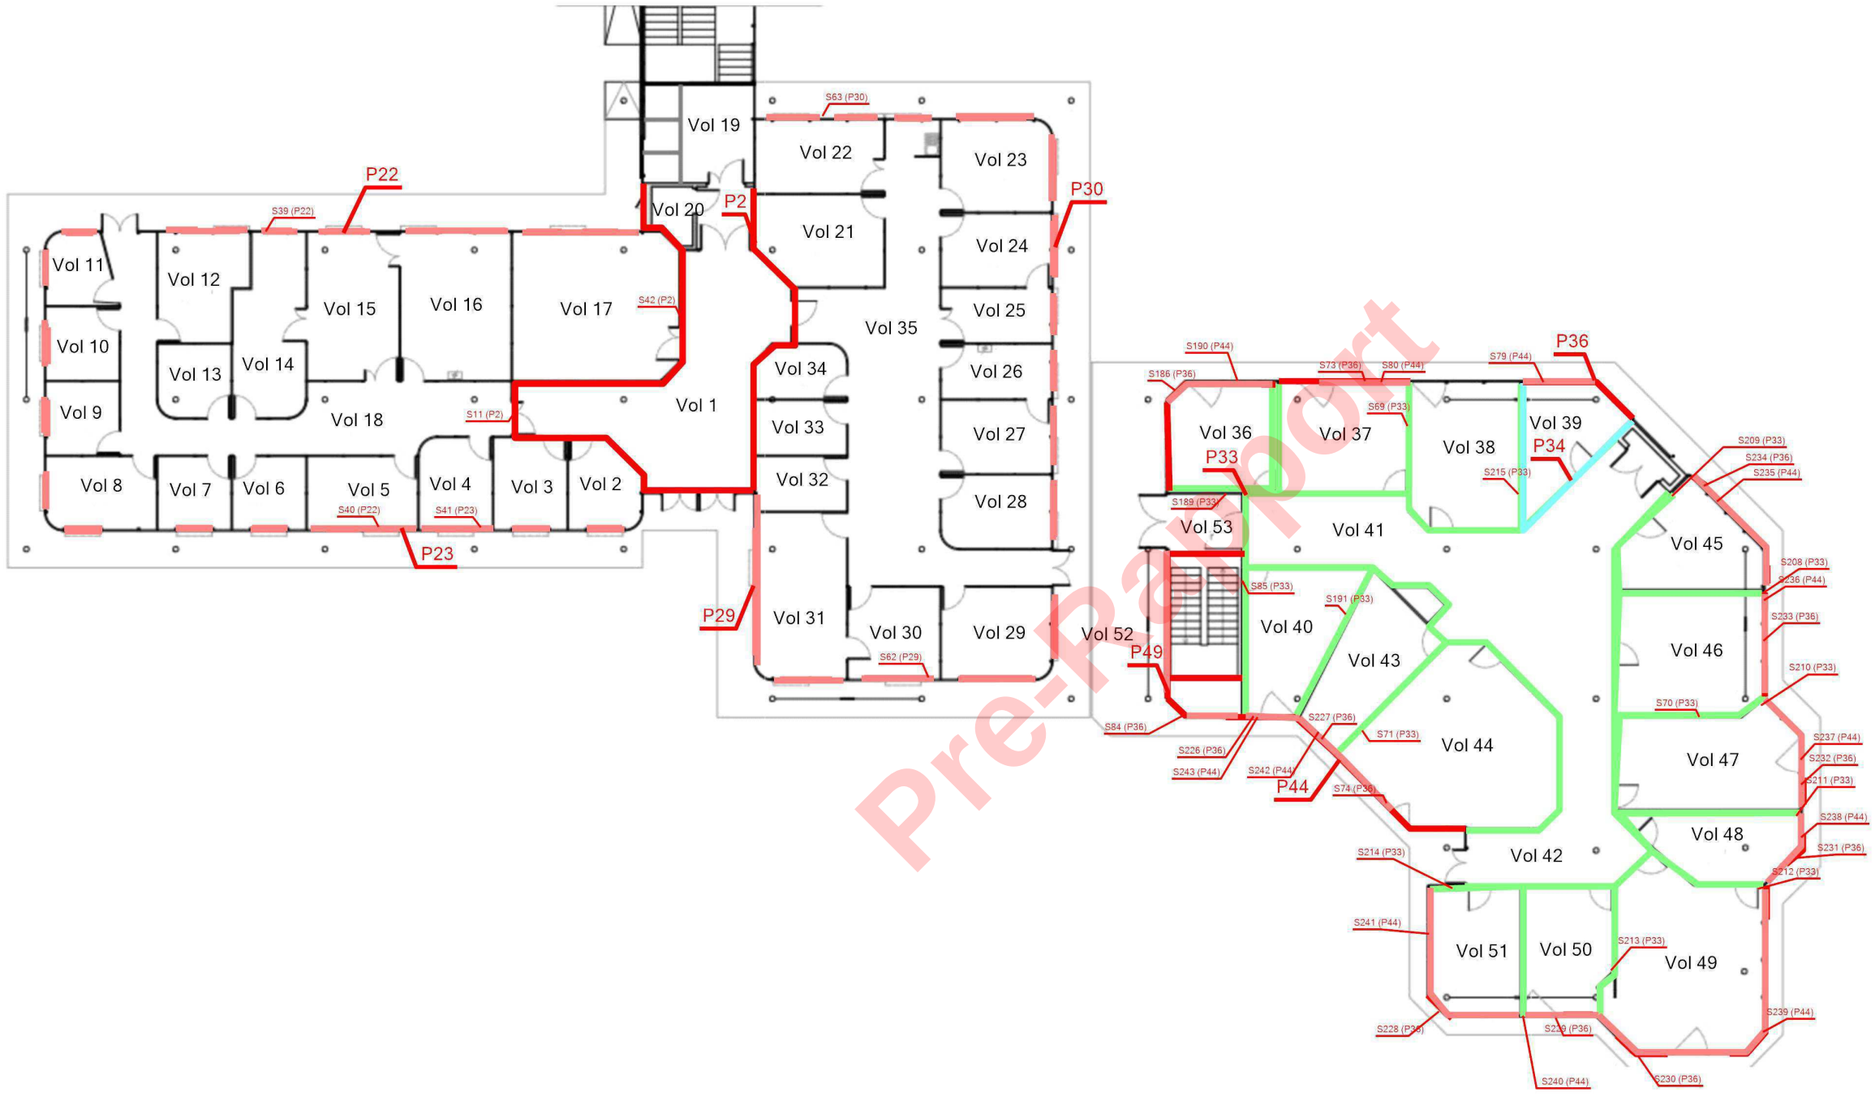

Pre-Rapport


Légende

	P22 : Mastic vitrier
	P49 : Mastic vitrier
	P44 : Mastic Effritable Gris
	P30 : Mastic vitrier
	P36 : Plaques planes en fibres-ciment
	P34 : Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc
	P23 : Mastic vitrier
	P29 : Mastic vitrier
	P2 : Plaques planes en fibres-ciment
	P33 : Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 0 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002BM002401-4

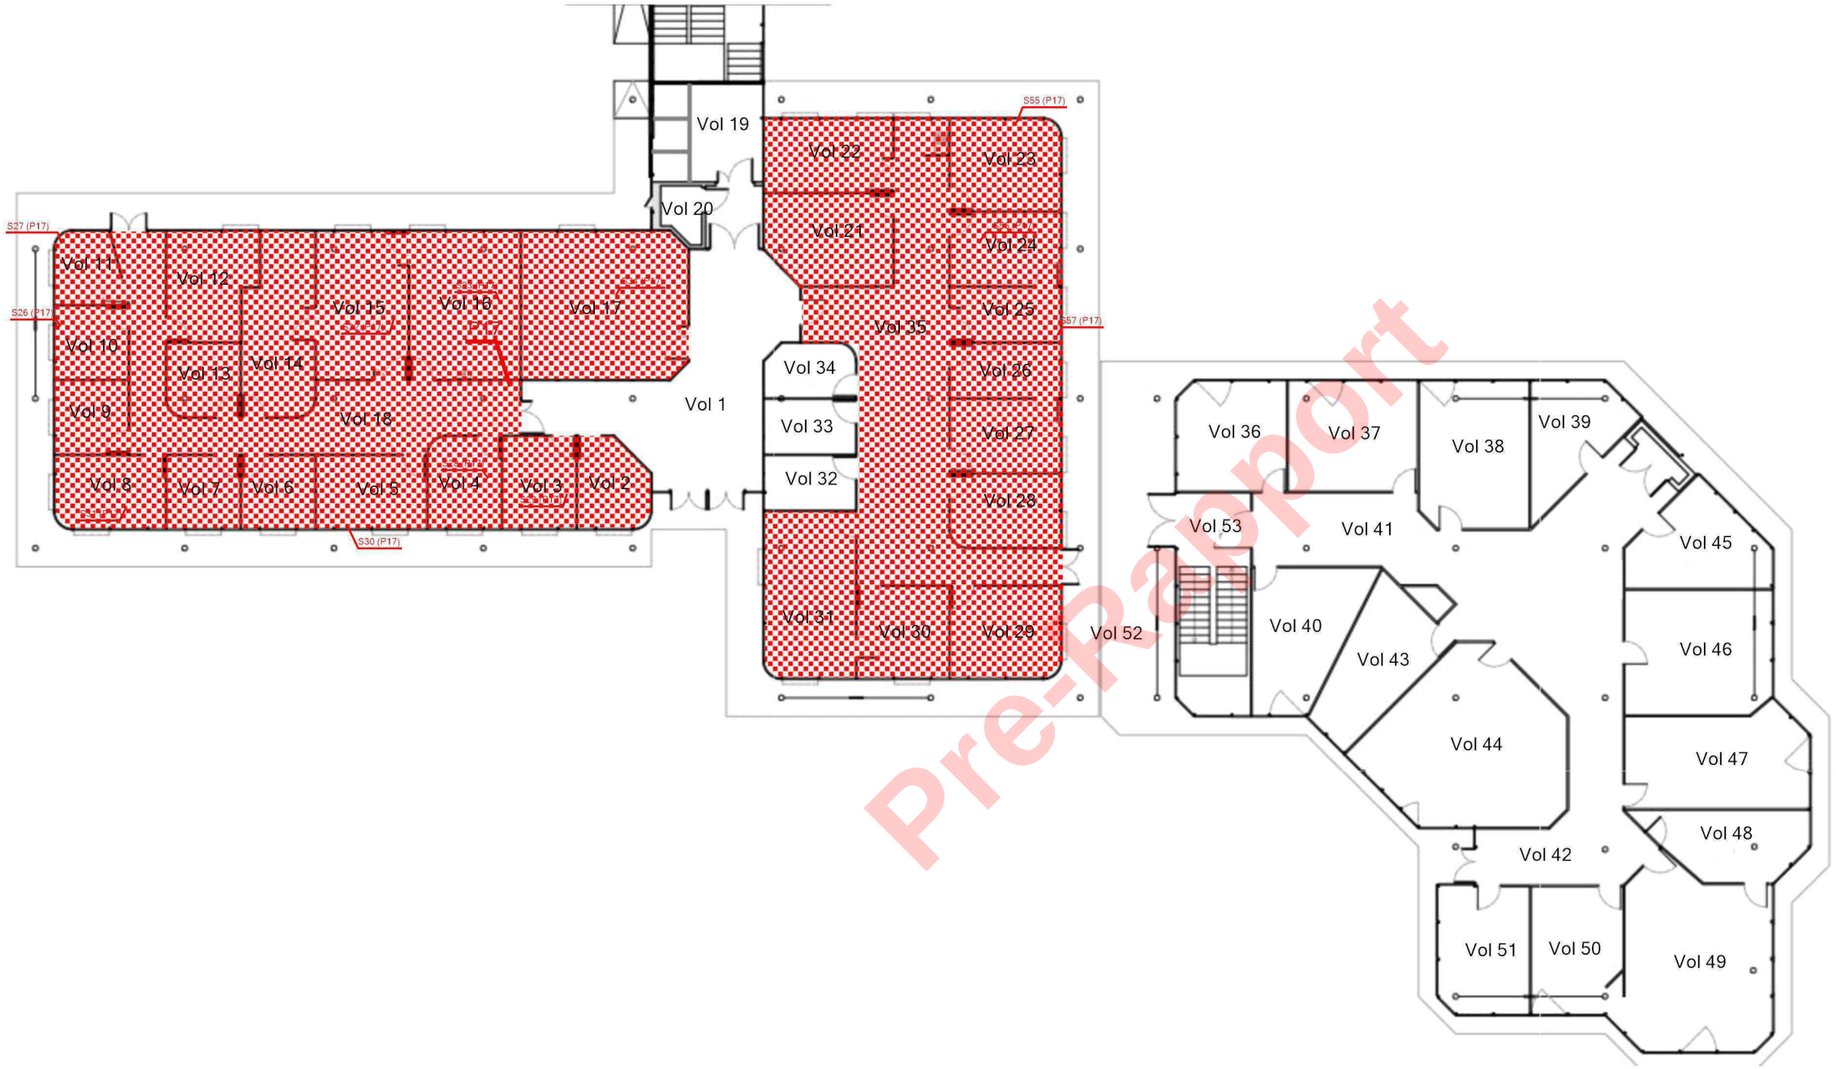

Pre-Rapport


Légende

	P17 : Panneaux et plaques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 0 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002BM002401-4

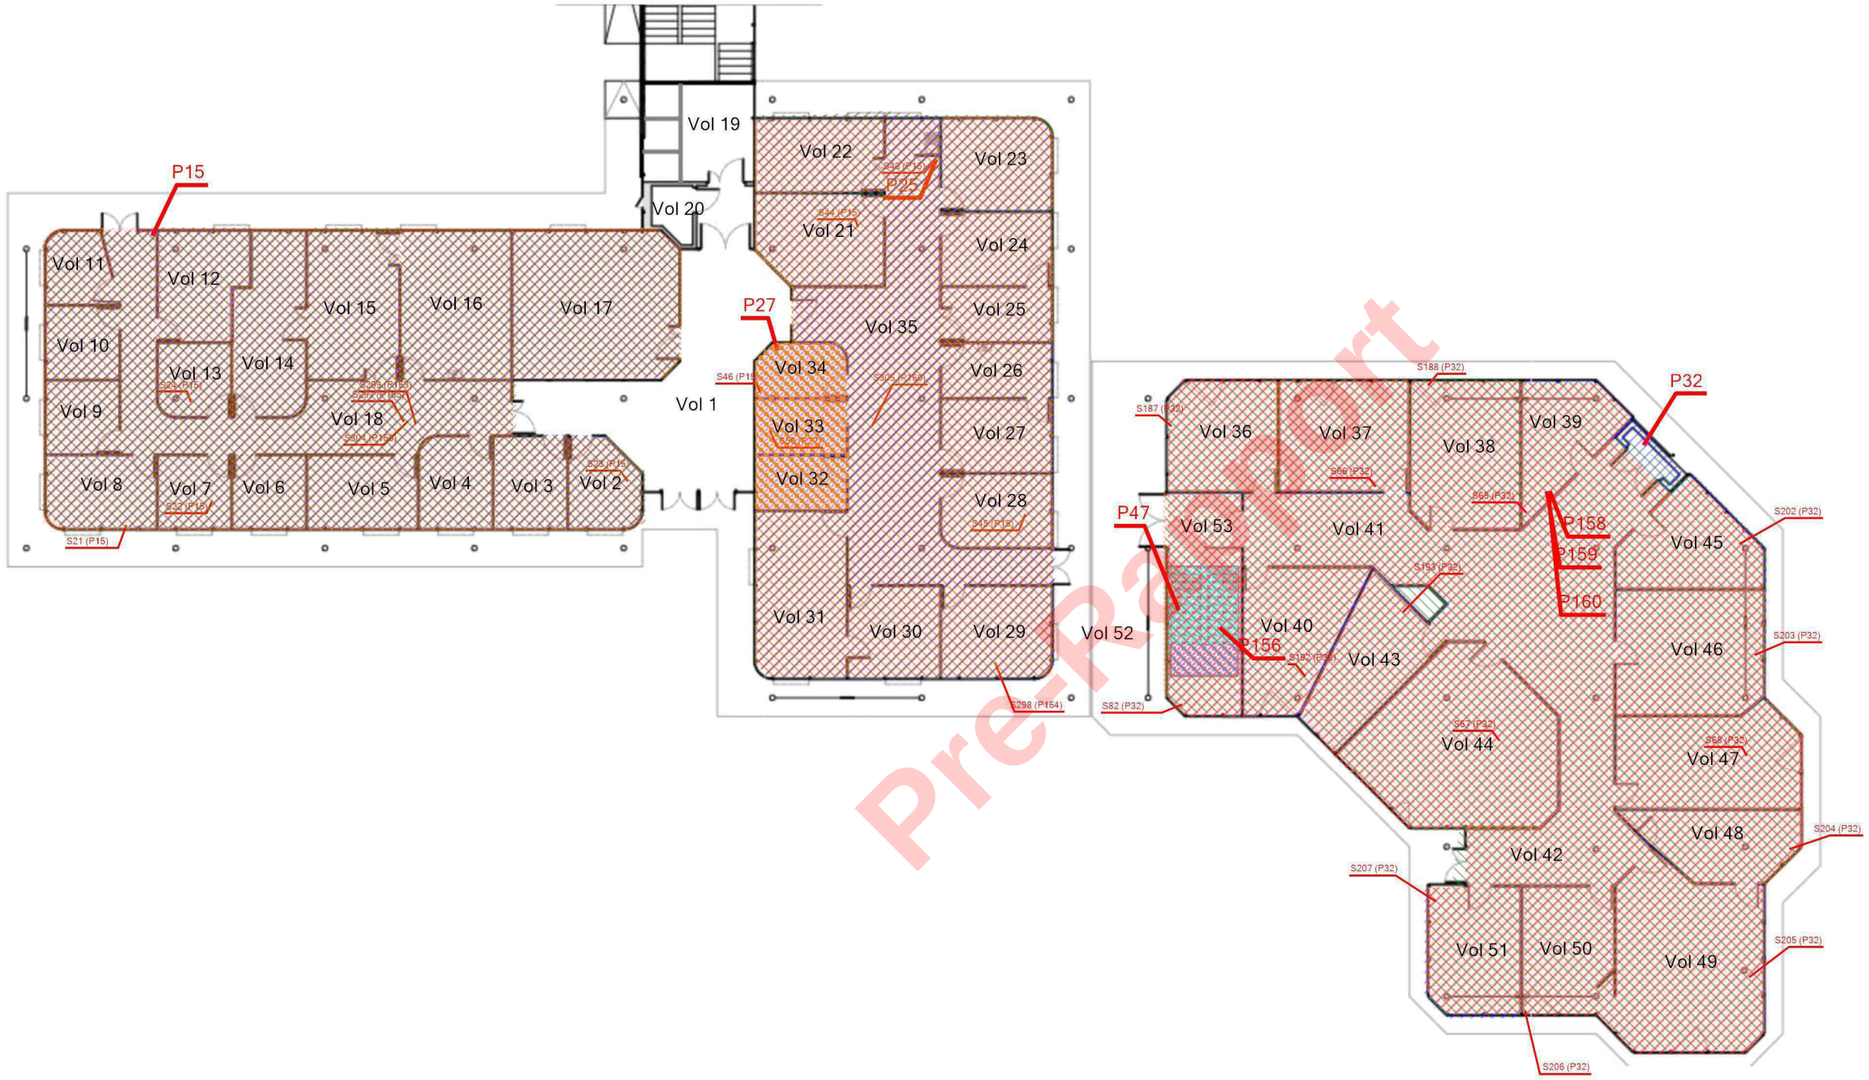

Légende


	P15 : Dalles plastiques
	P159 : Colle bitumeuse
	P158 : Dalle dure cassante rouge
	P163 : Dalle dure cassante marron, Colle bitumineuse noire
	P27 : Moquettes avec sous-couche
	P160 : Ragréage
	P156 : Nez de marche
	P165 : Ragréage
	P25 : Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige Blanc
	P47 : Joint gris
	P32 : Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris
	P164 : Colle bitumeuse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

Pre-Rapport

NIVEAU 0 - MPCA DALLES PLASTIQUES

Référence:
002BM002401-4

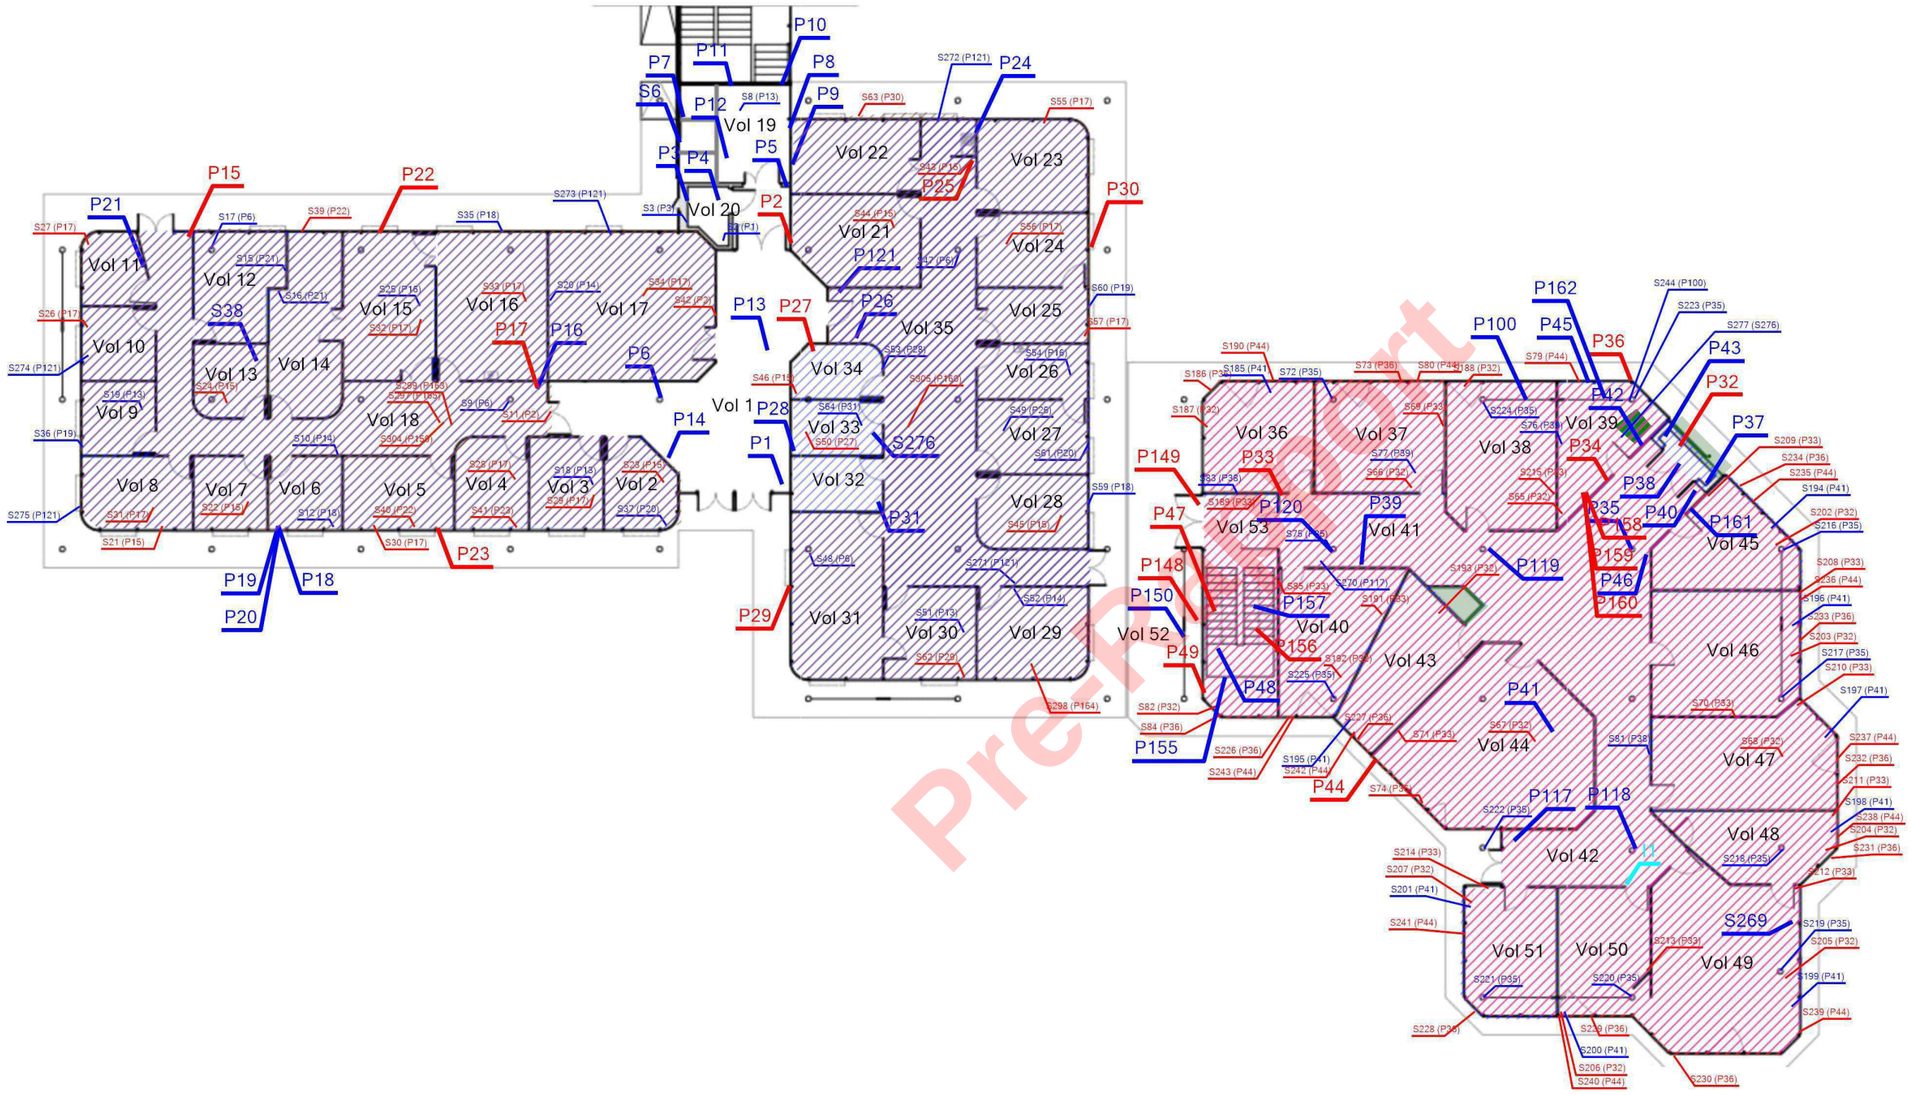

Légende


	P15 : Dalles plastiques
	P158 : Dalle dure cassante rouge
	P163 : Dalle dure cassante marron, Colle bitumineuse noire
	P25 : Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige Blanc
	P32 : Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris
	Gaines techniques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

Pre-Rapport

NIVEAU 0 - MPCA COLLE BITUMINEUSE

Référence:
002BM002401-4

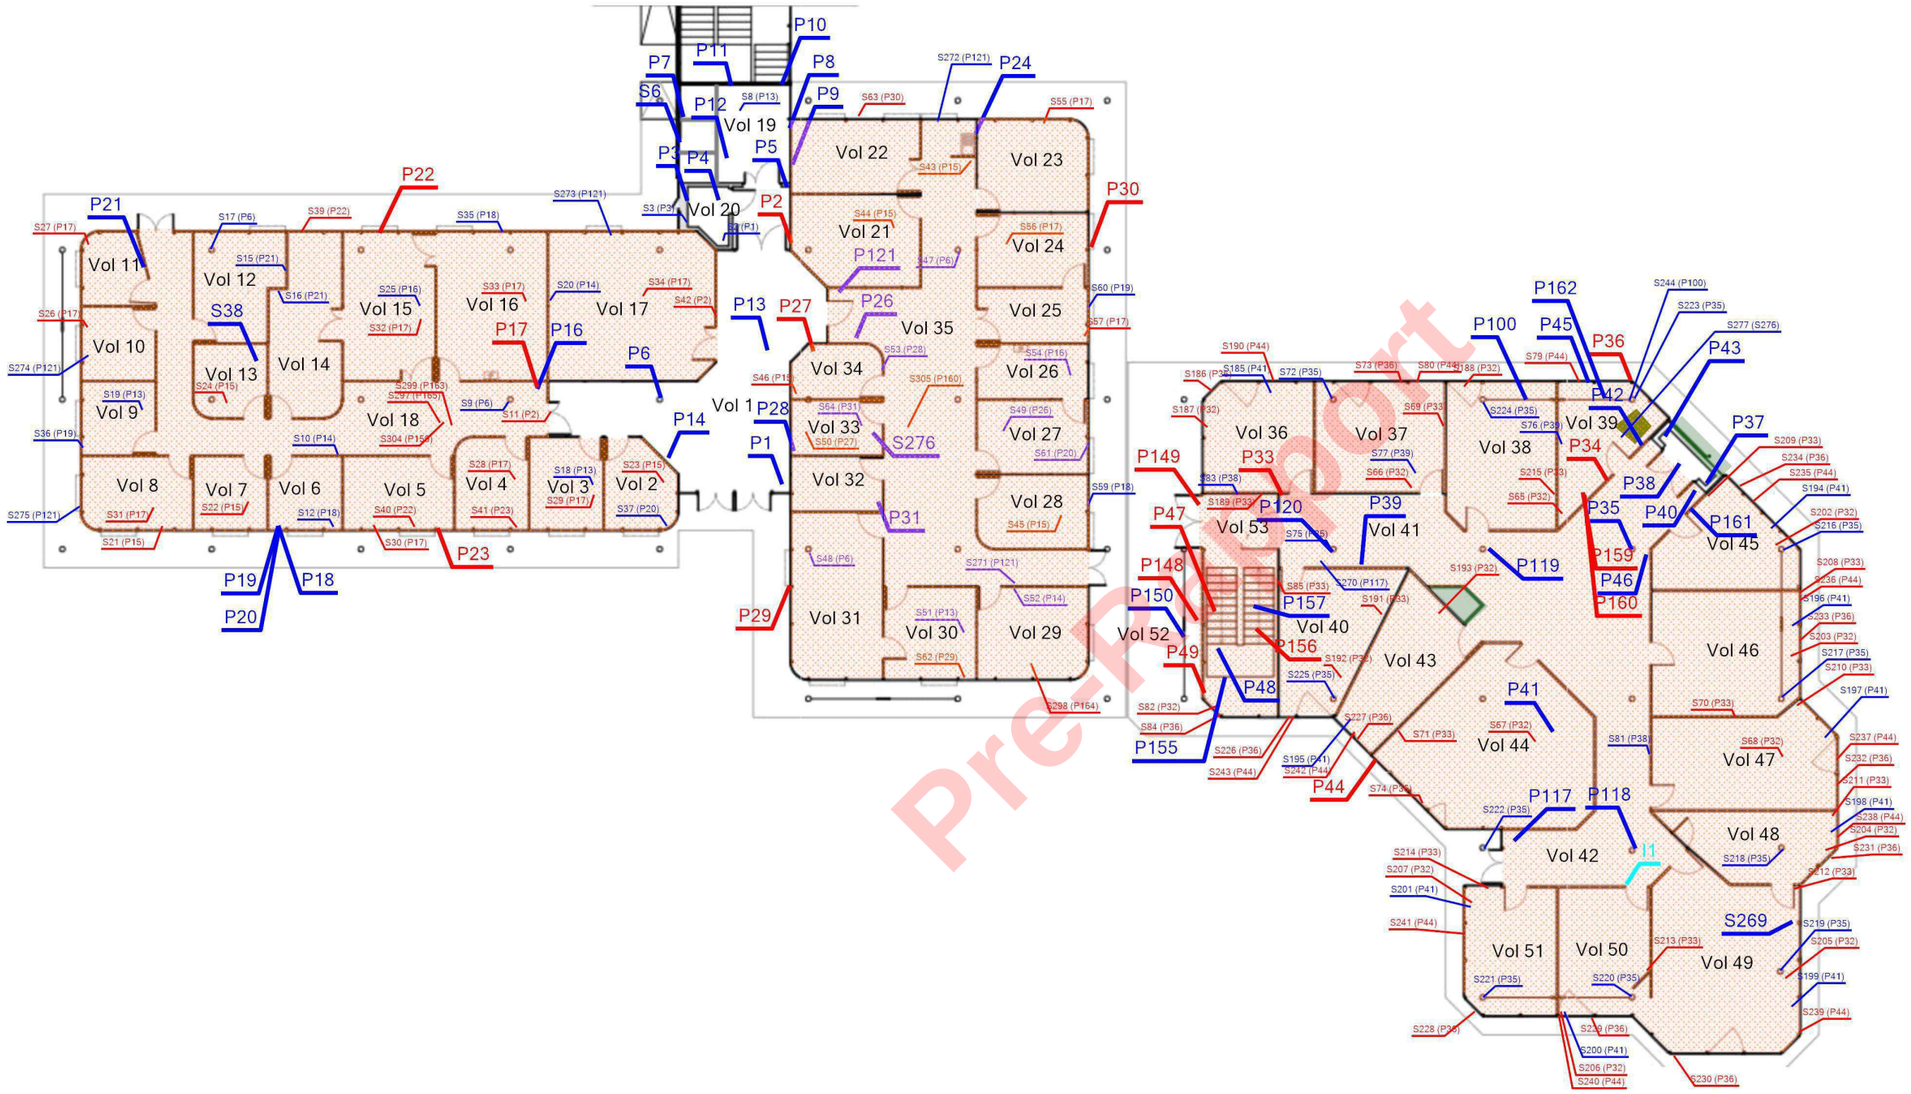

Légende


	P159 : Colle bitumeuse
	P164 : Colle bitumeuse
	Gaines techniques

Pré-rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 0 - MPCA RAGRÉAGES

Référence:
002BM002401-4

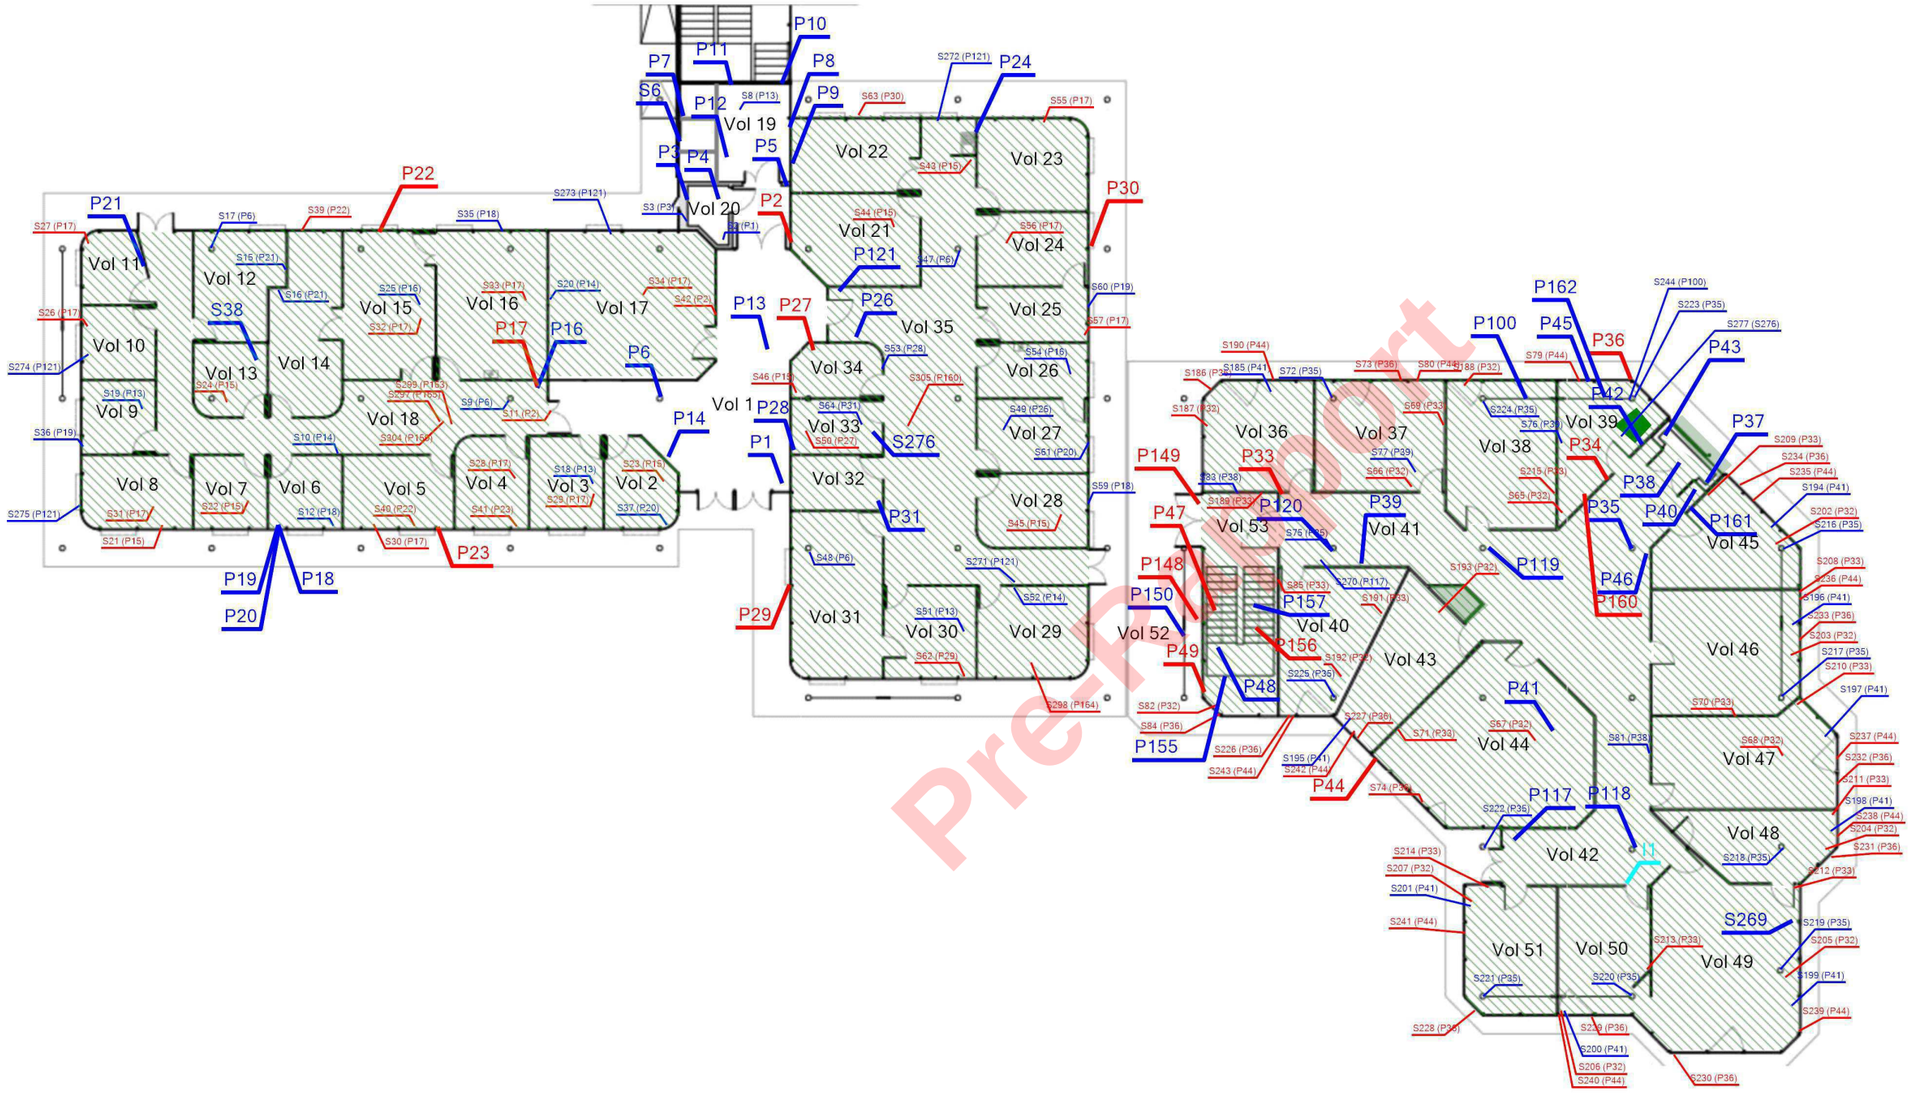

Légende


	P160 : Ragréage
	P165 : Ragréage
	Gaines techniques

Pre-Report

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002BM002401-4

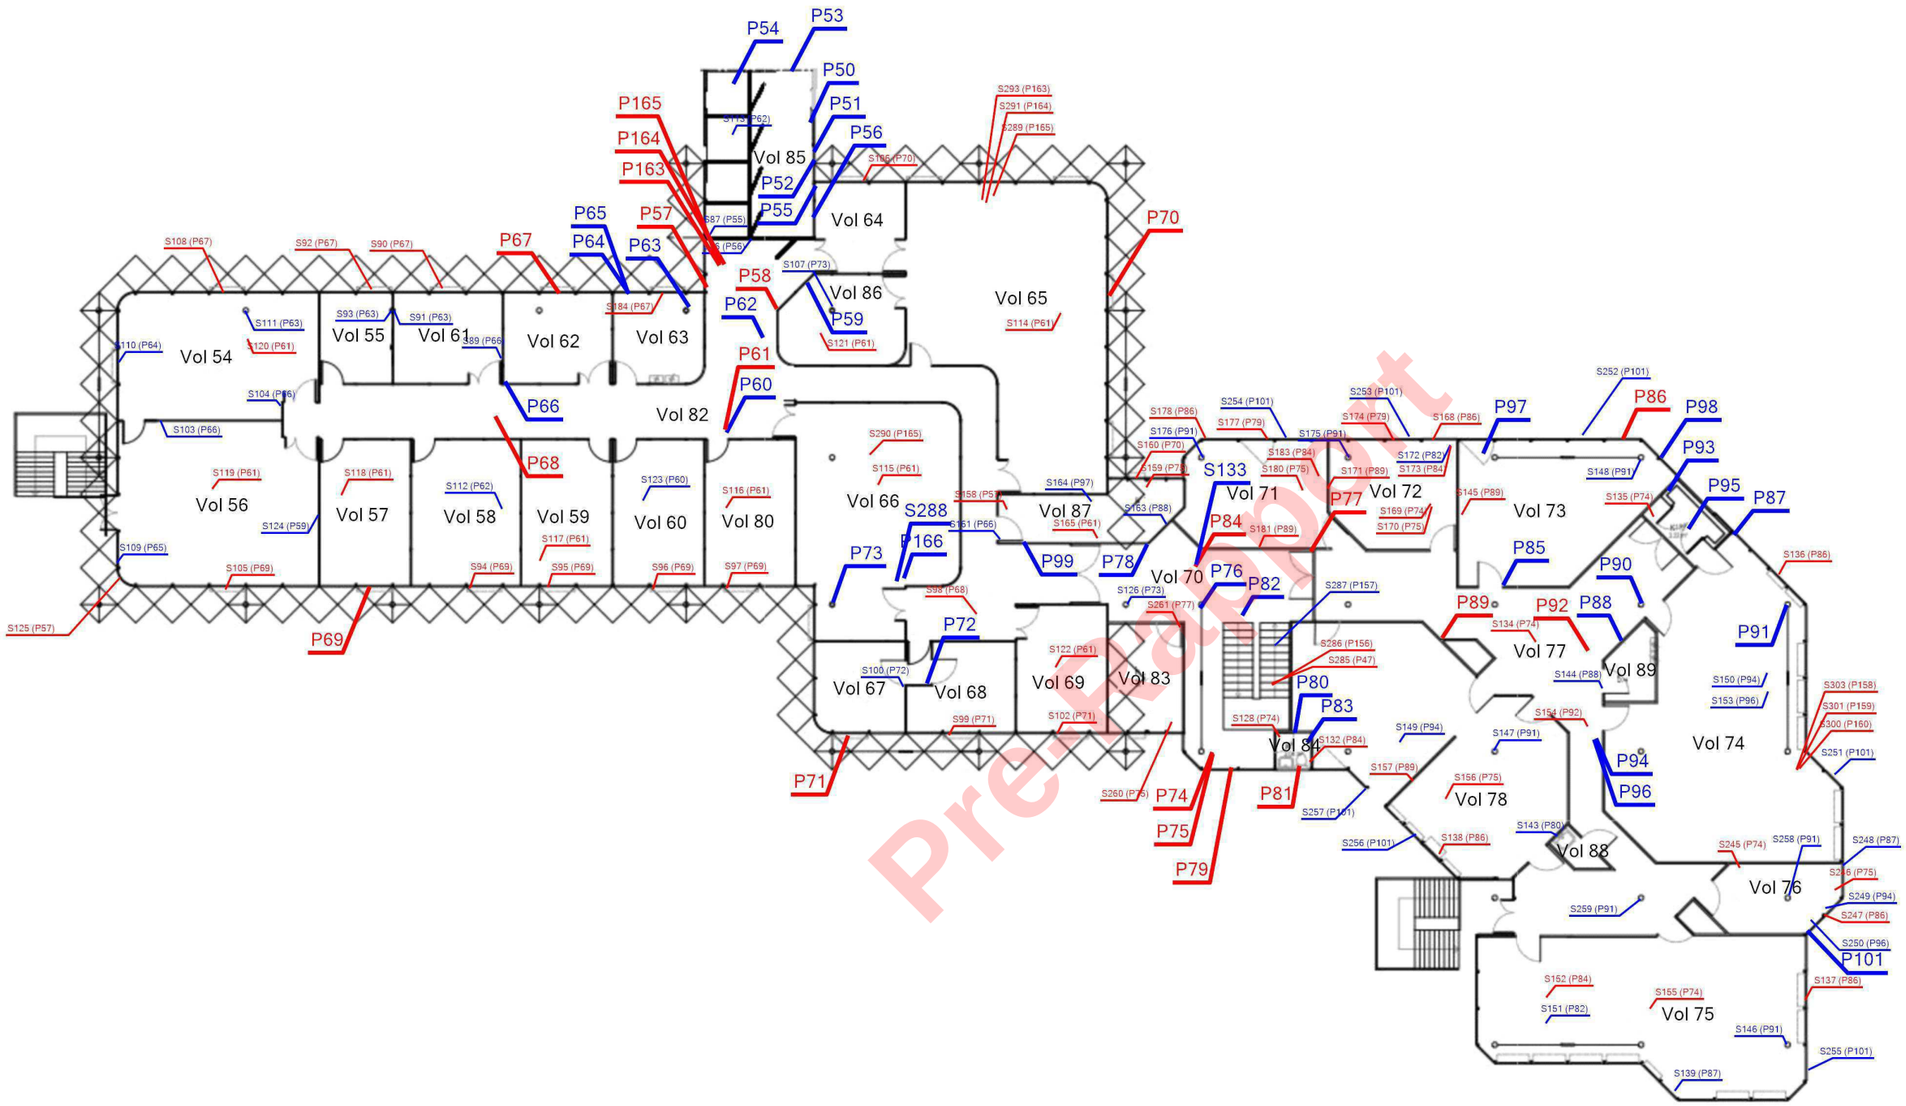

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Pré-Rapport

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002BM002401-4

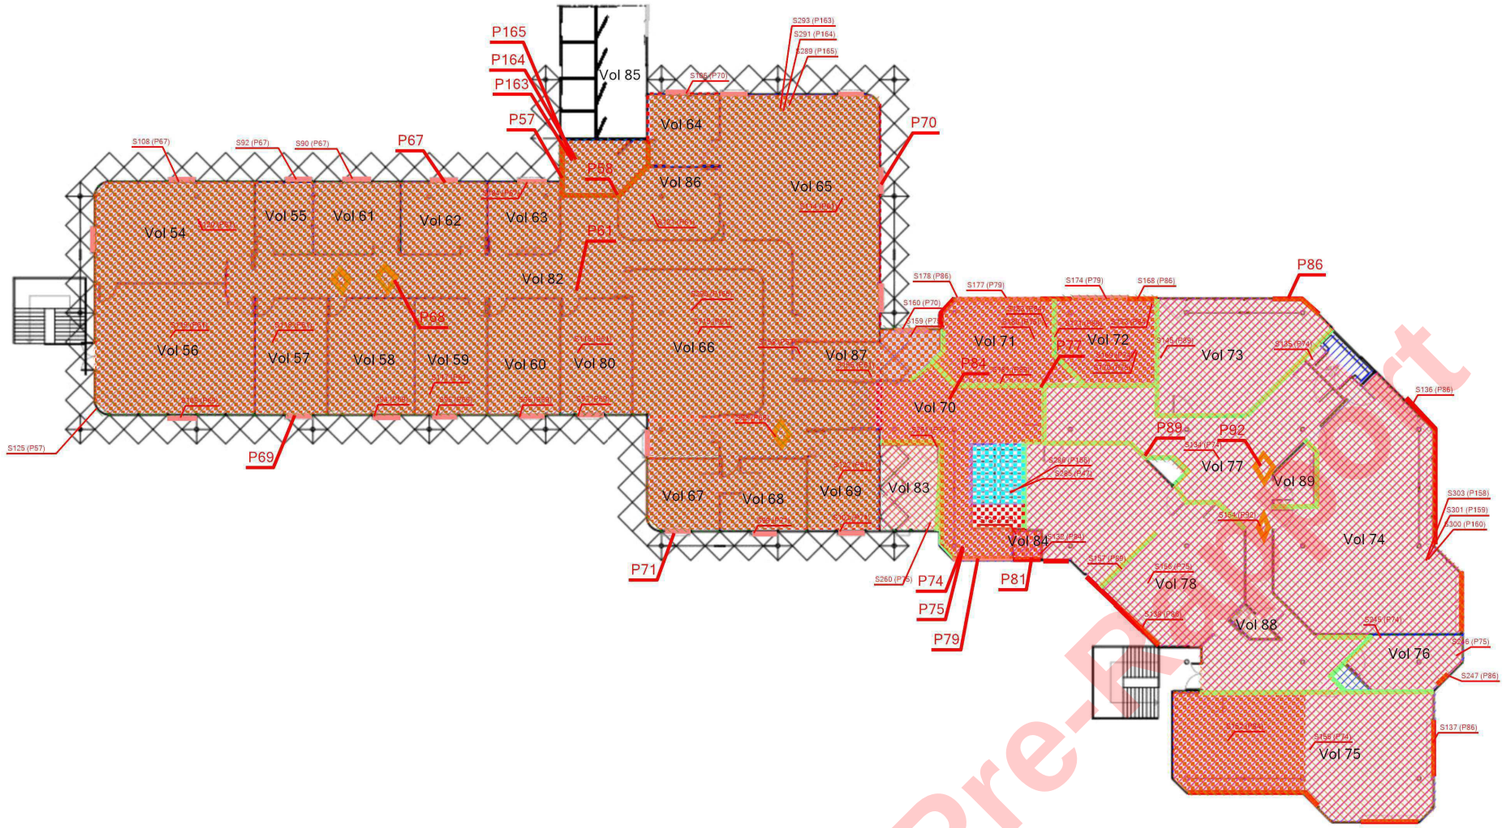

Légende

	P160 : Ragréage		P81 : Plaques planes en fibres-ciment
	P156 : Nez de marche		P61 : Panneaux et plaques
	P79 : Mastic vitrier		P92 : Enduits plâtre
	P70 : Mastic vitrier		P75 : Revêtement Dur Rouge, Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris
	P71 : Mastic vitrier		P57 : Dalles plastiques
	P165 : Ragréage		P159 : Colle bitumeuse
	P84 : Panneaux et plaques		P158 : Dalle dure cassante rouge
	P67 : Mastic vitrier		P74 : Dalles plastiques
	P68 : Enduits plâtre		P58 : Plaques planes en fibres-ciment
	P47 : Joint gris		P163 : Dalle dure cassante marron, Colle bitumineuse noire
	P89 : Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige, Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Bla		P69 : Mastic vitrier
	P89 : Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige, Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Bla		P86 : Plaques planes en fibres-ciment
			P77 : Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige


Pre-Rapport

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002BM002401-4

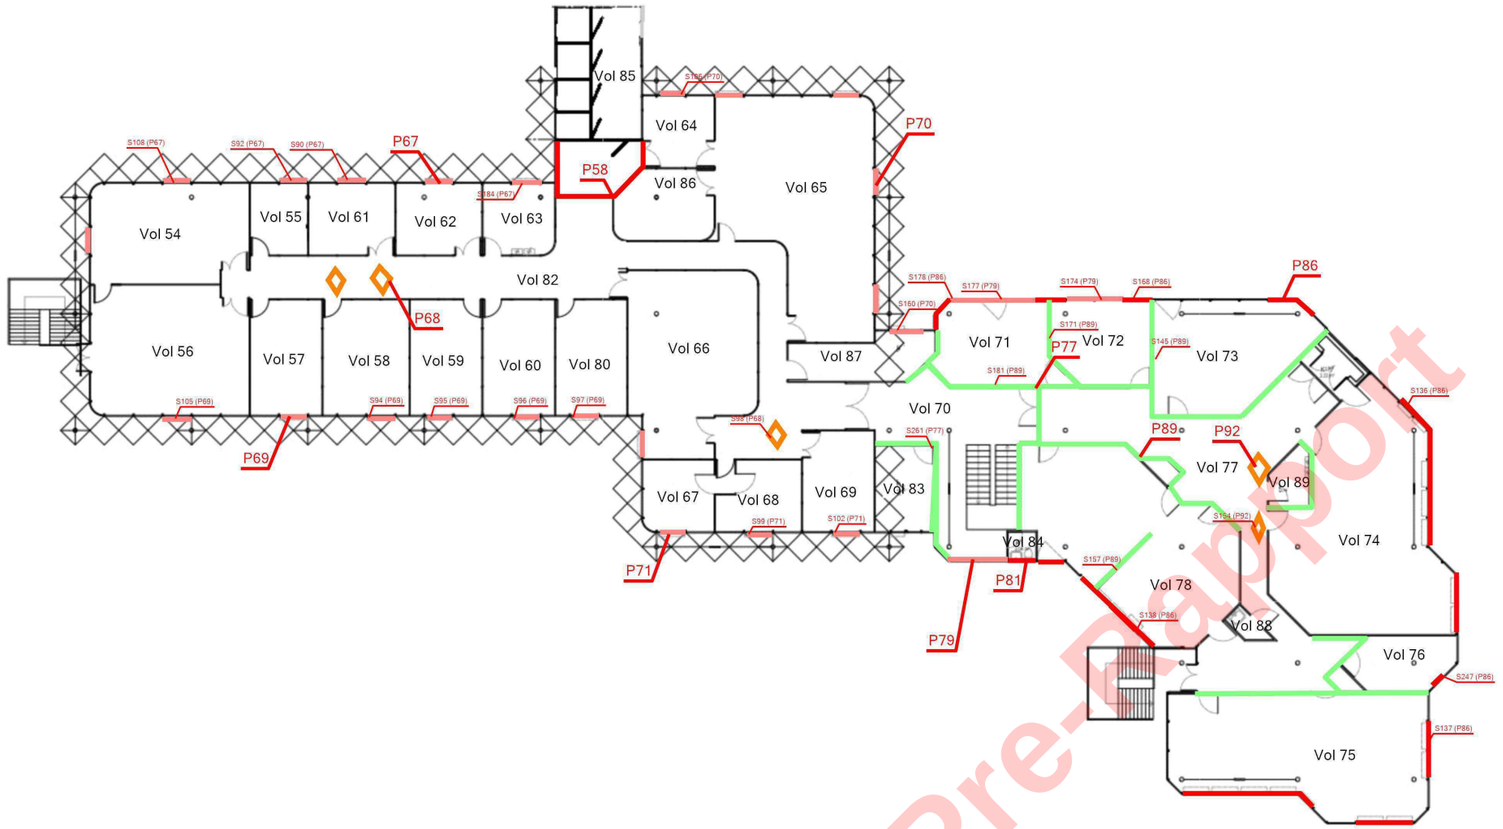

Pre-Rapport

Légende


			P81 : Plaques planes en fibres-ciment
			P92 : Enduits plâtre
			P58 : Plaques planes en fibres-ciment
			P69 : Mastic vitrier
			P86 : Plaques planes en fibres-ciment
			P77 : Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige
			P79 : Mastic vitrier
			P70 : Mastic vitrier
			P71 : Mastic vitrier
			P67 : Mastic vitrier
			P68 : Enduits plâtre
			P89 : Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige, Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Bla
			P89 : Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige, Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Bla

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 1 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002BM002401-4

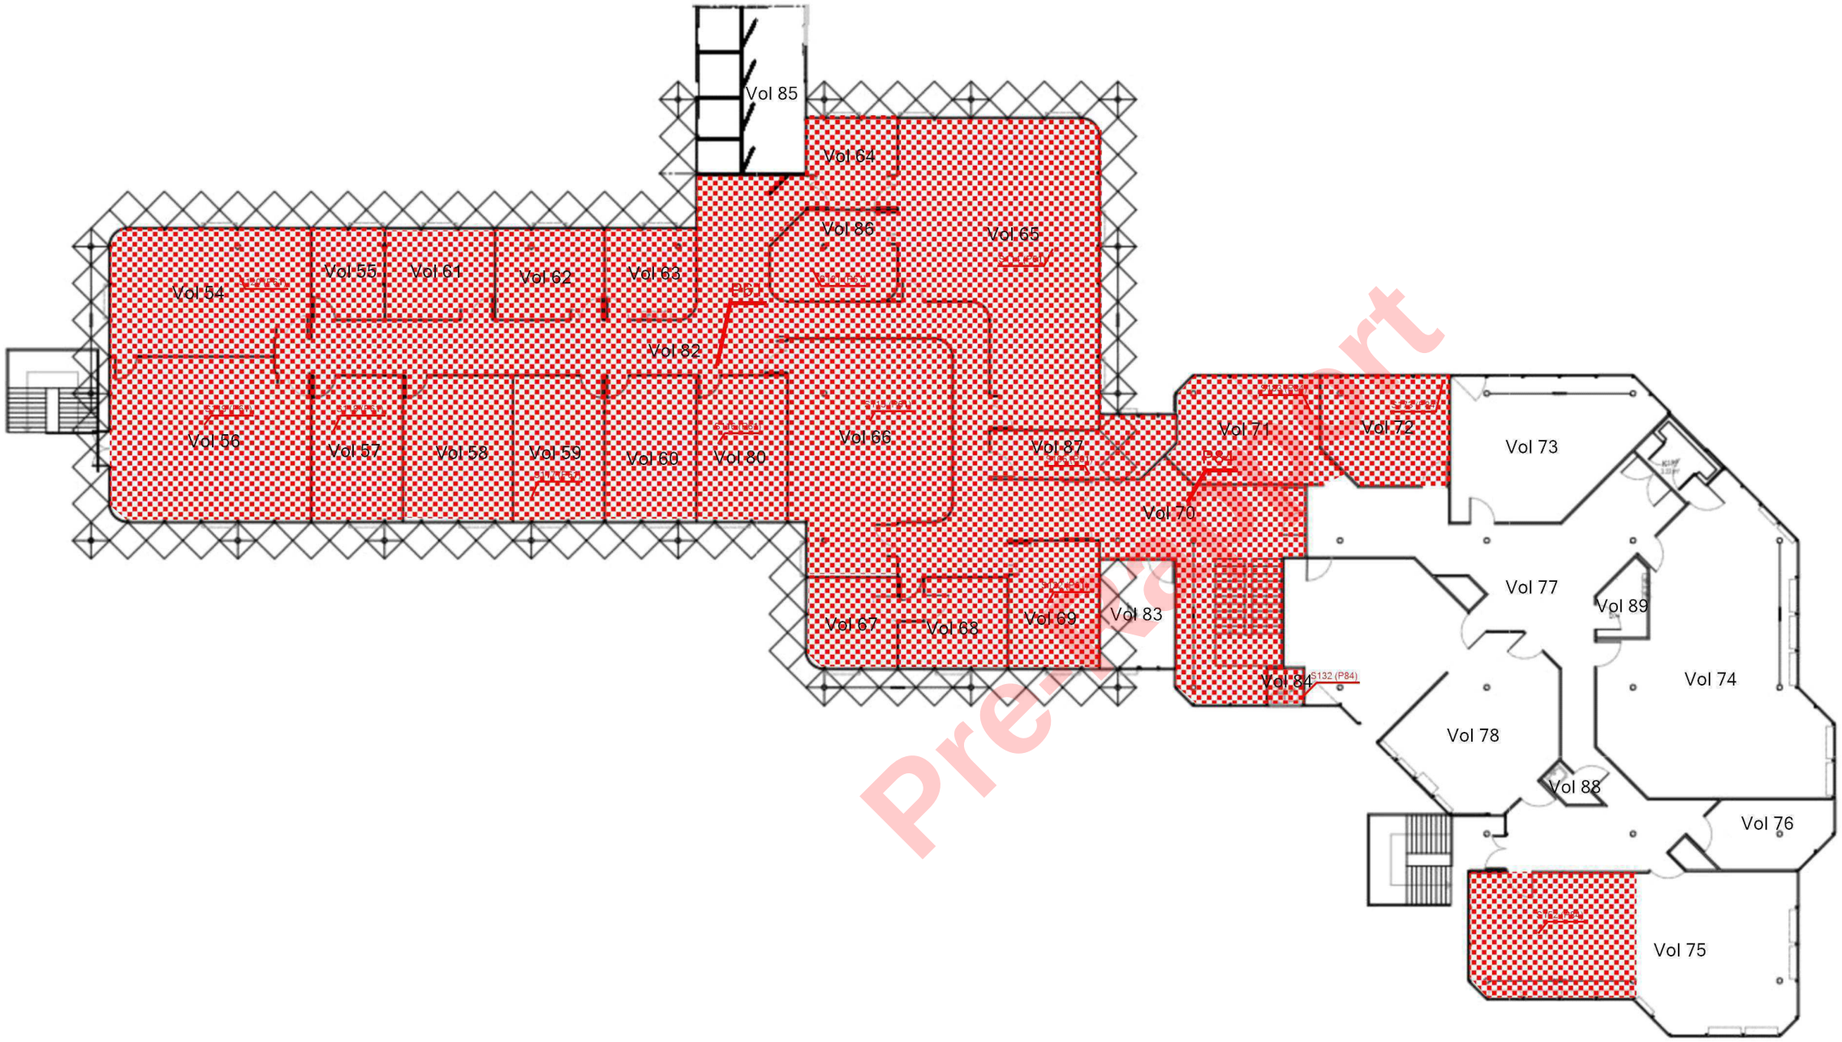

Légende


	P61 : Panneaux et plaques
	P84 : Panneaux et plaques

Pre-rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002BM002401-4

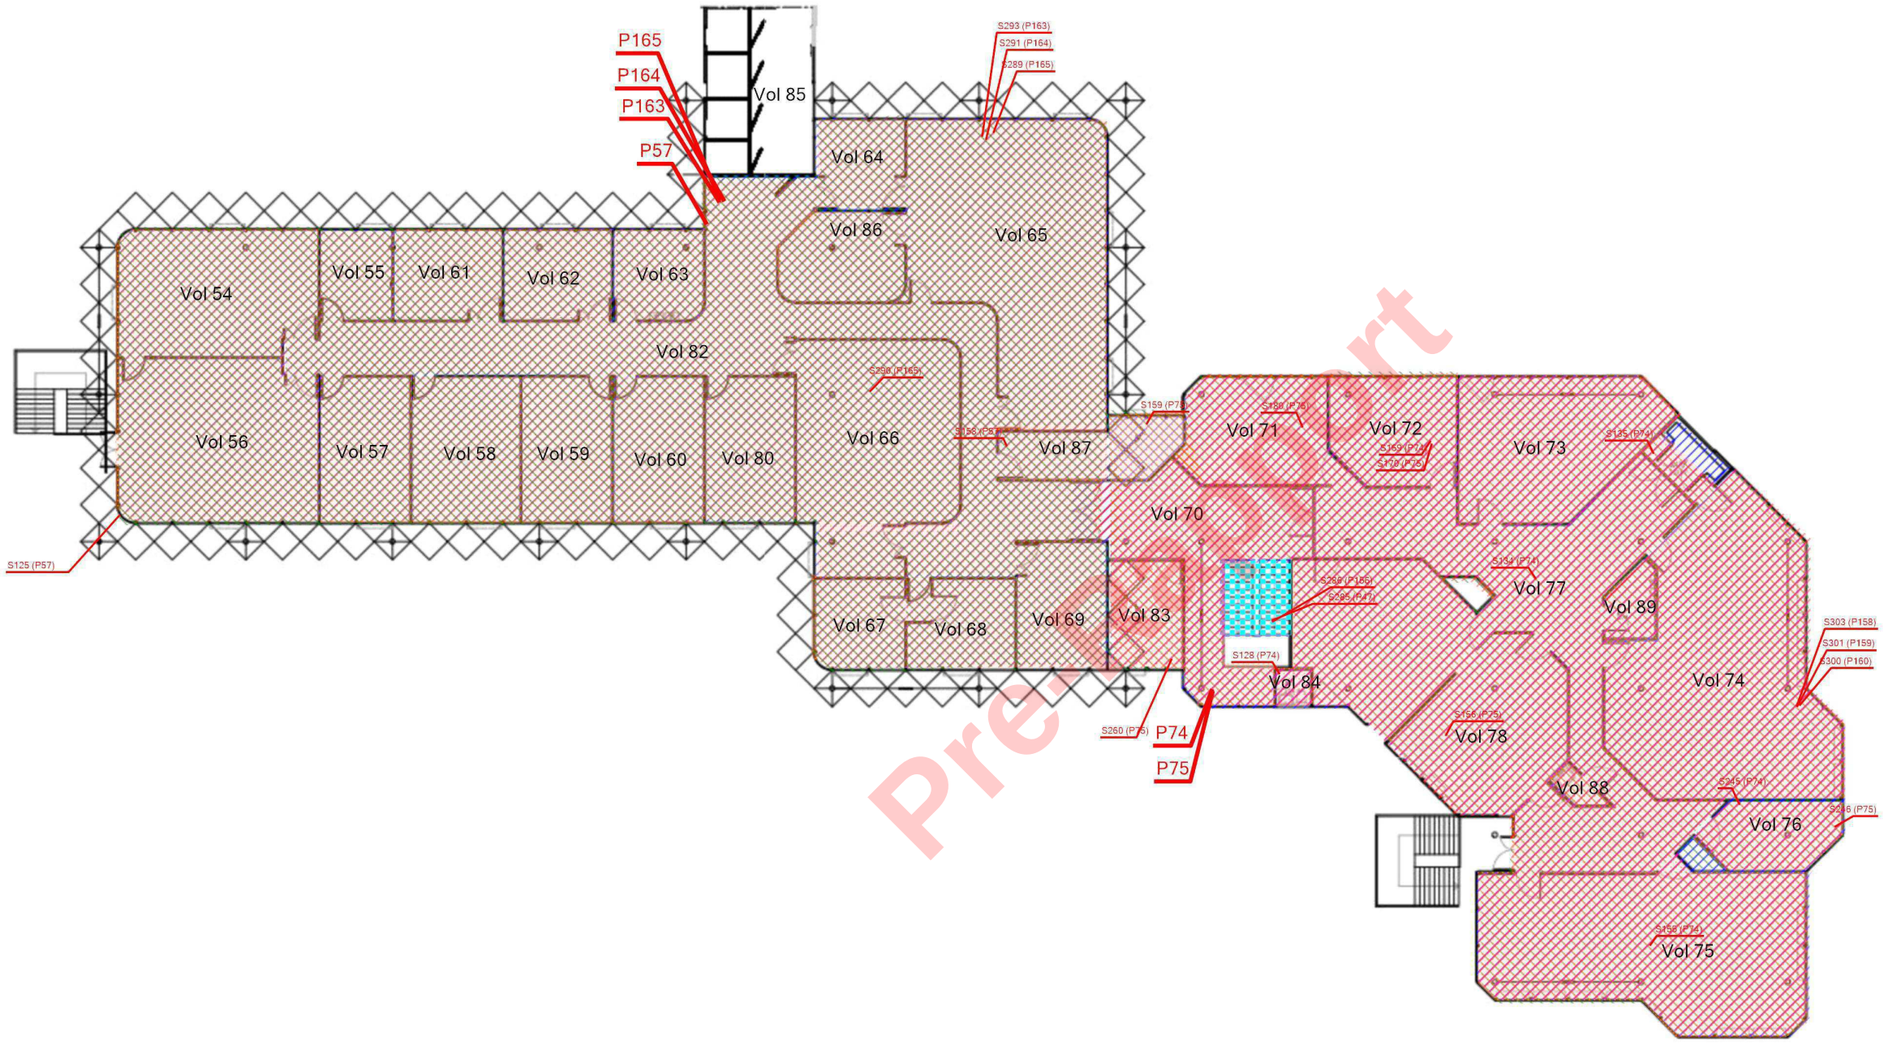

Pré-rapport


Légende

	P75 : Revêtement Dur Rouge, Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris
	P57 : Dalles plastiques
	P159 : Colle bitumeuse
	P158 : Dalle dure cassante rouge
	P74 : Dalles plastiques
	P163 : Dalle dure cassante marron, Colle bitumineuse noire
	P160 : Ragréage
	P156 : Nez de marche
	P165 : Ragréage
	P47 : Joint gris
	P164 : Colle bitumeuse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 1 - MPCA DALLES DE SOL

Référence:
002BM002401-4

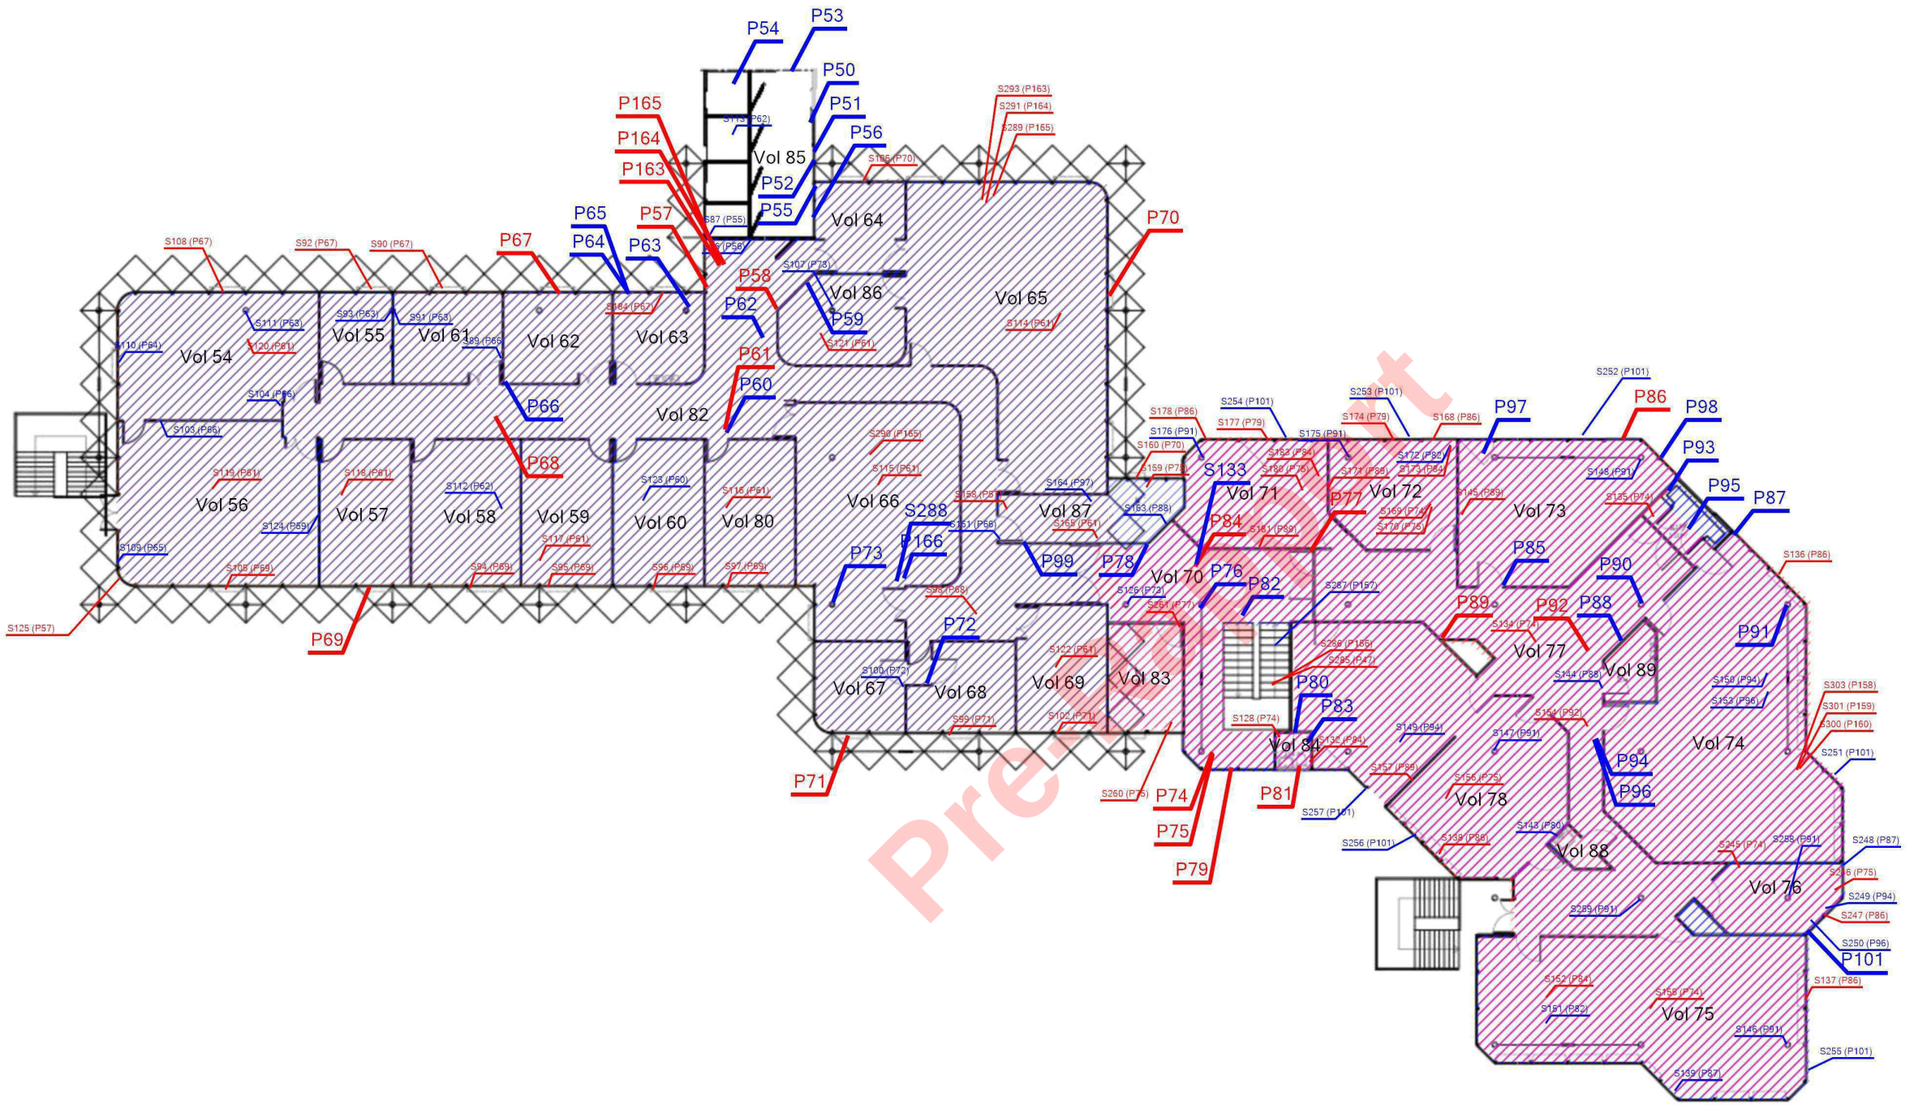

Pre-rapport


Légende

	P75 : Revêtement Dur Rouge, Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris
	P57 : Dalles plastiques
	P158 : Dalle dure cassante rouge
	P74 : Dalles plastiques
	P163 : Dalle dure cassante marron, Colle bitumineuse noire

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 1 - MPCA COLLE BITUMINEUSE

Référence:
002BM002401-4

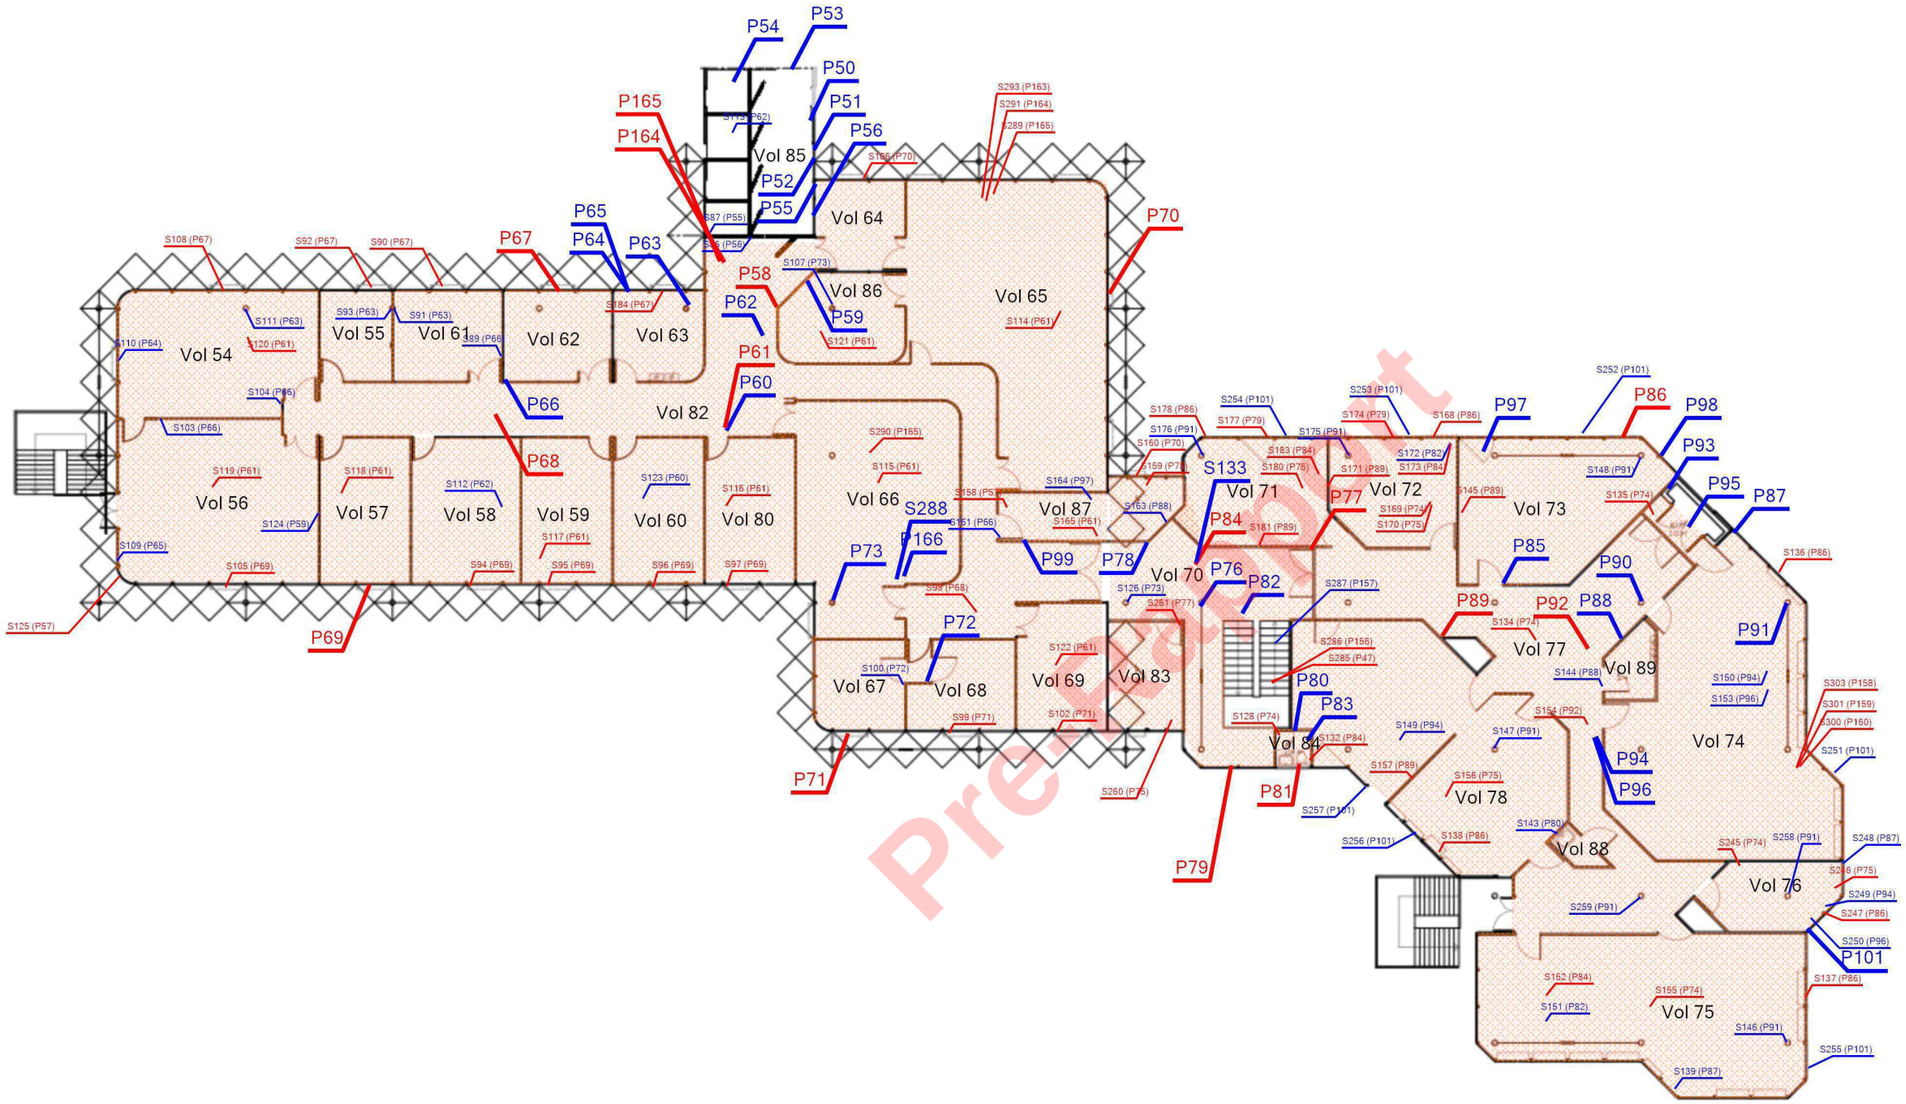


Légende

	P159 : Colle bitumeuse
	P164 : Colle bitumeuse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

NIVEAU 1 - MPCA RAGRÉAGES

Référence:
002BM002401-4

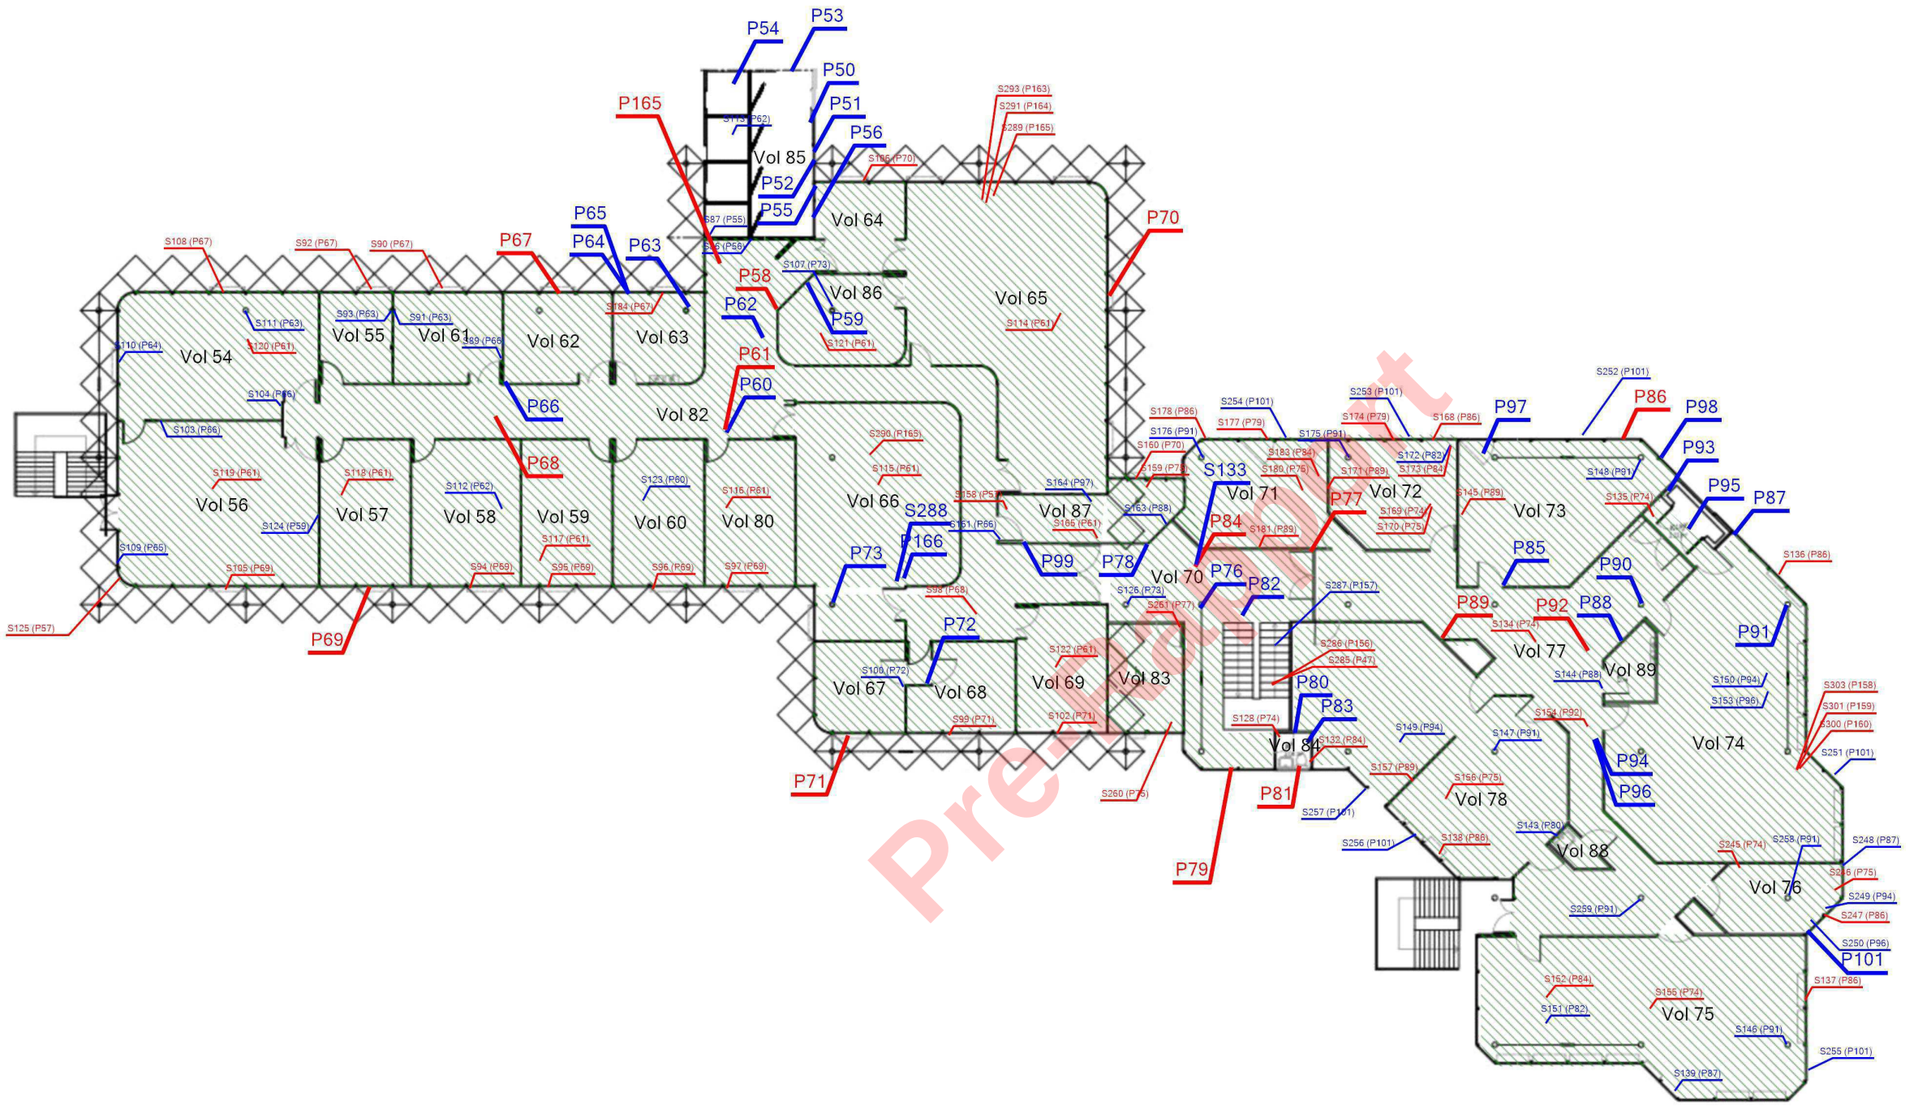

Légende


	P160 : Ragréage
	P165 : Ragréage

Pre-rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002BM002401-4

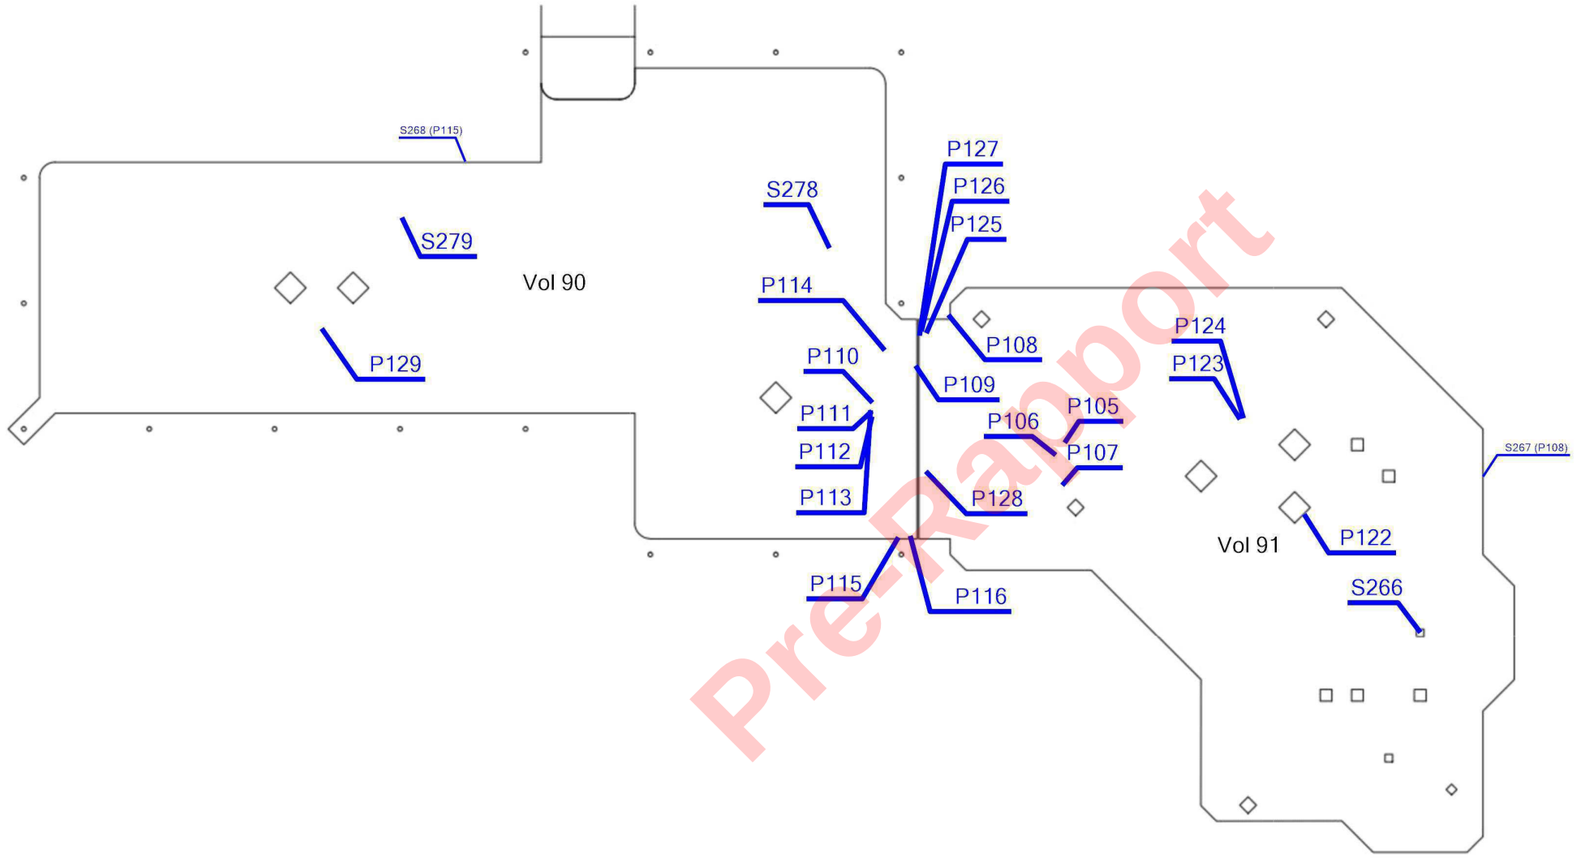

Pré-Rapport

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002BM002401-4




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

FAÇADES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002BM002401-4

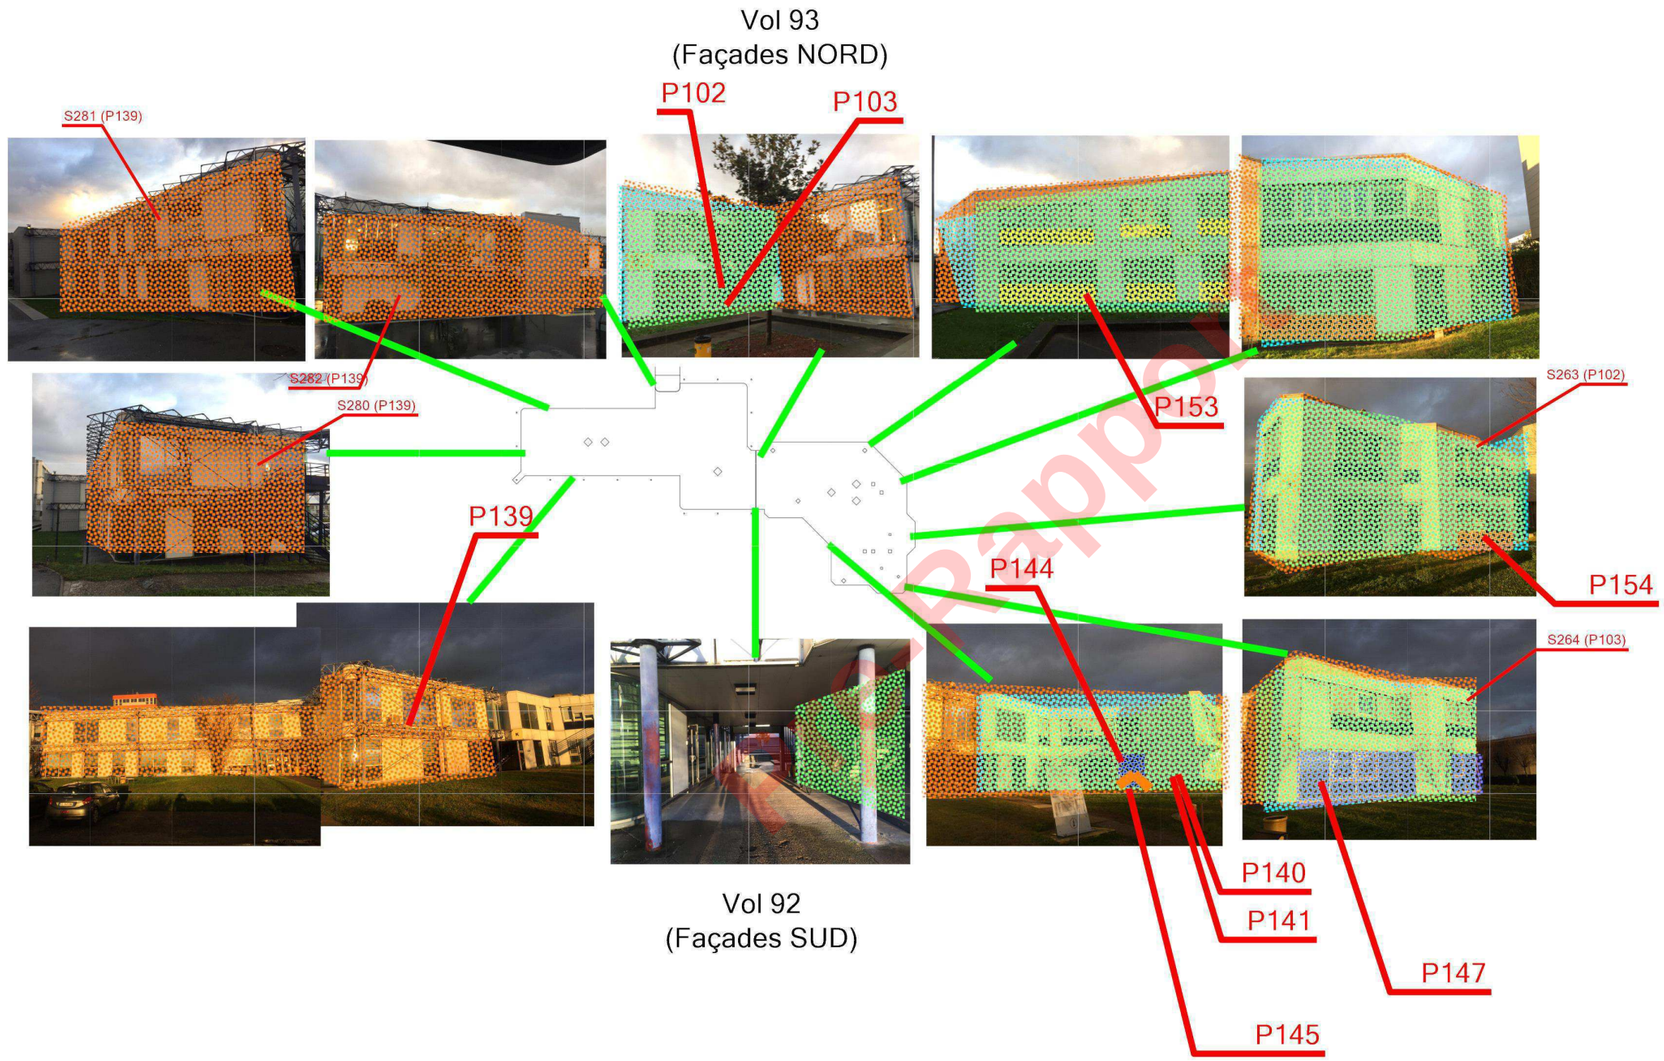


Légende

	P144 : Joints détanchéïté
	P145 : Joints détanchéïté
	P154 : Mastic vitrier
	P141 : Joints détanchéïté
	P147 : Joints détanchéïté
	P103 : Plaques fibres
	P139 : Plaques
	P102 : Joint entre élement
	P140 : Joints détanchéïté
	P153 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

FAÇADES - MPCA FAÇADES

Référence:
002BM002401-4

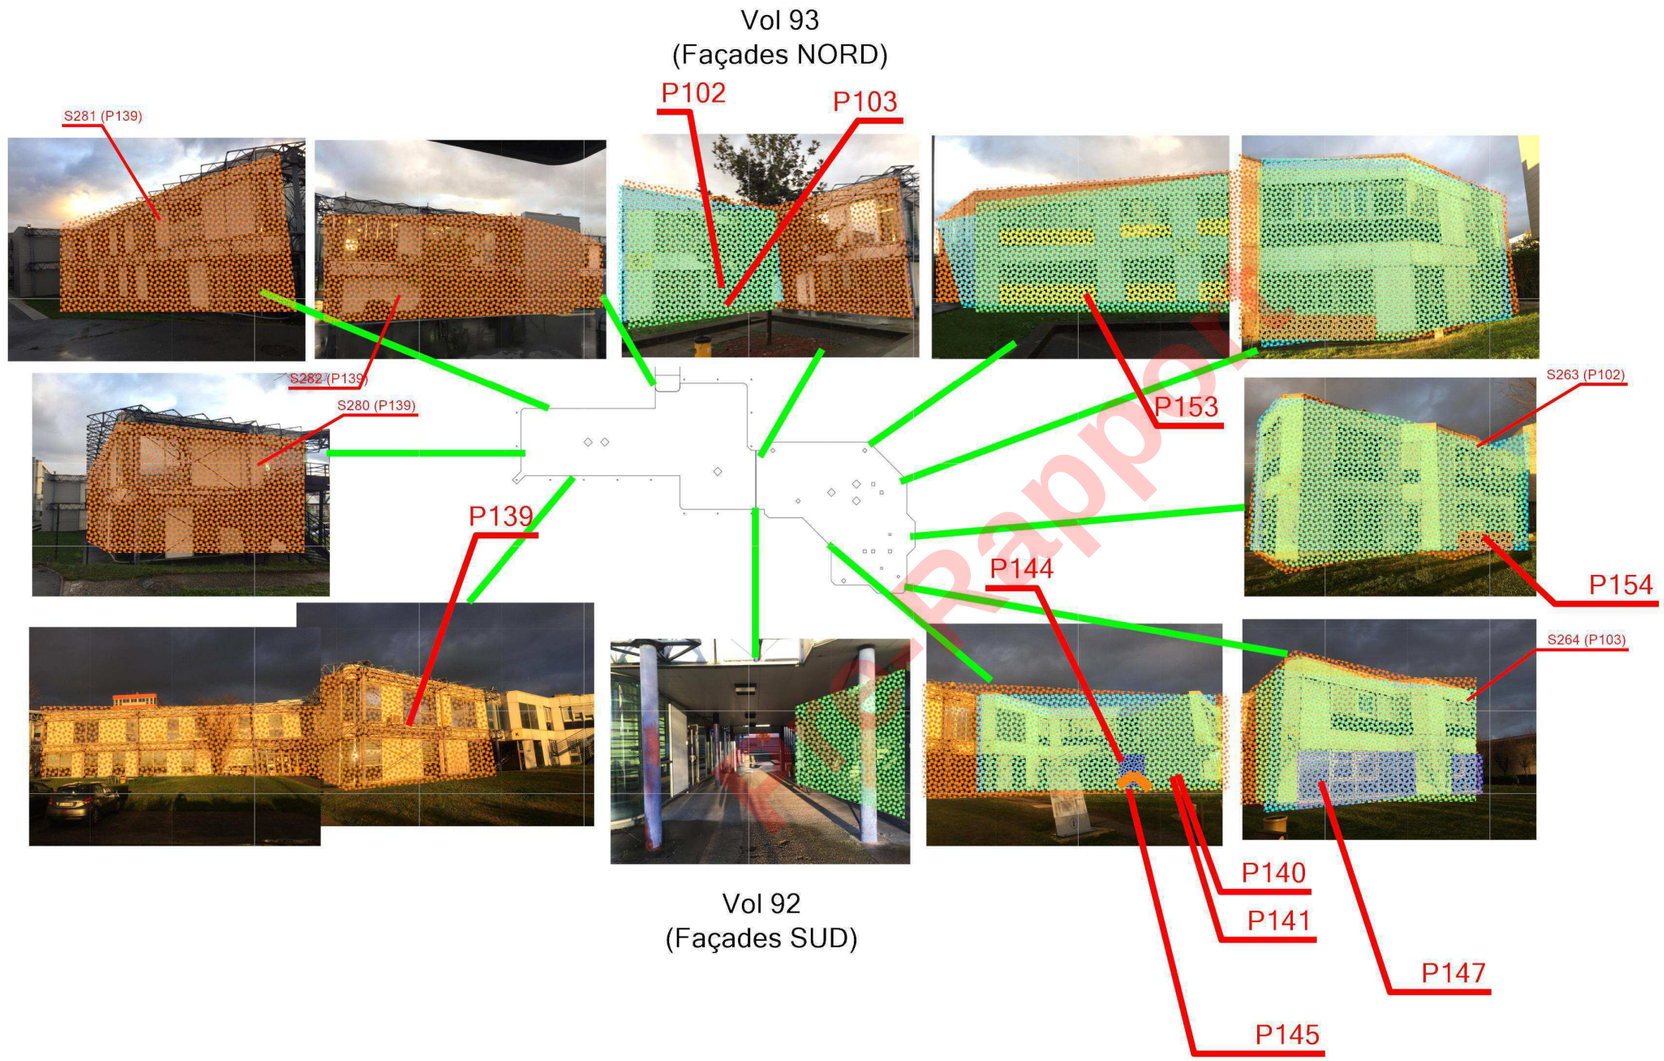

Légende

	P144 : Joints détanchéïté
	P145 : Joints détanchéïté
	P154 : Mastic vitrier
	P141 : Joints détanchéïté
	P147 : Joints détanchéïté
	P103 : Plaques fibres
	P139 : Plaques
	P102 : Joint entre élement
	P140 : Joints détanchéïté
	P153 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	Campus porte des Alpes - Bâtiment K	19/02/2026	SABRE Mathieu

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002BM002401-1 n°102 - 1 (P102)	Façades - Vol 93 (Façades NORD)	Prélevement positif
002BM002401-1 n°103 - 1 (P103)	Façades - Vol 93 (Façades NORD)	Prélevement positif
002BM002401-1 n°104 - 1 (P104)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°131 - 1 (P131)	Façades - Vol 93 (Façades NORD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°132 - 1 (P132)	Façades - Vol 93 (Façades NORD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°133 - 1 (P133)	Façades - Vol 93 (Façades NORD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°134 - 1 (P134)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°135 - 1 (P135)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°136 - 1 (P136)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°137 - 1 (P137)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°138 - 1 (P138)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°139 - 1 (P139)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement positif
002BM002401-4 n°140 - 1 (P140)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement positif
002BM002401-4 n°141 - 1 (P141)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement positif
002BM002401-4 n°142 - 1 (P142)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°143 - 1 (P143)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°144 - 1 (P144)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement positif
002BM002401-4 n°145 - 1 (P145)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement positif
002BM002401-4 n°146 - 1 (P146)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°147 - 1 (P147)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement positif
002BM002401-4 n°151 - 1 (P151)	Façades - Vol 93 (Façades NORD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°152 - 1 (P152)	Façades - Vol 93 (Façades NORD)	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°153 - 1 (P153)	Façades - Vol 93 (Façades NORD)	Prélevement positif
002BM002401-4 n°154 - 1 (P154)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Prélevement positif
S262 - 1 (S262)	Façades - Vol 93 (Façades NORD)	Absence : pas d'amiante par nature
S283 - 1 (S283)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Absence : pas d'amiante par nature
S284 - 1 (S284)	Façades - Vol 92 (Façades SUD)	Absence : pas d'amiante par nature

Pré-Rapport

002BM002401 n°1 - 1 (P1)	Niveau 0 - Vol 1	Prélevement négatif
002BM002401 n°2 - 1 (P2)	Niveau 0 - Vol 1	Prélevement positif
002BM002401 n°3 - 1 (P3)	Niveau 0 - Vol 1	Prélevement négatif
002BM002401 n°4 - 1 (P4)	Niveau 0 - Vol 20	Prélevement négatif
002BM002401 n°5 - 1 (P5)	Niveau 0 - Vol 1	Prélevement négatif
002BM002401 n°6 - 1 (P6)	Niveau 0 - Vol 1	Prélevement négatif
002BM002401 n°7 - 1 (P7)	Niveau 0 - Vol 19	Prélevement négatif
002BM002401 n°8 - 1 (P8)	Niveau 0 - Vol 19	Prélevement négatif
002BM002401 n°9 - 1 (P9)	Niveau 0 - Vol 19	Prélevement négatif
002BM002401 n°10 - 1 (P10)	Niveau 0 - Vol 19	Prélevement négatif
002BM002401 n°11 - 1 (P11)	Niveau 0 - Vol 19	Prélevement négatif
002BM002401 n°12 - 1 (P12)	Niveau 0 - Vol 19	Prélevement négatif
002BM002401 n°13 - 1 (P13)	Niveau 0 - Vol 1	Prélevement négatif
002BM002401 n°14 - 1 (P14)	Niveau 0 - Vol 1	Prélevement négatif
002BM002401 n°15 - 1 (P15)	Niveau 0 - Vol 18	Prélevement positif
002BM002401 n°16 - 1 (P16)	Niveau 0 - Vol 18	Prélevement négatif
002BM002401 n°17 - 1 (P17)	Niveau 0 - Vol 18	Prélevement positif
002BM002401 n°18 - 1 (P18)	Niveau 0 - Vol 6	Prélevement négatif
002BM002401 n°19 - 1 (P19)	Niveau 0 - Vol 6	Prélevement négatif
002BM002401 n°20 - 1 (P20)	Niveau 0 - Vol 6	Prélevement négatif
002BM002401 n°21 - 1 (P21)	Niveau 0 - Vol 11	Prélevement négatif
002BM002401 n°22 - 1 (P22)	Niveau 0 - Vol 15	Prélevement positif
002BM002401 n°23 - 1 (P23)	Niveau 0 - Vol 5	Prélevement positif
002BM002401 n°24 - 1 (P24)	Niveau 0 - Vol 35	Prélevement négatif
002BM002401 n°25 - 1 (P25)	Niveau 0 - Vol 35	Prélevement positif
002BM002401 n°26 - 1 (P26)	Niveau 0 - Vol 35	Prélevement négatif
002BM002401 n°27 - 1 (P27)	Niveau 0 - Vol 34	Prélevement positif
002BM002401 n°28 - 1 (P28)	Niveau 0 - Vol 33	Prélevement négatif
002BM002401 n°29 - 1 (P29)	Niveau 0 - Vol 31	Prélevement positif
002BM002401 n°30 - 1 (P30)	Niveau 0 - Vol 24	Prélevement positif
002BM002401 n°31 - 1 (P31)	Niveau 0 - Vol 32	Prélevement négatif
002BM002401 n°32 - 1 (P32)	Niveau 0 - Vol 42	Prélevement positif
002BM002401 n°33 - 1 (P33)	Niveau 0 - Vol 41	Prélevement positif
002BM002401 n°34 - 1 (P34)	Niveau 0 - Vol 39	Prélevement positif
002BM002401 n°35 - 1 (P35)	Niveau 0 - Vol 42	Prélevement négatif
002BM002401 n°36 - 1 (P36)	Niveau 0 - Vol 39	Prélevement positif
002BM002401 n°37 - 1 (P37)	Niveau 0 - Vol 42	Prélevement négatif
002BM002401 n°38 - 1 (P38)	Niveau 0 - Vol 42	Prélevement négatif
002BM002401 n°39 - 1 (P39)	Niveau 0 - Vol 42	Prélevement négatif
002BM002401 n°40 - 1 (P40)	Niveau 0 - Vol 41	Prélevement négatif
002BM002401 n°41 - 1 (P41)	Niveau 0 - Vol 44	Prélevement négatif
002BM002401 n°42 - 1 (P42)	Niveau 0 - Vol 39	Prélevement négatif
002BM002401 n°43 - 1 (P43)	Niveau 0 - Vol 42	Prélevement négatif
002BM002401 n°44 - 1 (P44)	Niveau 0 - Vol 44	Prélevement positif
002BM002401 n°45 - 1 (P45)	Niveau 0 - Vol 39	Prélevement négatif
002BM002401 n°46 - 1 (P46)	Niveau 0 - Vol 41	Prélevement négatif
002BM002401 n°47 - 1 (P47)	Niveau 0 - Vol 53	Prélevement positif
002BM002401 n°48 - 1 (P48)	Niveau 0 - Vol 53	Prélevement négatif
002BM002401 n°49 - 1 (P49)	Niveau 0 - Vol 53	Prélevement positif
002BM002401-1 n°100 - 2 (P100)	Niveau 0 - Vol 38	Prélevement négatif
002BM002401-3 n°117 - 1 (P117)	Niveau 0 - Vol 42	Prélevement négatif
002BM002401-3 n°118 - 1 (P118)	Niveau 0 - Vol 42	Prélevement négatif
002BM002401-3 n°119 - 1 (P119)	Niveau 0 - Vol 41	Prélevement négatif
002BM002401-3 n°120 - 1 (P120)	Niveau 0 - Vol 41	Prélevement négatif
002BM002401-3 n°121 - 1 (P121)	Niveau 0 - Vol 35	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°148 - 1 (P148)	Niveau 0 - Vol 52	Prélevement positif

Pré-Rapport

002BM002401-4 n°149 - 1 (P149)	Niveau 0 - Vol 53	Prélevement positif
002BM002401-4 n°150 - 1 (P150)	Niveau 0 - Vol 53	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°155 - 1 (P155)	Niveau 0 - Vol 53	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°156 - 1 (P156)	Niveau 0 - Vol 53	Prélevement positif
002BM002401-4 n°157 - 1 (P157)	Niveau 0 - Vol 53	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°158 - 1 (P158)	Niveau 0 - Vol 39	Prélevement positif
002BM002401-4 n°159 - 1 (P159)	Niveau 0 - Vol 39	Prélevement positif
002BM002401-4 n°160 - 1 (P160)	Niveau 0 - Vol 39	Prélevement positif
002BM002401-4 n°161 - 1 (P161)	Niveau 0 - Vol 41	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°162 - 1 (P162)	Niveau 0 - Vol 39	Prélevement négatif
S6 - 1 (S6)	Niveau 0 - Vol 19	Absence sur présentation de documents
S38 - 1 (S38)	Niveau 0 - Vol 13	Absence : pas d'amiante par nature
S269 - 1 (S269)	Niveau 0 - Vol 49	Absence : pas d'amiante par nature
S276 - 2 (S276)	Niveau 0 - Vol 33	Absence : pas d'amiante par nature
002BM002401 n°50 - 1 (P50)	Niveau 1 - Vol 85	Prélevement négatif
002BM002401 n°51 - 1 (P51)	Niveau 1 - Vol 85	Prélevement négatif
002BM002401 n°52 - 1 (P52)	Niveau 1 - Vol 85	Prélevement négatif
002BM002401 n°53 - 1 (P53)	Niveau 1 - Vol 85	Prélevement négatif
002BM002401 n°54 - 1 (P54)	Niveau 1 - Vol 85	Prélevement négatif
002BM002401 n°55 - 1 (P55)	Niveau 1 - Vol 85	Prélevement négatif
002BM002401 n°56 - 1 (P56)	Niveau 1 - Vol 85	Prélevement négatif
002BM002401 n°57 - 1 (P57)	Niveau 1 - Vol 82	Prélevement positif
002BM002401 n°58 - 1 (P58)	Niveau 1 - Vol 82	Prélevement positif
002BM002401 n°59 - 1 (P59)	Niveau 1 - Vol 82	Prélevement négatif
002BM002401 n°60 - 4 (P60)	Niveau 1 - Vol 82	Prélevement négatif
002BM002401 n°61 - 1 (P61)	Niveau 1 - Vol 82	Prélevement positif
002BM002401 n°62 - 2 (P62)	Niveau 1 - Vol 82	Prélevement négatif
002BM002401 n°63 - 1 (P63)	Niveau 1 - Vol 63	Prélevement négatif
002BM002401 n°64 - 1 (P64)	Niveau 1 - Vol 63	Prélevement négatif
002BM002401 n°65 - 1 (P65)	Niveau 1 - Vol 63	Prélevement négatif
002BM002401 n°66 - 1 (P66)	Niveau 1 - Vol 62	Prélevement négatif
002BM002401 n°67 - 1 (P67)	Niveau 1 - Vol 62	Prélevement positif
002BM002401 n°68 - 1 (P68)	Niveau 1 - Vol 82	Prélevement positif
002BM002401 n°69 - 1 (P69)	Niveau 1 - Vol 57	Prélevement positif
002BM002401 n°70 - 1 (P70)	Niveau 1 - Vol 65	Prélevement positif
002BM002401 n°71 - 1 (P71)	Niveau 1 - Vol 67	Prélevement positif
002BM002401 n°72 - 1 (P72)	Niveau 1 - Vol 68	Prélevement négatif
002BM002401 n°73 - 1 (P73)	Niveau 1 - Vol 66	Prélevement négatif
002BM002401 n°74 - 1 (P74)	Niveau 1 - Vol 70	Prélevement positif
002BM002401 n°75 - 1 (P75)	Niveau 1 - Vol 70	Prélevement positif
002BM002401 n°76 - 1 (P76)	Niveau 1 - Vol 70	Prélevement négatif
002BM002401 n°77 - 1 (P77)	Niveau 1 - Vol 70	Prélevement positif
002BM002401 n°78 - 1 (P78)	Niveau 1 - Vol 70	Prélevement négatif
002BM002401 n°79 - 1 (P79)	Niveau 1 - Vol 70	Prélevement positif
002BM002401 n°80 - 1 (P80)	Niveau 1 - Vol 84	Prélevement négatif
002BM002401 n°81 - 1 (P81)	Niveau 1 - Vol 84	Prélevement positif
002BM002401 n°82 - 1 (P82)	Niveau 1 - Vol 70	Prélevement négatif
002BM002401 n°83 - 1 (P83)	Niveau 1 - Vol 84	Prélevement négatif
002BM002401 n°84 - 1 (P84)	Niveau 1 - Vol 70	Prélevement positif
002BM002401 n°85 - 1 (P85)	Niveau 1 - Vol 73	Prélevement négatif
002BM002401 n°86 - 1 (P86)	Niveau 1 - Vol 73	Prélevement positif
002BM002401 n°87 - 1 (P87)	Niveau 1 - Vol 74	Prélevement négatif
002BM002401 n°88 - 1 (P88)	Niveau 1 - Vol 77	Prélevement négatif
002BM002401 n°89 - 1 (P89)	Niveau 1 - Vol 77	Prélevement positif
002BM002401 n°90 - 1 (P90)	Niveau 1 - Vol 77	Prélevement négatif
002BM002401 n°91 - 1 (P91)	Niveau 1 - Vol 74	Prélevement négatif

Pre-Rapport

002BM002401 n°92 - 1 (P92)	Niveau 1 - Vol 77	Prélevement positif
002BM002401 n°93 - 1 (P93)	Niveau 1 - Vol 77	Prélevement négatif
002BM002401 n°94 - 1 (P94)	Niveau 1 - Vol 77	Prélevement négatif
002BM002401 n°95 - 2 (P95)	Niveau 1 - Vol 77	Prélevement négatif
002BM002401 n°96 - 1 (P96)	Niveau 1 - Vol 77	Prélevement négatif
002BM002401 n°97 - 1 (P97)	Niveau 1 - Vol 73	Prélevement négatif
002BM002401 n°98 - 1 (P98)	Niveau 1 - Vol 73	Prélevement négatif
002BM002401 n°99 - 1 (P99)	Niveau 1 - Vol 87	Prélevement négatif
002BM002401-1 n°101 - 1 (P101)	Niveau 1 - Vol 76	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°163 - 1 (P163)	Niveau 1 - Vol 82	Prélevement positif
002BM002401-4 n°164 - 1 (P164)	Niveau 1 - Vol 82	Prélevement positif
002BM002401-4 n°165 - 1 (P165)	Niveau 1 - Vol 82	Prélevement positif
002BM002401-4 n°166 - 1 (P166)	Niveau 1 - Vol 66	Prélevement négatif
S133 - 1 (S133)	Niveau 1 - Vol 70	Absence : pas d'amiante par nature
S288 - 1 (S288)	Niveau 1 - Vol 66	Absence : pas d'amiante par nature
002BM002401-2 n°105 - 1 (P105)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-2 n°106 - 1 (P106)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-2 n°107 - 1 (P107)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-2 n°108 - 1 (P108)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-2 n°109 - 1 (P109)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-2 n°110 - 1 (P110)	Toiture - Vol 90	Prélevement négatif
002BM002401-2 n°111 - 1 (P111)	Toiture - Vol 90	Prélevement négatif
002BM002401-2 n°112 - 1 (P112)	Toiture - Vol 90	Prélevement négatif
002BM002401-2 n°113 - 1 (P113)	Toiture - Vol 90	Prélevement négatif
002BM002401-2 n°114 - 1 (P114)	Toiture - Vol 90	Prélevement négatif
002BM002401-2 n°115 - 1 (P115)	Toiture - Vol 90	Prélevement négatif
002BM002401-2 n°116 - 1 (P116)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°122 - 1 (P122)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°122 - 2 (P122)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°123 - 1 (P123)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°124 - 1 (P124)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°125 - 1 (P125)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°126 - 1 (P126)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°127 - 1 (P127)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°128 - 1 (P128)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°128 - 2 (P128)	Toiture - Vol 91	Prélevement négatif
002BM002401-4 n°129 - 1 (P129)	Toiture - Vol 90	Prélevement négatif
S266 - 1 (S266)	Toiture - Vol 91	Absence : pas d'amiante par nature
S278 - 1 (S278)	Toiture - Vol 90	Absence : pas d'amiante par nature
S279 - 1 (S279)	Toiture - Vol 90	Absence : pas d'amiante par nature

Pré-Rapport



002BM002401 n°1 - 1 (P1) - Niveau 0 - Vol 1




002BM002401 n°2 - 1 (P2) - Niveau 0 - Vol 1



002BM002401 n°3 - 1 (P3) - Niveau 0 - Vol 1



002BM002401 n°4 - 1 (P4) - Niveau 0 - Vol 20

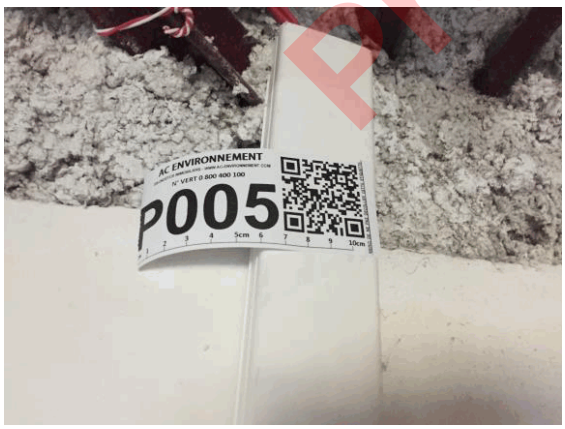

002BM002401 n°5 - 1 (P5) - Niveau 0 - Vol 1



002BM002401 n°6 - 1 (P6) - Niveau 0 - Vol 1

Pre-Rapport



002BM002401 n°7 - 1 (P7) - Niveau 0 - Vol 19



002BM002401 n°8 - 1 (P8) - Niveau 0 - Vol 19



002BM002401 n°9 - 1 (P9) - Niveau 0 - Vol 19



002BM002401 n°10 - 1 (P10) - Niveau 0 - Vol 19



002BM002401 n°11 - 1 (P11) - Niveau 0 - Vol 19



002BM002401 n°12 - 1 (P12) - Niveau 0 - Vol 19

Pre-Rapport



002BM002401 n°13 - 1 (P13) - Niveau 0 - Vol 1



002BM002401 n°14 - 1 (P14) - Niveau 0 - Vol 1



002BM002401 n°15 - 1 (P15) - Niveau 0 - Vol 18



002BM002401 n°16 - 1 (P16) - Niveau 0 - Vol 18



002BM002401 n°17 - 1 (P17) - Niveau 0 - Vol 18



002BM002401 n°18 - 1 (P18) - Niveau 0 - Vol 6

Pre-Rapport



002BM002401 n°19 - 1 (P19) - Niveau 0 - Vol 6




002BM002401 n°20 - 1 (P20) - Niveau 0 - Vol 6



002BM002401 n°21 - 1 (P21) - Niveau 0 - Vol 11



002BM002401 n°22 - 1 (P22) - Niveau 0 - Vol 15

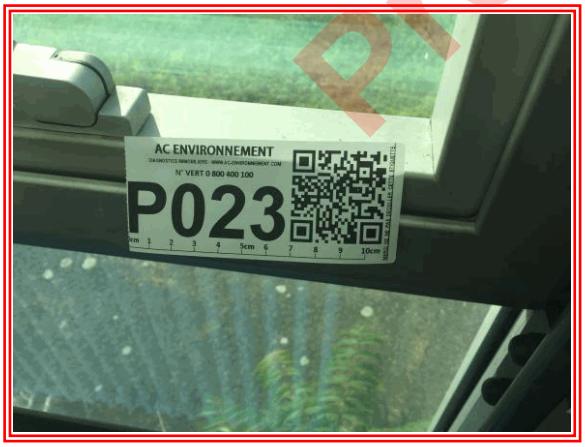

002BM002401 n°23 - 1 (P23) - Niveau 0 - Vol 5



002BM002401 n°24 - 1 (P24) - Niveau 0 - Vol 35

Pre-Rapport



002BM002401 n°25 - 1 (P25) - Niveau 0 - Vol 35



002BM002401 n°26 - 1 (P26) - Niveau 0 - Vol 35



002BM002401 n°27 - 1 (P27) - Niveau 0 - Vol 34



002BM002401 n°28 - 1 (P28) - Niveau 0 - Vol 33



002BM002401 n°29 - 1 (P29) - Niveau 0 - Vol 31



002BM002401 n°30 - 1 (P30) - Niveau 0 - Vol 24

Pré-Rapport



002BM002401 n°31 - 1 (P31) - Niveau 0 - Vol 32



002BM002401 n°32 - 1 (P32) - Niveau 0 - Vol 42



002BM002401 n°33 - 1 (P33) - Niveau 0 - Vol 41



002BM002401 n°34 - 1 (P34) - Niveau 0 - Vol 39



002BM002401 n°35 - 1 (P35) - Niveau 0 - Vol 42



002BM002401 n°36 - 1 (P36) - Niveau 0 - Vol 39

Pre-Rapport



002BM002401 n°37 - 1 (P37) - Niveau 0 - Vol 42



002BM002401 n°38 - 1 (P38) - Niveau 0 - Vol 42



002BM002401 n°39 - 1 (P39) - Niveau 0 - Vol 42



002BM002401 n°40 - 1 (P40) - Niveau 0 - Vol 41



002BM002401 n°41 - 1 (P41) - Niveau 0 - Vol 44



002BM002401 n°42 - 1 (P42) - Niveau 0 - Vol 39

Pre-Rapport



002BM002401 n°43 - 1 (P43) - Niveau 0 - Vol 42



002BM002401 n°44 - 1 (P44) - Niveau 0 - Vol 44



002BM002401 n°45 - 1 (P45) - Niveau 0 - Vol 39



002BM002401 n°46 - 1 (P46) - Niveau 0 - Vol 41



002BM002401 n°47 - 1 (P47) - Niveau 0 - Vol 53



002BM002401 n°48 - 1 (P48) - Niveau 0 - Vol 53

Pre-Rapport



002BM002401 n°49 - 1 (P49) - Niveau 0 - Vol 53



002BM002401 n°50 - 1 (P50) - Niveau 1 - Vol 85



002BM002401 n°51 - 1 (P51) - Niveau 1 - Vol 85



002BM002401 n°52 - 1 (P52) - Niveau 1 - Vol 85



002BM002401 n°53 - 1 (P53) - Niveau 1 - Vol 85



002BM002401 n°54 - 1 (P54) - Niveau 1 - Vol 85

Pre-Rapport



002BM002401 n°55 - 1 (P55) - Niveau 1 - Vol 85



002BM002401 n°56 - 1 (P56) - Niveau 1 - Vol 85



002BM002401 n°57 - 1 (P57) - Niveau 1 - Vol 82



002BM002401 n°58 - 1 (P58) - Niveau 1 - Vol 82



002BM002401 n°59 - 1 (P59) - Niveau 1 - Vol 82



002BM002401 n°60 - 4 (P60) - Niveau 1 - Vol 82

Pre-Rapport



002BM002401 n°61 - 1 (P61) - Niveau 1 - Vol 82



002BM002401 n°62 - 2 (P62) - Niveau 1 - Vol 82



002BM002401 n°63 - 1 (P63) - Niveau 1 - Vol 63



002BM002401 n°64 - 1 (P64) - Niveau 1 - Vol 63




002BM002401 n°65 - 1 (P65) - Niveau 1 - Vol 63



002BM002401 n°66 - 1 (P66) - Niveau 1 - Vol 62

Pre-Rapport

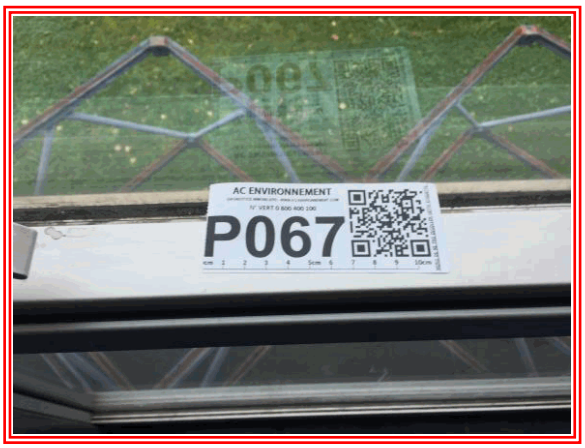

002BM002401 n°67 - 1 (P67) - Niveau 1 - Vol 62



002BM002401 n°68 - 1 (P68) - Niveau 1 - Vol 82



002BM002401 n°69 - 1 (P69) - Niveau 1 - Vol 57



002BM002401 n°70 - 1 (P70) - Niveau 1 - Vol 65



002BM002401 n°71 - 1 (P71) - Niveau 1 - Vol 67



002BM002401 n°72 - 1 (P72) - Niveau 1 - Vol 68

Pre-Rapport



002BM002401 n°73 - 1 (P73) - Niveau 1 - Vol 66




002BM002401 n°74 - 1 (P74) - Niveau 1 - Vol 70



002BM002401 n°75 - 1 (P75) - Niveau 1 - Vol 70



002BM002401 n°76 - 1 (P76) - Niveau 1 - Vol 70

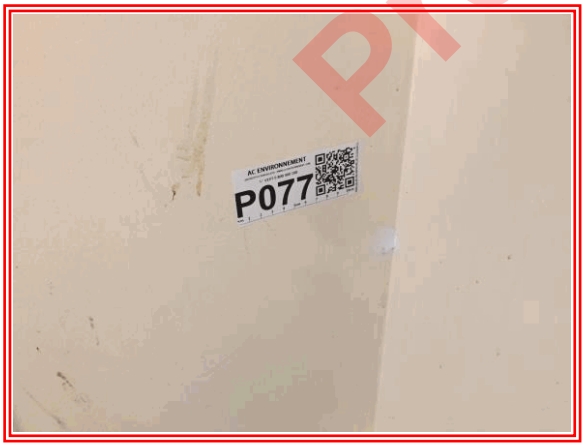

002BM002401 n°77 - 1 (P77) - Niveau 1 - Vol 70



002BM002401 n°78 - 1 (P78) - Niveau 1 - Vol 70

Pre-Rapport



002BM002401 n°79 - 1 (P79) - Niveau 1 - Vol 70



002BM002401 n°80 - 1 (P80) - Niveau 1 - Vol 84



002BM002401 n°81 - 1 (P81) - Niveau 1 - Vol 84



002BM002401 n°82 - 1 (P82) - Niveau 1 - Vol 70



002BM002401 n°83 - 1 (P83) - Niveau 1 - Vol 84



002BM002401 n°84 - 1 (P84) - Niveau 1 - Vol 70

Pre-Rapport



002BM002401 n°85 - 1 (P85) - Niveau 1 - Vol 73



002BM002401 n°86 - 1 (P86) - Niveau 1 - Vol 73



002BM002401 n°87 - 1 (P87) - Niveau 1 - Vol 74



002BM002401 n°88 - 1 (P88) - Niveau 1 - Vol 77



002BM002401 n°89 - 1 (P89) - Niveau 1 - Vol 77



002BM002401 n°90 - 1 (P90) - Niveau 1 - Vol 77

Pre-Rapport



002BM002401 n°91 - 1 (P91) - Niveau 1 - Vol 74




002BM002401 n°92 - 1 (P92) - Niveau 1 - Vol 77



002BM002401 n°93 - 1 (P93) - Niveau 1 - Vol 77



002BM002401 n°94 - 1 (P94) - Niveau 1 - Vol 77

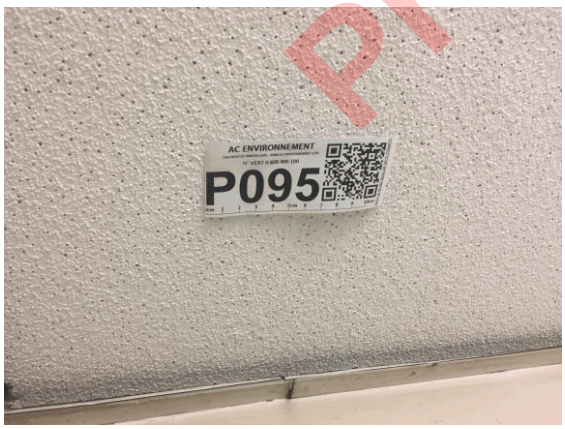

002BM002401 n°95 - 2 (P95) - Niveau 1 - Vol 77



002BM002401 n°96 - 1 (P96) - Niveau 1 - Vol 77

Pre-Rapport



002BM002401 n°97 - 1 (P97) - Niveau 1 - Vol 73



002BM002401 n°98 - 1 (P98) - Niveau 1 - Vol 73



002BM002401 n°99 - 1 (P99) - Niveau 1 - Vol 87



002BM002401-1 n°100 - 2 (P100) - Niveau 0 - Vol 38



002BM002401-1 n°101 - 1 (P101) - Niveau 1 - Vol 76



002BM002401-1 n°102 - 1 (P102) - Façades - Vol 93 (Façades NORD)

Pre-Rapport



002BM002401-1 n°103 - 1 (P103) - Façades - Vol 93
(Façades NORD)



002BM002401-1 n°104 - 1 (P104) - Façades - Vol 92
(Façades SUD)



002BM002401-2 n°105 - 1 (P105) - Toiture - Vol 91



002BM002401-2 n°106 - 1 (P106) - Toiture - Vol 91



002BM002401-2 n°107 - 1 (P107) - Toiture - Vol 91



002BM002401-2 n°108 - 1 (P108) - Toiture - Vol 91

Pre-Rapport



002BM002401-2 n°109 - 1 (P109) - Toiture - Vol 91



002BM002401-2 n°110 - 1 (P110) - Toiture - Vol 90



002BM002401-2 n°111 - 1 (P111) - Toiture - Vol 90



002BM002401-2 n°112 - 1 (P112) - Toiture - Vol 90



002BM002401-2 n°113 - 1 (P113) - Toiture - Vol 90



002BM002401-2 n°114 - 1 (P114) - Toiture - Vol 90

Pre-Rapport



002BM002401-2 n°115 - 1 (P115) - Toiture - Vol 90



002BM002401-2 n°116 - 1 (P116) - Toiture - Vol 91



002BM002401-3 n°117 - 1 (P117) - Niveau 0 - Vol 42



002BM002401-3 n°118 - 1 (P118) - Niveau 0 - Vol 42



002BM002401-3 n°119 - 1 (P119) - Niveau 0 - Vol 41



002BM002401-3 n°120 - 1 (P120) - Niveau 0 - Vol 41

Pre-Rapport



002BM002401-3 n°121 - 1 (P121) - Niveau 0 - Vol 35



002BM002401-4 n°122 - 1 (P122) - Toiture - Vol 91




002BM002401-4 n°122 - 2 (P122) - Toiture - Vol 91



002BM002401-4 n°123 - 1 (P123) - Toiture - Vol 91



002BM002401-4 n°124 - 1 (P124) - Toiture - Vol 91

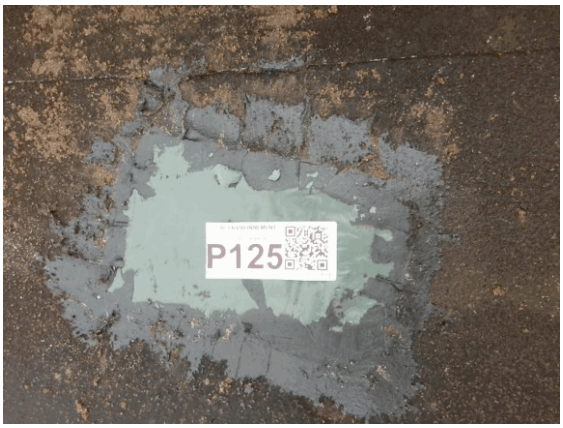

002BM002401-4 n°125 - 1 (P125) - Toiture - Vol 91

Pre-Rapport



002BM002401-4 n°126 - 1 (P126) - Toiture - Vol 91



002BM002401-4 n°127 - 1 (P127) - Toiture - Vol 91



002BM002401-4 n°128 - 1 (P128) - Toiture - Vol 91



002BM002401-4 n°128 - 2 (P128) - Toiture - Vol 91



002BM002401-4 n°129 - 1 (P129) - Toiture - Vol 90



002BM002401-4 n°131 - 1 (P131) - Façades - Vol 93 (Façades NORD)

Pre-Rapport



002BM002401-4 n°132 - 1 (P132) - Façades - Vol 93 (Façades NORD)



002BM002401-4 n°133 - 1 (P133) - Façades - Vol 93 (Façades NORD)



002BM002401-4 n°134 - 1 (P134) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°135 - 1 (P135) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°136 - 1 (P136) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°137 - 1 (P137) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)

Pre-Rapport



002BM002401-4 n°138 - 1 (P138) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°139 - 1 (P139) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°140 - 1 (P140) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°141 - 1 (P141) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°142 - 1 (P142) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°143 - 1 (P143) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)

Pre-Rapport



002BM002401-4 n°144 - 1 (P144) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°145 - 1 (P145) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°146 - 1 (P146) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°147 - 1 (P147) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°148 - 1 (P148) - Niveau 0 - Vol 52



002BM002401-4 n°149 - 1 (P149) - Niveau 0 - Vol 53

Pré-Rapport



002BM002401-4 n°150 - 1 (P150) - Niveau 0 - Vol 53



002BM002401-4 n°151 - 1 (P151) - Façades - Vol 93 (Façades NORD)



002BM002401-4 n°152 - 1 (P152) - Façades - Vol 93 (Façades NORD)



002BM002401-4 n°153 - 1 (P153) - Façades - Vol 93 (Façades NORD)



002BM002401-4 n°154 - 1 (P154) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



002BM002401-4 n°155 - 1 (P155) - Niveau 0 - Vol 53

Pré-Rapport



002BM002401-4 n°156 - 1 (P156) - Niveau 0 - Vol 53



002BM002401-4 n°157 - 1 (P157) - Niveau 0 - Vol 53



002BM002401-4 n°158 - 1 (P158) - Niveau 0 - Vol 39



002BM002401-4 n°159 - 1 (P159) - Niveau 0 - Vol 39



002BM002401-4 n°160 - 1 (P160) - Niveau 0 - Vol 39



002BM002401-4 n°161 - 1 (P161) - Niveau 0 - Vol 41

Pre-Rapport



002BM002401-4 n°162 - 1 (P162) - Niveau 0 - Vol 39



002BM002401-4 n°163 - 1 (P163) - Niveau 1 - Vol 82



002BM002401-4 n°164 - 1 (P164) - Niveau 1 - Vol 82



002BM002401-4 n°165 - 1 (P165) - Niveau 1 - Vol 82



002BM002401-4 n°166 - 1 (P166) - Niveau 1 - Vol 66



S6 - 1 (S6) - Niveau 0 - Vol 19

Pré-Rapport



S38 - 1 (S38) - Niveau 0 - Vol 13



S133 - 1 (S133) - Niveau 1 - Vol 70



S262 - 1 (S262) - Façades - Vol 93 (Façades NORD)



S266 - 1 (S266) - Toiture - Vol 91



S269 - 1 (S269) - Niveau 0 - Vol 49



S276 - 2 (S276) - Niveau 0 - Vol 33

Pre-Rapport



S278 - 1 (S278) - Toiture - Vol 90



S279 - 1 (S279) - Toiture - Vol 90



S283 - 1 (S283) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



S284 - 1 (S284) - Façades - Vol 92 (Façades SUD)



S288 - 1 (S288) - Niveau 1 - Vol 66

Pre-Rapport

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002BM002401 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton Dur Gris - Sue terre plein	Niveau 0 - Vol 1	
002BM002401 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige - En partie haute de cloisons	Niveau 0 - Vol 1	
002BM002401 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Béton cellulaire Effritable Blanc - Joint de béton cellulaire	Niveau 0 - Vol 1	
002BM002401 n°4 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige - Calicot avec enduit sur BA13	Niveau 0 - Vol 20	
002BM002401 n°4 Phase 4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13	Niveau 0 - Vol 20	
002BM002401 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Gris - En partie haute	Niveau 0 - Vol 1	
002BM002401 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc - Sur poteaux métalliques	Niveau 0 - Vol 1	
002BM002401 n°7 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	Niveau 0 - Vol 19	

Pre-Rapport

002BM002401 n°7 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	Niveau 0 - Vol 19
002BM002401 n°7 Phase 7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	Niveau 0 - Vol 19
002BM002401 n°8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - Colle grise	Niveau 0 - Vol 19
002BM002401 n°9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Dur Blanc Matériau Effritable Marron - Entre béton cellulaire et BA13	Niveau 0 - Vol 19
002BM002401 n°10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Vert - Colle beige	Niveau 0 - Vol 19
002BM002401 n°11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune - Pare-vapeur avec laine minérale	Niveau 0 - Vol 19
002BM002401 n°12	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron - Plaque fibreuse	Niveau 0 - Vol 19
002BM002401 n°13	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture Effritable Rouge - Peinture sur support bac acier	Niveau 0 - Vol 1
002BM002401 n°14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Laine Souple Fibreux Beige - Laine minérale	Niveau 0 - Vol 1
002BM002401 n°15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir - Dalle avec colle noir	Niveau 0 - Vol 18
002BM002401 n°16	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir - Isolant de plaque métallique	Niveau 0 - Vol 18
002BM002401 n°17	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris - Au dessus du faux plafond métallique	Niveau 0 - Vol 18

Pre-Rapport

002BM002401 n°18 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc - Doublage en plaque BA13	Niveau 0 - Vol 6
002BM002401 n°18 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - Doublage en plaque BA13	Niveau 0 - Vol 6
002BM002401 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Laine Souple Fibreux Jaune - Entre doublages et façades	Niveau 0 - Vol 6
002BM002401 n°20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Résineux Noir Laine Souple Fibreux Jaune - Jonction bitumineuse entre panneaux sandwichs et montant métalliques	Niveau 0 - Vol 6
002BM002401 n°21 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige - Calicot avec enduit sur BA13	Niveau 0 - Vol 11
002BM002401 n°21 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13	Niveau 0 - Vol 11
002BM002401 n°22	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Résineux Noir - Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	Niveau 0 - Vol 15
002BM002401 n°23	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Résineux Noir - Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	Niveau 0 - Vol 5
002BM002401 n°24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Beige - Colle beige	Niveau 0 - Vol 35
002BM002401 n°25 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - Dalle souple avec colle jaune	Niveau 0 - Vol 35

Pre-Rapport

002BM002401 n°25 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige Blanc - Dalle souple avec colle jaune	Niveau 0 - Vol 35
002BM002401 n°26	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune - Dalle minérale avec couche grise	Niveau 0 - Vol 35
002BM002401 n°27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Gris Sous-couche Bitumineux Noir Matériau Souple Fibreux Gris - Avec colle jaune	Niveau 0 - Vol 34
002BM002401 n°28 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Souple Fibreux Rouge - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	Niveau 0 - Vol 33
002BM002401 n°28 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	Niveau 0 - Vol 33
002BM002401 n°28 Phase 5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Dur Blanc - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	Niveau 0 - Vol 33
002BM002401 n°29	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Résineux Noir Matériau Effritable Jaune - Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	Niveau 0 - Vol 31
002BM002401 n°30	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Résineux Noir - Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	Niveau 0 - Vol 24
002BM002401 n°31 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige - Calicot avec enduit sur BA13	Niveau 0 - Vol 32

Pre-Rapport

002BM002401 n°31 Phase 4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13	Niveau 0 - Vol 32
002BM002401 n°32 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron - Dalle avec colle noir	Niveau 0 - Vol 42
002BM002401 n°32 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris - Dalle avec colle noir	Niveau 0 - Vol 42
002BM002401 n°33 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Souple Fibreux Rouge - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	Niveau 0 - Vol 41
002BM002401 n°33 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	Niveau 0 - Vol 41
002BM002401 n°33 Phase 5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces sèches)	Niveau 0 - Vol 41
002BM002401 n°34 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	Niveau 0 - Vol 39
002BM002401 n°34 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	Niveau 0 - Vol 39
002BM002401 n°35	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris - Sur poteaux métallique	Niveau 0 - Vol 42

Pre-Rapport

002BM002401 n°36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Souple Jaune - Panneaux de doublage en fibre-ciment	Niveau 0 - Vol 39
002BM002401 n°37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Beige Béton cellulaire Effritable Blanc - Joint de béton cellulaire	Niveau 0 - Vol 42
002BM002401 n°38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - Sur lattis vertical en partie haute	Niveau 0 - Vol 42
002BM002401 n°39	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron - Plaque fibreuse 20X20	Niveau 0 - Vol 42
002BM002401 n°40	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - Plaque fibreuse beige 50X50	Niveau 0 - Vol 41
002BM002401 n°41	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Effritable Beige Faux-plafond Effritable Fibreux Marron - Plaque fibreuse marron 50X50	Niveau 0 - Vol 44
002BM002401 n°42	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - Colle beige	Niveau 0 - Vol 39
002BM002401 n°43	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Souple Fibreux Jaune Rose Matériau Souple Fibreux Gris - Laine minérale	Niveau 0 - Vol 42
002BM002401 n°44 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Gris - Mastic gris	Niveau 0 - Vol 44
002BM002401 n°44 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse Souple Noir - Mastic gris	Niveau 0 - Vol 44
002BM002401 n°45	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Blanc Matériau Effritable Gris Noir - Joint souple blanc	Niveau 0 - Vol 39

Pre-Rapport

002BM002401 n°46	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture Effritable Gris Matériau Effritable Gris - Sur conduit de ventilation métallique	Niveau 0 - Vol 41
002BM002401 n°47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Résineux Gris - Joint entre partie métallique et pierre de l'escalier	Niveau 0 - Vol 53
002BM002401 n°48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Blanc Ciment Dur Gris - Flocage ciment sur éléments métallique	Niveau 0 - Vol 53
002BM002401 n°49	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Beige - Mastic noir sur partie basse de menuiserie	Niveau 0 - Vol 53
002BM002401 n°50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris - Colle grise	Niveau 1 - Vol 85
002BM002401 n°51 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Papier Souple Fibreux Beige - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	Niveau 1 - Vol 85
002BM002401 n°51 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton Fibreux Souple Vert Marron Plâtre Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13 (pièces humide)	Niveau 1 - Vol 85
002BM002401 n°52	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - Colle beige	Niveau 1 - Vol 85
002BM002401 n°53	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton Fibreux Souple Marron Laine Fibreux Souple Jaune - Pare-vapeur avec laine minérale	Niveau 1 - Vol 85
002BM002401 n°54	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - Plaque fibreuse	Niveau 1 - Vol 85
002BM002401 n°55	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton cellulaire Dur Blanc - Joint de béton cellulaire	Niveau 1 - Vol 85
002BM002401 n°56	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Flocage Fibreux Effritable Beige - En partie haute	Niveau 1 - Vol 85

Pre-Rapport

002BM002401 n°57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris - Dalle avec colle noir	Niveau 1 - Vol 82
002BM002401 n°58	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau Effritable Fibreux Beige - En partie haute de cloisons	Niveau 1 - Vol 82
002BM002401 n°59	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Laine Souple Fibreux Blanc Gris - Laine minérale	Niveau 1 - Vol 82
002BM002401 n°60	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine Souple Fibreux Noir - Isolant de plaque métallique	Niveau 1 - Vol 82
002BM002401 n°61	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Effritable Fibreux Beige - Au dessus du faux plafond métallique	Niveau 1 - Vol 82
002BM002401 n°62	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture Effritable Violet - Peinture sur support bac acier	Niveau 1 - Vol 82
002BM002401 n°63	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige - Sur poteaux métalliques	Niveau 1 - Vol 63
002BM002401 n°64 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige - Doublage en plaque BA13	Niveau 1 - Vol 63
002BM002401 n°64 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Carton Souple Fibreux Marron - Doublage en plaque BA13	Niveau 1 - Vol 63
002BM002401 n°64 Phase 6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - Doublage en plaque BA13	Niveau 1 - Vol 63
002BM002401 n°65	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Laine Souple Fibreux Jaune - Entre doublages et façades	Niveau 1 - Vol 63
002BM002401 n°66 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13	Niveau 1 - Vol 62

Pre-Rapport

002BM002401 n°66 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13	Niveau 1 - Vol 62
002BM002401 n°67	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Résineux Noir - Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	Niveau 1 - Vol 62
002BM002401 n°68	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc - Enduit crépi sur puis de lumière métallique	Niveau 1 - Vol 82
002BM002401 n°69	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Résineux Noir - Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	Niveau 1 - Vol 57
002BM002401 n°70	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Résineux Noir - Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	Niveau 1 - Vol 65
002BM002401 n°71	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Résineux Noir - Mastic noir bitumineux (coté intérieur)	Niveau 1 - Vol 67
002BM002401 n°72	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc - Joint de carreaux de plâre	Niveau 1 - Vol 68
002BM002401 n°73	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Beige - Sur poteaux métalliques	Niveau 1 - Vol 66
002BM002401 n°74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc - Dalle grise supérieur colle jaune	Niveau 1 - Vol 70
002BM002401 n°75 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Rouge - Dalle rouge inférieur colle noir	Niveau 1 - Vol 70
002BM002401 n°75 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Noir Colle Souple Jaune - Dalle rouge inférieur colle noir	Niveau 1 - Vol 70
002BM002401 n°75 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Beige Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris - Dalle rouge inférieur colle noir	Niveau 1 - Vol 70

Pre-Rapport

002BM002401 n°76	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Gris Blanc Ciment Dur Gris - Flocage ciment	Niveau 1 - Vol 70
002BM002401 n°77 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige - Calicot avec enduit sur BA13	Niveau 1 - Vol 70
002BM002401 n°77 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron - Calicot avec enduit sur BA13	Niveau 1 - Vol 70
002BM002401 n°77 Phase 7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13	Niveau 1 - Vol 70
002BM002401 n°78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - Joint de carreaux de plâre	Niveau 1 - Vol 70
002BM002401 n°79	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Résineux Noir Gris Matériau Effritable Beige Marron - Mastic bitumineux	Niveau 1 - Vol 70
002BM002401 n°80	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc - Sur cloison brique	Niveau 1 - Vol 84
002BM002401 n°81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Jaune Fibres-ciment Dur Fibreux Gris - En panneau sandwichs et allège	Niveau 1 - Vol 84
002BM002401 n°82	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron - Plaque fibreuse 20X20	Niveau 1 - Vol 70
002BM002401 n°83	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Jaune Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - Plaque fibreuse 50X50	Niveau 1 - Vol 84

Pre-Rapport

002BM002401 n°84	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris - Plaque fibre-ciment sur faux-plafond	Niveau 1 - Vol 70
002BM002401 n°85 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Vert - Dalle avec colle beige et ragéage et résidu de colle noir	Niveau 1 - Vol 73
002BM002401 n°85 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ciment Dur Gris - Dalle avec colle beige et ragéage et résidu de colle noir	Niveau 1 - Vol 73
002BM002401 n°86	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Fibres-ciment Effritable Fibreux Gris - En panneau sandwichs et allège	Niveau 1 - Vol 73
002BM002401 n°87 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	Niveau 1 - Vol 74
002BM002401 n°87 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13 en doublage	Niveau 1 - Vol 74
002BM002401 n°88	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc - Sur cloison brique	Niveau 1 - Vol 77
002BM002401 n°89 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige - Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	Niveau 1 - Vol 77
002BM002401 n°89 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - Calicot avec enduit sur BA13 en cloison	Niveau 1 - Vol 77
002BM002401 n°90	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Gris Bleu Ciment Effritable Gris - Flocage ciment	Niveau 1 - Vol 77

Pre-Rapport

002BM002401 n°91	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Vert Ciment Effritable Gris - Flocage ciment	Niveau 1 - Vol 74
002BM002401 n°92	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc - Enduit crépi sur puis de lumière bois	Niveau 1 - Vol 77
002BM002401 n°93	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - Joint de béton cellulaire	Niveau 1 - Vol 77
002BM002401 n°94	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Beige Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris - Plaque fibreuse rectangulaire	Niveau 1 - Vol 77
002BM002401 n°95	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - Plaque fibreuse rectangulaire granuleuse	Niveau 1 - Vol 77
002BM002401 n°96	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Effritable Noir - Laine minérale sur faux-plafond	Niveau 1 - Vol 77
002BM002401 n°97	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Gris Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron - Plaque fibreuse 40X40	Niveau 1 - Vol 73
002BM002401 n°98	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Blanc Peinture Effritable Bleu Noir - Mastic bitumineux	Niveau 1 - Vol 73
002BM002401 n°99	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Marron - Colle jaune	Niveau 1 - Vol 87
002BM002401 -1 n°100	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc - Tirant métalique en croix	Niveau 0 - Vol 38

Pre-Rapport

002BM002401-1 n°101	Façades	Bardages	Laine Souple Fibreux Beige - Laine minéral marron	Niveau 1 - Vol 76
002BM002401-1 n°102	Façades	Bardages	Mastic Résineux Fibreux Gris Peinture Effritable Blanc - Jointbresineux blanc entre panneaux fibre-ciment et armature	Façades - Vol 93 (Façades NORD)
002BM002401-1 n°103	Façades	Bardages	Peinture Effritable Blanc Fibres-ciment Dur Fibreux Gris - Bardage fibre-ciment peint en beige	Façades - Vol 93 (Façades NORD)
002BM002401-1 n°104	Façades	Bardages	Joint Souple Gris Matériau Effritable Gris - Mastic sur vis de fixation du bardage	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
002BM002401-2 n°105	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Gris - Revêtement bitumeux d'étanchéité couche supérieure	Toiture - Vol 91
002BM002401-2 n°106	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Effritable Fibreux Marron - Isolant 7cm laine de roche	Toiture - Vol 91
002BM002401-2 n°107	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Effritable Fibreux Marron Matériau Bitumineux Noir Matériau Bitumineux Fibreux Noir - Revêtement bitumeux d'étanchéité inférieur sur dalle BA	Toiture - Vol 91
002BM002401-2 n°108	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Marron - Relevé étanchéité	Toiture - Vol 91
002BM002401-2 n°109	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande Bitumineux Fibreux Noir - Relevé étanchéité sur acrotère	Toiture - Vol 91

Pre-Rapport

002BM002401-2 n°110	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande Bitumineux Fibreux Noir - Revêtement bitumeux d'étanchéité supérieure 3 couches	Toiture - Vol 90
002BM002401-2 n°111	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Effritable Fibreux Jaune Matériau Souple Translucide Matériau Bitumineux Fibreux Noir - Revêtement bitumeux d'étanchéité intermédiaire	Toiture - Vol 90
002BM002401-2 n°112	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Fibreux Bitumineux Marron - Revêtement bitumeux d'étanchéité inférieure	Toiture - Vol 90
002BM002401-2 n°113	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Laine Fibreux Souple Gris Jaune - Isolant laine de roche	Toiture - Vol 90
002BM002401-2 n°114	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande Bitumineux Fibreux Noir Matériau Bitumineux Noir - Relevé étanchéité sur acrotère	Toiture - Vol 90
002BM002401-2 n°115	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Bitumineux Noir Bande Bitumineux Fibreux Noir - Relevé étanchéité sur acrotère	Toiture - Vol 90
002BM002401-2 n°116	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Bitumineux Noir Matériau Bitumineux Fibreux Noir - Relevé étanchéité Noir	Toiture - Vol 91
002BM002401-3 n°117	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Beige Gris / Beige - Filasse sur radiateur double	Niveau 0 - Vol 42
002BM002401-3 n°118	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - Sur poteaux métalliques	Niveau 0 - Vol 42

Pre-Rapport

002BM002401-3 n°119	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Gris - Sur poteaux métalliques	Niveau 0 - Vol 41
002BM002401-3 n°120	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Gris - Sur poteaux métalliques	Niveau 0 - Vol 41
002BM002401-3 n°121	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige - Filasse sur radiateur double	Niveau 0 - Vol 35
P122	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile - Bande type "Paxalu" ardoisé sur lanternaux	Toiture - Vol 91
P123	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile - Etanchéité bitumeuse	Toiture - Vol 91
P124	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec couche en toile et poussières - Pare-vapeur	Toiture - Vol 91
P125	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec couche en toile et poussières - Etanchéité bitumeusesupérieure	Toiture - Vol 91
P126	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières - Etanchéité bitumeuse inférieure	Toiture - Vol 91
P127	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec poussières - Pare-vapeur	Toiture - Vol 91
P128	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile - Bande type "Paxalu"	Toiture - Vol 91
P129	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons non séparable + matériau fibreux jaune - Etanchéité bitumeuse	Toiture - Vol 90
P130 Phase 1	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Façades - Vol 93 (Façades NORD)

Pre-Rapport

P130 Phase 2	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène	Façades - Vol 93 (Façades NORD)
P131	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples en vrac avec poussières - Peinture sur poteaux extérieurs	Façades - Vol 93 (Façades NORD)
P132	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples en vrac avec poussières - Peinture sur croix st andré	Façades - Vol 93 (Façades NORD)
P133	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples en vrac avec poussières - Peinture sur structure horizontale	Façades - Vol 93 (Façades NORD)
P134	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples en vrac avec poussières - Peinture sur poteaux extérieurs	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P135	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples en vrac avec poussières - Peinture sur croix st andré	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P136	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples en vrac avec poussières - Peinture sur structure horizontale	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P137	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples en vrac avec poussières - Peinture sur bac acier	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P138	Façades	Bardages	Peinture en vrac avec poussières - Peinture sur panneaux sandwich	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P139	Façades	Panneaux-sandwichs	Matériau fibreux blanc avec poussières non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles non séparable + couche plâtreuse rose en vrac non séparable - Plaques fibre ciment	Façades - Vol 92 (Façades SUD)

Pre-Rapport

P140	Façades	Panneaux-sandwichs	Peinture non séparable + matériau mou gris non séparable + matériau souple incolore avec poussières non séparable - Autour des vis sur rails	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P141	Façades	Panneaux-sandwichs	Peinture en faible quantité non séparable + matériau mou gris avec poussières - Autour de plaques	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P142	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples en vrac - Peinture sur poteaux extérieurs	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P143	Façades	Bardages	Peintures multiples en vrac avec poussières - Peinture sur bas de panneaux sandwich	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P144	Façades	Panneaux-sandwichs	Matériau mou gris avec poussières - Autour de plaques	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P145	Façades	Panneaux-sandwichs	Matériau mou gris avec poussières - En pied de plaques	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P146	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P147	Façades	Panneaux-sandwichs	Matériau mou gris avec poussières - Autour de vitres	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P148	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau mou gris avec poussières - Mastic vitrier résineux	Niveau 0 - Vol 52
P149	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau mou gris avec poussières - Mastic vitrier effritable	Niveau 0 - Vol 53
P150	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples en vrac - Peinture sur croix st andré	Niveau 0 - Vol 53
P151	Façades	Menuiseries	Matériau mou gris avec poussières - Mastic vitrier résineux sur vitre battante	Façades - Vol 93 (Façades NORD)

Pre-Rapport

P152	Façades	Menuiseries	Matériau mou gris avec poussières - Mastic vitrier résineux sur vitre battante	Façades - Vol 93 (Façades NORD)
P153	Façades	Menuiseries	Matériau souple gris avec poussières + matériau mou gris en faible quantité non séparable - Mastic vitrier résineux sur vitre fixe	Façades - Vol 93 (Façades NORD)
P154	Façades	Menuiseries	Matériau mou gris avec poussières - Mastic vitrier résineux	Façades - Vol 92 (Façades SUD)
P155	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - Flocage ciment sur éléments métallique	Niveau 0 - Vol 53
P156	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant noir avec fibres visibles	Niveau 0 - Vol 53
P157	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact blanc hétérogène - Marches en granito	Niveau 0 - Vol 53
P158 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité + colle bitumineuse noire en faible quantité - Dalles plastiques semi dure rouge	Niveau 0 - Vol 39
P158 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge - Dalles plastiques semi dure rouge	Niveau 0 - Vol 39
P158 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Poussières - Dalles plastiques semi dure rouge	Niveau 0 - Vol 39
P159	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable - Colle noire + ragréage	Niveau 0 - Vol 39
P160	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable - Colle noire + ragréage	Niveau 0 - Vol 39
P161	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux beige + matériau mou noir avec poussières non séparable - Filasse	Niveau 0 - Vol 41

Pre-Rapport

P162	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable - Peinture sur croix st andré	Niveau 0 - Vol 39
P163 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante marron - Dalles plastiques semi dure marron	Niveau 1 - Vol 82
P163 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Dalles plastiques semi dure marron	Niveau 1 - Vol 82
P163 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau mousse jaune en faible quantité - Dalles plastiques semi dure marron	Niveau 1 - Vol 82
P164	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable - Colle noire + ragréage	Niveau 1 - Vol 82
P165	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable - Colle noire + ragréage	Niveau 1 - Vol 82
P166	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau fibreux blanc avec poussières - Laine sur rails de cloison	Niveau 1 - Vol 66

Pre-Rapport

AC LABS
PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES

CHANTIER

Référence **C032019012040**
Adresse Commande : 002BM002401
Affaire : Bâtiment K
5 avenue pierre Mendes France 69676 Bron
69676 BRON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 27/12/2019

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C032019012040 (99 prélèvements)
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104252

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002BM002401_001 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles gravillonnée Vol 1	1	Béton	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104253

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_002 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Plaques planes en fibres-ciment Vol 1	1 2	Peinture Matériau	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104254

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_003 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 1	1 2 3	Peinture Enduit Béton cellulaire	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104255

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_004 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 20	1 2 3	Peinture Enduit Papier	Effritable Effritable Souple Fibreux	Blanc Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
	4 5 6	Enduit Carton Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable	Beige Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104256

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Flocages Vol 1	1 2	Flocage Matériau	Souple Fibreux Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104257

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_006 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente Vol 1	1 2	Peinture Enduit	Effritable Effritable	Multicolore Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104258

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	24/12/2019	Date d'analyse	24/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_007 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 19	1 2 3	Peinture Toile Enduit	Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
	4 5 6	Papier Enduit Carton	Souple Fibreux Effritable Souple Fibreux	Beige Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	4	MET*	Non détecté	●
	7	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104259

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_008 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 19	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104260

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_009 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plot de colle Vol 19	1 2	Matériau Matériau	Dur Effritable	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104261

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_010 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 19	1 2	Colle Carton	Effritable Souple Fibreux	Blanc Marron Vert	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104262

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_011 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Isolant intérieur Vol 19	1 2	Carton Laine	Souple Fibreux Souple Fibreux	Marron Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104263

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_012 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 19	1 2	Peinture Faux-plafond	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104264

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_013 Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Peinture intumescente Vol 1	1	Peinture	Effritable	Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104265

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_014 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Isolant intérieur Vol 1	1	Laine	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104266

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_015 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 18	1	Revêtement	Dur	Marron	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Colle	Bitumineux	Noir					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104267

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_016 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 18	1	Laine	Souple Fibreux	Jaune	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté	●
	2	Matériau	Bitumineux	Noir					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104268

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_017 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 18	1	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104269

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_018 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 6	1	Peinture	Effritable	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Papier	Souple Fibreux	Blanc					
	4	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	5	Carton	Souple Fibreux	Marron					
	6	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104270

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_019 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Isolant intérieur Vol 6	1	Laine	Souple Fibreux	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104271

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_020 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 6	1	Matériau	Résineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté	●
	2	Laine	Souple Fibreux	Jaune					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104272

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	24/12/2019	Date d'analyse	24/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_021 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 11	1	Peinture	Effritable	Jaune	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Papier	Souple Fibreux	Beige					
	4	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
	5	Carton	Souple Fibreux	Marron					
	6	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104273

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_022 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 15	1	Mastic	Résineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104274

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_023 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 5	1	Mastic	Résineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104275

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_024 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 35	1	Colle	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104276

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_025 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 35	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	3	Matériau	Effritable	Beige Blanc					

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104277

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_026 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 35	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Laine	Souple Fibreux	Jaune					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104278

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_027 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 34	1	Moquette	Souple Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Sous-couche	Bitumineux	Noir					
	3	Matériau	Souple Fibreux	Gris					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104279

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	26/12/2019	Date d'analyse	26/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_028 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 33	1	Matériau	Souple_Fibreux	Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
	3	Papier	Souple Fibreux	Beige					
	4	Enduit	Effritable	Beige					
	5	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	6	Plâtre	Dur	Blanc					

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104280

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_029 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 31	1	Mastic	Résineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Matériau	Effritable	Jaune					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104281

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_030 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 24	1	Mastic	Résineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104282

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_031 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 32	1	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Papier	Souple Fibreux	Beige					
	3	Enduit	Effritable	Beige					
	4	Carton	Fibreux Souple	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	5	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104283

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_032 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 42	1	Revêtement	Dur	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	3	Ragréage	Effritable	Gris					

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104284

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_033 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 41	1	Matériau	Souple Fibreux	Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	3	Enduit	Effritable	Blanc					
	4	Papier	Souple Fibreux	Beige					
	5	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
	6	Carton	Souple Fibreux	Marron					
	7	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque La couche enduit effritable beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.
Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104285

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_034 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 39	1	Peinture	Effritable	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	4	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104286

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_035 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits projetés (ciment) Vol 42	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Ciment	Effritable	Gris					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104287

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_036 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment Vol 39	1	Peinture	Effritable	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Gris					
	3	Matériau	Souple	Jaune					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104288

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_037 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 42	1	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Béton cellulaire	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104289

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_038 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 42	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Carton	Souple Fibreux	Marron					
	3	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104290

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_039 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 42	1 2	Peinture Faux-plafond	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104291

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_040 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 41	1 2	Peinture Faux-plafond	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104292

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_041 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 44	1 2	Matériau Faux-plafond	Effritable Effritable Fibreux	Beige Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104293

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_042 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 39	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104294

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_043 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 42	1 2	Laine Matériau	Souple Fibreux Souple Fibreux	Jaune Rose Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104295

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_044 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 44	1	Mastic	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Mousse	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104296

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_045 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 39	1 2	Joint Matériau	Souple Effritable	Blanc Gris Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104297

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	24/12/2019	Date d'analyse	24/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_046 Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Mastics Vol 41	1 2	Peinture Matériau	Effritable Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone	6	MET*	Non détecté	●

Remarque Faiblement amianté.
La couche peinture effritable gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
La couche matériau effritable gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104298

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_047 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint gris Vol 53	1	Matériau	Résineux	Gris	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104299

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_048 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Flocages Vol 53	1 2	Peinture Ciment	Effritable Dur	Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104300

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_049 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 53	1	Mastic	Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104301

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_050 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 85	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104302

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	24/12/2019	Date d'analyse	24/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_051 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 85	1 2 3	Peinture Toile Papier	Effritable Souple Fibreux Souple Fibreux	Blanc Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
	4 5	Carton Plâtre	Fibreux Souple Effritable	Vert Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104303

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_052 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 85	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104304

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_053 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Isolant intérieur Vol 85	1 2	Carton Laine	Fibreux Souple Fibreux Souple	Marron Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104305

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_054 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 85	1 2	Peinture Faux-plafond	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104306

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_055 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 85	1	Béton cellulaire	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104307

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_056 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Flocages Vol 85	1	Flocage	Fibreux Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104308

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_057 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 82	1 2 3	Revêtement Colle Ragréage	Dur Bitumineux Effritable	Marron Noir Gris	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque La couche ragréage effritable gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104309

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_058 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Plaques planes en fibres-ciment Vol 82	1	Matériau	Effritable Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104310

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_059 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Isolant intérieur Vol 82	1	Laine	Souple Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104311

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_060 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 82	1	Laine	Souple Fibreux	Noir	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104312

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_061 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 82	1	Matériau	Effritable Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104313

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_062 Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Peinture intumescente Vol 82	1	Peinture	Effritable	Violet	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104314

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_063 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente Vol 63	1 2	Peinture Enduit	Effritable Effritable	Violet Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104315

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_064 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 63	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc					
	3	Enduit	Effritable	Beige					
	4	Peinture	Effritable	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	5	Carton	Souple Fibreux	Marron					
	6	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104316

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_065 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Isolant intérieur Vol 63	1	Laine	Souple Fibreux	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104317

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_066 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 62	1	Peinture	Effritable	Jaune	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Carton	Fibreux Souple	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	4	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104318

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_067 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 62	1	Mastic	Résineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104319

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_068 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 82	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104320

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_069 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 57	1	Mastic	Résineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104321

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_070 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 65	1	Mastic	Résineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104322

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_071 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 67	1	Mastic	Résineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104323

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_072 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 68	1	Peinture	Effritable	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104324

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_073 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente Vol 66	1	Peinture	Effritable	Violet	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Beige					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104325

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	26/12/2019	Date d'analyse	26/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_074 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 70	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	4	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Colle	Souple	Jaune					
	3	Matériau	Effritable	Blanc					

Remarque La couche matériau effritable blanc est présent en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104326

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_075 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 70	1	Revêtement	Dur	Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Revêtement	Dur	Noir	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	3	Colle	Souple	Jaune					
	4	Ragréage	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme, Acide chlorhydrique	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	5	Colle	Bitumineux	Noir					
	6	Ciment	Dur	Gris					

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104327

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_076 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Flocages Vol 70	1	Peinture	Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Ciment	Dur	Gris					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104328

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_077 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 70	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Papier	Souple Fibreux	Beige					
	4	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté	●
	5	Enduit	Effritable	Beige					
	6	Carton	Souple Fibreux	Marron					
	7	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104329

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_078 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 70	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104330

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_079 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 70	1	Mastic	Résineux	Noir Gris	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	3	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Matériau	Effritable	Beige Marron					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104331

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_080 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 84	1	Peinture	Effritable	Jaune	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104332

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_081 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment Vol 84	1	Peinture	Effritable	Beige Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Gris					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104333

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_082 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 70	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Marron					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104334

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_083 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 84	1	Peinture	Effritable	Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104335

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_084 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 70	1	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104336

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_085 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 73	1	Revêtement	Semi-dur	Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	3	Ciment	Dur	Gris					

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104337

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_086 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment Vol 73	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Fibres-ciment	Effritable Fibreux	Gris					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104338

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_087 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 74	1	Peinture	Effritable	Vert	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	4	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104339

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_088 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 77	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104340

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_089 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 77	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Papier	Souple Fibreux	Beige					
	4	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	5	Carton	Souple Fibreux	Marron					
	6	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104341

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	23/12/2019	Date d'analyse	23/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_090 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Flocages Vol 77	1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Gris Bleu Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104342

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_091 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Flocages Vol 74	1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Vert Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104343

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_092 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 77	1 2	Peinture Enduit	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104344

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_093 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 77	1 2	Enduit Ciment	Effritable Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104345

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_094 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 77	1 2	Peinture Faux-plafond	Effritable Effritable Fibreux	Beige Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104346

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_095 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 77	1 2	Peinture Faux-plafond	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104347

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_096 Toiture et étanchéité / Elément sous toiture / Isolant sous toiture Vol 77	1 2	Laine Matériau	Souple Fibreux Effritable	Jaune Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104348

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_097 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 73	1 2	Peinture Faux-plafond	Effritable Effritable Fibreux	Gris Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104349

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_098 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 73	1 2	Joint Peinture	Souple Effritable	Blanc Bleu Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 69PM00104350

Date de réception	19/12/2019	Date de préparation	21/12/2019	Date d'analyse	21/12/2019

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401_099	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe Vol 87	2	Colle	Souple	Jaune Marron	Acétone				

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable d'équipe

Dalila Habchi



Pre-Rapport

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-6519 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

AC LABS
PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES

CHANTIER

Référence **C022020157463**
Adresse Commande : 002BM002401-1
Affaire : Bâtiment K
5 avenue pierre Mendes France 69676 Bron
69676 BRON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 21/01/2020

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C022020157463 (5 prélèvements)
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM00976653

Date de réception	16/01/2020	Date de préparation	20/01/2020	Date d'analyse	20/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-1_100 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente Vol 38	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM00976654

Date de réception	16/01/2020	Date de préparation	20/01/2020	Date d'analyse	20/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-1_101 Façades / Bardages / Isolant sous bardage Vol 76	1	Laine	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM00976655

Date de réception	16/01/2020	Date de préparation	20/01/2020	Date d'analyse	20/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-1_102 Façades / Bardages / Joint entre élement Vol 93 (Façades NORD)	1 2	Mastic Peinture	Résineux Fibreux Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM00976656

Date de réception	16/01/2020	Date de préparation	20/01/2020	Date d'analyse	20/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-1_103 Façades / Bardages / Plaques fibres Vol 93 (Façades NORD)	1 2	Peinture Fibres-ciment	Effritable Dur Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM00976657


Date de réception	16/01/2020	Date de préparation	20/01/2020	Date d'analyse	20/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-1_104 Façades / Bardages / Mastic sur visserie Vol 92 (Façades SUD)	1 2	Joint Matériau	Souple Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable d'équipe
Emilie Fournie Doré



Pre-Rapport

AC LABS
PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES

CHANTIER

Référence **C022020165506**
Adresse Commande : 002BM002401-2
Affaire : Bâtiment K
5 avenue pierre Mendes France 69676 Bron
69676 BRON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 12/06/2020

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C022020165506 (12 prélèvements)
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Pre-Rapport

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053927

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	11/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_105 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 91	1 2	Matériau Matériau	Bitumineux Fibreux Effritable	Noir Gris	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053928

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	10/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_106 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Isolant Vol 91	1	Matériau	Effritable Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053929

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	11/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_107 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 91	1 2 3	Matériau Matériau Matériau	Effritable Fibreux Bitumineux Bitumineux Fibreux	Marron Noir Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053930

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	10/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_108 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 91	1 2	Matériau Matériau	Bitumineux Fibreux Effritable	Noir Marron	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053931

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	10/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_109 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 91	1	Bande	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053932

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	11/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_110 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 90	1	Bande	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	2	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053933

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	11/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_111 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 90	1 2 3	Matériau Matériau Matériau	Effritable Fibreux Souple Bitumineux Fibreux	Jaune Translucide Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053934

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	10/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_112 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 90	1 2	Matériau Matériau	Bitumineux Fibreux Fibreux Bitumineux	Noir Marron	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053935

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	10/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_113 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Isolant Vol 90	1	Laine	Fibreux Souple	Gris Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053936

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	10/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_114 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 90	1 2	Bande Matériau	Bitumineux Fibreux Bitumineux	Noir Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053937

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	10/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_115 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 90	1 2	Matériau Bande	Bitumineux Bitumineux Fibreux	Noir Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01053938

Date de réception	10/06/2020	Date de préparation	10/06/2020	Date d'analyse	11/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002BM002401-2_116 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 91	1 2	Matériau Matériau	Bitumineux Bitumineux Fibreux	Noir Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Pre-Rapport

Analyste

Mejra Klincevic



Accréditation N°1-6001 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

CHANTIER

Référence	**C032025090375**
Adresse	Commande : 002BM002401-3 Affaire : Bâtiment K 5 avenue pierre Mendes France 69676 Bron 69676 BRON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 06/05/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025090375
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002BM002401-3_117

Référence labo	69PM00682935
Date du prélèvement	28/04/2025
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Tresses
Zone de prélèvement	Campus porte des Alpes - Bâtiment K - Vol 42
Remarque concernant le prélèvement	Filasse sur radiateur double

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	05/05/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MVX	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Fibreux Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002BM002401-3_118

Référence labo	69PM00682936
Date du prélèvement	28/04/2025
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits projetés (ciment)
Zone de prélèvement	Campus porte des Alpes - Bâtiment K - Vol 42
Remarque concernant le prélèvement	Sur poteaux métalliques

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	05/05/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MVX	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pré Rapport

Référence échantillon : 002BM002401-3_119

Référence labo	69PM00682937	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits projetés (ciment)		
Zone de prélèvement	Campus porte des Alpes - Bâtiment K - Vol 41		
Remarque concernant le prélèvement	Sur poteaux métalliques		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MVX	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002BM002401-3_120

Référence labo	69PM00682938	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits projetés (ciment)		
Zone de prélèvement	Campus porte des Alpes - Bâtiment K - Vol 41		
Remarque concernant le prélèvement	Sur poteaux métalliques		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MVX	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002BM002401-3_121

Référence labo	69PM00682939	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/05/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Tresses		
Zone de prélèvement	Campus porte des Alpes - Bâtiment K - Vol 35		
Remarque concernant le prélèvement	Filasse sur radiateur double		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MVX	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence dossier: RSC032025090375

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 5 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 5/5

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

TÁurqpucdng"f)Áswkrg
Lucile Falenta



Pre-Rapport

Accréditation N°1-7326 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-3455 EN DATE DU 03/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT1426-3455
		Réf. Commande Client :	002BM002401-4

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/02/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4122 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 91		Réf échantillon ITGA : IT142602-18029 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RJK
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4123 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 91		Réf échantillon ITGA : IT142602-18030 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOK

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-3455 EN DATE DU 03/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4124 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Pare-vapeur / Vol 91		Réf échantillon ITGA : IT142602-18031 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en toile et poussières	
Matériau bitumineux noir avec couche en toile et poussières	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOK
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4125 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 91		Réf échantillon ITGA : IT142602-18032 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en toile et poussières	
Matériau bitumineux noir avec couche en toile et poussières	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOK
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4126 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 91		Réf échantillon ITGA : IT142602-18033 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières	
Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOK
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4127 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Pare-vapeur / Vol 91		Réf échantillon ITGA : IT142602-18034 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières	
Matériau bitumineux noir avec poussières	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOK
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4128 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 91		Réf échantillon ITGA : IT142602-18035 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOK

Pre Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-3455 EN DATE DU 03/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4129 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 90		Réf échantillon ITGA : IT142602-18036 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons / Matériau fibreux jaune	
▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons non séparable + Matériau fibreux jaune (1)	MOLP + META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOK (5)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4131 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente / Vol 93 (Façades NORD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18038 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
▸ Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 02/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ICD (4)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4132 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente / Vol 93 (Façades NORD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18039 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
▸ Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4133 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente / Vol 93 (Façades NORD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18040 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
▸ Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-3455 EN DATE DU 03/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4134 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18041 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4135 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18042 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4136 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18043 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 02/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ICD (4)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4137 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18044 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 02/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ICD (4)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-3455 EN DATE DU 03/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4138 / Façades / Bardages / Peinture / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18045 Description ITGA : Peinture en vrac avec poussières	
Peinture en vrac avec poussières	META (A) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4139 / Façades / Panneaux-sandwichs / Plaques / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18046 Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières / Matériau compact beige avec fibres visibles / Couche plâtreuse rose en vrac	
Matériau fibreux blanc avec poussières non séparable + Matériau compact beige avec fibres visibles non séparable + Couche plâtreuse rose en vrac non séparable (1)	MOLP le 02/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AAQ (4)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4140 / Façades / Panneaux-sandwichs / Joints d'étanchéïté / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18047 Description ITGA : Peinture / Matériau mou gris / Matériau souple incolore avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau mou gris non séparable + Matériau souple incolore avec poussières non séparable (1)	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BOK (5)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4141 / Façades / Panneaux-sandwichs / Joints d'étanchéïté / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18048 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau mou gris avec poussières	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau mou gris avec poussières (1)	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BOK (5)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-3455 EN DATE DU 03/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4142 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18049 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4143 / Façades / Bardages / Peinture / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18050 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ICD (4)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4144 / Façades / Panneaux-sandwichs / Joints d'étanchéité / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18051 Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières	
Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BOK
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4145 / Façades / Panneaux-sandwichs / Joints d'étanchéité / Vol 92 (Façades SUD)		Réf échantillon ITGA : IT142602-18052 Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières	
Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BOK

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-3455 EN DATE DU 03/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18053	
Réf échantillon client : 002BM002401-4146 / Façades / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 92 (Façades SUD)		Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières	
Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFN
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18054	
Réf échantillon client : 002BM002401-4147 / Façades / Panneaux-sandwichs / Joints d'étanchéïté / Vol 92 (Façades SUD)		Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières	
Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BOK
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18055	
Réf échantillon client : 002BM002401-4148 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 52		Description ITGA : Peinture / Matériau mou gris avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau mou gris avec poussières (1)	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BOK (5)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18056	
Réf échantillon client : 002BM002401-4149 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 53		Description ITGA : Peinture / Matériau mou gris avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau mou gris avec poussières (1)	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BOK (5)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18057	
Réf échantillon client : 002BM002401-4150 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente / Vol 53		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

Pre Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-3455 EN DATE DU 03/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18058	
Réf échantillon client : 002BM002401-4151 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 93 (Façades NORD)		Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières	
Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFN
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18059	
Réf échantillon client : 002BM002401-4152 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 93 (Façades NORD)		Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières	
Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFN
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18060	
Réf échantillon client : 002BM002401-4153 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 93 (Façades NORD)		Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières / Matériau mou gris en faible quantité	
Matériau souple gris avec poussières + Matériau mou gris en faible quantité non séparable (1)	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BOK (5)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18061	
Réf échantillon client : 002BM002401-4154 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 92 (Façades SUD)		Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières	
Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BOK
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18062	
Réf échantillon client : 002BM002401-4155 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Flocages / Vol 53		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

Pre Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-3455 EN DATE DU 03/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18063	
Réf échantillon client : 002BM002401-4156 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche / Vol 53		Description ITGA : Revêtement cassant noir avec fibres visibles	
Revêtement cassant noir avec fibres visibles	MOLP le 03/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VVA
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18064	
Réf échantillon client : 002BM002401-4157 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plancher / Vol 53		Description ITGA : Matériau compact blanc hétérogène	
Matériau compact blanc hétérogène	META (A) le 02/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ICD
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18065	
Réf échantillon client : 002BM002401-4158 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 39		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Poussières	
Peinture en faible quantité + Colle bitumineuse noire en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Dalle dure cassante rouge	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BOK
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K		Réf échantillon ITGA : IT142602-18066	
Réf échantillon client : 002BM002401-4159 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 39		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable (1)	MOLP le 02/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AAQ (5)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-3455 EN DATE DU 03/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4160 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 39		Réf échantillon ITGA : IT142602-18067 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	MOLP le 02/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AAQ (5)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4161 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Tresses / Vol 41		Réf échantillon ITGA : IT142602-18068 Description ITGA : Matériau fibreux beige / Matériau mou noir avec poussières	
Matériau fibreux beige + Matériau mou noir avec poussières non séparable (1)	MOLP + META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RJK (5)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4162 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Peinture intumescente / Vol 39		Réf échantillon ITGA : IT142602-18069 Description ITGA : Peinture / **Matériau plâtreux blanc**	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 02/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : ICD (5)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4163 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 82		Réf échantillon ITGA : IT142602-18070 Description ITGA : Dalle dure cassante marron / Colle bitumineuse noire / **Matériau mousse jaune en faible quantité**	
Dalle dure cassante marron	META (B) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BOK
Colle bitumineuse noire	MOLP le 02/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AAQ
Matériau mousse jaune en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-3455 EN DATE DU 03/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4164 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 82		Réf échantillon ITGA : IT142602-18071 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / **Matériau gris hétérogène**	
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (1)	MOLP le 02/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AAQ (5)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4165 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 82		Réf échantillon ITGA : IT142602-18072 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / **Matériau gris hétérogène**	
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (1)	MOLP le 02/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AAQ (5)
Réf dossier client : Campus porte des Alpes - Bâtiment K 5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON Campus porte des Alpes - Bâtiment K Réf échantillon client : 002BM002401-4166 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Isolant intérieur / Vol 66		Réf échantillon ITGA : IT142602-18073 Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières	
Matériau fibreux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 03/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ICD

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Audrey LUTHRINGER Analyste

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ITGA
Agence de saint-etienne enrobes
44 rue Jean Huss
42000 Saint-Etienne
Tel. : 04.77.79.52.99
www.itga.fr - E-Mail : se@itga.fr

Accréditation n°1-1761
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole (C).

Rapport d'essai : KSP2602-2700-001_1 **Date :** 6 mars 2026

Client :	**AC ENVIRONNEMENT**
Réf. commande :	002BM002401-4 / IT1426-3456
Interlocuteur :	M. Sabre Mathieu
Adresse :	64 rue clement Ader 42153 RIORGES

ITGA :

Date de réception des échantillons : 25 février 2026

Site de prélèvement : Campus porte des Alpes - Bâtiment K
5 Avenue Pierre Mendès France - 69500 BRON
Campus porte des Alpes - Bâtiment K

Description : Enrobé bitumineux (x1)

Analyses demandées : Teneur en HAP

Observations : Prélèvements effectués par vos soins

La somme des 16 HAP est donnée à titre indicatif. Le résultat affiché est précédé du signe ≤ si la teneur d'au moins un des composés sur les 16 HAP prioritaires est en dessous de sa limite de quantification. Dans ce cas, la valeur de la limite de quantification est utilisée pour le calcul de la somme. Le résultat de la somme devient alors une indication par excès.

Saint-Etienne, le vendredi 6 mars 2026

Le Cheffe d'équipe laboratoire
Sophie MAGNOLON

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à essais. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Teneur en HAP

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : Méthode interne IT 441
Matériau : Enrobé
Méthode de préparation : Broyage (<4mm) / Extraction par sonication
Technique analytique : Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

	002BM002401-4130
Emplacement	Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche et souscouche / Vol 93 (Façades NORD) 19/02/2026

RÉSULTAT

TENEUR	LQ	I		002BM002401-4130
Naphtalène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Acénaphtylène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Acénaphtène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Fluorène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Phénanthrène(C)	0,50	35%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Fluoranthène(C)	0,50	35%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Pyrène(C)	0,50	35%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Benzo[a]anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Chrysène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Benzo[b]fluoranthène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Benzo[k]fluoranthène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Benzo[a]pyrène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Dibenzo[a,h]anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Benzo[g,h,i]pérylène(C)	0,50	30%	mg/kg brut	< 0,50 (LQ)
Somme 16 HAP			mg/kg brut	≤ 8,0

REMARQUES

- Date de préparation de l'échantillon : 04/03/2026
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

ITGA S.A.
Destinataire rÈsultats et AR

3 rue Armand Herpin Lacroix
CS n°46537
35065 RENNES

Les rÈsultats et les conclusions Èventuelles ne se rapportent quí‡ líÈchantillon soumis ‡ líanalyse et tel quíil a ÈtÈ reÁu au laboratoire. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisÈe que sous la forme de fac-similÈ photographique intÈgral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque líinformation est fournie par le client. En outre, le laboratoire ne saurait Í tre tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la validitÈ des rÈsultats.
Dans le cas o˘ le laboratoire nía pas ÈtÈ chargÈ de líÈtape díÈchantillonnage, les rÈsultats síappliquent ‡ líÈchantillon tel quíil a ÈtÈ reÁu.
Les activitÈs de laboratoire sont rÈalisÈes au sein de SOCOR ‡ DECHY, hormis les paramËtres Èventuellement sous-traitÈs qui sont rÈalisÈs chez le sous-traitant, dont líadresse est indiquÈe sur son rapport díessais joint
Les paramËtres sous-traitÈs sont identifiÈs par (*).
La rÈfÈrence de líÈchantillon, sa nature, ainsi que la date de prÈlËvement, si celui-ci a ÈtÈ rÈalisÈ par le client, sont des informations fournies par ce dernier.

Identification dossier : SOC26-3235 **RÈference contrat :** SOCC25-676
Identification rapport : SOC2603-191 V1 **Identification Èchantillon : SOC2603-191**

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4
RÈfÈrence client : 002BM002401 - 4 n°122 - Toiture et ÈtanchÈitÈ - RevÍ tement Bitumineux d'ÈtanchÈitÈ - Bandes Bitumineuses - Vol 91
Nature: (PRODUITS SOLIDES - D..CHETS SOLIDES)
PrÈlËvement : PrÈlevÈ le 19/02/2026 ‡ 00h00 RÈceptionnÈ le 02/03/2026 EnregistrÈ le 02/03/2026
PrÈlevÈ par le client

Les donnÈes concernant la rÈception, la conservation, le traitement analytique de l'Èchantillon et les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour dÈclarer, ou non, la conformitÈ ‡ la spÈcification, il n'a pas ÈtÈ tenu explicitement compte de l'incertitude associÈe au rÈsultat.

Date de dÈbut d'analyse le 11/03/2026

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ	
Analyse sur le produit						
Analyse de base						
PrÈparation/Broyage d'un Èchantillon	-	-	NF EN ISO 21646	NA		
ComposÈs organiques						
HAP						
FluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (b) fluoranthËne	1.61	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
Benzo (k) fluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (a) pyrËne	0.67	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
Benzo (ghi) pÈrylËne	0.91	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
IndÈno (1,2,3 cd) PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AnthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AcÈnaphtËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
ChrysËne	0.92	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		

.../...

SOCOR

Rapport d'analyse Page 2 / 2
EditÈ le : 17/03/2026
Identification rapport: SOC2603-191 V1
Destinataire : ITGA S.A.

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ	
Dibenzo (a,h) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
FluorËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
NaphtalËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
PhÈnanthrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AcÈnaphtylËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (a) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Somme des 16 HAP	<10.110	mg/kg	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		

DÈtection : Q : QuantifiÈ D : DÈtectÈ ND : Non DÈtectÈ NA : Non Applicable N.M. = Non MesurÈ

HAP PRD BITUMI HAP sur produits bitumineux

La rÈsolution chromatographique ne permet pas la sÈparation complËte du triphÈnylËne et du chrysËne. La contribution du triphÈnylËne au signal attribuÈ au chrysËne ne peut Í tre ni nÈgligÈe ni ÈvaluÈe de maniËre fiable.

Anne-Marie IRMER
RÈfÈrent EnrobÈs



EditÈ le : 17/03/2026

ITGA S.A.
Destinataire rÈsultats et AR

3 rue Armand Herpin Lacroix
CS n°46537
35065 RENNES

Les rÈsultats et les conclusions Èventuelles ne se rapportent quí‡ líÈchantillon soumis ‡ líanalyse et tel quíil a ÈtÈ reÁu au laboratoire. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisÈe que sous la forme de fac-similÈ photographique intÈgral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque líinformation est fournie par le client. En outre, le laboratoire ne saurait Í tre tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la validitÈ des rÈsultats.
Dans le cas o˘ le laboratoire nía pas ÈtÈ chargÈ de líÈtape díÈchantillonnage, les rÈsultats síappliquent ‡ líÈchantillon tel quíil a ÈtÈ reÁu.
Les activitÈs de laboratoire sont rÈalisÈes au sein de SOCOR ‡ DECHY, hormis les paramËtres Èventuellement sous-traitÈs qui sont rÈalisÈs chez le sous-traitant, dont líadresse est indiquÈe sur son rapport díessais joint
Les paramËtres sous-traitÈs sont identifiÈs par (*).
La rÈfÈrence de líÈchantillon, sa nature, ainsi que la date de prÈlËvement, si celui-ci a ÈtÈ rÈalisÈ par le client, sont des informations fournies par ce dernier.

Identification dossier : SOC26-3235 **RÈference contrat :** SOCC25-676
Identification rapport : SOC2603-196 V1 **Identification Èchantillon : SOC2603-196**

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4
RÈfÈrence client : 002BM002401 - 4 n°123 - Toiture et ÈtanchÈitÈ - RevÍ tement Bitumineux d'ÈtanchÈitÈ - Complexe d'ÈtanchÈitÈ - Vol 91
Nature: (PRODUITS SOLIDES - D..CHETS SOLIDES)
PrÈlËvement : PrÈlevÈ le 19/02/2026 ‡ 00h00 RÈceptionnÈ le 02/03/2026 EnregistrÈ le 02/03/2026
PrÈlevÈ par le client

Les donnÈes concernant la rÈception, la conservation, le traitement analytique de l'Èchantillon et les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour dÈclarer, ou non, la conformitÈ ‡ la spÈcification, il n'a pas ÈtÈ tenu explicitement compte de l'incertitude associÈe au rÈsultat.

Date de dÈbut d'analyse le 11/03/2026

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ	
Analyse sur le produit						
Analyse de base						
PrÈparation/Broyage d'un Èchantillon	-	-	NF EN ISO 21646	NA		
ComposÈs organiques						
HAP						
FluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (b) fluoranthËne	1.17	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
Benzo (k) fluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (a) pyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (ghi) pÈrylËne	0.83	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
IndÈno (1,2,3 cd) PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AnthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AcÈnaphtËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
ChrysËne	0.88	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		

.../...

SOCOR

Rapport d'analyse Page 2 / 2
EditÈ le : 17/03/2026
Identification rapport: SOC2603-196 V1
Destinataire : ITGA S.A.

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ	
Dibenzo (a,h) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
FluorËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
NaphtalËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
PhÈnanthrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AcÈnaphtylËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (a) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Somme des 16 HAP	<9.380	mg/kg	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		

DÈtection : Q : QuantifiÈ D : DÈtectÈ ND : Non DÈtectÈ NA : Non Applicable N.M. = Non MesurÈ

HAP PRD BITUMI HAP sur produits bitumineux

La rÈsolution chromatographique ne permet pas la sÈparation complËte du triphÈnylËne et du chrysËne. La contribution du triphÈnylËne au signal attribuÈ au chrysËne ne peut Í tre ni nÈgligÈe ni ÈvaluÈe de maniËre fiable.

Anne-Marie IRMER
RÈfÈrent EnrobÈs



ITGA S.A.
Destinataire rÈsultats et AR

3 rue Armand Herpin Lacroix
CS n°46537
35065 RENNES

Les rÈsultats et les conclusions Èventuelles ne se rapportent quí‡ líÈchantillon soumis ‡ líanalyse et tel quíil a ÈtÈ reÁu au laboratoire. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisÈe que sous la forme de fac-similÈ photographique intÈgral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque líinformation est fournie par le client. En outre, le laboratoire ne saurait Í tre tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la validitÈ des rÈsultats.
Dans le cas o˘ le laboratoire nía pas ÈtÈ chargÈ de líÈtape díÈchantillonnage, les rÈsultats síappliquent ‡ líÈchantillon tel quíil a ÈtÈ reÁu.
Les activitÈs de laboratoire sont rÈalisÈes au sein de SOCOR ‡ DECHY, hormis les paramËtres Èventuellement sous-traitÈs qui sont rÈalisÈs chez le sous-traitant, dont líadresse est indiquÈe sur son rapport díessais joint
Les paramËtres sous-traitÈs sont identifiÈs par (*).
La rÈfÈrence de líÈchantillon, sa nature, ainsi que la date de prÈlËvement, si celui-ci a ÈtÈ rÈalisÈ par le client, sont des informations fournies par ce dernier.

Identification dossier : SOC26-3235 **RÈference contrat :** SOCC25-676
Identification rapport : SOC2603-197 V1 **Identification Èchantillon : SOC2603-197**

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4
RÈfÈrence client : 002BM002401 - 4 n°124 - Toiture et ÈtanchÈitÈ - RevÍ tement Bitumineux d'ÈtanchÈitÈ - Pare-vapeur - Vol 91
Nature: (PRODUITS SOLIDES - D..CHETS SOLIDES)
PrÈlËvement : PrÈlevÈ le 19/02/2026 ‡ 00h00 RÈceptionnÈ le 02/03/2026 EnregistrÈ le 02/03/2026
PrÈlevÈ par le client

Les donnÈes concernant la rÈception, la conservation, le traitement analytique de l'Èchantillon et les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour dÈclarer, ou non, la conformitÈ ‡ la spÈcification, il n'a pas ÈtÈ tenu explicitement compte de l'incertitude associÈe au rÈsultat.

Date de dÈbut d'analyse le 11/03/2026

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ
Analyse sur le produit					
Analyse de base					
PrÈparation/Broyage d'un Èchantillon	-	-	NF EN ISO 21646	NA	
ComposÈs organiques					
HAP					
FluoranthËne	1.06	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
Benzo (b) fluoranthËne	2.52	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
Benzo (k) fluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
Benzo (a) pyrËne	2.07	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
Benzo (ghi) pÈrylËne	1.17	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
IndÈno (1,2,3 cd) PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
AnthracËne	1.82	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
AcÈnaphtËne	8.03	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
ChrysËne	2.77	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	

.../...

SOCOR

Rapport d'analyse Page 2 / 2
EditÈ le : 17/03/2026
Identification rapport: SOC2603-197 V1
Destinataire : ITGA S.A.

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ	
Dibenzo (a,h) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
FluorËne	1.70	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
NaphtalËne	1.02	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
PyrËne	1.90	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
PhÈnanthrËne	11.41	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
AcÈnaphtylËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (a) anthracËne	1.55	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
Somme des 16 HAP	<39.020	mg/kg	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		

DÈtection : Q : QuantifiÈ D : DÈtectÈ ND : Non DÈtectÈ NA : Non Applicable N.M. = Non MesurÈ

HAP PRD BITUMI HAP sur produits bitumineux

La rÈsolution chromatographique ne permet pas la sÈparation complËte du triphÈnylËne et du chrysËne. La contribution du triphÈnylËne au signal attribuÈ au chrysËne ne peut Í tre ni nÈgligÈe ni ÈvaluÈe de maniËre fiable.

Anne-Marie IRMER
RÈfÈrent EnrobÈs



ITGA S.A.
Destinataire rÈsultats et AR

3 rue Armand Herpin Lacroix
CS n°46537
35065 RENNES

Les rÈsultats et les conclusions Èventuelles ne se rapportent quí‡ líÈchantillon soumis ‡ líanalyse et tel quíil a ÈtÈ reÁu au laboratoire. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisÈe que sous la forme de fac-similÈ photographique intÈgral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque líinformation est fournie par le client. En outre, le laboratoire ne saurait Í tre tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la validitÈ des rÈsultats.
Dans le cas o˘ le laboratoire nía pas ÈtÈ chargÈ de líÈtape díÈchantillonnage, les rÈsultats síappliquent ‡ líÈchantillon tel quíil a ÈtÈ reÁu.
Les activitÈs de laboratoire sont rÈalisÈes au sein de SOCOR ‡ DECHY, hormis les paramËtres Èventuellement sous-traitÈs qui sont rÈalisÈs chez le sous-traitant, dont líadresse est indiquÈe sur son rapport díessais joint
Les paramËtres sous-traitÈs sont identifiÈs par (*).
La rÈfÈrence de líÈchantillon, sa nature, ainsi que la date de prÈlËvement, si celui-ci a ÈtÈ rÈalisÈ par le client, sont des informations fournies par ce dernier.

Identification dossier : SOC26-3235 **RÈference contrat :** SOCC25-676
Identification rapport : SOC2603-198 V1 **Identification Èchantillon : SOC2603-198**

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4
RÈfÈrence client : 002BM002401 - 4 n°125 - Toiture et ÈtanchÈitÈ - RevÍ tement Bitumineux d'ÈtanchÈitÈ - Complexe d'ÈtanchÈitÈ - Vol 91
Nature: (PRODUITS SOLIDES - D..CHETS SOLIDES)
PrÈlËvement : PrÈlevÈ le 19/02/2026 ‡ 00h00 RÈceptionnÈ le 02/03/2026 EnregistrÈ le 02/03/2026
PrÈlevÈ par le client

Les donnÈes concernant la rÈception, la conservation, le traitement analytique de l'Èchantillon et les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour dÈclarer, ou non, la conformitÈ ‡ la spÈcification, il n'a pas ÈtÈ tenu explicitement compte de l'incertitude associÈe au rÈsultat.

Date de dÈbut d'analyse le 11/03/2026

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ	
Analyse sur le produit						
Analyse de base						
PrÈparation/Broyage d'un Èchantillon	-	-	NF EN ISO 21646	NA		
ComposÈs organiques						
HAP						
FluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (b) fluoranthËne	1.96	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
Benzo (k) fluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (a) pyrËne	1.58	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
Benzo (ghi) pÈrylËne	1.06	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
IndÈno (1,2,3 cd) PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AnthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AcÈnaphtËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
ChrysËne	1.77	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		

.../...

SOCOR

Rapport d'analyse Page 2 / 2
EditÈ le : 17/03/2026
Identification rapport: SOC2603-198 V1
Destinataire : ITGA S.A.

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ	
Dibenzo (a,h) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
FluorËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
NaphtalËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
PyrËne	1.05	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
PhÈnanthrËne	0.66	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
AcËnaphtylËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (a) anthracËne	0.65	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
Somme des 16 HAP	<13.230	mg/kg	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		

DÈtection : Q : QuantifiÈ D : DÈtectÈ ND : Non DÈtectÈ NA : Non Applicable N.M. = Non MesurÈ

HAP PRD BITUMI HAP sur produits bitumineux

La rÈsolution chromatographique ne permet pas la sÈparation complËte du triphÈnylËne et du chrysËne. La contribution du triphÈnylËne au signal attribuÈ au chrysËne ne peut Í tre ni nÈgligÈe ni ÈvaluÈe de maniËre fiable.

Anne-Marie IRMER
RÈfÈrent EnrobÈs



ITGA S.A.
Destinataire rÈsultats et AR

3 rue Armand Herpin Lacroix
CS n°46537
35065 RENNES

Les rÈsultats et les conclusions Èventuelles ne se rapportent quí‡ líÈchantillon soumis ‡ líanalyse et tel quíil a ÈtÈ reÁu au laboratoire. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisÈe que sous la forme de fac-similÈ photographique intÈgral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque líinformation est fournie par le client. En outre, le laboratoire ne saurait Í tre tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la validitÈ des rÈsultats.
Dans le cas o˘ le laboratoire nía pas ÈtÈ chargÈ de líÈtape díÈchantillonnage, les rÈsultats síappliquent ‡ líÈchantillon tel quíil a ÈtÈ reÁu.
Les activitÈs de laboratoire sont rÈalisÈes au sein de SOCOR ‡ DECHY, hormis les paramËtres Èventuellement sous-traitÈs qui sont rÈalisÈs chez le sous-traitant, dont líadresse est indiquÈe sur son rapport díessais joint
Les paramËtres sous-traitÈs sont identifiÈs par (*).
La rÈfÈrence de líÈchantillon, sa nature, ainsi que la date de prÈlËvement, si celui-ci a ÈtÈ rÈalisÈ par le client, sont des informations fournies par ce dernier.

Identification dossier : SOC26-3235 **RÈference contrat :** SOCC25-676
Identification rapport : SOC2603-199 V1 **Identification Èchantillon : SOC2603-199**

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4
RÈfÈrence client : 002BM002401 - 4 n°126 - Toiture et ÈtanchÈitÈ - RevÍ tement Bitumineux d'ÈtanchÈitÈ - Complexe d'ÈtanchÈitÈ - Vol 91
Nature: (PRODUITS SOLIDES - D..CHETS SOLIDES)
PrÈlËvement : PrÈlevÈ le 19/02/2026 ‡ 00h00 RÈceptionnÈ le 02/03/2026 EnregistrÈ le 02/03/2026 PrÈlevÈ par le client

Les donnÈes concernant la rÈception, la conservation, le traitement analytique de l'Èchantillon et les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour dÈclarer, ou non, la conformitÈ ‡ la spÈcification, il n'a pas ÈtÈ tenu explicitement compte de l'incertitude associÈe au rÈsultat.

Date de dÈbut d'analyse le 11/03/2026

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ
Analyse sur le produit					
Analyse de base					
PrÈparation/Broyage d'un Èchantillon	-	-	NF EN ISO 21646	NA	
ComposÈs organiques					
HAP					
FluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
Benzo (b) fluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
Benzo (k) fluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
Benzo (a) pyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
Benzo (ghi) pÈrylËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
IndÈno (1,2,3 cd) PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
AnthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
AcÈnaphtËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
ChrysËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	

.../...

SOCOR

Rapport d'analyse Page 2 / 2
EditÈ le : 17/03/2026
Identification rapport: SOC2603-199 V1
Destinataire : ITGA S.A.

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ	
Dibenzo (a,h) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
FluorËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
NaphtalËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
PhÈnanthrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AcÈnaphtylËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (a) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Somme des 16 HAP	<8.000	mg/kg	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		

DÈtection : Q : QuantifiÈ D : DÈtectÈ ND : Non DÈtectÈ NA : Non Applicable N.M. = Non MesurÈ

HAP PRD BITUMI HAP sur produits bitumineux

La rÈsolution chromatographique ne permet pas la sÈparation complËte du triphÈnylËne et du chrysËne. La contribution du triphÈnylËne au signal attribuÈ au chrysËne ne peut Í tre ni nÈgligÈe ni ÈvaluÈe de maniËre fiable.

Anne-Marie IRMER
RÈfÈrent EnrobÈs



EditÈ le : 17/03/2026

ITGA S.A.
Destinataire rÈsultats et AR

3 rue Armand Herpin Lacroix
CS n°46537
35065 RENNES

Les rÈsultats et les conclusions Èventuelles ne se rapportent quí‡ líÈchantillon soumis ‡ líanalyse et tel quíil a ÈtÈ reÁu au laboratoire. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisÈe que sous la forme de fac-similÈ photographique intÈgral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque líinformation est fournie par le client. En outre, le laboratoire ne saurait Í tre tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la validitÈ des rÈsultats.
Dans le cas o˘ le laboratoire nía pas ÈtÈ chargÈ de líÈtape díÈchantillonnage, les rÈsultats síappliquent ‡ líÈchantillon tel quíil a ÈtÈ reÁu.
Les activitÈs de laboratoire sont rÈalisÈes au sein de SOCOR ‡ DECHY, hormis les paramËtres Èventuellement sous-traitÈs qui sont rÈalisÈs chez le sous-traitant, dont líadresse est indiquÈe sur son rapport díessais joint
Les paramËtres sous-traitÈs sont identifiÈs par (*).
La rÈfÈrence de líÈchantillon, sa nature, ainsi que la date de prÈlËvement, si celui-ci a ÈtÈ rÈalisÈ par le client, sont des informations fournies par ce dernier.

Identification dossier : SOC26-3235 **RÈference contrat :** SOCC25-676
Identification rapport : SOC2603-200 V1 **Identification Èchantillon : SOC2603-200**

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4
RÈfÈrence client : 002BM002401 - 4 n°127 - Toiture et ÈtanchÈitÈ - RevÍ tement Bitumineux d'ÈtanchÈitÈ - Pare-vapeur - Vol 91
Nature: (PRODUITS SOLIDES - D..CHETS SOLIDES)
PrÈlËvement : PrÈlevÈ le 19/02/2026 ‡ 00h00 RÈceptionnÈ le 02/03/2026 EnregistrÈ le 02/03/2026
PrÈlevÈ par le client

Les donnÈes concernant la rÈception, la conservation, le traitement analytique de l'Èchantillon et les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour dÈclarer, ou non, la conformitÈ ‡ la spÈcification, il n'a pas ÈtÈ tenu explicitement compte de l'incertitude associÈe au rÈsultat.

Date de dÈbut d'analyse le 11/03/2026

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ
Analyse sur le produit					
Analyse de base					
PrÈparation/Broyage d'un Èchantillon	-	-	NF EN ISO 21646	NA	
ComposÈs organiques					
HAP					
FluoranthËne	0.57	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
Benzo (b) fluoranthËne	1.83	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
Benzo (k) fluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
Benzo (a) pyrËne	1.33	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
Benzo (ghi) pÈrylËne	0.92	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
IndÈno (1,2,3 cd) PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
AnthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
AcÈnaphtËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
ChrysËne	2.42	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	

.../...

SOCOR

Rapport d'analyse Page 2 / 2
EditÈ le : 17/03/2026
Identification rapport: SOC2603-200 V1
Destinataire : ITGA S.A.

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ
Dibenzo (a,h) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
FluorËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
NaphtalËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
PyrËne	1.32	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
PhÈnanthrËne	1.83	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
AcÈnaphtylËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
Benzo (a) anthracËne	1.24	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
Somme des 16 HAP	<15.460	mg/kg	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	

DÈtection : Q : QuantifiÈ D : DÈtectÈ ND : Non DÈtectÈ NA : Non Applicable N.M. = Non MesurÈ

HAP PRD BITUMI HAP sur produits bitumineux

La rÈsolution chromatographique ne permet pas la sÈparation complËte du triphÈnylËne et du chrysËne. La contribution du triphÈnylËne au signal attribuÈ au chrysËne ne peut Í tre ni nÈgligÈe ni ÈvaluÈe de maniËre fiable.

Anne-Marie IRMER
RÈfÈrent EnrobÈs



EditÈ le : 17/03/2026

ITGA S.A.
Destinataire rÈsultats et AR

3 rue Armand Herpin Lacroix
CS n°46537
35065 RENNES

Les rÈsultats et les conclusions Èventuelles ne se rapportent quí‡ líÈchantillon soumis ‡ líanalyse et tel quíil a ÈtÈ reÁu au laboratoire. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisÈe que sous la forme de fac-similÈ photographique intÈgral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque líinformation est fournie par le client. En outre, le laboratoire ne saurait Í tre tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la validitÈ des rÈsultats.
Dans le cas o˘ le laboratoire nía pas ÈtÈ chargÈ de líÈtape díÈchantillonnage, les rÈsultats síappliquent ‡ líÈchantillon tel quíil a ÈtÈ reÁu.
Les activitÈs de laboratoire sont rÈalisÈes au sein de SOCOR ‡ DECHY, hormis les paramËtres Èventuellement sous-traitÈs qui sont rÈalisÈs chez le sous-traitant, dont líadresse est indiquÈe sur son rapport díessais joint
Les paramËtres sous-traitÈs sont identifiÈs par (*).
La rÈfÈrence de líÈchantillon, sa nature, ainsi que la date de prÈlËvement, si celui-ci a ÈtÈ rÈalisÈ par le client, sont des informations fournies par ce dernier.

Identification dossier : SOC26-3235 **RÈference contrat :** SOCC25-676
Identification rapport : SOC2603-201 V1 **Identification Èchantillon : SOC2603-201**

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4
RÈfÈrence client : 002BM002401 - 4 n°128 - Toiture et ÈtanchÈitÈ - RevÍ tement Bitumineux d'ÈtanchÈitÈ - Bandes Bitumineuses - Vol 91
Nature: (PRODUITS SOLIDES - D..CHETS SOLIDES)
PrÈlËvement : PrÈlevÈ le 19/02/2026 ‡ 00h00 RÈceptionnÈ le 02/03/2026 EnregistrÈ le 02/03/2026
PrÈlevÈ par le client

Les donnÈes concernant la rÈception, la conservation, le traitement analytique de l'Èchantillon et les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour dÈclarer, ou non, la conformitÈ ‡ la spÈcification, il n'a pas ÈtÈ tenu explicitement compte de l'incertitude associÈe au rÈsultat.

Date de dÈbut d'analyse le 11/03/2026

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ
Analyse sur le produit					
Analyse de base					
PrÈparation/Broyage d'un Èchantillon	-	-	NF EN ISO 21646	NA	
ComposÈs organiques					
HAP					
FluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
Benzo (b) fluoranthËne	1.36	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
Benzo (k) fluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
Benzo (a) pyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
Benzo (ghi) pÈrylËne	0.65	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	
IndÈno (1,2,3 cd) PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
AnthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
AcÈnaphtËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND	
ChrysËne	1.18	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q	

.../...

SOCOR

Rapport d'analyse Page 2 / 2
EditÈ le : 17/03/2026
Identification rapport: SOC2603-201 V1
Destinataire : ITGA S.A.

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ	
Dibenzo (a,h) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
FluorËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
NaphtalËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
PhÈnanthrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AcÈnaphtylËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (a) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Somme des 16 HAP	<9.690	mg/kg	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		

DÈtection : Q : QuantifiÈ D : DÈtectÈ ND : Non DÈtectÈ NA : Non Applicable N.M. = Non MesurÈ

HAP PRD BITUMI HAP sur produits bitumineux

La rÈsolution chromatographique ne permet pas la sÈparation complËte du triphÈnylËne et du chrysËne. La contribution du triphÈnylËne au signal attribuÈ au chrysËne ne peut Í tre ni nÈgligÈe ni ÈvaluÈe de maniËre fiable.

Anne-Marie IRMER
RÈfÈrent EnrobÈs



ITGA S.A.
Destinataire rÈsultats et AR

3 rue Armand Herpin Lacroix
CS n°46537
35065 RENNES

Les rÈsultats et les conclusions Èventuelles ne se rapportent quí‡ líÈchantillon soumis ‡ líanalyse et tel quíil a ÈtÈ reÁu au laboratoire. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisÈe que sous la forme de fac-similÈ photographique intÈgral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque líinformation est fournie par le client. En outre, le laboratoire ne saurait Í tre tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la validitÈ des rÈsultats.
Dans le cas o˘ le laboratoire nía pas ÈtÈ chargÈ de líÈtape díÈchantillonnage, les rÈsultats síappliquent ‡ líÈchantillon tel quíil a ÈtÈ reÁu.
Les activitÈs de laboratoire sont rÈalisÈes au sein de SOCOR ‡ DECHY, hormis les paramËtres Èventuellement sous-traitÈs qui sont rÈalisÈs chez le sous-traitant, dont líadresse est indiquÈe sur son rapport díessais joint
Les paramËtres sous-traitÈs sont identifiÈs par (*).
La rÈfÈrence de líÈchantillon, sa nature, ainsi que la date de prÈlËvement, si celui-ci a ÈtÈ rÈalisÈ par le client, sont des informations fournies par ce dernier.

Identification dossier : SOC26-3235 **RÈference contrat :** SOCC25-676
Identification rapport : SOC2603-202 V1 **Identification Èchantillon : SOC2603-202**

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4
RÈfÈrence client : 002BM002401 - 4 n°129 - Toiture et ÈtanchÈitÈ - RevÍ tement Bitumineux d'ÈtanchÈitÈ - Complexe d'ÈtanchÈitÈ - Vol 91
Nature: (PRODUITS SOLIDES - D..CHETS SOLIDES)
PrÈlËvement : PrÈlevÈ le 19/02/2026 ‡ 00h00 RÈceptionnÈ le 02/03/2026 EnregistrÈ le 02/03/2026 PrÈlevÈ par le client

Les donnÈes concernant la rÈception, la conservation, le traitement analytique de l'Èchantillon et les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Pour dÈclarer, ou non, la conformitÈ ‡ la spÈcification, il n'a pas ÈtÈ tenu explicitement compte de l'incertitude associÈe au rÈsultat.

Date de dÈbut d'analyse le 11/03/2026

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ	
Analyse sur le produit						
Analyse de base						
PrÈparation/Broyage d'un Èchantillon	-	-	NF EN ISO 21646	NA		
ComposÈs organiques						
HAP						
FluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (b) fluoranthËne	1.08	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
Benzo (k) fluoranthËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (a) pyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (ghi) pÈrylËne	0.65	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		
IndÈno (1,2,3 cd) PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AnthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AcÈnaphtËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
ChrysËne	0.99	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	Q		

.../...

EditÈ le : 17/03/2026
Identification rapport: SOC2603-202 V1
Destinataire : ITGA S.A.

Doc Adm Client : IT1126-3576 / 002BM002401-4

ParamËtres analytiques	RÈsultats	UnitÈs	MÈthodes	Detection	RÈfÈrences de qualitÈ	
Dibenzo (a,h) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
FluorËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
NaphtalËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
PyrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
PhÈnanthrËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
AcÈnaphtylËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Benzo (a) anthracËne	<0.5	mg/kg sec	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		
Somme des 16 HAP	<9.220	mg/kg	Traitement par ultrasons GC/MS - NF EN 17503	ND		

DÈtection : Q : QuantifiÈ D : DÈtectÈ ND : Non DÈtectÈ NA : Non Applicable N.M. = Non MesurÈ

HAP PRD BITUMI HAP sur produits bitumineux


La rÈsolution chromatographique ne permet pas la sÈparation complËte du triphÈnylËne et du chrysËne. La contribution du triphÈnylËne au signal attribuÈ au chrysËne ne peut Í tre ni nÈgligÈe ni ÈvaluÈe de maniËre fiable.

Anne-Marie IRMER
RÈfÈrent EnrobÈs



ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

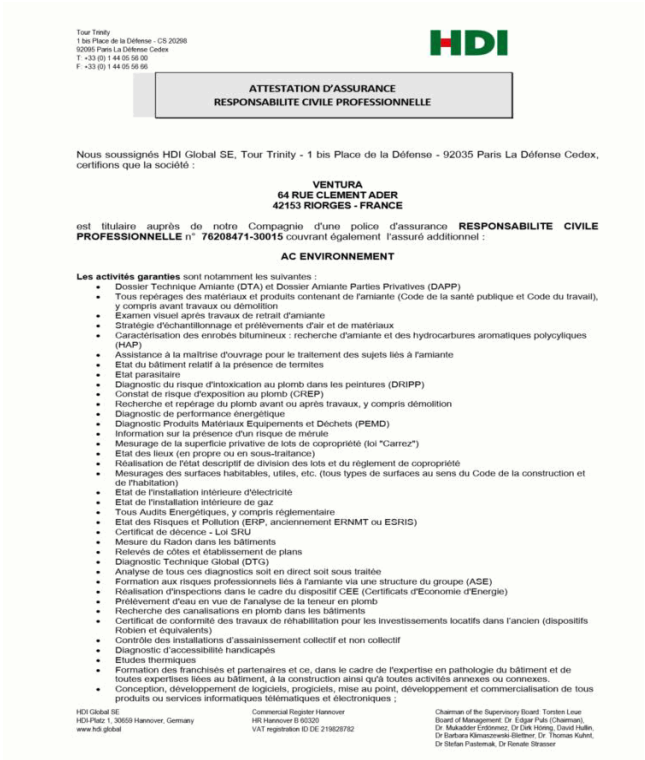

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman), Dr. Mukaddder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2

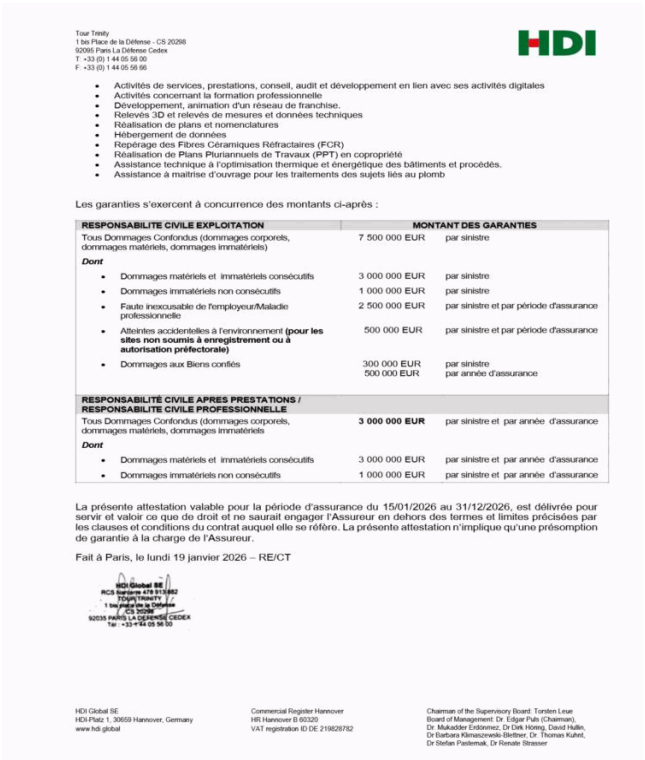

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman), Dr. Mukaddder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI4978



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4978 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (2) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 26/09/2024.

(1) Arrêté du 16 juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 16 juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI4978



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4978 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (2) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 26/09/2024.

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19
