Diagramme de Gantt

COVALENCE ARCHITECTES
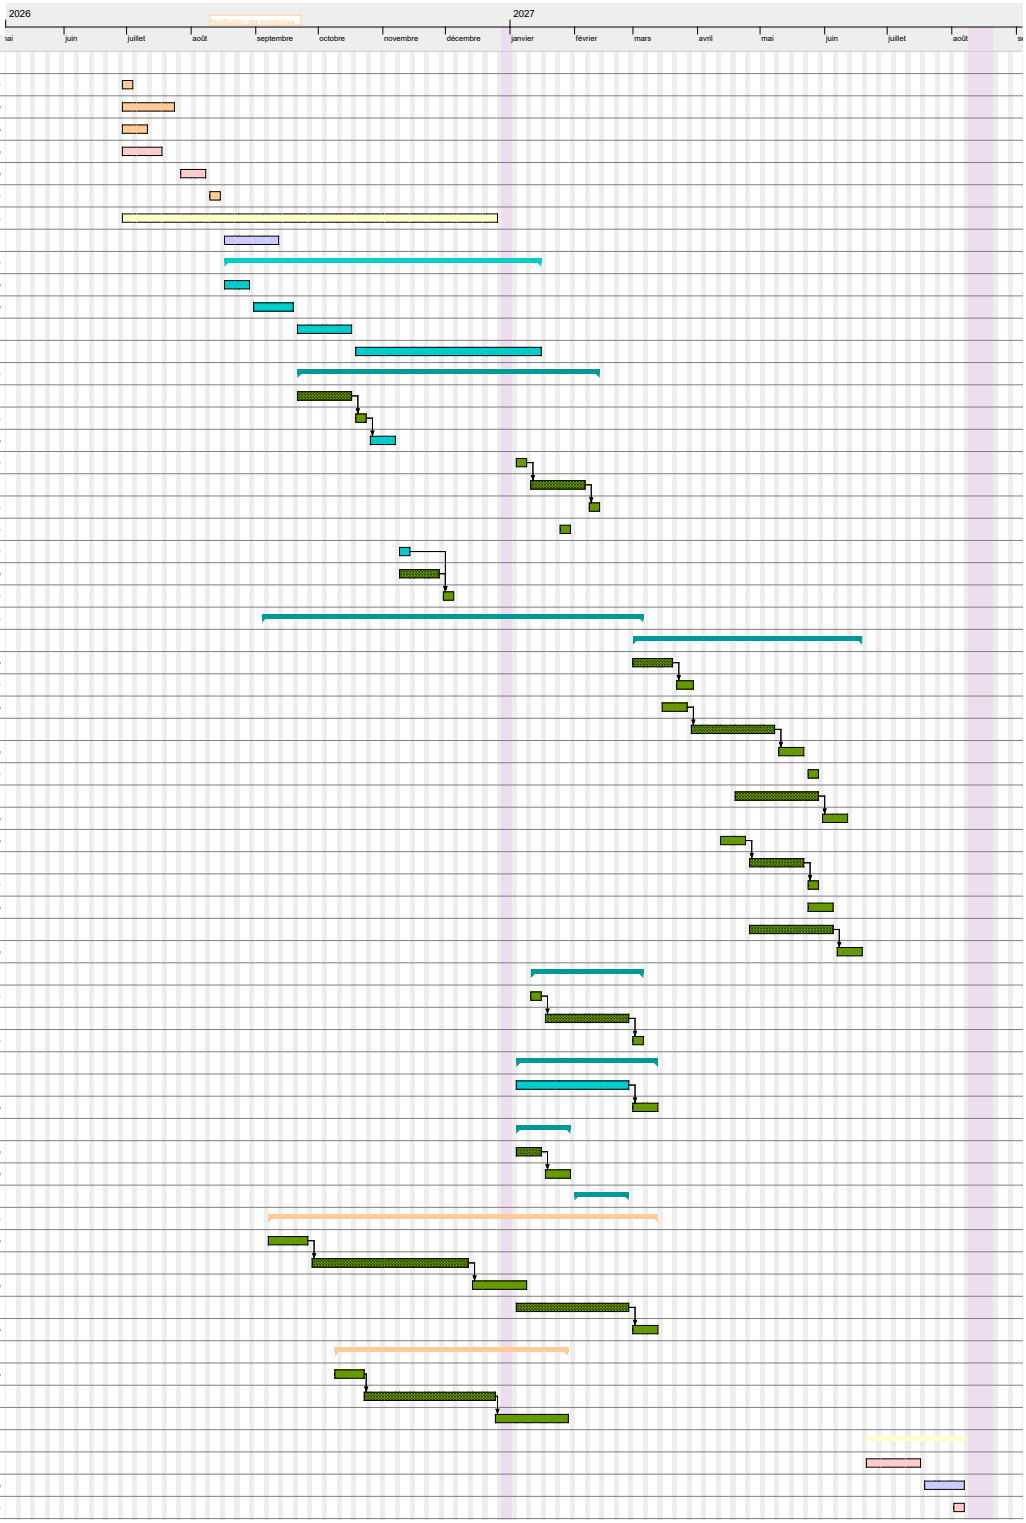
Nom	Date de début	Date de fin	Durée
Instruction du dossier SSI	03/11/2025	27/02/2026	75.0 day
Publication de l'offre	29/06/2026	03/07/2026	5.0 day
Consultation des entreprises	29/06/2026	23/07/2026	19.0 day
Visites de site des entreprises	29/06/2026	10/07/2026	10.0 day
Questions/réponses	29/06/2026	17/07/2026	15.0 day
Analyse des offres	27/07/2026	07/08/2026	10.0 day
Notification des entreprises	10/08/2026	14/08/2026	5.0 day
Instruction permis de construire	29/06/2026	25/12/2026	130.0 day
Periode de préparation + plans d'exécution + commande fournitures	17/08/2026	11/09/2026	20.0 day
Cafétéria et sanitaires	17/08/2026	15/01/2027	105.0 day
Cloisonnement de chantier provisoire (hors marché)	17/08/2026	28/08/2026	10.0 day
Installations communes de chantier	31/08/2026	18/09/2026	15.0 day
Curage et déposes (WC et Cafétéria - Site) semaines 52-53	21/09/2026	16/10/2026	20.0 day
Aménagement WC et Cafétéria	19/10/2026	15/01/2027	60.0 day
Galerie Bernard	21/09/2026	12/02/2027	100.0 day
Fabrication menuiserie recoupement (Atelier)	21/09/2026	16/10/2026	20.0 day
Pose menuiserie recoupement (site)	19/10/2026	23/10/2026	5.0 day
Pose cloison recoupement (site)	26/10/2026	06/11/2026	10.0 day
Restauration de menuiserie extérieure (dépose)	04/01/2027	08/01/2027	5.0 day
Restauration de menuiserie extérieure (Atelier)	11/01/2027	05/02/2027	20.0 day
Restauration de menuiserie extérieure (repose)	08/02/2027	12/02/2027	5.0 day
Traitement menuiserie extérieure (site)	25/01/2027	29/01/2027	5.0 day
Doublage coupe-feu (site)	09/11/2026	13/11/2026	5.0 day
Traitement menuiserie intérieure (Atelier)	09/11/2026	27/11/2026	15.0 day
Traitement menuiserie intérieure (Site)	30/11/2026	04/12/2026	5.0 day
Galerie Dumas	04/09/2026	05/03/2027	126.0 day
Galerie Richelieu	01/03/2027	18/06/2027	80.0 day
Fabrication cantonnement (Atelier)	01/03/2027	19/03/2027	15.0 day
Pose cantonnement (Site)	22/03/2027	29/03/2027	6.0 day
Traitement menuiserie extérieure (dépose)	15/03/2027	26/03/2027	10.0 day
Traitement menuiserie extérieure (Atelier)	29/03/2027	07/05/2027	30.0 day
Repose menuiserie extérieure (site)	10/05/2027	21/05/2027	10.0 day
Remplacement menuiserie extérieure (dépose)	24/05/2027	28/05/2027	5.0 day
Fabricaiton menuiserie extérieure (Atelier)	19/04/2027	28/05/2027	30.0 day
Pose menuiserie extérieure (Site)	31/05/2027	11/06/2027	10.0 day
Traitement menuiserie intérieure (dépose)	12/04/2027	23/04/2027	10.0 day
Traitement menuiserie intérieure (Atelier)	26/04/2027	21/05/2027	20.0 day
Repose menuiserie intérieure (site)	24/05/2027	28/05/2027	5.0 day
Remplacement menuiserie intérieure (dépose)	24/05/2027	04/06/2027	10.0 day
Fabrication menuiserie intérieure (Atelier)	26/04/2027	04/06/2027	30.0 day
Pose menuiserie intérieure (site)	07/06/2027	18/06/2027	10.0 day
Galerie Sorbon	11/01/2027	05/03/2027	40.0 day
Traitement menuiseries extérieures (dépose)	11/01/2027	15/01/2027	5.0 day
Traitement menuiseries extérieures (Atelier)	18/01/2027	26/02/2027	30.0 day
Repose menuiseries extérieures (site)	01/03/2027	05/03/2027	5.0 day
Galerie secondaire	04/01/2027	12/03/2027	50.0 day
Travaux de maçonnerie	04/01/2027	26/02/2027	40.0 day
Menuiseries intérieures (site)	01/03/2027	12/03/2027	10.0 day
Galerie des Sciences	04/01/2027	29/01/2027	20.0 day
Fabrication de poignées (Atelier)	04/01/2027	15/01/2027	10.0 day
Révision menuiseries extérieures (site)	18/01/2027	29/01/2027	10.0 day
Galerie des Lettes	01/02/2027	26/02/2027	20.0 day
Escalier J (Atelier)	07/09/2026	12/03/2027	130.0 day
Dépose menuiseries	07/09/2026	25/09/2026	15.0 day
Modifications menuiseries (Atelier)	28/09/2026	11/12/2026	55.0 day
Repose menuiseries	14/12/2026	08/01/2027	15.0 day
Menuiseries intérieures (Fabrication Atelier)	04/01/2027	26/02/2027	40.0 day
Menuiseries intérieures (Pose site)	01/03/2027	12/03/2027	10.0 day
Escalier N	09/10/2026	28/01/2027	75.0 day
Dépose menuiseries	09/10/2026	22/10/2026	10.0 day
Fabrication menuiseries	23/10/2026	24/12/2026	45.0 day
Pose menuiseries	25/12/2026	28/01/2027	20.0 day
Réception	21/06/2027	06/08/2027	35.0 day
OPR	21/06/2027	16/07/2027	20.0 day
Levée de réserves	19/07/2027	06/08/2027	15.0 day
Réception de chantier	02/08/2027	06/08/2027	5.0 day
