AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE ARCUEIL

16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : 0178121300
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

EPAURIF
103 Rue Réaumur
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002KN000189-5
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 09/12/2019
Reférence mandataire :
EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_

DÉSIGNATION DU BIEN

Université Paris-Dauphine - Réhabilitation
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 PARIS

PROPRIÉTAIRE

EPAURIF
103 Rue Réaumur
7 5 0 0 2 P A R I S 2 E M E ARRONDISSEMENT

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Présence

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.
Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS

Référence client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation

Désignation : Université Paris-Dauphine - Réhabilitation

Date de construction : Avant 1970

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
EPAURIF
103 Rue Réaumur
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT

Donneur d'ordre :
EPAURIF
103 Rue Réaumur
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : CHAMLAL NAIM
Accompagnateur : LENFANT, Paris Dauphine ()
Date de repérage 09/12/2019
Numéro attestation : DT 1812-003
Délivré le : 20/12/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC – 1 Rue René Anjolvy – 94250 GENTILLY

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)
Date du rapport : 30/12/2019
Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (validité début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019)

A Riorges, le 30/12/2019

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	Plan sous-sol -2 - Vol 2 (Parking centre)
Plan sous-sol -2 - Vol 3 (SP 203)	Plan sous-sol -2 - Vol 4 (Réserve DI)
Plan sous-sol -2 - Vol 6 (SP 200)	Plan sous-sol -2 - Vol 7 (SP 202)
Plan sous-sol -2 - Vol 8 (Ventilation amphi)	Plan sous-sol -2 - Vol 9 (TGBT A)
Plan sous-sol -2 - Vol 10 (CTA)	Plan sous-sol -2 - Vol 13 (SC 202)
Plan sous-sol -2 - Vol 14 (Esc)	Plan sous-sol -2 - Vol 15 (Esc)
Plan sous-sol -2 - Vol 16 (SB 207)	Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)
Plan sous-sol -2 - Vol 19 (SB 203)	Plan sous-sol -2 - Vol 20 (Esc)
Plan sous-sol -2 - Vol 22	Plan sous-sol -2 - Vol 24
Plan sous-sol -2 - Vol 25	Plan sous-sol -2 - Vol 27
Plan sous-sol -2 - Vol 29	Plan sous-sol -2 - Vol 31
Plan sous-sol -2 - Vol 32	Plan sous-sol -2 - Vol 33
Plan sous-sol -2 - Vol 34	Plan sous-sol -2 - Vol 35
Plan sous-sol -2 - Vol 36	Plan sous-sol -2 - Vol 37

Plan sous-sol -2 - Vol 38	Plan sous-sol -2 - Vol 39
Plan sous-sol -2 - Vol 40	Plan sous-sol -2 - Vol 41
Plan sous-sol -2 - Vol 43	Plan sous-sol -2 - Vol 44
Plan sous-sol -2 - Vol 45	Plan sous-sol -2 - Vol 46
Plan sous-sol -2 - Vol 47	Plan sous-sol -2 - Vol 48
Plan sous-sol -2 - Vol 49	Plan sous-sol -2 - Vol 50
Plan sous-sol -2 - Vol 51	Plan sous-sol -2 - Vol 52
Plan sous-sol -2 - Vol 53	Plan sous-sol -2 - Vol 54
Plan sous-sol -2 - Vol 55	Plan sous-sol -2 - Vol 56
Plan sous-sol -2 - Vol 57	Plan sous-sol -2 - Vol 58
Plan sous-sol -2 - Vol 59	Plan sous-sol -2 - Vol 60
Plan sous-sol -2 - Vol 61	Plan sous-sol -2 - Vol 62
Plan sous-sol -2 - Vol 63	Plan sous-sol -2 - Vol 64
Plan sous-sol -2 - Vol 65 (SD200)	Plan sous-sol -2 - Vol 66
Plan sous-sol -2 - Vol 69	Plan sous-sol -2 - Vol 71
Plan sous-sol -2 - Vol 72	Plan sous-sol -2 - Vol 73
Plan sous-sol -2 - Vol 74	Plan sous-sol -2 - Vol 75
Plan sous-sol -2 - Vol 76	Plan sous-sol -2 - Vol 77
Plan sous-sol -2 - Vol 78	Plan sous-sol -2 - Vol 79
Plan sous-sol -2 - Vol 80	Plan sous-sol -2 - Vol 81
Plan sous-sol -2 - Vol 82	Plan sous-sol -2 - Vol 83
Plan sous-sol -2 - Vol 84	Plan sous-sol -2 - Vol 85
Plan sous-sol -1 - Vol 86	Plan sous-sol -1 - Vol 87
Plan sous-sol -1 - Vol 88	Plan sous-sol -1 - Vol 89
Plan sous-sol -1 - Vol 90	Plan sous-sol -1 - Vol 91
Plan sous-sol -1 - Vol 92	Plan sous-sol -1 - Vol 95
Plan sous-sol -1 - Vol 96	Plan sous-sol -1 - Vol 97
Plan sous-sol -1 - Vol 99	Plan sous-sol -1 - Vol 100
Plan sous-sol -1 - Vol 106	Plan sous-sol -1 - Vol 107
Plan sous-sol -1 - Vol 108	Plan sous-sol -1 - Vol 110
Plan sous-sol -1 - Vol 111	Plan sous-sol -1 - Vol 113
Plan sous-sol -1 - Vol 114	Plan sous-sol -1 - Vol 115
Plan sous-sol -1 - Vol 116	Plan sous-sol -1 - Vol 117
Plan sous-sol -1 - Vol 118	Plan sous-sol -1 - Vol 128
Plan sous-sol -1 - Vol 129	Plan sous-sol -1 - Vol 133
Plan sous-sol -1 - Vol 134	Plan sous-sol -1 - Vol 135
Plan sous-sol -1 - Vol 136	Plan sous-sol -1 - Vol 138
Plan sous-sol -1 - Vol 139	Plan sous-sol -1 - Vol 140
Plan sous-sol -1 - Vol 141	Plan sous-sol -1 - Vol 142
Plan sous-sol -1 - Vol 143	Plan sous-sol -1 - Vol 144
Plan sous-sol -1 - Vol 145	Plan sous-sol -1 - Vol 146
Plan sous-sol -1 - Vol 147	Plan sous-sol -1 - Vol 148
Plan sous-sol -1 - Vol 149	Plan sous-sol -1 - Vol 152

Plan sous-sol -1 - Vol 156	Plan sous-sol -1 - Vol 157
Plan sous-sol -1 - Vol 158	Plan sous-sol -1 - Vol 159 (S/B106)
Plan sous-sol -1 - Vol 160	Plan sous-sol -1 - Vol 161
Plan sous-sol -1 - Vol 162	Plan sous-sol -1 - Vol 163
Plan sous-sol -1 - Vol 164	Plan sous-sol -1 - Vol 165
Plan sous-sol -1 - Vol 166	Plan sous-sol -1 - Vol 167
Plan sous-sol -1 - Vol 168	Plan sous-sol -1 - Vol 169
Plan sous-sol -1 - Vol 170	Plan sous-sol -1 - Vol 171
Plan sous-sol -1 - Vol 172	Plan sous-sol -1 - Vol 173
Plan sous-sol -1 - Vol 174	Plan sous-sol -1 - Vol 175
Plan sous-sol -1 - Vol 176	Plan sous-sol -1 - Vol 177
Plan sous-sol -1 - Vol 178	Plan sous-sol -1 - Vol 179
Plan sous-sol -1 - Vol 180	Plan sous-sol -1 - Vol 181
Plan sous-sol -1 - Vol 182	Plan sous-sol -1 - Vol 183
Plan sous-sol -1 - Vol 184	Plan sous-sol -1 - Vol 185
Plan sous-sol -1 - Vol 186	Plan sous-sol -1 - Vol 187
Plan sous-sol -1 - Vol 188	Plan sous-sol -1 - Vol 189
Plan sous-sol -1 - Vol 190	Plan sous-sol -1 - Vol 191
Plan sous-sol -1 - Vol 192	Plan sous-sol -1 - Vol 193
Plan sous-sol -1 - Vol 194	Plan sous-sol -1 - Vol 197
Plan sous-sol -1 - Vol 198	Plan sous-sol -1 - Vol 242
Plan sous-sol -1 - Vol 243	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)
Plan sous-sol -2 - Vol 252	Plan sous-sol -2 - Vol 253
Plan sous-sol -2 - Vol 254	Plan sous-sol -2 - Vol 255
Plan Rdc - Vol 256	Plan Rdc - Vol 258
Plan Rdc - Vol 259	Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)
Plan Rdc - Vol 262 (B004)	Plan Rdc - Vol 263
Plan Rdc - Vol 264	Plan Rdc - Vol 265 (B000)
Plan Rdc - Vol 266	Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)
Plan R+1 - Vol 268	Plan R+1 - Vol 269
Plan R+1 - Vol 270 (100)	Plan R+1 - Vol 271 (101)
Plan R+1 - Vol 272	Plan R+1 - Vol 273 (103)
Plan R+1 - Vol 274 (105)	Plan R+1 - Vol 275 (P107)
Plan R+1 - Vol 276 (P115)	Plan R+1 - Vol 277
Plan R+1 - Vol 278	Plan R+1 - Vol 279
Plan R+1 - Vol 280	Plan R+1 - Vol 281
Plan sous-sol -1 - Vol 284	Plan Rdc - Vol 285 (P026)
Plan R+2 - Vol 286 (P209)	Plan R+2 - Vol 287
Plan R+3 - Vol 288	Plan R+3 - Vol 289 (P321)
Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)	Plan R+4 - Vol 291 (P427)
Plan R+5 - Vol 292 (P517)	Plan R+5 - Vol 293 (P518)
Plan R+5 - Vol 294 (P535)	Plan R+6 - Vol 295
Plan R+6 - Vol 296 (P611)	Plan R+6 - Vol 297

Plan R+1 - Vol 298 (P104)	Plan R+1 - Vol 299 (P104 bis)
Plan R+1 - Vol 300 (P106)	Plan R+1 - Vol 301 (P108)
Plan R+1 - Vol 302 (P110)	Plan R+1 - Vol 303 (P112)
Plan R+1 - Vol 304 (P114)	Plan R+1 - Vol 305 (P116)
Plan R+1 - Vol 306 (P118)	Plan R+1 - Vol 307 (P109)
Plan R+1 - Vol 308 (P111)	Plan R+1 - Vol 309 (P113)
Plan R+1 - Vol 310 (P117)	Plan R+1 - Vol 311 (P119)
Plan R+1 - Vol 312 (P121)	Plan R+1 - Vol 313
Plan R+1 - Vol 314	Plan R+1 - Vol 315
Plan R+1 - Vol 316	Plan R+1 - Vol 317
Plan R+1 - Vol 318	Plan R+1 - Vol 319
Plan Rdc - Vol 320 (B026)	Plan R+1 - Vol 321 (B105)
Plan R+2 - Vol 322 (B212)	Plan R+2 - Vol 323 (B225)
Plan R+2 - Vol 324 (B223)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)
Plan R+4 - Vol 326 (B408)	Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)
Plan R+5 - Vol 328 (B530)	Plan R+5 - Vol 329 (B532)
Plan R+6 - Vol 330 (B606)	Plan R+6 - Vol 331 (B632)
Plan R+6 - Vol 332 (B644)	Plan R+6 - Vol 333 (C614)
Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)
Plan R+5 - Vol 336 (D512)	Plan R+5 - Vol 337 (B516)
Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Plan R+4 - Vol 339 (D409)
Plan R+4 - Vol 340 (D414)	Plan R+4 - Vol 341 (C408)
Plan R+1 - Vol 342 (P171)	Plan R+1 - Vol 343 (D111)
Plan R+1 - Vol 344 (D110)	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)
Plan R+6 - Vol 346 (Ascenseur)	Plan Rdc - Vol 347 (Ascenseur)
Plan R+1 - Vol 348 (Palier et escalier)	Plan R+2 - Vol 349 (Palier et escalier)
Plan R+3 - Vol 350 (Palier et escalier)	Plan R+4 - Vol 351 (Palier et escalier)
Plan R+5 - Vol 352 (Palier et escalier)	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)
Plan Rdc - Vol 354	Plan Rdc - Vol 355
Plan R+6 - Vol 356	Plan R+6 - Vol 357
Plan R+6 - Vol 358	Plan R+6 - Vol 359
Plan R+6 - Vol 360	Plan R+6 - Vol 361
Plan R+6 - Vol 362	Plan R+4 - Vol 363
Plan R+4 - Vol 364	Plan R+4 - Vol 365
Plan R+4 - Vol 366	Plan R+5 - Vol 367
Plan R+5 - Vol 368	Plan R+5 - Vol 369
Plan R+5 - Vol 370	Plan R+3 - Vol 371
Plan R+3 - Vol 372	Plan R+3 - Vol 373
Plan R+2 - Vol 374	Plan R+2 - Vol 375
Plan R+2 - Vol 376	Plan R+2 - Vol 377
Plan R+1 - Vol 378	Plan R+1 - Vol 379
Plan R+1 - Vol 380	Plan Rdc - Vol 381
Plan Rdc - Vol 382	Plan Rdc - Vol 383

Plan Rdc - Vol 384	Plan Rdc - Vol 385
Plan R+2 - Vol 386	Plan R+5 - Vol 387
Plan R+4 - Vol 388	Plan R+4 - Vol 389
Plan R+3 - Vol 390	Plan R+1 - Vol 391 (P136)
Plan R+1 - Vol 392 (P143)	Plan R+1 - Vol 393
Plan R+1 - Vol 394 (P147)	Plan R+1 - Vol 395
Plan R+1 - Vol 396	Plan R+2 - Vol 397
Plan R+2 - Vol 398	Plan R+2 - Vol 399
Plan R+2 - Vol 400	Plan R+2 - Vol 401
Plan R+2 - Vol 402	Plan R+2 - Vol 403
Plan R+2 - Vol 404	Plan R+3 - Vol 405
Plan R+3 - Vol 406	Plan R+3 - Vol 407
Plan R+3 - Vol 408	Plan R+3 - Vol 409
Plan R+3 - Vol 410	Plan R+3 - Vol 411
Plan R+3 - Vol 412	Plan R+3 - Vol 413
Plan R+3 - Vol 414	Plan R+3 - Vol 415
Plan R+3 - Vol 416	Plan R+5 - Vol 417 (P504)
Plan R+5 - Vol 418 (P501)	Plan R+5 - Vol 419 (P506)
Plan R+5 - Vol 420 (P508)	Plan R+5 - Vol 421 (P505)
Plan R+5 - Vol 422 (P510)	Plan R+5 - Vol 423 (P509)
Plan R+5 - Vol 424 (P513)	Plan R+5 - Vol 425 (P521)
Plan R+1 - Vol 426 (P134)	Plan R+1 - Vol 427
Plan R+1 - Vol 428	Plan R+1 - Vol 429
Plan R+1 - Vol 430 (P149)	Plan R+1 - Vol 431 (P145)
Plan R+2 - Vol 432	Plan R+2 - Vol 433
Plan R+2 - Vol 434	Plan R+2 - Vol 435
Plan R+2 - Vol 436	Plan R+2 - Vol 437
Plan R+2 - Vol 438	Plan R+2 - Vol 439
Plan R+2 - Vol 440	Plan R+2 - Vol 441
Plan R+2 - Vol 442	Plan R+2 - Vol 443
Plan R+2 - Vol 444	Plan R+2 - Vol 445
Plan R+2 - Vol 446	Plan R+2 - Vol 447
Plan R+2 - Vol 448	Plan R+2 - Vol 449
Plan R+2 - Vol 450	Plan R+2 - Vol 451
Plan R+2 - Vol 452	Plan R+2 - Vol 453
Plan R+2 - Vol 454	Plan R+3 - Vol 455
Plan R+3 - Vol 456	Plan R+3 - Vol 457
Plan R+3 - Vol 458	Plan R+3 - Vol 459
Plan R+3 - Vol 460	Plan R+3 - Vol 461
Plan R+3 - Vol 462	Plan R+3 - Vol 463
Plan R+3 - Vol 464	Plan R+3 - Vol 465
Plan R+3 - Vol 466	Plan R+3 - Vol 467
Plan R+3 - Vol 468	Plan R+3 - Vol 469

Plan R+3 - Vol 470	Plan R+3 - Vol 471
Plan R+3 - Vol 472	Plan R+3 - Vol 473
Plan R+3 - Vol 474	Plan R+3 - Vol 475
Plan R+3 - Vol 476	Plan R+4 - Vol 477
Plan R+4 - Vol 478	Plan R+4 - Vol 479
Plan R+4 - Vol 480	Plan R+4 - Vol 481
Plan R+4 - Vol 482	Plan R+4 - Vol 483
Plan R+4 - Vol 484	Plan R+4 - Vol 485
Plan R+4 - Vol 486	Plan R+4 - Vol 487
Plan R+4 - Vol 488	Plan R+4 - Vol 489
Plan R+4 - Vol 490	Plan R+4 - Vol 491
Plan R+4 - Vol 492	Plan R+4 - Vol 493
Plan R+4 - Vol 494	Plan R+4 - Vol 495
Plan R+4 - Vol 496	Plan R+4 - Vol 497
Plan R+4 - Vol 498	Plan R+4 - Vol 499
Plan R+4 - Vol 500	Plan R+4 - Vol 501
Plan R+4 - Vol 502	Plan R+4 - Vol 503
Plan R+4 - Vol 504	Plan R+4 - Vol 505
Plan R+4 - Vol 506	Plan R+4 - Vol 507
Plan R+4 - Vol 508	Plan R+4 - Vol 509
Plan R+4 - Vol 510	Plan R+4 - Vol 511
Plan R+4 - Vol 512	Plan R+4 - Vol 513
Plan R+4 - Vol 514	Plan R+4 - Vol 515
Plan R+4 - Vol 516	Plan R+4 - Vol 517
Plan R+4 - Vol 518	Plan R+4 - Vol 519
Plan R+4 - Vol 520	Plan R+4 - Vol 521
Plan R+4 - Vol 522	Plan R+4 - Vol 523
Plan R+4 - Vol 524	Plan R+4 - Vol 525
Plan R+4 - Vol 526	Plan R+4 - Vol 527
Plan R+4 - Vol 528	Plan R+5 - Vol 529
Plan R+5 - Vol 530	Plan R+5 - Vol 531
Plan R+5 - Vol 532	Plan R+5 - Vol 533
Plan R+5 - Vol 534	Plan R+5 - Vol 535
Plan R+5 - Vol 536	Plan R+5 - Vol 537
Plan R+5 - Vol 538	Plan R+5 - Vol 539
Plan R+5 - Vol 540	Plan R+5 - Vol 541
Plan R+5 - Vol 542	Plan R+5 - Vol 543
Plan R+5 - Vol 544	Plan R+5 - Vol 545
Plan R+5 - Vol 546	Plan R+5 - Vol 547
Plan R+5 - Vol 548	Plan R+5 - Vol 549
Plan R+5 - Vol 550	Plan R+6 - Vol 551
Plan R+6 - Vol 552	Plan R+6 - Vol 553
Plan R+6 - Vol 554	Plan R+6 - Vol 555

Plan R+6 - Vol 556	Plan R+6 - Vol 557
Plan R+6 - Vol 558	Plan R+6 - Vol 559
Plan R+6 - Vol 560	Plan R+6 - Vol 561
Plan R+6 - Vol 562	Plan R+6 - Vol 563
Plan R+6 - Vol 564	Plan R+6 - Vol 565
Plan R+6 - Vol 566	Plan R+6 - Vol 567
Plan R+6 - Vol 568	Plan R+6 - Vol 569
Plan R+6 - Vol 570	Plan R+6 - Vol 571
Plan R+6 - Vol 572	Plan R+6 - Vol 573
Plan R+6 - Vol 574	Plan R+6 - Vol 575
Plan R+6 - Vol 576	Plan R+6 - Vol 577
Plan R+6 - Vol 578	Plan R+6 - Vol 579
Plan R+6 - Vol 580	Plan R+6 - Vol 581
Plan R+6 - Vol 582	Plan R+6 - Vol 583
Plan R+6 - Vol 584	Plan R+6 - Vol 585
Plan R+6 - Vol 586	Plan R+6 - Vol 587
Plan R+6 - Vol 588	Plan R+6 - Vol 589
Plan R+6 - Vol 590	Plan R+6 - Vol 591
Plan R+6 - Vol 592	Plan R+6 - Vol 593
Plan R+6 - Vol 594	Plan R+6 - Vol 595
Plan R+6 - Vol 596	Plan R+6 - Vol 597
Plan R+6 - Vol 598	Plan R+6 - Vol 599
Plan R+6 - Vol 600	Plan R+6 - Vol 601
Plan R+6 - Vol 602	Plan R+6 - Vol 603
Plan R+6 - Vol 604	Plan R+6 - Vol 605
Plan R+6 - Vol 606	Plan R+6 - Vol 607
Plan R+6 - Vol 608	Plan R+6 - Vol 609
Plan R+7 - Vol 610	Plan R+7 - Vol 611
Plan R+7 - Vol 612	Plan R+7 - Vol 613
Plan R+7 - Vol 614	Plan R+7 - Vol 615
Plan R+7 - Vol 616	Plan R+7 - Vol 618
Plan R+7 - Vol 619	Plan R+7 - Vol 620
Plan R+7 - Vol 623	Plan R+6 - Vol 624
Plan R+2 - Vol 625	Plan R+1 - Vol 626
Plan Rdc - Vol 627	Plan R+7 - Vol 628
Plan R+7 - Vol 630	Plan R+7 - Vol 631
Plan R+7 - Vol 632	Plan façade extérieur - Vol 633 (Façade extérieur)
Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur)	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)
Plan R+5 - Vol 636 Salle de reunion	Plan sous-sol -1 - Vol 637
Plan sous-sol -1 - Vol 638	Plan sous-sol -1 - Vol 639
Plan sous-sol -1 - Vol 640	Plan Rdc - Vol 641
Plan Rdc - Vol 642 (Couloir 1)	Plan Rdc - Vol 643 (Bureaux 3)
Plan Rdc - Vol 644 (Couloir 2)	Plan Rdc - Vol 645 (Bureaux 5)

Plan Rdc - Vol 646 (Couloir 3)	Plan Rdc - Vol 647 (Bureaux 7)
Plan Rdc - Vol 648 (Bureaux 8)	Plan Rdc - Vol 649 (Couloir 4)
Plan Rdc - Vol 650 (Bureaux 10)	Plan Rdc - Vol 651 (Bureaux 11)
Plan Rdc - Vol 652 (Bureaux 12)	Plan Rdc - Vol 653 (Bureaux 13)
Plan Rdc - Vol 654 (Bureaux 14)	Plan Rdc - Vol 655 (B028)
Plan Rdc - Vol 656 (B032)	Plan Rdc - Vol 657 (B038)
Plan Rdc - Vol 658 (B042)	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
Plan Rdc - Vol 660 (Escalier)	Plan Rdc - Vol 661
Plan Rdc - Vol 662 (Infirmerie 3)	Plan Rdc - Vol 664
Plan Rdc - Vol 665 (B048)	Plan Rdc - Vol 666 (Infirmerie 2)
Plan Rdc - Vol 667 (C013)	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)
Plan Rdc - Vol 669	Plan Rdc - Vol 670
Plan Rdc - Vol 671	Plan Rdc - Vol 672
Plan Rdc - Vol 673 (C005)	Plan Rdc - Vol 674
Plan Rdc - Vol 675	Plan Rdc - Vol 676 (PMRHC001)
Plan Rdc - Vol 677	Plan Rdc - Vol 678
Plan Rdc - Vol 679	Plan Rdc - Vol 680
Plan Rdc - Vol 681	Plan Rdc - Vol 682
Plan Rdc - Vol 683	Plan Rdc - Vol 684
Plan Rdc - Vol 685	Plan Rdc - Vol 686
Plan Rdc - Vol 687	Plan Rdc - Vol 688
Plan Rdc - Vol 689	Plan Rdc - Vol 690
Plan Rdc - Vol 691 (PMR009)	Plan Rdc - Vol 692
Plan Rdc - Vol 694	Plan Rdc - Vol 696 (Sureté)
Plan Rdc - Vol 697	Plan Rdc - Vol 698
Plan Rdc - Vol 699	Plan Rdc - Vol 700
Plan Rdc - Vol 701	Plan Rdc - Vol 702
Plan Rdc - Vol 703	Plan Rdc - Vol 704
Plan Rdc - Vol 705	Plan Rdc - Vol 706
Plan Rdc - Vol 707	Plan Rdc - Vol 708
Plan Rdc - Vol 709	Plan Rdc - Vol 710
Plan Rdc - Vol 711	Plan Rdc - Vol 712
Plan Rdc - Vol 713	Plan Rdc - Vol 714
Plan Rdc - Vol 715	Plan Rdc - Vol 716
Plan Rdc - Vol 717	Plan Rdc - Vol 718
Plan Rdc - Vol 719	Plan R+1 - Vol 720 (B100)
Plan R+1 - Vol 722	Plan R+1 - Vol 723
Plan R+1 - Vol 724 (B102)	Plan R+1 - Vol 725
Plan R+1 - Vol 726	Plan R+1 - Vol 727 (B102TER)
Plan R+1 - Vol 728 (B507)	Plan R+1 - Vol 729
Plan R+1 - Vol 730	Plan R+1 - Vol 731
Plan R+1 - Vol 732	Plan R+1 - Vol 733
Plan R+1 - Vol 734	Plan R+1 - Vol 735

Plan R+1 - Vol 736	Plan R+1 - Vol 737
Plan R+1 - Vol 738	Plan R+1 - Vol 739
Plan R+1 - Vol 740	Plan R+1 - Vol 742 (102)
Plan R+1 - Vol 751	Plan R+1 - Vol 752
Plan R+1 - Vol 755	Plan R+1 - Vol 758
Plan R+1 - Vol 760	Plan R+1 - Vol 761
Plan R+1 - Vol 762	Plan R+1 - Vol 772
Plan R+1 - Vol 774	Plan R+1 - Vol 775
Plan R+1 - Vol 776	Plan R+1 - Vol 777
Plan R+1 - Vol 780 (B112)	Plan R+1 - Vol 781 (B114)
Plan R+1 - Vol 783	Plan R+1 - Vol 784
Plan R+1 - Vol 785	Plan R+1 - Vol 786
Plan R+1 - Vol 787	Plan R+1 - Vol 788
Plan R+1 - Vol 789	Plan R+1 - Vol 790
Plan R+1 - Vol 791 (102b)	Plan R+1 - Vol 792 (102)
Plan R+1 - Vol 793	Plan R+1 - Vol 794 (120)
Plan R+1 - Vol 795 (132)	Plan R+1 - Vol 796 (133)
Plan R+1 - Vol 798	Plan R+1 - Vol 799
Plan R+1 - Vol 800	Plan R+1 - Vol 801
Plan R+1 - Vol 802	Plan R+1 - Vol 803
Plan R+1 - Vol 804	Plan R+1 - Vol 805
Plan R+1 - Vol 806	Plan R+1 - Vol 807
Plan R+1 - Vol 808	Plan R+1 - Vol 809
Plan R+1 - Vol 810	Plan R+1 - Vol 811
Plan R+1 - Vol 812	Plan R+1 - Vol 813
Plan R+1 - Vol 819	Plan R+1 - Vol 821
Plan R+1 - Vol 822	Plan R+1 - Vol 823
Plan R+1 - Vol 824	Plan R+1 - Vol 825
Plan R+1 - Vol 826	Plan R+1 - Vol 827
Plan R+1 - Vol 828	Plan R+1 - Vol 829
Plan R+1 - Vol 830	Plan R+1 - Vol 831
Plan R+1 - Vol 832	Plan R+1 - Vol 833
Plan R+1 - Vol 834	Plan R+1 - Vol 835
Plan R+1 - Vol 836	Plan R+1 - Vol 837
Plan R+1 - Vol 838	Plan R+2 - Vol 840
Plan R+2 - Vol 841	Plan R+2 - Vol 842
Plan R+2 - Vol 843	Plan R+2 - Vol 844
Plan R+2 - Vol 845	Plan R+2 - Vol 846
Plan R+2 - Vol 847	Plan R+2 - Vol 848
Plan R+2 - Vol 849	Plan R+2 - Vol 850
Plan R+2 - Vol 853	Plan R+2 - Vol 854
Plan R+2 - Vol 855	Plan R+2 - Vol 859
Plan R+2 - Vol 860	Plan R+2 - Vol 861

Plan R+2 - Vol 862	Plan R+2 - Vol 863
Plan R+2 - Vol 864	Plan R+2 - Vol 868
Plan R+2 - Vol 869	Plan R+2 - Vol 870
Plan R+2 - Vol 871	Plan R+2 - Vol 872
Plan R+2 - Vol 873	Plan R+2 - Vol 874
Plan R+2 - Vol 875	Plan R+2 - Vol 876
Plan R+2 - Vol 881	Plan R+2 - Vol 882
Plan R+2 - Vol 884	Plan R+2 - Vol 885
Plan R+2 - Vol 886	Plan R+2 - Vol 887
Plan R+2 - Vol 888	Plan R+2 - Vol 889
Plan R+2 - Vol 890	Plan R+2 - Vol 891
Plan R+2 - Vol 892	Plan R+2 - Vol 893
Plan R+2 - Vol 895	Plan R+2 - Vol 896
Plan R+2 - Vol 897	Plan R+2 - Vol 898
Plan R+2 - Vol 899	Plan R+2 - Vol 900
Plan R+2 - Vol 901	Plan R+2 - Vol 902
Plan R+2 - Vol 903	Plan R+2 - Vol 905
Plan R+2 - Vol 906	Plan R+2 - Vol 907
Plan R+2 - Vol 908	Plan R+2 - Vol 909 (P202)
Plan R+2 - Vol 910	Plan R+2 - Vol 911
Plan R+2 - Vol 912	Plan R+2 - Vol 913 (Bureaux 16)
Plan R+2 - Vol 914 (Bureaux 17)	Plan R+2 - Vol 915 (B211)
Plan R+2 - Vol 916	Plan R+2 - Vol 917
Plan R+2 - Vol 918	Plan R+2 - Vol 919
Plan R+2 - Vol 920 (B204)	Plan R+2 - Vol 921 (B202)
Plan R+2 - Vol 922	Plan R+2 - Vol 923 (B201)
Plan R+2 - Vol 924 (TFB202)	Plan R+2 - Vol 925 (THB201)
Plan R+3 - Vol 926	Plan R+3 - Vol 927
Plan R+3 - Vol 928	Plan R+3 - Vol 929
Plan R+3 - Vol 930	Plan R+3 - Vol 931
Plan R+3 - Vol 932	Plan R+3 - Vol 933
Plan R+3 - Vol 934	Plan R+3 - Vol 935
Plan R+3 - Vol 936 (B 307)	Plan R+3 - Vol 937
Plan R+3 - Vol 938	Plan R+3 - Vol 939
Plan R+3 - Vol 940	Plan R+3 - Vol 941
Plan R+3 - Vol 942	Plan R+3 - Vol 943
Plan R+3 - Vol 944	Plan R+3 - Vol 945
Plan R+3 - Vol 946	Plan R+3 - Vol 948
Plan R+3 - Vol 949	Plan R+3 - Vol 950
Plan R+3 - Vol 951	Plan R+3 - Vol 953
Plan R+3 - Vol 955	Plan R+3 - Vol 957
Plan R+3 - Vol 959	Plan R+3 - Vol 960
Plan R+3 - Vol 961	Plan R+3 - Vol 964

Plan R+3 - Vol 965	Plan R+3 - Vol 966
Plan R+3 - Vol 967	Plan R+3 - Vol 968
Plan R+3 - Vol 969	Plan R+3 - Vol 971
Plan R+3 - Vol 972	Plan R+3 - Vol 973
Plan R+3 - Vol 975	Plan R+3 - Vol 976
Plan R+3 - Vol 977	Plan R+3 - Vol 978
Plan R+3 - Vol 979	Plan R+3 - Vol 980
Plan R+3 - Vol 981	Plan R+3 - Vol 982
Plan R+3 - Vol 983	Plan R+3 - Vol 985
Plan R+3 - Vol 986	Plan R+4 - Vol 987
Plan R+4 - Vol 988	Plan R+4 - Vol 1000
Plan R+4 - Vol 1003	Plan R+4 - Vol 1011
Plan R+4 - Vol 1012 (B420)	Plan R+4 - Vol 1013
Plan R+4 - Vol 1017	Plan R+4 - Vol 1018
Plan R+4 - Vol 1019	Plan R+4 - Vol 1020
Plan R+4 - Vol 1021	Plan R+4 - Vol 1022
Plan R+4 - Vol 1023	Plan R+4 - Vol 1024
Plan R+4 - Vol 1025	Plan R+4 - Vol 1026
Plan R+4 - Vol 1027	Plan R+4 - Vol 1028
Plan R+4 - Vol 1029	Plan R+4 - Vol 1030
Plan R+4 - Vol 1031	Plan R+4 - Vol 1032
Plan R+4 - Vol 1033	Plan R+4 - Vol 1034
Plan R+4 - Vol 1035	Plan R+4 - Vol 1036
Plan R+4 - Vol 1037	Plan R+4 - Vol 1038
Plan R+4 - Vol 1039	Plan R+4 - Vol 1040
Plan R+4 - Vol 1041	Plan R+4 - Vol 1042
Plan R+4 - Vol 1043	Plan R+4 - Vol 1044
Plan R+4 - Vol 1045	Plan R+4 - Vol 1046
Plan R+4 - Vol 1047	Plan R+4 - Vol 1048
Plan R+4 - Vol 1049	Plan R+4 - Vol 1050
Plan R+4 - Vol 1051	Plan R+4 - Vol 1052
Plan R+4 - Vol 1053	Plan R+4 - Vol 1054
Plan R+4 - Vol 1055	Plan R+4 - Vol 1058
Plan R+4 - Vol 1059	Plan R+4 - Vol 1060
Plan R+4 - Vol 1064	Plan R+4 - Vol 1065
Plan R+4 - Vol 1066	Plan R+4 - Vol 1067
Plan R+4 - Vol 1068	Plan R+4 - Vol 1069
Plan R+4 - Vol 1070	Plan R+4 - Vol 1071
Plan R+4 - Vol 1072	Plan R+4 - Vol 1073
Plan R+4 - Vol 1074	Plan R+4 - Vol 1075
Plan R+4 - Vol 1076	Plan R+4 - Vol 1077
Plan R+4 - Vol 1078	Plan R+4 - Vol 1079
Plan R+4 - Vol 1080	Plan R+4 - Vol 1081

Plan R+4 - Vol 1082	Plan R+4 - Vol 1083
Plan R+4 - Vol 1084	Plan R+4 - Vol 1085
Plan R+4 - Vol 1087	Plan R+4 - Vol 1088
Plan R+4 - Vol 1089	Plan R+4 - Vol 1090
Plan R+4 - Vol 1091	Plan R+4 - Vol 1092
Plan R+4 - Vol 1093	Plan R+4 - Vol 1094
Plan R+4 - Vol 1095	Plan R+4 - Vol 1096
Plan R+4 - Vol 1097	Plan R+4 - Vol 1098
Plan R+4 - Vol 1099	Plan R+4 - Vol 1100
Plan R+4 - Vol 1101	Plan R+4 - Vol 1102
Plan R+4 - Vol 1103	Plan R+4 - Vol 1104
Plan R+4 - Vol 1105	Plan R+4 - Vol 1106
Plan R+4 - Vol 1107	Plan R+4 - Vol 1108
Plan R+4 - Vol 1109	Plan R+4 - Vol 1110
Plan R+4 - Vol 1111	Plan R+4 - Vol 1113
Plan R+4 - Vol 1114	Plan R+4 - Vol 1115
Plan R+4 - Vol 1116	Plan R+4 - Vol 1117
Plan R+5 - Vol 1118	Plan R+5 - Vol 1119
Plan R+5 - Vol 1121	Plan R+5 - Vol 1122
Plan R+5 - Vol 1123 (B505)	Plan R+5 - Vol 1124
Plan R+5 - Vol 1125	Plan R+5 - Vol 1126
Plan R+5 - Vol 1127	Plan R+5 - Vol 1128 (B513)
Plan R+5 - Vol 1129	Plan R+5 - Vol 1130
Plan R+5 - Vol 1131	Plan R+5 - Vol 1132
Plan R+5 - Vol 1133	Plan R+5 - Vol 1134
Plan R+5 - Vol 1135	Plan R+5 - Vol 1136
Plan R+5 - Vol 1137	Plan R+5 - Vol 1138
Plan R+5 - Vol 1139	Plan R+5 - Vol 1140
Plan R+5 - Vol 1141	Plan R+5 - Vol 1142
Plan R+5 - Vol 1143	Plan R+5 - Vol 1144
Plan R+5 - Vol 1145	Plan R+5 - Vol 1146 (B520b)
Plan R+5 - Vol 1147	Plan R+5 - Vol 1148
Plan R+5 - Vol 1149	Plan R+5 - Vol 1150
Plan R+5 - Vol 1151	Plan R+5 - Vol 1152
Plan R+5 - Vol 1153	Plan R+5 - Vol 1154
Plan R+5 - Vol 1155	Plan R+5 - Vol 1156
Plan R+5 - Vol 1157	Plan R+5 - Vol 1158
Plan R+5 - Vol 1159	Plan R+5 - Vol 1162
Plan R+5 - Vol 1164 (C516)	Plan R+5 - Vol 1165
Plan R+5 - Vol 1166	Plan R+5 - Vol 1167
Plan R+5 - Vol 1168	Plan R+5 - Vol 1169
Plan R+5 - Vol 1170	Plan R+5 - Vol 1171
Plan R+5 - Vol 1172	Plan R+5 - Vol 1173

Plan R+5 - Vol 1174	Plan R+5 - Vol 1175
Plan R+5 - Vol 1176	Plan R+5 - Vol 1177
Plan R+5 - Vol 1178	Plan R+5 - Vol 1179
Plan R+5 - Vol 1180	Plan R+5 - Vol 1181
Plan R+5 - Vol 1182	Plan R+5 - Vol 1183
Plan R+5 - Vol 1184	Plan R+5 - Vol 1185
Plan R+5 - Vol 1186	Plan R+5 - Vol 1187
Plan R+5 - Vol 1188	Plan R+5 - Vol 1189
Plan R+5 - Vol 1190	Plan R+5 - Vol 1194
Plan R+5 - Vol 1196	Plan R+5 - Vol 1197
Plan R+5 - Vol 1198	Plan R+5 - Vol 1199
Plan R+5 - Vol 1200	Plan R+5 - Vol 1201
Plan R+5 - Vol 1202	Plan R+5 - Vol 1203
Plan R+5 - Vol 1204	Plan R+5 - Vol 1205
Plan R+5 - Vol 1206	Plan R+5 - Vol 1207
Plan R+5 - Vol 1208	Plan R+5 - Vol 1209
Plan R+5 - Vol 1211	Plan R+5 - Vol 1212
Plan R+5 - Vol 1213	Plan R+5 - Vol 1214
Plan R+5 - Vol 1215	Plan R+5 - Vol 1216
Plan R+5 - Vol 1217	Plan R+5 - Vol 1218
Plan R+5 - Vol 1219	Plan R+5 - Vol 1220
Plan R+5 - Vol 1221	Plan R+5 - Vol 1222
Plan R+5 - Vol 1223	Plan R+5 - Vol 1224
Plan R+5 - Vol 1225	Plan R+5 - Vol 1226
Plan R+5 - Vol 1227	Plan R+5 - Vol 1231
Plan R+5 - Vol 1232	Plan R+5 - Vol 1238
Plan R+6 - Vol 1241	Plan R+6 - Vol 1242
Plan R+6 - Vol 1243	Plan R+6 - Vol 1244
Plan R+6 - Vol 1245	Plan R+6 - Vol 1246
Plan R+6 - Vol 1247	Plan R+6 - Vol 1248
Plan R+6 - Vol 1249	Plan R+6 - Vol 1250
Plan R+6 - Vol 1251	Plan R+6 - Vol 1252
Plan R+6 - Vol 1253	Plan R+6 - Vol 1254
Plan R+6 - Vol 1255	Plan R+6 - Vol 1256
Plan R+6 - Vol 1257	Plan R+6 - Vol 1258
Plan R+6 - Vol 1259	Plan R+6 - Vol 1260
Plan R+6 - Vol 1261	Plan R+6 - Vol 1262
Plan R+6 - Vol 1263	Plan R+6 - Vol 1264
Plan R+6 - Vol 1265	Plan R+6 - Vol 1266
Plan R+6 - Vol 1267	Plan R+6 - Vol 1268
Plan R+6 - Vol 1269	Plan R+6 - Vol 1270
Plan R+6 - Vol 1271	Plan R+6 - Vol 1272
Plan R+6 - Vol 1273	Plan R+6 - Vol 1274

Plan R+6 - Vol 1275	Plan R+6 - Vol 1276
Plan R+6 - Vol 1277	Plan R+6 - Vol 1278
Plan R+6 - Vol 1279	Plan R+6 - Vol 1280
Plan R+6 - Vol 1281	Plan R+6 - Vol 1282
Plan R+6 - Vol 1283	Plan R+6 - Vol 1284
Plan R+6 - Vol 1285	Plan R+6 - Vol 1286
Plan R+6 - Vol 1287	Plan R+6 - Vol 1288
Plan R+6 - Vol 1289	Plan R+6 - Vol 1290
Plan R+6 - Vol 1291	Plan R+6 - Vol 1292
Plan R+6 - Vol 1293	Plan R+6 - Vol 1294
Plan R+6 - Vol 1295	Plan R+6 - Vol 1296
Plan R+6 - Vol 1297	Plan R+6 - Vol 1298
Plan R+6 - Vol 1299	Plan R+6 - Vol 1300
Plan R+6 - Vol 1301	Plan R+6 - Vol 1302
Plan R+6 - Vol 1303	Plan R+6 - Vol 1304
Plan R+6 - Vol 1305	Plan R+6 - Vol 1306
Plan R+6 - Vol 1307	Plan R+6 - Vol 1308
Plan R+6 - Vol 1309	Plan R+6 - Vol 1310
Plan R+6 - Vol 1311	Plan R+6 - Vol 1312
Plan R+6 - Vol 1313	Plan R+6 - Vol 1314
Plan R+6 - Vol 1315	Plan R+6 - Vol 1316
Plan R+6 - Vol 1317	Plan R+6 - Vol 1318
Plan R+6 - Vol 1319	Plan R+6 - Vol 1320
Plan R+6 - Vol 1321	Plan R+6 - Vol 1322
Plan R+6 - Vol 1323	Plan R+6 - Vol 1324
Plan R+6 - Vol 1325	Plan R+6 - Vol 1326
Plan R+6 - Vol 1327	Plan R+6 - Vol 1328
Plan R+6 - Vol 1329	Plan R+6 - Vol 1330
Plan R+6 - Vol 1331	Plan R+6 - Vol 1332
Plan R+6 - Vol 1333	Plan R+6 - Vol 1334
Plan R+6 - Vol 1335	Plan R+6 - Vol 1336
Plan R+6 - Vol 1337	Plan R+6 - Vol 1338
Plan R+6 - Vol 1339	Plan R+6 - Vol 1341
Plan R+6 - Vol 1342	Plan R+6 - Vol 1343
Plan R+6 - Vol 1344	Plan R+6 - Vol 1345
Plan R+6 - Vol 1346	Plan R+6 - Vol 1347
Plan R+6 - Vol 1348	Plan R+6 - Vol 1349
Plan R+6 - Vol 1350	Plan R+6 - Vol 1351
Plan R+6 - Vol 1352	Plan R+6 - Vol 1353
Plan R+6 - Vol 1354	Plan R+6 - Vol 1355
Plan R+6 - Vol 1356	Plan R+6 - Vol 1358
Plan R+6 - Vol 1359	Plan R+6 - Vol 1360
Plan R+6 - Vol 1361	Plan R+6 - Vol 1362

Plan R+6 - Vol 1363	Plan R+2 - Vol 1364
Plan R+2 - Vol 1365	Plan R+2 - Vol 1366
Plan R+2 - Vol 1367	Plan R+2 - Vol 1368
Plan R+2 - Vol 1369	Plan R+2 - Vol 1370
Plan R+2 - Vol 1371	Plan R+2 - Vol 1372
Plan R+2 - Vol 1373	Plan R+4 - Vol 1374
Plan R+6 - Vol 1375	Plan R+6 - Vol 1376 (Cour intérieure 1)
Plan R+6 - Vol 1377	Plan R+6 - Vol 1378
Plan R+5 - Vol 1379	Plan R+5 - Vol 1380
Plan R+5 - Vol 1381	Plan R+5 - Vol 1382
Plan R+5 - Vol 1383	Plan Rdc - Vol 1384
Plan Rdc - Vol 1385	Plan R+2 - Vol 1386
Plan Rdc - Vol 1387	Plan Rdc - Vol 1388
Plan R+5 - Vol 1389	Plan R+4 - Vol 1390
Plan Rdc - Vol 1391 (Cour intérieure 2)	Plan R+6 - Vol 1392
Plan R+5 - Vol 1393	Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)
Plan Rdc - Vol 1395 (Rampe Sortie)	Plan R+4 - Vol 1396
Plan R+4 - Vol 1397	Plan R+4 - Vol 1398
Plan R+4 - Vol 1399	Plan R+4 - Vol 1400
Plan R+4 - Vol 1401	Plan R+4 - Vol 1402
Plan R+4 - Vol 1403	Plan R+4 - Vol 1404
Plan R+4 - Vol 1405	Plan Rdc - Vol 1406
Plan Rdc - Vol 1407 (Esc P8)	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)
Plan Rdc - Vol 1409 (Parvis)	Plan R+1 - Vol 1410
Plan R+1 - Vol 1411	Plan R+1 - Vol 1412
Plan R+1 - Vol 1413 (P142)	Plan R+1 - Vol 1414 (P140)
Plan R+1 - Vol 1415	Plan R+1 - Vol 1416 (C117)
Plan R+1 - Vol 1417 (C131)	Plan Rdc - Vol 1418 (Ext Sud)
Plan R+2 - Vol 1419	Plan R+2 - Vol 1420
Plan R+2 - Vol 1421 (THA8)	Plan R+2 - Vol 1424 (TFA8)
Plan R+2 - Vol 1425 (C201)	Plan R+2 - Vol 1427
Plan R+1 - Vol 1428 (Salle F)	Plan R+1 - Vol 1430
Plan R+1 - Vol 1431	Plan R+1 - Vol 1432
Plan R+3 - Vol 1433 (ZF0201VH)	Plan R+3 - Vol 1434
Plan R+3 - Vol 1435	Plan R+3 - Vol 1436
Plan R+3 - Vol 1438	Plan Rdc - Vol 1443 (OUEST)
Plan Rdc - Vol 1444 (EST)	Plan R+4 - Vol 1446
Plan R+4 - Vol 1450	Plan R+4 - Vol 1451
Plan R+4 - Vol 1452	Plan R+4 - Vol 1453
Plan R+5 - Vol 1454	Plan R+5 - Vol 1455
Plan R+5 - Vol 1456	Plan R+5 - Vol 1457
Plan R+5 - Vol 1458	Plan R+5 - Vol 1459
Plan R+5 - Vol 1461	Plan R+5 - Vol 1462

Local fioul - Vol 1463 (Local fioul)	Plan sous-sol -1 - Vol 1471 (G.t condamnée 1)
Plan Rdc - Vol 1472 (G.t condamnée 2)	Plan R+1 - Vol 1473 (G.t condamnée 3)
Plan R+2 - Vol 1474 (G.t condamnée 4)	Plan R+4 - Vol 1475 (G.t condamnée 5)
Plan R+5 - Vol 1476 (G.t condamnée 6)	Plan R+6 - Vol 1477 (G.t condamnée 7)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Plan R+7 - Vol 629	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan R+1 - Vol 763	pièce non visée par le présent diagnostic	Aile P
Plan R+7 - Vol 622	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 224	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 109	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan R+4 - Vol 1112	pièce non visée par le présent diagnostic	Aile P
Plan R+4 - Vol 1086	pièce non visée par le présent diagnostic	Sol refait
Plan sous-sol -1 - Vol 104	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 225	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 103	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan Rdc - Vol 695 (Société Générale)	Moyen investigation non mis a disposition	Distributeur de devises
Plan R+2 - Vol 904	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -2 - Vol 23	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 237	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -2 - Vol 5 (SP 201)	Moyen investigation non mis a disposition	Réserve Sport
Plan R+3 - Vol 1464	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef
Plan R+1 - Vol 766	pièce non visée par le présent diagnostic	Aile P
Plan sous-sol -1 - Vol 230	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+3 - Vol 947	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 247	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan R+1 - Vol 765	Moyen investigation non mis a disposition	Aile P
Plan R+7 - Vol 621	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -2 - Vol 42	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 226	pièce non visée par le présent diagnostic	

Plan sous-sol -1 - Vol 126	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+4 - Vol 1449	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 130	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 221	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 229	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 119	Moyen investigation non mis a disposition	Local électrique
Plan sous-sol -2 - Vol 11 (SC 200)	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 238	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 153	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -2 - Vol 30	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan R+4 - Vol 1063	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef le jour du repérage
Plan sous-sol -1 - Vol 101	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 102	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+1 - Vol 797 (136)	pièce non visée par le présent diagnostic	Aile P
Plan sous-sol -1 - Vol 125	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 214	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -2 - Vol 26	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan R+4 - Vol 1448	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan R+3 - Vol 1441	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 218	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 239	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 132	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -2 - Vol 68	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 124	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+1 - Vol 778	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 249	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 244	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 131	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 241	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 105	Moyen investigation non mis a disposition	

Plan sous-sol -1 - Vol 195	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 215	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 219	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan Rdc - Vol 257 (Loc Synd)	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 210	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 227	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+1 - Vol 770	Moyen investigation non mis a disposition	Aile P
Plan R+3 - Vol 1439	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 246	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous sol -3 - Vol 1445 (Sous sol -3)	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 94	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 245	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan R+2 - Vol 1423	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan R+4 - Vol 1056	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef le jour du repérage
Plan R+4 - Vol 1447	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 206	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+3 - Vol 1465	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clés
Plan R+7 - Vol 617	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan R+5 - Vol 1120	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 222	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 196	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan R+5 - Vol 1466	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef
Plan sous-sol -2 - Vol 21	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan R+3 - Vol 1437	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan R+2 - Vol 858	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clés
Plan R+5 - Vol 1239	pièce non visée par le présent diagnostic	Aile P
Plan R+1 - Vol 764	pièce non visée par le présent diagnostic	Aile P
Plan sous-sol -1 - Vol 234	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+5 - Vol 1470	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef
Plan sous-sol -1 - Vol 201	pièce non visée par le présent diagnostic	

Plan R+5 - Vol 1460	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 112	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 208	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+4 - Vol 1061	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef le jour du repérage
Plan R+3 - Vol 974	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 122	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 150	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 250	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan R+4 - Vol 1062	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 151	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 231	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+5 - Vol 1237	pièce non visée par le présent diagnostic	Aile P
Plan sous-sol -1 - Vol 228	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+1 - Vol 839	pièce non visée par le présent diagnostic	Aile P
Plan sous-sol -1 - Vol 212	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+5 - Vol 1467	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef
Plan sous-sol -1 - Vol 202	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 199	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 98	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 235	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+2 - Vol 1426	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -2 - Vol 67	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 93	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 213	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+5 - Vol 1468	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef
Plan sous-sol -1 - Vol 233	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 216	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 248	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 220	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 223	pièce non visée par le présent diagnostic	

Plan sous-sol -1 - Vol 207	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+1 - Vol 779	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+3 - Vol 970	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 240	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -2 - Vol 12 (Squash)	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan Rdc - Vol 260 (Loc Synd)	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 120	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 217	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+3 - Vol 1440	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan R+1 - Vol 768	Moyen investigation non mis a disposition	Aile P
Plan sous-sol -1 - Vol 200	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+1 - Vol 1429 (102b)	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan R+6 - Vol 1357	pièce non visée par le présent diagnostic	Aile P
Plan sous-sol -1 - Vol 211	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 127	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+1 - Vol 721 (B100bis)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clés
Plan sous-sol -1 - Vol 232	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -2 - Vol 18 (SB 201)	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -2 - Vol 70	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 236	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+5 - Vol 1240	pièce non visée par le présent diagnostic	Aile P
Plan sous-sol -1 - Vol 209	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -1 - Vol 204	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan Rdc - Vol 663	pièce non visée par le présent diagnostic	Pas de travaux de prévus
Plan sous-sol -1 - Vol 121	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+5 - Vol 1469	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef
Plan R+1 - Vol 767	pièce non visée par le présent diagnostic	Aile P
Plan sous-sol -1 - Vol 203	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan sous-sol -2 - Vol 28	pièce non visée par le présent diagnostic	Volume non concerné par les travaux
Plan sous-sol -1 - Vol 123	pièce non visée par le présent diagnostic	

Plan R+2 - Vol 1422	Moyen investigation non mis a disposition	
Plan sous-sol -1 - Vol 205	pièce non visée par le présent diagnostic	
Plan R+1 - Vol 769	Moyen investigation non mis a disposition	Aile P
Vol 276 (P115) - Plan R+1	Inaccessible sans sondage destructif	Plénum Faux plafond à déposer
Vol 1094 - Plan R+4	Inaccessible sans sondage destructif	Sol Sous faux plancher posé en 2014
Vol 1212 - Plan R+5	Inaccessible sans sondage destructif	Sol Faux plancher
Vol 1265 - Plan R+6	Inaccessible sans sondage destructif	Mur Doublage bois
Vol 701 - Plan Rdc	Inaccessible sans sondage destructif	Parois verticale Mobilier de la librairie à déposer
Vol 659 (Bureaux 15) - Plan Rdc	Moyen investigation non mis a disposition	B015
Vol 1445 (Sous sol -3) - Plan sous sol -3	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'accompagnement
Vol 115 - Plan sous-sol -1	pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 113 - Plan sous-sol -1	Inaccessible sans sondage destructif	Sous faux plancher

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la santé publique.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Réhabiliation de l'Université Paris Dauphine (UPD)

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Investigation approfondie des menuiseries.
- Investigation des enrobés.
- Vérification des menuiseries à l'emplacement de la création de l'aile B-P
- Inspection visuelle des entourages de poteaux sur l'ensemble de l'Université.

002KN000189-5 :
- Intervention sur les volumes non visités lors du rapport 002KN000189-4
- Visite des cours anglaises
- Visite des sous-sols 3 : non effectuée
- Visite des locaux suite Plan de repérage des périmètres d'intervention

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Plan de repérage annoté par AMO - APS - GPAA - 24/11/2017
Plan de repérage des périmètres d'intervention - Scan20190327115249 - AD Conseil - 25/11/2019

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et parties de composant des catégories suivantes conformément à la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique.

Ouvrages/parties d'ouvrage inspectés	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord) - Vol 2 (Parking centre) - Vol 4 (Réserve DI) - Vol 6 (SP 200) - Vol 7 (SP 202) - Vol 8 (Ventilation amphi) - Vol 13 (SC 202) - Vol 14 (Esc) - Vol 15 (Esc) - Vol 19 (SB 203) - Vol 20 (Esc) - Vol 24 - Vol 29 - Vol 31 - Vol 35 - Vol 36 - Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 46 - Vol 53 - Vol 58 - Vol 65 (SD200) - Vol 66 - Vol 69 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 83 - Vol 251 (Sous-station) - Vol 255	

Plafond et faux-plafonds	Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord) - Vol 2 (Parking centre) - Vol 4 (Réserve DI) - Vol 6 (SP 200) - Vol 13 (SC 202) - Vol 15 (Esc) - Vol 16 (SB 207) - Vol 17 (SB 209) - Vol 20 (Esc) - Vol 24 - Vol 25 - Vol 29 - Vol 31 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 34 - Vol 36 - Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 46 - Vol 54 - Vol 65 (SD200) - Vol 66 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 75 - Vol 77 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 83 - Vol 251 (Sous-station)
Conduits, canalisations et équipements	Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre) - Vol 3 (SP 203) - Vol 4 (Réserve DI) - Vol 6 (SP 200) - Vol 8 (Ventilation amphi) - Vol 16 (SB 207) - Vol 17 (SB 209) - Vol 20 (Esc) - Vol 22 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 27 - Vol 29 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 34 - Vol 35 - Vol 37 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 54 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 71 - Vol 73 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 251 (Sous-station) - Vol 252 - Vol 253 - Vol 254
Revêtement de sol	Plan sous-sol -2	Vol 15 (Esc) - Vol 20 (Esc) - Vol 31 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 65 (SD200) - Vol 69 - Vol 75 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 251 (Sous-station) - Vol 255
Equipements divers et accessoires	Plan sous-sol -2	Vol 37 - Vol 46 - Vol 251 (Sous-station)
Revêtement de mur	Plan sous-sol -2	Vol 43 - Vol 59
Conduits, canalisations et équipements	Plan sous-sol -1	Vol 86 - Vol 87 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 107 - Vol 118 - Vol 133 - Vol 134 - Vol 135 - Vol 142 - Vol 143 - Vol 144 - Vol 152 - Vol 165 - Vol 166 - Vol 167 - Vol 169 - Vol 171 - Vol 173 - Vol 177 - Vol 179 - Vol 243 - Vol 284 - Vol 640 - Vol 1471 (G.t condamnée 1)

Parois verticales intérieures et enduits	Plan sous-sol -1	Vol 86 - Vol 89 - Vol 92 - Vol 96 - Vol 113 - Vol 116 - Vol 128 - Vol 129 - Vol 135 - Vol 142 - Vol 144 - Vol 146 - Vol 149 - Vol 152 - Vol 156 - Vol 157 - Vol 159 (S/B106) - Vol 171 - Vol 172 - Vol 173 - Vol 174 - Vol 175 - Vol 179 - Vol 183 - Vol 187 - Vol 188 - Vol 189 - Vol 191 - Vol 194 - Vol 197 - Vol 198 - Vol 242 - Vol 243 - Vol 284
Plafond et faux-plafonds	Plan sous-sol -1	Vol 86 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 106 - Vol 113 - Vol 114 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 129 - Vol 135 - Vol 138 - Vol 142 - Vol 143 - Vol 144 - Vol 145 - Vol 146 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 149 - Vol 152 - Vol 157 - Vol 158 - Vol 160 - Vol 161 - Vol 162 - Vol 163 - Vol 164 - Vol 166 - Vol 168 - Vol 169 - Vol 170 - Vol 171 - Vol 172 - Vol 176 - Vol 179 - Vol 180 - Vol 181 - Vol 183 - Vol 187 - Vol 188 - Vol 189 - Vol 193 - Vol 197 - Vol 242 - Vol 284
Revêtement de sol	Plan sous-sol -1	Vol 86 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 92 - Vol 95 - Vol 96 - Vol 97 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 106 - Vol 107 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 114 - Vol 116 - Vol 128 - Vol 129 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 152 - Vol 156 - Vol 159 (S/B106) - Vol 165 - Vol 174 - Vol 175 - Vol 176 - Vol 178 - Vol 181 - Vol 182 - Vol 183 - Vol 184 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 189 - Vol 190 - Vol 191 - Vol 192 - Vol 194 - Vol 197 - Vol 198 - Vol 242 - Vol 243 - Vol 639
Revêtement de mur	Plan sous-sol -1	Vol 87 - Vol 159 (S/B106) - Vol 177 - Vol 179 - Vol 182 - Vol 183 - Vol 184 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188 - Vol 189 - Vol 192 - Vol 637
Ascenceurs et monte charges	Plan sous-sol -1	Vol 88
Façades	Plan sous-sol -1	Vol 108
Equipements divers et accessoires	Plan sous-sol -1	Vol 136

Revêtement de sol	Plan Rdc	Vol 256 - Vol 258 - Vol 259 - Vol 261 (Escalier A) - Vol 262 (B004) - Vol 263 - Vol 264 - Vol 265 (B000) - Vol 267 (Sanitaires 1) - Vol 285 (P026) - Vol 320 (B026) - Vol 347 (Ascenseur) - Vol 355 - Vol 381 - Vol 382 - Vol 383 - Vol 384 - Vol 385 - Vol 641 - Vol 642 (Couloir 1) - Vol 643 (Bureaux 3) - Vol 644 (Couloir 2) - Vol 645 (Bureaux 5) - Vol 646 (Couloir 3) - Vol 647 (Bureaux 7) - Vol 648 (Bureaux 8) - Vol 649 (Couloir 4) - Vol 650 (Bureaux 10) - Vol 651 (Bureaux 11) - Vol 652 (Bureaux 12) - Vol 653 (Bureaux 13) - Vol 654 (Bureaux 14) - Vol 655 (B028) - Vol 656 (B032) - Vol 657 (B038) - Vol 658 (B042) - Vol 659 (Bureaux 15) - Vol 660 (Escalier) - Vol 661 - Vol 662 (Infirmerie 3) - Vol 664 - Vol 665 (B048) - Vol 666 (Infirmerie 2) - Vol 667 (C013) - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS) - Vol 669 - Vol 670 - Vol 671 - Vol 672 - Vol 673 (C005) - Vol 674 - Vol 675 - Vol 676 (PMRHC001) - Vol 677 - Vol 678 - Vol 679 - Vol 680 - Vol 681 - Vol 682 - Vol 683 - Vol 684 - Vol 685 - Vol 686 - Vol 687 - Vol 688 - Vol 689 - Vol 690 - Vol 691 (PMR009) - Vol 692 - Vol 694 - Vol 696 (Sureté) - Vol 697 - Vol 698 - Vol 699 - Vol 700 - Vol 702 - Vol 703 - Vol 704 - Vol 705 - Vol 706 - Vol 707 - Vol 708 - Vol 710 - Vol 711 - Vol 712 - Vol 713 - Vol 714 - Vol 715 - Vol 716 - Vol 717 - Vol 718 - Vol 1384 - Vol 1385 - Vol 1387 - Vol 1388 - Vol 1394 (Rampe entrée) - Vol 1395 (Rampe Sortie) - Vol 1406 - Vol 1407 (Esc P8) - Vol 1408 (Livraison) - Vol 1409 (Parvis) - Vol 1443 (OUEST) - Vol 1444 (EST)

Parois verticales intérieures et enduits	Plan Rdc	Vol 259 - Vol 261 (Escalier A) - Vol 264 - Vol 265 (B000) - Vol 266 - Vol 267 (Sanitaires 1) - Vol 285 (P026) - Vol 320 (B026) - Vol 354 - Vol 355 - Vol 384 - Vol 627 - Vol 644 (Couloir 2) - Vol 649 (Couloir 4) - Vol 653 (Bureaux 13) - Vol 654 (Bureaux 14) - Vol 656 (B032) - Vol 657 (B038) - Vol 658 (B042) - Vol 659 (Bureaux 15) - Vol 660 (Escalier) - Vol 661 - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS) - Vol 673 (C005) - Vol 688 - Vol 692 - Vol 696 (Sureté) - Vol 698 - Vol 710 - Vol 1384 - Vol 1385 - Vol 1387 - Vol 1388 - Vol 1391 (Cour intérieure 2) - Vol 1408 (Livraison)
Plafond et faux-plafonds	Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A) - Vol 262 (B004) - Vol 263 - Vol 285 (P026) - Vol 320 (B026) - Vol 354 - Vol 355 - Vol 381 - Vol 382 - Vol 383 - Vol 384 - Vol 666 (Infirmerie 2) - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS) - Vol 673 (C005) - Vol 708 - Vol 710 - Vol 1384 - Vol 1385 - Vol 1387 - Vol 1388
Revêtement de mur	Plan Rdc	Vol 266 - Vol 267 (Sanitaires 1) - Vol 285 (P026) - Vol 385 - Vol 662 (Infirmerie 3) - Vol 666 (Infirmerie 2) - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS) - Vol 670 - Vol 671 - Vol 672 - Vol 692 - Vol 700 - Vol 704 - Vol 708 - Vol 712 - Vol 713 - Vol 714 - Vol 715
Parois verticales intérieures et enduits	Plan R+1	Vol 268 - Vol 272 - Vol 276 (P115) - Vol 313 - Vol 321 (B105) - Vol 342 (P171) - Vol 343 (D111) - Vol 344 (D110) - Vol 348 (Palier et escalier) - Vol 378 - Vol 379 - Vol 380 - Vol 429 - Vol 626 - Vol 725 - Vol 727 (B102TER) - Vol 728 (B507) - Vol 729 - Vol 731 - Vol 732 - Vol 733 - Vol 734 - Vol 735 - Vol 737 - Vol 740 - Vol 758 - Vol 777 - Vol 780 (B112) - Vol 781 (B114) - Vol 788 - Vol 798 - Vol 799 - Vol 808 - Vol 812 - Vol 822 - Vol 823 - Vol 824 - Vol 838 - Vol 1410 - Vol 1411

Revêtement de mur	Plan R+1	Vol 268 - Vol 276 (P115) - Vol 739 - Vol 793 - Vol 799 - Vol 823 - Vol 1410

Revêtement de sol	Plan R+1	Vol 269 - Vol 270 (100) - Vol 271 (101) - Vol 272 - Vol 273 (103) - Vol 274 (105) - Vol 275 (P107) - Vol 276 (P115) - Vol 277 - Vol 278 - Vol 279 - Vol 280 - Vol 281 - Vol 299 (P104 bis) - Vol 300 (P106) - Vol 301 (P108) - Vol 302 (P110) - Vol 303 (P112) - Vol 304 (P114) - Vol 305 (P116) - Vol 306 (P118) - Vol 307 (P109) - Vol 308 (P111) - Vol 309 (P113) - Vol 310 (P117) - Vol 311 (P119) - Vol 312 (P121) - Vol 313 - Vol 314 - Vol 315 - Vol 316 - Vol 317 - Vol 318 - Vol 319 - Vol 321 (B105) - Vol 342 (P171) - Vol 343 (D111) - Vol 344 (D110) - Vol 348 (Palier et escalier) - Vol 378 - Vol 379 - Vol 380 - Vol 392 (P143) - Vol 393 - Vol 394 (P147) - Vol 426 (P134) - Vol 427 - Vol 428 - Vol 429 - Vol 430 (P149) - Vol 431 (P145) - Vol 720 (B100) - Vol 722 - Vol 723 - Vol 724 (B102) - Vol 725 - Vol 726 - Vol 727 (B102TER) - Vol 728 (B507) - Vol 729 - Vol 730 - Vol 731 - Vol 732 - Vol 733 - Vol 734 - Vol 735 - Vol 736 - Vol 737 - Vol 738 - Vol 739 - Vol 742 (102) - Vol 751 - Vol 752 - Vol 755 - Vol 758 - Vol 760 - Vol 761 - Vol 762 - Vol 772 - Vol 774 - Vol 775 - Vol 776 - Vol 777 - Vol 780 (B112) - Vol 781 (B114) - Vol 783 - Vol 784 - Vol 785 - Vol 786 - Vol 787 - Vol 788 - Vol 789 - Vol 790 - Vol 791 (102b) - Vol 792 (102) - Vol 793 - Vol 794 (120) - Vol 795 (132) - Vol 796 (133) - Vol 798 - Vol 799 - Vol 800 - Vol 801 - Vol 802 - Vol 803 - Vol 804 - Vol 805 - Vol 806 - Vol 807 - Vol 808 - Vol 809 - Vol 810 - Vol 811 - Vol 812 - Vol 813 - Vol 819 - Vol 821 - Vol 822 - Vol 823 - Vol 824 - Vol 825 - Vol 826 - Vol 827 - Vol 837 - Vol 838 - Vol 1411 - Vol 1412 - Vol 1413 (P142) - Vol 1414 (P140) - Vol 1415 - Vol 1416 (C117) - Vol 1417 (C131) - Vol 1428 (Salle F) - Vol 1430 - Vol 1431 - Vol 1432

Conduits, canalisations et équipements	Plan R+1	Vol 272 - Vol 813 - Vol 1473 (G.t condamnée 3)
Plafond et faux-plafonds	Plan R+1	Vol 272 - Vol 276 (P115) - Vol 321 (B105) - Vol 342 (P171) - Vol 343 (D111) - Vol 344 (D110) - Vol 348 (Palier et escalier) - Vol 378 - Vol 379 - Vol 380 - Vol 740 - Vol 777 - Vol 798 - Vol 812 - Vol 824 - Vol 838 - Vol 1411
Parois verticales intérieures et enduits	Plan R+2	Vol 286 (P209) - Vol 287 - Vol 322 (B212) - Vol 323 (B225) - Vol 324 (B223) - Vol 349 (Palier et escalier) - Vol 374 - Vol 375 - Vol 376 - Vol 377 - Vol 432 - Vol 449 - Vol 452 - Vol 625 - Vol 844 - Vol 845 - Vol 848 - Vol 850 - Vol 854 - Vol 855 - Vol 868 - Vol 869 - Vol 870 - Vol 871 - Vol 872 - Vol 873 - Vol 874 - Vol 889 - Vol 892 - Vol 893 - Vol 905 - Vol 907 - Vol 912 - Vol 915 (B211) - Vol 917 - Vol 918 - Vol 919 - Vol 921 (B202) - Vol 922 - Vol 1365 - Vol 1366 - Vol 1368 - Vol 1371 - Vol 1372 - Vol 1386 - Vol 1427
Plafond et faux-plafonds	Plan R+2	Vol 286 (P209) - Vol 287 - Vol 322 (B212) - Vol 323 (B225) - Vol 324 (B223) - Vol 349 (Palier et escalier) - Vol 374 - Vol 375 - Vol 376 - Vol 377 - Vol 449 - Vol 450 - Vol 451 - Vol 452 - Vol 453 - Vol 625 - Vol 844 - Vol 850 - Vol 854 - Vol 871 - Vol 873 - Vol 886 - Vol 889 - Vol 905 - Vol 1386

Revêtement de sol	Plan R+2	Vol 286 (P209) - Vol 287 - Vol 322 (B212) - Vol 323 (B225) - Vol 324 (B223) - Vol 349 (Palier et escalier) - Vol 374 - Vol 375 - Vol 376 - Vol 377 - Vol 386 - Vol 397 - Vol 398 - Vol 399 - Vol 400 - Vol 401 - Vol 402 - Vol 403 - Vol 404 - Vol 432 - Vol 433 - Vol 434 - Vol 435 - Vol 436 - Vol 437 - Vol 438 - Vol 439 - Vol 440 - Vol 441 - Vol 442 - Vol 443 - Vol 444 - Vol 445 - Vol 446 - Vol 447 - Vol 448 - Vol 449 - Vol 450 - Vol 451 - Vol 452 - Vol 453 - Vol 454 - Vol 625 - Vol 840 - Vol 841 - Vol 842 - Vol 843 - Vol 844 - Vol 845 - Vol 846 - Vol 847 - Vol 848 - Vol 849 - Vol 850 - Vol 853 - Vol 854 - Vol 855 - Vol 859 - Vol 860 - Vol 861 - Vol 862 - Vol 863 - Vol 864 - Vol 871 - Vol 875 - Vol 876 - Vol 881 - Vol 882 - Vol 884 - Vol 885 - Vol 886 - Vol 887 - Vol 888 - Vol 889 - Vol 890 - Vol 891 - Vol 893 - Vol 895 - Vol 896 - Vol 898 - Vol 899 - Vol 900 - Vol 901 - Vol 902 - Vol 903 - Vol 906 - Vol 907 - Vol 908 - Vol 909 (P202) - Vol 910 - Vol 911 - Vol 912 - Vol 913 (Bureaux 16) - Vol 914 (Bureaux 17) - Vol 915 (B211) - Vol 916 - Vol 917 - Vol 918 - Vol 919 - Vol 920 (B204) - Vol 921 (B202) - Vol 922 - Vol 923 (B201) - Vol 924 (TFB202) - Vol 925 (THB201) - Vol 1364 - Vol 1365 - Vol 1367 - Vol 1369 - Vol 1370 - Vol 1371 - Vol 1372 - Vol 1373 - Vol 1386 - Vol 1419 - Vol 1420 - Vol 1421 (THA8) - Vol 1424 (TFA8) - Vol 1425 (C201) - Vol 1427
Coffrages perdus	Plan R+3	Vol 288 - Vol 325 (B302) - Vol 405 - Vol 406 - Vol 407 - Vol 408 - Vol 409 - Vol 410 - Vol 411 - Vol 412 - Vol 413 - Vol 414 - Vol 415 - Vol 416

Parois verticales intérieures et enduits	Plan R+3	Vol 288 - Vol 289 (P321) - Vol 325 (B302) - Vol 350 (Palier et escalier) - Vol 371 - Vol 372 - Vol 373 - Vol 390 - Vol 455 - Vol 460 - Vol 475 - Vol 476 - Vol 927 - Vol 928 - Vol 929 - Vol 931 - Vol 932 - Vol 935 - Vol 938 - Vol 939 - Vol 942 - Vol 944 - Vol 945 - Vol 950 - Vol 951 - Vol 971 - Vol 972 - Vol 973 - Vol 975 - Vol 976 - Vol 977 - Vol 978 - Vol 979 - Vol 980 - Vol 981 - Vol 982 - Vol 983 - Vol 985 - Vol 986
Plafond et faux-plafonds	Plan R+3	Vol 288 - Vol 289 (P321) - Vol 325 (B302) - Vol 350 (Palier et escalier) - Vol 371 - Vol 372 - Vol 373 - Vol 455 - Vol 475 - Vol 476 - Vol 951 - Vol 972 - Vol 975 - Vol 985 - Vol 986
Revêtement de sol	Plan R+3	Vol 288 - Vol 289 (P321) - Vol 325 (B302) - Vol 350 (Palier et escalier) - Vol 371 - Vol 372 - Vol 373 - Vol 390 - Vol 405 - Vol 406 - Vol 407 - Vol 408 - Vol 409 - Vol 410 - Vol 412 - Vol 413 - Vol 414 - Vol 415 - Vol 416 - Vol 455 - Vol 456 - Vol 457 - Vol 458 - Vol 459 - Vol 460 - Vol 461 - Vol 462 - Vol 463 - Vol 464 - Vol 465 - Vol 466 - Vol 467 - Vol 468 - Vol 469 - Vol 470 - Vol 471 - Vol 472 - Vol 473 - Vol 474 - Vol 475 - Vol 476 - Vol 926 - Vol 927 - Vol 928 - Vol 929 - Vol 930 - Vol 931 - Vol 932 - Vol 933 - Vol 934 - Vol 935 - Vol 936 (B 307) - Vol 937 - Vol 938 - Vol 939 - Vol 940 - Vol 941 - Vol 942 - Vol 943 - Vol 944 - Vol 945 - Vol 946 - Vol 948 - Vol 949 - Vol 950 - Vol 951 - Vol 953 - Vol 955 - Vol 957 - Vol 959 - Vol 960 - Vol 972 - Vol 975 - Vol 976 - Vol 977 - Vol 978 - Vol 979 - Vol 980 - Vol 981 - Vol 982 - Vol 983 - Vol 985 - Vol 986 - Vol 1434 - Vol 1435 - Vol 1436 - Vol 1438

Parois verticales intérieures et enduits	Plan R+4	Vol 290 (P413 ter) - Vol 291 (P427) - Vol 326 (B408) - Vol 327 (B424 bis) - Vol 339 (D409) - Vol 340 (D414) - Vol 341 (C408) - Vol 351 (Palier et escalier) - Vol 363 - Vol 364 - Vol 365 - Vol 366 - Vol 388 - Vol 480 - Vol 483 - Vol 485 - Vol 486 - Vol 487 - Vol 491 - Vol 494 - Vol 495 - Vol 500 - Vol 503 - Vol 510 - Vol 512 - Vol 514 - Vol 518 - Vol 523 - Vol 1003 - Vol 1017 - Vol 1020 - Vol 1022 - Vol 1024 - Vol 1034 - Vol 1037 - Vol 1058 - Vol 1059 - Vol 1064 - Vol 1066 - Vol 1069 - Vol 1071 - Vol 1075 - Vol 1085 - Vol 1093 - Vol 1096 - Vol 1097 - Vol 1100 - Vol 1103 - Vol 1106 - Vol 1107 - Vol 1108 - Vol 1111 - Vol 1114 - Vol 1116 - Vol 1117 - Vol 1390 - Vol 1396 - Vol 1397 - Vol 1398 - Vol 1399 - Vol 1400 - Vol 1401 - Vol 1402 - Vol 1403 - Vol 1404 - Vol 1405
Plafond et faux-plafonds	Plan R+4	Vol 290 (P413 ter) - Vol 291 (P427) - Vol 326 (B408) - Vol 327 (B424 bis) - Vol 339 (D409) - Vol 340 (D414) - Vol 341 (C408) - Vol 351 (Palier et escalier) - Vol 363 - Vol 364 - Vol 365 - Vol 366 - Vol 484 - Vol 1034 - Vol 1037 - Vol 1058 - Vol 1069 - Vol 1085 - Vol 1091 - Vol 1097 - Vol 1111

Revêtement de sol	Plan R+4	Vol 290 (P413 ter) - Vol 291 (P427) - Vol 326 (B408) - Vol 327 (B424 bis) - Vol 339 (D409) - Vol 340 (D414) - Vol 341 (C408) - Vol 351 (Palier et escalier) - Vol 363 - Vol 364 - Vol 365 - Vol 388 - Vol 389 - Vol 477 - Vol 478 - Vol 479 - Vol 480 - Vol 481 - Vol 482 - Vol 483 - Vol 484 - Vol 485 - Vol 486 - Vol 487 - Vol 488 - Vol 489 - Vol 490 - Vol 491 - Vol 492 - Vol 493 - Vol 494 - Vol 495 - Vol 496 - Vol 497 - Vol 498 - Vol 499 - Vol 500 - Vol 501 - Vol 502 - Vol 503 - Vol 504 - Vol 505 - Vol 506 - Vol 507 - Vol 508 - Vol 509 - Vol 510 - Vol 511 - Vol 512 - Vol 513 - Vol 514 - Vol 515 - Vol 516 - Vol 517 - Vol 518 - Vol 519 - Vol 520 - Vol 521 - Vol 522 - Vol 523 - Vol 524 - Vol 525 - Vol 526 - Vol 527 - Vol 987 - Vol 988 - Vol 1000 - Vol 1003 - Vol 1011 - Vol 1012 (B420) - Vol 1013 - Vol 1017 - Vol 1018 - Vol 1019 - Vol 1020 - Vol 1021 - Vol 1022 - Vol 1023 - Vol 1024 - Vol 1025 - Vol 1026 - Vol 1027 - Vol 1028 - Vol 1029 - Vol 1031 - Vol 1032 - Vol 1033 - Vol 1034 - Vol 1037 - Vol 1050 - Vol 1051 - Vol 1052 - Vol 1055 - Vol 1059 - Vol 1060 - Vol 1069 - Vol 1070 - Vol 1071 - Vol 1072 - Vol 1073 - Vol 1074 - Vol 1075 - Vol 1076 - Vol 1077 - Vol 1078 - Vol 1079 - Vol 1080 - Vol 1081 - Vol 1082 - Vol 1085 - Vol 1087 - Vol 1088 - Vol 1089 - Vol 1090 - Vol 1091 - Vol 1092 - Vol 1093 - Vol 1094 - Vol 1096 - Vol 1097 - Vol 1098 - Vol 1102 - Vol 1103 - Vol 1104 - Vol 1105 - Vol 1110 - Vol 1111 - Vol 1113 - Vol 1374 - Vol 1390 - Vol 1446 - Vol 1450 - Vol 1451 - Vol 1452 - Vol 1453

Coffrages perdus	Plan R+5	Vol 292 (P517) - Vol 293 (P518) - Vol 417 (P504) - Vol 418 (P501) - Vol 419 (P506) - Vol 420 (P508) - Vol 421 (P505) - Vol 422 (P510) - Vol 423 (P509) - Vol 424 (P513) - Vol 425 (P521)
Parois verticales intérieures et enduits	Plan R+5	Vol 292 (P517) - Vol 294 (P535) - Vol 328 (B530) - Vol 329 (B532) - Vol 334 (Bureau 4) - Vol 335 (D511 bis) - Vol 336 (D512) - Vol 337 (B516) - Vol 338 (B507) - Vol 352 (Palier et escalier) - Vol 367 - Vol 368 - Vol 369 - Vol 370 - Vol 387 - Vol 530 - Vol 538 - Vol 541 - Vol 545 - Vol 550 - Vol 635 (Escaliers) - Vol 636 Salle de reunion - Vol 1121 - Vol 1122 - Vol 1123 (B505) - Vol 1124 - Vol 1125 - Vol 1126 - Vol 1127 - Vol 1128 (B513) - Vol 1130 - Vol 1131 - Vol 1137 - Vol 1140 - Vol 1141 - Vol 1142 - Vol 1144 - Vol 1145 - Vol 1148 - Vol 1150 - Vol 1156 - Vol 1183 - Vol 1186 - Vol 1200 - Vol 1201 - Vol 1203 - Vol 1211 - Vol 1212 - Vol 1214 - Vol 1227 - Vol 1231 - Vol 1389
Plafond et faux-plafonds	Plan R+5	Vol 292 (P517) - Vol 294 (P535) - Vol 329 (B532) - Vol 334 (Bureau 4) - Vol 335 (D511 bis) - Vol 336 (D512) - Vol 337 (B516) - Vol 338 (B507) - Vol 345 (Plénum amphi 8) - Vol 352 (Palier et escalier) - Vol 367 - Vol 368 - Vol 369 - Vol 370 - Vol 530 - Vol 550 - Vol 635 (Escaliers) - Vol 1145 - Vol 1186 - Vol 1201 - Vol 1211 - Vol 1214 - Vol 1227

Revêtement de sol	Plan R+5	Vol 292 (P517) - Vol 293 (P518) - Vol 294 (P535) - Vol 328 (B530) - Vol 329 (B532) - Vol 334 (Bureau 4) - Vol 335 (D511 bis) - Vol 336 (D512) - Vol 337 (B516) - Vol 338 (B507) - Vol 352 (Palier et escalier) - Vol 368 - Vol 387 - Vol 417 (P504) - Vol 418 (P501) - Vol 419 (P506) - Vol 420 (P508) - Vol 421 (P505) - Vol 422 (P510) - Vol 423 (P509) - Vol 424 (P513) - Vol 425 (P521) - Vol 529 - Vol 530 - Vol 531 - Vol 532 - Vol 533 - Vol 534 - Vol 535 - Vol 536 - Vol 537 - Vol 539 - Vol 540 - Vol 541 - Vol 542 - Vol 543 - Vol 544 - Vol 545 - Vol 546 - Vol 547 - Vol 548 - Vol 549 - Vol 550 - Vol 635 (Escaliers) - Vol 1119 - Vol 1123 (B505) - Vol 1127 - Vol 1128 (B513) - Vol 1129 - Vol 1131 - Vol 1132 - Vol 1133 - Vol 1134 - Vol 1135 - Vol 1136 - Vol 1137 - Vol 1138 - Vol 1139 - Vol 1140 - Vol 1142 - Vol 1143 - Vol 1145 - Vol 1146 (B520b) - Vol 1147 - Vol 1148 - Vol 1149 - Vol 1150 - Vol 1151 - Vol 1152 - Vol 1153 - Vol 1154 - Vol 1155 - Vol 1156 - Vol 1157 - Vol 1158 - Vol 1159 - Vol 1162 - Vol 1164 (C516) - Vol 1165 - Vol 1166 - Vol 1167 - Vol 1168 - Vol 1169 - Vol 1170 - Vol 1171 - Vol 1172 - Vol 1183 - Vol 1184 - Vol 1185 - Vol 1187 - Vol 1188 - Vol 1189 - Vol 1190 - Vol 1194 - Vol 1196 - Vol 1197 - Vol 1198 - Vol 1199 - Vol 1201 - Vol 1202 - Vol 1203 - Vol 1204 - Vol 1205 - Vol 1206 - Vol 1207 - Vol 1208 - Vol 1209 - Vol 1211 - Vol 1212 - Vol 1213 - Vol 1214 - Vol 1215 - Vol 1216 - Vol 1217 - Vol 1218 - Vol 1219 - Vol 1220 - Vol 1221 - Vol 1222 - Vol 1223 - Vol 1224 - Vol 1225 - Vol 1226 - Vol 1227 - Vol 1231 - Vol 1232 - Vol 1238 - Vol 1379 - Vol 1380 - Vol 1381 - Vol 1382 - Vol 1383 - Vol 1389 - Vol 1393 - Vol 1454 -

		Vol 1455 - Vol 1456 - Vol 1457 - Vol 1458 - Vol 1459 - Vol 1461 - Vol 1462
Parois verticales intérieures et enduits	Plan R+6	Vol 295 - Vol 296 (P611) - Vol 297 - Vol 330 (B606) - Vol 331 (B632) - Vol 332 (B644) - Vol 333 (C614) - Vol 353 (Palier et escalier) - Vol 356 - Vol 357 - Vol 358 - Vol 359 - Vol 360 - Vol 361 - Vol 362 - Vol 551 - Vol 577 - Vol 580 - Vol 586 - Vol 587 - Vol 591 - Vol 599 - Vol 600 - Vol 601 - Vol 624 - Vol 1308 - Vol 1309 - Vol 1318 - Vol 1344 - Vol 1345 - Vol 1350 - Vol 1356 - Vol 1375 - Vol 1377
Plafond et faux-plafonds	Plan R+6	Vol 295 - Vol 296 (P611) - Vol 297 - Vol 330 (B606) - Vol 331 (B632) - Vol 332 (B644) - Vol 333 (C614) - Vol 346 (Ascenseur) - Vol 353 (Palier et escalier) - Vol 356 - Vol 358 - Vol 359 - Vol 360 - Vol 361 - Vol 362 - Vol 557 - Vol 580 - Vol 591 - Vol 599 - Vol 1308 - Vol 1344 - Vol 1345 - Vol 1350 - Vol 1378

Revêtement de sol	Plan R+6	Vol 295 - Vol 296 (P611) - Vol 297 - Vol 330 (B606) - Vol 331 (B632) - Vol 332 (B644) - Vol 333 (C614) - Vol 353 (Palier et escalier) - Vol 356 - Vol 357 - Vol 358 - Vol 359 - Vol 360 - Vol 361 - Vol 362 - Vol 551 - Vol 552 - Vol 553 - Vol 554 - Vol 555 - Vol 556 - Vol 557 - Vol 558 - Vol 559 - Vol 560 - Vol 561 - Vol 562 - Vol 563 - Vol 564 - Vol 565 - Vol 566 - Vol 567 - Vol 568 - Vol 569 - Vol 570 - Vol 571 - Vol 572 - Vol 573 - Vol 574 - Vol 575 - Vol 576 - Vol 577 - Vol 578 - Vol 579 - Vol 580 - Vol 581 - Vol 582 - Vol 583 - Vol 584 - Vol 585 - Vol 586 - Vol 587 - Vol 588 - Vol 589 - Vol 590 - Vol 591 - Vol 592 - Vol 593 - Vol 594 - Vol 595 - Vol 596 - Vol 597 - Vol 598 - Vol 599 - Vol 600 - Vol 602 - Vol 603 - Vol 604 - Vol 605 - Vol 606 - Vol 607 - Vol 608 - Vol 609 - Vol 1241 - Vol 1242 - Vol 1243 - Vol 1244 - Vol 1245 - Vol 1246 - Vol 1247 - Vol 1248 - Vol 1250 - Vol 1251 - Vol 1252 - Vol 1255 - Vol 1256 - Vol 1257 - Vol 1258 - Vol 1259 - Vol 1260 - Vol 1261 - Vol 1262 - Vol 1264 - Vol 1265 - Vol 1266 - Vol 1267 - Vol 1268 - Vol 1269 - Vol 1270 - Vol 1271 - Vol 1272 - Vol 1273 - Vol 1274 - Vol 1277 - Vol 1281 - Vol 1283 - Vol 1284 - Vol 1285 - Vol 1286 - Vol 1288 - Vol 1289 - Vol 1290 - Vol 1291 - Vol 1292 - Vol 1293 - Vol 1294 - Vol 1295 - Vol 1296 - Vol 1297 - Vol 1298 - Vol 1299 - Vol 1300 - Vol 1301 - Vol 1303 - Vol 1304 - Vol 1305 - Vol 1306 - Vol 1307 - Vol 1308 - Vol 1309 - Vol 1310 - Vol 1313 - Vol 1314 - Vol 1315 - Vol 1317 - Vol 1318 - Vol 1319 - Vol 1320 - Vol 1321 - Vol 1323 - Vol 1324 - Vol 1325 - Vol 1330 - Vol 1331 - Vol 1332 - Vol 1333 - Vol 1334 - Vol 1335 - Vol 1336 - Vol 1337 - Vol 1338 - Vol 1341 - Vol 1342 -

		Vol 1343 - Vol 1344 - Vol 1345 - Vol 1350 - Vol 1356 - Vol 1358 - Vol 1375 - Vol 1377 - Vol 1392
Coffrages perdus	Plan R+1	Vol 298 (P104) - Vol 312 (P121) - Vol 315 - Vol 319 - Vol 321 (B105) - Vol 342 (P171) - Vol 391 (P136) - Vol 392 (P143) - Vol 393 - Vol 394 (P147) - Vol 395 - Vol 396
Coffrages perdus	Plan R+2	Vol 323 (B225) - Vol 324 (B223) - Vol 397 - Vol 398 - Vol 399 - Vol 400 - Vol 401 - Vol 402 - Vol 403 - Vol 404
Coffrages perdus	Plan R+4	Vol 326 (B408) - Vol 327 (B424 bis) - Vol 340 (D414)
Façades	Plan R+5	Vol 338 (B507)
Conduits, canalisations et équipements	Plan R+6	Vol 356 - Vol 360 - Vol 551 - Vol 557 - Vol 591 - Vol 601 - Vol 1350 - Vol 1477 (G.t condamnée 7)
Revêtement de mur	Plan R+6	Vol 358 - Vol 359 - Vol 600 - Vol 1241 - Vol 1242 - Vol 1302 - Vol 1358
Conduits, canalisations et équipements	Plan R+2	Vol 374 - Vol 375 - Vol 376 - Vol 449 - Vol 1474 (G.t condamnée 4)
Conduits, canalisations et équipements	Plan R+3	Vol 455 - Vol 476 - Vol 1433 (ZF0201VH)
Revêtement de mur	Plan R+4	Vol 478 - Vol 484 - Vol 528 - Vol 987 - Vol 988 - Vol 1050 - Vol 1070 - Vol 1088 - Vol 1089 - Vol 1096 - Vol 1098 - Vol 1110 - Vol 1450 - Vol 1451 - Vol 1452 - Vol 1453
Conduits, canalisations et équipements	Plan R+4	Vol 484 - Vol 1475 (G.t condamnée 5)
Conduits, canalisations et équipements	Plan R+5	Vol 530 - Vol 550 - Vol 1476 (G.t condamnée 6)
Parois verticales intérieures et enduits	Plan R+7	Vol 610 - Vol 611 - Vol 613 - Vol 614 - Vol 615 - Vol 616 - Vol 618 - Vol 630 - Vol 631
Revêtement de sol	Plan R+7	Vol 610 - Vol 613 - Vol 628 - Vol 630 - Vol 631
Conduits, canalisations et équipements	Plan R+7	Vol 612 - Vol 620
Façades	Plan R+7	Vol 612 - Vol 620 - Vol 623 - Vol 632
Toiture et étanchéité	Plan R+7	Vol 612 - Vol 619 - Vol 620 - Vol 623 - Vol 632

Revêtement de mur	Plan R+2	Vol 625 - Vol 843 - Vol 846 - Vol 847 - Vol 849 - Vol 853 - Vol 855 - Vol 875 - Vol 876 - Vol 910 - Vol 1421 (THA8) - Vol 1424 (TFA8)
Plafond et faux-plafonds	Plan R+7	Vol 628 - Vol 630 - Vol 631
Revêtement de mur	Plan R+7	Vol 631
Façades	Plan façade extérieur	Vol 633 (Façade extérieur)
Parois verticales intérieures et enduits	Plan façade extérieur	Vol 633 (Façade extérieur)
Façades	Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)
Parois verticales intérieures et enduits	Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)
Equipements divers et accessoires	Plan Rdc	Vol 671
Façades	Plan R+1	Vol 728 (B507)
Revêtement de mur	Plan R+3	Vol 927 - Vol 936 (B 307) - Vol 937 - Vol 944 - Vol 946 - Vol 948 - Vol 949 - Vol 1434 - Vol 1435 - Vol 1436
Façades	Plan R+3	Vol 936 (B 307)
Façades	Plan R+4	Vol 1034
Revêtement de mur	Plan R+5	Vol 1119 - Vol 1123 (B505) - Vol 1150 - Vol 1170 - Vol 1202 - Vol 1226 - Vol 1232 - Vol 1454 - Vol 1455 - Vol 1456 - Vol 1457 - Vol 1459 - Vol 1462
Façades	Plan R+6	Vol 1376 (Cour intérieure 1)
Conduits, canalisations et équipements	Plan Rdc	Vol 1385 - Vol 1472 (G.t condamnée 2)
Toiture et étanchéité	Plan Rdc	Vol 1391 (Cour intérieure 2)
Voies et réseaux divers	Plan Rdc	Vol 1395 (Rampe Sortie)
Façades	Plan Rdc	Vol 1409 (Parvis) - Vol 1418 (Ext Sud)
Revêtement de sol	Local fioul	Vol 1463 (Local fioul)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Lors d'une première visite en date du 18/09/2018, un prélèvement "P266" sur les mastics vitrier a révélé la présence d'amiante. Sur demande de l'AMO, des prélèvements complémentaires ont été effectués. L'ensemble de ces échantillons a révélé l'absence d'amiante. Par conséquent, l'ensemble de la zone couverte par les prélèvements "P759, P760, P761" (mastic vitrier) a été considéré comme étant négatif à la présence d'amiante.
Le prélèvement P266 a été supprimé du rapport par soucis de clarté.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 346 (Ascenseur)	Fibralytes	Plafond inaccessible
Vol 347 (Ascenseur)	Chappe maigre (base ciment)	Impossibilité sans présence d'ascensoriste
Vol 634 (Façade intérieur)	Asphalte	Risque de dégradation de la fonction première
Vol 634 (Façade intérieur)	Plaques	impossible de sonder sans dépose du parement en façade
Vol 634 (Façade intérieur)	Parement	Impossible de sonder dans l'état actuel sans sondage très destructif
Vol 633 (Façade extérieur)	Joint vitrier	impossible sans sondage trés destructif
Vol 633 (Façade extérieur)	Joint vitrier	impossible sans sondage très destructif
Vol 634 (Façade intérieur)	Joint vitrier	impossible sans sondage très destructif
Vol 634 (Façade intérieur)	Joint vitrier	impossible sans sondage très destructif
Vol 634 (Façade intérieur)	Joint vitrier	impossible sans sondage très destructif
Vol 136	Isolant	En fonctionnement
Vol 34	Clapet	En fonctionnement
Vol 37	Isolant	En fonctionnement
Vol 813	Volets	En fonctionnement
Vol 143	Clapet	En fonctionnement
Vol 47	Calorifugeage	Prélèvement à réaliser lors de la phase 3
Vol 152	Clapet	En fonctionnement
Vol 144	Clapet	En fonctionnement
Vol 694	Ragréage	Inaccessible le jour du prélèvement
Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Parquet	Nécessite sondage destructif important
Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Colles de carrelage	Nécessite sondage destructif important
Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Colle de carrelage (plinthe)	Refus // Nécessite sondage destructif important
Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Colle de carrelage (faïence)	Refus // Nécessite un sondage destructif important
Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Colle de carrelage (faïence)	Refus // Nécessite sondage destructif important
Vol 1433 (ZF0201VH)	Calorifugeage	inaccessible

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 52	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S9
Vol 46	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S10
Vol 47	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S11
Vol 47	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S12
Vol 251 (Sous-station)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S91
Vol 251 (Sous-station)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S92
Vol 288	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S235
Vol 288	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S236
Vol 292 (P517)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S253
Vol 292 (P517)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S254
Vol 293 (P518)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S255
Vol 293 (P518)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S256
Vol 293 (P518)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S257
Vol 293 (P518)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S258
Vol 298 (P104)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S278
Vol 298 (P104)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S279
Vol 321 (B105)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S301
Vol 321 (B105)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S302
Vol 321 (B105)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S303
Vol 324 (B223)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S316
Vol 324 (B223)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S317
Vol 323 (B225)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S318
Vol 323 (B225)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S319
Vol 325 (B302)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S322
Vol 325 (B302)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S323
Vol 325 (B302)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S324
Vol 325 (B302)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S325
Vol 326 (B408)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S327
Vol 326 (B408)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S328
Vol 327 (B424 bis)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S332
Vol 327 (B424 bis)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S333

Vol 340 (D414)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S376
Vol 340 (D414)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S377
Vol 342 (P171)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S386
Vol 342 (P171)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S387
Vol 312 (P121)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S567
Vol 312 (P121)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S568
Vol 315	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S569
Vol 315	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S570
Vol 319	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S571
Vol 319	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S572
Vol 391 (P136)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S573
Vol 391 (P136)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S574
Vol 392 (P143)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S575
Vol 392 (P143)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S576
Vol 393	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S577
Vol 393	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S578
Vol 394 (P147)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S579
Vol 394 (P147)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S580
Vol 394 (P147)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S581
Vol 394 (P147)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S582
Vol 395	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S583
Vol 395	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S584
Vol 396	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S585
Vol 396	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S586
Vol 397	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S587
Vol 397	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S588
Vol 397	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S589
Vol 397	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S590
Vol 398	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S591
Vol 398	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S592
Vol 399	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S593
Vol 399	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S594
Vol 399	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S595
Vol 399	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S596
Vol 400	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S597
Vol 400	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S598
Vol 401	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S599
Vol 401	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S600
Vol 402	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S601
Vol 402	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S602
Vol 403	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S603
Vol 403	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S604
Vol 404	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S605

Vol 404	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S606
Vol 405	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S607
Vol 405	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S608
Vol 406	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S609
Vol 406	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S610
Vol 406	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S611
Vol 406	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S612
Vol 407	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S613
Vol 407	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S614
Vol 407	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S615
Vol 408	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S616
Vol 408	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S617
Vol 408	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S618
Vol 409	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S619
Vol 410	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S620
Vol 410	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S621
Vol 410	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S622
Vol 411	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S623
Vol 411	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S624
Vol 412	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S625
Vol 412	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S626
Vol 413	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S627
Vol 413	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S628
Vol 413	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S629
Vol 413	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S630
Vol 414	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S631
Vol 414	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S632
Vol 415	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S633
Vol 415	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S634
Vol 415	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S635
Vol 416	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S636
Vol 416	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S637
Vol 417 (P504)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S638
Vol 417 (P504)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S639
Vol 418 (P501)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S640
Vol 418 (P501)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S641
Vol 418 (P501)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S642
Vol 418 (P501)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S643
Vol 419 (P506)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S644
Vol 419 (P506)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S645
Vol 420 (P508)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S646
Vol 420 (P508)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S647
Vol 420 (P508)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S648

Vol 421 (P505)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S649
Vol 421 (P505)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S650
Vol 421 (P505)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S651
Vol 421 (P505)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S652
Vol 422 (P510)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S653
Vol 422 (P510)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S654
Vol 422 (P510)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S655
Vol 423 (P509)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S656
Vol 423 (P509)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S657
Vol 424 (P513)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S658
Vol 424 (P513)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S659
Vol 425 (P521)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S660
Vol 425 (P521)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S661
Vol 425 (P521)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S662
Vol 425 (P521)	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	S663
Vol 634 (Façade intérieur)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002KN000189-1 n°258
Vol 634 (Façade intérieur)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002KN000189-1 n°259
Vol 633 (Façade extérieur)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002KN000189-1 n°260
Vol 633 (Façade extérieur)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002KN000189-1 n°261
Vol 633 (Façade extérieur)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S1074
Vol 179	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002KN000189-3 n°290
Vol 189	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002KN000189-3 n°290
Vol 188	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002KN000189-3 n°290
Vol 192	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002KN000189-3 n°290
Vol 186	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002KN000189-3 n°290
Vol 182	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002KN000189-3 n°290
Vol 187	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002KN000189-3 n°290
Vol 184	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002KN000189-3 n°290
Vol 185	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002KN000189-3 n°290
Vol 183	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002KN000189-3 n°290
Vol 192	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	002KN000189-3 n°291
Vol 186	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	002KN000189-3 n°291
Vol 182	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	002KN000189-3 n°291
Vol 187	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	002KN000189-3 n°291

Vol 184	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	002KN000189-3 n°291
Vol 185	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	002KN000189-3 n°291
Vol 165	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002KN000189-3 n°293
Vol 142	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002KN000189-3 n°293
Vol 640	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002KN000189-3 n°293
Vol 88	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Frein	002KN000189-3 n°300
Vol 87	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Plaques menuiserie	002KN000189-3 n°302
Vol 57	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002KN000189-3 n°335
Vol 56	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002KN000189-3 n°335
Vol 54	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002KN000189-3 n°335
Vol 656 (B032)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1192
Vol 659 (Bureaux 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1195
Vol 657 (B038)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1197
Vol 657 (B038)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1198
Vol 659 (Bureaux 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1199
Vol 659 (Bureaux 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1200
Vol 658 (B042)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1206
Vol 698	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1231
Vol 698	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1232
Vol 714	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	002KN000189-3 n°421 Phase 3
Vol 715	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	002KN000189-3 n°421 Phase 3
Vol 808	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1275
Vol 808	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1276
Vol 429	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1286
Vol 915 (B211)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1341

Vol 915 (B211)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1342
Vol 918	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1343
Vol 917	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1344
Vol 919	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1345
Vol 922	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1347
Vol 922	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1350
Vol 919	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1351
Vol 918	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1352
Vol 917	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1353
Vol 725	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1356
Vol 725	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1357
Vol 725	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1358
Vol 725	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1359
Vol 728 (B507)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1360
Vol 728 (B507)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1361
Vol 728 (B507)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1362
Vol 729	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1365
Vol 729	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1366
Vol 729	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1367
Vol 729	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1368
Vol 731	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1370
Vol 731	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1371
Vol 731	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1372
Vol 731	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1373
Vol 732	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1374
Vol 732	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1375

Vol 735	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002KN000189-3 n°494 Phase 3
Vol 733	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002KN000189-3 n°494 Phase 3
Vol 735	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1376
Vol 735	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1377
Vol 735	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1378
Vol 735	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1379
Vol 733	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1380
Vol 733	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1381
Vol 77	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Colle d'isolant	002KN000189-3 n°748
Vol 73	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S1802
Vol 73	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S1803
Vol 727 (B102TER)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1810
Vol 727 (B102TER)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1811
Vol 734	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1812
Vol 734	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1813
Vol 737	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1814
Vol 737	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1815
Vol 737	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1816
Vol 737	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1817
Vol 780 (B112)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1818
Vol 780 (B112)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1819
Vol 780 (B112)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1820
Vol 780 (B112)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1821
Vol 781 (B114)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1822
Vol 781 (B114)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1823

Vol 788	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1824
Vol 788	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1825
Vol 921 (B202)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1826
Vol 921 (B202)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1827
Vol 921 (B202)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1828
Vol 921 (B202)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1829
Vol 1365	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1830
Vol 1365	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1831
Vol 1366	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1832
Vol 1366	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1833
Vol 1372	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1834
Vol 1372	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1835
Vol 1371	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1836
Vol 1368	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1837
Vol 1368	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1838
Vol 912	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1839
Vol 912	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1840
Vol 945	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1841
Vol 945	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1842
Vol 945	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1843
Vol 945	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1844
Vol 927	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1845
Vol 927	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1846
Vol 927	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1847
Vol 927	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1848
Vol 944	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1849
Vol 944	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1850

Vol 944	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1851
Vol 928	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1852
Vol 928	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1853
Vol 942	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1854
Vol 942	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1855
Vol 929	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1856
Vol 929	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1857
Vol 931	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1858
Vol 931	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1859
Vol 939	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1860
Vol 939	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1861
Vol 932	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1862
Vol 932	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1863
Vol 938	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1864
Vol 938	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1865
Vol 938	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1866
Vol 938	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1867
Vol 935	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1868
Vol 935	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1869
Vol 950	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1870
Vol 950	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1871
Vol 1396	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1872
Vol 1396	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1873
Vol 1397	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1874
Vol 1397	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1875
Vol 1398	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1876

Vol 1398	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1877
Vol 1399	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1878
Vol 1399	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1879
Vol 1400	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1880
Vol 1400	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1881
Vol 1400	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1882
Vol 1401	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1883
Vol 1401	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1884
Vol 1003	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1885
Vol 1405	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1886
Vol 1405	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1887
Vol 1405	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1888
Vol 1405	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1889
Vol 1402	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1890
Vol 1402	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1891
Vol 1403	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1892
Vol 1403	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1893
Vol 1403	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1894
Vol 1403	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1895
Vol 1404	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1896
Vol 1404	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1897
Vol 1017	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1898
Vol 1017	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1899
Vol 1020	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1900
Vol 1020	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1901
Vol 1022	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1902
Vol 1022	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1903

Vol 1024	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1904
Vol 1024	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1905
Vol 518	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1906
Vol 518	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1907
Vol 518	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1908
Vol 518	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1909
Vol 1064	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1910
Vol 1064	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1911
Vol 523	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1912
Vol 523	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1913
Vol 1066	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1914
Vol 1066	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1915
Vol 1108	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1916
Vol 1107	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1917
Vol 1106	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1918
Vol 1106	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1919
Vol 1100	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1920
Vol 1100	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1921
Vol 1103	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1922
Vol 1103	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1923
Vol 1071	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1924
Vol 1071	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1925
Vol 1075	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1926
Vol 1075	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1927
Vol 1117	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1928
Vol 1117	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1929

Vol 1116	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1930
Vol 1116	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1931
Vol 512	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1932
Vol 512	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1933
Vol 1114	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1934
Vol 514	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1935
Vol 510	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1936
Vol 510	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1937
Vol 503	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1938
Vol 503	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1939
Vol 500	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1940
Vol 500	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1941
Vol 495	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1942
Vol 495	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1943
Vol 494	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1944
Vol 494	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1945
Vol 487	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1946
Vol 486	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1947
Vol 486	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1948
Vol 485	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1949
Vol 485	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1950
Vol 480	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1951
Vol 480	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1952
Vol 483	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1953
Vol 483	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1954
Vol 483	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1955
Vol 483	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1956

Vol 491	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1957
Vol 491	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1958
Vol 1203	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1959
Vol 1203	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1960
Vol 541	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1961
Vol 541	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1962
Vol 545	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1963
Vol 545	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1964
Vol 1200	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1965
Vol 1200	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1966
Vol 1156	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1967
Vol 1156	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1968
Vol 328 (B530)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1969
Vol 328 (B530)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1970
Vol 1150	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1971
Vol 1150	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1972
Vol 1141	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1973
Vol 1141	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1974
Vol 1142	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1975
Vol 1142	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1976
Vol 1144	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1977
Vol 1144	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1978
Vol 1144	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1979
Vol 1144	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1980
Vol 1140	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1981
Vol 1140	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1982

Vol 1137	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1983
Vol 1137	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1984
Vol 1128 (B513)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1985
Vol 1128 (B513)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1986
Vol 1131	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1987
Vol 1131	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1988
Vol 1148	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1989
Vol 1148	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1990
Vol 1130	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1991
Vol 1130	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1992
Vol 1130	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1993
Vol 1130	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1994
Vol 1127	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1995
Vol 1127	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1996
Vol 1127	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1997
Vol 1127	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1998
Vol 1126	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1999
Vol 1126	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2000
Vol 1125	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2001
Vol 1125	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2002
Vol 1124	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2003
Vol 1124	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2004
Vol 1123 (B505)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2005
Vol 1123 (B505)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2006
Vol 1123 (B505)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2007
Vol 1123 (B505)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2008
Vol 1122	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2009

Vol 1122	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2010
Vol 1122	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2011
Vol 1122	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2012
Vol 1121	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2013
Vol 1121	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2014
Vol 1121	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2015
Vol 1121	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2016
Vol 1409 (Parvis)	Façades	Murs	Joint de scellement	P799
Vol 1410	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Fibralith (colle)	P817
Vol 1433 (ZF0201VH)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2065
Vol 1443 (OUEST)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint dilatation	S2081
Vol 1471 (G.t condamnée 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2086
Vol 1472 (G.t condamnée 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2087
Vol 1473 (G.t condamnée 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2088
Vol 1474 (G.t condamnée 4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2089
Vol 1475 (G.t condamnée 5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2090
Vol 1476 (G.t condamnée 6)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2091
Vol 1477 (G.t condamnée 7)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2092

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Ascenceurs et monte charges

9 - Equipements divers et accessoires

10 - Coffrages perdus

11 - Voies et réseaux divers

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P227	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °227 - 1	002KN 00018 9-1 n °227	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P227		002KN 00018 9-1 n °227 - 1	002KN 00018 9-1 n °227	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P232	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S967	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S968	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S969	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S970	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S971	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S972	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S973	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S974	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 619	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S978	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 619	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S979	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 619	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S980	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 619	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S981	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 619	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S982	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 619	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S983	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 619	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S984	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S985	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S986	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 620	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S987	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S988	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S989	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S990	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S991	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S992	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S993	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 612 - Vol 619 - Vol 620	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P232 - S967 - S968 - S969 - S970 - S971 - S972 - S973 - S974 - S978 - S979 - S980 - S981 - S982 - S983 - S984 - S985 - S986 - S987 - S988 - S989 - S990 - S991 - S992 - S993	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002KN 00018 9-1 n °232 - 1	002KN 00018 9-1 n °232	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 623	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P239	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °239 - 1	002KN 00018 9-1 n °239	Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 623	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S1006	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P239		002KN 00018 9-1 n °239 - 1	002KN 00018 9-1 n °239	Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 623	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S1007	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P239		002KN 00018 9-1 n °239 - 1	002KN 00018 9-1 n °239	Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 623	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S1008	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P239		002KN 00018 9-1 n °239 - 1	002KN 00018 9-1 n °239	Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 623	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S1006 - S1007 - S1008	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P239		002KN 00018 9-1 n °239 - 1	002KN 00018 9-1 n °239	Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 623	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P240	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °240 - 1	002KN 00018 9-1 n °240	Shingle Bitumineux Fibreux Gris Noir Aluminium Souple Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 623	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S1009	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P240		002KN 00018 9-1 n °240 - 1	002KN 00018 9-1 n °240	Shingle Bitumineux Fibreux Gris Noir Aluminium Souple Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 623	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S1010	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P240		002KN 00018 9-1 n °240 - 1	002KN 00018 9-1 n °240	Shingle Bitumineux Fibreux Gris Noir Aluminium Souple Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 623	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S1009 - S1010	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P240		002KN 00018 9-1 n °240 - 1	002KN 00018 9-1 n °240	Shingle Bitumineux Fibreux Gris Noir Aluminium Souple Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 632	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P249	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °249 - 1	002KN 00018 9-1 n °249	Shingle Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 632	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S1063	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002KN 00018 9-1 n °249 - 1	002KN 00018 9-1 n °249	Shingle Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 632	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S1064	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002KN 00018 9-1 n °249 - 1	002KN 00018 9-1 n °249	Shingle Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 632	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S1065	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002KN 00018 9-1 n °249 - 1	002KN 00018 9-1 n °249	Shingle Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 632	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	S1063 - S1064 - S1065	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002KN 00018 9-1 n °249 - 1	002KN 00018 9-1 n °249	Shingle Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 632	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P250	Réalisation d'un prélevement	PAXALU	002KN 00018 9-1 n °250 - 1	002KN 00018 9-1 n °250	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 632	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250	PAXALU	002KN 00018 9-1 n °250 - 1	002KN 00018 9-1 n °250	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 632	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S1066	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250	PAXALU	002KN 00018 9-1 n °250 - 1	002KN 00018 9-1 n °250	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 632	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P250 - S1066	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250	PAXALU	002KN 00018 9-1 n °250 - 1	002KN 00018 9-1 n °250	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 620	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	S1075	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document CF DOSSIER N°: S/15300114
Plan Rdc	Vol 1391 (Cour intérieure 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P825	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°825 - 1	P825	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 612	Murs	Enduit ciment	P228	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-1 n°228 - 1	002KN000189-1 n°228	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Murs	Enduit ciment	P228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P228		002KN000189-1 n°228 - 1	002KN000189-1 n°228	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Murs	Enduit ciment	P229	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-1 n°229 - 1	002KN000189-1 n°229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 612	Murs	Enduit ciment	S963	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002KN 00018 9-1 n °229 - 1	002KN 00018 9-1 n °229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Murs	Enduit ciment	S964	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002KN 00018 9-1 n °229 - 1	002KN 00018 9-1 n °229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Murs	Enduit ciment	S965	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002KN 00018 9-1 n °229 - 1	002KN 00018 9-1 n °229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Murs	Enduit ciment	S975	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002KN 00018 9-1 n °229 - 1	002KN 00018 9-1 n °229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 612	Murs	Enduit ciment	S976	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002KN 00018 9-1 n °229 - 1	002KN 00018 9-1 n °229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612	Murs	Enduit ciment	S977	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002KN 00018 9-1 n °229 - 1	002KN 00018 9-1 n °229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Murs	Enduit ciment	S999	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002KN 00018 9-1 n °229 - 1	002KN 00018 9-1 n °229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Murs	Enduit ciment	S1000	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002KN 00018 9-1 n °229 - 1	002KN 00018 9-1 n °229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 620	Murs	Enduit ciment	S1001	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002KN 00018 9-1 n °229 - 1	002KN 00018 9-1 n °229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Murs	Enduit ciment	S1002	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002KN 00018 9-1 n °229 - 1	002KN 00018 9-1 n °229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 612 - Vol 620	Murs	Enduit ciment	S963 - S964 - S965 - S975 - S976 - S977 - S999 - S1000 - S1001 - S1002	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002KN 00018 9-1 n °229 - 1	002KN 00018 9-1 n °229	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 623	Murs	Enduit ciment	P238	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °238 - 1	002KN 00018 9-1 n °238	Matériau Effritable Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 623	Murs	Enduit ciment	S1003	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P238		002KN 00018 9-1 n °238 - 1	002KN 00018 9-1 n °238	Matériau Effritable Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 623	Murs	Enduit ciment	S1004	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P238		002KN 00018 9-1 n °238 - 1	002KN 00018 9-1 n °238	Matériau Effritable Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 623	Murs	Enduit ciment	S1005	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P238		002KN 00018 9-1 n °238 - 1	002KN 00018 9-1 n °238	Matériau Effritable Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 623	Murs	Enduit ciment	S1003 - S1004 - S1005	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P238		002KN 00018 9-1 n °238 - 1	002KN 00018 9-1 n °238	Matériau Effritable Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 632	Murs	Enduit ciment	P248	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °248 - 1	002KN 00018 9-1 n °248	Ciment Dur Gris Peinture Souple Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 632	Murs	Enduit ciment	S1060	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002KN 00018 9-1 n °248 - 1	002KN 00018 9-1 n °248	Ciment Dur Gris Peinture Souple Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 632	Murs	Enduit ciment	S1061	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002KN 00018 9-1 n °248 - 1	002KN 00018 9-1 n °248	Ciment Dur Gris Peinture Souple Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 632	Murs	Enduit ciment	S1062	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002KN 00018 9-1 n °248 - 1	002KN 00018 9-1 n °248	Ciment Dur Gris Peinture Souple Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 632	Murs	Enduit ciment	S1060 - S1061 - S1062	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002KN 00018 9-1 n °248 - 1	002KN 00018 9-1 n °248	Ciment Dur Gris Peinture Souple Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Etanchéité	Asphalte	I6			I6 - 1				Risque de dégradation de la fonction première
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Panneaux-sandwichs	Plaques	I7			I7 - 1				impossible de sonder sans dépose du parement en façade
Plan façade extérieur	Vol 633 (Façade extérieur)	Menuiseries	Joint vitrier	S1074	Réalisation d'un sondage	Sous habillage au pourtour de la menuiserie					Présence sur document Cf rapport n °A-04/09/2015-01

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan façade extérieur	Vol 633 (Façade extérieur)	Menuiseries	Joint vitrier	I9		Sous habillage au pourtour de la menuiserie					impossible sans sondage très destructif
Plan façade extérieur	Vol 633 (Façade extérieur)	Menuiseries	Joint vitrier	I10		Sous habillage au pourtour de la menuiserie					impossible sans sondage très destructif
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Menuiseries	Joint vitrier	I11		Sous habillage au pourtour de la menuiserie					impossible sans sondage très destructif
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Menuiseries	Joint vitrier	I12		Sous habillage au pourtour de la menuiserie					impossible sans sondage très destructif
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Menuiseries	Joint vitrier	I13		Sous habillage au pourtour de la menuiserie					impossible sans sondage très destructif

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 108	Murs	Enduit ciment	P308	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °308 - 1	002KN 00018 9-3 n °308	Ciment Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1376 (Cour intérieure 1)	Appui de fenêtre	Peinture	P608	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °608 - 1	002KN 00018 9-3 n °608	Peinture Effritable Gris Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1376 (Cour intérieure 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P609	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °609 - 1	002KN 00018 9-3 n °609 Phase 1	Mastic Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1376 (Cour intérieure 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P609	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °609 - 1	002KN 00018 9-3 n °609 Phase 2	Joint Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1376 (Cour intérieure 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P610	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °610 - 1	002KN 00018 9-3 n °610	Mastic Effritable Beige Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1376 (Cour intérieure 1)	Murs	Enduit ciment	P611	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °611 - 1	002KN 00018 9-3 n °611	Enduit Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1034	Menuiseries	Mastic vitrier	P749	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °749 - 1	002KN 00018 9-3 n °749	Peinture Effritable Blanc Gris Matériau Effritable Blanc Mastic Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Menuiseries	Mastic vitrier	P760	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °760 - 1	002KN 00018 9-4 n °760	Matériau compact gris avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Menuiseries	Mastic vitrier	P761	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °761 - 1	002KN 00018 9-4 n °761	Matériau beige et gris en vrac hétérogène avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 936 (B 307)	Menuiseries	Mastic vitrier	P762	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °762 - 1	002KN 00018 9-4 n °762	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 728 (B507)	Menuiseries	Mastic vitrier	P763	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °763 - 1	002KN 00018 9-4 n °763	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1409 (Parvis)	Murs	Joint de scellement	P799	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °799 - 1	P799	Matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Plan Rdc	Vol 1409 (Parvis)	Murs	Joint de scellement	S2026 (P799)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P799		002KN 00018 9-5 n °799 - 1	P799	Matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Plan Rdc	Vol 1409 (Parvis)	Murs	Joint de scellement	S2027 (P799)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P799		002KN 00018 9-5 n °799 - 1	P799	Matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Plan Rdc	Vol 1409 (Parvis)	Murs	Joint de scellement	S2028 (P799)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P799		002KN 00018 9-5 n °799 - 1	P799	Matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1418 (Ext Sud)	Murs	Enduit ciment	P822	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °822 - 1	P822	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1418 (Ext Sud)	Poteaux	Enduits Ciment	P823	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °823 - 1	P823	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1418 (Ext Sud)	Murs	Enduit ciment	P824	Réalisation d'un prélevement	Mur rouge	002KN 00018 9-5 n °824 - 1	P824 Phase 1	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1418 (Ext Sud)	Murs	Enduit ciment	P824	Réalisation d'un prélevement	Mur rouge	002KN 00018 9-5 n °824 - 1	P824 Phase 2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 6 (SP 200)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 6 (SP 200)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 29	Murs et cloisons	Enduit ciment	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 73	Murs et cloisons	Enduit ciment	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 73	Murs et cloisons	Enduit ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 38	Murs et cloisons	Enduit ciment	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 39	Murs et cloisons	Enduit ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 40	Murs et cloisons	Enduit ciment	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 13 (SC 202)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 81	Murs et cloisons	Enduit ciment	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 72	Murs et cloisons	Enduit ciment	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 71	Murs et cloisons	Enduit ciment	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 80	Murs et cloisons	Enduit ciment	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 80	Murs et cloisons	Enduit ciment	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 255	Murs et cloisons	Enduit ciment	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 66	Murs et cloisons	Enduit ciment	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 66	Murs et cloisons	Enduit ciment	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 66	Murs et cloisons	Enduit ciment	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 66	Murs et cloisons	Enduit ciment	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 65 (SD200)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2066	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 65 (SD200)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2067	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 65 (SD200)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2068	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 65 (SD200)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2069	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Murs et cloisons	Enduit ciment	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Murs et cloisons	Enduit ciment	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 86	Murs et cloisons	Enduit ciment	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Murs et cloisons	Enduit ciment	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Murs et cloisons	Enduit ciment	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 86	Murs et cloisons	Enduit ciment	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 142	Murs et cloisons	Enduit ciment	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 142	Murs et cloisons	Enduit ciment	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 142	Murs et cloisons	Enduit ciment	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 142	Murs et cloisons	Enduit ciment	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 142	Murs et cloisons	Enduit ciment	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 142	Murs et cloisons	Enduit ciment	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 142	Murs et cloisons	Enduit ciment	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 142	Murs et cloisons	Enduit ciment	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 173	Murs et cloisons	Enduit ciment	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 171	Murs et cloisons	Enduit ciment	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 135	Murs et cloisons	Enduit ciment	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord) - Vol 2 (Parking centre) - Vol 6 (SP 200) - Vol 29 - Vol 73 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 13 (SC 202) - Vol 81 - Vol 251 (Sous-station) - Vol 72 - Vol 71 - Vol 80 - Vol 255 - Vol 66 - Vol 65 (SD200)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S37 - S38 - S41 - S54 - S55 - S68 - S69 - S70 - S76 - S82 - S83 - S84 - S85 - S88 - S93 - S94 - S95 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN 00018 9 n°1 - 1	002KN 00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
				S98 - S99 - S100 - S101 - S2066 - S2067 - S2068 - S2069							
Plan sous-sol -1	Vol 86 - Vol 142 - Vol 173 - Vol 171 - Vol 135	Murs et cloisons	Enduit ciment	S120 - S121 - S122 - S123 - S124 - S125 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131 - S132 - S133 - S171 - S176 - S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002KN00018 9 n°1 - 1	002KN00018 9 n°1	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P3	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n°3 - 1	002KN00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 4 (Réserve DI)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 4 (Réserve DI)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 24	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 46	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 37	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 86	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN00018 9 n°3 - 1	002KN00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN00018 9 n°3 - 1	002KN00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN00018 9 n°3 - 1	002KN00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN00018 9 n°3 - 1	002KN00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 86	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord) - Vol 4 (Réserve DI) - Vol 24 - Vol 2 (Parking centre) - Vol 46 - Vol 37	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P3 - S109 - S110 - S111 - S112 - S113 - S114 - S115 - S116 - S117 - S118 - S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN 00018 9 n°3 - 1	002KN 00018 9 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 86	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S159 - S160 - S161 - S162 - S163 - S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002KN000189 n°3 - 1	002KN000189 n°3	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Murs et cloisons	Joint de dilatation	P5	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°5 - 1	002KN000189 n°5	Matériau Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Murs et cloisons	Joint de dilatation	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002KN000189 n°5 - 1	002KN000189 n°5	Matériau Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 4 (Réserve DI)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu	P6	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°6 - 1	002KN000189 n°6	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 24	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002KN000189 n°6 - 1	002KN000189 n°6	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 7 (SP 202)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002KN000189 n°6 - 1	002KN000189 n°6	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 7 (SP 202)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002KN000189 n°6 - 1	002KN000189 n°6	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 24 - Vol 7 (SP 202)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu	S46 - S106 - S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002KN000189 n°6 - 1	002KN000189 n°6	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 15 (Esc)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P7	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°7 - 1	002KN000189 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 15 (Esc)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN000189 n°7 - 1	002KN000189 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 15 (Esc)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN000189 n°7 - 1	002KN000189 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 14 (Esc)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN000189 n°7 - 1	002KN000189 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 20 (Esc)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 75	Murs et cloisons	Enduit ciment	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 75	Murs et cloisons	Enduit ciment	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 74	Murs et cloisons	Enduit ciment	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 74	Murs et cloisons	Enduit ciment	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 37	Murs et cloisons	Enduit ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 36	Murs et cloisons	Enduit ciment	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 37	Murs et cloisons	Enduit ciment	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 37	Murs et cloisons	Enduit ciment	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 19 (SB 203)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2050	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 19 (SB 203)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2051	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 15 (Esc) - Vol 14 (Esc) - Vol 20 (Esc) - Vol 75 - Vol 74 - Vol 37 - Vol 36 - Vol 19 (SB 203)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P7 - S34 - S42 - S44 - S50 - S51 - S52 - S53 - S62 - S63 - S64 - S65 - S2050 - S2051	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002KN 00018 9 n°7 - 1	002KN 00018 9 n°7	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 24	Murs et cloisons	Flocages	P9	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°9 - 1	002KN 00018 9 n°9	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Flocages	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002KN 00018 9 n°9 - 1	002KN 00018 9 n°9	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Flocages	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002KN 00018 9 n°9 - 1	002KN 00018 9 n°9	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Flocages	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002KN 00018 9 n°9 - 1	002KN 00018 9 n°9	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Murs et cloisons	Flocages	S47 - S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002KN 00018 9 n°9 - 1	002KN 00018 9 n°9	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 36	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°17 - 1	002KN 00018 9 n°17	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 31	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P21	Réalisation d'un prélevement	Panneaux doublage	002KN 00018 9 n°21 - 1	002KN 00018 9 n°21	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Carton Fibreux Souple Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 31	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Panneaux doublage	002KN 00018 9 n°21 - 1	002KN 00018 9 n°21	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Carton Fibreux Souple Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Socle)	P24	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°24 - 1	002KN 00018 9 n°24	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Rouge Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Socle)	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002KN 00018 9 n°24 - 1	002KN 00018 9 n°24	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Rouge Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 8 (Ventilation amphi)	Gaines et coffre verticaux	Flocages	P34	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°34 - 1	002KN 00018 9 n°34	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 7 (SP 202)	Gaines et coffre verticaux	Flocages	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002KN00018 9 n°34 - 1	002KN00018 9 n°34	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 268	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S138	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P036 pyramide conseil du 03/03/2016
Plan R+1	Vol 272	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S146	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P032 pyramide conseil du 03/03/2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 174	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P38	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 172	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 175	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 157	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 156	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 156	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 243	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 243	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 243	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 188	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 189	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 179	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 146	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 149	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 152	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 58	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 172 - Vol 175 - Vol 157 - Vol 156 - Vol 243 - Vol 188 - Vol 189 - Vol 179 - Vol 146 - Vol 149 - Vol 152	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S170 - S172 - S181 - S182 - S183 - S192 - S193 - S194 - S199 - S200 - S201 - S213 - S214 - S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002KN 00018 9 n°38 - 1	002KN 00018 9 n°38	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 284	Murs et cloisons	Enduit ciment	P41	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°41 - 1	002KN 00018 9 n°41	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 284	Murs et cloisons	Enduit ciment	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002KN 00018 9 n°41 - 1	002KN 00018 9 n°41	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 284	Murs et cloisons	Enduit ciment	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002KN 00018 9 n°41 - 1	002KN 00018 9 n°41	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 284	Murs et cloisons	Enduit ciment	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002KN 00018 9 n°41 - 1	002KN 00018 9 n°41	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 284	Murs et cloisons	Enduit ciment	S187 - S188 - S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002KN 00018 9 n°41 - 1	002KN 00018 9 n°41	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 135	Gaines et coffre verticaux	Flocages	P43	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°43 - 1	002KN 00018 9 n°43	Flocage Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P48	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°48 - 1	002KN 00018 9 n°48	Plâtre Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P49	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°49 - 1	002KN 00018 9 n°49	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002KN 00018 9 n°49 - 1	002KN 00018 9 n°49	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Menuiseries	Mastic vitrier	P51	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°51 - 1	002KN 00018 9 n°51	Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Menuiseries	Mastic vitrier	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002KN 00018 9 n°51 - 1	002KN 00018 9 n°51	Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Menuiseries	Joint à lèvre	P52	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°52 - 1	002KN 00018 9 n°52	Peinture Effritable Noir Bois Dur Fibreux Marron Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Gris Mastic Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P54	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°54 - 1	002KN 00018 9 n°54	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Blanc Vert Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002KN00018 9 n°54 - 1	002KN00018 9 n°54	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Blanc Vert Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 276 (P115)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P56	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n°56 - 1	002KN00018 9 n°56	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 276 (P115)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P57	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°57 - 1	002KN 00018 9 n°57	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron Papier peint Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 276 (P115)	Menuiseries	Joint à lèvre	P58	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°58 - 1	002KN 00018 9 n°58	Joint Dur Marron Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P59	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°59 - 1	002KN 00018 9 n°59	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P60	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°60 - 1	002KN 00018 9 n°60	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002KN 00018 9 n°60 - 1	002KN 00018 9 n°60	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002KN 00018 9 n°60 - 1	002KN 00018 9 n°60	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S229 - S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002KN 00018 9 n°60 - 1	002KN 00018 9 n°60	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	P61	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°61 - 1	002KN000189 n°61	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002KN000189 n°61 - 1	002KN000189 n°61	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 287	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002KN000189 n°61 - 1	002KN000189 n°61	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 286 (P209) - Vol 287	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	P61 - S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002KN000189 n°61 - 1	002KN000189 n°61	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Menuiseries	Joint à lèvre	P63	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°63 - 1	002KN000189 n°63	Joint Effritable Marron Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Menuiseries	Joint à lèvre	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002KN000189 n°63 - 1	002KN000189 n°63	Joint Effritable Marron Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 287	Menuiseries	Joint à lèvre	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002KN 00018 9 n°63 - 1	002KN 00018 9 n°63	Joint Effritable Marron Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 286 (P209) - Vol 287	Menuiseries	Joint à lèvre	P63 - S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002KN 00018 9 n°63 - 1	002KN 00018 9 n°63	Joint Effritable Marron Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 287	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P64	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°64 - 1	002KN 00018 9 n°64	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Vert Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 287	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P65	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°65 - 1	002KN 00018 9 n°65	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 288	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P67	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°67 - 1	002KN 00018 9 n°67	Peinture Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 289 (P321)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002KN 00018 9 n°67 - 1	002KN 00018 9 n°67	Peinture Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 289 (P321)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002KN 00018 9 n°67 - 1	002KN 00018 9 n°67	Peinture Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 289 (P321)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S240 - S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002KN 00018 9 n°67 - 1	002KN 00018 9 n°67	Peinture Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 288	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P68	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°68 - 1	002KN 00018 9 n°68	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 288	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002KN00018 9 n°68 - 1	002KN00018 9 n°68	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 289 (P321)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002KN00018 9 n°68 - 1	002KN00018 9 n°68	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 289 (P321)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002KN00018 9 n°68 - 1	002KN00018 9 n°68	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 288 - Vol 289 (P321)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S239 - S242 - S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002KN 00018 9 n°68 - 1	002KN 00018 9 n°68	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 289 (P321)	Menuiseries	Mastic vitrier	P70	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°70 - 1	002KN 00018 9 n°70	Mastic Effritable Marron Peinture Effritable Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 288	Menuiseries	Mastic vitrier	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002KN 00018 9 n°70 - 1	002KN 00018 9 n°70	Mastic Effritable Marron Peinture Effritable Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 288	Menuiseries	Mastic vitrier	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002KN 00018 9 n°70 - 1	002KN 00018 9 n°70	Mastic Effritable Marron Peinture Effritable Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 288	Menuiseries	Mastic vitrier	S245 - S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002KN 00018 9 n°70 - 1	002KN 00018 9 n°70	Mastic Effritable Marron Peinture Effritable Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 290 (P413 ter)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P71	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°71 - 1	002KN 00018 9 n°71	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Vert Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 290 (P413 ter)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P72	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°72 - 1	002KN 00018 9 n°72	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 290 (P413 ter)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002KN 00018 9 n°72 - 1	002KN 00018 9 n°72	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 290 (P413 ter)	Menuiseries	Mastic vitrier	P73	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°73 - 1	002KN 00018 9 n°73	Mastic Dur Marron Matériau Effritable Noir Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 291 (P427)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P75	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°75 - 1	002KN 00018 9 n°75	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 291 (P427)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P76	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°76 - 1	002KN 00018 9 n°76	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 291 (P427)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002KN 00018 9 n°76 - 1	002KN 00018 9 n°76	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 291 (P427)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002KN 00018 9 n°76 - 1	002KN 00018 9 n°76	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 291 (P427)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S250 - S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002KN 00018 9 n°76 - 1	002KN 00018 9 n°76	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 291 (P427)	Menuiseries	Mastic vitrier	P77	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°77 - 1	002KN 00018 9 n°77	Mastic Dur Marron Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 291 (P427)	Menuiseries	Mastic vitrier	P77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002KN 00018 9 n°77 - 1	002KN 00018 9 n°77	Mastic Dur Marron Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 292 (P517)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P79	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°79 - 1	002KN 00018 9 n°79	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 292 (P517)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°80 - 1	002KN 00018 9 n°80	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 292 (P517)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002KN 00018 9 n°80 - 1	002KN 00018 9 n°80	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 292 (P517)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002KN000189 n°80 - 1	002KN000189 n°80	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 292 (P517)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S259 - S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002KN000189 n°80 - 1	002KN000189 n°80	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 294 (P535)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P81	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°81 - 1	002KN000189 n°81	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 294 (P535)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°82 - 1	002KN000189 n°82	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 294 (P535)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002KN00018 9 n°82 - 1	002KN00018 9 n°82	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 294 (P535)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002KN00018 9 n°82 - 1	002KN00018 9 n°82	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 294 (P535)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S263 - S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002KN00018 9 n°82 - 1	002KN00018 9 n°82	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 294 (P535)	Menuiseries	Mastic vitrier	P83	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n°83 - 1	002KN00018 9 n°83	Mastic Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 294 (P535)	Menuiseries	Mastic vitrier	P83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002KN 00018 9 n°83 - 1	002KN 00018 9 n°83	Mastic Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 295	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P84	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°84 - 1	002KN 00018 9 n°84	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 296 (P611)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002KN 00018 9 n°84 - 1	002KN 00018 9 n°84	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 295	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P85	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°85 - 1	002KN 00018 9 n°85	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 295	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002KN00018 9 n°85 - 1	002KN00018 9 n°85	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 295	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002KN00018 9 n°85 - 1	002KN00018 9 n°85	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 296 (P611)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002KN00018 9 n°85 - 1	002KN00018 9 n°85	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 295 - Vol 296 (P611)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S268 - S269 - S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002KN00018 9 n°85 - 1	002KN00018 9 n°85	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 295	Menuiseries	Mastic vitrier	P86	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n°86 - 1	002KN00018 9 n°86	Mastic Dur Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 296 (P611)	Menuiseries	Mastic vitrier	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002KN00018 9 n°86 - 1	002KN00018 9 n°86	Mastic Dur Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 297	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P87	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n°87 - 1	002KN00018 9 n°87	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 297	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P88	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n°88 - 1	002KN00018 9 n°88	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 297	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002KN000189 n°88 - 1	002KN000189 n°88	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 297	Menuiseries	Mastic vitrier	P89	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°89 - 1	002KN000189 n°89	Mastic Dur Beige Matériau Effritable Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 313	Porte coupe-feu	Joint	S288	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P29
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P91	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°91 - 1	002KN000189 n°91	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P92	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°92 - 1	002KN000189 n°92	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002KN 00018 9 n°92 - 1	002KN 00018 9 n°92	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002KN 00018 9 n°92 - 1	002KN 00018 9 n°92	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S295 - S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002KN 00018 9 n°92 - 1	002KN 00018 9 n°92	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P93	Réalisation d'un prélevement	Au niveau de l'angle (bande calicot)	002KN 00018 9 n°93 - 1	002KN 00018 9 n°93	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93	Au niveau de l'angle (bande calicot)	002KN 00018 9 n°93 - 1	002KN 00018 9 n°93	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P95	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°95 - 1	002KN 00018 9 n°95	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P96	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°96 - 1	002KN000189 n°96	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002KN000189 n°96 - 1	002KN000189 n°96	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002KN000189 n°96 - 1	002KN000189 n°96	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S298 - S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002KN000189 n°96 - 1	002KN000189 n°96	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Menuiseries	Mastic vitrier	P97	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°97 - 1	002KN000189 n°97	Bois Dur Fibreux Marron Mastic Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Menuiseries	Mastic vitrier	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002KN000189 n°97 - 1	002KN000189 n°97	Bois Dur Fibreux Marron Mastic Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P98	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°98 - 1	002KN000189 n°98	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 322 (B212)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P100	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °100 - 1	002KN000189 n °100	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 322 (B212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P101	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °101 - 1	002KN 00018 9 n °101	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 322 (B212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002KN 00018 9 n °101 - 1	002KN 00018 9 n °101	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 322 (B212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002KN 00018 9 n °101 - 1	002KN 00018 9 n °101	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 322 (B212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S306 - S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002KN 00018 9 n °101 - 1	002KN 00018 9 n °101	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 322 (B212)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P102	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °102 - 1	002KN 00018 9 n °102	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 322 (B212)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002KN 00018 9 n °102 - 1	002KN 00018 9 n °102	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 324 (B223)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P104	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °104 - 1	002KN 00018 9 n °104	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 323 (B225)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002KN 00018 9 n °104 - 1	002KN 00018 9 n °104	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 324 (B223)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P105	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °105 - 1	002KN 00018 9 n °105	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 324 (B223)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002KN 00018 9 n °105 - 1	002KN 00018 9 n °105	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 323 (B225)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002KN 00018 9 n °105 - 1	002KN 00018 9 n °105	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 324 (B223) - Vol 323 (B225)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S314 - S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002KN 00018 9 n °105 - 1	002KN 00018 9 n °105	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 324 (B223)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S308	Réalisation d'un sondage		S308 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Cloison récente séparatrice
Plan R+2	Vol 323 (B225)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S309	Réalisation d'un sondage		S309 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Cloison récente séparatrice
Plan R+2	Vol 324 (B223)	Menuiseries	Mastic vitrier	P106	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °106 - 1	002KN000189 n °106	Bois Dur Fibreux Marron Mastic Dur Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 323 (B225)	Menuiseries	Mastic vitrier	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002KN000189 n °106 - 1	002KN000189 n °106	Bois Dur Fibreux Marron Mastic Dur Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 325 (B302)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P108	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °108 - 1	002KN 00018 9 n °108	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 325 (B302)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P109	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °109 - 1	002KN 00018 9 n °109	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 325 (B302)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002KN 00018 9 n °109 - 1	002KN 00018 9 n °109	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 325 (B302)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002KN 00018 9 n °109 - 1	002KN 00018 9 n °109	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 325 (B302)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S320 - S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002KN 00018 9 n °109 - 1	002KN 00018 9 n °109	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 326 (B408)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P110	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °110 - 1	002KN 00018 9 n °110	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 326 (B408)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P111	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °111 - 1	002KN 00018 9 n°111	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 326 (B408)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002KN 00018 9 n °111 - 1	002KN 00018 9 n°111	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 327 (B424 bis)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P113	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °113 - 1	002KN 00018 9 n °113	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 327 (B424 bis)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P114	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °114 - 1	002KN 00018 9 n °114	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 327 (B424 bis)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002KN 00018 9 n °114 - 1	002KN 00018 9 n °114	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 328 (B530)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P116	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °116 - 1	002KN 00018 9 n °116	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 329 (B532)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002KN 00018 9 n °116 - 1	002KN 00018 9 n °116	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 328 (B530)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P117	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °117 - 1	002KN 00018 9 n °117	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 328 (B530)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002KN 00018 9 n °117 - 1	002KN 00018 9 n °117	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 328 (B530)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002KN000189 n °117 - 1	002KN000189 n °117	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 329 (B532)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002KN000189 n °117 - 1	002KN000189 n °117	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 328 (B530) - Vol 329 (B532)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S336 - S337 - S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002KN000189 n °117 - 1	002KN000189 n °117	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 330 (B606)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P119	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °119 - 1	002KN000189 n °119	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 331 (B632)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002KN000189 n °119 - 1	002KN000189 n °119	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 330 (B606)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P120	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °120 - 1	002KN 00018 9 n °120	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 330 (B606)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002KN 00018 9 n °120 - 1	002KN 00018 9 n °120	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 330 (B606)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002KN 00018 9 n °120 - 1	002KN 00018 9 n °120	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 331 (B632)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002KN 00018 9 n °120 - 1	002KN 00018 9 n °120	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 331 (B632)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002KN 00018 9 n °120 - 1	002KN 00018 9 n °120	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 331 (B632)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002KN 00018 9 n °120 - 1	002KN 00018 9 n °120	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 330 (B606) - Vol 331 (B632)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S343 - S344 - S347 - S348 - S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002KN 00018 9 n °120 - 1	002KN 00018 9 n °120	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 332 (B644)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P122	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °122 - 1	002KN 00018 9 n °122	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 332 (B644)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P123	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °123 - 1	002KN 00018 9 n °123	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 332 (B644)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002KN 00018 9 n °123 - 1	002KN 00018 9 n °123	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 332 (B644)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002KN 00018 9 n °123 - 1	002KN 00018 9 n °123	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 332 (B644)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S352 - S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002KN 00018 9 n °123 - 1	002KN 00018 9 n °123	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 333 (C614)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P125	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °125 - 1	002KN 00018 9 n °125	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 333 (C614)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002KN 00018 9 n °125 - 1	002KN 00018 9 n °125	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 333 (C614)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P126	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °126 - 1	002KN 00018 9 n °126	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 333 (C614)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002KN 00018 9 n °126 - 1	002KN 00018 9 n °126	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 334 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P127	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °127 - 1	002KN 00018 9 n °127	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 334 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P128	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n °128 - 1	002KN00018 9 n °128	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 334 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002KN00018 9 n °128 - 1	002KN00018 9 n °128	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 334 (Bureau 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P129	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n °129 - 1	002KN00018 9 n °129	Matériau Effritable Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 334 (Bureau 4)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	P130	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n °130 - 1	002KN00018 9 n °130	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 334 (Bureau 4)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	P130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002KN 00018 9 n °130 - 1	002KN 00018 9 n °130	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 335 (D511 bis)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P131	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °131 - 1	002KN 00018 9 n °131	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 335 (D511 bis)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P132	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °132 - 1	002KN 00018 9 n °132	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 335 (D511 bis)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002KN 00018 9 n °132 - 1	002KN 00018 9 n °132	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 335 (D511 bis)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002KN 00018 9 n °132 - 1	002KN 00018 9 n °132	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 335 (D511 bis)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S361 - S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002KN 00018 9 n °132 - 1	002KN 00018 9 n °132	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 335 (D511 bis)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P133	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °133 - 1	002KN 00018 9 n °133	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 335 (D511 bis)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002KN000189 n °133 - 1	002KN000189 n °133	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 335 (D511 bis)	Menuiseries	Mastic vitrier	P135	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °135 - 1	002KN000189 n °135	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 336 (D512)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P137	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °137 - 1	002KN000189 n °137	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 336 (D512)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P138	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °138 - 1	002KN000189 n °138	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 336 (D512)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002KN000189 n °138 - 1	002KN000189 n °138	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 336 (D512)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002KN000189 n °138 - 1	002KN000189 n °138	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 336 (D512)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S364 - S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002KN 00018 9 n °138 - 1	002KN 00018 9 n °138	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 336 (D512)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P139	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °139 - 1	002KN 00018 9 n °139	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 336 (D512)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002KN 00018 9 n °139 - 1	002KN 00018 9 n °139	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 337 (B516)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P141	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °141 - 1	002KN 00018 9 n °141	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 337 (B516)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P142	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °142 - 1	002KN 00018 9 n °142	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 337 (B516)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142		002KN 00018 9 n °142 - 1	002KN 00018 9 n °142	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 337 (B516)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142		002KN 00018 9 n °142 - 1	002KN 00018 9 n °142	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 337 (B516)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P142 - S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142		002KN 00018 9 n °142 - 1	002KN 00018 9 n °142	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 337 (B516)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P143	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °143 - 1	002KN 00018 9 n °143	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 337 (B516)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P143		002KN00018 9 n °143 - 1	002KN00018 9 n °143	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P145	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n °145 - 1	002KN00018 9 n °145	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		002KN00018 9 n °145 - 1	002KN00018 9 n °145	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P146	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n °146 - 1	002KN00018 9 n °146	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002KN 00018 9 n °146 - 1	002KN 00018 9 n °146	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P147	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °147 - 1	002KN 00018 9 n °147	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147		002KN 00018 9 n °147 - 1	002KN 00018 9 n °147	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Menuiseries	Mastic vitrier	P148	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °148 - 1	002KN 00018 9 n °148	Mastic Dur Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Menuiseries	Mastic vitrier	P148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148		002KN 00018 9 n °148 - 1	002KN 00018 9 n °148	Mastic Dur Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Menuiseries	Mastic vitrier	P149	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °149 - 1	002KN 00018 9 n °149	Mastic Effritable Noir Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Menuiseries	Mastic vitrier	P149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P149		002KN 00018 9 n °149 - 1	002KN 00018 9 n °149	Mastic Effritable Noir Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 339 (D409)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P151	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °151 - 1	002KN 00018 9 n °151	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 339 (D409)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P152	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °152 - 1	002KN 00018 9 n °152	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Marron Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 339 (D409)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002KN 00018 9 n °152 - 1	002KN 00018 9 n °152	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Marron Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 339 (D409)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002KN 00018 9 n °152 - 1	002KN 00018 9 n °152	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Marron Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 339 (D409)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P152 - S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002KN 00018 9 n °152 - 1	002KN 00018 9 n °152	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Marron Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 339 (D409)	Menuiseries	Mastic vitrier	P153	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °153 - 1	002KN 00018 9 n °153	Mastic Dur Noir Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 339 (D409)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P154	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n °154 - 1	002KN00018 9 n °154	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 339 (D409)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002KN00018 9 n °154 - 1	002KN00018 9 n °154	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P156	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9 n °156 - 1	002KN00018 9 n °156	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P157	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °157 - 1	002KN 00018 9 n °157	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002KN 00018 9 n °157 - 1	002KN 00018 9 n °157	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002KN 00018 9 n °157 - 1	002KN 00018 9 n °157	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P157 - S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002KN 00018 9 n °157 - 1	002KN 00018 9 n °157	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P158	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °158 - 1	002KN 00018 9 n °158	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002KN 00018 9 n °158 - 1	002KN 00018 9 n °158	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Menuiseries	Mastic vitrier	P159	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °159 - 1	002KN 00018 9 n °159	Joint Souple Gris Mastic Dur Blanc Matériau Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 341 (C408)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P160	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °160 - 1	002KN 00018 9 n °160	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 341 (C408)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P161	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °161 - 1	002KN 00018 9 n °161	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 341 (C408)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002KN 00018 9 n °161 - 1	002KN 00018 9 n °161	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 341 (C408)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002KN 00018 9 n °161 - 1	002KN 00018 9 n °161	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 341 (C408)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S380 - S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002KN 00018 9 n °161 - 1	002KN 00018 9 n °161	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 341 (C408)	Menuiseries	Mastic vitrier	P162	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °162 - 1	002KN 00018 9 n °162	Mastic Dur Blanc Matériau Effritable Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P163	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °163 - 1	002KN 00018 9 n °163	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Orange Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002KN 00018 9 n °163 - 1	002KN 00018 9 n °163	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Orange Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P164	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °164 - 1	002KN 00018 9 n °164	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Orange Beige Toile Fibreux Souple Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002KN 00018 9 n °164 - 1	002KN 00018 9 n °164	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Orange Beige Toile Fibreux Souple Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P165	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °165 - 1	002KN 00018 9 n °165	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002KN 00018 9 n °165 - 1	002KN 00018 9 n °165	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Menuiseries	Mastic vitrier	P166	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °166 - 1	002KN 00018 9 n °166	Bois Dur Fibreux Marron Peinture Effritable Noir Mastic Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Menuiseries	Mastic vitrier	P166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002KN 00018 9 n °166 - 1	002KN 00018 9 n °166	Bois Dur Fibreux Marron Peinture Effritable Noir Mastic Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 343 (D111)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P167	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °167 - 1	002KN 00018 9 n °167	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 343 (D111)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P168	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °168 - 1	002KN 00018 9 n °168	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 343 (D111)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002KN 00018 9 n °168 - 1	002KN 00018 9 n °168	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 343 (D111)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P169	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °169 - 1	002KN 00018 9 n °169	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 343 (D111)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002KN 00018 9 n °169 - 1	002KN 00018 9 n °169	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 343 (D111)	Menuiseries	Mastic vitrier	P170	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °170 - 1	002KN 00018 9 n °170	Mastic Effritable Marron Beige Matériau Effritable Noir Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 344 (D110)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P172	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °172 - 1	002KN 00018 9 n °172	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 344 (D110)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002KN 00018 9 n °172 - 1	002KN 00018 9 n °172	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 344 (D110)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P173	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °173 - 1	002KN 00018 9 n °173	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 344 (D110)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002KN 00018 9 n °173 - 1	002KN 00018 9 n °173	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 344 (D110)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P174	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °174 - 1	002KN 00018 9 n °174	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 344 (D110)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002KN 00018 9 n °174 - 1	002KN 00018 9 n °174	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P179	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 264	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 264	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 264	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 264	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 348 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 348 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 348 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 348 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A) - Vol 264	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P179 - S396 - S397 - S398 - S399 - S400 - S401 - S402 - S403 - S404 - S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 348 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S412 - S413 - S414 - S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S416 - S417 - S418 - S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S420 - S421 - S422 - S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002KN 00018 9 n °179 - 1	002KN 00018 9 n °179	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P186	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S428 - S429 - S430 - S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S436 - S437 - S438 - S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S440 - S441 - S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002KN 00018 9 n °186 - 1 - 002KN 00018 9 n °186 - 2	002KN 00018 9 n °186	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 360	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P192	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 360	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 357	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 357	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 357	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 357	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 356	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 356	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 361	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 361	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 362	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 362	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 367	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 367	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 368	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 368	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 369	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 369	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 370	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 370	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 360 - Vol 357 - Vol 356 - Vol 361 - Vol 362	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S453 - S454 - S455 - S456 - S457 - S458 - S459 - S460 - S461 - S462 - S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 367 - Vol 368 - Vol 369 - Vol 370	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S496 - S497 - S498 - S499 - S500 - S501 - S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002KN 00018 9 n °192 - 1	002KN 00018 9 n °192	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 359	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P194	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °194 - 1	002KN 00018 9 n °194	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 359	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002KN 00018 9 n °194 - 1	002KN 00018 9 n °194	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 358	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002KN 00018 9 n °194 - 1	002KN 00018 9 n °194	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 359 - Vol 358	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P194 - S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002KN 00018 9 n °194 - 1	002KN 00018 9 n °194	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 359	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °195 - 1	002KN 00018 9 n °195	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 359	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002KN 00018 9 n °195 - 1	002KN 00018 9 n °195	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 358	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002KN 00018 9 n °195 - 1	002KN 00018 9 n °195	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 359 - Vol 358	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195 - S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002KN 00018 9 n °195 - 1	002KN 00018 9 n °195	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 364	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P203	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 364	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 363	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 363	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 365	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 365	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 366	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 366	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 373	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 373	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 372	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 372	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 371	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 371	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 364 - Vol 363 - Vol 365 - Vol 366	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S482 - S483 - S484 - S485 - S486 - S487 - S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 373 - Vol 372 - Vol 371	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S503 - S504 - S505 - S506 - S507 - S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002KN 00018 9 n °203 - 1	002KN 00018 9 n °203	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 376	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P206	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 376	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 377	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 377	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 375	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 375	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 374	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 374	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 380	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 380	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 379	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 379	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 378	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 378	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 376 - Vol 377 - Vol 375 - Vol 374	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S514 - S515 - S516 - S517 - S518 - S519 - S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 380 - Vol 379 - Vol 378	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S530 - S531 - S532 - S533 - S534 - S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002KN 00018 9 n °206 - 1	002KN 00018 9 n °206	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 375	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P211	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °211 - 1	002KN 00018 9 n °211	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 375	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002KN 00018 9 n °211 - 1	002KN 00018 9 n °211	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 379	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002KN 00018 9 n °211 - 1	002KN 00018 9 n °211	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 372	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002KN 00018 9 n °211 - 1	002KN 00018 9 n °211	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 363	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P212	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °212 - 1	002KN 00018 9 n °212	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 363	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002KN 00018 9 n °212 - 1	002KN 00018 9 n °212	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 368	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002KN 00018 9 n °212 - 1	002KN 00018 9 n °212	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 362	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002KN 00018 9 n °212 - 1	002KN 00018 9 n °212	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 432	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S680	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P33 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S692	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P11 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 449	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S713	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'003 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 452	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S723	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'013 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 455	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S731	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P006 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 476	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S772	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P032 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 530	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S843	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P023 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 538	Porte coupe-feu	Joint	S859	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P045 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 550	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S880	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P020 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 551	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S885	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P019 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 577	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S916	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P012 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 586	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S927	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P067 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 591	Murs et cloisons	Joint de dilatation	S928	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P058 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 587	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Carton + plâtre	S933	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P002 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 587	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Carton + plâtre	S933	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S933						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P002 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 601	Murs et cloisons	Joint de scellement	S943	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P010 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 600	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S945	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P004 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 600	Menuiseries	Mastic vitrier	S949	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P008 pyramide conseil
Plan R+7	Vol 610	Murs et cloisons	Enduit ciment	P223	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-1 n°223 - 1	002KN000189-1 n°223	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 610	Murs et cloisons	Enduit ciment	S961	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P223		002KN000189-1 n°223 - 1	002KN000189-1 n°223	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 611	Murs et cloisons	Enduit ciment	P224	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °224 - 1	002KN 00018 9-1 n °224	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 611	Murs et cloisons	Enduit ciment	S962	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P224		002KN 00018 9-1 n °224 - 1	002KN 00018 9-1 n °224	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 613	Murs et cloisons	Enduit ciment	P230	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °230 - 1	002KN 00018 9-1 n °230	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 613	Murs et cloisons	Enduit ciment	P230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P230		002KN 00018 9-1 n °230 - 1	002KN 00018 9-1 n °230	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 613	Murs et cloisons	Enduit ciment	S966	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P230		002KN 00018 9-1 n °230 - 1	002KN 00018 9-1 n °230	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 613	Murs et cloisons	Enduit ciment	P230 - S966	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P230		002KN 00018 9-1 n °230 - 1	002KN 00018 9-1 n °230	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 614	Murs et cloisons	Enduit ciment	P233	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °233 - 1	002KN 00018 9-1 n °233	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 616	Murs et cloisons	Enduit ciment	S994	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002KN 00018 9-1 n °233 - 1	002KN 00018 9-1 n °233	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 616	Murs et cloisons	Enduit ciment	S995	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002KN 00018 9-1 n °233 - 1	002KN 00018 9-1 n °233	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 618	Murs et cloisons	Enduit ciment	S996	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002KN 00018 9-1 n °233 - 1	002KN 00018 9-1 n °233	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 616	Murs et cloisons	Enduit ciment	S997	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002KN 00018 9-1 n °233 - 1	002KN 00018 9-1 n °233	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 618	Murs et cloisons	Enduit ciment	S998	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002KN 00018 9-1 n °233 - 1	002KN 00018 9-1 n °233	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 616 - Vol 618	Murs et cloisons	Enduit ciment	S994 - S995 - S996 - S997 - S998	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002KN 00018 9-1 n °233 - 1	002KN 00018 9-1 n °233	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 615	Gaines et coffre verticaux	Flocages	P234	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °234 - 1	002KN 00018 9-1 n °234	Flocage Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 618	Gaines et coffre verticaux	Flocages	P235	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °235 - 1	002KN 00018 9-1 n °235	Flocage Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 611	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P237	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °237 - 1	002KN 00018 9-1 n °237	Plâtre Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P242	Réalisation d'un prélevement	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °242 - 1	002KN 00018 9-1 n °242	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1022	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °242 - 1	002KN 00018 9-1 n °242	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1023	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °242 - 1	002KN 00018 9-1 n °242	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 387	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1024	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °242 - 1	002KN 00018 9-1 n °242	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1025	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °242 - 1	002KN 00018 9-1 n °242	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1026	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °242 - 1	002KN 00018 9-1 n °242	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1027	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °242 - 1	002KN 00018 9-1 n °242	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1028	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °242 - 1	002KN 00018 9-1 n °242	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 387	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1029	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °242 - 1	002KN 00018 9-1 n °242	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1030	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °242 - 1	002KN 00018 9-1 n °242	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1022 - S1023 - S1024 - S1025 - S1026 - S1027 - S1028 - S1029 - S1030	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °242 - 1	002KN 00018 9-1 n °242	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P243	Réalisation d'un prélevement	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °243 - 1	002KN00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1011	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °243 - 1	002KN00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1012	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °243 - 1	002KN00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1013	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °243 - 1	002KN00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1014	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °243 - 1	002KN00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1015	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °243 - 1	002KN00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1016	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °243 - 1	002KN00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1017	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °243 - 1	002KN00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1018	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °243 - 1	002KN00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1019	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °243 - 1	002KN00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1020	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °243 - 1	002KN 00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1021	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °243 - 1	002KN 00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 388	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1011 - S1012 - S1013 - S1014 - S1015 - S1016 - S1017 - S1018 - S1019 - S1020 - S1021	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °243 - 1	002KN00018 9-1 n °243	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 624	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P244	Réalisation d'un prélevement	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °244 - 1	002KN00018 9-1 n °244	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 624	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1031	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °244 - 1	002KN 00018 9-1 n °244	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 624	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1032	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °244 - 1	002KN 00018 9-1 n °244	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 624	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1033	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °244 - 1	002KN 00018 9-1 n °244	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 624	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1034	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °244 - 1	002KN 00018 9-1 n °244	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 624	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1035	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °244 - 1	002KN 00018 9-1 n °244	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 624	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1036	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °244 - 1	002KN 00018 9-1 n °244	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 624	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1037	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °244 - 1	002KN 00018 9-1 n °244	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 624	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1038	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °244 - 1	002KN 00018 9-1 n °244	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 624	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1039	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °244 - 1	002KN 00018 9-1 n °244	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 624	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1031 - S1032 - S1033 - S1034 - S1035 - S1036 - S1037 - S1038 - S1039	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °244 - 1	002KN 00018 9-1 n °244	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 390	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P245	Réalisation d'un prélevement	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °245 - 1	002KN00018 9-1 n °245	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 390	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1040	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °245 - 1	002KN00018 9-1 n °245	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 390	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1041	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °245 - 1	002KN 00018 9-1 n °245	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 390	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1042	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °245 - 1	002KN 00018 9-1 n °245	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 390	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1043	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °245 - 1	002KN 00018 9-1 n °245	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 390	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1044	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °245 - 1	002KN 00018 9-1 n °245	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 390	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1045	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °245 - 1	002KN 00018 9-1 n °245	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 390	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1046	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °245 - 1	002KN 00018 9-1 n °245	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 390	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1047	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °245 - 1	002KN 00018 9-1 n °245	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 390	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1048	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °245 - 1	002KN 00018 9-1 n °245	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 390	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1040 - S1041 - S1042 - S1043 - S1044 - S1045 - S1046 - S1047 - S1048	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °245 - 1	002KN00018 9-1 n °245	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P246	Réalisation d'un prélevement	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °246 - 1	002KN00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1049	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °246 - 1	002KN00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1050	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °246 - 1	002KN00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1051	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN00018 9-1 n °246 - 1	002KN00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1052	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °246 - 1	002KN 00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1053	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °246 - 1	002KN 00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1054	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °246 - 1	002KN 00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1055	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °246 - 1	002KN 00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1056	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °246 - 1	002KN 00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1057	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °246 - 1	002KN 00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1058	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °246 - 1	002KN 00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1059	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °246 - 1	002KN 00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 626	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1049 - S1050 - S1051 - S1052 - S1053 - S1054 - S1055 - S1056 - S1057 - S1058 - S1059	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °246 - 1	002KN 00018 9-1 n °246	Enduits lissés	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 627	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P247	Réalisation d'un prélevement	Enduit avec colle bande calicot	002KN 00018 9-1 n °247 - 1	002KN 00018 9-1 n °247	Enduit Effritable Beige Blanc Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 630	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P253	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °253 - 1	002KN 00018 9-1 n °253	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Papier Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 631	Murs et cloisons	Enduit ciment	P254	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °254 - 1	002KN 00018 9-1 n °254	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 630	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1067	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002KN 00018 9-1 n °254 - 1	002KN 00018 9-1 n °254	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 631	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1070	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002KN 00018 9-1 n °254 - 1	002KN 00018 9-1 n °254	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 630 - Vol 631	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1067 - S1070	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002KN 00018 9-1 n °254 - 1	002KN 00018 9-1 n °254	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 631	Murs et cloisons	Panneaux bois	S1071	Réalisation d'un sondage		S1071 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Panneaux bois

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	P258	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °258 - 1	002KN 00018 9-1 n °258	Mastic Dur Gris Matériau Effritable Noir	Positif	Présence sur analyse
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	P258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002KN 00018 9-1 n °258 - 1	002KN 00018 9-1 n °258	Mastic Dur Gris Matériau Effritable Noir	Positif	Présence sur analyse
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1072 (P258)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002KN 00018 9-1 n °258 - 1	002KN 00018 9-1 n °258	Mastic Dur Gris Matériau Effritable Noir	Positif	Présence sur analyse
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	P259	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °259 - 1	002KN 00018 9-1 n °259	Mastic Dur Gris Matériau Effritable Noir	Positif	Présence sur analyse
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	P259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002KN 00018 9-1 n °259 - 1	002KN 00018 9-1 n °259	Mastic Dur Gris Matériau Effritable Noir	Positif	Présence sur analyse
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1073 (P259)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002KN 00018 9-1 n °259 - 1	002KN 00018 9-1 n °259	Mastic Dur Gris Matériau Effritable Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan façade intérieur	Vol 634 (Façade intérieur)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Parement	I8			I8 - 1				Impossible de sonder dans l'état actuel sans sondage très destructif
Plan façade extérieur	Vol 633 (Façade extérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	P260	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-1 n °260 - 1 - 002KN000189-1 n °260 - 2	002KN000189-1 n °260	Mastic Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Plan façade extérieur	Vol 633 (Façade extérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	P260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P260		002KN000189-1 n °260 - 1 - 002KN000189-1 n °260 - 2	002KN000189-1 n °260	Mastic Dur Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan façade extérieur	Vol 633 (Façade extérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	P261	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °261 - 1 - 002KN 00018 9-1 n °261 - 2	002KN 00018 9-1 n °261	Mastic Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Plan façade extérieur	Vol 633 (Façade extérieur)	Menuiseries	Mastic vitrier	P261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002KN 00018 9-1 n °261 - 1 - 002KN 00018 9-1 n °261 - 2	002KN 00018 9-1 n °261	Mastic Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit plâtre	P262	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °262 - 1	002KN 00018 9-2 n °262	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit plâtre	P262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002KN 00018 9-2 n °262 - 1	002KN 00018 9-2 n °262	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P263	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °263 - 1	002KN 00018 9-2 n °263	Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P264	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °264 - 1	002KN 00018 9-2 n °264	Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S1076	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002KN 00018 9-2 n °264 - 1	002KN 00018 9-2 n °264	Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S1077	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002KN 00018 9-2 n °264 - 1	002KN 00018 9-2 n °264	Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S1076 - S1077	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002KN 00018 9-2 n °264 - 1	002KN 00018 9-2 n °264	Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Menuiseries	Mastic vitrier	P265	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °265 - 1 - 002KN 00018 9-2 n °265 - 2	002KN 00018 9-2 n °265	Mastic Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1080	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002KN 00018 9-2 n °265 - 1 - 002KN 00018 9-2 n °265 - 2	002KN 00018 9-2 n °265	Mastic Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Menuiseries	Mastic d'étanchéité	P267	Réalisation d'un prélèvement		002KN 00018 9-2 n °267 - 1	002KN 00018 9-2 n °267	Mastic d'étanchéité	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Menuiseries	Mastic d'étanchéité	S1078	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		002KN 00018 9-2 n °267 - 1	002KN 00018 9-2 n °267	Mastic d'étanchéité	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 627	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit plâtre	P268	Réalisation d'un prélèvement		002KN 00018 9-2 n °268 - 1	002KN 00018 9-2 n °268	Papier peint Souple Fibreux Rose Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 627	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit plâtre	P268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002KN 00018 9-2 n °268 - 1	002KN 00018 9-2 n °268	Papier peint Souple Fibreux Rose Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P273	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °273 - 1	002KN 00018 9-2 n °273	Plâtre Dur Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P274	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1081	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1082	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1083	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1084	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1085	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1086	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1087	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1088	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1089	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1090	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1081 - S1082 - S1083 - S1084 - S1085 - S1086 - S1087 - S1088 - S1089 - S1090	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002KN 00018 9-2 n °274 - 1	002KN 00018 9-2 n °274	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Gaines et coffre verticaux	Flocages	P276	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °276 - 1	002KN 00018 9-2 n °276	Flocage Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Gaines et coffre verticaux	Flocages	S1091	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002KN 00018 9-2 n °276 - 1	002KN 00018 9-2 n °276	Flocage Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 636 Salle de reunion	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	P278	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °278 - 1	002KN 00018 9-2 n °278	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 636 Salle de reunion	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés	S1092	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P278		002KN00018 9-2 n °278 - 1	002KN00018 9-2 n °278	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 636 Salle de reunion	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P279	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-2 n °279 - 1	002KN00018 9-2 n °279	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 636 Salle de reunion	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P280	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-2 n °280 - 1	002KN00018 9-2 n °280	Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Marron Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 636 Salle de reunion	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P281	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-2 n °281 - 1	002KN00018 9-2 n °281	Plâtre Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 636 Salle de reunion	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1093	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002KN00018 9-2 n °281 - 1	002KN00018 9-2 n °281	Plâtre Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 636 Salle de reunion	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1094	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002KN00018 9-2 n °281 - 1	002KN00018 9-2 n °281	Plâtre Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 636 Salle de reunion	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1093 - S1094	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002KN 00018 9-2 n °281 - 1	002KN 00018 9-2 n °281	Plâtre Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 191	Murs et cloisons	Enduits ciment	P289	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °289 - 1	002KN 00018 9-3 n °289	Peinture Effritable Blanc Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 189	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P292	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °292 - 1	002KN 00018 9-3 n °292	Peinture Effritable Blanc Gris Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 113	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P307	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °307 - 1	002KN 00018 9-3 n °307	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 144	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	P315	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °315 - 1	002KN 00018 9-3 n °315	Matériau Dur Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 92	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P320	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °320 - 1	002KN 00018 9-3 n °320	Peinture Effritable Beige Gris Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 194	Murs et cloisons	Enduits ciment	P321	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °321 - 1	002KN 00018 9-3 n °321	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 69	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002KN 00018 9-3 n °321 - 1	002KN 00018 9-3 n °321	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 69	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P323	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °323 - 1	002KN 00018 9-3 n °323	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 79	Murs et cloisons	Joint de dilatation	P326	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °326 - 1	002KN 00018 9-3 n °326	Matériau Souple Fibreux Marron Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 53	Murs et cloisons	Joint de dilatation	P336	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °336 - 1	002KN 00018 9-3 n °336	Matériau Souple Fibreux Marron Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 35	Murs et cloisons	Joint de dilatation	S1150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002KN 00018 9-3 n °336 - 1	002KN 00018 9-3 n °336	Matériau Souple Fibreux Marron Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P348	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °348 - 1	002KN 00018 9-3 n °348	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 4 (Réserve DI)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S1172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		002KN 00018 9-3 n °348 - 1	002KN 00018 9-3 n °348	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 654 (Bureaux 14)	Gaines et coffre verticaux	Jonction entre panneaux	P350	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °350 - 1	002KN 00018 9-3 n °350	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 654 (Bureaux 14)	Gaines et coffre verticaux	Jonction entre panneaux	S1187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P350		002KN 00018 9-3 n °350 - 1	002KN 00018 9-3 n °350	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 653 (Bureaux 13)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P352	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °352 - 1	002KN 00018 9-3 n °352	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Papier Souple Fibreux Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 654 (Bureaux 14)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002KN 00018 9-3 n °352 - 1	002KN 00018 9-3 n °352	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Papier Souple Fibreux Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 384	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P353	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °353 - 1	002KN 00018 9-3 n °353	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 384	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P354	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °354 - 1	002KN 00018 9-3 n °354	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 660 (Escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002KN 00018 9-3 n °354 - 1	002KN 00018 9-3 n °354	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 661	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P358	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °358 - 1	002KN 00018 9-3 n °358	Papier peint Souple Fibreux Bleu Toile Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Fibres Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P361	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °361 - 1	002KN 00018 9-3 n °361	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P368	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °368 - 1	002KN 00018 9-3 n °368	Peinture Effritable Gris Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 656 (B032)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1192	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1195	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan Rdc	Vol 657 (B038)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1197	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan Rdc	Vol 657 (B038)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1198	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1199	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1200	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan Rdc	Vol 658 (B042)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1206	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan Rdc	Vol 673 (C005)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P382	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °382 - 1	002KN00018 9-3 n °382	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 688	Menuiseries	Mastic vitrier	S1219	Réalisation d'un sondage		S1219 - 1				Négatif sur document Posé en 2012, info UPD
Plan Rdc	Vol 692	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P393	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °393 - 1	002KN00018 9-3 n °393	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Beige Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 696 (Sureté)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P396	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °396 - 1	002KN00018 9-3 n °396	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 698	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1231	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 698	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1232	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan Rdc	Vol 649 (Couloir 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P403	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °403 - 1	002KN00018 9-3 n °403	Papier peint Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 644 (Couloir 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P404	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °404 - 1	002KN00018 9-3 n °404	Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 710	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P406	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °406 - 1	002KN00018 9-3 n °406	Peinture Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 266	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P410	Réalisation d'un prélevement	Bas	002KN00018 9-3 n °410 - 1	002KN00018 9-3 n °410	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 266	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P410	Bas	002KN 00018 9-3 n °410 - 1	002KN 00018 9-3 n °410	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 259	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P410	Bas	002KN 00018 9-3 n °410 - 1	002KN 00018 9-3 n °410	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 266 - Vol 259	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1259 - S1260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P410	Bas	002KN 00018 9-3 n °410 - 1	002KN 00018 9-3 n °410	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 267 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P411	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °411 - 1	002KN 00018 9-3 n °411	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 799	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P429	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °429 - 1	002KN 00018 9-3 n °429	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 808	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1275	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 808	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1276	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 758	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P433	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °433 - 1	002KN00018 9-3 n °433	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 429	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1286	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 823	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P442	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °442 - 1	002KN00018 9-3 n °442	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 822	Porte coupe-feu	Vantaux	S1292	Réalisation d'un sondage		S1292 - 1				Négatif sur marquage2009

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 855	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P453	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °453 - 1	002KN 00018 9-3 n °453	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 845	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P457	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °457 - 1	002KN 00018 9-3 n °457	Peinture Effritable Blanc Rouge Matériau Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 845	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P457		002KN 00018 9-3 n °457 - 1	002KN 00018 9-3 n °457	Peinture Effritable Blanc Rouge Matériau Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 848	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P458	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °458 - 1	002KN 00018 9-3 n °458	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 848	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P459	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °459 - 1	002KN 00018 9-3 n °459	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 848	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P461	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °461 - 1	002KN 00018 9-3 n °461	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 625	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P466	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °466 - 1	002KN00018 9-3 n °466	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S1320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P466		002KN00018 9-3 n °466 - 1	002KN00018 9-3 n °466	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 625	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S1321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P466		002KN00018 9-3 n °466 - 1	002KN00018 9-3 n °466	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S1322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P466		002KN00018 9-3 n °466 - 1	002KN00018 9-3 n °466	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 625	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S1323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P466		002KN00018 9-3 n °466 - 1	002KN00018 9-3 n °466	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S1324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P466		002KN00018 9-3 n °466 - 1	002KN00018 9-3 n °466	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 625	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S1325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P466		002KN00018 9-3 n °466 - 1	002KN00018 9-3 n °466	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S1326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P466		002KN00018 9-3 n °466 - 1	002KN00018 9-3 n °466	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 625	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S1320 - S1321 - S1322 - S1323 - S1324 - S1325 - S1326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P466		002KN00018 9-3 n °466 - 1	002KN00018 9-3 n °466	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 893	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P480	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °480 - 1	002KN00018 9-3 n °480	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 892	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1799	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P480		002KN00018 9-3 n °480 - 1	002KN00018 9-3 n °480	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 915 (B211)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1341	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 915 (B211)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1342	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 918	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1343	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 917	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1344	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 919	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1345	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 922	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1347	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 922	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1350	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 919	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1351	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 918	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1352	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 917	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1353	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 725	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1356	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 725	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1357	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 725	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1358	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 725	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1359	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 728 (B507)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1360	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 728 (B507)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1361	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 728 (B507)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1362	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 729	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1365	Réalisation d'un sondage		S1365 - 1				Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 729	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1366	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 729	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1367	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 729	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1368	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 731	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1370	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 731	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1371	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 731	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1372	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 731	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1373	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 732	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1374	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 732	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1375	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 735	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1376	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 735	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1377	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 735	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1378	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 735	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1379	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 733	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1380	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 733	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1381	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 872	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P523	Réalisation d'un prélevement	Isolant phonique, mur et plafond	002KN 00018 9-3 n °523 - 1	002KN 00018 9-3 n °523	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 871	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P523	Isolant phonique, mur et plafond	002KN 00018 9-3 n °523 - 1	002KN 00018 9-3 n °523	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 873	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P523	Isolant phonique, mur et plafond	002KN 00018 9-3 n °523 - 1	002KN 00018 9-3 n °523	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 874	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P523	Isolant phonique, mur et plafond	002KN 00018 9-3 n °523 - 1	002KN 00018 9-3 n °523	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 869	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P523	Isolant phonique, mur et plafond	002KN 00018 9-3 n °523 - 1	002KN 00018 9-3 n °523	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 868	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P523	Isolant phonique, mur et plafond	002KN 00018 9-3 n °523 - 1	002KN 00018 9-3 n °523	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 870	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P523	Isolant phonique, mur et plafond	002KN 00018 9-3 n °523 - 1	002KN 00018 9-3 n °523	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 871 - Vol 873 - Vol 874 - Vol 869 - Vol 868 - Vol 870	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1417 - S1418 - S1419 - S1420 - S1421 - S1422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P523	Isolant phonique, mur et plafond	002KN 00018 9-3 n °523 - 1	002KN 00018 9-3 n °523	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 872	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	P524	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °524 - 1	002KN 00018 9-3 n °524	Laine Souple Fibreux Vert Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 874	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	S1423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P524		002KN 00018 9-3 n °524 - 1	002KN 00018 9-3 n °524	Laine Souple Fibreux Vert Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 872	Porte coupe-feu	Joint	P525	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °525 - 1	002KN 00018 9-3 n °525	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 871	Porte coupe-feu	Joint	S1424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P525		002KN 00018 9-3 n °525 - 1	002KN 00018 9-3 n °525	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 873	Porte coupe-feu	Joint	S1425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P525		002KN 00018 9-3 n °525 - 1	002KN 00018 9-3 n °525	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 874	Porte coupe-feu	Joint	S1426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P525		002KN 00018 9-3 n °525 - 1	002KN 00018 9-3 n °525	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 868	Porte coupe-feu	Joint	S1427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P525		002KN 00018 9-3 n °525 - 1	002KN 00018 9-3 n °525	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 869	Porte coupe-feu	Joint	S1428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P525		002KN 00018 9-3 n °525 - 1	002KN 00018 9-3 n °525	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 870	Porte coupe-feu	Joint	S1429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P525		002KN 00018 9-3 n °525 - 1	002KN 00018 9-3 n °525	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 871 - Vol 873 - Vol 874 - Vol 868 - Vol 869 - Vol 870	Porte coupe-feu	Joint	S1424 - S1425 - S1426 - S1427 - S1428 - S1429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P525		002KN 00018 9-3 n °525 - 1	002KN 00018 9-3 n °525	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 868	Menuiseries	Mastic vitrier	P529	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °529 - 1	002KN 00018 9-3 n °529	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1034	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P549	Réalisation d'un prélevement	Mezzanine	002KN 00018 9-3 n °549 - 1	002KN 00018 9-3 n °549	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1096	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P558	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °558 - 1	002KN 00018 9-3 n °558	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1096	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P559	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °559 - 1	002KN 00018 9-3 n °559	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1093	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P566	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °566 - 1	002KN 00018 9-3 n °566	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Rose Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1093	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P567	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °567 - 1	002KN 00018 9-3 n °567	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1059	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P581	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °581 - 2	002KN 00018 9-3 n °581	Enduits plâtre	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1375	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P612	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °612 - 1	002KN 00018 9-3 n °612	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1377	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P620	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °620 - 1	002KN 00018 9-3 n °620	Peinture Effritable Beige Gris Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1318	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P629	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °629 - 1	002KN 00018 9-3 n °629	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1309	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S1516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P629		002KN 00018 9-3 n °629 - 1	002KN 00018 9-3 n °629	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1212	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P643	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °643 - 1	002KN 00018 9-3 n °643	Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1231	Murs et cloisons	Joint de scellement	P647	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °647 - 1	002KN 00018 9-3 n °647	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1231	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P648	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °648 - 1	002KN 00018 9-3 n °648	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1128 (B513)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P663	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °663 - 1	002KN 00018 9-3 n °663	Enduit Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1128 (B513)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P664	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °664 - 1	002KN 00018 9-3 n °664	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Translucide Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1183	Gaines et coffre verticaux	Enduits projetés	P670	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °670 - 1	002KN 00018 9-3 n °670	Matériau Effritable Gris Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1350	Gaines et coffre verticaux	Enduits projetés	P674	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °674 - 1	002KN 00018 9-3 n °674	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Dur Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1350	Murs et cloisons	Enduits projetés	P675	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1356	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1384	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1560	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1385	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 798	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 824	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 854	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 850	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 972	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 975	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1069	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1111	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1201	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1227	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1384 - Vol 1385	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1560 - S1561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 798 - Vol 824	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1558 - S1559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 854 - Vol 850	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1556 - S1557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 972 - Vol 975	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1554 - S1555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1069 - Vol 1111	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1552 - S1553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1201 - Vol 1227	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1550 - S1551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P675		002KN 00018 9-3 n °675 - 1	002KN 00018 9-3 n °675	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1350	Menuiseries	Joint	P677	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1356	Menuiseries	Joint	S1575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1384	Menuiseries	Joint	S1586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1385	Menuiseries	Joint	S1587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 798	Menuiseries	Joint	S1584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 824	Menuiseries	Joint	S1585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 854	Menuiseries	Joint	S1582	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 850	Menuiseries	Joint	S1583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 972	Menuiseries	Joint	S1580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 975	Menuiseries	Joint	S1581	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1069	Menuiseries	Joint	S1578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1111	Menuiseries	Joint	S1579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1201	Menuiseries	Joint	S1576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1227	Menuiseries	Joint	S1577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1384 - Vol 1385	Menuiseries	Joint	S1586 - S1587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 798 - Vol 824	Menuiseries	Joint	S1584 - S1585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 854 - Vol 850	Menuiseries	Joint	S1582 - S1583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 972 - Vol 975	Menuiseries	Joint	S1580 - S1581	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1069 - Vol 1111	Menuiseries	Joint	S1578 - S1579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1201 - Vol 1227	Menuiseries	Joint	S1576 - S1577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P677		002KN 00018 9-3 n °677 - 1	002KN 00018 9-3 n °677	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1344	Murs et cloisons	Enduits projetés	P680	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1345	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1387	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1388	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1611	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 812	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 838	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 844	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1386	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 985	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1604	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 986	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1605	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1085	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1602	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1097	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1603	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1211	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1214	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1387 - Vol 1388	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1610 - S1611	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 812 - Vol 838	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1608 - S1609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 844 - Vol 1386	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1606 - S1607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 985 - Vol 986	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1604 - S1605	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1085 - Vol 1097	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1602 - S1603	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1211 - Vol 1214	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1600 - S1601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P680		002KN 00018 9-3 n °680 - 1	002KN 00018 9-3 n °680	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1344	Murs et cloisons	Enduits projetés	P681	Réalisation d'un prélevement	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1345	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1612	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1387	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1388	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 812	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 838	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1622	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 844	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1386	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 985	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 986	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1085	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1097	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1211	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1214	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1387 - Vol 1388	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1623 - S1624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 812 - Vol 838	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1621 - S1622	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 844 - Vol 1386	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1619 - S1620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 985 - Vol 986	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1617 - S1618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1085 - Vol 1097	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1615 - S1616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1211 - Vol 1214	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1613 - S1614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P681	Gaine au centre de l'escalier	002KN 00018 9-3 n °681 - 1	002KN 00018 9-3 n °681	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1308	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P689	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 599	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1675	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 355	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 354	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 777	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 740	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 889	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 905	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 951	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1680	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 475	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1037	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1678	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1058	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1679	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1145	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1676	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1186	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1677	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 355 - Vol 354	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1686 - S1687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 777 - Vol 740	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1684 - S1685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 889 - Vol 905	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1682 - S1683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 951 - Vol 475	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1680 - S1681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1037 - Vol 1058	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1678 - S1679	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1145 - Vol 1186	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1676 - S1677	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P689		002KN 00018 9-3 n °689 - 1	002KN 00018 9-3 n °689	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1308	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P690	Réalisation d'un prélevement	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 599	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1688	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 355	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 354	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 777	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1697	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 740	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1698	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 889	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1695	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 905	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 951	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 475	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1694	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1037	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1058	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1145	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1186	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 355 - Vol 354	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1699 - S1700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 777 - Vol 740	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1697 - S1698	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 889 - Vol 905	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1695 - S1696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 951 - Vol 475	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1693 - S1694	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1037 - Vol 1058	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1691 - S1692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1145 - Vol 1186	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1689 - S1690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P690	Gaine	002KN 00018 9-3 n °690 - 1	002KN 00018 9-3 n °690	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1037	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P692	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °692 - 1	002KN 00018 9-3 n °692	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1145	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S1712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P692		002KN 00018 9-3 n °692 - 1	002KN 00018 9-3 n °692	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 580	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P694	Réalisation d'un prélevement	Mur refend	002KN 00018 9-3 n °694 - 1	002KN 00018 9-3 n °694	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 710	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1718	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P694	Mur refend	002KN 00018 9-3 n °694 - 1	002KN 00018 9-3 n °694	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 313	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1717	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P694	Mur refend	002KN 00018 9-3 n °694 - 1	002KN 00018 9-3 n °694	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 907	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1716	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P694	Mur refend	002KN 00018 9-3 n °694 - 1	002KN 00018 9-3 n °694	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 460	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P694	Mur refend	002KN 00018 9-3 n °694 - 1	002KN 00018 9-3 n °694	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1390	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1714	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P694	Mur refend	002KN 00018 9-3 n °694 - 1	002KN 00018 9-3 n °694	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1389	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P694	Mur refend	002KN 00018 9-3 n °694 - 1	002KN 00018 9-3 n °694	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 580	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P695	Réalisation d'un prélevement	Mur centre escalier	002KN 00018 9-3 n °695 - 1	002KN 00018 9-3 n °695	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 710	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1724	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P695	Mur centre escalier	002KN 00018 9-3 n °695 - 1	002KN 00018 9-3 n °695	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 313	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P695	Mur centre escalier	002KN 00018 9-3 n °695 - 1	002KN 00018 9-3 n °695	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 907	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P695	Mur centre escalier	002KN 00018 9-3 n °695 - 1	002KN 00018 9-3 n °695	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 460	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1721	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P695	Mur centre escalier	002KN 00018 9-3 n °695 - 1	002KN 00018 9-3 n °695	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1390	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1720	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P695	Mur centre escalier	002KN 00018 9-3 n °695 - 1	002KN 00018 9-3 n °695	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1389	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1719	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P695	Mur centre escalier	002KN 00018 9-3 n °695 - 1	002KN 00018 9-3 n °695	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 580	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P697	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °697 - 1	002KN 00018 9-3 n °697	Peinture Effritable Beige Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 710	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1736	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P697		002KN 00018 9-3 n °697 - 1	002KN 00018 9-3 n °697	Peinture Effritable Beige Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 313	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1735	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P697		002KN 00018 9-3 n °697 - 1	002KN 00018 9-3 n °697	Peinture Effritable Beige Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 907	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1734	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P697		002KN 00018 9-3 n °697 - 1	002KN 00018 9-3 n °697	Peinture Effritable Beige Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 460	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P697		002KN 00018 9-3 n °697 - 1	002KN 00018 9-3 n °697	Peinture Effritable Beige Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1390	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P697		002KN 00018 9-3 n °697 - 1	002KN 00018 9-3 n °697	Peinture Effritable Beige Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1389	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P697		002KN 00018 9-3 n °697 - 1	002KN 00018 9-3 n °697	Peinture Effritable Beige Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P700	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °700 - 1	002KN 00018 9-3 n °700	Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P700		002KN 00018 9-3 n °700 - 1	002KN 00018 9-3 n °700	Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P701	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °701 - 1	002KN 00018 9-3 n °701	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P702	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °702 - 1	002KN 00018 9-3 n °702	Peinture Effritable Beige Blanc Plâtre Effritable Blanc Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Menuiseries	Joint	P703	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °703 - 1	002KN 00018 9-3 n °703	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 116	Murs et cloisons	Enduits ciment	P706	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °706 - 1	002KN 00018 9-3 n °706	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 129	Murs et cloisons	Enduits ciment	P710	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °710 - 1	002KN 00018 9-3 n °710	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1391 (Cour intérieure 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P713	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °713 - 1	002KN 00018 9-3 n °713	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 242	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P715	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °715 - 1	002KN 00018 9-3 n °715	Peinture Effritable Blanc Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 75	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P715		002KN 00018 9-3 n °715 - 1	002KN 00018 9-3 n °715	Peinture Effritable Blanc Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 981	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P725	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 983	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1759	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 981	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 979	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1761	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN00018 9-3 n °725 - 1	002KN00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 979	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 977	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1763	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 977	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 977	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 976	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 976	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1767	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 976	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1768	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 978	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1769	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 978	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1770	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 980	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1771	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 980	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1772	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 982	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1773	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 982	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 973	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1775	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 971	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 983 - Vol 981 - Vol 979 - Vol 977 - Vol 976 - Vol 978 - Vol 980 - Vol 982 - Vol 973 - Vol 971	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1759 - S1760 - S1761 - S1762 - S1763 - S1764 - S1765 - S1766 - S1767 - S1768 - S1769 - S1770 - S1771 - S1772 - S1773 - S1774 - S1775 - S1776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P725		002KN 00018 9-3 n °725 - 1	002KN 00018 9-3 n °725	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Menuiseries	Joint à lèvre	P759	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °759 - 1	002KN 00018 9-4 n °759	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 654 (Bureaux 14)	Menuiseries	Mastic vitrier	P764	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °764 - 1	002KN 00018 9-4 n °764	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P766	Réalisation d'un prélevement	Mur brique	002KN 00018 9-4 n °766 - 1	002KN 00018 9-4 n °766	Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 727 (B102TER)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1810	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 727 (B102TER)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1811	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 734	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1812	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 734	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1813	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 737	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1814	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 737	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1815	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 737	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1816	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 737	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1817	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 780 (B112)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1818	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 780 (B112)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1819	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 780 (B112)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1820	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 780 (B112)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1821	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 781 (B114)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1822	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 781 (B114)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1823	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 788	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1824	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+1	Vol 788	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1825	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 921 (B202)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1826	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 921 (B202)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1827	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 921 (B202)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1828	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 921 (B202)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1829	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 1365	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1830	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 1365	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1831	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1366	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1832	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 1366	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1833	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 1372	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1834	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 1372	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1835	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 1371	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1836	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 1368	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1837	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 1368	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1838	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+2	Vol 912	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1839	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 912	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1840	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 945	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1841	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 945	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1842	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 945	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1843	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 945	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1844	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 927	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1845	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 927	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1846	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 927	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1847	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 927	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1848	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 944	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1849	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 944	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1850	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 944	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1851	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 928	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1852	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 928	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1853	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 942	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1854	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 942	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1855	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 929	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1856	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 929	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1857	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 931	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1858	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 931	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1859	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 939	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1860	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 939	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1861	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 932	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1862	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 932	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1863	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 938	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1864	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 938	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1865	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 938	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1866	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 938	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1867	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 935	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1868	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 935	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1869	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 950	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1870	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+3	Vol 950	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1871	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1396	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1872	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1396	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1873	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1397	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1874	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1397	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1875	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1398	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1876	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1398	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1877	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1399	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1878	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1399	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1879	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1400	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1880	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1400	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1881	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1400	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1882	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1401	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1883	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1401	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1884	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1003	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1885	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1405	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1886	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1405	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1887	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1405	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1888	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1405	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1889	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1402	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1890	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1402	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1891	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1403	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1892	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1403	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1893	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1403	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1894	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1403	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1895	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1404	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1896	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1404	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1897	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1017	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1898	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1017	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1899	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1020	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1900	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1020	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1901	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1022	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1902	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1022	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1903	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1024	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1904	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1024	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1905	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 518	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1906	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 518	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1907	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 518	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1908	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 518	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1909	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1064	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1910	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1064	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1911	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 523	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1912	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 523	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1913	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1066	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1914	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1066	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1915	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1108	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1916	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1107	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1917	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1106	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1918	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1106	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1919	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1100	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1920	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1100	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1921	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1103	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1922	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1103	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1923	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1071	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1924	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1071	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1925	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1075	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1926	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1075	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1927	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1117	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1928	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1117	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1929	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1116	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1930	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1116	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1931	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 512	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1932	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 512	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1933	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 1114	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1934	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 514	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1935	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 510	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1936	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 510	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1937	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 503	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1938	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 503	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1939	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 500	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1940	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 500	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1941	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 495	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1942	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 495	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1943	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 494	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1944	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 494	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1945	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 487	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1946	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 486	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1947	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 486	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1948	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 485	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1949	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 485	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1950	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 480	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1951	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 480	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1952	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 483	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1953	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 483	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1954	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 483	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1955	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 483	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1956	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 491	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1957	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+4	Vol 491	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1958	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1203	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1959	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1203	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1960	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 541	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1961	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 541	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1962	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 545	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1963	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 545	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1964	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1200	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1965	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1200	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1966	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1156	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1967	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1156	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1968	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 328 (B530)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1969	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 328 (B530)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1970	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1150	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1971	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1150	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1972	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1141	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1973	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1141	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1974	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1142	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1975	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1142	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1976	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1144	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1977	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1144	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1978	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1144	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1979	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1144	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1980	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1140	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1981	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1140	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1982	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1137	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1983	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1137	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1984	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1128 (B513)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1985	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1128 (B513)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1986	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1131	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1987	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1131	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1988	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1148	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1989	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1148	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1990	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1130	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1991	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1130	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1992	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1130	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1993	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1130	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1994	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1127	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1995	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1127	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1996	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1127	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1997	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1127	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1998	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1126	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S1999	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1126	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2000	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1125	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2001	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1125	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2002	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1124	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2003	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1124	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2004	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1123 (B505)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2005	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1123 (B505)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2006	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1123 (B505)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2007	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1123 (B505)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2008	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1122	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2009	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1122	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2010	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1122	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2011	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1122	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2012	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1121	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2013	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1121	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2014	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan R+5	Vol 1121	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2015	Réalisation d'un sondage						Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1121	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	S2016	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Plan Rdc	Vol 1408 (Livraison)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P771	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°771 - 1	P771	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1408 (Livraison)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P772	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°772 - 1	P772	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1408 (Livraison)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P773	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°773 - 1	P773 Phase 1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1408 (Livraison)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P773	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°773 - 1	P773 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1408 (Livraison)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P774	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °774 - 1	P774 Phase 1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1408 (Livraison)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P774	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °774 - 1	P774 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P779	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °779 - 1	P779	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P780	Réalisation d'un prélevement			P780	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P781	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °781 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °781 - 2	P781	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P782	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °782 - 1	P782	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 265 (B000)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P785	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °785 - 1	P785	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 159 (S/B106)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P790	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °790 - 1	P790	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 89	Murs et cloisons	Enduits ciment	P792	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °792 - 1	P792	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 128	Murs et cloisons	Enduits ciment	P794	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °794 - 1	P794	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 128	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P795	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °795 - 1	P795	Peinture non séparable + matériau plâtreux bleu en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 197	Murs et cloisons	Joint de scellement	P801	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °801 - 1	P801	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 197	Murs et cloisons	Joint de scellement	S2029	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P801		002KN 00018 9-5 n °801 - 1	P801	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 198	Murs et cloisons	Joint de scellement	S2030	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P801		002KN 00018 9-5 n °801 - 1	P801	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 198	Murs et cloisons	Joint de scellement	S2031	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P801		002KN 00018 9-5 n °801 - 1	P801	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 197 - Vol 198	Murs et cloisons	Joint de scellement	S2029 - S2030 - S2031	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P801		002KN 00018 9-5 n °801 - 1	P801	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 197	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P802	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °802 - 1	P802	Peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 198	Murs et cloisons	Enduits ciment	P804	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °804 - 1	P804	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 187	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P806	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °806 - 1	P806	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 187	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P806	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P806		002KN000189-5 n °806 - 1	P806	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 187	Murs et cloisons	Enduits ciment	P807	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n °807 - 1	P807	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 187	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P811	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n °811 - 1	P811	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 183	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S2039	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P811		002KN000189-5 n °811 - 1	P811	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1411	Murs et cloisons	Enduits ciment	P814	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n °814 - 1	P814 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 1411	Murs et cloisons	Enduits ciment	P814	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P814		002KN 00018 9-5 n °814 - 1	P814 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1411	Murs et cloisons	Enduits ciment	P814	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °814 - 1	P814 Phase 2	Enduit compact gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1411	Murs et cloisons	Enduits ciment	P814	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P814		002KN 00018 9-5 n °814 - 1	P814 Phase 2	Enduit compact gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1410	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P818	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °818 - 1	P818	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 96	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P832	Réalisation d'un prélevement			P832	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 83	Murs et cloisons	Enduits ciment	P835	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °835 - 1	P835	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1427	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P840	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °840 - 1	P840	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 4 (Réserve DI)	Plafonds	Flocages	S1	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P005 09/02/2016 Pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Plafonds	Flocages	S2	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P006 09/02/2016 Pyramide conseil
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Plafonds	Panneaux vissés	S3	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P003 P004 09/02/2016 Pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Plafonds	Panneaux vissés	S3	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3						Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P003 P004 09/02/2016 Pyramide conseil
Plan sous-sol -1	Vol 86	Plafonds	Flocages	S4	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P001 09/02/2016 Pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 86	Plafonds	Flocages	S5	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P'001 09/02/2016 Pyramide conseil
Plan sous-sol -1	Vol 115	Plafonds	Flocages	S8	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport : P10604367 1/3/1 10/06/2013 bureau veritas
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Plafonds	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°2 - 1	002KN000189 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Plafonds	Enduit ciment	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN000189 n°2 - 1	002KN000189 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 4 (Réserve DI)	Plafonds	Enduit ciment	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 15 (Esc)	Plafonds	Enduit ciment	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 6 (SP 200)	Plafonds	Enduit ciment	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 29	Plafonds	Enduit ciment	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 24	Plafonds	Enduit ciment	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Plafonds	Enduit ciment	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 46	Plafonds	Enduit ciment	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 37	Plafonds	Enduit ciment	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 36	Plafonds	Enduit ciment	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 38	Plafonds	Enduit ciment	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 39	Plafonds	Enduit ciment	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 40	Plafonds	Enduit ciment	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 13 (SC 202)	Plafonds	Enduit ciment	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 73	Plafonds	Enduit ciment	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 81	Plafonds	Enduit ciment	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 72	Plafonds	Enduit ciment	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 71	Plafonds	Enduit ciment	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 66	Plafonds	Enduit ciment	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 54	Plafonds	Enduit ciment	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 83	Plafonds	Enduit ciment	S2049	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 65 (SD200)	Plafonds	Enduit ciment	S2070	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 166	Plafonds	Enduit ciment	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 158	Plafonds	Enduit ciment	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 284	Plafonds	Enduit ciment	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 193	Plafonds	Enduit ciment	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 188	Plafonds	Enduit ciment	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 189	Plafonds	Enduit ciment	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 179	Plafonds	Enduit ciment	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 146	Plafonds	Enduit ciment	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 149	Plafonds	Enduit ciment	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 152	Plafonds	Enduit ciment	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 147	Plafonds	Enduit ciment	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 148	Plafonds	Enduit ciment	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 135	Plafonds	Enduit ciment	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 144	Plafonds	Enduit ciment	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 145	Plafonds	Enduit ciment	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 143	Plafonds	Enduit ciment	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre) - Vol 4 (Réserve DI) - Vol 15 (Esc) - Vol 6 (SP 200) - Vol 29 - Vol 24 - Vol 251 (Sous-station) - Vol 46 - Vol 37 - Vol 36 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 13 (SC 202) - Vol 73 - Vol 81 - Vol 72 - Vol 71 - Vol 66 - Vol 54 - Vol 83 - Vol 65 (SD200)	Plafonds	Enduit ciment	S31 - S33 - S35 - S36 - S39 - S43 - S58 - S59 - S60 - S61 - S71 - S72 - S73 - S77 - S79 - S80 - S81 - S86 - S97 - S277 - S2049 - S2070	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 166 - Vol 158 - Vol 284 - Vol 193 - Vol 188 - Vol 189 - Vol 179 - Vol 146 - Vol 149 - Vol 152 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 135 - Vol 144 - Vol 145 - Vol 143	Plafonds	Enduit ciment	S167 - S185 - S186 - S195 - S196 - S197 - S198 - S211 - S212 - S215 - S216 - S217 - S222 - S223 - S224 - S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002KN 00018 9 n°2 - 1	002KN 00018 9 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 1 (Parking nord)	Poutres et charpentes	Enduit ciment	P4	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°4 - 1	002KN 00018 9 n°4	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Plafonds	Flocages	P13	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9 n°13	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Plafonds	Flocages	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13			002KN 00018 9 n°13	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 81	Plafonds	Flocages	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13			002KN 00018 9 n°13	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station) - Vol 81	Plafonds	Flocages	S56 - S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13			002KN 00018 9 n°13	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 37	Gaines et coffre horizontaux	Enduit platre	P16	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°16 - 1	002KN 00018 9 n°16	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 32	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P20	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°20 - 1	002KN 00018 9 n°20	Panneaux et plaques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 31	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002KN 00018 9 n°20 - 1	002KN 00018 9 n°20	Panneaux et plaques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 33	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002KN 00018 9 n°20 - 1	002KN 00018 9 n°20	Panneaux et plaques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 34	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002KN 00018 9 n°20 - 1	002KN 00018 9 n°20	Panneaux et plaques	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 31 - Vol 33 - Vol 34	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S74 - S1137 - S1138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002KN 00018 9 n°20 - 1	002KN 00018 9 n°20	Panneaux et plaques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 73	Plafonds	Panneaux vissés	S78	Réalisation d'un sondage		S78 - 1				Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P003 P004 09/02/2016 Pyramide conseil
Plan sous-sol -2	Vol 81	Plafonds	Panneaux vissés	S78	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S78		S78 - 1				Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P003 P004 09/02/2016 Pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 80	Plafonds	Panneaux vissés	S78	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S78		S78 - 1				Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P003 P004 09/02/2016 Pyramide conseil
Plan R+1	Vol 272	Plafonds	Flocages	S145	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P031 pyramide conseil du 03/03/2016
Plan sous-sol -1	Vol 142	Gaines et coffre horizontaux	Enduit platre	P37	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°37 - 1	002KN000189 n°37	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 142	Gaines et coffre horizontaux	Enduit platre	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002KN 00018 9 n°37 - 1	002KN 00018 9 n°37	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 158	Gaines et coffre horizontaux	Enduit platre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002KN 00018 9 n°37 - 1	002KN 00018 9 n°37	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 142 - Vol 158	Gaines et coffre horizontaux	Enduit platre	S166 - S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002KN 00018 9 n°37 - 1	002KN 00018 9 n°37	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 166	Plafonds	Flocages	P40	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 172	Plafonds	Flocages	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 171	Plafonds	Flocages	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 170	Plafonds	Flocages	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 157	Plafonds	Flocages	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 169	Plafonds	Flocages	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 160	Plafonds	Flocages	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 161	Plafonds	Flocages	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 163	Plafonds	Flocages	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 164	Plafonds	Flocages	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 162	Plafonds	Flocages	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 168	Plafonds	Flocages	S1095	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 172 - Vol 171 - Vol 170 - Vol 157 - Vol 169 - Vol 160 - Vol 161 - Vol 163 - Vol 164 - Vol 162 - Vol 168	Plafonds	Flocages	S177 - S178 - S179 - S180 - S202 - S205 - S206 - S207 - S208 - S209 - S1095	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002KN 00018 9 n°40 - 1	002KN 00018 9 n°40	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 163	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S210	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquageFaux-plafonds récent
Plan sous-sol -1	Vol 138	Plafonds	Flocages	P44	Réalisation d'un prélevement	Local stockage flocage au sol (aucune information sur l'état)	002KN 00018 9 n°44 - 1 - 002KN 00018 9 n°44 - 2	002KN 00018 9 n°44	Flocage Fibreux Effritable Blanc Papier Fibreux Souple Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 176	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P45	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°45 - 1	002KN 00018 9 n°45	Panneaux et plaques	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S226	Réalisation d'un sondage		S226 - 1				Négatif sur marquageFaux-plafonds métallique
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Plafonds	Flocages	P53	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°53 - 1	002KN000189 n°53	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 276 (P115)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S227	Réalisation d'un sondage		S227 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragFaux-plafonds métallique
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S231	Réalisation d'un sondage		S231 - 1				Négatif sur marquageFaux-plafonds métallique

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 287	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S234	Réalisation d'un sondage		S234 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragFaux-plafonds métallique non visitable
Plan R+3	Vol 288	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S238	Réalisation d'un sondage		S238 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragFaux-plafonds métallique

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 289 (P321)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S244	Réalisation d'un sondage		S244 - 1				Négatif sur marquageFaux-plafonds métallique
Plan R+4	Vol 290 (P413 ter)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S249	Réalisation d'un sondage		S249 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérageFaux-plafonds métallique
Plan R+4	Vol 291 (P427)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S252	Réalisation d'un sondage		S252 - 1				Négatif sur marquageFaux-plafonds métallique

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 292 (P517)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S261	Réalisation d'un sondage		S261 - 1				Négatif sur marquageFaux-plafonds métallique
Plan R+5	Vol 294 (P535)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S265	Réalisation d'un sondage		S265 - 1				Négatif sur document
Plan R+6	Vol 295	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S266	Réalisation d'un sondage		S266 - 1				Négatif sur marquageFaux-plafonds métallique
Plan R+6	Vol 296 (P611)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S271	Réalisation d'un sondage		S271 - 1				Négatif sur marquageFaux-plafonds métallique

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 297	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S276	Réalisation d'un sondage		S276 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragFaux-plafonds métallique
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S297	Réalisation d'un sondage		S297 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S304	Réalisation d'un sondage		S304 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métalliques non visitable
Plan R+2	Vol 322 (B212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S305	Réalisation d'un sondage		S305 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métalliques non visitable

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 324 (B223)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S310	Réalisation d'un sondage		S310 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+2	Vol 323 (B225)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S311	Réalisation d'un sondage		S311 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 325 (B302)	Faux plafonds	Panneaux	S326	Réalisation d'un sondage		S326 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+4	Vol 326 (B408)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S330	Réalisation d'un sondage		S330 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+4	Vol 327 (B424 bis)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S335	Réalisation d'un sondage		S335 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 329 (B532)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S338	Réalisation d'un sondage		S338 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+5	Vol 329 (B532)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S339	Réalisation d'un sondage		S339 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 330 (B606)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S345	Réalisation d'un sondage		S345 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+6	Vol 331 (B632)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S346	Réalisation d'un sondage		S346 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+6	Vol 332 (B644)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S354	Réalisation d'un sondage		S354 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 333 (C614)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S357	Réalisation d'un sondage		S357 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+5	Vol 334 (Bureau 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S359	Réalisation d'un sondage		S359 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 335 (D511 bis)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S363	Réalisation d'un sondage		S363 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+5	Vol 336 (D512)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S366	Réalisation d'un sondage		S366 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 337 (B516)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S368	Réalisation d'un sondage		S368 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S371	Réalisation d'un sondage		S371 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 339 (D409)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S373	Réalisation d'un sondage		S373 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S375	Réalisation d'un sondage		S375 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 341 (C408)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S379	Réalisation d'un sondage		S379 - 1				Négatif sur document Faux-plafond métallique non-accessible
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S385	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureFaux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+1	Vol 343 (D111)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S390	Réalisation d'un sondage		S390 - 1				Négatif sur document Faux-plafonds datant d'après 2000

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 344 (D110)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S393	Réalisation d'un sondage		S393 - 1				Négatif sur marquage Panneaux Armstrong
Plan R+5	Vol 345 (Plénum amphi 8)	Plafonds	Flocages	P175	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °175 - 1	002KN000189 n °175	Matériau Effritable Beige Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 345 (Plénum amphi 8)	Plafonds	Flocages	P176	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °176 - 1 - 002KN000189 n °176 - 2	002KN000189 n °176	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 345 (Plénum amphi 8)	Plafonds	Flocages	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		002KN000189 n °176 - 1 - 002KN000189 n °176 - 2	002KN000189 n °176	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 345 (Plénum amphi 8)	Plafonds	Flocages	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		002KN 00018 9 n °176 - 1 - 002KN 00018 9 n °176 - 2	002KN 00018 9 n °176	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 345 (Plénum amphi 8)	Plafonds	Flocages	S394 - S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		002KN 00018 9 n °176 - 1 - 002KN 00018 9 n °176 - 2	002KN 00018 9 n °176	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 346 (Ascenseur)	Plafonds	Fibralytes	I3			I3 - 1				Plafond inaccessible
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Plafonds	Enduit plâtre	P182	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur bois		002KN 00018 9 n °182	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 348 (Palier et escalier)	Plafonds	Enduit plâtre	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Enduit plâtre sur bois		002KN 00018 9 n °182	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Plafonds	Enduit plâtre	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Enduit plâtre sur bois		002KN 00018 9 n °182	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Plafonds	Enduit plâtre	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Enduit plâtre sur bois		002KN 00018 9 n °182	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Plafonds	Enduit plâtre	P187	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °187 - 1 - 002KN 00018 9 n °187 - 2	002KN 00018 9 n °187	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Plafonds	Enduit plâtre	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002KN 00018 9 n °187 - 1 - 002KN 00018 9 n °187 - 2	002KN 00018 9 n °187	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Plafonds	Enduit plâtre	P189	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °189 - 1 - 002KN 00018 9 n °189 - 2	002KN 00018 9 n °189	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 359	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S469	Réalisation d'un sondage		S469 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage faux-plafonds métallique non-accessible
Plan R+6	Vol 358	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S470	Réalisation d'un sondage		S470 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage faux-plafonds métallique non-accessible

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 360	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S471	Réalisation d'un sondage		S471 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage faux-plafonds récent d'après 2000
Plan R+6	Vol 360	Plafonds	Flocages	P198	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °198 - 1	002KN000189 n °198	Flocage Fibreux Effritable Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 356	Plafonds	Flocages	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002KN000189 n °198 - 1	002KN000189 n °198	Flocage Fibreux Effritable Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 362	Plafonds	Flocages	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002KN000189 n °198 - 1	002KN000189 n °198	Flocage Fibreux Effritable Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 361	Plafonds	Flocages	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002KN 00018 9 n °198 - 1	002KN 00018 9 n °198	Flocage Fibreux Effritable Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 367	Plafonds	Flocages	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002KN 00018 9 n °198 - 1	002KN 00018 9 n °198	Flocage Fibreux Effritable Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 368	Plafonds	Flocages	S493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002KN 00018 9 n °198 - 1	002KN 00018 9 n °198	Flocage Fibreux Effritable Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 369	Plafonds	Flocages	S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002KN 00018 9 n °198 - 1	002KN 00018 9 n °198	Flocage Fibreux Effritable Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 370	Plafonds	Flocages	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002KN 00018 9 n °198 - 1	002KN 00018 9 n °198	Flocage Fibreux Effritable Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 356 - Vol 362 - Vol 361	Plafonds	Flocages	S473 - S474 - S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002KN 00018 9 n °198 - 1	002KN 00018 9 n °198	Flocage Fibreux Effritable Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 367 - Vol 368 - Vol 369 - Vol 370	Plafonds	Flocages	S492 - S493 - S494 - S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002KN 00018 9 n °198 - 1	002KN 00018 9 n °198	Flocage Fibreux Effritable Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 356	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S476	Réalisation d'un sondage		S476 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage faux-plafonds récent d'après 2000

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 362	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S477	Réalisation d'un sondage		S477 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage faux-plafonds récent d'après 2000
Plan R+6	Vol 361	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S478	Réalisation d'un sondage		S478 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage faux-plafonds récent d'après 2000
Plan R+4	Vol 364	Plafonds	Flocages	P204	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °204 - 1	002KN 00018 9 n °204	Flocage Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 363	Plafonds	Flocages	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002KN 00018 9 n °204 - 1	002KN 00018 9 n °204	Flocage Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 365	Plafonds	Flocages	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002KN 00018 9 n °204 - 1	002KN 00018 9 n °204	Flocage Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 366	Plafonds	Flocages	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002KN 00018 9 n °204 - 1	002KN 00018 9 n °204	Flocage Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 371	Plafonds	Flocages	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002KN 00018 9 n °204 - 1	002KN 00018 9 n °204	Flocage Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 372	Plafonds	Flocages	S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002KN 00018 9 n °204 - 1	002KN 00018 9 n °204	Flocage Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 373	Plafonds	Flocages	S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002KN 00018 9 n °204 - 1	002KN 00018 9 n °204	Flocage Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 363 - Vol 365 - Vol 366	Plafonds	Flocages	S489 - S490 - S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002KN 00018 9 n °204 - 1	002KN 00018 9 n °204	Flocage Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 371 - Vol 372 - Vol 373	Plafonds	Flocages	S509 - S510 - S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002KN 00018 9 n °204 - 1	002KN 00018 9 n °204	Flocage Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 376	Plafonds	Flocages	P209	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 377	Plafonds	Flocages	S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 375	Plafonds	Flocages	S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 374	Plafonds	Flocages	S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 263	Plafonds	Flocages	S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 381	Plafonds	Flocages	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 384	Plafonds	Flocages	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 382	Plafonds	Flocages	S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 383	Plafonds	Flocages	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 378	Plafonds	Flocages	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 379	Plafonds	Flocages	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 380	Plafonds	Flocages	S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 377 - Vol 375 - Vol 374	Plafonds	Flocages	S525 - S526 - S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 263 - Vol 381 - Vol 384 - Vol 382 - Vol 383	Plafonds	Flocages	S553 - S554 - S555 - S556 - S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 378 - Vol 379 - Vol 380	Plafonds	Flocages	S550 - S551 - S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002KN 00018 9 n °209 - 1	002KN 00018 9 n °209	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 449	Plafonds	Flocages	S712	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'002 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 450	Plafonds	Panneaux vissés	S718	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'008 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 452	Plafonds	Panneaux vissés	S724	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'014 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 455	Plafonds	Flocages	S733	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P008 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 476	Plafonds	Flocages	S769	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P030 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 484	Plafonds	Flocages	S785	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P049 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 484	Plafonds	Flocages	S799	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P019 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 530	Plafonds	Flocages	S842	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P022 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 550	Plafonds	Flocages	S877	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P017 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 557	Plafonds	Flocages	S905	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P070 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 557	Plafonds	Panneaux vissés	S920	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P013 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 591	Plafonds	Flocages	S952	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P028 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 345 (Plénum amphi 8)	Plafonds	Flocages	P241	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-1 n°241 - 1 - 002KN000189-1 n°241 - 2	002KN000189-1 n°241	Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 631	Plafonds	Enduit ciment	P256	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-1 n°256 - 1 - 002KN000189-1 n°256 - 2	002KN000189-1 n°256	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 631	Plafonds	Enduit ciment	P256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002KN 00018 9-1 n °256 - 1 - 002KN 00018 9-1 n °256 - 2	002KN 00018 9-1 n °256	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 628	Plafonds	Enduit ciment	S1068	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002KN 00018 9-1 n °256 - 1 - 002KN 00018 9-1 n °256 - 2	002KN 00018 9-1 n °256	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 630	Plafonds	Enduit ciment	S1069	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002KN 00018 9-1 n °256 - 1 - 002KN 00018 9-1 n °256 - 2	002KN 00018 9-1 n °256	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 631 - Vol 628 - Vol 630	Plafonds	Enduit ciment	P256 - S1068 - S1069	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002KN 00018 9-1 n °256 - 1 - 002KN 00018 9-1 n °256 - 2	002KN 00018 9-1 n °256	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 345 (Plénum amphi 8)	Faux plafonds	Poussière	P269	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °269 - 1	002KN 00018 9-2 n °269	Poussière sur lingette Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 345 (Plénum amphi 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P270	Réalisation d'un prélevement	Au sol - Sol	002KN 00018 9-2 n °270 - 1	002KN 00018 9-2 n °270	Laine Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Plafonds	Enduit plâtre	P275	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °275 - 1	002KN 00018 9-2 n °275	Plâtre Dur Blanc Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 181	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P286	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °286 - 1	002KN 00018 9-3 n °286	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 180	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1096	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002KN 00018 9-3 n °286 - 1	002KN 00018 9-3 n °286	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Interface entre structures	Joints de dilatation	P303	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °303 - 1	002KN 00018 9-3 n °303	Peinture Effritable Blanc Matériau Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 113	Plafonds	Flocages	S1117	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport : P10 604367 1/3/1 10/06/2013 bureau veritas
Plan sous-sol -1	Vol 114	Plafonds	Flocages	S1118	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport : P10 604367 1/3/1 10/06/2013 bureau veritas

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 90	Plafonds	Flocages	S1121	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P001 09/02/2016 Pyramide conseil
Plan sous-sol -1	Vol 91	Plafonds	Flocages	S1122	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P001 09/02/2016 Pyramide conseil
Plan sous-sol -1	Vol 86	Poutres et charpentes	Flocages	P309	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-3 n °309 - 1	002KN000189-3 n °309	Flocage Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 106	Poutres et charpentes	Flocages	S1795	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P309		002KN 00018 9-3 n °309 - 1	002KN 00018 9-3 n °309	Flocage Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 92	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P319	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °319 - 1	002KN 00018 9-3 n °319	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 79	Plafonds	Enduits ciment	P325	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °325 - 1	002KN 00018 9-3 n °325	Peinture Effritable Blanc Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 77	Plafonds	Enduits ciment	S1144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002KN 00018 9-3 n °325 - 1	002KN 00018 9-3 n °325	Peinture Effritable Blanc Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 79	Gaines et coffre horizontaux	Panneaux	P327	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °327 - 1	002KN 00018 9-3 n °327	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 79	Gaines et coffre horizontaux	Panneaux	S1141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002KN 00018 9-3 n °327 - 1	002KN 00018 9-3 n °327	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 54	Gaines et coffre horizontaux	Panneaux	S1142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002KN 00018 9-3 n °327 - 1	002KN 00018 9-3 n °327	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 77	Gaines et coffre horizontaux	Panneaux	S1143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002KN 00018 9-3 n °327 - 1	002KN 00018 9-3 n °327	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 79 - Vol 54 - Vol 77	Gaines et coffre horizontaux	Panneaux	S1141 - S1142 - S1143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002KN 00018 9-3 n °327 - 1	002KN 00018 9-3 n °327	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 16 (SB 207)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P340	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °340 - 1	002KN 00018 9-3 n °340	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 25	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P340		002KN 00018 9-3 n °340 - 1	002KN 00018 9-3 n °340	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P341	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °341 - 1	002KN 00018 9-3 n °341	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 16 (SB 207)	Poutres et charpentes	Entourage de poutres	P342	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °342 - 1	002KN 00018 9-3 n °342	Papier Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Polystyrène Souple Blanc Peinture Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 666 (Infirmerie 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P372	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °372 - 1	002KN 00018 9-3 n °372	Faux plafond Fibreux Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 673 (C005)	Plafonds	Enduits plâtre	P381	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °381 - 1	002KN 00018 9-3 n °381	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 708	Plafonds	Flocages	P401	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °401 - 1	002KN 00018 9-3 n °401	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 710	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P407	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °407 - 1	002KN 00018 9-3 n °407	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 710	Plafonds	Flocages	P408	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °408 - 1	002KN 00018 9-3 n °408	Flocage Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P467	Réalisation d'un prélevement	Plafond et mur	002KN 00018 9-3 n °467 - 1	002KN 00018 9-3 n °467	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 453	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1787	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P467	Plafond et mur	002KN 00018 9-3 n °467 - 1	002KN 00018 9-3 n °467	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 452	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1788	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P467	Plafond et mur	002KN 00018 9-3 n °467 - 1	002KN 00018 9-3 n °467	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 453 - Vol 452	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1787 - S1788	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P467	Plafond et mur	002KN 00018 9-3 n °467 - 1	002KN 00018 9-3 n °467	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 886	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P474	Réalisation d'un prélevement	Plafond et mur	002KN 00018 9-3 n °474 - 1	002KN 00018 9-3 n °474	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 871	Plafonds	Panneaux vissés	P522	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °522 - 1	002KN 00018 9-3 n °522	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 873	Plafonds	Panneaux vissés	S1415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P522		002KN 00018 9-3 n °522 - 1	002KN 00018 9-3 n °522	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 451	Plafonds	Panneaux vissés	S1416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P522		002KN 00018 9-3 n °522 - 1	002KN 00018 9-3 n °522	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 873 - Vol 451	Plafonds	Panneaux vissés	S1415 - S1416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P522		002KN 00018 9-3 n °522 - 1	002KN 00018 9-3 n °522	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1034	Ouverture	Joint	P550	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °550 - 1	002KN 00018 9-3 n °550	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1091	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P570	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °570 - 1	002KN 00018 9-3 n °570	Peinture Effritable Gris Enduit Dur Blanc Toile Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1378	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P621	Réalisation d'un prélevement	Ancien faux plafond	002KN 00018 9-3 n °621 - 1	002KN 00018 9-3 n °621	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1350	Plafonds	Enduits projetés	P672	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °672 - 1	002KN 00018 9-3 n °672	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1069	Plafonds	Enduits plâtre	P678	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1111	Plafonds	Enduits plâtre	S1590	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1384	Plafonds	Enduits plâtre	S1597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1385	Plafonds	Enduits plâtre	S1598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 798	Plafonds	Enduits plâtre	S1595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 824	Plafonds	Enduits plâtre	S1596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 854	Plafonds	Enduits plâtre	S1593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 850	Plafonds	Enduits plâtre	S1594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 972	Plafonds	Enduits plâtre	S1591	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 975	Plafonds	Enduits plâtre	S1592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1201	Plafonds	Enduits plâtre	S1588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1227	Plafonds	Enduits plâtre	S1589	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1384 - Vol 1385	Plafonds	Enduits plâtre	S1597 - S1598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 798 - Vol 824	Plafonds	Enduits plâtre	S1595 - S1596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 854 - Vol 850	Plafonds	Enduits plâtre	S1593 - S1594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 972 - Vol 975	Plafonds	Enduits plâtre	S1591 - S1592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1201 - Vol 1227	Plafonds	Enduits plâtre	S1588 - S1589	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P678		002KN 00018 9-3 n °678 - 1	002KN 00018 9-3 n °678	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1344	Plafonds	Enduits plâtre	P679	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °679 - 1	002KN 00018 9-3 n °679	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1345	Plafonds	Enduits plâtre	S1781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P679		002KN 00018 9-3 n °679 - 1	002KN 00018 9-3 n °679	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1085	Plafonds	Enduits plâtre	P684	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1097	Plafonds	Enduits plâtre	S1653	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1387	Plafonds	Enduits plâtre	S1660	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1388	Plafonds	Enduits plâtre	S1661	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 812	Plafonds	Enduits plâtre	S1658	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 838	Plafonds	Enduits plâtre	S1659	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 844	Plafonds	Enduits plâtre	S1656	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1386	Plafonds	Enduits plâtre	S1657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 985	Plafonds	Enduits plâtre	S1654	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 986	Plafonds	Enduits plâtre	S1655	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1211	Plafonds	Enduits plâtre	S1651	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1214	Plafonds	Enduits plâtre	S1652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1387 - Vol 1388	Plafonds	Enduits plâtre	S1660 - S1661	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 812 - Vol 838	Plafonds	Enduits plâtre	S1658 - S1659	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 844 - Vol 1386	Plafonds	Enduits plâtre	S1656 - S1657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 985 - Vol 986	Plafonds	Enduits plâtre	S1654 - S1655	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1211 - Vol 1214	Plafonds	Enduits plâtre	S1651 - S1652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P684		002KN 00018 9-3 n °684 - 1	002KN 00018 9-3 n °684	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1308	Plafonds	Enduits plâtre	P688	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °688 - 1	002KN 00018 9-3 n °688	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 599	Plafonds	Enduits plâtre	S1674	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P688		002KN 00018 9-3 n °688 - 1	002KN 00018 9-3 n °688	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1037	Plafonds	Enduits plâtre	P691	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1058	Plafonds	Enduits plâtre	S1701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 355	Plafonds	Enduits plâtre	S1710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 354	Plafonds	Enduits plâtre	S1711	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 777	Plafonds	Enduits plâtre	S1708	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 740	Plafonds	Enduits plâtre	S1709	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 889	Plafonds	Enduits plâtre	S1706	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 905	Plafonds	Enduits plâtre	S1707	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 951	Plafonds	Enduits plâtre	S1704	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 475	Plafonds	Enduits plâtre	S1705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1145	Plafonds	Enduits plâtre	S1702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1186	Plafonds	Enduits plâtre	S1703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 355 - Vol 354	Plafonds	Enduits plâtre	S1710 - S1711	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 777 - Vol 740	Plafonds	Enduits plâtre	S1708 - S1709	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 889 - Vol 905	Plafonds	Enduits plâtre	S1706 - S1707	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 951 - Vol 475	Plafonds	Enduits plâtre	S1704 - S1705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1145 - Vol 1186	Plafonds	Enduits plâtre	S1702 - S1703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P691		002KN 00018 9-3 n °691 - 1	002KN 00018 9-3 n °691	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 580	Plafonds	Flocages	P693	Réalisation d'un prélevement	Au dessus du faux plafond	002KN 00018 9-3 n °693 - 1	002KN 00018 9-3 n °693	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Plafonds	Enduits plâtre	P699	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °699 - 1	002KN 00018 9-3 n °699	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 116	Plafonds	Enduits ciment	P705	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °705 - 1	002KN 00018 9-3 n °705	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 20 (Esc)	Plafonds	Enduits ciment	S1743	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P705		002KN 00018 9-3 n °705 - 1	002KN 00018 9-3 n °705	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 129	Plafonds	Enduits ciment	P709	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °709 - 1	002KN 00018 9-3 n °709	Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 129	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P712	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °712 - 1	002KN 00018 9-3 n °712	Matériau Effritable Gris Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 242	Plafonds	Enduits plâtre	P714	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °714 - 1	002KN 00018 9-3 n °714	Peinture Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 75	Plafonds	Enduits plâtre	S1744	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P714		002KN 00018 9-3 n °714 - 1	002KN 00018 9-3 n °714	Peinture Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P777	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 1	Peinture non séparable + matériau cartonné non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2017	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 1	Peinture non séparable + matériau cartonné non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2018	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 1	Peinture non séparable + matériau cartonné non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2019	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 1	Peinture non séparable + matériau cartonné non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2020	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 1	Peinture non séparable + matériau cartonné non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2021	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 1	Peinture non séparable + matériau cartonné non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2022	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 1	Peinture non séparable + matériau cartonné non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2017 - S2018 - S2019 - S2020 - S2021 - S2022	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 1	Peinture non séparable + matériau cartonné non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P777	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 2	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2017	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 2	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2018	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 2	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2019	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 2	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2020	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 2	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2021	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 2	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2022	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 2	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2017 - S2018 - S2019 - S2020 - S2021 - S2022	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P777		002KN 00018 9-5 n °777 - 1	P777 Phase 2	Couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Plafonds	Panneaux vissés	P778	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °778 - 1	P778	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 262 (B004)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P787	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °787 - 1	P787	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 197	Plafonds	Flocages	P803	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °803 - 1	P803	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 187	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P810	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °810 - 1	P810	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 183	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2041	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P810		002KN 00018 9-5 n °810 - 1	P810	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 1411	Plafonds	Flocages	P815	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °815 - 1	P815	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 15 (Esc)	Revêtement de sol	Chape maigre	P8	Réalisation d'un prélevement	Escalier	002KN 00018 9 n°8 - 1	002KN 00018 9 n°8	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 20 (Esc)	Revêtement de sol	Chape maigre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Escalier	002KN 00018 9 n°8 - 1	002KN 00018 9 n°8	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 31	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P22	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°22 - 1	002KN 00018 9 n°22	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 255	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002KN 00018 9 n°22 - 1	002KN 00018 9 n°22	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 65 (SD200)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S2071	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002KN000189 n°22 - 1	002KN000189 n°22	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 255 - Vol 65 (SD200)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S96 - S2071	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002KN000189 n°22 - 1	002KN000189 n°22	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P25	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°25 - 1 - 002KN000189 n°25 - 2	002KN000189 n°25	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 258	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S134	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0048 P001 pyramide conseil du 02/03/2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 267 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S136	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0048 P003 pyrami de conseil du 02/03/2016
Plan R+1	Vol 269	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S139	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P011 pyrami de conseil du 03/03/2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 269	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S140	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P010 pyramide conseil du 03/03/2016
Plan R+1	Vol 270 (100)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S141	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P034 pyramide conseil du 03/03/2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 270 (100)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S142	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P012 pyramide conseil du 03/03/2016
Plan R+1	Vol 271 (101)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S143	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P037 pyramide conseil du 03/03/2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 272	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P033 pyrami de conseil du 03/03/2016
Plan R+1	Vol 274 (105)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P015 pyrami de conseil du 03/03/2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 273 (103)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S149	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P009 pyramide conseil du 03/03/2016
Plan R+1	Vol 275 (P107)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P016 pyramide conseil du 03/03/2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 272	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P041 pyrami de conseil du 03/03/2016
Plan R+1	Vol 277	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P054 pyrami de conseil du 03/03/2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 278	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S153	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P054 pyramide conseil du 03/03/2016
Plan R+1	Vol 279	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S154	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P054 pyramide conseil du 03/03/2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 280	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S155	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P054 pyrami de conseil du 03/03/2016
Plan R+1	Vol 281	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S156	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P054 pyrami de conseil du 03/03/2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 175	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P39	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°39 - 1 - 002KN 00018 9 n°39 - 2	002KN 00018 9 n°39	Colle Dur Gris Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 243	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002KN 00018 9 n°39 - 1 - 002KN 00018 9 n°39 - 2	002KN 00018 9 n°39	Colle Dur Gris Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 152	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P42	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°42 - 1	002KN 00018 9 n°42	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Blanc Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 147	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002KN 00018 9 n°42 - 1	002KN 00018 9 n°42	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Blanc Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 148	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002KN 00018 9 n°42 - 1	002KN 00018 9 n°42	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Blanc Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 147 - Vol 148	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S219 - S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002KN 00018 9 n°42 - 1	002KN 00018 9 n°42	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Blanc Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 176	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P46	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°46 - 1	002KN 00018 9 n°46	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Beige Colle Souple Jaune Moquette Fibreux Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P47	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 647 (Bureaux 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 647 (Bureaux 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 646 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 648 (Bureaux 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 648 (Bureaux 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 644 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 645 (Bureaux 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 645 (Bureaux 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 645 (Bureaux 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 645 (Bureaux 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 643 (Bureaux 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 643 (Bureaux 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 642 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 643 (Bureaux 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 643 (Bureaux 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 643 (Bureaux 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 647 (Bureaux 7) - Vol 646 (Couloir 3) - Vol 648 (Bureaux 8) - Vol 644 (Couloir 2) - Vol 645 (Bureaux 5) - Vol 643 (Bureaux 3) - Vol 642 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1242 - S1243 - S1244 - S1245 - S1246 - S1247 - S1248 - S1249 - S1250 - S1251 - S1252 - S1253 - S1254 - S1255 - S1256 - S1257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002KN 00018 9 n°47 - 1	002KN 00018 9 n°47	Colles de carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 276 (P115)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P55	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°55 - 1	002KN 00018 9 n°55	Revêtement Souple Marron Toile Souple Fibreux Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°62 - 1	002KN 00018 9 n°62	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Revêtement Souple Marron Matériau Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 287	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P66	Réalisation d'un prélevement	Sous moquette	002KN 00018 9 n°66 - 1	002KN 00018 9 n°66	Ciment Effritable Gris Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune Revêtement Souple Marron Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 288	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S237	Réalisation d'un sondage		S237 - 1				Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P12

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 289 (P321)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°69 - 1	002KN 00018 9 n°69	Matériau Effritable Beige Revêtement Souple Gris Toile Souple Fibreux Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 290 (P413 ter)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S247	Réalisation d'un sondage		S247 - 1				Négatif sur marquageCf rapport 16/IMO/0041 P35

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 291 (P427)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P74	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°74 - 1	002KN 00018 9 n°74	Revêtement Souple Beige Joint Souple Blanc Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 292 (P517)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P78	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°78 - 1	002KN 00018 9 n°78	Revêtement Semi-dur Noir Sous-couch e Souple Fibreux Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Matériau Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 294 (P535)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S262	Réalisation d'un sondage		S262 - 1				Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P3
Plan R+6	Vol 295	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S267	Réalisation d'un sondage		S267 - 1				Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0042
Plan R+6	Vol 296 (P611)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S270	Réalisation d'un sondage		S270 - 1				Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0042 P52
Plan R+6	Vol 297	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S275	Réalisation d'un sondage		S275 - 1				Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0042

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 307 (P109)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S281	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P41
Plan R+1	Vol 308 (P111)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S282	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P42
Plan R+1	Vol 309 (P113)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S283	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P44

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 276 (P115)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S284	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P46
Plan R+1	Vol 310 (P117)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S285	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P48
Plan R+1	Vol 311 (P119)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S286	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P49

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 312 (P121)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S287	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P52
Plan R+1	Vol 300 (P106)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S289	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P40
Plan R+1	Vol 301 (P108)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S290	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P43

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 302 (P110)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S291	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P45
Plan R+1	Vol 303 (P112)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S292	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P47
Plan R+1	Vol 305 (P116)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S293	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P50

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 306 (P118)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S294	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO /0045 P51
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P90	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°90 - 1	002KN 00018 9 n°90	Colle Souple Translucide Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P94	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°94 - 1	002KN 00018 9 n°94	Peinture Effritable Gris Beige Vert Revêtement Semi-dur Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 322 (B212)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P99	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°99 - 1	002KN 00018 9 n°99	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 324 (B223)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P103	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °103 - 1	002KN 00018 9 n °103	Lés plastiques avec sous-couch e	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 323 (B225)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002KN 00018 9 n °103 - 1	002KN 00018 9 n °103	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 911	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002KN 00018 9 n °103 - 1	002KN 00018 9 n °103	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1370	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002KN 00018 9 n °103 - 1	002KN 00018 9 n °103	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 914 (Bureaux 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002KN 00018 9 n °103 - 1	002KN 00018 9 n °103	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1372	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002KN 00018 9 n °103 - 1	002KN 00018 9 n °103	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 323 (B225) - Vol 911 - Vol 1370 - Vol 914 (Bureaux 17) - Vol 1372	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1383 - S1384 - S1408 - S1409 - S1410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002KN 00018 9 n °103 - 1	002KN 00018 9 n °103	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 325 (B302)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P107	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °107 - 1	002KN 00018 9 n °107	Revêtement Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Rose Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 326 (B408)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S331	Réalisation d'un sondage		S331 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragRevêtement sol récent (décapé et nouveaux revêtement vu avec client)
Plan R+4	Vol 327 (B424 bis)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P112	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °112 - 1	002KN000189 n °112	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 328 (B530)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P115	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °115 - 1	002KN000189 n °115	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 329 (B532)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002KN 00018 9 n °115 - 1	002KN 00018 9 n °115	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1148	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002KN 00018 9 n °115 - 1	002KN 00018 9 n °115	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1149	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002KN 00018 9 n °115 - 1	002KN 00018 9 n °115	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1150	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002KN 00018 9 n °115 - 1	002KN 00018 9 n °115	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1151	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002KN 00018 9 n °115 - 1	002KN 00018 9 n °115	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1152	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002KN 00018 9 n °115 - 1	002KN 00018 9 n °115	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1153	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1545	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002KN 00018 9 n °115 - 1	002KN 00018 9 n °115	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1154	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002KN 00018 9 n °115 - 1	002KN 00018 9 n °115	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1155	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002KN 00018 9 n °115 - 1	002KN 00018 9 n °115	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 329 (B532) - Vol 1148 - Vol 1149 - Vol 1150 - Vol 1151 - Vol 1152 - Vol 1153 - Vol 1154 - Vol 1155	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S342 - S1540 - S1541 - S1542 - S1543 - S1544 - S1545 - S1546 - S1547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002KN 00018 9 n °115 - 1	002KN 00018 9 n °115	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 330 (B606)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P118	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °118 - 1	002KN 00018 9 n °118	Revêtement Semi-dur Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 331 (B632)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S351	Réalisation d'un sondage		S351 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragRevêtement récent (changé par Mr LASSE, présent à ce jour par décapage et nouveaux ragréage)
Plan R+6	Vol 332 (B644)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P121	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °121 - 1	002KN000189 n °121	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1288	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002KN000189 n °121 - 1	002KN000189 n °121	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 333 (C614)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P124	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °124 - 1	002KN 00018 9 n °124	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1319	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002KN 00018 9 n °124 - 1	002KN 00018 9 n °124	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1317	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002KN 00018 9 n °124 - 1	002KN 00018 9 n °124	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1318	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002KN 00018 9 n °124 - 1	002KN 00018 9 n °124	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1315	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002KN 00018 9 n °124 - 1	002KN 00018 9 n °124	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1314	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002KN 00018 9 n °124 - 1	002KN 00018 9 n °124	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1313	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002KN 00018 9 n °124 - 1	002KN 00018 9 n °124	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1319 - Vol 1317 - Vol 1318 - Vol 1315 - Vol 1314 - Vol 1313	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1510 - S1511 - S1512 - S1513 - S1514 - S1515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002KN 00018 9 n °124 - 1	002KN 00018 9 n °124	Lés plastiques avec sous-couch e	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 334 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S360	Réalisation d'un sondage		S360 - 1				Négatif sur jugeme nt person nel de l'opérat eur de repérag eSol récent vu avec client
Plan R+5	Vol 335 (D511 bis)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P134	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °134 - 1	002KN 00018 9 n °134	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1220	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002KN 00018 9 n °134 - 1	002KN 00018 9 n °134	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1219	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002KN 00018 9 n °134 - 1	002KN 00018 9 n °134	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1217	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002KN 00018 9 n °134 - 1	002KN 00018 9 n °134	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1218	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002KN 00018 9 n °134 - 1	002KN 00018 9 n °134	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1220 - Vol 1219 - Vol 1217 - Vol 1218	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1525 - S1526 - S1527 - S1528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002KN 00018 9 n °134 - 1	002KN 00018 9 n °134	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 336 (D512)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P136	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °136 - 1	002KN 00018 9 n °136	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1206	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002KN 00018 9 n °136 - 1	002KN 00018 9 n °136	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1205	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002KN 00018 9 n °136 - 1	002KN 00018 9 n °136	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1204	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002KN 00018 9 n °136 - 1	002KN 00018 9 n °136	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1203	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002KN 00018 9 n °136 - 1	002KN 00018 9 n °136	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1202	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002KN 00018 9 n °136 - 1	002KN 00018 9 n °136	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1207	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002KN 00018 9 n °136 - 1	002KN 00018 9 n °136	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1208	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002KN 00018 9 n °136 - 1	002KN 00018 9 n °136	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1209	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002KN 00018 9 n °136 - 1	002KN 00018 9 n °136	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1206 - Vol 1205 - Vol 1204 - Vol 1203 - Vol 1202 - Vol 1207 - Vol 1208 - Vol 1209	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1457 - S1458 - S1459 - S1460 - S1461 - S1462 - S1463 - S1464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002KN 00018 9 n °136 - 1	002KN 00018 9 n °136	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 337 (B516)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P140	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °140 - 1	002KN 00018 9 n °140	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1129	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002KN 00018 9 n °140 - 1	002KN 00018 9 n °140	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 338 (B507)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P144	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °144 - 1	002KN 00018 9 n °144	Revêtement Souple Noir Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Revêtement Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 339 (D409)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °150 - 1	002KN 00018 9 n °150	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1105	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002KN 00018 9 n °150 - 1	002KN 00018 9 n °150	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1374	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002KN 00018 9 n °150 - 1	002KN 00018 9 n °150	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1105 - Vol 1374	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1467 - S1468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002KN 00018 9 n °150 - 1	002KN 00018 9 n °150	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P155	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1071	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1072	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1073	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1074	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1075	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1076	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1077	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1078	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1079	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1080	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1081	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1082	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1071 - Vol 1072 - Vol 1073 - Vol 1074 - Vol 1075 - Vol 1076 - Vol 1077 - Vol 1078 - Vol 1079 - Vol 1080 - Vol 1081 - Vol 1082	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1445 - S1446 - S1447 - S1448 - S1449 - S1450 - S1451 - S1452 - S1453 - S1454 - S1455 - S1456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002KN 00018 9 n °155 - 1	002KN 00018 9 n °155	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 341 (C408)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S378	Réalisation d'un sondage		S378 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragSol changé et décapé récenment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S382	Réalisation d'un sondage		S382 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragesol changé et décapé par le client récemment
Plan R+1	Vol 343 (D111)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S388	Réalisation d'un sondage		S388 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragesol refait par la DI décapé et réagré

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 344 (D110)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P171	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 800	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 801	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 803	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 804	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 805	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 802	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 806	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 808	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 807	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 809	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 810	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 811	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 800 - Vol 801 - Vol 803 - Vol 804 - Vol 805 - Vol 802 - Vol 806 - Vol 808 - Vol 807 - Vol 809 - Vol 810 - Vol 811	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1267 - S1268 - S1269 - S1270 - S1271 - S1272 - S1273 - S1274 - S1277 - S1278 - S1279 - S1280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 344 (D110)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P171	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 800	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 801	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 803	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 804	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 805	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 802	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 806	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 808	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 807	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 809	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 810	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 811	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 800 - Vol 801 - Vol 803 - Vol 804 - Vol 805 - Vol 802 - Vol 806 - Vol 808 - Vol 807 - Vol 809 - Vol 810 - Vol 811	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1267 - S1268 - S1269 - S1270 - S1271 - S1272 - S1273 - S1274 - S1277 - S1278 - S1279 - S1280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 5	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 344 (D110)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P171	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 800	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 801	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 803	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 804	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 805	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 802	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 806	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 808	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 807	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 809	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 810	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 811	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 800 - Vol 801 - Vol 803 - Vol 804 - Vol 805 - Vol 802 - Vol 806 - Vol 808 - Vol 807 - Vol 809 - Vol 810 - Vol 811	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1267 - S1268 - S1269 - S1270 - S1271 - S1272 - S1273 - S1274 - S1277 - S1278 - S1279 - S1280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002KN 00018 9 n °171 - 1	002KN 00018 9 n °171 Phase 6	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 347 (Ascenseur)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	I4			I4 - 1				Impossibilité sans présence d'ascensoriste

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P177	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °177 - 1	002KN 00018 9 n °177	Revêtement Semi-dur Beige Vert Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Dur Noir Matériau Effritable Beige Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P178	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °178 - 1	002KN 00018 9 n °178	Revêtement Semi-dur Beige Toile Fibreux Souple Marron Ragréage Effritable Gris Rose Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 264	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P180	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °180 - 1	002KN 00018 9 n °180	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 261 (Escalier A)	Revêtement de sol	Nez de marche	P181	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °181 - 1	002KN 00018 9 n °181	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 348 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Nez de marche	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002KN 00018 9 n °181 - 1	002KN 00018 9 n °181	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Nez de marche	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002KN 00018 9 n °181 - 1	002KN 00018 9 n °181	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Nez de marche	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002KN 00018 9 n °181 - 1	002KN 00018 9 n °181	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P183	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °183 - 1	002KN 00018 9 n °183 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002KN 00018 9 n °183 - 1	002KN 00018 9 n °183 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002KN 00018 9 n °183 - 1	002KN 00018 9 n °183 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002KN 00018 9 n °183 - 1	002KN 00018 9 n °183 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P183	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °183 - 1	002KN 00018 9 n °183 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002KN 00018 9 n °183 - 1	002KN 00018 9 n °183 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002KN 00018 9 n °183 - 1	002KN 00018 9 n °183 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002KN 00018 9 n °183 - 1	002KN 00018 9 n °183 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P184	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 1	Revêtement Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 1	Revêtement Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 1	Revêtement Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 1	Revêtement Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 1	Revêtement Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P184	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 3	Revêtement Souple Marron Colle Souple Jaune Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 3	Revêtement Souple Marron Colle Souple Jaune Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 3	Revêtement Souple Marron Colle Souple Jaune Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 3	Revêtement Souple Marron Colle Souple Jaune Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 3	Revêtement Souple Marron Colle Souple Jaune Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 349 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P184	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 350 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002KN 00018 9 n °184 - 1	002KN 00018 9 n °184 Phase 5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 351 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Nez de marche	P185	Réalisation d'un prélevement	Escalier	002KN 00018 9 n °185 - 1	002KN 00018 9 n °185	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Nez de marche	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185	Escalier	002KN 00018 9 n °185 - 1	002KN 00018 9 n °185	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Nez de marche	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185	Escalier	002KN 00018 9 n °185 - 1	002KN 00018 9 n °185	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P188	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9 n °188 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 352 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P188	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9 n °188 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Noir Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 156	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P190	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °190 - 1	002KN 00018 9 n °190	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 174	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002KN 00018 9 n °190 - 1	002KN 00018 9 n °190	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 58	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002KN 00018 9 n °190 - 1	002KN 00018 9 n °190	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 41	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002KN 00018 9 n °190 - 1	002KN 00018 9 n °190	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 58 - Vol 41	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S447 - S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002KN 00018 9 n °190 - 1	002KN 00018 9 n °190	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 360	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P191	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °191 - 1	002KN 00018 9 n °191	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 356	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002KN 00018 9 n °191 - 1	002KN 00018 9 n °191	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 357	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002KN 00018 9 n °191 - 1	002KN 00018 9 n °191	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1264	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002KN 00018 9 n °191 - 1	002KN 00018 9 n °191	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1271	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002KN 00018 9 n °191 - 1	002KN 00018 9 n °191	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1268	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002KN 00018 9 n °191 - 1	002KN 00018 9 n °191	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1270	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002KN 00018 9 n °191 - 1	002KN 00018 9 n °191	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 356 - Vol 357 - Vol 1264 - Vol 1271 - Vol 1268 - Vol 1270	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S451 - S452 - S1478 - S1479 - S1480 - S1481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002KN 00018 9 n °191 - 1	002KN 00018 9 n °191	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 359	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P193	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °193 - 1	002KN 00018 9 n °193	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 358	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002KN 00018 9 n °193 - 1	002KN 00018 9 n °193	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 362	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P200	Réalisation d'un prélèvement		002KN 00018 9 n °200 - 1	002KN 00018 9 n °200	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 361	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P200		002KN 00018 9 n °200 - 1	002KN 00018 9 n °200	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 363	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P201	Réalisation d'un prélèvement		002KN 00018 9 n °201 - 1	002KN 00018 9 n °201	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Ragréage Effritable Gris Rose Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 364	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201		002KN 00018 9 n °201 - 1	002KN 00018 9 n °201	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Ragréage Effritable Gris Rose Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 363	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P202	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °202 - 1	002KN 00018 9 n °202	Revêtement Souple Beige Matériau Effritable Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 365	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002KN 00018 9 n °202 - 1	002KN 00018 9 n °202	Revêtement Souple Beige Matériau Effritable Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 372	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P205	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °205 - 1	002KN 00018 9 n °205	Revêtement Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 371	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002KN 00018 9 n °205 - 1	002KN 00018 9 n °205	Revêtement Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 373	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002KN 00018 9 n °205 - 1	002KN 00018 9 n °205	Revêtement Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 371 - Vol 373	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S512 - S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002KN 00018 9 n °205 - 1	002KN 00018 9 n °205	Revêtement Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 374	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P207	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °207 - 1	002KN 00018 9 n °207	Revêtement Semi-dur Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 375	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002KN 00018 9 n °207 - 1	002KN 00018 9 n °207	Revêtement Semi-dur Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 376	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002KN 00018 9 n °207 - 1	002KN 00018 9 n °207	Revêtement Semi-dur Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 377	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002KN 00018 9 n °207 - 1	002KN 00018 9 n °207	Revêtement Semi-dur Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 386	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002KN 00018 9 n °207 - 1	002KN 00018 9 n °207	Revêtement Semi-dur Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 375 - Vol 376 - Vol 377 - Vol 386	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S521 - S522 - S523 - S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002KN 00018 9 n °207 - 1	002KN 00018 9 n °207	Revêtement Semi-dur Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 375	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P208	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °208 - 1	002KN 00018 9 n °208	Revêtement Semi-dur Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 376	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002KN 00018 9 n °208 - 1	002KN 00018 9 n °208	Revêtement Semi-dur Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 375	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P213	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °213 - 1	002KN 00018 9 n °213	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 379	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002KN 00018 9 n °213 - 1	002KN 00018 9 n °213	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 372	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002KN 00018 9 n °213 - 1	002KN 00018 9 n °213	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 363	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P214	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °214 - 1	002KN 00018 9 n °214	Colle Souple Jaune Matériau Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 368	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002KN 00018 9 n °214 - 1	002KN 00018 9 n °214	Colle Souple Jaune Matériau Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 362	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002KN 00018 9 n °214 - 1	002KN 00018 9 n °214	Colle Souple Jaune Matériau Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 378	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P215	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °215 - 1	002KN 00018 9 n °215	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 379	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002KN 00018 9 n °215 - 1	002KN 00018 9 n °215	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 380	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S545	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002KN 00018 9 n °215 - 1	002KN 00018 9 n °215	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 722	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002KN 00018 9 n °215 - 1	002KN 00018 9 n °215	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 348 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002KN 00018 9 n °215 - 1	002KN 00018 9 n °215	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 379 - Vol 380 - Vol 722 - Vol 348 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S544 - S545 - S1354 - S1355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002KN 00018 9 n °215 - 1	002KN 00018 9 n °215	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 382	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P216	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °216 - 1	002KN 00018 9 n °216	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 381	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002KN 00018 9 n °216 - 1	002KN 00018 9 n °216	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 384	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002KN 00018 9 n °216 - 1	002KN 00018 9 n °216	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 383	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002KN 00018 9 n °216 - 1	002KN 00018 9 n °216	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 263	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002KN 00018 9 n °216 - 1	002KN 00018 9 n °216	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 381 - Vol 384 - Vol 383 - Vol 263	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S546 - S547 - S548 - S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002KN 00018 9 n °216 - 1	002KN 00018 9 n °216	Lés plastiques avec sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 385	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P217	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °217 - 1	002KN 00018 9 n °217	Colle Effritable Gris Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 385	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		002KN 00018 9 n °217 - 1	002KN 00018 9 n °217	Colle Effritable Gris Bois Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 355	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P218	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °218 - 1	002KN 00018 9 n °218	Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P219	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °219 - 1	002KN 00018 9 n °219 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002KN 00018 9 n °219 - 1	002KN 00018 9 n °219 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P219	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °219 - 1	002KN 00018 9 n °219 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002KN 00018 9 n °219 - 1	002KN 00018 9 n °219 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 387	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P219	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °219 - 1	002KN 00018 9 n °219 Phase 4	Joint Souple Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 387	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002KN 00018 9 n °219 - 1	002KN 00018 9 n °219 Phase 4	Joint Souple Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 388	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P220	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °220 - 1	002KN 00018 9 n °220	Revêtement Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 389	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P221	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °221 - 1	002KN 00018 9 n °221 Phase 1	Revêtement Souple Noir Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 389	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P221	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °221 - 1	002KN 00018 9 n °221 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 390	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P222	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °222 - 1	002KN 00018 9 n °222	Revêtement Souple Noir Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 390	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002KN 00018 9 n °222 - 1	002KN 00018 9 n °222	Revêtement Souple Noir Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 316	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S560	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO /0045 P55
Plan R+1	Vol 317	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S561	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO /0045 P56

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 318	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S562	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P57
Plan R+1	Vol 314	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S563	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P53
Plan R+1	Vol 315	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S564	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P008

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 316	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S565	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P008
Plan R+1	Vol 319	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S566	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P59
Plan R+1	Vol 426 (P134)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S664	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P60

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 426 (P134)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S665	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P13
Plan R+1	Vol 393	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S666	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P007
Plan R+1	Vol 427	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S667	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P17

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 428	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S668	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P006
Plan R+1	Vol 392 (P143)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S669	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P006
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S670	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P61

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 431 (P145)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S671	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P005
Plan R+1	Vol 394 (P147)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S672	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P005
Plan R+1	Vol 430 (P149)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S673	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P005

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S674	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport n °16/IMO/0045 P005
Plan R+2	Vol 433	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S675	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P34 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 432	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S676	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P35 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 434	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S677	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P5 pyrami de conseil
Plan R+2	Vol 434	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S678	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P6 pyrami de conseil
Plan R+2	Vol 435	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S679	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P32 pyrami de conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 436	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S681	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P18 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 436	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S682	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P19 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 436	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S683	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P20 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 437	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S684	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P31 pyrami de conseil
Plan R+2	Vol 438	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S685	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P21 pyrami de conseil
Plan R+2	Vol 439	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S686	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P3 pyrami de conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 397	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S687	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P9 pyrami de conseil
Plan R+2	Vol 398	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S688	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P1 pyrami de conseil
Plan R+2	Vol 398	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S689	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P2 pyrami de conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 440	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S690	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P22 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 286 (P209)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S691	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P10 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 441	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S693	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P17 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 442	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S694	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P23 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 443	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S695	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P28 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 399	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S696	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P4 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 444	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S697	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P29 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 400	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S698	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P30 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 445	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S699	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P36 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 401	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S700	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P16 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 401	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S701	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P15 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 446	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S702	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P38 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 447	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S703	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P37 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 402	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S704	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P35 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 448	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S705	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P12 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 402	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S706	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P14 pyrami de conseil
Plan R+2	Vol 403	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S707	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P24 pyrami de conseil
Plan R+2	Vol 403	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S708	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P25 pyrami de conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 404	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S709	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P26 pyrami de conseil
Plan R+2	Vol 404	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S710	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P27 pyrami de conseil
Plan R+2	Vol 449	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S714	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'004 pyrami de conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 449	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S715	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'005 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 450	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S716	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'006 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 450	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S717	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'007 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 451	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S719	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'009 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 452	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S720	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'10 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 452	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S721	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'011 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 452	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S722	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'012 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 453	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S725	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'015 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 453	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S726	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'011 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 453	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S727	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'017 pyrami de conseil
Plan R+2	Vol 454	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S728	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'018 pyrami de conseil
Plan R+3	Vol 406	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S729	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P011 pyrami de conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 406	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S730	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P003 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 455	Revêtement de sol	Ragréage	S734	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P009 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 456	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S736	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P034 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 455	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S737	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P005 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 455	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S738	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P004 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 405	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S739	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P002 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 407	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S740	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P013 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 457	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S741	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P013 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 458	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S742	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P035 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 459	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S743	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P036 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 409	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S744	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P015 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 460	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S745	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P016 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 408	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S746	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P017 pyrami de conseil
Plan R+3	Vol 410	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S747	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P018 pyrami de conseil
Plan R+3	Vol 410	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S748	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P019 pyrami de conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 461	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S749	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P020 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 462	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S750	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P021 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 463	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S751	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P028 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 464	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S752	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P027 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 465	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S753	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P026 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 413	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S754	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P022 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 414	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S755	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P024 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 466	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S756	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P024 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 467	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S757	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P024 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 468	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S758	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P024 pyrami de conseil
Plan R+3	Vol 469	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S759	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P024 pyrami de conseil
Plan R+3	Vol 412	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S760	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 M039 pyrami de conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 470	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S761	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 M038 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 415	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S762	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P037 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 471	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S763	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P038 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 416	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S764	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P024 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 472	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S765	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P024 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 473	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S766	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P024 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 474	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S767	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P024 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 475	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S768	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P033 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 476	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S771	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P031 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 477	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S773	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P022 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 478	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S774	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P065 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 477	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S776	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P023 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 477	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S777	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P024 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 477	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S777	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S777						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P024 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 479	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S778	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P009 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 480	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S779	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P064 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 481	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S780	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P063 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 484	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S781	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P018 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 482	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S782	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P043 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 483	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S783	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P008 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 485	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S787	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P044 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 486	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S788	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P045 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 487	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S789	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P046 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 488	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S790	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P047 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 489	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S791	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P010 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 490	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S792	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P011 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 491	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S793	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P007 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 492	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S794	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P006 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 493	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S795	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P042 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 494	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S796	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P005 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 495	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S797	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P041 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 496	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S798	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P040 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 497	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S801	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P012 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 498	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S802	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P013 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 499	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S803	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P039 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 500	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S804	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P038 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 501	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S805	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P037 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 502	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S806	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P055 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 503	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S807	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P036 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 504	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S808	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P021 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 505	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S809	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P017 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 505	Revêtement de sol	Chape maigre	S810	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P040 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 508	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S811	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P014 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 506	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S812	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P014 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 507	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S813	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P061 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 509	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S814	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P060 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 510	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S815	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P004 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 511	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S816	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P034 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 512	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S817	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P033 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 513	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S818	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P032 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 514	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S819	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P062 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 515	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S820	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P056 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 515	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S821	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P054 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 516	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S822	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P031 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 517	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S823	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P003 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 518	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S824	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P030 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 519	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S825	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P029 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 524	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S826	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P053 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 523	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S827	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P028 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 522	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S828	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P029 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 521	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S829	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P001 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 520	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S830	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P058 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 525	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S831	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P059 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 526	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S832	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P057 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 526	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S833	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P052 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 527	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S834	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P025 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 527	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S835	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P026 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 529	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S837	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P025 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 417 (P504)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S838	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'007 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 417 (P504)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S839	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P026 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 418 (P501)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S840	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'004 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 530	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S844	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P024 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 419 (P506)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S845	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'003 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 420 (P508)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S846	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P046 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 531	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S847	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'005 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 531	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S848	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'006 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 421 (P505)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S849	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'002 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 532	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S850	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'001 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 422 (P510)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S851	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'043 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 423 (P509)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S852	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P042 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 533	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S853	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P014 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 534	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S854	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P015 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 535	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S855	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P016 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 424 (P513)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S856	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P044 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 536	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S857	Réalisation d'un sondage		S857 - 1				Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P011 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 537	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S858	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P012 P013 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 539	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S860	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'011 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 293 (P518)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S861	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P040 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 536	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S862	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P010 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 292 (P517)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S863	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P041 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 540	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S864	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P041 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 425 (P521)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S865	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'008 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 425 (P521)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S866	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'009 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 425 (P521)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S867	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P'010 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 541	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S868	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P009 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 542	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S869	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P008 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 543	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S870	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P008 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 544	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S871	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P007 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 545	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S872	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P006 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 546	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S873	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P005 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 547	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S874	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P004 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 548	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S875	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P002 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 549	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S876	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P001 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 550	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S879	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P019 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 551	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S881	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P022 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 551	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S884	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P017 pyrami de conseil
Plan R+6	Vol 552	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S886	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P057 pyrami de conseil
Plan R+6	Vol 553	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S887	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P029 pyrami de conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 554	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S888	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P030 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 555	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S889	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P033 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 558	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S890	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P031 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 557	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S891	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P018 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 556	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S892	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P054 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 559	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S893	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P016 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 560	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S894	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P035 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 561	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S895	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P036 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 562	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S896	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P051 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 563	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S897	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P037 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 564	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S898	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P034 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 565	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S899	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P053 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 566	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S900	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P032 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 567	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S901	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P023 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 568	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S902	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P050 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 569	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S903	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P049 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 557	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S906	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P071 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 570	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S907	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P038 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 571	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S908	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P039 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 572	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S909	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P046 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 573	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S910	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P047 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 574	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S911	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P048 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 575	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S912	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P040 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 580	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S913	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P024 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 576	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S914	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P045 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 577	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S915	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P071 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 578	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S917	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P044 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 579	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S918	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P042 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 579	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S919	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P043 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 581	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S921	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P073 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 582	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S922	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P072 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 583	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S923	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P064 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 584	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S924	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P065 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 585	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S925	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P066 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 586	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S926	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P056 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 590	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S929	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P041 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 589	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S930	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P074 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 588	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S931	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P059 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 587	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S932	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P001 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 592	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S934	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P068 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 593	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S935	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P061 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 594	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S936	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P062 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 595	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S937	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P063 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 596	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S938	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P076 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 597	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S939	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P076 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 598	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S940	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P075 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 599	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S941	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P025 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 600	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S944	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P003 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 591	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S950	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P026 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 602	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S953	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P076 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 603	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S954	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P076 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 604	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S955	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P076 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 605	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S956	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P076 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 606	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S957	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P076 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 607	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S958	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P076 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 608	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S959	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P076 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 609	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S960	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P076 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 610	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P225	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °225 - 1	002KN 00018 9-1 n °225	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 613	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P231	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °231 - 1	002KN 00018 9-1 n °231	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 628	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P251	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °251 - 1	002KN 00018 9-1 n °251	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 630	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P252	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °252 - 1	002KN 00018 9-1 n °252	Moquette Souple Fibreux Bleu Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 631	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P255	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °255 - 1	002KN 00018 9-1 n °255	Revêtement Souple Fibreux Gris Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Revêtement de sol	Ragréage	P271	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °271 - 1	002KN 00018 9-2 n °271	Revêtement Souple Orange Noir Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Revêtement de sol	Chape maigre	P272	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °272 - 1	002KN 00018 9-2 n °272	Ciment Effritable Gris Matériau Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Revêtement de sol	Chape maigre	P272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P272		002KN 00018 9-2 n °272 - 1	002KN 00018 9-2 n °272	Ciment Effritable Gris Matériau Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 635 (Escaliers)	Revêtement de sol	Nez de marche	P277	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-2 n °277 - 1	002KN 00018 9-2 n °277	Matériau Effritable Gris Colle Souple Jaune Matériau Souple Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 178	Revêtement de sol	Ragréage	P285	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °285 - 1	002KN 00018 9-3 n °285 Phase 1	Revêtement Semi-dur Orange Matériau Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 178	Revêtement de sol	Ragréage	P285	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °285 - 1	002KN 00018 9-3 n °285 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 181	Faux plancher	Colle	P287	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °287 - 1	002KN 00018 9-3 n °287	Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 191	Revêtement de sol	Ragréage	P288	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °288 - 1	002KN 00018 9-3 n °288	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 639	Revêtement de sol	Ragréage	S1102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002KN 00018 9-3 n °288 - 1	002KN 00018 9-3 n °288	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 190	Revêtement de sol	Ragréage	S1103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002KN 00018 9-3 n °288 - 1	002KN 00018 9-3 n °288	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 165	Revêtement de sol	Ragréage	S1107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002KN 00018 9-3 n °288 - 1	002KN 00018 9-3 n °288	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 639 - Vol 190 - Vol 165	Revêtement de sol	Ragréage	S1102 - S1103 - S1107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002KN 00018 9-3 n °288 - 1	002KN 00018 9-3 n °288	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 192	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P291	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °291 - 1	002KN 00018 9-3 n °291	Colle Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 186	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1104 (P291)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002KN 00018 9-3 n °291 - 1	002KN 00018 9-3 n °291	Colle Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 182	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1105 (P291)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002KN 00018 9-3 n °291 - 1	002KN 00018 9-3 n °291	Colle Dur Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 187	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2036 (P291)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002KN 00018 9-3 n °291 - 1	002KN 00018 9-3 n °291	Colle Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 184	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2037 (P291)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002KN 00018 9-3 n °291 - 1	002KN 00018 9-3 n °291	Colle Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 185	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2038 (P291)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002KN 00018 9-3 n °291 - 1	002KN 00018 9-3 n °291	Colle Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 106	Revêtement de sol	Ragréage	P297	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °297 - 1	002KN 00018 9-3 n °297	Ragréage Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 107	Revêtement de sol	Ragréage	S1108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		002KN 00018 9-3 n °297 - 1	002KN 00018 9-3 n °297	Ragréage Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 110	Revêtement de sol	Ragréage	S1109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		002KN 00018 9-3 n °297 - 1	002KN 00018 9-3 n °297	Ragréage Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Revêtement de sol	Ragréage	S1110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		002KN 00018 9-3 n °297 - 1	002KN 00018 9-3 n °297	Ragréage Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 107 - Vol 110 - Vol 86	Revêtement de sol	Ragréage	S1108 - S1109 - S1110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		002KN 00018 9-3 n °297 - 1	002KN 00018 9-3 n °297	Ragréage Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 88	Massif	Ciment	P301	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °301 - 1	002KN 00018 9-3 n °301	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 97	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P304	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °304 - 1	002KN 00018 9-3 n °304 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert Toile Souple Fibreux Jaune Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 95	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2024	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002KN 00018 9-3 n °304 - 1	002KN 00018 9-3 n °304 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert Toile Souple Fibreux Jaune Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 99	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2025	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002KN 00018 9-3 n °304 - 1	002KN 00018 9-3 n °304 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert Toile Souple Fibreux Jaune Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 95 - Vol 99	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2024 - S2025	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002KN 00018 9-3 n °304 - 1	002KN 00018 9-3 n °304 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert Toile Souple Fibreux Jaune Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 97	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P304	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °304 - 1	002KN 00018 9-3 n °304 Phase 4	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 95	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2024	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002KN 00018 9-3 n °304 - 1	002KN 00018 9-3 n °304 Phase 4	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 99	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2025	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002KN 00018 9-3 n °304 - 1	002KN 00018 9-3 n °304 Phase 4	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 95 - Vol 99	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2024 - S2025	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002KN 00018 9-3 n °304 - 1	002KN 00018 9-3 n °304 Phase 4	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 111	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P305	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °305 - 1	002KN 00018 9-3 n °305 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 114	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002KN 00018 9-3 n °305 - 1	002KN 00018 9-3 n °305 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 111	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P305	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °305 - 1	002KN 00018 9-3 n °305 Phase 2	Matériau Bitumineux Noir Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 114	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002KN 00018 9-3 n °305 - 1	002KN 00018 9-3 n °305 Phase 2	Matériau Bitumineux Noir Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 111	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P306	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °306 - 1	002KN 00018 9-3 n °306 Phase 1	Revêtement Semi-dur Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 111	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P306	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °306 - 1	002KN 00018 9-3 n °306 Phase 2	Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 111	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P306	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °306 - 1	002KN 00018 9-3 n °306 Phase 4	Ragréage Effritable Rose Peinture Effritable Rose Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 92	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P317	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °317 - 1	002KN 00018 9-3 n °317 Phase 1	Revêtement Semi-dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 92	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P317	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °317 - 1	002KN 00018 9-3 n °317 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 92	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P317	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °317 - 1	002KN 00018 9-3 n °317 Phase 5	Bois Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 92	Revêtement de sol	Nez de marche	P318	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °318 - 1	002KN 00018 9-3 n °318	Matériau Souple Blanc Jaune Revêtement Semi-dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 194	Revêtement de sol	Chape maigre	P322	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °322 - 1	002KN 00018 9-3 n °322	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Blanc Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 69	Revêtement de sol	Chape maigre	S1133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		002KN 00018 9-3 n °322 - 1	002KN 00018 9-3 n °322	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Blanc Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 59	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P337	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °337 - 1	002KN 00018 9-3 n °337	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 43	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002KN 00018 9-3 n °337 - 1	002KN 00018 9-3 n °337	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 41	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P339	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °339 - 1	002KN 00018 9-3 n °339	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 58	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002KN 00018 9-3 n °339 - 1	002KN 00018 9-3 n °339	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 44	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1798	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002KN 00018 9-3 n °339 - 1	002KN 00018 9-3 n °339	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 174	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002KN 00018 9-3 n °339 - 1	002KN 00018 9-3 n °339	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 156	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002KN 00018 9-3 n °339 - 1	002KN 00018 9-3 n °339	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 189	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002KN 00018 9-3 n °339 - 1	002KN 00018 9-3 n °339	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 677	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1796	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002KN 00018 9-3 n °339 - 1	002KN 00018 9-3 n °339	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 690	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002KN 00018 9-3 n °339 - 1	002KN 00018 9-3 n °339	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 58 - Vol 44	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1155 - S1798	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002KN 00018 9-3 n °339 - 1	002KN 00018 9-3 n °339	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 174 - Vol 156 - Vol 189	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1180 - S1181 - S1182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002KN 00018 9-3 n °339 - 1	002KN 00018 9-3 n °339	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 677 - Vol 690	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1796 - S1797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002KN 00018 9-3 n °339 - 1	002KN 00018 9-3 n °339	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 652 (Bureaux 12)	Revêtement de sol	Ragréage	P349	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °349 - 1	002KN 00018 9-3 n °349 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 653 (Bureaux 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S1183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002KN 00018 9-3 n °349 - 1	002KN 00018 9-3 n °349 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 654 (Bureaux 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S1184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002KN 00018 9-3 n °349 - 1	002KN 00018 9-3 n °349 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 653 (Bureaux 13) - Vol 654 (Bureaux 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S1183 - S1184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002KN 00018 9-3 n °349 - 1	002KN 00018 9-3 n °349 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 652 (Bureaux 12)	Revêtement de sol	Ragréage	P349	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °349 - 1	002KN 00018 9-3 n °349 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 653 (Bureaux 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S1183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002KN 00018 9-3 n °349 - 1	002KN 00018 9-3 n °349 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 654 (Bureaux 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S1184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002KN 00018 9-3 n °349 - 1	002KN 00018 9-3 n °349 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 653 (Bureaux 13) - Vol 654 (Bureaux 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S1183 - S1184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002KN 00018 9-3 n °349 - 1	002KN 00018 9-3 n °349 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 654 (Bureaux 14)	Revêtement de sol	Ragréage	P351	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °351 - 1	002KN 00018 9-3 n °351 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 653 (Bureaux 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S1185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351		002KN 00018 9-3 n °351 - 1	002KN 00018 9-3 n °351 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 654 (Bureaux 14)	Revêtement de sol	Ragréage	P351	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °351 - 1	002KN 00018 9-3 n °351 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 653 (Bureaux 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S1185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351		002KN 00018 9-3 n °351 - 1	002KN 00018 9-3 n °351 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 384	Revêtement de sol	Nez de marche	P355	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °355 - 1	002KN 00018 9-3 n °355 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 660 (Escalier)	Revêtement de sol	Nez de marche	S1189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355		002KN 00018 9-3 n °355 - 1	002KN 00018 9-3 n °355 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 384	Revêtement de sol	Nez de marche	P355	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °355 - 1	002KN 00018 9-3 n °355 Phase 2	Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 660 (Escalier)	Revêtement de sol	Nez de marche	S1189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355		002KN 00018 9-3 n °355 - 1	002KN 00018 9-3 n °355 Phase 2	Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 384	Revêtement de sol	Ragréage	P356	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °356 - 1	002KN 00018 9-3 n °356 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 660 (Escalier)	Revêtement de sol	Ragréage	S1188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P356		002KN 00018 9-3 n °356 - 1	002KN 00018 9-3 n °356 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 384	Revêtement de sol	Ragréage	P356	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °356 - 1	002KN 00018 9-3 n °356 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 660 (Escalier)	Revêtement de sol	Ragréage	S1188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P356		002KN 00018 9-3 n °356 - 1	002KN 00018 9-3 n °356 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 661	Revêtement de sol	Ragréage	P357	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °357 - 1	002KN 00018 9-3 n °357 Phase 1	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 661	Revêtement de sol	Ragréage	P357	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °357 - 1	002KN 00018 9-3 n °357 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Revêtement de sol	Ragréage	P359	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °359 - 1	002KN 00018 9-3 n °359 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 320 (B026)	Revêtement de sol	Ragréage	P359	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °359 - 1	002KN 00018 9-3 n °359 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 382	Revêtement de sol	Ragréage	P360	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °360 - 1	002KN 00018 9-3 n °360 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 383	Revêtement de sol	Ragréage	S1202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360		002KN 00018 9-3 n °360 - 1	002KN 00018 9-3 n °360 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 382	Revêtement de sol	Ragréage	P360	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °360 - 1	002KN 00018 9-3 n °360 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 383	Revêtement de sol	Ragréage	S1202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360		002KN 00018 9-3 n °360 - 1	002KN 00018 9-3 n °360 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	P362	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °362 - 1	002KN 00018 9-3 n °362 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Bleu Revêtement Semi-dur Rose Toile Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	P362	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °362 - 1	002KN 00018 9-3 n °362 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Souple Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P363	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °363 - 1	002KN 00018 9-3 n °363 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Multicolore Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P363	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °363 - 1	002KN 00018 9-3 n °363 Phase 3	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Marron Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	P364	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °364 - 1	002KN 00018 9-3 n °364 Phase 1	Revêtement Semi-dur Orange Toile Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	P364	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °364 - 1	002KN 00018 9-3 n °364 Phase 3	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Gris Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 655 (B028)	Revêtement de sol	Ragréage	P365	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 1	Revêtement Semi-dur Orange Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 656 (B032)	Revêtement de sol	Ragréage	S1193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 1	Revêtement Semi-dur Orange Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 657 (B038)	Revêtement de sol	Ragréage	S1201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 1	Revêtement Semi-dur Orange Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 658 (B042)	Revêtement de sol	Ragréage	S1207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 1	Revêtement Semi-dur Orange Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 665 (B048)	Revêtement de sol	Ragréage	S1208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 1	Revêtement Semi-dur Orange Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 656 (B032) - Vol 657 (B038) - Vol 658 (B042) - Vol 665 (B048)	Revêtement de sol	Ragréage	S1193 - S1201 - S1207 - S1208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 1	Revêtement Semi-dur Orange Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 655 (B028)	Revêtement de sol	Ragréage	P365	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 4	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 656 (B032)	Revêtement de sol	Ragréage	S1193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 4	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 657 (B038)	Revêtement de sol	Ragréage	S1201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 4	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 658 (B042)	Revêtement de sol	Ragréage	S1207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 4	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 665 (B048)	Revêtement de sol	Ragréage	S1208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 4	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 656 (B032) - Vol 657 (B038) - Vol 658 (B042) - Vol 665 (B048)	Revêtement de sol	Ragréage	S1193 - S1201 - S1207 - S1208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002KN 00018 9-3 n °365 - 1	002KN 00018 9-3 n °365 Phase 4	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	P366	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °366 - 1	002KN 00018 9-3 n °366 Phase 1	Revêtement Semi-dur Orange Toile Souple Fibreux Jaune Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S1191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002KN 00018 9-3 n °366 - 1	002KN 00018 9-3 n °366 Phase 1	Revêtement Semi-dur Orange Toile Souple Fibreux Jaune Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	P366	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °366 - 1	002KN 00018 9-3 n °366 Phase 4	Peinture Effritable Multicolore Joint Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S1191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002KN 00018 9-3 n °366 - 1	002KN 00018 9-3 n °366 Phase 4	Peinture Effritable Multicolore Joint Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	P366	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °366 - 1	002KN 00018 9-3 n °366 Phase 6	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S1191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002KN 00018 9-3 n °366 - 1	002KN 00018 9-3 n °366 Phase 6	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P367	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °367 - 1	002KN 00018 9-3 n °367	Revêtement Souple Beige Peinture Effritable Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002KN 00018 9-3 n °367 - 1	002KN 00018 9-3 n °367	Revêtement Souple Beige Peinture Effritable Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	P369	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °369 - 1	002KN 00018 9-3 n °369 Phase 1	Joint Souple Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S1196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P369		002KN 00018 9-3 n °369 - 1	002KN 00018 9-3 n °369 Phase 1	Joint Souple Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	P369	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °369 - 1	002KN 00018 9-3 n °369 Phase 2	Revêtement Semi-dur Jaune Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S1196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P369		002KN 00018 9-3 n °369 - 1	002KN 00018 9-3 n °369 Phase 2	Revêtement Semi-dur Jaune Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	P369	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °369 - 1	002KN 00018 9-3 n °369 Phase 5	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Bleu Colle Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S1196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P369		002KN 00018 9-3 n °369 - 1	002KN 00018 9-3 n °369 Phase 5	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Bleu Colle Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	P369	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °369 - 1	002KN 00018 9-3 n °369 Phase 8	Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 659 (Bureaux 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S1196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P369		002KN 00018 9-3 n °369 - 1	002KN 00018 9-3 n °369 Phase 8	Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 666 (Infirmerie 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P370	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °370 - 1	002KN 00018 9-3 n °370	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 666 (Infirmerie 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P370		002KN 00018 9-3 n °370 - 1	002KN 00018 9-3 n °370	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 662 (Infirmerie 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P370		002KN 00018 9-3 n °370 - 1	002KN 00018 9-3 n °370	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 666 (Infirmerie 2) - Vol 662 (Infirmerie 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1204 - S1205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P370		002KN 00018 9-3 n °370 - 1	002KN 00018 9-3 n °370	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 664	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P374	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °374 - 1	002KN 00018 9-3 n °374	Matériau Effritable Gris Revêtement Dur Bleu Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 664	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P375	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °375 - 1	002KN 00018 9-3 n °375	Matériau Effritable Noir Ragréage Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 385	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P376	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °376 - 1	002KN 00018 9-3 n °376 Phase 1	Colle Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 385	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P376	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °376 - 1	002KN 00018 9-3 n °376 Phase 3	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 669	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P378	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °378 - 1	002KN 00018 9-3 n °378 Phase 1	Revêtement Souple Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 672	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002KN 00018 9-3 n °378 - 1	002KN 00018 9-3 n °378 Phase 1	Revêtement Souple Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 669	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P378	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °378 - 1	002KN 00018 9-3 n °378 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 672	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002KN 00018 9-3 n °378 - 1	002KN 00018 9-3 n °378 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 669	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P379	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °379 - 1	002KN 00018 9-3 n °379 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 669	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P379	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °379 - 1	002KN 00018 9-3 n °379 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Bleu Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 673 (C005)	Revêtement de sol	Ragréage	P380	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °380 - 1	002KN 00018 9-3 n °380 Phase 1	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 673 (C005)	Revêtement de sol	Ragréage	P380	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °380 - 1	002KN 00018 9-3 n °380 Phase 3	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 675	Revêtement de sol	Ragréage	P383	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °383 - 1	002KN 00018 9-3 n °383 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 675	Revêtement de sol	Ragréage	P383	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °383 - 1	002KN 00018 9-3 n °383 Phase 2	Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 681	Revêtement de sol	Chape maigre	P384	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °384 - 1	002KN 00018 9-3 n °384 Phase 1	Peinture Effritable Gris Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 681	Revêtement de sol	Chape maigre	P384	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °384 - 1	002KN 00018 9-3 n °384 Phase 4	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 682	Revêtement de sol	Ragréage	P385	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 679	Revêtement de sol	Ragréage	S1210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 680	Revêtement de sol	Ragréage	S1211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 678	Revêtement de sol	Ragréage	S1212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 685	Revêtement de sol	Ragréage	S1213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 686	Revêtement de sol	Ragréage	S1214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 687	Revêtement de sol	Ragréage	S1215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 684	Revêtement de sol	Ragréage	S1216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 683	Revêtement de sol	Ragréage	S1217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 689	Revêtement de sol	Ragréage	S1218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 679 - Vol 680 - Vol 678 - Vol 685 - Vol 686 - Vol 687 - Vol 684 - Vol 683 - Vol 689	Revêtement de sol	Ragréage	S1210 - S1211 - S1212 - S1213 - S1214 - S1215 - S1216 - S1217 - S1218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 682	Revêtement de sol	Ragréage	P385	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 679	Revêtement de sol	Ragréage	S1210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 680	Revêtement de sol	Ragréage	S1211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 678	Revêtement de sol	Ragréage	S1212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 685	Revêtement de sol	Ragréage	S1213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 686	Revêtement de sol	Ragréage	S1214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 687	Revêtement de sol	Ragréage	S1215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 684	Revêtement de sol	Ragréage	S1216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 683	Revêtement de sol	Ragréage	S1217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 689	Revêtement de sol	Ragréage	S1218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 679 - Vol 680 - Vol 678 - Vol 685 - Vol 686 - Vol 687 - Vol 684 - Vol 683 - Vol 689	Revêtement de sol	Ragréage	S1210 - S1211 - S1212 - S1213 - S1214 - S1215 - S1216 - S1217 - S1218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002KN 00018 9-3 n °385 - 1	002KN 00018 9-3 n °385 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 688	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P386	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °386 - 1	002KN 00018 9-3 n °386	Colle Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Beige Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 671	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P387	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 1	Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 692	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 1	Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 670	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 1	Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 692 - Vol 670	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1220 - S1221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 1	Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 671	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P387	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 2	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 692	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 2	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 670	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 2	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 692 - Vol 670	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1220 - S1221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 2	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 671	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P387	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 4	Joint Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 692	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 4	Joint Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 670	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 4	Joint Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 692 - Vol 670	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1220 - S1221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387		002KN 00018 9-3 n °387 - 1	002KN 00018 9-3 n °387 Phase 4	Joint Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 696 (Sureté)	Revêtement de sol	Ragréage	P395	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °395 - 1	002KN 00018 9-3 n °395 Phase 1	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 697	Revêtement de sol	Ragréage	S1226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P395		002KN 00018 9-3 n °395 - 1	002KN 00018 9-3 n °395 Phase 1	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 696 (Sureté)	Revêtement de sol	Ragréage	P395	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °395 - 1	002KN 00018 9-3 n °395 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 697	Revêtement de sol	Ragréage	S1226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P395		002KN 00018 9-3 n °395 - 1	002KN 00018 9-3 n °395 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 702	Revêtement de sol	Ragréage	P397	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °397 - 1	002KN 00018 9-3 n °397 Phase 1	Matériau Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 698	Revêtement de sol	Ragréage	S1233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P397		002KN 00018 9-3 n °397 - 1	002KN 00018 9-3 n °397 Phase 1	Matériau Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 702	Revêtement de sol	Ragréage	P397	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °397 - 1	002KN 00018 9-3 n °397 Phase 4	Joint Souple Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 698	Revêtement de sol	Ragréage	S1233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P397		002KN 00018 9-3 n °397 - 1	002KN 00018 9-3 n °397 Phase 4	Joint Souple Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 705	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P398	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °398 - 1	002KN 00018 9-3 n °398	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 698	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P398		002KN 00018 9-3 n °398 - 1	002KN 00018 9-3 n °398	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 707	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P398		002KN 00018 9-3 n °398 - 1	002KN 00018 9-3 n °398	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 699	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P398		002KN 00018 9-3 n °398 - 1	002KN 00018 9-3 n °398	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 706	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P398		002KN 00018 9-3 n °398 - 1	002KN 00018 9-3 n °398	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 703	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P398		002KN 00018 9-3 n °398 - 1	002KN 00018 9-3 n °398	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 698 - Vol 707 - Vol 699 - Vol 706 - Vol 703	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1227 - S1228 - S1229 - S1230 - S1234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P398		002KN 00018 9-3 n °398 - 1	002KN 00018 9-3 n °398	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 708	Revêtement de sol	Ragréage	P399	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °399 - 1	002KN 00018 9-3 n °399	Revêtement Semi-dur Bleu Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 649 (Couloir 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P402	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °402 - 1	002KN 00018 9-3 n °402	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 650 (Bureaux 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002KN 00018 9-3 n °402 - 1	002KN 00018 9-3 n °402	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 650 (Bureaux 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002KN 00018 9-3 n °402 - 1	002KN 00018 9-3 n °402	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 650 (Bureaux 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002KN 00018 9-3 n °402 - 1	002KN 00018 9-3 n °402	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 651 (Bureaux 11)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002KN 00018 9-3 n °402 - 1	002KN 00018 9-3 n °402	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 651 (Bureaux 11)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002KN 00018 9-3 n °402 - 1	002KN 00018 9-3 n °402	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 651 (Bureaux 11)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002KN 00018 9-3 n °402 - 1	002KN 00018 9-3 n °402	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 648 (Bureaux 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002KN 00018 9-3 n °402 - 1	002KN 00018 9-3 n °402	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 650 (Bureaux 10) - Vol 651 (Bureaux 11) - Vol 648 (Bureaux 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1235 - S1236 - S1237 - S1238 - S1239 - S1240 - S1241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002KN 00018 9-3 n °402 - 1	002KN 00018 9-3 n °402	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 710	Revêtement de sol	Ragréage	P405	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °405 - 1	002KN 00018 9-3 n °405 Phase 1	Revêtement Semi-dur Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 710	Revêtement de sol	Ragréage	P405	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °405 - 1	002KN 00018 9-3 n °405 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Toile Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 641	Revêtement de sol	Ragréage	P409	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °409 - 1	002KN 00018 9-3 n °409 Phase 1	Revêtement Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 641	Revêtement de sol	Ragréage	P409	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °409 - 1	002KN 00018 9-3 n °409 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 267 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P412	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °412 - 1	002KN 00018 9-3 n °412 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 267 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P412	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °412 - 1	002KN 00018 9-3 n °412 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 259	Revêtement de sol	Ragréage	P414	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °414 - 1	002KN 00018 9-3 n °414 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 259	Revêtement de sol	Ragréage	P414	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °414 - 1	002KN 00018 9-3 n °414 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 711	Revêtement de sol	Ragréage	P416	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °416 - 1	002KN 00018 9-3 n °416 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 641	Revêtement de sol	Ragréage	S1261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P416		002KN 00018 9-3 n °416 - 1	002KN 00018 9-3 n °416 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 718	Revêtement de sol	Ragréage	S1266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P416		002KN 00018 9-3 n °416 - 1	002KN 00018 9-3 n °416 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 641 - Vol 718	Revêtement de sol	Ragréage	S1261 - S1266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P416		002KN 00018 9-3 n °416 - 1	002KN 00018 9-3 n °416 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 711	Revêtement de sol	Ragréage	P416	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °416 - 1	002KN 00018 9-3 n °416 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 641	Revêtement de sol	Ragréage	S1261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P416		002KN 00018 9-3 n °416 - 1	002KN 00018 9-3 n °416 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 718	Revêtement de sol	Ragréage	S1266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P416		002KN 00018 9-3 n °416 - 1	002KN 00018 9-3 n °416 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 641 - Vol 718	Revêtement de sol	Ragréage	S1261 - S1266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P416		002KN 00018 9-3 n °416 - 1	002KN 00018 9-3 n °416 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 712	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P417	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °417 - 1	002KN 00018 9-3 n °417 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 713	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002KN 00018 9-3 n °417 - 1	002KN 00018 9-3 n °417 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 712	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P417	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °417 - 1	002KN 00018 9-3 n °417 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 713	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002KN 00018 9-3 n °417 - 1	002KN 00018 9-3 n °417 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 712	Revêtement de sol	Ragréage	P418	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °418 - 1	002KN 00018 9-3 n °418	Peinture Effritable Bleu Revêtement Souple Jaune Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 712	Revêtement de sol	Ragréage	P419	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °419 - 1	002KN 00018 9-3 n °419	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 714	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P421	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °421 - 1	002KN 00018 9-3 n °421 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 715	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1264 (P421)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002KN 00018 9-3 n °421 - 1	002KN 00018 9-3 n °421 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 714	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P421	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °421 - 1	002KN 00018 9-3 n °421 Phase 3	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 715	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1264 (P421)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002KN 00018 9-3 n °421 - 1	002KN 00018 9-3 n °421 Phase 3	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige Marron	Positif	Présence sur analyse
Plan Rdc	Vol 716	Revêtement de sol	Ragréage	P424	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °424 - 1	002KN 00018 9-3 n °424 Phase 1	Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 716	Revêtement de sol	Ragréage	P424	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °424 - 1	002KN 00018 9-3 n °424 Phase 2	Revêtement Semi-dur Beige Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 716	Revêtement de sol	Ragréage	P424	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °424 - 1	002KN 00018 9-3 n °424 Phase 5	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 717	Revêtement de sol	Ragréage	P425	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °425 Phase 1	Joint Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 717	Revêtement de sol	Ragréage	P425	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °425 Phase 2	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 717	Revêtement de sol	Ragréage	P425	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °425 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 256	Revêtement de sol	Ragréage	P426	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °426 - 1	002KN00018 9-3 n °426 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 256	Revêtement de sol	Ragréage	P426	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °426 - 1	002KN 00018 9-3 n °426 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 799	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P427	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °427 - 1	002KN 00018 9-3 n °427 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 823	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P427		002KN 00018 9-3 n °427 - 1	002KN 00018 9-3 n °427 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 799	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P427	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °427 - 1	002KN 00018 9-3 n °427 Phase 2	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 823	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P427		002KN 00018 9-3 n °427 - 1	002KN 00018 9-3 n °427 Phase 2	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 821	Revêtement de sol	Ragréage	P430	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °430 - 1	002KN 00018 9-3 n °430 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 821	Revêtement de sol	Ragréage	P430	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °430 - 1	002KN 00018 9-3 n °430 Phase 4	Ragréage Dur Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 787	Revêtement de sol	Ragréage	S1281	Réalisation d'un sondage		S1281 - 1				Négatif sur document Info UPD
Plan R+1	Vol 776	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P431	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °431 - 1	002KN 00018 9-3 n °431 Phase 1	Joint Souple Gris Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 776	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P431	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °431 - 1	002KN 00018 9-3 n °431 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 758	Revêtement de sol	Ragréage	P432	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °432 - 1	002KN 00018 9-3 n °432	Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 786	Revêtement de sol	Ragréage	P434	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °434 - 1	002KN 00018 9-3 n °434	Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 760	Revêtement de sol	Ragréage	P435	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °435 - 1	002KN 00018 9-3 n °435 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 761	Revêtement de sol	Ragréage	S1282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P435		002KN 00018 9-3 n °435 - 1	002KN 00018 9-3 n °435 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 762	Revêtement de sol	Ragréage	S1283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P435		002KN 00018 9-3 n °435 - 1	002KN 00018 9-3 n °435 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 785	Revêtement de sol	Ragréage	S1284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P435		002KN 00018 9-3 n °435 - 1	002KN 00018 9-3 n °435 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 761 - Vol 762 - Vol 785	Revêtement de sol	Ragréage	S1282 - S1283 - S1284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P435		002KN 00018 9-3 n °435 - 1	002KN 00018 9-3 n °435 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 760	Revêtement de sol	Ragréage	P435	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °435 - 1	002KN 00018 9-3 n °435 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 761	Revêtement de sol	Ragréage	S1282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P435		002KN 00018 9-3 n °435 - 1	002KN 00018 9-3 n °435 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 762	Revêtement de sol	Ragréage	S1283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P435		002KN 00018 9-3 n °435 - 1	002KN 00018 9-3 n °435 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 785	Revêtement de sol	Ragréage	S1284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P435		002KN 00018 9-3 n °435 - 1	002KN 00018 9-3 n °435 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 761 - Vol 762 - Vol 785	Revêtement de sol	Ragréage	S1282 - S1283 - S1284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P435		002KN 00018 9-3 n °435 - 1	002KN 00018 9-3 n °435 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 784	Revêtement de sol	Ragréage	P436	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °436 - 1	002KN 00018 9-3 n °436 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 784	Revêtement de sol	Ragréage	P436	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °436 - 1	002KN 00018 9-3 n °436 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 784	Revêtement de sol	Ragréage	P436	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °436 - 1	002KN 00018 9-3 n °436 Phase 5	Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 776	Revêtement de sol	Ragréage	P437	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °437 - 1	002KN 00018 9-3 n °437 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Joint Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 1428 (Salle F)	Revêtement de sol	Ragréage	S2055	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P437		002KN 00018 9-3 n °437 - 1	002KN 00018 9-3 n °437 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Joint Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 776	Revêtement de sol	Ragréage	P437	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °437 - 1	002KN 00018 9-3 n °437 Phase 3	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1428 (Salle F)	Revêtement de sol	Ragréage	S2055	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P437		002KN 00018 9-3 n °437 - 1	002KN 00018 9-3 n °437 Phase 3	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 776	Revêtement de sol	Ragréage	P437	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °437 - 1	002KN 00018 9-3 n °437 Phase 5	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1428 (Salle F)	Revêtement de sol	Ragréage	S2055	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P437		002KN 00018 9-3 n °437 - 1	002KN 00018 9-3 n °437 Phase 5	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 742 (102)	Revêtement de sol	Ragréage	S1285	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Info UPD

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	P438	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °438 - 1	002KN 00018 9-3 n °438 Phase 1	Matériau Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	S1287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P438		002KN 00018 9-3 n °438 - 1	002KN 00018 9-3 n °438 Phase 1	Matériau Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	S1288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P438		002KN 00018 9-3 n °438 - 1	002KN 00018 9-3 n °438 Phase 1	Matériau Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	S1287 - S1288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P438		002KN 00018 9-3 n °438 - 1	002KN 00018 9-3 n °438 Phase 1	Matériau Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	P438	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °438 - 1	002KN 00018 9-3 n °438 Phase 3	Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	S1287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P438		002KN 00018 9-3 n °438 - 1	002KN 00018 9-3 n °438 Phase 3	Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	S1288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P438		002KN 00018 9-3 n °438 - 1	002KN 00018 9-3 n °438 Phase 3	Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	S1287 - S1288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P438		002KN 00018 9-3 n °438 - 1	002KN 00018 9-3 n °438 Phase 3	Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	P439	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °439 - 1	002KN 00018 9-3 n °439 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	P439	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °439 - 1	002KN 00018 9-3 n °439 Phase 3	Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	P440	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °440 - 1	002KN 00018 9-3 n °440 Phase 1	Matériau Effritable Gris Revêtement Semi-dur Rouge Toile Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 429	Revêtement de sol	Ragréage	P440	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °440 - 1	002KN 00018 9-3 n °440 Phase 5	Colle Souple Blanc Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Noir Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 813	Revêtement de sol	Ragréage	P443	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °443 - 1	002KN 00018 9-3 n °443 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Sous-couche Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 819	Revêtement de sol	Ragréage	S1295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P443		002KN 00018 9-3 n °443 - 1	002KN 00018 9-3 n °443 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Sous-couche Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 755	Revêtement de sol	Ragréage	S1296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P443		002KN 00018 9-3 n °443 - 1	002KN 00018 9-3 n °443 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Sous-couch e Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 819 - Vol 755	Revêtement de sol	Ragréage	S1295 - S1296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P443		002KN 00018 9-3 n °443 - 1	002KN 00018 9-3 n °443 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Sous-couch e Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 813	Revêtement de sol	Ragréage	P443	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °443 - 1	002KN 00018 9-3 n °443 Phase 5	Colle Souple Beige Ragréage Dur Rose Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 819	Revêtement de sol	Ragréage	S1295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P443		002KN 00018 9-3 n °443 - 1	002KN 00018 9-3 n °443 Phase 5	Colle Souple Beige Ragréage Dur Rose Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 755	Revêtement de sol	Ragréage	S1296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P443		002KN 00018 9-3 n °443 - 1	002KN 00018 9-3 n °443 Phase 5	Colle Souple Beige Ragréage Dur Rose Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 819 - Vol 755	Revêtement de sol	Ragréage	S1295 - S1296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P443		002KN 00018 9-3 n °443 - 1	002KN 00018 9-3 n °443 Phase 5	Colle Souple Beige Ragréage Dur Rose Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 825	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1291	Réalisation d'un sondage		002KN 00018 9-3 n °444 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragesol refait par la DI décapé et réagré
Plan R+1	Vol 837	Revêtement de sol	Ragréage	P444	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °444 - 1	002KN 00018 9-3 n °444 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Rouge Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 837	Revêtement de sol	Ragréage	P444	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °444 - 1	002KN 00018 9-3 n °444 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 822	Revêtement de sol	Ragréage	P445	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °445 - 1	002KN 00018 9-3 n °445 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 822	Revêtement de sol	Ragréage	P445	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °445 - 1	002KN 00018 9-3 n °445 Phase 4	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 826	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1293	Réalisation d'un sondage		002KN 00018 9-3 n °446 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragSol refait par la DI décapé et réagré

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 827	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1294	Réalisation d'un sondage		002KN 00018 9-3 n °446 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragSol refait par la DI décapé et réagré
Plan R+1	Vol 751	Revêtement de sol	Ragréage	P446	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °446 - 1	002KN 00018 9-3 n °446 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 751	Revêtement de sol	Ragréage	P446	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °446 - 1	002KN 00018 9-3 n °446 Phase 4	Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 752	Revêtement de sol	Ragréage	P447	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °447 - 1	002KN 00018 9-3 n °447 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 752	Revêtement de sol	Ragréage	P447	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °447 - 1	002KN 00018 9-3 n °447 Phase 2	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 752	Revêtement de sol	Ragréage	P447	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °447 - 1	002KN 00018 9-3 n °447 Phase 5	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 727 (B102TER)	Revêtement de sol	Ragréage	S1297	Réalisation d'un sondage		S1297 - 1				Négatif sur document Info UPD
Plan R+1	Vol 723	Revêtement de sol	Ragréage	S1298	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Info UPD

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 842	Revêtement de sol	Ragréage	P448	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °448 - 1	002KN 00018 9-3 n °448 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 841	Revêtement de sol	Ragréage	S1385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002KN 00018 9-3 n °448 - 1	002KN 00018 9-3 n °448 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 840	Revêtement de sol	Ragréage	S1386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002KN 00018 9-3 n °448 - 1	002KN 00018 9-3 n °448 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 841 - Vol 840	Revêtement de sol	Ragréage	S1385 - S1386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002KN 00018 9-3 n °448 - 1	002KN 00018 9-3 n °448 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 842	Revêtement de sol	Ragréage	P448	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °448 - 1	002KN 00018 9-3 n °448 Phase 4	Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 841	Revêtement de sol	Ragréage	S1385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002KN 00018 9-3 n °448 - 1	002KN 00018 9-3 n °448 Phase 4	Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 840	Revêtement de sol	Ragréage	S1386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002KN 00018 9-3 n °448 - 1	002KN 00018 9-3 n °448 Phase 4	Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 841 - Vol 840	Revêtement de sol	Ragréage	S1385 - S1386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002KN 00018 9-3 n °448 - 1	002KN 00018 9-3 n °448 Phase 4	Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 843	Revêtement de sol	Ragréage	P449	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °449 - 1	002KN 00018 9-3 n °449 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 843	Revêtement de sol	Ragréage	P449	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °449 - 1	002KN 00018 9-3 n °449 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 855	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P450	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °450 - 1	002KN 00018 9-3 n °450	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 846	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P450		002KN 00018 9-3 n °450 - 1	002KN 00018 9-3 n °450	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 847	Revêtement de sol	Ragréage	P454	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °454 - 1	002KN 00018 9-3 n °454 Phase 1	Matériau Effritable Beige Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 847	Revêtement de sol	Ragréage	P454	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °454 - 1	002KN 00018 9-3 n °454 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 845	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P455	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °455 - 1	002KN 00018 9-3 n °455 Phase 1	Revêtement Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 845	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P455	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °455 - 1	002KN 00018 9-3 n °455 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Bois Dur Fibreux Beige Peinture Effritable Orange Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 845	Revêtement de sol	Nez de marche	P456	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °456 - 1	002KN 00018 9-3 n °456	Revêtement Souple Noir Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 845	Revêtement de sol	Nez de marche	S1299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P456		002KN 00018 9-3 n °456 - 1	002KN 00018 9-3 n °456	Revêtement Souple Noir Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 845	Revêtement de sol	Ragréage	S1300	Réalisation d'un sondage		S1300 - 1				Négatif sur document Info UPD
Plan R+2	Vol 848	Revêtement de sol	Ragréage	P460	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °460 - 1	002KN00018 9-3 n °460	Revêtement Fibreux Semi-dur Gris Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 847	Revêtement de sol	Ragréage	P462	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °462 - 1	002KN00018 9-3 n °462	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Toile Souple Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 843	Revêtement de sol	Ragréage	S1308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P462		002KN00018 9-3 n °462 - 1	002KN00018 9-3 n °462	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Toile Souple Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 847	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P465	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °465 - 1	002KN 00018 9-3 n °465 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 843	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P465		002KN 00018 9-3 n °465 - 1	002KN 00018 9-3 n °465 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P465		002KN 00018 9-3 n °465 - 1	002KN 00018 9-3 n °465 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 843 - Vol 625	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1318 - S1319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P465		002KN 00018 9-3 n °465 - 1	002KN 00018 9-3 n °465 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 847	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P465	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °465 - 1	002KN 00018 9-3 n °465 Phase 3	Colle Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 843	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P465		002KN 00018 9-3 n °465 - 1	002KN 00018 9-3 n °465 Phase 3	Colle Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P465		002KN 00018 9-3 n °465 - 1	002KN 00018 9-3 n °465 Phase 3	Colle Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 843 - Vol 625	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1318 - S1319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P465		002KN 00018 9-3 n °465 - 1	002KN 00018 9-3 n °465 Phase 3	Colle Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 859	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P468	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °468 - 1	002KN 00018 9-3 n °468 Phase 1	Revêtement Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 860	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P468		002KN 00018 9-3 n °468 - 1	002KN 00018 9-3 n °468 Phase 1	Revêtement Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 859	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P468	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °468 - 1	002KN 00018 9-3 n °468 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 860	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P468		002KN 00018 9-3 n °468 - 1	002KN 00018 9-3 n °468 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 859	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P469	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °469 - 1	002KN 00018 9-3 n °469 Phase 1	Revêtement Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 860	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P469		002KN 00018 9-3 n °469 - 1	002KN 00018 9-3 n °469 Phase 1	Revêtement Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 859	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P469	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °469 - 1	002KN 00018 9-3 n °469 Phase 2	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Bleu Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 860	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P469		002KN 00018 9-3 n °469 - 1	002KN 00018 9-3 n °469 Phase 2	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Bleu Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 859	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P469	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °469 - 1	002KN 00018 9-3 n °469 Phase 5	Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 860	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P469		002KN 00018 9-3 n °469 - 1	002KN 00018 9-3 n °469 Phase 5	Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 861	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1327	Réalisation d'un sondage		S1327 - 1				Négatif sur document Info UPD

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 862	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1330	Réalisation d'un sondage		S1330 - 1				Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'018 pyramide conseil
Plan R+2	Vol 862	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P470	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-3 n °470 - 1	002KN000189-3 n °470 Phase 1	Colle Souple Translucide Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 454	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P470		002KN000189-3 n °470 - 1	002KN000189-3 n °470 Phase 1	Colle Souple Translucide Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 900	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P470		002KN000189-3 n °470 - 1	002KN000189-3 n °470 Phase 1	Colle Souple Translucide Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 454 - Vol 900	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1331 - S1332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P470		002KN000189-3 n °470 - 1	002KN000189-3 n °470 Phase 1	Colle Souple Translucide Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 862	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P470	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °470 - 1	002KN 00018 9-3 n °470 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 454	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P470		002KN 00018 9-3 n °470 - 1	002KN 00018 9-3 n °470 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 900	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P470		002KN 00018 9-3 n °470 - 1	002KN 00018 9-3 n °470 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 454 - Vol 900	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1331 - S1332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P470		002KN 00018 9-3 n °470 - 1	002KN 00018 9-3 n °470 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 863	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P471	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °471 - 1	002KN 00018 9-3 n °471	Colle Dur Fibreux Gris Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 864	Revêtement de sol	Ragréage	P472	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °472 - 1	002KN 00018 9-3 n °472 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 864	Revêtement de sol	Ragréage	P472	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °472 - 1	002KN 00018 9-3 n °472 Phase 3	Peinture Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Revêtement Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 864	Revêtement de sol	Ragréage	P472	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °472 - 1	002KN 00018 9-3 n °472 Phase 6	Colle Souple Marron Revêtement Souple Fibreux Beige Colle Souple Orange Matériau Effritable Blanc Matériau Souple Blanc Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 864	Revêtement de sol	Ragréage	P472	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °472 - 1	002KN 00018 9-3 n °472 Phase 11	Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 886	Revêtement de sol	Ragréage	P473	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °473 - 1	002KN 00018 9-3 n °473 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 886	Revêtement de sol	Ragréage	P473	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °473 - 1	002KN 00018 9-3 n °473 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Matériau Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 886	Revêtement de sol	Ragréage	P473	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °473 - 1	002KN 00018 9-3 n °473 Phase 6	Ragréage Effritable Beige Matériau Effritable Marron Béton Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 881	Revêtement de sol	Ragréage	P475	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °475 - 1	002KN 00018 9-3 n °475 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 884	Revêtement de sol	Ragréage	S1333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475		002KN 00018 9-3 n °475 - 1	002KN 00018 9-3 n °475 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 885	Revêtement de sol	Ragréage	S1334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475		002KN 00018 9-3 n °475 - 1	002KN 00018 9-3 n °475 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 882	Revêtement de sol	Ragréage	S1335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475		002KN 00018 9-3 n °475 - 1	002KN 00018 9-3 n °475 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 884 - Vol 885 - Vol 882	Revêtement de sol	Ragréage	S1333 - S1334 - S1335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475		002KN 00018 9-3 n °475 - 1	002KN 00018 9-3 n °475 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 881	Revêtement de sol	Ragréage	P475	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °475 - 1	002KN 00018 9-3 n °475 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 884	Revêtement de sol	Ragréage	S1333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475		002KN 00018 9-3 n °475 - 1	002KN 00018 9-3 n °475 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 885	Revêtement de sol	Ragréage	S1334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475		002KN 00018 9-3 n °475 - 1	002KN 00018 9-3 n °475 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 882	Revêtement de sol	Ragréage	S1335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475		002KN 00018 9-3 n °475 - 1	002KN 00018 9-3 n °475 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 884 - Vol 885 - Vol 882	Revêtement de sol	Ragréage	S1333 - S1334 - S1335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475		002KN 00018 9-3 n °475 - 1	002KN 00018 9-3 n °475 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 876	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P476	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °476 - 1	002KN 00018 9-3 n °476 Phase 1	Colle Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 876	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P476	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °476 - 1	002KN 00018 9-3 n °476 Phase 2	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 908	Revêtement de sol	Ragréage	P479	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °479 - 1	002KN 00018 9-3 n °479 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 907	Revêtement de sol	Ragréage	S1336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P479		002KN 00018 9-3 n °479 - 1	002KN 00018 9-3 n °479 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 906	Revêtement de sol	Ragréage	S1337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P479		002KN 00018 9-3 n °479 - 1	002KN 00018 9-3 n °479 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 907 - Vol 906	Revêtement de sol	Ragréage	S1336 - S1337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P479		002KN 00018 9-3 n °479 - 1	002KN 00018 9-3 n °479 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 908	Revêtement de sol	Ragréage	P479	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °479 - 1	002KN 00018 9-3 n °479 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Souple Beige Matériau Effritable Gris Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 907	Revêtement de sol	Ragréage	S1336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P479		002KN 00018 9-3 n °479 - 1	002KN 00018 9-3 n °479 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Souple Beige Matériau Effritable Gris Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 906	Revêtement de sol	Ragréage	S1337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P479		002KN 00018 9-3 n °479 - 1	002KN 00018 9-3 n °479 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Souple Beige Matériau Effritable Gris Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 907 - Vol 906	Revêtement de sol	Ragréage	S1336 - S1337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P479		002KN 00018 9-3 n °479 - 1	002KN 00018 9-3 n °479 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Souple Beige Matériau Effritable Gris Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 893	Revêtement de sol	Ragréage	P481	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 1	Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 890	Revêtement de sol	Ragréage	S1338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P481		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 1	Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 887	Revêtement de sol	Ragréage	S1339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P481		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 1	Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 890 - Vol 887	Revêtement de sol	Ragréage	S1338 - S1339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P481		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 1	Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 893	Revêtement de sol	Ragréage	P481	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 2	Revêtement Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 890	Revêtement de sol	Ragréage	S1338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P481		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 2	Revêtement Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 887	Revêtement de sol	Ragréage	S1339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P481		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 2	Revêtement Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 890 - Vol 887	Revêtement de sol	Ragréage	S1338 - S1339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P481		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 2	Revêtement Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 893	Revêtement de sol	Ragréage	P481	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 890	Revêtement de sol	Ragréage	S1338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P481		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 887	Revêtement de sol	Ragréage	S1339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P481		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 890 - Vol 887	Revêtement de sol	Ragréage	S1338 - S1339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P481		002KN 00018 9-3 n °481 - 1	002KN 00018 9-3 n °481 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 891	Revêtement de sol	Ragréage	P482	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °482 - 1	002KN 00018 9-3 n °482 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 888	Revêtement de sol	Ragréage	S1340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P482		002KN 00018 9-3 n °482 - 1	002KN 00018 9-3 n °482 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 891	Revêtement de sol	Ragréage	P482	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °482 - 1	002KN 00018 9-3 n °482 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 888	Revêtement de sol	Ragréage	S1340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P482		002KN 00018 9-3 n °482 - 1	002KN 00018 9-3 n °482 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 891	Revêtement de sol	Ragréage	P482	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °482 - 1	002KN 00018 9-3 n °482 Phase 7	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 888	Revêtement de sol	Ragréage	S1340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P482		002KN 00018 9-3 n °482 - 1	002KN 00018 9-3 n °482 Phase 7	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 915 (B211)	Revêtement de sol	Ragréage	P483	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °483 - 1	002KN 00018 9-3 n °483 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Fibreux Semi-dur Multicolore Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 915 (B211)	Revêtement de sol	Ragréage	P483	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °483 - 1	002KN 00018 9-3 n °483 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 915 (B211)	Revêtement de sol	Ragréage	P483	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °483 - 1	002KN 00018 9-3 n °483 Phase 6	Peinture Effritable Beige Revêtement Souple Marron Colle Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 917	Revêtement de sol	Ragréage	P484	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °484 - 1	002KN 00018 9-3 n °484 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 919	Revêtement de sol	Ragréage	S1346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P484		002KN 00018 9-3 n °484 - 1	002KN 00018 9-3 n °484 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 917	Revêtement de sol	Ragréage	P484	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °484 - 1	002KN 00018 9-3 n °484 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 919	Revêtement de sol	Ragréage	S1346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P484		002KN 00018 9-3 n °484 - 1	002KN 00018 9-3 n °484 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 918	Revêtement de sol	Ragréage	P485	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °485 - 1	002KN 00018 9-3 n °485 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 916	Revêtement de sol	Ragréage	S1786	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P485		002KN 00018 9-3 n °485 - 1	002KN 00018 9-3 n °485 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 918	Revêtement de sol	Ragréage	P485	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °485 - 1	002KN 00018 9-3 n °485 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 916	Revêtement de sol	Ragréage	S1786	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P485		002KN 00018 9-3 n °485 - 1	002KN 00018 9-3 n °485 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 922	Revêtement de sol	Ragréage	P486	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °486 - 1	002KN 00018 9-3 n °486 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 922	Revêtement de sol	Ragréage	P486	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °486 - 1	002KN 00018 9-3 n °486 Phase 4	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 724 (B102)	Revêtement de sol	Ragréage	P489	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °489 - 1	002KN 00018 9-3 n °489 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 729	Revêtement de sol	Ragréage	S1363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P489		002KN 00018 9-3 n °489 - 1	002KN 00018 9-3 n °489 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 726	Revêtement de sol	Ragréage	S1364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P489		002KN 00018 9-3 n °489 - 1	002KN 00018 9-3 n °489 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 729 - Vol 726	Revêtement de sol	Ragréage	S1363 - S1364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P489		002KN 00018 9-3 n °489 - 1	002KN 00018 9-3 n °489 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 724 (B102)	Revêtement de sol	Ragréage	P489	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °489 - 1	002KN 00018 9-3 n °489 Phase 4	Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 729	Revêtement de sol	Ragréage	S1363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P489		002KN 00018 9-3 n °489 - 1	002KN 00018 9-3 n °489 Phase 4	Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 726	Revêtement de sol	Ragréage	S1364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P489		002KN 00018 9-3 n °489 - 1	002KN 00018 9-3 n °489 Phase 4	Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 729 - Vol 726	Revêtement de sol	Ragréage	S1363 - S1364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P489		002KN 00018 9-3 n °489 - 1	002KN 00018 9-3 n °489 Phase 4	Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 725	Revêtement de sol	Ragréage	P490	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °490 - 1	002KN 00018 9-3 n °490 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 725	Revêtement de sol	Ragréage	P490	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °490 - 1	002KN 00018 9-3 n °490 Phase 3	Revêtement Semi-dur Marron Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 725	Revêtement de sol	Ragréage	P490	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °490 - 1	002KN 00018 9-3 n °490 Phase 6	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 728 (B507)	Revêtement de sol	Ragréage	P491	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °491 - 1	002KN 00018 9-3 n °491 Phase 1	Matériau Effritable Gris Revêtement Semi-dur Bleu Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 731	Revêtement de sol	Ragréage	S1369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P491		002KN 00018 9-3 n °491 - 1	002KN 00018 9-3 n °491 Phase 1	Matériau Effritable Gris Revêtement Semi-dur Bleu Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 728 (B507)	Revêtement de sol	Ragréage	P491	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °491 - 1	002KN 00018 9-3 n °491 Phase 5	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 731	Revêtement de sol	Ragréage	S1369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P491		002KN 00018 9-3 n °491 - 1	002KN 00018 9-3 n °491 Phase 5	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 730	Revêtement de sol	Ragréage	P492	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °492 - 1	002KN 00018 9-3 n °492 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Marron Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 730	Revêtement de sol	Ragréage	P492	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °492 - 1	002KN 00018 9-3 n °492 Phase 5	Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 732	Revêtement de sol	Ragréage	P493	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °493 - 1	002KN 00018 9-3 n °493 Phase 1	Matériau Souple Jaune Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 732	Revêtement de sol	Ragréage	P493	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °493 - 1	002KN 00018 9-3 n °493 Phase 3	Colle Souple Gris Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 735	Revêtement de sol	Ragréage	P494	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °494 - 1	002KN 00018 9-3 n °494 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 733	Revêtement de sol	Ragréage	S1382 (P494)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P494		002KN 00018 9-3 n °494 - 1	002KN 00018 9-3 n °494 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 735	Revêtement de sol	Ragréage	P494	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °494 - 1	002KN 00018 9-3 n °494 Phase 3	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Marron Colle Souple Marron Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Plan R+1	Vol 733	Revêtement de sol	Ragréage	S1382 (P494)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P494		002KN 00018 9-3 n °494 - 1	002KN 00018 9-3 n °494 Phase 3	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Marron Colle Souple Marron Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 733	Revêtement de sol	Ragréage	P495	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °495 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °495 - 2	002KN 00018 9-3 n °495	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 732	Revêtement de sol	Ragréage	S1388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P495		002KN 00018 9-3 n °495 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °495 - 2	002KN 00018 9-3 n °495	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 781 (B114)	Revêtement de sol	Ragréage	P496	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °496 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °496 - 2	002KN 00018 9-3 n °496 Phase 1	Matériau Effritable Gris Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 781 (B114)	Revêtement de sol	Ragréage	P496	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °496 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °496 - 2	002KN 00018 9-3 n °496 Phase 5	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 780 (B112)	Revêtement de sol	Ragréage	P497	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °497 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °497 - 2	002KN 00018 9-3 n °497 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 737	Revêtement de sol	Ragréage	S1389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P497		002KN 00018 9-3 n °497 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °497 - 2	002KN 00018 9-3 n °497 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 780 (B112)	Revêtement de sol	Ragréage	P497	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °497 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °497 - 2	002KN 00018 9-3 n °497 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 737	Revêtement de sol	Ragréage	S1389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P497		002KN 00018 9-3 n °497 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °497 - 2	002KN 00018 9-3 n °497 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 736	Revêtement de sol	Ragréage	P498	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °498 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °498 - 2	002KN 00018 9-3 n °498 Phase 1	Peinture Effritable Beige Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 736	Revêtement de sol	Ragréage	P498	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °498 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °498 - 2	002KN 00018 9-3 n °498 Phase 5	Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 734	Revêtement de sol	Ragréage	P499	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Marron Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 775	Revêtement de sol	Ragréage	S1390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P499		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Marron Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 774	Revêtement de sol	Ragréage	S1391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P499		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Marron Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 772	Revêtement de sol	Ragréage	S1392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P499		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Marron Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 790	Revêtement de sol	Ragréage	S1393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P499		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Marron Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 775 - Vol 774 - Vol 772 - Vol 790	Revêtement de sol	Ragréage	S1390 - S1391 - S1392 - S1393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P499		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Marron Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 734	Revêtement de sol	Ragréage	P499	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 5	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 775	Revêtement de sol	Ragréage	S1390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P499		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 5	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 774	Revêtement de sol	Ragréage	S1391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P499		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 5	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 772	Revêtement de sol	Ragréage	S1392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P499		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 5	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 790	Revêtement de sol	Ragréage	S1393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P499		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 5	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 775 - Vol 774 - Vol 772 - Vol 790	Revêtement de sol	Ragréage	S1390 - S1391 - S1392 - S1393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P499		002KN 00018 9-3 n °499 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °499 - 2	002KN 00018 9-3 n °499 Phase 5	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 783	Revêtement de sol	Ragréage	P500	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °500 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °500 - 2	002KN 00018 9-3 n °500 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 783	Revêtement de sol	Ragréage	P500	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °500 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °500 - 2	002KN 00018 9-3 n °500 Phase 4	Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 788	Revêtement de sol	Ragréage	P501	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °501 - 1	002KN 00018 9-3 n °501 Phase 1	Matériau Effritable Gris Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 789	Revêtement de sol	Ragréage	S1394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P501		002KN 00018 9-3 n °501 - 1	002KN 00018 9-3 n °501 Phase 1	Matériau Effritable Gris Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 788	Revêtement de sol	Ragréage	P501	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °501 - 1	002KN 00018 9-3 n °501 Phase 5	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 789	Revêtement de sol	Ragréage	S1394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P501		002KN 00018 9-3 n °501 - 1	002KN 00018 9-3 n °501 Phase 5	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 955	Revêtement de sol	Ragréage	P502	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 959	Revêtement de sol	Ragréage	S1782	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 957	Revêtement de sol	Ragréage	S1783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 955	Revêtement de sol	Ragréage	S1784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 959 - Vol 957 - Vol 955	Revêtement de sol	Ragréage	S1782 - S1783 - S1784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 955	Revêtement de sol	Ragréage	P502	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 959	Revêtement de sol	Ragréage	S1782	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 957	Revêtement de sol	Ragréage	S1783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 955	Revêtement de sol	Ragréage	S1784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 959 - Vol 957 - Vol 955	Revêtement de sol	Ragréage	S1782 - S1783 - S1784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 955	Revêtement de sol	Ragréage	P502	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 4	Matériau Effritable Noir Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 959	Revêtement de sol	Ragréage	S1782	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 4	Matériau Effritable Noir Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 957	Revêtement de sol	Ragréage	S1783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 4	Matériau Effritable Noir Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 955	Revêtement de sol	Ragréage	S1784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 4	Matériau Effritable Noir Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 959 - Vol 957 - Vol 955	Revêtement de sol	Ragréage	S1782 - S1783 - S1784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P502		002KN 00018 9-3 n °502 - 1	002KN 00018 9-3 n °502 Phase 4	Matériau Effritable Noir Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 953	Revêtement de sol	Ragréage	P503	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °503 - 1	002KN 00018 9-3 n °503 Phase 1	Revêtement Semi-dur Bleu Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 953	Revêtement de sol	Ragréage	P503	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °503 - 1	002KN 00018 9-3 n °503 Phase 4	Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 953	Revêtement de sol	Ragréage	P503	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °503 - 1	002KN 00018 9-3 n °503 Phase 5	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 938	Revêtement de sol	Ragréage	P504	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °504 - 1	002KN 00018 9-3 n °504 Phase 1	Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 938	Revêtement de sol	Ragréage	P504	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °504 - 1	002KN 00018 9-3 n °504 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 932	Revêtement de sol	Ragréage	P505	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 935	Revêtement de sol	Ragréage	S1395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 931	Revêtement de sol	Ragréage	S1396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 927	Revêtement de sol	Ragréage	S1397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 929	Revêtement de sol	Ragréage	S1398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 950	Revêtement de sol	Ragréage	S1434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 935 - Vol 931 - Vol 927 - Vol 929 - Vol 950	Revêtement de sol	Ragréage	S1395 - S1396 - S1397 - S1398 - S1434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 932	Revêtement de sol	Ragréage	P505	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 935	Revêtement de sol	Ragréage	S1395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 931	Revêtement de sol	Ragréage	S1396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 927	Revêtement de sol	Ragréage	S1397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 929	Revêtement de sol	Ragréage	S1398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 950	Revêtement de sol	Ragréage	S1434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 935 - Vol 931 - Vol 927 - Vol 929 - Vol 950	Revêtement de sol	Ragréage	S1395 - S1396 - S1397 - S1398 - S1434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 932	Revêtement de sol	Ragréage	P505	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 935	Revêtement de sol	Ragréage	S1395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 931	Revêtement de sol	Ragréage	S1396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 927	Revêtement de sol	Ragréage	S1397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 929	Revêtement de sol	Ragréage	S1398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 950	Revêtement de sol	Ragréage	S1434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 935 - Vol 931 - Vol 927 - Vol 929 - Vol 950	Revêtement de sol	Ragréage	S1395 - S1396 - S1397 - S1398 - S1434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505		002KN 00018 9-3 n °505 - 1	002KN 00018 9-3 n °505 Phase 6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 932	Revêtement de sol	Ragréage	P506	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °506 - 1	002KN 00018 9-3 n °506	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 939	Revêtement de sol	Ragréage	P507	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °507 - 1	002KN 00018 9-3 n °507 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 940	Revêtement de sol	Ragréage	S1785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P507		002KN 00018 9-3 n °507 - 1	002KN 00018 9-3 n °507 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 939	Revêtement de sol	Ragréage	P507	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °507 - 1	002KN 00018 9-3 n °507 Phase 3	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 940	Revêtement de sol	Ragréage	S1785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P507		002KN 00018 9-3 n °507 - 1	002KN 00018 9-3 n °507 Phase 3	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 944	Revêtement de sol	Ragréage	P509	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °509 - 1	002KN 00018 9-3 n °509	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 945	Revêtement de sol	Ragréage	S1403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P509		002KN 00018 9-3 n °509 - 1	002KN 00018 9-3 n °509	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 928	Revêtement de sol	Ragréage	S1404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P509		002KN 00018 9-3 n °509 - 1	002KN 00018 9-3 n °509	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 945 - Vol 928	Revêtement de sol	Ragréage	S1403 - S1404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P509		002KN 00018 9-3 n °509 - 1	002KN 00018 9-3 n °509	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 895	Revêtement de sol	Ragréage	P510	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °510 - 1	002KN 00018 9-3 n °510 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 896	Revêtement de sol	Ragréage	S1406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P510		002KN 00018 9-3 n °510 - 1	002KN 00018 9-3 n °510 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 895	Revêtement de sol	Ragréage	P510	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °510 - 1	002KN 00018 9-3 n °510 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 896	Revêtement de sol	Ragréage	S1406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P510		002KN 00018 9-3 n °510 - 1	002KN 00018 9-3 n °510 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 899	Revêtement de sol	Ragréage	P511	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °511 - 1	002KN 00018 9-3 n °511 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Orange Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 898	Revêtement de sol	Ragréage	S1407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P511		002KN 00018 9-3 n °511 - 1	002KN 00018 9-3 n °511 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Orange Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 899	Revêtement de sol	Ragréage	P511	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °511 - 1	002KN 00018 9-3 n °511 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 898	Revêtement de sol	Ragréage	S1407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P511		002KN 00018 9-3 n °511 - 1	002KN 00018 9-3 n °511 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 912	Revêtement de sol	Ragréage	P512	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °512 - 1	002KN 00018 9-3 n °512 Phase 1	Peinture Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 912	Revêtement de sol	Ragréage	P512	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °512 - 1	002KN 00018 9-3 n °512 Phase 4	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Blanc Ragréage Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1369	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P513	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °513 - 1	002KN 00018 9-3 n °513 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1367	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S1411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P513		002KN 00018 9-3 n °513 - 1	002KN 00018 9-3 n °513 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1369	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P513	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °513 - 1	002KN 00018 9-3 n °513 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1367	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S1411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P513		002KN 00018 9-3 n °513 - 1	002KN 00018 9-3 n °513 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1371	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P514	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °514 - 1	002KN 00018 9-3 n °514 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Gris Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1371	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P514	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °514 - 1	002KN 00018 9-3 n °514 Phase 3	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1365	Revêtement de sol	Ragréage	P515	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °515 - 1	002KN 00018 9-3 n °515 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Colle Souple Translucide Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1365	Revêtement de sol	Ragréage	P515	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °515 - 1	002KN 00018 9-3 n °515 Phase 5	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Marron Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1364	Revêtement de sol	Ragréage	P516	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °516 - 1	002KN 00018 9-3 n °516 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1364	Revêtement de sol	Ragréage	P516	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °516 - 1	002KN 00018 9-3 n °516 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 913 (Bureaux 16)	Revêtement de sol	Ragréage	P517	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °517 - 1	002KN 00018 9-3 n °517 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Beige Revêtement Semi-dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 913 (Bureaux 16)	Revêtement de sol	Ragréage	P517	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °517 - 1	002KN 00018 9-3 n °517 Phase 3	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 920 (B204)	Revêtement de sol	Ragréage	P518	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °518 - 1	002KN 00018 9-3 n °518	Matériau Souple Beige Matériau Effritable Marron Noir Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 921 (B202)	Revêtement de sol	Ragréage	S1412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P518		002KN 00018 9-3 n °518 - 1	002KN 00018 9-3 n °518	Matériau Souple Beige Matériau Effritable Marron Noir Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 923 (B201)	Revêtement de sol	Ragréage	P519	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °519 - 1	002KN 00018 9-3 n °519 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 923 (B201)	Revêtement de sol	Ragréage	P519	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °519 - 1	002KN 00018 9-3 n °519 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Beige Revêtement Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 923 (B201)	Revêtement de sol	Ragréage	P519	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °519 - 1	002KN 00018 9-3 n °519 Phase 5	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 923 (B201)	Revêtement de sol	Ragréage	P519	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °519 - 1	002KN 00018 9-3 n °519 Phase 8	Peinture Effritable Blanc Joint Souple Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 849	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P520	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °520 - 1	002KN 00018 9-3 n °520	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 853	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P520		002KN 00018 9-3 n °520 - 1	002KN 00018 9-3 n °520	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 871	Revêtement de sol	Ragréage	P526	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °526 - 1	002KN 00018 9-3 n °526 Phase 1	Joint Souple Blanc Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 862	Revêtement de sol	Ragréage	S1430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P526		002KN 00018 9-3 n °526 - 1	002KN 00018 9-3 n °526 Phase 1	Joint Souple Blanc Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 871	Revêtement de sol	Ragréage	P526	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °526 - 1	002KN 00018 9-3 n °526 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 862	Revêtement de sol	Ragréage	S1430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P526		002KN 00018 9-3 n °526 - 1	002KN 00018 9-3 n °526 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 451	Revêtement de sol	Nez de marche	P527	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °527 - 1	002KN 00018 9-3 n °527 Phase 1	Revêtement Souple Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 451	Revêtement de sol	Nez de marche	P527	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °527 - 1	002KN 00018 9-3 n °527 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 451	Revêtement de sol	Nez de marche	P527	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °527 - 1	002KN 00018 9-3 n °527 Phase 5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 451	Revêtement de sol	Ragréage	P528	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °528 - 1	002KN 00018 9-3 n °528 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 451	Revêtement de sol	Ragréage	P528	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °528 - 1	002KN 00018 9-3 n °528 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Noir Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 949	Revêtement de sol	Ragréage	P530	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °530 - 1	002KN 00018 9-3 n °530 Phase 1	Matériau Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 930	Revêtement de sol	Ragréage	S1431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P530		002KN 00018 9-3 n °530 - 1	002KN 00018 9-3 n °530 Phase 1	Matériau Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 949	Revêtement de sol	Ragréage	P530	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °530 - 1	002KN 00018 9-3 n °530 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 930	Revêtement de sol	Ragréage	S1431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P530		002KN 00018 9-3 n °530 - 1	002KN 00018 9-3 n °530 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 949	Revêtement de sol	Ragréage	P530	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °530 - 1	002KN 00018 9-3 n °530 Phase 5	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 930	Revêtement de sol	Ragréage	S1431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P530		002KN 00018 9-3 n °530 - 1	002KN 00018 9-3 n °530 Phase 5	Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 936 (B 307)	Revêtement de sol	Ragréage	P531	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °531 - 1	002KN 00018 9-3 n °531 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 937	Revêtement de sol	Ragréage	S1432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P531		002KN 00018 9-3 n °531 - 1	002KN 00018 9-3 n °531 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 936 (B 307)	Revêtement de sol	Ragréage	P531	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °531 - 1	002KN 00018 9-3 n °531 Phase 3	Colle Souple Marron Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 937	Revêtement de sol	Ragréage	S1432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P531		002KN 00018 9-3 n °531 - 1	002KN 00018 9-3 n °531 Phase 3	Colle Souple Marron Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 934	Revêtement de sol	Ragréage	P532	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °532 - 1	002KN 00018 9-3 n °532	Colle Souple Blanc Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 933	Revêtement de sol	Ragréage	P533	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °533 - 1	002KN 00018 9-3 n °533 Phase 1	Peinture Effritable Beige Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 933	Revêtement de sol	Ragréage	P533	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °533 - 1	002KN 00018 9-3 n °533 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 941	Revêtement de sol	Ragréage	P534	Réalisation d'un prélevement	Lès bleu, Sous lès beige	002KN 00018 9-3 n °534 - 1	002KN 00018 9-3 n °534 Phase 1	Colle Souple Marron Revêtement Semi-dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 941	Revêtement de sol	Ragréage	P534	Réalisation d'un prélevement	Lès bleu, Sous lès beige	002KN 00018 9-3 n °534 - 1	002KN 00018 9-3 n °534 Phase 3	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 942	Revêtement de sol	Ragréage	P535	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °535 - 1	002KN 00018 9-3 n °535 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 943	Revêtement de sol	Ragréage	S1433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P535		002KN 00018 9-3 n °535 - 1	002KN 00018 9-3 n °535 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 942	Revêtement de sol	Ragréage	P535	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °535 - 1	002KN 00018 9-3 n °535 Phase 3	Colle Souple Marron Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 943	Revêtement de sol	Ragréage	S1433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P535		002KN 00018 9-3 n °535 - 1	002KN 00018 9-3 n °535 Phase 3	Colle Souple Marron Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 926	Revêtement de sol	Ragréage	P536	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °536 - 1	002KN 00018 9-3 n °536	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 946	Revêtement de sol	Ragréage	P537	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °537 - 1	002KN 00018 9-3 n °537 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 946	Revêtement de sol	Ragréage	P537	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °537 - 1	002KN 00018 9-3 n °537 Phase 3	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1000	Revêtement de sol	Ragréage	P538	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °538 - 1	002KN 00018 9-3 n °538 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1000	Revêtement de sol	Ragréage	P538	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °538 - 1	002KN 00018 9-3 n °538 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1003	Revêtement de sol	Ragréage	P539	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °539 - 1	002KN 00018 9-3 n °539 Phase 1	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1003	Revêtement de sol	Ragréage	P539	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °539 - 1	002KN 00018 9-3 n °539 Phase 3	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1003	Revêtement de sol	Ragréage	P539	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °539 - 1	002KN 00018 9-3 n °539 Phase 4	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1011	Revêtement de sol	Ragréage	P540	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °540 - 1	002KN 00018 9-3 n °540 Phase 1	Revêtement Souple Beige Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1011	Revêtement de sol	Ragréage	P540	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °540 - 1	002KN 00018 9-3 n °540 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1011	Revêtement de sol	Ragréage	P540	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °540 - 1	002KN 00018 9-3 n °540 Phase 5	Revêtement Semi-dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1011	Revêtement de sol	Ragréage	P540	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °540 - 1	002KN 00018 9-3 n °540 Phase 6	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1011	Revêtement de sol	Ragréage	P540	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °540 - 1	002KN 00018 9-3 n °540 Phase 8	Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1012 (B420)	Revêtement de sol	Ragréage	P542	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 1	Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1013	Revêtement de sol	Ragréage	S1435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P542		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 1	Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1017	Revêtement de sol	Ragréage	S1436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P542		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 1	Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1013 - Vol 1017	Revêtement de sol	Ragréage	S1435 - S1436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P542		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 1	Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1012 (B420)	Revêtement de sol	Ragréage	P542	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1013	Revêtement de sol	Ragréage	S1435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P542		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1017	Revêtement de sol	Ragréage	S1436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P542		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1013 - Vol 1017	Revêtement de sol	Ragréage	S1435 - S1436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P542		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1012 (B420)	Revêtement de sol	Ragréage	P542	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 5	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1013	Revêtement de sol	Ragréage	S1435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P542		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 5	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1017	Revêtement de sol	Ragréage	S1436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P542		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 5	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1013 - Vol 1017	Revêtement de sol	Ragréage	S1435 - S1436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P542		002KN 00018 9-3 n °542 - 1	002KN 00018 9-3 n °542 Phase 5	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1018	Revêtement de sol	Ragréage	P543	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °543 - 1	002KN 00018 9-3 n °543 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1018	Revêtement de sol	Ragréage	P543	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °543 - 1	002KN 00018 9-3 n °543 Phase 2	Colle Souple Fibreux Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1019	Revêtement de sol	Ragréage	P544	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 1	Matériau Effritable Noir Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1020	Revêtement de sol	Ragréage	S1437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 1	Matériau Effritable Noir Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 327 (B424 bis)	Revêtement de sol	Ragréage	S1438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 1	Matériau Effritable Noir Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1021	Revêtement de sol	Ragréage	S1439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 1	Matériau Effritable Noir Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1028	Revêtement de sol	Ragréage	S1440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 1	Matériau Effritable Noir Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1029	Revêtement de sol	Ragréage	S1441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 1	Matériau Effritable Noir Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1031	Revêtement de sol	Ragréage	S1442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 1	Matériau Effritable Noir Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1020 - Vol 327 (B424 bis) - Vol 1021 - Vol 1028 - Vol 1029 - Vol 1031	Revêtement de sol	Ragréage	S1437 - S1438 - S1439 - S1440 - S1441 - S1442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 1	Matériau Effritable Noir Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1019	Revêtement de sol	Ragréage	P544	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1020	Revêtement de sol	Ragréage	S1437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 327 (B424 bis)	Revêtement de sol	Ragréage	S1438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1021	Revêtement de sol	Ragréage	S1439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1028	Revêtement de sol	Ragréage	S1440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1029	Revêtement de sol	Ragréage	S1441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1031	Revêtement de sol	Ragréage	S1442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1020 - Vol 327 (B424 bis) - Vol 1021 - Vol 1028 - Vol 1029 - Vol 1031	Revêtement de sol	Ragréage	S1437 - S1438 - S1439 - S1440 - S1441 - S1442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544		002KN 00018 9-3 n °544 - 1	002KN 00018 9-3 n °544 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1022	Revêtement de sol	Ragréage	P545	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °545 - 1	002KN 00018 9-3 n °545 Phase 1	Colle Souple Translucide Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1025	Revêtement de sol	Ragréage	S1443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P545		002KN 00018 9-3 n °545 - 1	002KN 00018 9-3 n °545 Phase 1	Colle Souple Translucide Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1022	Revêtement de sol	Ragréage	P545	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °545 - 1	002KN 00018 9-3 n °545 Phase 3	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1025	Revêtement de sol	Ragréage	S1443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P545		002KN 00018 9-3 n °545 - 1	002KN 00018 9-3 n °545 Phase 3	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1024	Revêtement de sol	Ragréage	P546	Réalisation d'un prélèvement		002KN 00018 9-3 n °546 - 1	002KN 00018 9-3 n °546	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1023	Revêtement de sol	Ragréage	S1444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P546		002KN 00018 9-3 n °546 - 1	002KN 00018 9-3 n °546	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1026	Revêtement de sol	Ragréage	P547	Réalisation d'un prélèvement		002KN 00018 9-3 n °547 - 1	002KN 00018 9-3 n °547 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1026	Revêtement de sol	Ragréage	P547	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °547 - 1	002KN 00018 9-3 n °547 Phase 3	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1027	Revêtement de sol	Ragréage	P548	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °548 - 1	002KN 00018 9-3 n °548 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1027	Revêtement de sol	Ragréage	P548	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °548 - 1	002KN 00018 9-3 n °548 Phase 3	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1034	Revêtement de sol	Ragréage	P551	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °551 - 1	002KN 00018 9-3 n °551 Phase 1	Revêtement Souple Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1034	Revêtement de sol	Ragréage	P551	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °551 - 1	002KN 00018 9-3 n °551 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1033	Revêtement de sol	Ragréage	P552	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °552 - 1	002KN 00018 9-3 n °552 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1033	Revêtement de sol	Ragréage	P552	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °552 - 1	002KN 00018 9-3 n °552 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1032	Revêtement de sol	Ragréage	P553	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °553 - 1	002KN 00018 9-3 n °553 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1032	Revêtement de sol	Ragréage	P553	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °553 - 1	002KN 00018 9-3 n °553 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1373	Revêtement de sol	Ragréage	P554	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °554 - 1	002KN 00018 9-3 n °554 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1373	Revêtement de sol	Ragréage	P554	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °554 - 1	002KN 00018 9-3 n °554 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1070	Revêtement de sol	Ragréage	P555	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °555 - 1	002KN 00018 9-3 n °555 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1070	Revêtement de sol	Ragréage	P555	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °555 - 1	002KN 00018 9-3 n °555 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1070	Revêtement de sol	Ragréage	P555	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °555 - 1	002KN 00018 9-3 n °555 Phase 4	Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1096	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P556	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °556 - 1	002KN 00018 9-3 n °556 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1110	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P556		002KN 00018 9-3 n °556 - 1	002KN 00018 9-3 n °556 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1096	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P556	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °556 - 1	002KN 00018 9-3 n °556 Phase 2	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1110	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P556		002KN 00018 9-3 n °556 - 1	002KN 00018 9-3 n °556 Phase 2	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1098	Revêtement de sol	Ragréage	P561	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °561 - 1	002KN 00018 9-3 n °561 Phase 1	Revêtement Souple Marron Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1098	Revêtement de sol	Ragréage	P561	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °561 - 1	002KN 00018 9-3 n °561 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1104	Revêtement de sol	Ragréage	P563	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °563 - 1	002KN 00018 9-3 n °563 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1104	Revêtement de sol	Ragréage	P563	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °563 - 1	002KN 00018 9-3 n °563 Phase 3	Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1103	Revêtement de sol	Ragréage	P564	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °564 - 1	002KN 00018 9-3 n °564	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1102	Revêtement de sol	Ragréage	S1469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P564		002KN 00018 9-3 n °564 - 1	002KN 00018 9-3 n °564	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1093	Revêtement de sol	Ragréage	P565	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °565 - 1	002KN 00018 9-3 n °565	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1092	Revêtement de sol	Ragréage	S1471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565		002KN 00018 9-3 n °565 - 1	002KN 00018 9-3 n °565	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1091	Revêtement de sol	Ragréage	P568	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °568 - 1	002KN 00018 9-3 n °568 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1091	Revêtement de sol	Ragréage	P568	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °568 - 1	002KN 00018 9-3 n °568 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1091	Revêtement de sol	Nez de marche	P569	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °569 - 1	002KN 00018 9-3 n °569	Matériau Semi-dur Multicolore Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1090	Revêtement de sol	Ragréage	P571	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °571 - 1	002KN 00018 9-3 n °571 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1090	Revêtement de sol	Ragréage	P571	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °571 - 1	002KN 00018 9-3 n °571 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1089	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P572	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °572 - 1	002KN 00018 9-3 n °572 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1050	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P572		002KN 00018 9-3 n °572 - 1	002KN 00018 9-3 n °572 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1089	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P572	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °572 - 1	002KN 00018 9-3 n °572 Phase 2	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1050	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P572		002KN 00018 9-3 n °572 - 1	002KN 00018 9-3 n °572 Phase 2	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1094	Faux plancher	Plaques	S1472	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Info UPD
Plan R+4	Vol 1055	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P574	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-3 n °574 - 1	002KN000189-3 n °574 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1052	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S1473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P574		002KN000189-3 n °574 - 1	002KN000189-3 n °574 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1055	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P574	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-3 n °574 - 1	002KN000189-3 n °574 Phase 2	Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1052	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S1473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P574		002KN000189-3 n °574 - 1	002KN000189-3 n °574 Phase 2	Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1051	Revêtement de sol	Ragréage	P575	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °575 - 1	002KN 00018 9-3 n °575 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1051	Revêtement de sol	Ragréage	P575	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °575 - 1	002KN 00018 9-3 n °575 Phase 3	Matériau Effritable Blanc Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1059	Revêtement de sol	Ragréage	P582	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °582 - 1	002KN 00018 9-3 n °582	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1113	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P583	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °583 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °583 - 2	002KN 00018 9-3 n °583 Phase 1	Moquette Fibreux Souple Gris Toile Fibreux Souple Beige Toile Fibreux Souple Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1113	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P583	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °583 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °583 - 2	002KN 00018 9-3 n °583 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1286	Revêtement de sol	Ragréage	P584	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9-3 n °584 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1286	Revêtement de sol	Ragréage	P584	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9-3 n °584 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Gris Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1285	Revêtement de sol	Ragréage	P585	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °585 - 1	002KN 00018 9-3 n °585 Phase 1	Revêtement Souple Gris Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1285	Revêtement de sol	Ragréage	P585	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °585 - 1	002KN 00018 9-3 n °585 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1274	Revêtement de sol	Ragréage	P586	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °586 - 1	002KN 00018 9-3 n °586	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Marron Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1277	Revêtement de sol	Ragréage	P587	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °587 - 1	002KN 00018 9-3 n °587 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1277	Revêtement de sol	Ragréage	P587	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °587 - 1	002KN 00018 9-3 n °587 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1269	Revêtement de sol	Ragréage	P588	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °588 - 1	002KN 00018 9-3 n °588 Phase 1	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 362	Revêtement de sol	Ragréage	S1476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P588		002KN 00018 9-3 n °588 - 1	002KN 00018 9-3 n °588 Phase 1	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1269	Revêtement de sol	Ragréage	P588	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °588 - 1	002KN 00018 9-3 n °588 Phase 3	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 362	Revêtement de sol	Ragréage	S1476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P588		002KN 00018 9-3 n °588 - 1	002KN 00018 9-3 n °588 Phase 3	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1266	Revêtement de sol	Ragréage	P589	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9-3 n °589 Phase 1	Revêtement Fibreux Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1256	Revêtement de sol	Ragréage	S1477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P589			002KN00018 9-3 n °589 Phase 1	Revêtement Fibreux Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1255	Revêtement de sol	Ragréage	S1482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P589			002KN00018 9-3 n °589 Phase 1	Revêtement Fibreux Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1256 - Vol 1255	Revêtement de sol	Ragréage	S1477 - S1482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P589			002KN00018 9-3 n °589 Phase 1	Revêtement Fibreux Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1266	Revêtement de sol	Ragréage	P589	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °589 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1256	Revêtement de sol	Ragréage	S1477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P589			002KN00018 9-3 n °589 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1255	Revêtement de sol	Ragréage	S1482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P589			002KN 00018 9-3 n °589 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1256 - Vol 1255	Revêtement de sol	Ragréage	S1477 - S1482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P589			002KN 00018 9-3 n °589 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1265	Revêtement de sol	Ragréage	P590	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9-3 n °590 Phase 1	Revêtement Semi-dur Vert Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1265	Revêtement de sol	Ragréage	P590	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9-3 n °590 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1284	Revêtement de sol	Ragréage	P591	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °591 - 1	002KN 00018 9-3 n °591 Phase 1	Revêtement Semi-dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1284	Revêtement de sol	Ragréage	P591	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °591 - 1	002KN 00018 9-3 n °591 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1283	Revêtement de sol	Ragréage	P592	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °592 - 1	002KN 00018 9-3 n °592	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1281	Revêtement de sol	Ragréage	P593	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °593 - 1	002KN 00018 9-3 n °593	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1250	Revêtement de sol	Ragréage	S1483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P593		002KN 00018 9-3 n °593 - 1	002KN 00018 9-3 n °593	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1245	Revêtement de sol	Ragréage	S1484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P593		002KN 00018 9-3 n °593 - 1	002KN 00018 9-3 n °593	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1250 - Vol 1245	Revêtement de sol	Ragréage	S1483 - S1484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P593		002KN 00018 9-3 n °593 - 1	002KN 00018 9-3 n °593	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1252	Revêtement de sol	Ragréage	P594	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °594 - 1	002KN 00018 9-3 n °594 Phase 1	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Blanc Bleu Matériau Effritable Orange Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1252	Revêtement de sol	Ragréage	P594	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °594 - 1	002KN 00018 9-3 n °594 Phase 5	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1251	Revêtement de sol	Ragréage	P595	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °595 - 1	002KN 00018 9-3 n °595	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1258	Revêtement de sol	Ragréage	P596	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °596 - 1	002KN 00018 9-3 n °596	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1261	Revêtement de sol	Ragréage	S1485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P596		002KN 00018 9-3 n °596 - 1	002KN 00018 9-3 n °596	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1257	Revêtement de sol	Ragréage	S1486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P596		002KN 00018 9-3 n °596 - 1	002KN 00018 9-3 n °596	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1261 - Vol 1257	Revêtement de sol	Ragréage	S1485 - S1486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P596		002KN 00018 9-3 n °596 - 1	002KN 00018 9-3 n °596	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1259	Revêtement de sol	Ragréage	P597	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °597 - 1	002KN 00018 9-3 n °597	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Fibres Souple Fibreux Blanc Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1260	Revêtement de sol	Ragréage	S1487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P597		002KN 00018 9-3 n °597 - 1	002KN 00018 9-3 n °597	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Fibres Souple Fibreux Blanc Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1244	Revêtement de sol	Ragréage	P598	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9-3 n °598 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1244	Revêtement de sol	Ragréage	P598	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9-3 n °598 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1243	Revêtement de sol	Ragréage	P599	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °599 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1243	Revêtement de sol	Ragréage	P599	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °599 Phase 3	Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1243	Revêtement de sol	Ragréage	P599	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °599 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1248	Revêtement de sol	Ragréage	P600	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °600 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Orange Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1248	Revêtement de sol	Ragréage	P600	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °600 Phase 5	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Rose Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1272	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1488	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9-3 n °601 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérageRevêtement récent (changé par Mr LASSE, présent à ce jour par décapage et nouveaux ragréage)

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1273	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1489	Réalisation d'un sondage		002KN 00018 9-3 n °601 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérageRevêtement récent (changé par Mr LASSE, présent à ce jour par décapage et nouveaux ragréage)
Plan R+6	Vol 1289	Revêtement de sol	Ragréage	P601	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °601 - 1	002KN 00018 9-3 n °601	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1290	Revêtement de sol	Ragréage	P602	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °602 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °602 - 2	002KN 00018 9-3 n °602 Phase 1	Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1290	Revêtement de sol	Ragréage	P602	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °602 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °602 - 2	002KN 00018 9-3 n °602 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1290	Revêtement de sol	Ragréage	P602	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °602 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °602 - 2	002KN 00018 9-3 n °602 Phase 4	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1375	Revêtement de sol	Ragréage	P603	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °603 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °603 - 2	002KN 00018 9-3 n °603 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1307	Revêtement de sol	Ragréage	S1491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P603		002KN 00018 9-3 n °603 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °603 - 2	002KN 00018 9-3 n °603 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1375	Revêtement de sol	Ragréage	P603	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °603 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °603 - 2	002KN 00018 9-3 n °603 Phase 3	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Marron Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1307	Revêtement de sol	Ragréage	S1491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P603		002KN 00018 9-3 n °603 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °603 - 2	002KN 00018 9-3 n °603 Phase 3	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Marron Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1306	Revêtement de sol	Ragréage	P604	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °604 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °604 - 2	002KN 00018 9-3 n °604	Colle Souple Fibreux Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1305	Revêtement de sol	Ragréage	P605	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °605 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °605 - 2	002KN 00018 9-3 n °605	Ragréage Effritable Gris Béton Dur Gris Colle Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1304	Revêtement de sol	Ragréage	P606	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °606 - 1	002KN 00018 9-3 n °606 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1304	Revêtement de sol	Ragréage	P606	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °606 - 1	002KN 00018 9-3 n °606 Phase 3	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1303	Revêtement de sol	Ragréage	P607	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °607 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °607 - 2	002KN 00018 9-3 n °607 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1303	Revêtement de sol	Ragréage	P607	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °607 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °607 - 2	002KN 00018 9-3 n °607 Phase 4	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1303	Revêtement de sol	Ragréage	P607	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °607 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °607 - 2	002KN 00018 9-3 n °607 Phase 5	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1291	Revêtement de sol	Ragréage	P613	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °613 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °613 - 2	002KN 00018 9-3 n °613	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1293	Revêtement de sol	Ragréage	P614	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °614 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °614 - 2	002KN 00018 9-3 n °614 Phase 1	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1293	Revêtement de sol	Ragréage	P614	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °614 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °614 - 2	002KN 00018 9-3 n °614 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1294	Revêtement de sol	Ragréage	P615	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °615 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °615 - 2	002KN 00018 9-3 n °615 Phase 1	Revêtement Semi-dur Noir Peinture Effritable Rose Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1294	Revêtement de sol	Ragréage	P615	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °615 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °615 - 2	002KN 00018 9-3 n °615 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1295	Revêtement de sol	Ragréage	P616	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °616 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °616 - 2	002KN 00018 9-3 n °616 Phase 1	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1295	Revêtement de sol	Ragréage	P616	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °616 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °616 - 2	002KN 00018 9-3 n °616 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1296	Revêtement de sol	Ragréage	P617	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °617 - 1	002KN 00018 9-3 n °617 Phase 1	Peinture Effritable Gris Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1296	Revêtement de sol	Ragréage	P617	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °617 - 1	002KN 00018 9-3 n °617 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1297	Revêtement de sol	Ragréage	P618	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °618 - 1	002KN 00018 9-3 n °618 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Revêtement Semi-dur Vert Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1297	Revêtement de sol	Ragréage	P618	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °618 - 1	002KN 00018 9-3 n °618 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1377	Revêtement de sol	Ragréage	P619	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1299	Revêtement de sol	Ragréage	S1493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1298	Revêtement de sol	Ragréage	S1494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1300	Revêtement de sol	Ragréage	S1495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1301	Revêtement de sol	Ragréage	S1496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1335	Revêtement de sol	Ragréage	S1497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1334	Revêtement de sol	Ragréage	S1498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1332	Revêtement de sol	Ragréage	S1499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1333	Revêtement de sol	Ragréage	S1500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1331	Revêtement de sol	Ragréage	S1501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1330	Revêtement de sol	Ragréage	S1502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1341	Revêtement de sol	Ragréage	S1503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1299 - Vol 1298 - Vol 1300 - Vol 1301 - Vol 1335 - Vol 1334 - Vol 1332 - Vol 1333 - Vol 1331 - Vol 1330 - Vol 1341	Revêtement de sol	Ragréage	S1493 - S1494 - S1495 - S1496 - S1497 - S1498 - S1499 - S1500 - S1501 - S1502 - S1503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P619		002KN 00018 9-3 n °619 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °619 - 2	002KN 00018 9-3 n °619	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1300	Revêtement de sol	Ragréage	P623	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °623 - 1	002KN 00018 9-3 n °623 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1300	Revêtement de sol	Ragréage	P623	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °623 - 1	002KN 00018 9-3 n °623 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1325	Revêtement de sol	Ragréage	P624	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °624 - 1	002KN 00018 9-3 n °624 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Beige Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1325	Revêtement de sol	Ragréage	P624	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °624 - 1	002KN 00018 9-3 n °624 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1337	Revêtement de sol	Ragréage	P625	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °625 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °625 - 2	002KN 00018 9-3 n °625	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1342	Revêtement de sol	Ragréage	S1504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P625		002KN 00018 9-3 n °625 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °625 - 2	002KN 00018 9-3 n °625	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1343	Revêtement de sol	Ragréage	S1505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P625		002KN 00018 9-3 n °625 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °625 - 2	002KN 00018 9-3 n °625	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1341	Revêtement de sol	Ragréage	S1506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P625		002KN 00018 9-3 n °625 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °625 - 2	002KN 00018 9-3 n °625	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1338	Revêtement de sol	Ragréage	S1507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P625		002KN 00018 9-3 n °625 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °625 - 2	002KN 00018 9-3 n °625	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1336	Revêtement de sol	Ragréage	S1508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P625		002KN 00018 9-3 n °625 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °625 - 2	002KN 00018 9-3 n °625	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1342 - Vol 1343 - Vol 1341 - Vol 1338 - Vol 1336	Revêtement de sol	Ragréage	S1504 - S1505 - S1506 - S1507 - S1508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P625		002KN 00018 9-3 n °625 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °625 - 2	002KN 00018 9-3 n °625	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1321	Revêtement de sol	Ragréage	P626	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °626 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °626 - 2	002KN 00018 9-3 n °626	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1323	Revêtement de sol	Ragréage	P627	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °627 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °627 - 2	002KN 00018 9-3 n °627	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1324	Revêtement de sol	Ragréage	S1509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P627		002KN 00018 9-3 n °627 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °627 - 2	002KN 00018 9-3 n °627	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1320	Revêtement de sol	Ragréage	P628	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °628 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °628 - 2	002KN 00018 9-3 n °628 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1320	Revêtement de sol	Ragréage	P628	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °628 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °628 - 2	002KN 00018 9-3 n °628 Phase 3	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1309	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P630	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °630 - 1	002KN 00018 9-3 n °630 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1310	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S1517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P630		002KN 00018 9-3 n °630 - 1	002KN 00018 9-3 n °630 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1309	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P630	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °630 - 1	002KN 00018 9-3 n °630 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1310	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S1517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P630		002KN 00018 9-3 n °630 - 1	002KN 00018 9-3 n °630 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1172	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P631	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °631 - 1	002KN 00018 9-3 n °631	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1171	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P632	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °632 - 1	002KN 00018 9-3 n °632 Phase 1	Colle Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1171	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P632	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °632 - 1	002KN 00018 9-3 n °632 Phase 2	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1170	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P633	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °633 - 1	002KN 00018 9-3 n °633 Phase 1	Colle Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1170	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P633	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °633 - 1	002KN 00018 9-3 n °633 Phase 2	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1169	Revêtement de sol	Ragréage	P635	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °635 - 1	002KN 00018 9-3 n °635	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1164 (C516)	Revêtement de sol	Ragréage	P636	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °636 - 1	002KN 00018 9-3 n °636 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1166	Revêtement de sol	Ragréage	S1518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P636		002KN 00018 9-3 n °636 - 1	002KN 00018 9-3 n °636 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1164 (C516)	Revêtement de sol	Ragréage	P636	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °636 - 1	002KN 00018 9-3 n °636 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1166	Revêtement de sol	Ragréage	S1518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P636		002KN 00018 9-3 n °636 - 1	002KN 00018 9-3 n °636 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1166	Revêtement de sol	Ragréage	P637	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °637 - 1	002KN 00018 9-3 n °637	Peinture Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1379	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P638	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °638 - 1	002KN 00018 9-3 n °638	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1168	Revêtement de sol	Ragréage	P639	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °639 - 1	002KN 00018 9-3 n °639	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1167	Revêtement de sol	Ragréage	S1519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P639		002KN 00018 9-3 n °639 - 1	002KN 00018 9-3 n °639	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1202	Revêtement de sol	Ragréage	P641	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °641 - 1	002KN 00018 9-3 n °641 Phase 1	Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1202	Revêtement de sol	Ragréage	P641	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °641 - 1	002KN 00018 9-3 n °641 Phase 3	Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1212	Revêtement de sol	Ragréage	P642	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °642 - 1	002KN 00018 9-3 n °642	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1380	Revêtement de sol	Ragréage	S1520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P642		002KN 00018 9-3 n °642 - 1	002KN 00018 9-3 n °642	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1231	Revêtement de sol	Ragréage	P645	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °645 - 1	002KN 00018 9-3 n °645 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Beige Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1231	Revêtement de sol	Ragréage	P645	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °645 - 1	002KN 00018 9-3 n °645 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1232	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P646	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °646 - 1	002KN 00018 9-3 n °646	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1225	Revêtement de sol	Ragréage	P649	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °649 - 1	002KN 00018 9-3 n °649	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1224	Revêtement de sol	Ragréage	P650	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °650 - 1	002KN 00018 9-3 n °650	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1223	Revêtement de sol	Ragréage	S1522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P650		002KN 00018 9-3 n °650 - 1	002KN 00018 9-3 n °650	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1222	Revêtement de sol	Ragréage	S1523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P650		002KN 00018 9-3 n °650 - 1	002KN 00018 9-3 n °650	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1221	Revêtement de sol	Ragréage	S1524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P650		002KN 00018 9-3 n °650 - 1	002KN 00018 9-3 n °650	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1223 - Vol 1222 - Vol 1221	Revêtement de sol	Ragréage	S1522 - S1523 - S1524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P650		002KN 00018 9-3 n °650 - 1	002KN 00018 9-3 n °650	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1382	Revêtement de sol	Ragréage	P651	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °651 - 1	002KN 00018 9-3 n °651	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Souple Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1383	Revêtement de sol	Ragréage	P652	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °652 - 1	002KN 00018 9-3 n °652 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1383	Revêtement de sol	Ragréage	P652	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °652 - 1	002KN 00018 9-3 n °652 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1215	Revêtement de sol	Ragréage	P653	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °653 - 1	002KN 00018 9-3 n °653 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Translucide Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1215	Revêtement de sol	Ragréage	P653	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °653 - 1	002KN 00018 9-3 n °653 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1381	Revêtement de sol	Ragréage	P654	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °654 - 1	002KN 00018 9-3 n °654 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1393	Revêtement de sol	Ragréage	S1791	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P654		002KN 00018 9-3 n °654 - 1	002KN 00018 9-3 n °654 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1381	Revêtement de sol	Ragréage	P654	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °654 - 1	002KN 00018 9-3 n °654 Phase 3	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1393	Revêtement de sol	Ragréage	S1791	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P654		002KN 00018 9-3 n °654 - 1	002KN 00018 9-3 n °654 Phase 3	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1213	Revêtement de sol	Ragréage	P655	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °655 - 1	002KN 00018 9-3 n °655 Phase 1	Peinture Effritable Beige Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1213	Revêtement de sol	Ragréage	P655	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °655 - 1	002KN 00018 9-3 n °655 Phase 4	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1213	Revêtement de sol	Ragréage	P655	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °655 - 1	002KN 00018 9-3 n °655 Phase 6	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1146 (B520b)	Revêtement de sol	Ragréage	P656	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °656 - 1	002KN 00018 9-3 n °656 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1147	Revêtement de sol	Ragréage	S1529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P656		002KN 00018 9-3 n °656 - 1	002KN 00018 9-3 n °656 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1142	Revêtement de sol	Ragréage	S1530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P656		002KN 00018 9-3 n °656 - 1	002KN 00018 9-3 n °656 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1147 - Vol 1142	Revêtement de sol	Ragréage	S1529 - S1530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P656		002KN 00018 9-3 n °656 - 1	002KN 00018 9-3 n °656 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1146 (B520b)	Revêtement de sol	Ragréage	P656	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °656 - 1	002KN 00018 9-3 n °656 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1147	Revêtement de sol	Ragréage	S1529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P656		002KN 00018 9-3 n °656 - 1	002KN 00018 9-3 n °656 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1142	Revêtement de sol	Ragréage	S1530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P656		002KN 00018 9-3 n °656 - 1	002KN 00018 9-3 n °656 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1147 - Vol 1142	Revêtement de sol	Ragréage	S1529 - S1530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P656		002KN 00018 9-3 n °656 - 1	002KN 00018 9-3 n °656 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1140	Revêtement de sol	Ragréage	P657	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °657 - 1	002KN 00018 9-3 n °657 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1140	Revêtement de sol	Ragréage	P657	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °657 - 1	002KN 00018 9-3 n °657 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1138	Revêtement de sol	Ragréage	P658	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °658 - 1	002KN 00018 9-3 n °658 Phase 1	Matériau Effritable Translucide Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu Toile Souple Fibreux Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1139	Revêtement de sol	Ragréage	S1531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P658		002KN 00018 9-3 n °658 - 1	002KN 00018 9-3 n °658 Phase 1	Matériau Effritable Translucide Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu Toile Souple Fibreux Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1132	Revêtement de sol	Ragréage	S1532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P658		002KN 00018 9-3 n °658 - 1	002KN 00018 9-3 n °658 Phase 1	Matériau Effritable Translucide Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu Toile Souple Fibreux Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1131	Revêtement de sol	Ragréage	S1533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P658		002KN 00018 9-3 n °658 - 1	002KN 00018 9-3 n °658 Phase 1	Matériau Effritable Translucide Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu Toile Souple Fibreux Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1139 - Vol 1132 - Vol 1131	Revêtement de sol	Ragréage	S1531 - S1532 - S1533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P658		002KN 00018 9-3 n °658 - 1	002KN 00018 9-3 n °658 Phase 1	Matériau Effritable Translucide Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu Toile Souple Fibreux Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1138	Revêtement de sol	Ragréage	P658	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °658 - 1	002KN 00018 9-3 n °658 Phase 4	Colle Souple Jaune Matériau Semi-dur Gris Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1139	Revêtement de sol	Ragréage	S1531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P658		002KN 00018 9-3 n °658 - 1	002KN 00018 9-3 n °658 Phase 4	Colle Souple Jaune Matériau Semi-dur Gris Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1132	Revêtement de sol	Ragréage	S1532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P658		002KN 00018 9-3 n °658 - 1	002KN 00018 9-3 n °658 Phase 4	Colle Souple Jaune Matériau Semi-dur Gris Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1131	Revêtement de sol	Ragréage	S1533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P658		002KN 00018 9-3 n °658 - 1	002KN 00018 9-3 n °658 Phase 4	Colle Souple Jaune Matériau Semi-dur Gris Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1139 - Vol 1132 - Vol 1131	Revêtement de sol	Ragréage	S1531 - S1532 - S1533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P658		002KN 00018 9-3 n °658 - 1	002KN 00018 9-3 n °658 Phase 4	Colle Souple Jaune Matériau Semi-dur Gris Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1137	Revêtement de sol	Ragréage	P660	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °660 - 1	002KN 00018 9-3 n °660 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige Toile Souple Fibreux Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1143	Revêtement de sol	Ragréage	S1537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P660		002KN 00018 9-3 n °660 - 1	002KN 00018 9-3 n °660 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige Toile Souple Fibreux Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1137	Revêtement de sol	Ragréage	P660	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °660 - 1	002KN 00018 9-3 n °660 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1143	Revêtement de sol	Ragréage	S1537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P660		002KN 00018 9-3 n °660 - 1	002KN 00018 9-3 n °660 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1127	Revêtement de sol	Ragréage	P661	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °661 - 1	002KN 00018 9-3 n °661 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1127	Revêtement de sol	Ragréage	P661	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °661 - 1	002KN 00018 9-3 n °661 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1127	Revêtement de sol	Ragréage	P661	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °661 - 1	002KN 00018 9-3 n °661 Phase 6	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1128 (B513)	Revêtement de sol	Ragréage	P662	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °662 - 1	002KN 00018 9-3 n °662 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1134	Revêtement de sol	Ragréage	S1792	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P662		002KN 00018 9-3 n °662 - 1	002KN 00018 9-3 n °662 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1135	Revêtement de sol	Ragréage	S1793	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P662		002KN 00018 9-3 n °662 - 1	002KN 00018 9-3 n °662 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1136	Revêtement de sol	Ragréage	S1794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P662		002KN 00018 9-3 n °662 - 1	002KN 00018 9-3 n °662 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1134 - Vol 1135 - Vol 1136	Revêtement de sol	Ragréage	S1792 - S1793 - S1794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P662		002KN 00018 9-3 n °662 - 1	002KN 00018 9-3 n °662 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1128 (B513)	Revêtement de sol	Ragréage	P662	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °662 - 1	002KN 00018 9-3 n °662 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1134	Revêtement de sol	Ragréage	S1792	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P662		002KN 00018 9-3 n °662 - 1	002KN 00018 9-3 n °662 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1135	Revêtement de sol	Ragréage	S1793	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P662		002KN 00018 9-3 n °662 - 1	002KN 00018 9-3 n °662 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1136	Revêtement de sol	Ragréage	S1794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P662		002KN 00018 9-3 n °662 - 1	002KN 00018 9-3 n °662 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1134 - Vol 1135 - Vol 1136	Revêtement de sol	Ragréage	S1792 - S1793 - S1794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P662		002KN 00018 9-3 n °662 - 1	002KN 00018 9-3 n °662 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1123 (B505)	Revêtement de sol	Ragréage	P665	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °665 - 1	002KN 00018 9-3 n °665	Peinture Effritable Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1156	Revêtement de sol	Ragréage	P667	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °667 - 2	002KN 00018 9-3 n °667 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1156	Revêtement de sol	Ragréage	P667	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °667 - 2	002KN 00018 9-3 n °667 Phase 2	Peinture Effritable Multicolore Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1184	Revêtement de sol	Ragréage	P668	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9-3 n °668 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1185	Revêtement de sol	Ragréage	S1548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P668			002KN00018 9-3 n °668 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1184	Revêtement de sol	Ragréage	P668	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °668 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1185	Revêtement de sol	Ragréage	S1548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P668			002KN00018 9-3 n °668 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1183	Revêtement de sol	Ragréage	P669	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °669 Phase 1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1183	Revêtement de sol	Ragréage	P669	Réalisation d'un prélevement			002KN00018 9-3 n °669 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1194	Revêtement de sol	Ragréage	P671	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °671 - 1	002KN00018 9-3 n °671	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1350	Revêtement de sol	Chape maigre	P676	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °676 - 1	002KN00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1356	Revêtement de sol	Chape maigre	S1562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN00018 9-3 n °676 - 1	002KN00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1384	Revêtement de sol	Chape maigre	S1573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1385	Revêtement de sol	Chape maigre	S1574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 798	Revêtement de sol	Chape maigre	S1571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 824	Revêtement de sol	Chape maigre	S1572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 854	Revêtement de sol	Chape maigre	S1569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 850	Revêtement de sol	Chape maigre	S1570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 972	Revêtement de sol	Chape maigre	S1567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 975	Revêtement de sol	Chape maigre	S1568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1069	Revêtement de sol	Chape maigre	S1565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1111	Revêtement de sol	Chape maigre	S1566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1201	Revêtement de sol	Chape maigre	S1563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1227	Revêtement de sol	Chape maigre	S1564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1384 - Vol 1385	Revêtement de sol	Chape maigre	S1573 - S1574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 798 - Vol 824	Revêtement de sol	Chape maigre	S1571 - S1572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 854 - Vol 850	Revêtement de sol	Chape maigre	S1569 - S1570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 972 - Vol 975	Revêtement de sol	Chape maigre	S1567 - S1568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1069 - Vol 1111	Revêtement de sol	Chape maigre	S1565 - S1566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1201 - Vol 1227	Revêtement de sol	Chape maigre	S1563 - S1564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P676		002KN 00018 9-3 n °676 - 1	002KN 00018 9-3 n °676	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1344	Revêtement de sol	Chape maigre	P682	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1345	Revêtement de sol	Chape maigre	S1625	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1387	Revêtement de sol	Chape maigre	S1636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1388	Revêtement de sol	Chape maigre	S1637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 812	Revêtement de sol	Chape maigre	S1634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 838	Revêtement de sol	Chape maigre	S1635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 844	Revêtement de sol	Chape maigre	S1632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1386	Revêtement de sol	Chape maigre	S1633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 985	Revêtement de sol	Chape maigre	S1630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 986	Revêtement de sol	Chape maigre	S1631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1085	Revêtement de sol	Chape maigre	S1628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1097	Revêtement de sol	Chape maigre	S1629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1211	Revêtement de sol	Chape maigre	S1626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1214	Revêtement de sol	Chape maigre	S1627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1387 - Vol 1388	Revêtement de sol	Chape maigre	S1636 - S1637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 812 - Vol 838	Revêtement de sol	Chape maigre	S1634 - S1635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 844 - Vol 1386	Revêtement de sol	Chape maigre	S1632 - S1633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 985 - Vol 986	Revêtement de sol	Chape maigre	S1630 - S1631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1085 - Vol 1097	Revêtement de sol	Chape maigre	S1628 - S1629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1211 - Vol 1214	Revêtement de sol	Chape maigre	S1626 - S1627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P682		002KN 00018 9-3 n °682 - 1	002KN 00018 9-3 n °682	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1308	Revêtement de sol	Ragréage	P686	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °686 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °686 - 2	002KN 00018 9-3 n °686	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 355	Revêtement de sol	Ragréage	S1667	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P686		002KN 00018 9-3 n °686 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °686 - 2	002KN 00018 9-3 n °686	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 777	Revêtement de sol	Ragréage	S1666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P686		002KN 00018 9-3 n °686 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °686 - 2	002KN 00018 9-3 n °686	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 889	Revêtement de sol	Ragréage	S1665	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P686		002KN 00018 9-3 n °686 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °686 - 2	002KN 00018 9-3 n °686	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 951	Revêtement de sol	Ragréage	S1664	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P686		002KN 00018 9-3 n °686 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °686 - 2	002KN 00018 9-3 n °686	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1037	Revêtement de sol	Ragréage	S1663	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P686		002KN 00018 9-3 n °686 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °686 - 2	002KN 00018 9-3 n °686	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1145	Revêtement de sol	Ragréage	S1662	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P686		002KN 00018 9-3 n °686 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °686 - 2	002KN 00018 9-3 n °686	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1308	Revêtement de sol	Ragréage	P687	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °687 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °687 - 2	002KN 00018 9-3 n °687	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 355	Revêtement de sol	Ragréage	S1673	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P687		002KN 00018 9-3 n °687 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °687 - 2	002KN 00018 9-3 n °687	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 777	Revêtement de sol	Ragréage	S1672	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P687		002KN 00018 9-3 n °687 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °687 - 2	002KN 00018 9-3 n °687	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 889	Revêtement de sol	Ragréage	S1671	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P687		002KN 00018 9-3 n °687 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °687 - 2	002KN 00018 9-3 n °687	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 951	Revêtement de sol	Ragréage	S1670	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P687		002KN 00018 9-3 n °687 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °687 - 2	002KN 00018 9-3 n °687	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1037	Revêtement de sol	Ragréage	S1669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P687		002KN 00018 9-3 n °687 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °687 - 2	002KN 00018 9-3 n °687	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1145	Revêtement de sol	Ragréage	S1668	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P687		002KN 00018 9-3 n °687 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °687 - 2	002KN 00018 9-3 n °687	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 580	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P696	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °696 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °696 - 2	002KN 00018 9-3 n °696	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 710	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P696		002KN 00018 9-3 n °696 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °696 - 2	002KN 00018 9-3 n °696	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 313	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1729	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P696		002KN 00018 9-3 n °696 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °696 - 2	002KN 00018 9-3 n °696	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 907	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1728	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P696		002KN 00018 9-3 n °696 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °696 - 2	002KN 00018 9-3 n °696	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 460	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1727	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P696		002KN 00018 9-3 n °696 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °696 - 2	002KN 00018 9-3 n °696	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1390	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P696		002KN 00018 9-3 n °696 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °696 - 2	002KN 00018 9-3 n °696	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1389	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1725	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P696		002KN 00018 9-3 n °696 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °696 - 2	002KN 00018 9-3 n °696	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 353 (Palier et escalier)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P704	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °704 - 1 - 002KN 00018 9-3 n °704 - 2	002KN 00018 9-3 n °704	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 116	Revêtement de sol	Chape maigre	P707	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °707 - 1	002KN 00018 9-3 n °707	Peinture Effritable Rouge Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 116	Revêtement de sol	Chape maigre	P708	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °708 - 1	002KN 00018 9-3 n °708	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 129	Revêtement de sol	Chape maigre	P711	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °711 - 1	002KN 00018 9-3 n °711	Matériau Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 242	Revêtement de sol	Chape maigre	P716	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °716 - 1	002KN 00018 9-3 n °716	Ciment Dur Gris Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 75	Revêtement de sol	Chape maigre	S1746	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P716		002KN 00018 9-3 n °716 - 1	002KN 00018 9-3 n °716	Ciment Dur Gris Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1162	Revêtement de sol	Ragréage	P717	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °717 - 1	002KN 00018 9-3 n °717 Phase 1	Peinture Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1162	Revêtement de sol	Ragréage	P717	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °717 - 1	002KN 00018 9-3 n °717 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1158	Revêtement de sol	Ragréage	P718	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °718 - 1	002KN 00018 9-3 n °718 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Revêtement Semi-dur Noir Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1157	Revêtement de sol	Ragréage	S1747	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P718		002KN 00018 9-3 n °718 - 1	002KN 00018 9-3 n °718 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Revêtement Semi-dur Noir Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1159	Revêtement de sol	Ragréage	S1748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P718		002KN 00018 9-3 n °718 - 1	002KN 00018 9-3 n °718 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Revêtement Semi-dur Noir Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1157 - Vol 1159	Revêtement de sol	Ragréage	S1747 - S1748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P718		002KN 00018 9-3 n °718 - 1	002KN 00018 9-3 n °718 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Revêtement Semi-dur Noir Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1158	Revêtement de sol	Ragréage	P718	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °718 - 1	002KN 00018 9-3 n °718 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1157	Revêtement de sol	Ragréage	S1747	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P718		002KN 00018 9-3 n °718 - 1	002KN 00018 9-3 n °718 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1159	Revêtement de sol	Ragréage	S1748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P718		002KN 00018 9-3 n °718 - 1	002KN 00018 9-3 n °718 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1157 - Vol 1159	Revêtement de sol	Ragréage	S1747 - S1748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P718		002KN 00018 9-3 n °718 - 1	002KN 00018 9-3 n °718 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1196	Revêtement de sol	Ragréage	P719	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °719 - 1	002KN 00018 9-3 n °719 Phase 1	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1196	Revêtement de sol	Ragréage	P719	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °719 - 1	002KN 00018 9-3 n °719 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1197	Revêtement de sol	Ragréage	P720	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °720 - 1	002KN 00018 9-3 n °720 Phase 1	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1197	Revêtement de sol	Ragréage	P720	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °720 - 1	002KN 00018 9-3 n °720 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1198	Revêtement de sol	Ragréage	P721	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °721 - 1	002KN 00018 9-3 n °721 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1198	Revêtement de sol	Ragréage	P721	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °721 - 1	002KN 00018 9-3 n °721 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1199	Revêtement de sol	Ragréage	P722	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °722 - 1	002KN 00018 9-3 n °722 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1199	Revêtement de sol	Ragréage	P722	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °722 - 1	002KN 00018 9-3 n °722 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1188	Revêtement de sol	Ragréage	P723	Réalisation d'un prélevement	Sous nouveau revetement , surépaisseur visible	002KN00018 9-3 n °723 - 1	002KN00018 9-3 n °723	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1187	Revêtement de sol	Ragréage	S1749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P723	Sous nouveau revetement , surépaisseur visible	002KN00018 9-3 n °723 - 1	002KN00018 9-3 n °723	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1189	Revêtement de sol	Ragréage	S1750	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P723	Sous nouveau revetement , surépaisseur visible	002KN00018 9-3 n °723 - 1	002KN00018 9-3 n °723	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1190	Revêtement de sol	Ragréage	S1751	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P723	Sous nouveau revetement , surépaisseur visible	002KN00018 9-3 n °723 - 1	002KN00018 9-3 n °723	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1187 - Vol 1189 - Vol 1190	Revêtement de sol	Ragréage	S1749 - S1750 - S1751	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P723	Sous nouveau revetement , surépaisseur visible	002KN00018 9-3 n °723 - 1	002KN00018 9-3 n °723	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 981	Revêtement de sol	Ragréage	P724	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 983	Revêtement de sol	Ragréage	S1752	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 979	Revêtement de sol	Ragréage	S1753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 977	Revêtement de sol	Ragréage	S1754	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 976	Revêtement de sol	Ragréage	S1755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 978	Revêtement de sol	Ragréage	S1756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 980	Revêtement de sol	Ragréage	S1757	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 982	Revêtement de sol	Ragréage	S1758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 983 - Vol 979 - Vol 977 - Vol 976 - Vol 978 - Vol 980 - Vol 982	Revêtement de sol	Ragréage	S1752 - S1753 - S1754 - S1755 - S1756 - S1757 - S1758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 981	Revêtement de sol	Ragréage	P724	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 3	Ragréage Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 983	Revêtement de sol	Ragréage	S1752	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 3	Ragréage Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 979	Revêtement de sol	Ragréage	S1753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 3	Ragréage Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 977	Revêtement de sol	Ragréage	S1754	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 3	Ragréage Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 976	Revêtement de sol	Ragréage	S1755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 3	Ragréage Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 978	Revêtement de sol	Ragréage	S1756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 3	Ragréage Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 980	Revêtement de sol	Ragréage	S1757	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 3	Ragréage Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 982	Revêtement de sol	Ragréage	S1758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 3	Ragréage Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 983 - Vol 979 - Vol 977 - Vol 976 - Vol 978 - Vol 980 - Vol 982	Revêtement de sol	Ragréage	S1752 - S1753 - S1754 - S1755 - S1756 - S1757 - S1758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P724		002KN 00018 9-3 n °724 - 1	002KN 00018 9-3 n °724 Phase 3	Ragréage Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1246	Revêtement de sol	Ragréage	S1777	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Info UPD, refait
Plan R+6	Vol 1247	Revêtement de sol	Ragréage	S1778	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Info UPD, refait

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1262	Revêtement de sol	Ragréage	S1779	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Info UPD, refait
Plan R+6	Vol 1267	Revêtement de sol	Ragréage	S1780	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Info UPD, refait
Plan R+5	Vol 1123 (B505)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P726	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-3 n°726 - 1	002KN000189-3 n°726 Phase 1	Colle Souple Marron Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1123 (B505)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P726	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-3 n°726 - 1	002KN000189-3 n°726 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 938	Revêtement de sol	Ragréage	P728	Réalisation d'un prélevement	Sous P504	002KN000189-3 n°728 - 1	002KN000189-3 n°728 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Gris Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 938	Revêtement de sol	Ragréage	P728	Réalisation d'un prélevement	Sous P504	002KN 00018 9-3 n °728 - 1	002KN 00018 9-3 n °728 Phase 4	Colle Souple Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 941	Revêtement de sol	Ragréage	P729	Réalisation d'un prélevement	Sous P534, lès vert sous lès bleu	002KN 00018 9-3 n °729 - 1	002KN 00018 9-3 n °729 Phase 1	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 941	Revêtement de sol	Ragréage	P729	Réalisation d'un prélevement	Sous P534, lès vert sous lès bleu	002KN 00018 9-3 n °729 - 1	002KN 00018 9-3 n °729 Phase 3	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 941	Revêtement de sol	Ragréage	P729	Réalisation d'un prélevement	Sous P534, lès vert sous lès bleu	002KN 00018 9-3 n °729 - 1	002KN 00018 9-3 n °729 Phase 5	Colle Souple Beige Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1369	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P730	Réalisation d'un prélevement	Sous P513	002KN 00018 9-3 n °730 - 1	002KN 00018 9-3 n °730 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1369	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P730	Réalisation d'un prélevement	Sous P513	002KN 00018 9-3 n °730 - 1	002KN 00018 9-3 n °730 Phase 4	Ragréage Effritable Gris Colle Souple Marron Ragréage Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1371	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P731	Réalisation d'un prélevement	Sous P514	002KN 00018 9-3 n °731 - 1	002KN 00018 9-3 n °731 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1371	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P731	Réalisation d'un prélevement	Sous P514	002KN 00018 9-3 n °731 - 1	002KN 00018 9-3 n °731 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 920 (B204)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P732	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °732 - 1	002KN 00018 9-3 n °732 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 920 (B204)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P732	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °732 - 1	002KN 00018 9-3 n °732 Phase 3	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Marron Colle Souple Marron Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1199	Revêtement de sol	Ragréage	P733	Réalisation d'un prélevement	2ème revetement , sous P722	002KN 00018 9-3 n °733 - 1	002KN 00018 9-3 n °733 Phase 1	Revêtement Semi-dur Bleu Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1199	Revêtement de sol	Ragréage	P733	Réalisation d'un prélevement	2ème revetement , sous P722	002KN 00018 9-3 n °733 - 1	002KN 00018 9-3 n °733 Phase 3	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1199	Revêtement de sol	Ragréage	P733	Réalisation d'un prélevement	2ème revetement , sous P722	002KN 00018 9-3 n °733 - 1	002KN 00018 9-3 n °733 Phase 5	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1392	Revêtement de sol	Ragréage	P734	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °734 - 1	002KN 00018 9-3 n °734 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Jaune Toile Souple Fibreux Blanc Tresse Souple Fibreux Bleu Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1392	Revêtement de sol	Ragréage	P734	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °734 - 1	002KN 00018 9-3 n °734 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1392	Revêtement de sol	Ragréage	P734	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °734 - 1	002KN 00018 9-3 n °734 Phase 6	Matériau Effritable Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1292	Revêtement de sol	Ragréage	P735	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °735 - 1	002KN 00018 9-3 n °735	Matériau Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1292	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P736	Réalisation d'un prélevement	Sous P735	002KN 00018 9-3 n °736 - 1	002KN 00018 9-3 n °736 Phase 1	Colle Souple Translucide Revêtement Semi-dur Orange Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1292	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P736	Réalisation d'un prélevement	Sous P735	002KN 00018 9-3 n °736 - 1	002KN 00018 9-3 n °736 Phase 4	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Bleu Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 790	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P737	Réalisation d'un prélevement	Sous P499		002KN 00018 9-3 n °737 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris Rouge Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 790	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P737	Réalisation d'un prélevement	Sous P499		002KN 00018 9-3 n °737 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 786	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P738	Réalisation d'un prélevement	Sous P434		002KN 00018 9-3 n °738	Peinture Effritable Blanc Bleu Revêtement Semi-dur Bleu Rouge Colle Souple Translucide Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 712	Revêtement de sol	Ragréage	P739	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9-3 n °739 Phase 1	Peinture Effritable Bleu Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 712	Revêtement de sol	Ragréage	P739	Réalisation d'un prélevement			002KN 00018 9-3 n °739 Phase 4	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1123 (B505)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P740	Réalisation d'un prélevement	Sous revetement visible		002KN 00018 9-3 n °740 Phase 1	Revêtement Souple Gris Beige Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1123 (B505)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P740	Réalisation d'un prélevement	Sous revetement visible		002KN 00018 9-3 n °740 Phase 4	Revêtement Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1123 (B505)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P740	Réalisation d'un prélevement	Sous revetement visible		002KN 00018 9-3 n °740 Phase 5	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1098	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P741	Réalisation d'un prélevement	Sous P561	002KN 00018 9-3 n °741 - 1	002KN 00018 9-3 n °741 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1098	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P741	Réalisation d'un prélevement	Sous P561	002KN 00018 9-3 n °741 - 1	002KN 00018 9-3 n °741 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1140	Revêtement de sol	Ragréage	P742	Réalisation d'un prélevement	Sous P667	002KN 00018 9-3 n °742 - 1	002KN 00018 9-3 n °742 Phase 1	Colle Souple Marron Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1140	Revêtement de sol	Ragréage	P742	Réalisation d'un prélevement	Sous P667	002KN 00018 9-3 n °742 - 1	002KN 00018 9-3 n °742 Phase 3	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1382	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P743	Réalisation d'un prélevement	Sous P651	002KN 00018 9-3 n °743 - 1	002KN 00018 9-3 n °743 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1382	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P743	Réalisation d'un prélevement	Sous P651	002KN 00018 9-3 n °743 - 1	002KN 00018 9-3 n °743 Phase 3	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1212	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P744	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °744 - 1	002KN 00018 9-3 n °744	Moquette Souple Fibreux Gris Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1070	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P746	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °746 - 1	002KN 00018 9-3 n °746 Phase 1	Matériau Effritable Beige Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1070	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P746	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °746 - 1	002KN 00018 9-3 n °746 Phase 3	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1286	Revêtement de sol	Ragréage	P747	Réalisation d'un prélevement	Sous 2ème lès	002KN 00018 9-3 n °747 - 1	002KN 00018 9-3 n °747 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1286	Revêtement de sol	Ragréage	P747	Réalisation d'un prélevement	Sous 2ème lès	002KN 00018 9-3 n °747 - 1	002KN 00018 9-3 n °747 Phase 2	Colle Souple Marron Matériau Effritable Orange Ragréage Effritable Gris Colle Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 694	Revêtement de sol	Ragréage	I21							Inaccessible le jour du prélèvement
Plan Rdc	Vol 1394 (Rampe entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre	P750	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °750 - 1	002KN 00018 9-4 n °750	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1395 (Rampe Sortie)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1804	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P750		002KN 00018 9-4 n °750 - 1	002KN 00018 9-4 n °750	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1394 (Rampe entrée)	Revêtement de sol	Joint	P751	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °751 - 1	002KN 00018 9-4 n °751	Matériau plâtreux gris en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1395 (Rampe Sortie)	Revêtement de sol	Joint	S1805	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P751		002KN 00018 9-4 n °751 - 1	002KN 00018 9-4 n °751	Matériau plâtreux gris en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1394 (Rampe entrée)	Revêtement de sol	Joint	P752	Réalisation d'un prélevement	Bordure trottoir	002KN 00018 9-4 n °752 - 1	002KN 00018 9-4 n °752	Matériau compact gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1394 (Rampe entrée)	Revêtement de sol	Joint	S1806	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P752	Bordure trottoir	002KN 00018 9-4 n °752 - 1	002KN 00018 9-4 n °752	Matériau compact gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1395 (Rampe Sortie)	Revêtement de sol	Joint	S1807	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P752	Bordure trottoir	002KN 00018 9-4 n °752 - 1	002KN 00018 9-4 n °752	Matériau compact gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1395 (Rampe Sortie)	Revêtement de sol	Joint	S1808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P752	Bordure trottoir	002KN 00018 9-4 n °752 - 1	002KN 00018 9-4 n °752	Matériau compact gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1394 (Rampe entrée) - Vol 1395 (Rampe Sortie)	Revêtement de sol	Joint	S1806 - S1807 - S1808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P752	Bordure trottoir	002KN 00018 9-4 n °752 - 1	002KN 00018 9-4 n °752	Matériau compact gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1394 (Rampe entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre	P753	Réalisation d'un prélevement	Reprise	002KN 00018 9-4 n °753 - 1	002KN 00018 9-4 n °753	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1394 (Rampe entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1801	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P753	Reprise	002KN 00018 9-4 n °753 - 1	002KN 00018 9-4 n °753	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1394 (Rampe entrée)	Revêtement de sol	Dalles	P754	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °754 - 1	002KN 00018 9-4 n °754	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1395 (Rampe Sortie)	Revêtement de sol	Dalles	S1809	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P754		002KN 00018 9-4 n °754 - 1	002KN 00018 9-4 n °754	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1395 (Rampe Sortie)	Revêtement de sol	Dalles	P755	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °755 - 1	002KN 00018 9-4 n °755	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1395 (Rampe Sortie)	Revêtement de sol	Chape maigre	P756	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °756 - 1	002KN 00018 9-4 n °756	Matériau compact en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1406	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P768	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °768 - 1	P768	Colle grise en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1407 (Esc P8)	Revêtement de sol	Chape maigre	P769	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °769 - 1 - 002KN00018 9-5 n °769 - 2	P769	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1408 (Livraison)	Revêtement de sol	Plancher	P770	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °770 - 1	P770	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 674	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P775	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °775 - 1 - 002KN00018 9-5 n °775 - 2	P775 Phase 1	Colle polymère incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 674	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P775	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°775 - 1 - 002KN000189-5 n°775 - 2	P775 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 674	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P775	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°775 - 1 - 002KN000189-5 n°775 - 2	P775 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 674	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P776	Réalisation d'un prélevement			P776	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Revêtement de sol	Parquet	I23			I23 - 1				Nécessite sondage destructif important

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I24		Pièces humides (SDB/WC)	I24 - 1				Nécessite sondage destructif important
Plan Rdc	Vol 691 (PMR009)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P783	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°783 - 1	P783	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 676 (PMRHC001)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2023	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P783		002KN000189-5 n°783 - 1	P783	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 265 (B000)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P784	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°784 - 1	P784 Phase 1	Revêtement cassant rouge avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 265 (B000)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P784	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°784 - 1	P784 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 262 (B004)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P786	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °786 - 1	P786 Phase 1	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 262 (B004)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P786	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °786 - 1	P786 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 159 (S/B106)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P788	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °788 - 1	P788 Phase 2	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 159 (S/B106)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P788	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °788 - 1	P788 Phase 3	Colle beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 89	Revêtement de sol	Chape maigre	P791	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °791 - 1	P791	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 128	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P793	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °793 - 1	P793 Phase 1	Revêtement cassant vert avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 128	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P793	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °793 - 1	P793 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 128	Revêtement de sol	Chape maigre	P796	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °796 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °796 - 2	P796	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 100	Revêtement de sol	Plancher	P797	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °797 - 1	P797	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1409 (Parvis)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P798	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °798 - 1	P798	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 197	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P800	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °800 - 1	P800 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 197	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P800	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °800 - 1	P800 Phase 2	Dalle dure cassante rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 198	Revêtement de sol	Chape maigre	P805	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °805 - 1	P805	Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 187	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P812	Réalisation d'un prélevement			P812 Phase 1	Revêtement cassant bleu avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 183	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2040	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P812			P812 Phase 1	Revêtement cassant bleu avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 187	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P812	Réalisation d'un prélevement			P812 Phase 2	Matériau souple beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 183	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2040	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P812			P812 Phase 2	Matériau souple beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1411	Revêtement de sol	Chape maigre	P813	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n °813 - 1	P813	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1412	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P819	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n °819 - 1 - 002KN000189-5 n °819 - 2	P819 Phase 1	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 813	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2042	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P819		002KN000189-5 n °819 - 1 - 002KN000189-5 n °819 - 2	P819 Phase 1	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1412	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P819	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n °819 - 1 - 002KN000189-5 n °819 - 2	P819 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 813	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2042	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P819		002KN000189-5 n °819 - 1 - 002KN000189-5 n °819 - 2	P819 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 1412	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P819	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °819 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °819 - 2	P819 Phase 3	Matériau mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 813	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2042	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P819		002KN 00018 9-5 n °819 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °819 - 2	P819 Phase 3	Matériau mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1413 (P142)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P820	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °820 - 1	P820 Phase 1	Revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1414 (P140)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2043	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P820		002KN 00018 9-5 n °820 - 1	P820 Phase 1	Revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1417 (C131)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2045	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P820		002KN 00018 9-5 n °820 - 1	P820 Phase 1	Revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 1414 (P140) - Vol 1417 (C131)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2043 - S2045	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P820		002KN 00018 9-5 n °820 - 1	P820 Phase 1	Revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1413 (P142)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P820	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °820 - 1	P820 Phase 2	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1414 (P140)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2043	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P820		002KN 00018 9-5 n °820 - 1	P820 Phase 2	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 1417 (C131)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2045	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P820		002KN 00018 9-5 n °820 - 1	P820 Phase 2	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1414 (P140) - Vol 1417 (C131)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2043 - S2045	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P820		002KN 00018 9-5 n °820 - 1	P820 Phase 2	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1415	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P821	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °821 - 1	P821 Phase 1	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1416 (C117)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2044	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P821		002KN 00018 9-5 n °821 - 1	P821 Phase 1	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 1415	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P821	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °821 - 1	P821 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1416 (C117)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2044	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P821		002KN00018 9-5 n °821 - 1	P821 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1419	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P826	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °826 - 1	P826	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1419	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2076	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P826		002KN00018 9-5 n °826 - 1	P826	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 738	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2062	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P826		002KN00018 9-5 n °826 - 1	P826	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1420	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P827	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °827 - 1	P827 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1420	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P827	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °827 - 1	P827 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1421 (THA8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P828	Réalisation d'un prélevement			P828	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1424 (TFA8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2047	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P828			P828	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 875	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2077	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P828			P828	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1424 (TFA8) - Vol 875	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2047 - S2077	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P828			P828	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 96	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P830	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °830 - 1	P830 Phase 1	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 96	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P830	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °830 - 1	P830 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 96	Revêtement de sol	Ragréage	P831	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °831 - 1	P831	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 82	Revêtement de sol	Plancher	P833	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °833 - 1	P833	Matériau compact rouge non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 83	Revêtement de sol	Plancher	S2048	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P833		002KN000189-5 n°833 - 1	P833	Matériau compact rouge non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 82	Revêtement de sol	Nez de marche	P834	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°834 - 1	P834	Matériau souple noir avec couche en papier + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1425 (C201)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P836	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°836 - 1	P836 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1425 (C201)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P836	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°836 - 1	P836 Phase 2	Revêtement cassant gris avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 909 (P202)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P837	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°837 - 1	P837 Phase 1	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 909 (P202)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P837	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °837 - 1	P837 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1427	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P838	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 1	Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 901	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2052	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 1	Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 902	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2053	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 1	Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 903	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2054	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 1	Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 901 - Vol 902 - Vol 903	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2052 - S2053 - S2054	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 1	Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1427	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P838	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 2	Revêtement cassant gris et rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 901	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2052	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 2	Revêtement cassant gris et rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 902	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2053	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 2	Revêtement cassant gris et rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 903	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2054	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 2	Revêtement cassant gris et rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 901 - Vol 902 - Vol 903	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2052 - S2053 - S2054	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 2	Revêtement cassant gris et rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1427	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P838	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 901	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2052	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 902	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2053	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 903	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2054	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 901 - Vol 902 - Vol 903	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S2052 - S2053 - S2054	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P838		002KN 00018 9-5 n °838 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °838 - 2	P838 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1427	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P839	Réalisation d'un prélevement			P839 Phase 1	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1427	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P839	Réalisation d'un prélevement			P839 Phase 2	Revêtement cassant rouge + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 792 (102)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P841	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 791 (102b)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2056	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 299 (P104 bis)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2057	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 304 (P114)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2058	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 794 (120)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2059	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 796 (133)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2060	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 795 (132)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2061	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 1430	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2063	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1431	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2064	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1432	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2072	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 791 (102b) - Vol 299 (P104 bis) - Vol 304 (P114) - Vol 794 (120) - Vol 796 (133) - Vol 795 (132) - Vol 1430 - Vol 1431 - Vol 1432	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2056 - S2057 - S2058 - S2059 - S2060 - S2061 - S2063 - S2064 - S2072	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 792 (102)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P841	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 791 (102b)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2056	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 299 (P104 bis)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2057	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 304 (P114)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2058	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 794 (120)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2059	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 796 (133)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2060	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 795 (132)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2061	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 1430	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2063	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1431	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2064	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 1432	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2072	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 791 (102b) - Vol 299 (P104 bis) - Vol 304 (P114) - Vol 794 (120) - Vol 796 (133) - Vol 795 (132) - Vol 1430 - Vol 1431 - Vol 1432	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2056 - S2057 - S2058 - S2059 - S2060 - S2061 - S2063 - S2064 - S2072	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P841		002KN 00018 9-5 n °841 - 1 - 002KN 00018 9-5 n °841 - 2	P841 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 739	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P842	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °842 - 1	P842	Colle grise non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 793	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2073	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P842		002KN 00018 9-5 n °842 - 1	P842	Colle grise non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 667 (C013)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P848	Réalisation d'un prélevement			P848 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 667 (C013)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P848	Réalisation d'un prélevement			P848 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 667 (C013)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P848	Réalisation d'un prélevement			P848 Phase 3	Colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 925 (THB201)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P849	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °849 - 1	P849	Colle grise en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 924 (TFB202)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2075	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P849		002KN 00018 9-5 n °849 - 1	P849	Colle grise en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 720 (B100)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P850	Réalisation d'un prélevement			P850 Phase 1	Revêtement cassant vert avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 720 (B100)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P850	Réalisation d'un prélevement			P850 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 910	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P851	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °851 - 1	P851	Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 704	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P853	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °853 - 1	P853	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 700	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P855	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °855 - 1	P855	Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 948	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P857	Réalisation d'un prélevement			P857	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 1434	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P859	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °859 - 1	P859	Colle beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 1435	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2079	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P859		002KN 00018 9-5 n °859 - 1	P859	Colle beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 1436	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P861	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °861 - 1	P861	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 1438	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P863	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °863 - 1	P863	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 960	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P864	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °864 - 1	P864	Ragréage gris en vrac non séparable + colle grise en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1443 (OUEST)	Revêtement de sol	Joint dilatation	S2081	Réalisation d'un sondage						Présence sur document 002zg002133
Plan Rdc	Vol 1444 (EST)	Revêtement de sol	Joint dilatation	S2081	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2081						Présence sur document 002zg002133

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 987	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P865	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °865 - 1	P865	Colle grise en vrac + ragréage rose en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 988	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P867	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °867 - 1	P867	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1446	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P869	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °869 - 1	P869 Phase 1	Peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1446	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P869	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °869 - 1	P869 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1446	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P869	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °869 - 1	P869 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1446	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P869	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °869 - 1	P869 Phase 4	Revêtement cassant beige en faible quantité avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1446	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P870	Réalisation d'un prélevement	2eme couche	002KN 00018 9-5 n °870 - 1	P870 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1446	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P870	Réalisation d'un prélevement	2eme couche	002KN 00018 9-5 n °870 - 1	P870 Phase 2	Matériau souple blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1446	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P870	Réalisation d'un prélevement	2eme couche	002KN 00018 9-5 n °870 - 1	P870 Phase 3	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1446	Revêtement de sol	Ragréage	P871	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °871 - 1	P871	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1450	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P872	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °872 - 1	P872 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1450	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P872	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °872 - 1	P872 Phase 3	Joint cassant blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1451	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P874	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °874 - 1	P874 Phase 2	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1451	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P874	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °874 - 1	P874 Phase 3	Colle grise non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1453	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P876	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °876 - 1	P876 Phase 2	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1453	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P876	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °876 - 1	P876 Phase 3	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1452	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P878	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °878 - 1	P878 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1452	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P878	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °878 - 1	P878 Phase 3	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1452	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P878	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °878 - 1	P878 Phase 4	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1060	Revêtement de sol	Ragréage	P880	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °880 - 1	P880	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1060	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P881	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °881 - 1	P881 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1060	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P881	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °881 - 1	P881 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1087	Revêtement de sol	Ragréage	P882	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °882 - 1	P882	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1087	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P883	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °883 - 1	P883 Phase 1	Revêtement cassant gris avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1087	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P883	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °883 - 1	P883 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1088	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P884	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °884 - 1	P884 Phase 2	Peinture non séparable + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1088	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P884	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °884 - 1	P884 Phase 3	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1454	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P886	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °886 - 1	P886	Colle beige en vrac non séparable + papier gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1455	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P888	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °888 - 1	P888	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1165	Revêtement de sol	Ragréage	P890	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °890 - 1	P890	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1165	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P891	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °891 - 1	P891 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1165	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P891	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °891 - 1	P891 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1165	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P891	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °891 - 1	P891 Phase 3	Colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1133	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P892	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °892 - 1	P892 Phase 1	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1133	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P892	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °892 - 1	P892 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1133	Revêtement de sol	Ragréage	P893	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °893 - 1	P893	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1119	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P894	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °894 - 1	P894	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1238	Revêtement de sol	Ragréage	P896	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °896 - 1	P896	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1238	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P897	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °897 - 1	P897 Phase 1	Revêtement cassant beige avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1238	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P897	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °897 - 1	P897 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1238	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P898	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °898 - 1	P898 Phase 1	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1238	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P898	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °898 - 1	P898 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1456	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P899	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °899 - 1	P899	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1457	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P901	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °901 - 1	P901	Colle grise en vrac hétérogène non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1458	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P903	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °903 - 1	P903 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1458	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P903	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °903 - 1	P903 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1458	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P903	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °903 - 1	P903 Phase 3	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1458	Revêtement de sol	Ragréage	P904	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °904 - 1	P904	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1459	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P905	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °905 - 1	P905 Phase 2	Joint cassant gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1459	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P905	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °905 - 1	P905 Phase 3	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1226	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P907	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °907 - 1	P907	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1216	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P909	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °909 - 1	P909 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1216	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P909	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °909 - 1	P909 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1216	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P909	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °909 - 1	P909 Phase 3	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1216	Revêtement de sol	Ragréage	P910	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °910 - 1	P910	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1461	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P911	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °911 - 1	P911	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1462	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2082	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P911		002KN 00018 9-5 n °911 - 1	P911	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Local fioul	Vol 1463 (Local fioul)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P913	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °913 - 1	P913	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1241	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P914	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °914 - 1	P914	Colle grise en vrac hétérogène non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1242	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2084	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P914		002KN00018 9-5 n °914 - 1	P914	Colle grise en vrac hétérogène non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1358	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P916	Réalisation d'un prélèvement		002KN00018 9-5 n °916 - 1	P916	Colle grise en vrac hétérogène non séparable + ragréage beige en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 266	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S135	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0048 P002 pyrami de conseil du 02/03/2016
Plan Rdc	Vol 266	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S135	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S135						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0048 P002 pyrami de conseil du 02/03/2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 268	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S137	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P035 pyramide conseil du 03/03/2016
Plan Rdc	Vol 285 (P026)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P50	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°50 - 1	002KN000189 n°50	Colle de plinthe	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 276 (P115)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002KN000189 n°50 - 1	002KN000189 n°50	Colle de plinthe	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 359	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P196	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n °196 - 1	002KN000189 n °196	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 359	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002KN 00018 9 n °196 - 1	002KN 00018 9 n °196	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 358	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002KN 00018 9 n °196 - 1	002KN 00018 9 n °196	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 359 - Vol 358	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P196 - S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002KN 00018 9 n °196 - 1	002KN 00018 9 n °196	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 359	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P197	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °197 - 1	002KN 00018 9 n °197	Colle Dur Gris Peinture Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 359	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002KN 00018 9 n °197 - 1	002KN 00018 9 n °197	Colle Dur Gris Peinture Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 358	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002KN 00018 9 n °197 - 1	002KN 00018 9 n °197	Colle Dur Gris Peinture Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 359 - Vol 358	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P197 - S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002KN 00018 9 n °197 - 1	002KN 00018 9 n °197	Colle Dur Gris Peinture Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 478	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S775	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P066 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 484	Revêtement de mur	Plaques menuiserie	S786	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P050 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 528	Revêtement de mur	Plaques menuiserie	S836	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P051 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 600	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S946	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P005 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 600	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S947	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P006 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 600	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S948	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P008 pyramide conseil
Plan R+7	Vol 631	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P257	Réalisation d'un prélevement			002KN000189-1 n°257	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 631	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257			002KN 00018 9-1 n °257	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 637	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P282	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °282 - 1	002KN 00018 9-3 n °282	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 177	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P284	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °284 - 1	002KN 00018 9-3 n °284 Phase 1	Colle Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 177	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P284	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °284 - 1	002KN 00018 9-3 n °284 Phase 4	Peinture Effritable Orange Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 179	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P290	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °290 - 1	002KN 00018 9-3 n °290	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 189	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1097 (P290)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002KN 00018 9-3 n °290 - 1	002KN 00018 9-3 n °290	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 188	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1098 (P290)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002KN 00018 9-3 n °290 - 1	002KN 00018 9-3 n °290	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 188	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1099 (P290)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002KN 00018 9-3 n °290 - 1	002KN 00018 9-3 n °290	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 192	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1100 (P290)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002KN 00018 9-3 n °290 - 1	002KN 00018 9-3 n °290	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 186	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1101 (P290)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002KN 00018 9-3 n °290 - 1	002KN 00018 9-3 n °290	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 182	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1106 (P290)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002KN 00018 9-3 n °290 - 1	002KN 00018 9-3 n °290	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 187	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2032 (P290)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002KN 00018 9-3 n °290 - 1	002KN 00018 9-3 n °290	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 184	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2033 (P290)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002KN 00018 9-3 n °290 - 1	002KN 00018 9-3 n °290	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 185	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2034 (P290)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002KN 00018 9-3 n °290 - 1	002KN 00018 9-3 n °290	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 183	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2035 (P290)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002KN 00018 9-3 n °290 - 1	002KN 00018 9-3 n °290	Colle de carrelage (plinthe)	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 87	Revêtement de mur	Plaques menuiserie	P302	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °302 - 1	002KN 00018 9-3 n °302	Plaques menuiserie	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 87	Revêtement de mur	Plaques menuiserie	S1800 (P302)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P302		002KN 00018 9-3 n °302 - 1	002KN 00018 9-3 n °302	Plaques menuiserie	Positif	Présence sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 59	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P338	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °338 - 1	002KN 00018 9-3 n °338	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 43	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002KN 00018 9-3 n °338 - 1	002KN 00018 9-3 n °338	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 666 (Infirmerie 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P371	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °371 - 1	002KN 00018 9-3 n °371 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 666 (Infirmerie 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P371		002KN 00018 9-3 n °371 - 1	002KN 00018 9-3 n °371 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 666 (Infirmerie 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P371	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °371 - 1	002KN 00018 9-3 n °371 Phase 2	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 666 (Infirmerie 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P371		002KN 00018 9-3 n °371 - 1	002KN 00018 9-3 n °371 Phase 2	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 385	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P377	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °377 - 1	002KN 00018 9-3 n °377 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Vert Joint Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 385	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002KN 00018 9-3 n °377 - 1	002KN 00018 9-3 n °377 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Vert Joint Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 385	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P377	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °377 - 1	002KN 00018 9-3 n °377 Phase 3	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 385	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002KN 00018 9-3 n °377 - 1	002KN 00018 9-3 n °377 Phase 3	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 671	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P388	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °388 - 1	002KN 00018 9-3 n °388	Colle Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 670	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P388		002KN 00018 9-3 n °388 - 1	002KN 00018 9-3 n °388	Colle Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 692	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P388		002KN 00018 9-3 n °388 - 1	002KN 00018 9-3 n °388	Colle Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 670 - Vol 692	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1222 - S1223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P388		002KN 00018 9-3 n °388 - 1	002KN 00018 9-3 n °388	Colle Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 671	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P389	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °389 - 1	002KN 00018 9-3 n °389 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 671	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P389	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °389 - 1	002KN 00018 9-3 n °389 Phase 2	Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 671	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P389	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °389 - 1	002KN 00018 9-3 n °389 Phase 3	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 692	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P391	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °391 - 1	002KN 00018 9-3 n °391 Phase 1	Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 692	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P391	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °391 - 1	002KN 00018 9-3 n °391 Phase 2	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 692	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P392	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °392 - 1	002KN 00018 9-3 n °392 Phase 1	Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 692	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P392	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °392 - 1	002KN 00018 9-3 n °392 Phase 2	Colle Dur Gris Matériau Effritable Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 672	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1225	Réalisation d'un sondage		S1225 - 1				Négatif sur document Info UPD, 2009

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 708	Revêtement de mur	Sous-couches des tissus muraux	P400	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °400 - 1	002KN00018 9-3 n °400	Papier peint Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 267 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1258	Réalisation d'un sondage		S1258 - 1				Négatif sur document Info UPD, 2013
Plan Rdc	Vol 267 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P413	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °413 - 1	002KN00018 9-3 n °413 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 267 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P413	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °413 - 1	002KN00018 9-3 n °413 Phase 2	Peinture Effritable Blanc Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 267 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P413	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °413 - 1	002KN00018 9-3 n °413 Phase 4	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 266	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P415	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °415 - 1	002KN 00018 9-3 n °415 Phase 1	Revêtement Souple Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 266	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P415	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °415 - 1	002KN 00018 9-3 n °415 Phase 2	Matériau Résineux Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 712	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P420	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °420 - 1	002KN 00018 9-3 n °420 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 713	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002KN 00018 9-3 n °420 - 1	002KN 00018 9-3 n °420 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 712	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P420	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °420 - 1	002KN 00018 9-3 n °420 Phase 3	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 713	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002KN 00018 9-3 n °420 - 1	002KN 00018 9-3 n °420 Phase 3	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 712	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P420	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °420 - 1	002KN 00018 9-3 n °420 Phase 4	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 713	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002KN 00018 9-3 n °420 - 1	002KN 00018 9-3 n °420 Phase 4	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 714	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P422	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °422 - 1	002KN 00018 9-3 n °422	Peinture Effritable Blanc Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 715	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422		002KN 00018 9-3 n °422 - 1	002KN 00018 9-3 n °422	Peinture Effritable Blanc Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 714	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P423	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °423 - 1	002KN 00018 9-3 n °423	Peinture Effritable Multicolore Colle Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 799	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P428	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °428 - 1	002KN 00018 9-3 n °428 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 823	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P428		002KN 00018 9-3 n °428 - 1	002KN 00018 9-3 n °428 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 799	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P428	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °428 - 1	002KN 00018 9-3 n °428 Phase 3	Colle Dur Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 823	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P428		002KN 00018 9-3 n °428 - 1	002KN 00018 9-3 n °428 Phase 3	Colle Dur Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 823	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P441	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °441 - 1	002KN 00018 9-3 n °441	Colle Dur Gris Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 855	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P451	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °451 - 1	002KN 00018 9-3 n °451	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 846	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P451		002KN 00018 9-3 n °451 - 1	002KN 00018 9-3 n °451	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 855	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P452	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °452 - 1	002KN 00018 9-3 n °452 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Bleu Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 846	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P452		002KN 00018 9-3 n °452 - 1	002KN 00018 9-3 n °452 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Bleu Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 855	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P452	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °452 - 1	002KN 00018 9-3 n °452 Phase 3	Colle Souple Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 846	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P452		002KN 00018 9-3 n °452 - 1	002KN 00018 9-3 n °452 Phase 3	Colle Souple Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 847	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P463	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °463 - 1	002KN 00018 9-3 n °463 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 847	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P463		002KN 00018 9-3 n °463 - 1	002KN 00018 9-3 n °463 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 843	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P463		002KN 00018 9-3 n °463 - 1	002KN 00018 9-3 n °463 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 843	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P463		002KN 00018 9-3 n °463 - 1	002KN 00018 9-3 n °463 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 847 - Vol 843	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1305 - S1306 - S1307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P463		002KN 00018 9-3 n °463 - 1	002KN 00018 9-3 n °463 Phase 1	Matériau Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 847	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P463	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °463 - 1	002KN 00018 9-3 n °463 Phase 2	Colle Dur Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 847	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P463		002KN 00018 9-3 n °463 - 1	002KN 00018 9-3 n °463 Phase 2	Colle Dur Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 843	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P463		002KN 00018 9-3 n °463 - 1	002KN 00018 9-3 n °463 Phase 2	Colle Dur Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 843	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P463		002KN 00018 9-3 n °463 - 1	002KN 00018 9-3 n °463 Phase 2	Colle Dur Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 847 - Vol 843	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1305 - S1306 - S1307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P463		002KN 00018 9-3 n °463 - 1	002KN 00018 9-3 n °463 Phase 2	Colle Dur Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 847	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P464	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 843	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 625	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 625	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 625	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 625	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 843 - Vol 625	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1309 - S1310 - S1311 - S1312 - S1313 - S1314 - S1315 - S1316 - S1317 - S1387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002KN 00018 9-3 n °464 - 1	002KN 00018 9-3 n °464	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 876	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P477	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °477 - 1	002KN 00018 9-3 n °477	Colle Dur Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Peinture Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 876	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P478	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °478 - 1	002KN 00018 9-3 n °478 Phase 1	Colle Dur Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 876	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P478	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °478 - 1	002KN 00018 9-3 n °478 Phase 2	Peinture Effritable Vert Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 927	Revêtement de mur	Sous-couches des tissus muraux	P508	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °508 - 1	002KN 00018 9-3 n °508	Colle Souple Jaune Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 944	Revêtement de mur	Sous-couches des tissus muraux	S1399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P508		002KN00018 9-3 n °508 - 1	002KN00018 9-3 n °508	Colle Souple Jaune Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 937	Revêtement de mur	Sous-couches des tissus muraux	S1400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P508		002KN00018 9-3 n °508 - 1	002KN00018 9-3 n °508	Colle Souple Jaune Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 936 (B 307)	Revêtement de mur	Sous-couches des tissus muraux	S1401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P508		002KN00018 9-3 n °508 - 1	002KN00018 9-3 n °508	Colle Souple Jaune Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 949	Revêtement de mur	Sous-couches des tissus muraux	S1402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P508		002KN00018 9-3 n °508 - 1	002KN00018 9-3 n °508	Colle Souple Jaune Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 946	Revêtement de mur	Sous-couches des tissus muraux	S1405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P508		002KN00018 9-3 n °508 - 1	002KN00018 9-3 n °508	Colle Souple Jaune Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 944 - Vol 937 - Vol 936 (B 307) - Vol 949 - Vol 946	Revêtement de mur	Sous-couches des tissus muraux	S1399 - S1400 - S1401 - S1402 - S1405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P508		002KN00018 9-3 n °508 - 1	002KN00018 9-3 n °508	Colle Souple Jaune Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 849	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P521	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °521 - 1	002KN00018 9-3 n °521 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 853	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P521		002KN00018 9-3 n °521 - 1	002KN00018 9-3 n °521 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 849	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P521	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-3 n °521 - 1	002KN00018 9-3 n °521 Phase 2	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 853	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P521		002KN 00018 9-3 n °521 - 1	002KN 00018 9-3 n °521 Phase 2	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1096	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P557	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °557 - 1	002KN 00018 9-3 n °557 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1096	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P557	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °557 - 1	002KN 00018 9-3 n °557 Phase 2	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1096	Revêtement de mur	Revêtement durs	P560	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °560 - 1	002KN 00018 9-3 n °560	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1098	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P562	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °562 - 1	002KN 00018 9-3 n °562 Phase 1	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1110	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562		002KN 00018 9-3 n °562 - 1	002KN 00018 9-3 n °562 Phase 1	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1098	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P562	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °562 - 1	002KN 00018 9-3 n °562 Phase 2	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1110	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562		002KN 00018 9-3 n °562 - 1	002KN 00018 9-3 n °562 Phase 2	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1098	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1466	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marqua geInfo UPD
Plan R+4	Vol 1089	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P573	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °573 - 1	002KN 00018 9-3 n °573	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1050	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P573		002KN 00018 9-3 n °573 - 1	002KN 00018 9-3 n °573	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1050	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P576	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °576 - 1	002KN 00018 9-3 n °576	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1050	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P577	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °577 - 1	002KN 00018 9-3 n °577	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1050	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P578	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °578 - 1	002KN 00018 9-3 n °578	Peinture Effritable Blanc Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1050	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P579	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °579 - 1	002KN 00018 9-3 n °579	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1302	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P622	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °622 - 1	002KN 00018 9-3 n °622	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1170	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P634	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °634 - 1	002KN 00018 9-3 n °634	Colle Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1202	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P640	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °640 - 1	002KN 00018 9-3 n °640 Phase 1	Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1232	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P640		002KN 00018 9-3 n °640 - 1	002KN 00018 9-3 n °640 Phase 1	Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1202	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P640	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °640 - 1	002KN 00018 9-3 n °640 Phase 2	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1232	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P640		002KN 00018 9-3 n °640 - 1	002KN 00018 9-3 n °640 Phase 2	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1123 (B505)	Revêtement de mur	Sous-couche s des tissus muraux	P666	Réalisation d'un prélevement	Papier peint	002KN 00018 9-3 n °666 - 1	002KN 00018 9-3 n °666	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Translucide Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1150	Revêtement de mur	Sous-couche s des tissus muraux	S1538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P666	Papier peint	002KN 00018 9-3 n °666 - 1	002KN 00018 9-3 n °666	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Translucide Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1050	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P727	Réalisation d'un prélevement	Paillasse	002KN 00018 9-3 n °727 - 1	002KN 00018 9-3 n °727	Colle Dur Beige Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1070	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P745	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °745 - 1	002KN 00018 9-3 n °745	Colle Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	I25		WC	I25 - 1				Refus // Nécessite sondage destructif important
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	I26		SDB	I26 - 1				Refus // Nécessite un sondage destructif important

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	I27		Cuisine	I27 - 1				Refus // Nécessite sondage destructif important
Plan sous-sol -1	Vol 159 (S/B106)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P789	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°789 - 1	P789 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 159 (S/B106)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P789	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°789 - 1	P789 Phase 3	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 184	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P808	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°808 - 1	P808 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 184	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P808		002KN000189-5 n°808 - 1	P808 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 184	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P808	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °808 - 1	P808 Phase 3	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 184	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P808		002KN 00018 9-5 n °808 - 1	P808 Phase 3	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 185	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P809	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °809 - 1	P809	Colle beige non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 185	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P809	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P809		002KN000189-5 n°809 - 1	P809	Colle beige non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1410	Revêtement de mur	Colle	P816	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°816 - 1	P816 Phase 1	Colle marron en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1410	Revêtement de mur	Colle	P816	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°816 - 1	P816 Phase 2	Matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 1410	Revêtement de mur	Fibralith (colle)	P817	Réalisation d'un prélevement		002KN000189-5 n°817 - 1	P817	Matériau beige avec poussières non séparable + matériau gris non séparable + bois en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 1421 (THA8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P829	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °829 - 1	P829	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1421 (THA8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P829		002KN 00018 9-5 n °829 - 1	P829	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1424 (TFA8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2046	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P829		002KN 00018 9-5 n °829 - 1	P829	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 875	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2078	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P829		002KN 00018 9-5 n °829 - 1	P829	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 1421 (THA8) - Vol 1424 (TFA8) - Vol 875	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P829 - S2046 - S2078	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P829		002KN 00018 9-5 n °829 - 1	P829	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 739	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P843	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °843 - 1	P843	Colle blanche + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 739	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P843		002KN00018 9-5 n °843 - 1	P843	Colle blanche + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 793	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2074	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P843		002KN00018 9-5 n °843 - 1	P843	Colle blanche + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 739 - Vol 793	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P843 - S2074	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P843		002KN00018 9-5 n °843 - 1	P843	Colle blanche + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 662 (Infirmerie 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P844	Réalisation d'un prélevement		I18 - 1 - 002KN00018 9-5 n °844 - 2	P844	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 662 (Infirmerie 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P845	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °845 - 2 - 002KN 00018 9-5 n °845 - 1	P845	Peinture non séparable + colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 910	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P852	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °852 - 1	P852	Colle blanche + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 704	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P854	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °854 - 1	P854	Colle beige + carton en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 700	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P856	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °856 - 1	P856 Phase 1	Colle beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 700	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P856	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P856		002KN 00018 9-5 n °856 - 1	P856 Phase 1	Colle beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 700	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P856	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °856 - 1	P856 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 700	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P856	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P856		002KN 00018 9-5 n °856 - 1	P856 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 948	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P858	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °858 - 1	P858 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 948	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P858	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °858 - 1	P858 Phase 3	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 1434	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P860	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °860 - 1	P860 Phase 1	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 1435	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2080	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P860		002KN 00018 9-5 n °860 - 1	P860 Phase 1	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 1434	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P860	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °860 - 1	P860 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 1435	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2080	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P860		002KN 00018 9-5 n °860 - 1	P860 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 1436	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P862	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °862 - 1	P862	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 1436	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P862	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P862		002KN 00018 9-5 n °862 - 1	P862	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 987	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P866	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °866 - 1	P866	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 988	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P868	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °868 - 1	P868 Phase 2	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 988	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P868	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °868 - 1	P868 Phase 3	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1450	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P873	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °873 - 1	P873	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1451	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P875	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °875 - 1	P875	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1453	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P877	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °877 - 1	P877 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1453	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P877	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P877		002KN 00018 9-5 n °877 - 1	P877 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1453	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P877	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °877 - 1	P877 Phase 3	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 1453	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P877	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P877		002KN00018 9-5 n °877 - 1	P877 Phase 3	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1452	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P879	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °879 - 1	P879 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1452	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P879	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °879 - 1	P879 Phase 3	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+4	Vol 1088	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P885	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °885 - 1	P885	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1454	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P887	Réalisation d'un prélevement		002KN00018 9-5 n °887 - 1	P887	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1455	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P889	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °889 - 1	P889	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1119	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P895	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °895 - 1	P895 Phase 2	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1119	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P895	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °895 - 1	P895 Phase 3	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1456	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P900	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °900 - 1	P900	Colle beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1457	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P902	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °902 - 1	P902 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1457	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P902		002KN 00018 9-5 n °902 - 1	P902 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1457	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P902	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °902 - 1	P902 Phase 3	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1457	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P902		002KN 00018 9-5 n °902 - 1	P902 Phase 3	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1459	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P906	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °906 - 1	P906 Phase 1	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1459	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P906	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °906 - 1	P906 Phase 3	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1226	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P908	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °908 - 1	P908 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 1226	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P908	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °908 - 1	P908 Phase 3	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1462	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P912	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °912 - 1	P912	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+5	Vol 1462	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2083	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P912		002KN 00018 9-5 n °912 - 1	P912	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1241	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P915	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °915 - 1	P915	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1242	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2085	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P915		002KN 00018 9-5 n °915 - 1	P915	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1358	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P917	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °917 - 1	P917 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 1358	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P917	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °917 - 1	P917 Phase 3	Colle beige non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 86	Conduit eau	Calorifugeage	S6	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P002 09/02/2016 Pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 86	Conduit eau	Calorifugeage	S7	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport :16/IMO/0047 P'002 09/02/2016 Pyramide conseil
Plan sous-sol -2	Vol 52	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 1				Présence sur document Fiche récapitulative rev n° 00 du DTA 6043671/3/1

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 46	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S10	Réalisation d'un sondage		S10 - 1				Présence sur document Fiche récapitulative rev n° 00 du DTA 604367 1/3/1
Plan sous-sol -2	Vol 47	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S11	Réalisation d'un sondage		S11 - 1				Présence sur document Fiche récapitulative rev n° 00 du DTA 604367 1/3/1

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 47	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S12	Réalisation d'un sondage		S12 - 1				Présence sur document Fiche récapitulative rev n° 00 du DTA 6043671/3/1
Plan sous-sol -2	Vol 24	Conduit eau	Calorifugeage	P10	Réalisation d'un prélevement		002KN000189 n°10 - 1	002KN000189 n°10	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Conduit eau	Calorifugeage	P11	Réalisation d'un prélevement	Gaine technique	002KN 00018 9 n°11 - 1	002KN 00018 9 n°11	Laine Fibreux Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Carton Fibreux Souple Marron Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 51	Conduit eau	Calorifugeage	P12	Réalisation d'un prélevement	Gros diamètre	002KN 00018 9 n°12 - 1	002KN 00018 9 n°12	Plâtre Effritable Blanc Tresse Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 46	Conduit eau	Calorifugeage	P14	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°14 - 1	002KN 00018 9 n°14	Laine Fibreux Souple Orange Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 46	Conduit eau	Calorifugeage	P15	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°15 - 1	002KN 00018 9 n°15	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 37	Conduit eau	Calorifugeage	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002KN 00018 9 n°15 - 1	002KN 00018 9 n°15	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 52	Conduit eau	Calorifugeage	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002KN 00018 9 n°15 - 1	002KN 00018 9 n°15	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 37 - Vol 52	Conduit eau	Calorifugeage	S66 - S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002KN 00018 9 n°15 - 1	002KN 00018 9 n°15	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 52	Conduit eau	Calorifugeage	P18	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°18 - 1	002KN 00018 9 n°18	Laine Fibreux Souple Marron Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 52	Conduit air	Calorifugeage	P19	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°19 - 1	002KN 00018 9 n°19	Laine Fibreux Souple Jaune Papier Fibreux Souple Beige Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 71	Conduit eau	Calorifugeage	P23	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°23 - 1	002KN 00018 9 n°23	Laine Fibreux Souple Jaune Toile Fibreux Souple Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 71	Conduit eau	Calorifugeage	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002KN 00018 9 n°23 - 1	002KN 00018 9 n°23	Laine Fibreux Souple Jaune Toile Fibreux Souple Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Conduit eau	Calorifugeage	P26	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°26 - 1	002KN 00018 9 n°26	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Bitumineux Noir Toile Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Conduit eau	Calorifugeage	P27	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°27 - 1	002KN 00018 9 n°27	Matériau Bitumineux Noir Polystyrène Souple Blanc Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Conduit eau	Calorifugeage	P28	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°28 - 1	002KN 00018 9 n°28	Laine Fibreux Souple Jaune Aluminium Souple Gris Fibres Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 252	Conduit eau	Calorifugeage	P29	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°29 - 1	002KN 00018 9 n°29	Matériau Bitumineux Noir Polystyrène Souple Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 254	Conduit eau	Calorifugeage	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002KN 00018 9 n°29 - 1	002KN 00018 9 n°29	Matériau Bitumineux Noir Polystyrène Souple Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 253	Conduit air	Calorifugeage	P30	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°30 - 1	002KN 00018 9 n°30	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 253	Conduit eau	Calorifugeage	P31	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°31 - 1	002KN 00018 9 n°31	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S91	Réalisation d'un sondage	Au niveau de la sous-st dans les accès galerie	S91 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S92	Réalisation d'un sondage	Au niveau de la sous-st dans les accès galerie	S92 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Conduit eau	Calorifugeage	P32	Réalisation d'un prélevement	Au niveau de la sous-st dans les accès galerie	002KN 00018 9 n°32 - 1	002KN 00018 9 n°32	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P33	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°33 - 1	002KN 00018 9 n°33	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 8 (Ventilation amphi)	Conduit eau	Calorifugeage	P35	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n°35 - 1	002KN 00018 9 n°35	Toile Fibreux Souple Marron Matériau Souple Beige Matériau Bitumineux Noir Polystyrène Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 84	Conduit eau	Calorifugeage	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002KN 00018 9 n°35 - 1	002KN 00018 9 n°35	Toile Fibreux Souple Marron Matériau Souple Beige Matériau Bitumineux Noir Polystyrène Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 85	Conduit eau	Calorifugeage	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002KN 00018 9 n°35 - 1	002KN 00018 9 n°35	Toile Fibreux Souple Marron Matériau Souple Beige Matériau Bitumineux Noir Polystyrène Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 27	Conduit eau	Calorifugeage	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002KN 00018 9 n°35 - 1	002KN 00018 9 n°35	Toile Fibreux Souple Marron Matériau Souple Beige Matériau Bitumineux Noir Polystyrène Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 84 - Vol 85 - Vol 27	Conduit eau	Calorifugeage	S102 - S103 - S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002KN 00018 9 n°35 - 1	002KN 00018 9 n°35	Toile Fibreux Souple Marron Matériau Souple Beige Matériau Bitumineux Noir Polystyrène Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 272	Conduit eau	Calorifugeage	S144	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document cf rapport n° 16/IMO/0045 P030 pyramide conseil du 03/03/2016
Plan sous-sol -1	Vol 142	Conduit eau	Calorifugeage	P36	Réalisation d'un prélèvement		002KN000189 n°36 - 1	002KN000189 n°36	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Conduit eau	Calorifugeage	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002KN000189 n°36 - 1	002KN000189 n°36	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 173	Conduit eau	Calorifugeage	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002KN 00018 9 n°36 - 1	002KN 00018 9 n°36	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 243	Conduit eau	Calorifugeage	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002KN 00018 9 n°36 - 1	002KN 00018 9 n°36	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 169	Conduit eau	Calorifugeage	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002KN 00018 9 n°36 - 1	002KN 00018 9 n°36	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 171	Conduit eau	Calorifugeage	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002KN 00018 9 n°36 - 1	002KN 00018 9 n°36	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86 - Vol 173 - Vol 243 - Vol 169 - Vol 171	Conduit eau	Calorifugeage	S165 - S173 - S191 - S203 - S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002KN 00018 9 n°36 - 1	002KN 00018 9 n°36	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+6	Vol 360	Conduit eau	Calorifugeage	P199	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °199 - 1	002KN 00018 9 n °199	Laine Fibreux Souple Jaune Tresse Fibreux Souple Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 356	Conduit eau	Calorifugeage	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002KN 00018 9 n °199 - 1	002KN 00018 9 n °199	Laine Fibreux Souple Jaune Tresse Fibreux Souple Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 376	Conduit eau	Calorifugeage	P210	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9 n °210 - 1	002KN 00018 9 n °210	Laine Fibreux Jaune Tresse Fibreux Souple Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 375	Conduit eau	Calorifugeage	S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002KN 00018 9 n °210 - 1	002KN 00018 9 n °210	Laine Fibreux Jaune Tresse Fibreux Souple Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 374	Conduit eau	Calorifugeage	S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002KN 00018 9 n °210 - 1	002KN 00018 9 n °210	Laine Fibreux Jaune Tresse Fibreux Souple Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 375 - Vol 374	Conduit eau	Calorifugeage	S528 - S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002KN 00018 9 n °210 - 1	002KN 00018 9 n °210	Laine Fibreux Jaune Tresse Fibreux Souple Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+2	Vol 449	Conduit eau	Calorifugeage	S711	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0046 P'001 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 455	Conduit d'échappement	Calorifugeage	S732	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P007 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 455	Conduit eau	Calorifugeage	S735	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P010 pyramide conseil
Plan R+3	Vol 476	Conduit eau	Calorifugeage	S770	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0043 P029 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 484	Conduit eau	Calorifugeage	S784	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P048 pyramide conseil
Plan R+4	Vol 484	Conduit eau	Calorifugeage	S800	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0041 P020 pyramide conseil
Plan R+5	Vol 530	Conduit eau	Calorifugeage	S841	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P021 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 550	Conduit eau	Calorifugeage	S878	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0044 P018 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 551	Conduit eau	Calorifugeage	S882	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P020 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 551	Conduit eau	Calorifugeage	S883	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P021 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 557	Conduit eau	Calorifugeage	S904	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P069 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 601	Conduit eau	Calorifugeage	S942	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P009 pyramide conseil
Plan R+6	Vol 591	Conduit eau	Calorifugeage	S951	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf rapport 16/IMO/0042 P027 pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+7	Vol 612	Conduit air	Calorifugeage	P226	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °226 - 1	002KN 00018 9-1 n °226	Laine Fibreux Souple Jaune Carton Souple Fibreux Marron Bande peinte Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+7	Vol 620	Conduit air	Joint entre éléments	P236	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-1 n °236 - 1	002KN 00018 9-1 n °236	Joint Souple Rouge Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 177	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P283	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °283 - 1	002KN 00018 9-3 n °283	Peinture Effritable Multicolore Matériau Souple Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 165	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P293	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °293 - 1	002KN 00018 9-3 n °293	Conduit en fibres-ciment	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 142	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S1124 (P293)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002KN 00018 9-3 n °293 - 1	002KN 00018 9-3 n °293	Conduit en fibres-cimen t	Positif	Présen ce sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 640	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S1125 (P293)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002KN 00018 9-3 n °293 - 1	002KN 00018 9-3 n °293	Conduit en fibres-cimen t	Positif	Présen ce sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 167	Conduit air	Joint entre éléments	P294	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °294 - 1	002KN 00018 9-3 n °294	Matériau Résineux Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 166	Conduit air	Joint entre éléments	S1789	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002KN 00018 9-3 n °294 - 1	002KN 00018 9-3 n °294	Matériau Résineux Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 179	Conduit air	Joint entre éléments	S1790	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002KN 00018 9-3 n °294 - 1	002KN 00018 9-3 n °294	Matériau Résineux Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 166 - Vol 179	Conduit air	Joint entre éléments	S1789 - S1790	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002KN 00018 9-3 n °294 - 1	002KN 00018 9-3 n °294	Matériau Résineux Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 166	Conduit fluide non identifié	Tresses	P295	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °295 - 1	002KN 00018 9-3 n °295	Matériau Fibreux Souple Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 284	Conduit fluide non identifié	Tresses	S1132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002KN 00018 9-3 n °295 - 1	002KN 00018 9-3 n °295	Matériau Fibreux Souple Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 2 (Parking centre)	Conduit fluide non identifié	Tresses	S1158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002KN 00018 9-3 n °295 - 1	002KN 00018 9-3 n °295	Matériau Fibreux Souple Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P298	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °298 - 1	002KN 00018 9-3 n °298	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 86	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002KN 00018 9-3 n °298 - 1	002KN 00018 9-3 n °298	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 107	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002KN 00018 9-3 n °298 - 1	002KN 00018 9-3 n °298	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002KN 00018 9-3 n °298 - 1	002KN 00018 9-3 n °298	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 86	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002KN 00018 9-3 n °298 - 1	002KN 00018 9-3 n °298	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 87	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002KN 00018 9-3 n °298 - 1	002KN 00018 9-3 n °298	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 90	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002KN 00018 9-3 n °298 - 1	002KN 00018 9-3 n °298	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 118	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002KN 00018 9-3 n °298 - 1	002KN 00018 9-3 n °298	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 86 - Vol 107 - Vol 87 - Vol 90 - Vol 118	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1111 - S1112 - S1113 - S1114 - S1115 - S1119 - S1123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002KN 00018 9-3 n °298 - 1	002KN 00018 9-3 n °298	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 91	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	P299	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °299 - 1	002KN 00018 9-3 n °299	Joint Souple Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 90	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	S1120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002KN 00018 9-3 n °299 - 1	002KN 00018 9-3 n °299	Joint Souple Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 135	Clapets/volet Coupe feu	Volets	P310	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °310 - 1	002KN 00018 9-3 n °310	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 135	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P311	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °311 - 1	002KN 00018 9-3 n °311	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 135	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002KN 00018 9-3 n °311 - 1	002KN 00018 9-3 n °311	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 134	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002KN 00018 9-3 n °311 - 1	002KN 00018 9-3 n °311	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 142	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002KN 00018 9-3 n °311 - 1	002KN 00018 9-3 n °311	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 133	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002KN 00018 9-3 n °311 - 1	002KN 00018 9-3 n °311	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 135 - Vol 134 - Vol 142 - Vol 133	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1126 - S1127 - S1128 - S1129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002KN 00018 9-3 n °311 - 1	002KN 00018 9-3 n °311	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 143	Clapets/volet Coupe feu	Volets	P312	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °312 - 1	002KN 00018 9-3 n °312	Matériau Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 284	Conduit eau	Calorifugeage	P316	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °316 - 1	002KN 00018 9-3 n °316	Matériau Bitumineux Noir Toile Souple Fibreux Beige Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 284	Conduit eau	Calorifugeage	S1131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P316		002KN 00018 9-3 n °316 - 1	002KN 00018 9-3 n °316	Matériau Bitumineux Noir Toile Souple Fibreux Beige Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 32	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P324	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °324 - 1	002KN 00018 9-3 n °324	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 32	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002KN 00018 9-3 n °324 - 1	002KN 00018 9-3 n °324	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 32	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002KN 00018 9-3 n °324 - 1	002KN 00018 9-3 n °324	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 33	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002KN 00018 9-3 n °324 - 1	002KN 00018 9-3 n °324	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 34	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002KN 00018 9-3 n °324 - 1	002KN 00018 9-3 n °324	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 32 - Vol 33 - Vol 34	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1135 - S1136 - S1139 - S1140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002KN 00018 9-3 n °324 - 1	002KN 00018 9-3 n °324	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 34	Clapets/volet Coupe feu	Clapet	I15			I15 - 1				En fonction nement
Plan sous-sol -2	Vol 37	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P328	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °328 - 1	002KN 00018 9-3 n °328	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 77	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P331	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °331 - 1	002KN 00018 9-3 n °331	Toile Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 77	Conduit fluide non identifié	Tresses	P332	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °332 - 1	002KN 00018 9-3 n °332	Laine Souple Fibreux Noir Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 76	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P333	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °333 - 1	002KN 00018 9-3 n °333	Peinture Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 61	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002KN 00018 9-3 n °333 - 1	002KN 00018 9-3 n °333	Peinture Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 57	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P334	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °334 - 1	002KN 00018 9-3 n °334	Joint Effritable Gris Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 54	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002KN 00018 9-3 n °334 - 1	002KN 00018 9-3 n °334	Joint Effritable Gris Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 56	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002KN 00018 9-3 n °334 - 1	002KN 00018 9-3 n °334	Joint Effritable Gris Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 35	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002KN 00018 9-3 n °334 - 1	002KN 00018 9-3 n °334	Joint Effritable Gris Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 63	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002KN 00018 9-3 n °334 - 1	002KN 00018 9-3 n °334	Joint Effritable Gris Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 62	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002KN 00018 9-3 n °334 - 1	002KN 00018 9-3 n °334	Joint Effritable Gris Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 64	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002KN 00018 9-3 n °334 - 1	002KN 00018 9-3 n °334	Joint Effritable Gris Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 54 - Vol 56 - Vol 35 - Vol 63 - Vol 62 - Vol 64	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1146 - S1149 - S1151 - S1152 - S1153 - S1154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002KN 00018 9-3 n °334 - 1	002KN 00018 9-3 n °334	Joint Effritable Gris Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 57	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P335	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °335 - 1	002KN 00018 9-3 n °335	Conduit en fibres-cimen t	Positif	Présen ce sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 56	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S1147 (P335)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002KN 00018 9-3 n °335 - 1	002KN 00018 9-3 n °335	Conduit en fibres-cimen t	Positif	Présen ce sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 54	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S1148 (P335)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002KN 00018 9-3 n °335 - 1	002KN 00018 9-3 n °335	Conduit en fibres-cimen t	Positif	Présen ce sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P343	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °343 - 1	002KN 00018 9-3 n °343	Mousse Souple Beige Tresse Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P344	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 20 (Esc)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 3 (SP 203)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 4 (Réserve DI)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 4 (Réserve DI)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 4 (Réserve DI)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 6 (SP 200)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 29	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 22	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209) - Vol 20 (Esc) - Vol 3 (SP 203) - Vol 4 (Réserve DI) - Vol 6 (SP 200) - Vol 29 - Vol 22	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S1159 - S1160 - S1161 - S1162 - S1163 - S1164 - S1165 - S1166 - S1171 - S1173 - S1174 - S1175 - S1176 - S1177 - S1178 - S1179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002KN 00018 9-3 n °344 - 1	002KN 00018 9-3 n °344	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit air	Joint entre éléments	P345	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °345 - 1	002KN 00018 9-3 n °345	Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209)	Conduit air	Joint entre éléments	S1167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002KN 00018 9-3 n °345 - 1	002KN 00018 9-3 n °345	Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 25	Conduit air	Joint entre éléments	S1169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002KN 00018 9-3 n °345 - 1	002KN 00018 9-3 n °345	Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 17 (SB 209) - Vol 25	Conduit air	Joint entre éléments	S1167 - S1169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002KN 00018 9-3 n °345 - 1	002KN 00018 9-3 n °345	Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 25	Conduit air	Joint entre éléments	P346	Réalisation d'un prélevement	Joint gris	002KN 00018 9-3 n °346 - 1	002KN 00018 9-3 n °346	Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 16 (SB 207)	Conduit air	Joint entre éléments	S1170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346	Joint gris	002KN 00018 9-3 n °346 - 1	002KN 00018 9-3 n °346	Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+1	Vol 813	Clapets/volet Coupe feu	Volets	I17			I17 - 1				En fonctionnement

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1350	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P673	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °673 - 1	002KN 00018 9-3 n °673	Matériau Effritable Noir Laine Souple Fibreux Jaune Tresse Souple Fibreux Beige Tresse Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Rdc	Vol 1385	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P685	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °685 - 1	002KN 00018 9-3 n °685	Peinture Effritable Multicolore Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 143	Clapets/volet Coupe feu	Clapet	I19			I19 - 1				En fonctionnement
Plan sous-sol -2	Vol 47	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	I22			002KN 00018 9-3 n °330 - 1				Prélèvement à réaliser lors de la phase 3
Plan sous-sol -1	Vol 152	Clapets/volet Coupe feu	Clapet	I20			I20 - 1				En fonctionnement

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 144	Clapets/volet Coupe feu	Clapet	I20			I20 - 1				En fonction nement
Plan sous-sol -2	Vol 77	Conduit air	Colle d'isolant	P748	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °748 - 1	002KN 00018 9-3 n °748	Matériau Souple Marron Noir Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 73	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S1802	Réalisation d'un sondage		S1802 - 1				Présen ce sur docum ent
Plan sous-sol -2	Vol 73	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S1803	Réalisation d'un sondage		S1803 - 1				Présen ce sur docum ent
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P765	Réalisation d'un prélevement	Ancien calorifuge		002KN 00018 9-4 n °765	Matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan R+3	Vol 1433 (ZF0201VH)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	I28			I28 - 1				inacces sible
Plan R+3	Vol 1433 (ZF0201VH)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2065	Réalisation d'un sondage	S'étend sur toute la hauteur du bâtiment	S2065 - 1				Présen ce sur marqua gecont enant amiant e par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -2	Vol 47	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P846	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °846 - 3	P846	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 47	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P847	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-5 n °847 - 1	P847	Matériau bitumineux noir avec poussières non séparable + matériau en liège marron en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -1	Vol 1471 (G.t condamnée 1)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2086	Réalisation d'un sondage	S'étend sur toute la hauteur du bâtiment	002KN 00018 9-5 n °918 - 1				Présence sur marqua geconte nant amiante par nature
Plan Rdc	Vol 1472 (G.t condamnée 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2087	Réalisation d'un sondage	S'étend sur toute la hauteur du bâtiment	002KN 00018 9-5 n °918 - 1				Présence sur marqua geconte nant amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 1473 (G.t condamnée 3)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2088	Réalisation d'un sondage	S'étend sur toute la hauteur du bâtiment	002KN000189-5 n°918 - 1				Présence sur marquage contenant amiante par nature
Plan R+2	Vol 1474 (G.t condamnée 4)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2089	Réalisation d'un sondage	S'étend sur toute la hauteur du bâtiment	002KN000189-5 n°918 - 1				Présence sur marquage contenant amiante par nature
Plan R+4	Vol 1475 (G.t condamnée 5)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2090	Réalisation d'un sondage	S'étend sur toute la hauteur du bâtiment	002KN000189-5 n°918 - 1				Présence sur marquage contenant amiante par nature
Plan R+5	Vol 1476 (G.t condamnée 6)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2091	Réalisation d'un sondage	S'étend sur toute la hauteur du bâtiment	002KN000189-5 n°918 - 1				Présence sur marquage contenant amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+6	Vol 1477 (G.t condamnée 7)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2092	Réalisation d'un sondage	S'étend sur toute la hauteur du bâtiment	002KN 00018 9-5 n °918 - 1				Présence sur marquage contenant amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 88	Machinerie	Frein	P300	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °300 - 1	002KN 00018 9-3 n °300	Frein	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan sous-sol -1	Vol 136	Cables électriques	Isolant	I14			I14 - 1				En fonctionnement
Plan sous-sol -2	Vol 37	Cables électriques	Isolant	I16			I16 - 1				En fonctionnement
Plan sous-sol -2	Vol 46	Aérothermes	Isolant	P329	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °329 - 1	002KN 00018 9-3 n °329	Laine Souple Fibreux Noir Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 671	Evier	Tampon bitumineux	P390	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-3 n °390 - 1	002KN 00018 9-3 n °390	Tampon Bitumineux Noir Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Plan sous-sol -2	Vol 251 (Sous-station)	Etuves	Joints	P767	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °767 - 1	002KN 00018 9-4 n °767	Matériau beige en vrac hétérogène avec fibres + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 288	Coffrages	Elément en fibre ciment	S235	Réalisation d'un sondage		S235 - 1				Présence sur document Cf rapport 16/IMO/0043 de pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 288	Coffrages	Elément en fibre ciment	S236	Réalisation d'un sondage		S236 - 1				Présence sur document Cf rapport 16/IMO/0043 de pyramide conseil
Plan R+5	Vol 292 (P517)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S253	Réalisation d'un sondage		S253 - 1				Présence sur document Cf rapport 16/IMO/0043 de pyramide conseil
Plan R+5	Vol 292 (P517)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S254	Réalisation d'un sondage		S254 - 1				Présence sur document Cf rapport 16/IMO/0043 de pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 293 (P518)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S255	Réalisation d'un sondage		S255 - 1				Présence sur document Cf rapport 16/IMO/0043 de pyramide conseil
Plan R+5	Vol 293 (P518)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S256	Réalisation d'un sondage		S256 - 1				Présence sur document Cf rapport 16/IMO/0043 de pyramide conseil
Plan R+5	Vol 293 (P518)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S257	Réalisation d'un sondage		S257 - 1				Présence sur document Cf rapport 16/IMO/0043 de pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 293 (P518)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S258	Réalisation d'un sondage		S258 - 1				Présence sur document Cf rapport 16/IMO/0043 de pyramide conseil
Plan R+1	Vol 298 (P104)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S278	Réalisation d'un sondage		S278 - 2				Présence sur document Cf rapport 16/IMO/0043 de pyramide conseil
Plan R+1	Vol 298 (P104)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S279	Réalisation d'un sondage		S279 - 2				Présence sur document Cf rapport 16/IMO/0043 de pyramide conseil

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S301	Réalisation d'un sondage		S301 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S302	Réalisation d'un sondage		S302 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 321 (B105)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S303	Réalisation d'un sondage		S303 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+2	Vol 324 (B223)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S316	Réalisation d'un sondage		S316 - 2 - 002KN000189 n °107 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan R+2	Vol 324 (B223)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S317	Réalisation d'un sondage		S317 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 323 (B225)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S318	Réalisation d'un sondage		002KN000189 n°107 - 1 - S318 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan R+2	Vol 323 (B225)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S319	Réalisation d'un sondage		S319 - 2 - 002KN000189 n°107 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan R+3	Vol 325 (B302)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S322	Réalisation d'un sondage		002KN000189 n°110 - 1 - S322 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 325 (B302)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S323	Réalisation d'un sondage		S323 - 2 - 002KN 00018 9 n °110 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan R+3	Vol 325 (B302)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S324	Réalisation d'un sondage		002KN 00018 9 n °110 - 1 - S324 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan R+3	Vol 325 (B302)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S325	Réalisation d'un sondage		002KN 00018 9 n °110 - 1 - S325 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 326 (B408)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S327	Réalisation d'un sondage		S327 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan R+4	Vol 326 (B408)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S328	Réalisation d'un sondage		S328 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan R+4	Vol 327 (B424 bis)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S332	Réalisation d'un sondage		S332 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+4	Vol 327 (B424 bis)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S333	Réalisation d'un sondage		S333 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S376	Réalisation d'un sondage		S376 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan R+4	Vol 340 (D414)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S377	Réalisation d'un sondage		S377 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S386	Réalisation d'un sondage		S386 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan R+1	Vol 342 (P171)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S387	Réalisation d'un sondage		S387 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan R+1	Vol 312 (P121)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S567	Réalisation d'un sondage		S567 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage ePlaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 312 (P121)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S568	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+1	Vol 315	Coffrages	Elément en fibre ciment	S569	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 315	Coffrages	Elément en fibre ciment	S570	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+1	Vol 319	Coffrages	Elément en fibre ciment	S571	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 319	Coffrages	Elément en fibre ciment	S572	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+1	Vol 391 (P136)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S573	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 391 (P136)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S574	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+1	Vol 392 (P143)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S575	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 392 (P143)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S576	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+1	Vol 393	Coffrages	Elément en fibre ciment	S577	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 393	Coffrages	Elément en fibre ciment	S578	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+1	Vol 394 (P147)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S579	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 394 (P147)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S580	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+1	Vol 394 (P147)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S581	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 394 (P147)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S582	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+1	Vol 395	Coffrages	Elément en fibre ciment	S583	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 395	Coffrages	Elément en fibre ciment	S584	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+1	Vol 396	Coffrages	Elément en fibre ciment	S585	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+1	Vol 396	Coffrages	Elément en fibre ciment	S586	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+2	Vol 397	Coffrages	Elément en fibre ciment	S587	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 397	Coffrages	Elément en fibre ciment	S588	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+2	Vol 397	Coffrages	Elément en fibre ciment	S589	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 397	Coffrages	Elément en fibre ciment	S590	Réalisation d'un sondage		002KN000189 n°223 - 1 - 002KN000189 n°223 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+2	Vol 398	Coffrages	Elément en fibre ciment	S591	Réalisation d'un sondage		002KN000189 n°223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 398	Coffrages	Elément en fibre ciment	S592	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+2	Vol 399	Coffrages	Elément en fibre ciment	S593	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 399	Coffrages	Elément en fibre ciment	S594	Réalisation d'un sondage		002KN000189 n°223 - 1 - 002KN000189 n°223 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+2	Vol 399	Coffrages	Elément en fibre ciment	S595	Réalisation d'un sondage		002KN000189 n°223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 399	Coffrages	Elément en fibre ciment	S596	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+2	Vol 400	Coffrages	Elément en fibre ciment	S597	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 400	Coffrages	Elément en fibre ciment	S598	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+2	Vol 401	Coffrages	Elément en fibre ciment	S599	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 401	Coffrages	Elément en fibre ciment	S600	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+2	Vol 402	Coffrages	Elément en fibre ciment	S601	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 402	Coffrages	Elément en fibre ciment	S602	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+2	Vol 403	Coffrages	Elément en fibre ciment	S603	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 403	Coffrages	Elément en fibre ciment	S604	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+2	Vol 404	Coffrages	Elément en fibre ciment	S605	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+2	Vol 404	Coffrages	Elément en fibre ciment	S606	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 405	Coffrages	Elément en fibre ciment	S607	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 405	Coffrages	Elément en fibre ciment	S608	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 406	Coffrages	Elément en fibre ciment	S609	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 406	Coffrages	Elément en fibre ciment	S610	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 406	Coffrages	Elément en fibre ciment	S611	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 406	Coffrages	Elément en fibre ciment	S612	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 407	Coffrages	Elément en fibre ciment	S613	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 407	Coffrages	Elément en fibre ciment	S614	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 407	Coffrages	Elément en fibre ciment	S615	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 408	Coffrages	Elément en fibre ciment	S616	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 408	Coffrages	Elément en fibre ciment	S617	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 408	Coffrages	Elément en fibre ciment	S618	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 409	Coffrages	Elément en fibre ciment	S619	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 410	Coffrages	Elément en fibre ciment	S620	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 410	Coffrages	Elément en fibre ciment	S621	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 410	Coffrages	Elément en fibre ciment	S622	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 411	Coffrages	Elément en fibre ciment	S623	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 411	Coffrages	Elément en fibre ciment	S624	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 412	Coffrages	Elément en fibre ciment	S625	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 412	Coffrages	Elément en fibre ciment	S626	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 413	Coffrages	Elément en fibre ciment	S627	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 413	Coffrages	Elément en fibre ciment	S628	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 413	Coffrages	Elément en fibre ciment	S629	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 413	Coffrages	Elément en fibre ciment	S630	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 414	Coffrages	Elément en fibre ciment	S631	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 414	Coffrages	Elément en fibre ciment	S632	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 415	Coffrages	Elément en fibre ciment	S633	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 415	Coffrages	Elément en fibre ciment	S634	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 415	Coffrages	Elément en fibre ciment	S635	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+3	Vol 416	Coffrages	Elément en fibre ciment	S636	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+3	Vol 416	Coffrages	Elément en fibre ciment	S637	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 417 (P504)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S638	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 417 (P504)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S639	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 418 (P501)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S640	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 418 (P501)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S641	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 418 (P501)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S642	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 418 (P501)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S643	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 419 (P506)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S644	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 419 (P506)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S645	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 420 (P508)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S646	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 420 (P508)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S647	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 420 (P508)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S648	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 421 (P505)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S649	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 421 (P505)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S650	Réalisation d'un sondage		002KN000189 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 421 (P505)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S651	Réalisation d'un sondage		002KN000189 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 421 (P505)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S652	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 422 (P510)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S653	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 422 (P510)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S654	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 422 (P510)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S655	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 423 (P509)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S656	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 423 (P509)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S657	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 424 (P513)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S658	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 424 (P513)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S659	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 425 (P521)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S660	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 425 (P521)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S661	Réalisation d'un sondage		002KN00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan R+5	Vol 425 (P521)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S662	Réalisation d'un sondage		002KN 00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment
Plan R+5	Vol 425 (P521)	Coffrages	Elément en fibre ciment	S663	Réalisation d'un sondage		002KN 00018 9 n °223 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Plaque fibres-ciment

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1395 (Rampe Sortie)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P757	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °757 - 1	002KN 00018 9-4 n °757	Matériau bitumineux noir en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan Rdc	Vol 1395 (Rampe Sortie)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P758	Réalisation d'un prélevement		002KN 00018 9-4 n °758 - 1	002KN 00018 9-4 n °758	Matériau bitumineux noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Plan sous-sol -2	Plan sous-sol -2 - Plan de repérage - Actions menées
	Plan sous-sol -2	Plan sous-sol -2 - Aile nord D - Actions menées
	Plan sous-sol -2	Plan sous-sol -2 - Aile nord D - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan sous-sol -2	Plan sous-sol -2 - Aile nord D - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Plan sous-sol -2	Plan sous-sol -2 - Aile centre C - Actions menées
	Plan sous-sol -2	Plan sous-sol -2 - Aile centre C - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan sous-sol -2	Plan sous-sol -2 - Aile centre C - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Plan sous-sol -2	Plan sous-sol -2 - Aile sud A B P - Actions menées
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Plan de repérage - Actions menées
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile nord D - Actions menées
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile nord D - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile nord D - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile centre C - Actions menées
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile centre C - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile centre C - MPCA Revêtement de sol
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile centre C - MPCA Revêtement de mur
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile centre C - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile sud A B P - Actions menées
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile sud A B P - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile sud A B P - MPCA Revêtement de mur
	Plan sous-sol -1	Plan sous-sol -1 - Aile sud A B P - MPCA Ascenceurs et monte charges
	Plan Rdc	Plan Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Plan Rdc	Plan Rdc - Plan de repérage - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan Rdc	Plan Rdc - Plan de repérage - MPCA Revêtement de sol
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile A - Actions menées
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile B - Actions menées
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile B - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile B - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile C - Actions menées
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile C - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile C - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile D - Actions menées
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile D - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile D - MPCA Façades
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile D - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile P - Actions menées
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile P - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan Rdc	Plan Rdc - Aile P - MPCA Revêtement de sol
	Plan R+1	Plan R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	Plan R+1	Plan R+1 - Aile A - Actions menées
	Plan R+1	Plan R+1 - Aile B - Actions menées
	Plan R+1	Plan R+1 - Aile B - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan R+1	Plan R+1 - Aile B - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Plan R+1	Plan R+1 - Aile B - MPCA Revêtement de sol
	Plan R+1	Plan R+1 - Aile B - MPCA Coffrages perdus


Plan R+1	Plan R+1 - Aile C - Actions menées
Plan R+1	Plan R+1 - Aile C - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+1	Plan R+1 - Aile C - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan R+1	Plan R+1 - Aile C - MPCA Revêtement de mur
Plan R+1	Plan R+1 - Aile C - MPCA Coffrages perdus
Plan R+1	Plan R+1 - Aile D - Actions menées
Plan R+1	Plan R+1 - Aile D - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+1	Plan R+1 - Aile D - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan R+1	Plan R+1 - Aile D - MPCA Conduits, canalisations et équipements
Plan R+1	Plan R+1 - Aile P - Actions menées
Plan R+1	Plan R+1 - Aile P - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+1	Plan R+1 - Aile P - MPCA Coffrages perdus
Plan R+2	Plan R+2 - Plan de repérage - Actions menées
Plan R+2	Plan R+2 - Aile A - Actions menées
Plan R+2	Plan R+2 - Aile B - Actions menées
Plan R+2	Plan R+2 - Aile B - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+2	Plan R+2 - Aile B - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan R+2	Plan R+2 - Aile B - MPCA Coffrages perdus
Plan R+2	Plan R+2 - Aile C - Actions menées
Plan R+2	Plan R+2 - Aile C - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+2	Plan R+2 - Aile C - MPCA Coffrages perdus
Plan R+2	Plan R+2 - Aile D - Actions menées
Plan R+2	Plan R+2 - Aile D - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+2	Plan R+2 - Aile D - MPCA Conduits, canalisations et équipements
Plan R+2	Plan R+2 - Aile P - Actions menées
Plan R+2	Plan R+2 - Aile P - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+2	Plan R+2 - Aile P - MPCA Coffrages perdus
Plan R+3	Plan R+3 - Plan de repérage - Actions menées
Plan R+3	Plan R+3 - Aile A - Actions menées
Plan R+3	Plan R+3 - Aile B - Actions menées
Plan R+3	Plan R+3 - Aile B - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+3	Plan R+3 - Aile B - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan R+3	Plan R+3 - Aile B - MPCA Coffrages perdus
Plan R+3	Plan R+3 - Aile C - Actions menées
Plan R+3	Plan R+3 - Aile C - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+3	Plan R+3 - Aile C - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan R+3	Plan R+3 - Aile C - MPCA Coffrages perdus
Plan R+3	Plan R+3 - Aile D - Actions menées
Plan R+3	Plan R+3 - Aile D - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+3	Plan R+3 - Aile D - MPCA Conduits, canalisations et équipements
Plan R+3	Plan R+3 - Aile P - Actions menées
Plan R+3	Plan R+3 - Aile P - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+3	Plan R+3 - Aile P - MPCA Coffrages perdus
Plan R+4	Plan R+4 - Plan de repérage - Actions menées
Plan R+4	Plan R+4 - Aile A - Actions menées
Plan R+4	Plan R+4 - Aile B - Actions menées
Plan R+4	Plan R+4 - Aile B - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+4	Plan R+4 - Aile B - MPCA Parois verticales intérieures et enduits

Plan R+4	Plan R+4 - Aile B - MPCA Coffrages perdus
Plan R+4	Plan R+4 - Aile C - Actions menées
Plan R+4	Plan R+4 - Aile C - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+4	Plan R+4 - Aile C - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan R+4	Plan R+4 - Aile C - MPCA Coffrages perdus
Plan R+4	Plan R+4 - Aile D - Actions menées
Plan R+4	Plan R+4 - Aile D - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+4	Plan R+4 - Aile D - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan R+4	Plan R+4 - Aile D - MPCA Conduits, canalisations et équipements
Plan R+4	Plan R+4 - Aile D - MPCA Coffrages perdus
Plan R+4	Plan R+4 - Aile P - Actions menées
Plan R+4	Plan R+4 - Aile P - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+4	Plan R+4 - Aile P - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan R+5	Plan R+5 - Plan de repérage - Actions menées
Plan R+5	Plan R+5 - Aile A - Actions menées
Plan R+5	Plan R+5 - Aile B - Actions menées
Plan R+5	Plan R+5 - Aile B - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+5	Plan R+5 - Aile B - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan R+5	Plan R+5 - Aile C - Actions menées
Plan R+5	Plan R+5 - Aile C - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+5	Plan R+5 - Aile C - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan R+5	Plan R+5 - Aile C - MPCA Coffrages perdus
Plan R+5	Plan R+5 - Aile D - Actions menées
Plan R+5	Plan R+5 - Aile D - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+5	Plan R+5 - Aile D - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan R+5	Plan R+5 - Aile D - MPCA Conduits, canalisations et équipements
Plan R+5	Plan R+5 - Aile P - Actions menées
Plan R+5	Plan R+5 - Aile P - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+5	Plan R+5 - Aile P - MPCA Coffrages perdus
Plan R+6	Plan R+6 - Plan de repérage - Actions menées
Plan R+6	Plan R+6 - Aile A - Actions menées
Plan R+6	Plan R+6 - Aile B - Actions menées
Plan R+6	Plan R+6 - Aile C - Actions menées
Plan R+6	Plan R+6 - Aile D - Actions menées
Plan R+6	Plan R+6 - Aile D - MPCA Toutes catégories confondues
Plan R+6	Plan R+6 - Aile D - MPCA Conduits, canalisations et équipements
Plan R+6	Plan R+6 - Aile P - Actions menées
Plan R+7	Plan R+7 - Plan de repérage - Actions menées
Plan R+7	Plan R+7 - Aile A - Actions menées
Plan R+7	Plan R+7 - Aile B - Actions menées
Plan R+7	Plan R+7 - Aile C D - Actions menées
Plan R+7	Plan R+7 - Aile P - Actions menées
Plan R+8	Plan R+8 - Plan de repérage - Actions menées
Plan façade intérieur	Plan façade intérieur - Plan de repérage - Actions menées
Plan façade intérieur	Plan façade intérieur - MPCA Toutes catégories confondues
Plan façade intérieur	Plan façade intérieur - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan façade extérieur	Plan façade extérieur - Plan de repérage - Actions menées
Plan façade extérieur	Plan façade extérieur - MPCA Toutes catégories confondues

Plan façade extérieur	Plan façade extérieur - MPCA Façades
Plan façade extérieur	Plan façade extérieur - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Plan sous sol -3	Plan sous sol -3 - Plan de repérage - Actions menées
Local fioul	Local fioul - Plan de repérage - Actions menées

PLAN SOUS-SOL -2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

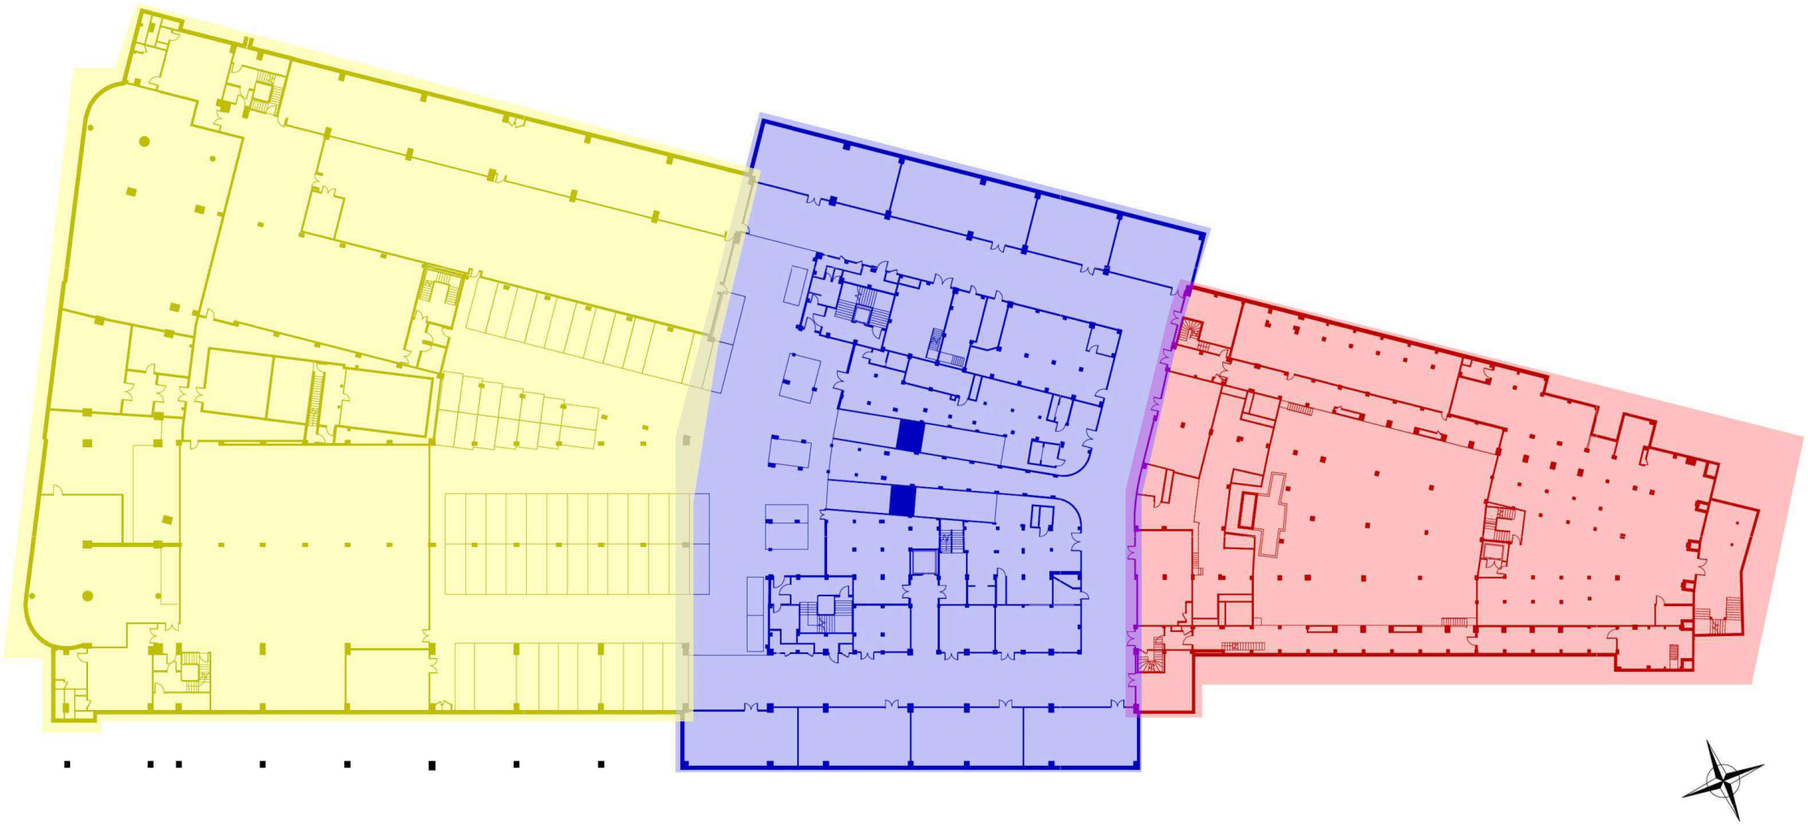

Légende	
	Aile nord D
	Aile centre C
	Aile sud A B P


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -2 - AILE NORD D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5



Plan de situation

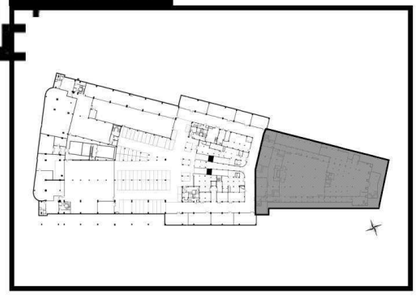

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -2 - AILE NORD D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5



Légende

	S91: Conduit en fibres-ciment
	S92: Conduit en fibres-ciment
	P748 : Colle disolant
	S1803: Conduit en fibres-ciment
	S1802: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -2 - AILE NORD D - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002KN000189-5



Légende

	S91: Conduit en fibres-ciment
	S92: Conduit en fibres-ciment
	P748 : Colle disolant
	S1803: Conduit en fibres-ciment
	S1802: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -2 - AILE CENTRE C - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation

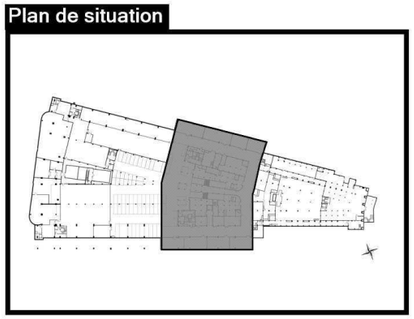

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -2 - AILE CENTRE C - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5



Légende

	P335 : Conduit en fibres-ciment
	S9: Conduit en fibres-ciment
	S12: Conduit en fibres-ciment
	S11: Conduit en fibres-ciment
	S10: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation

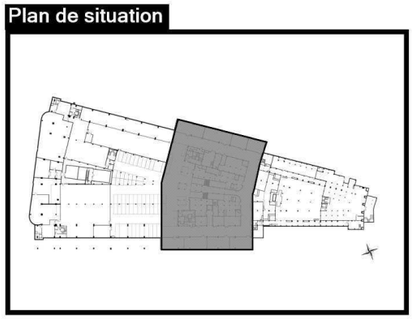

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -2 - AILE CENTRE C - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002KN000189-5



Légende

	P335 : Conduit en fibres-ciment
	S9: Conduit en fibres-ciment
	S12: Conduit en fibres-ciment
	S11: Conduit en fibres-ciment
	S10: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation

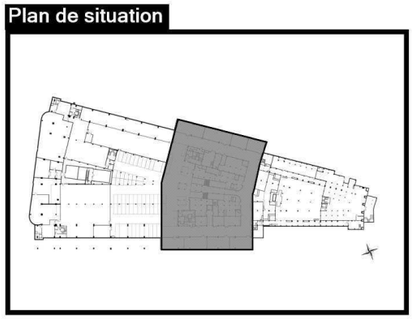


AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -2 - AILE SUD A B P - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

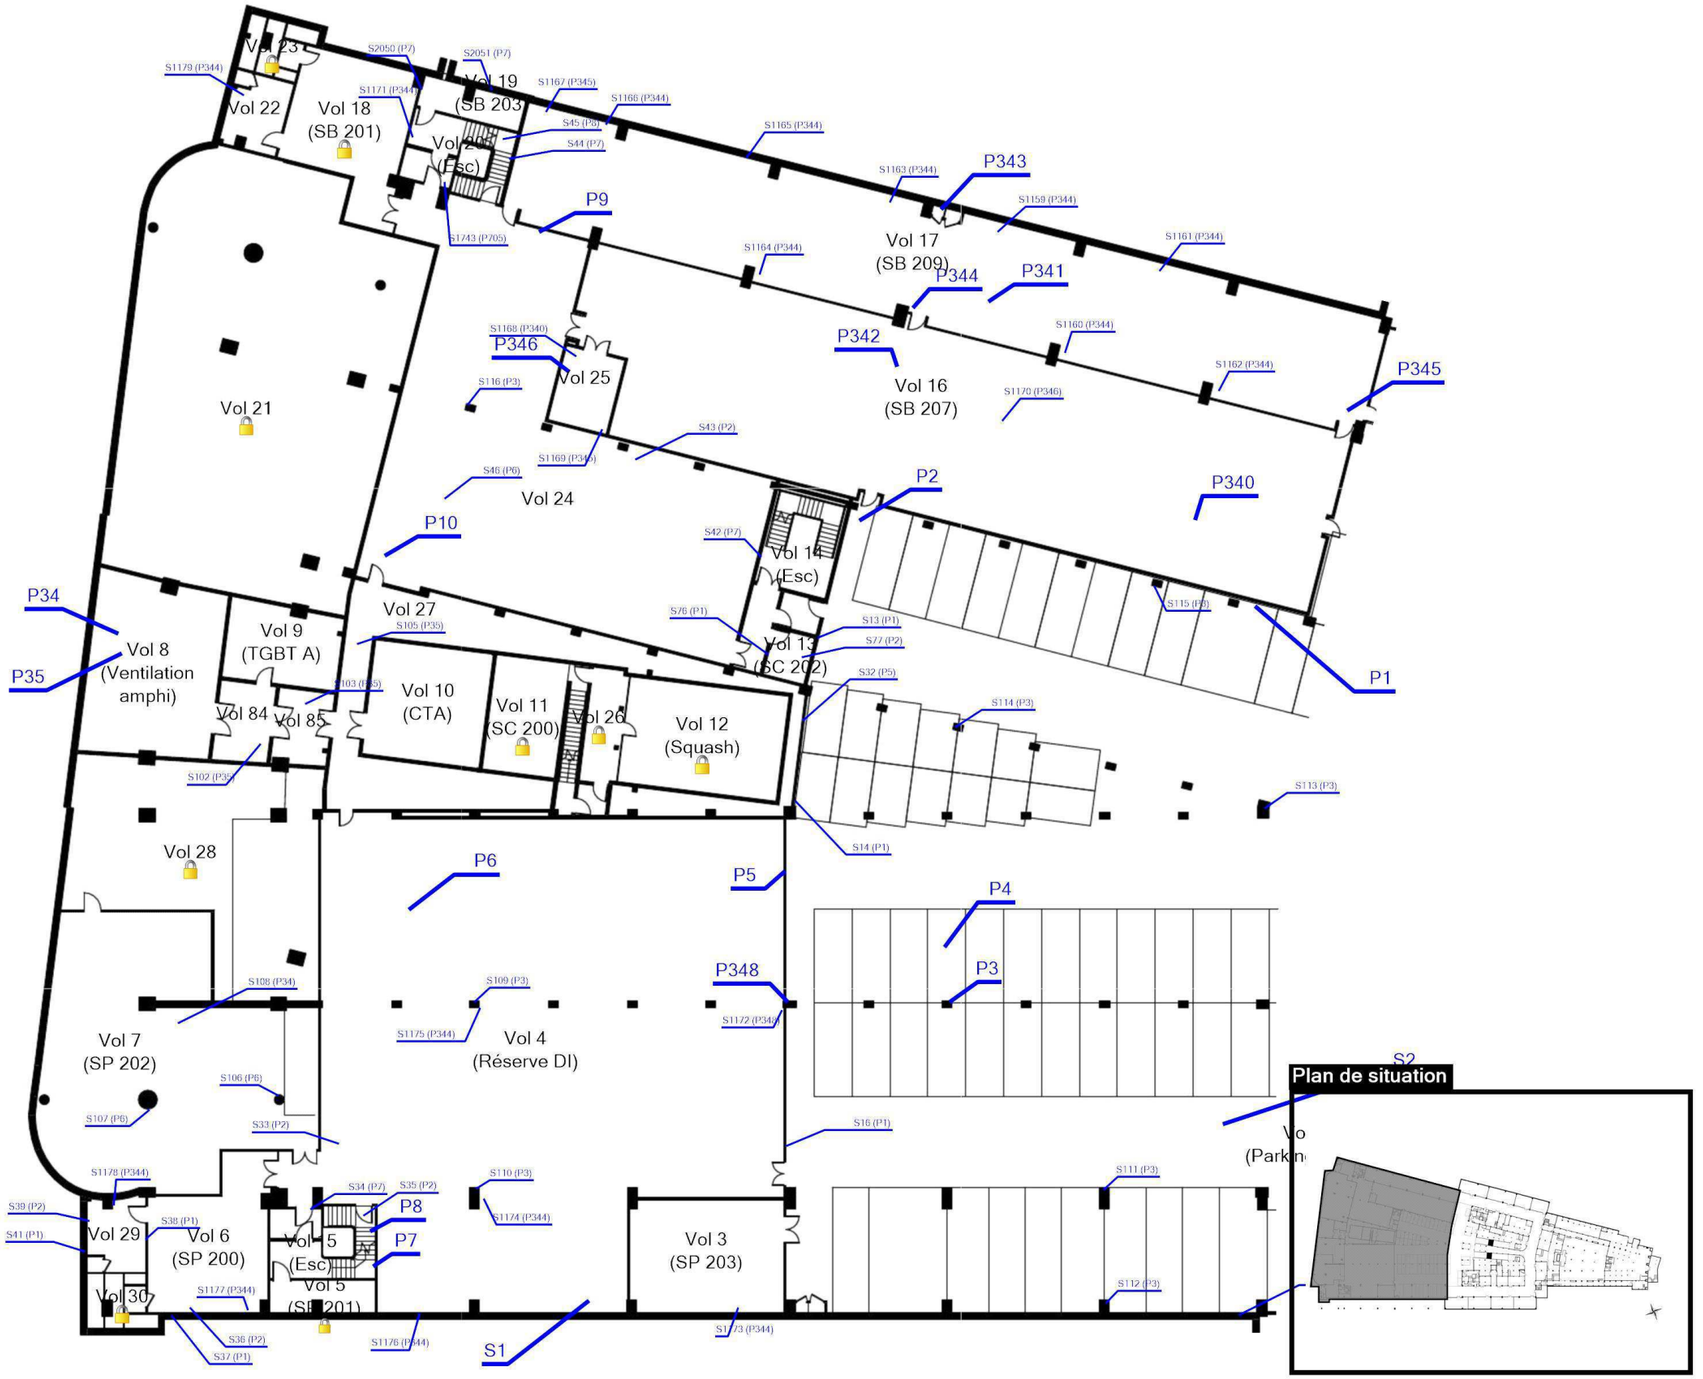

Plan de situation

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5



Légende	
	Aile nord D
	Aile centre C
	Aile sud A B P

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - AILE NORD D - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation

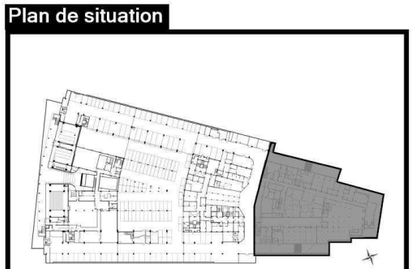

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - AILE NORD D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

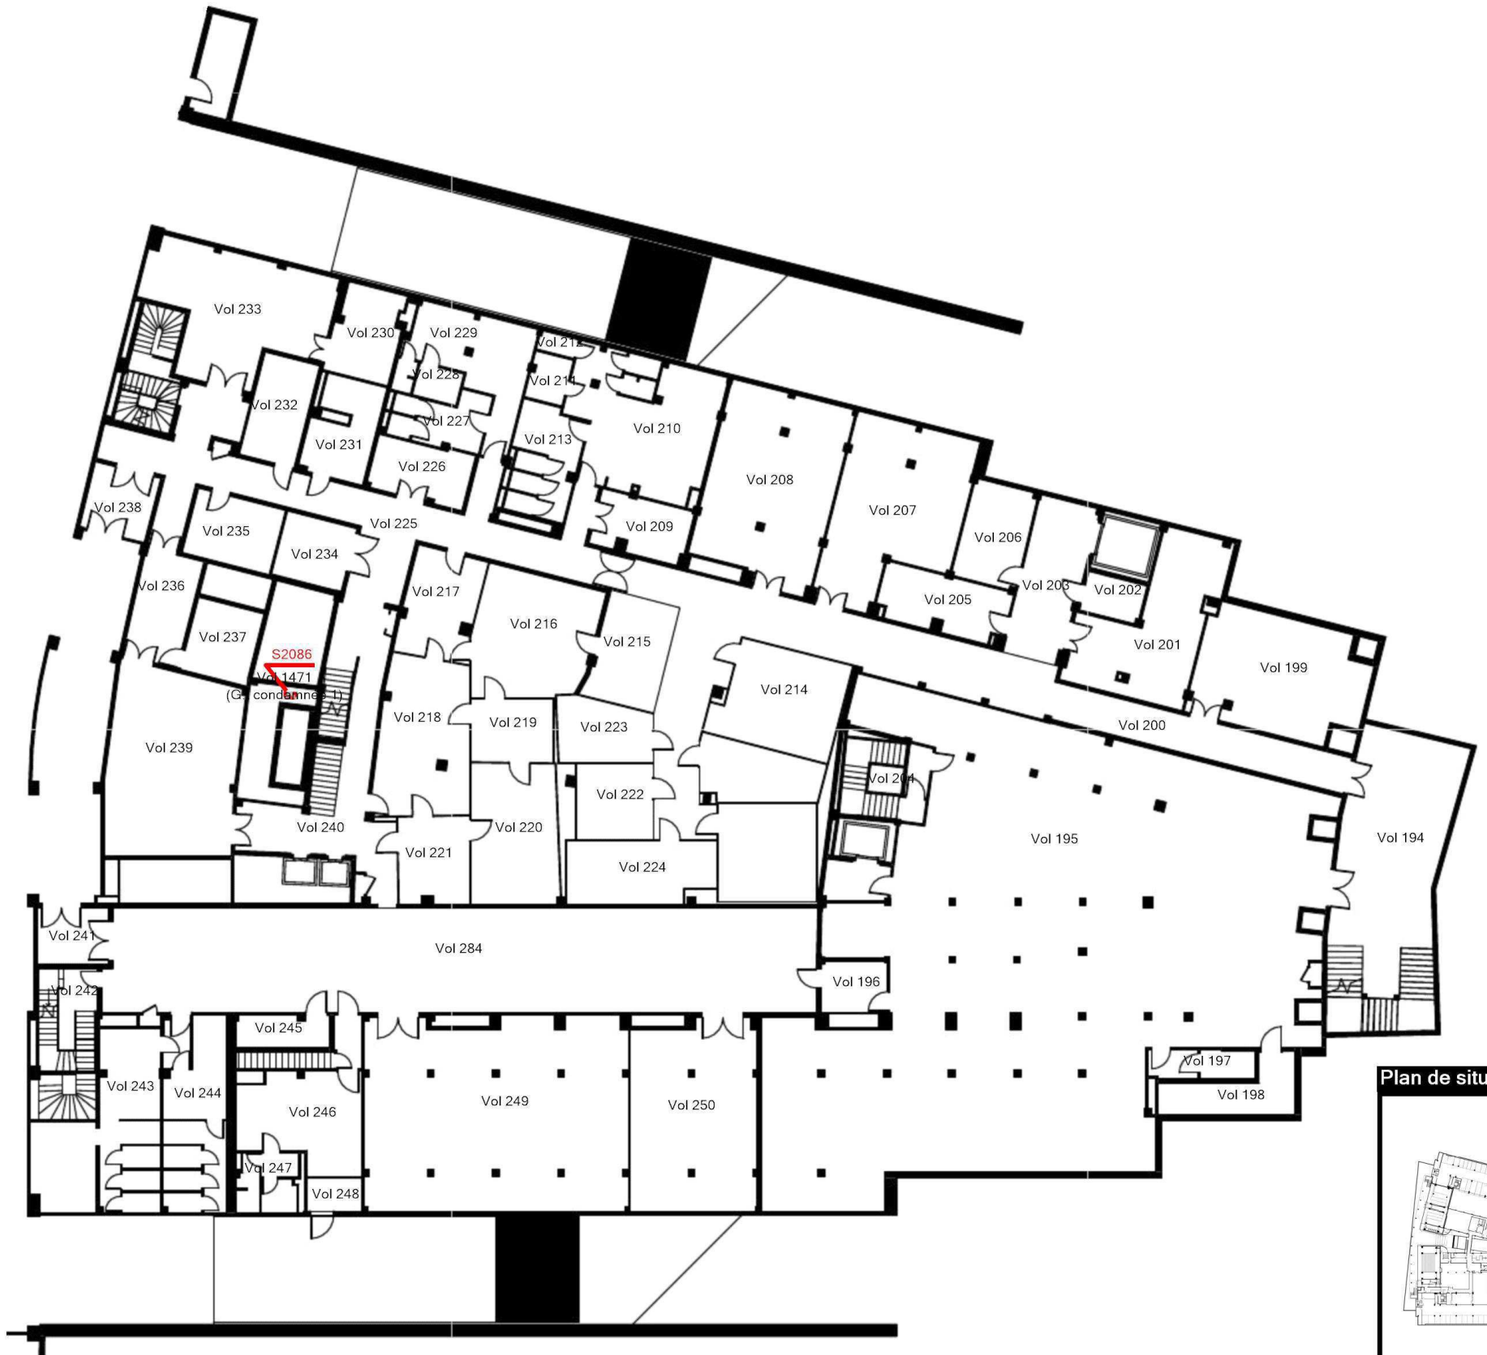

Légende

	S2086: Conduit en fibres-ciment


Plan de situation

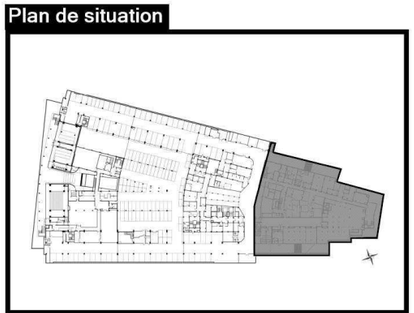

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - AILE NORD D - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002KN000189-5

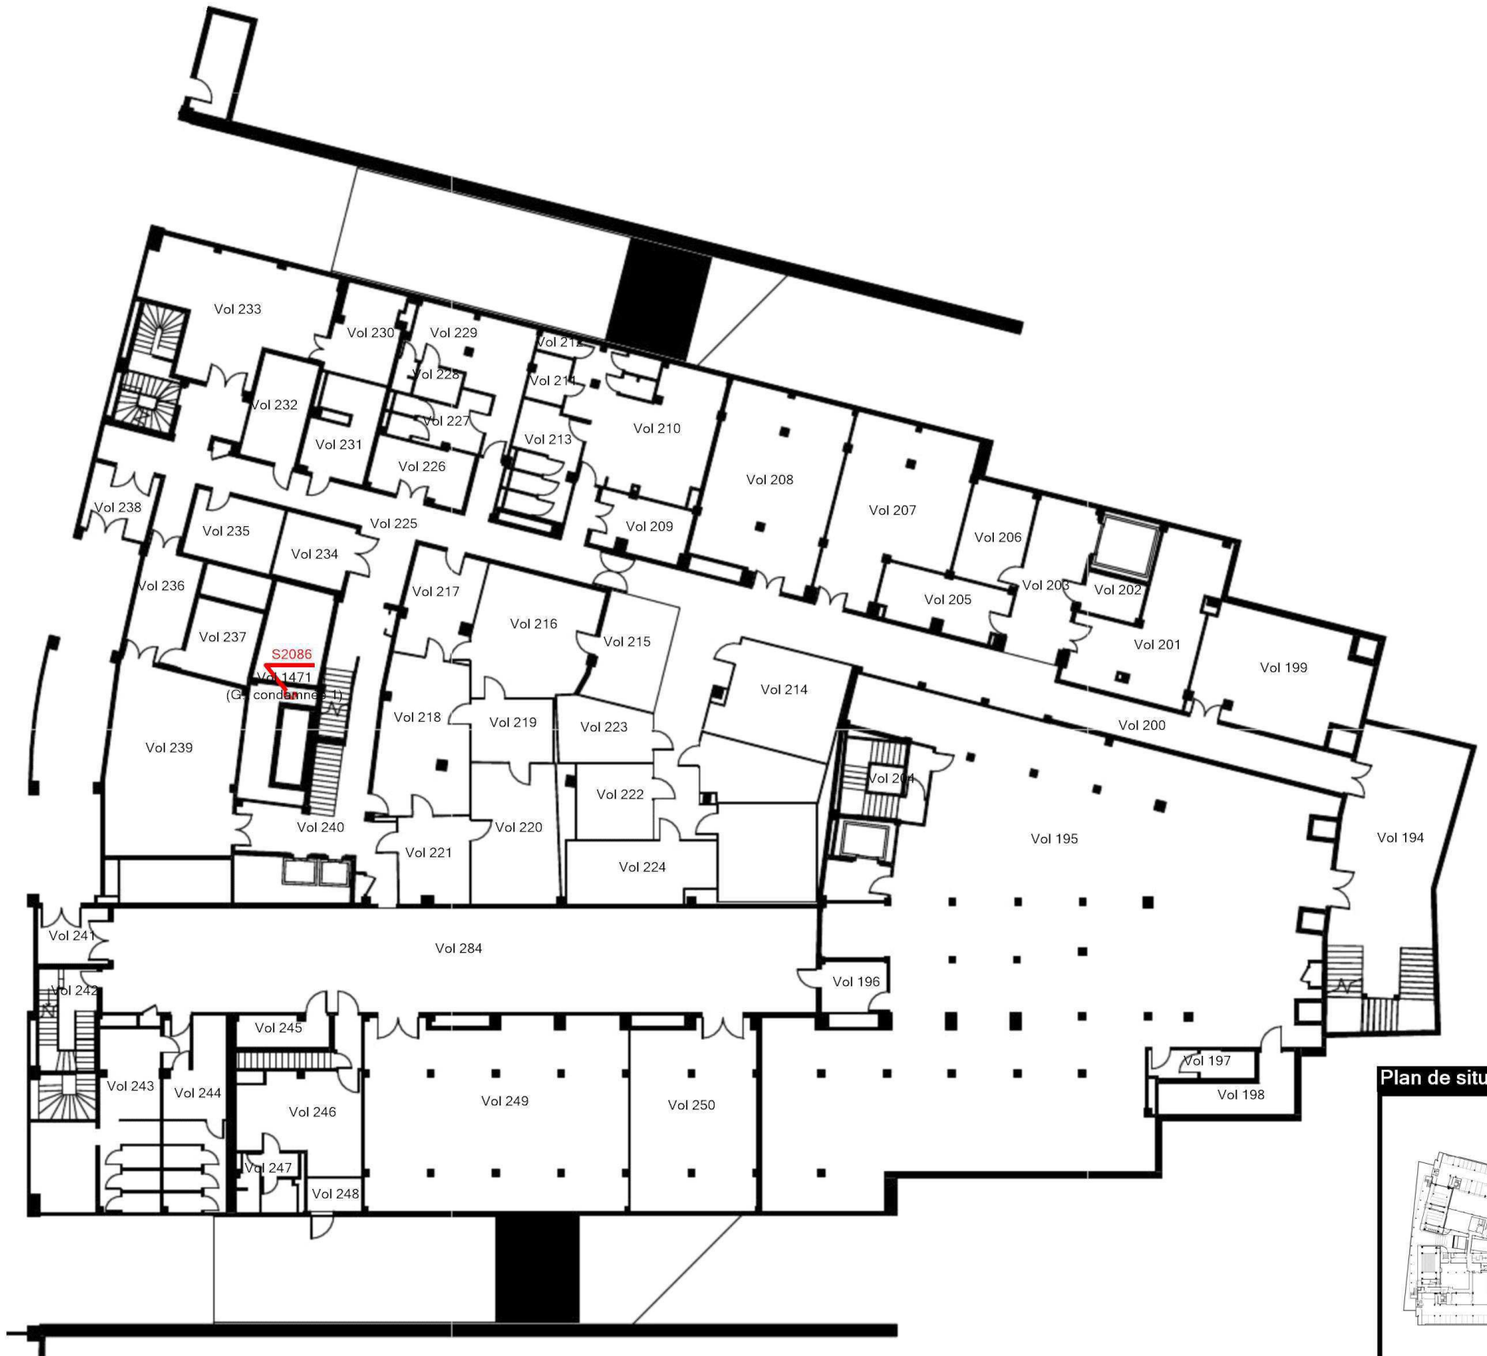

Légende

	S2086: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation

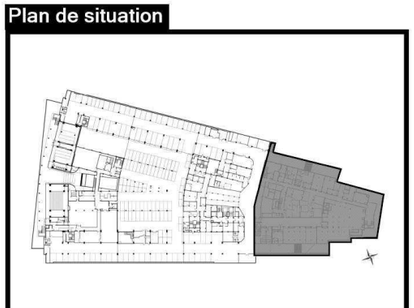

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - AILE CENTRE C - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation

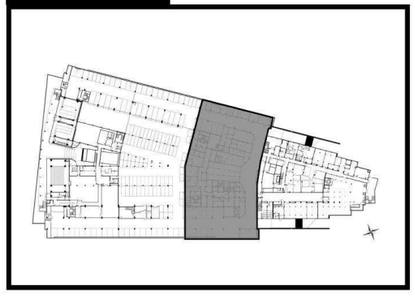

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - AILE CENTRE C - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5



Légende

	P291 : Colles de carrelage
	P293 : Conduit en fibres-ciment
	P290 : Colle de carrelage (plinthe)


Plan de situation

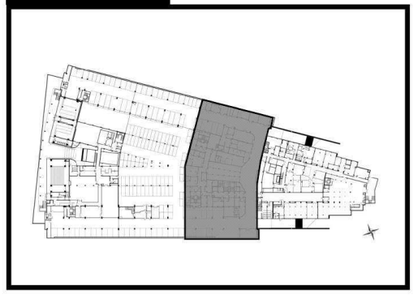

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - AILE CENTRE C - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002KN000189-5

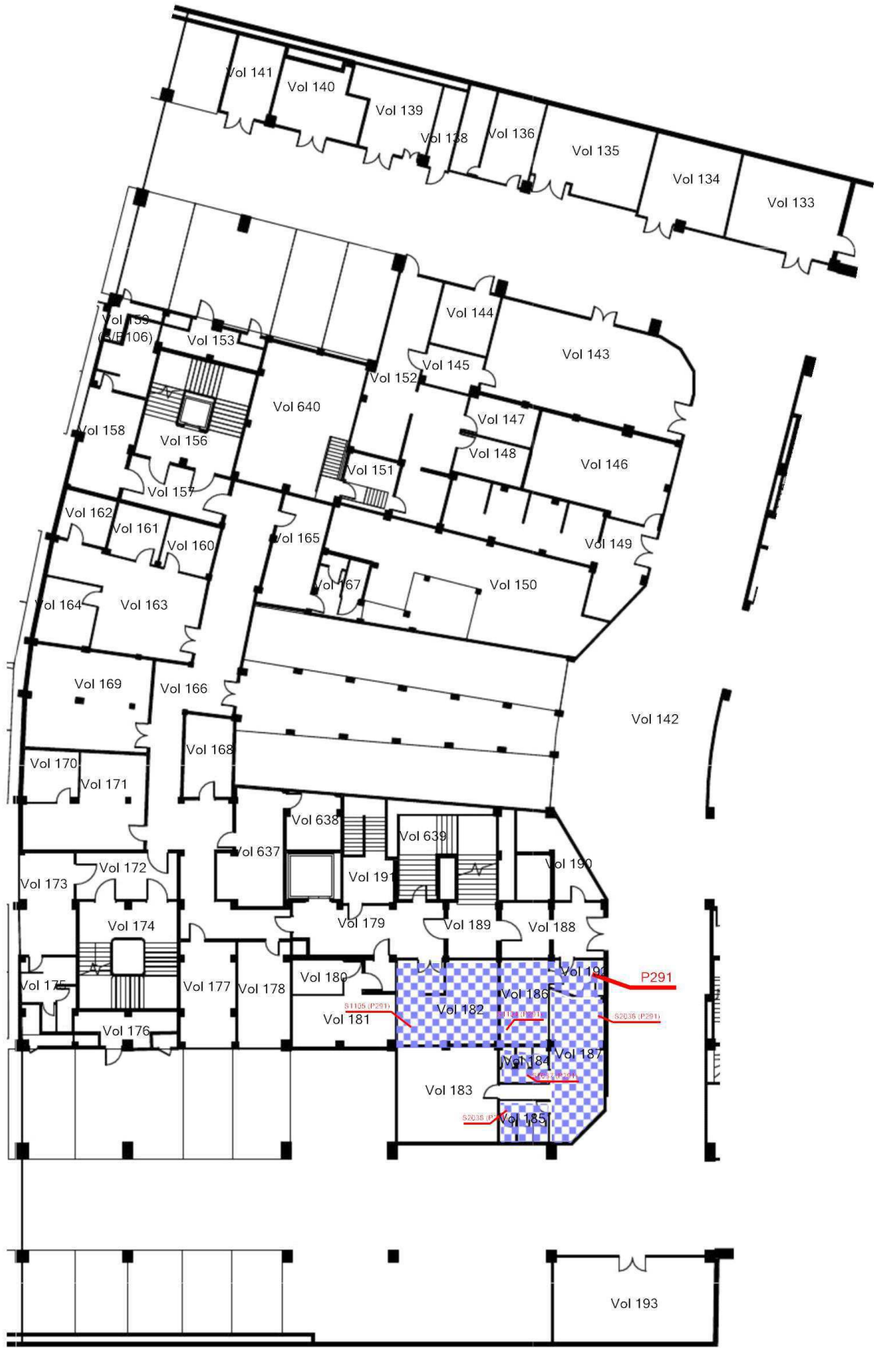

Légende

	P291 : Colles de carrelage


Plan de situation

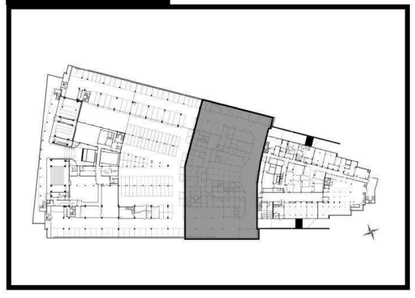

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - AILE CENTRE C - MPCA REVÊTEMENT DE MUR


Référence:
002KN000189-5

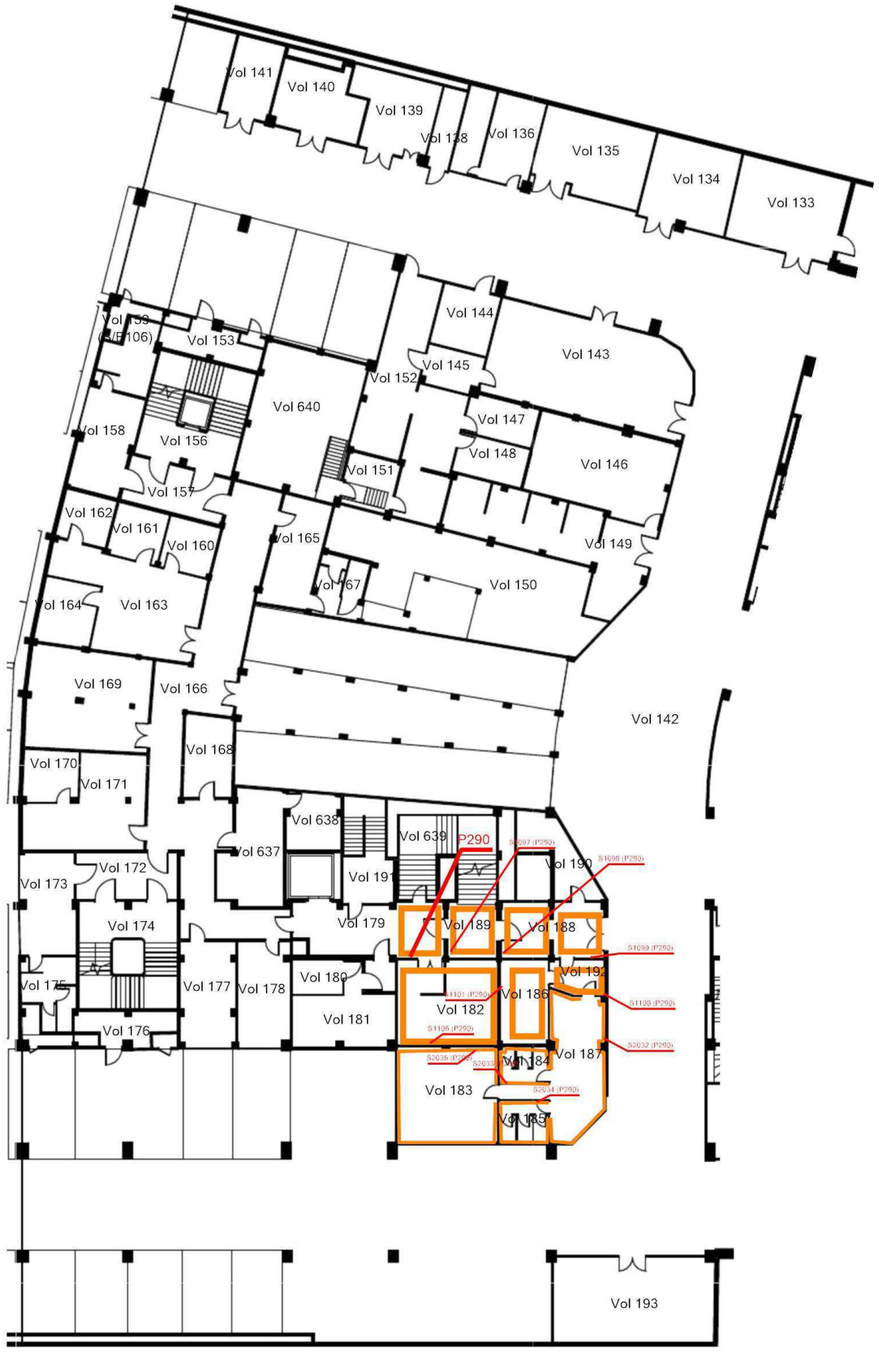

Légende

	P290 : Colle de carrelage (plinthe)


Plan de situation

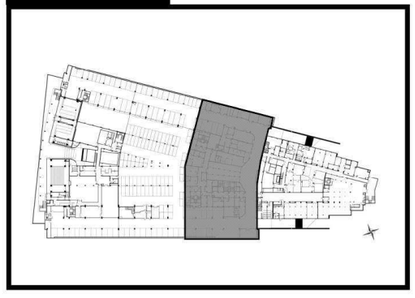

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - AILE CENTRE C - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002KN000189-5

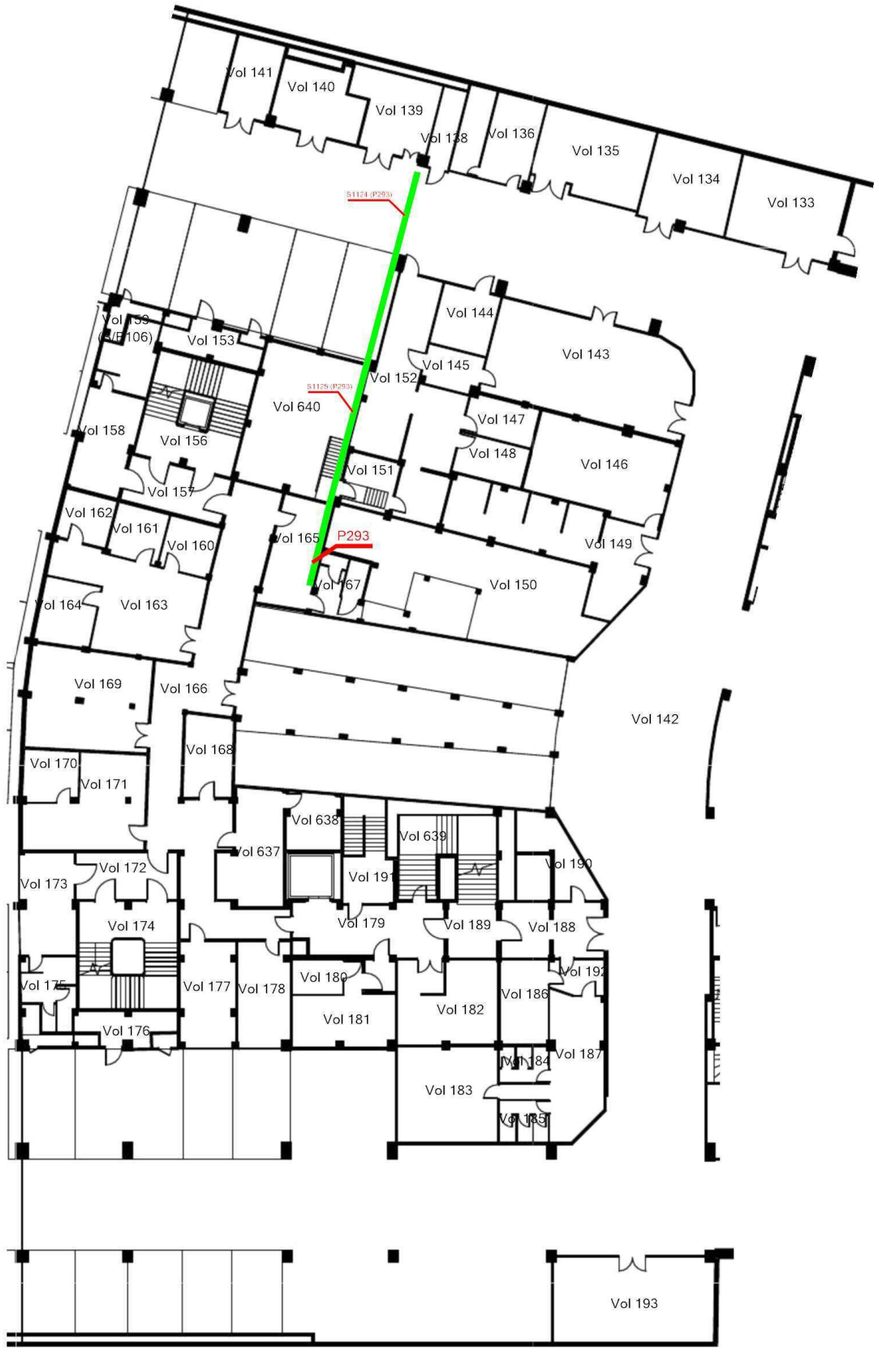

Légende

	P293 : Conduit en fibres-ciment

Plan de situation

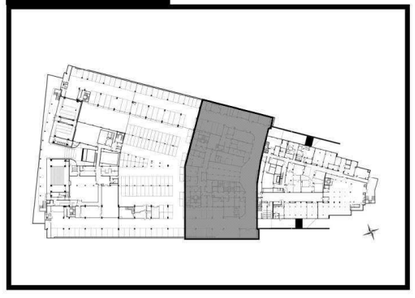

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - AILE SUD A B P - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation

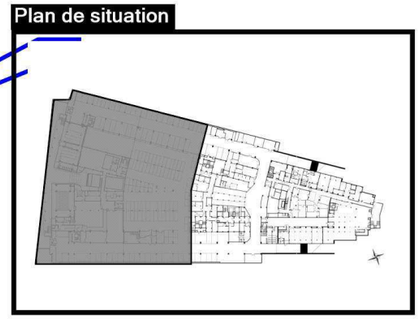


AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - AILE SUD A B P - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

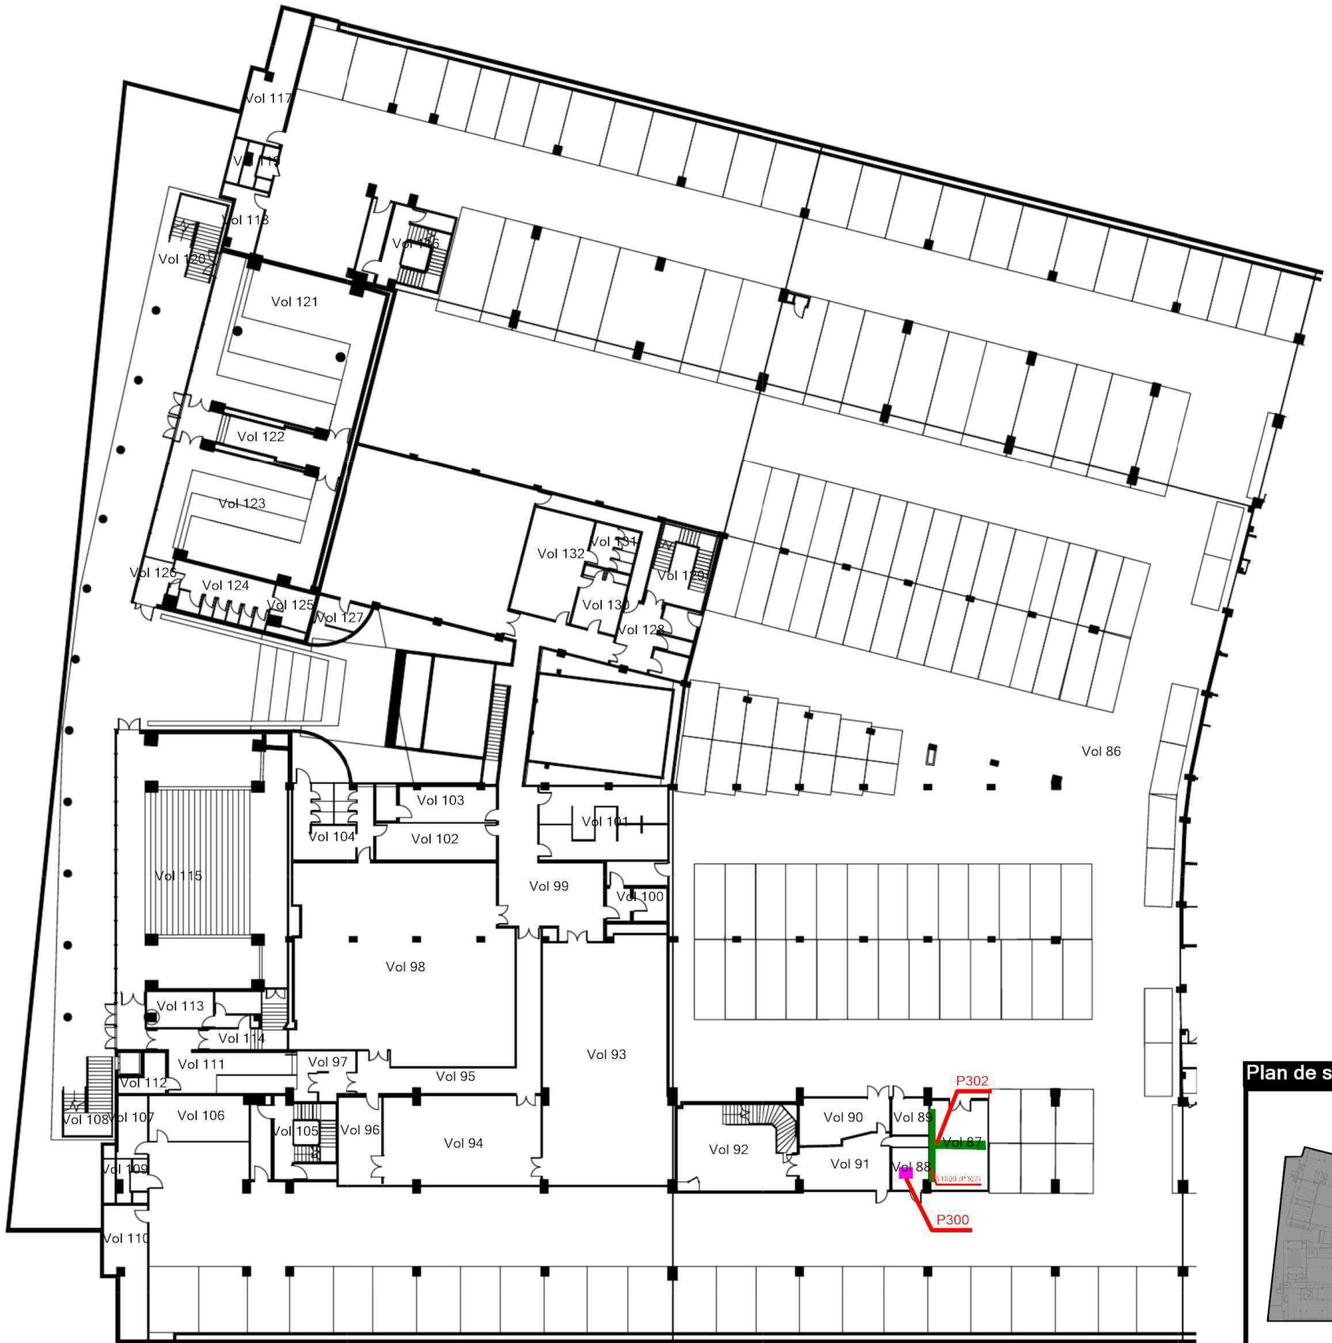

Légende

	P300 : Frein
	P302 : Plaques menuiserie

Plan de situation

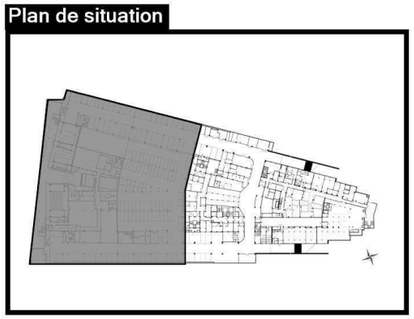


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS-SOL -1 - AILE SUD A B P - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002KN000189-5



Plan de situation

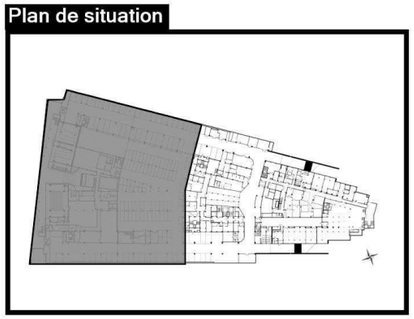


Légende	
	P302 : Plaques menuiserie

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN SOUS-SOL -1 - AILE SUD A B P - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002KN000189-5

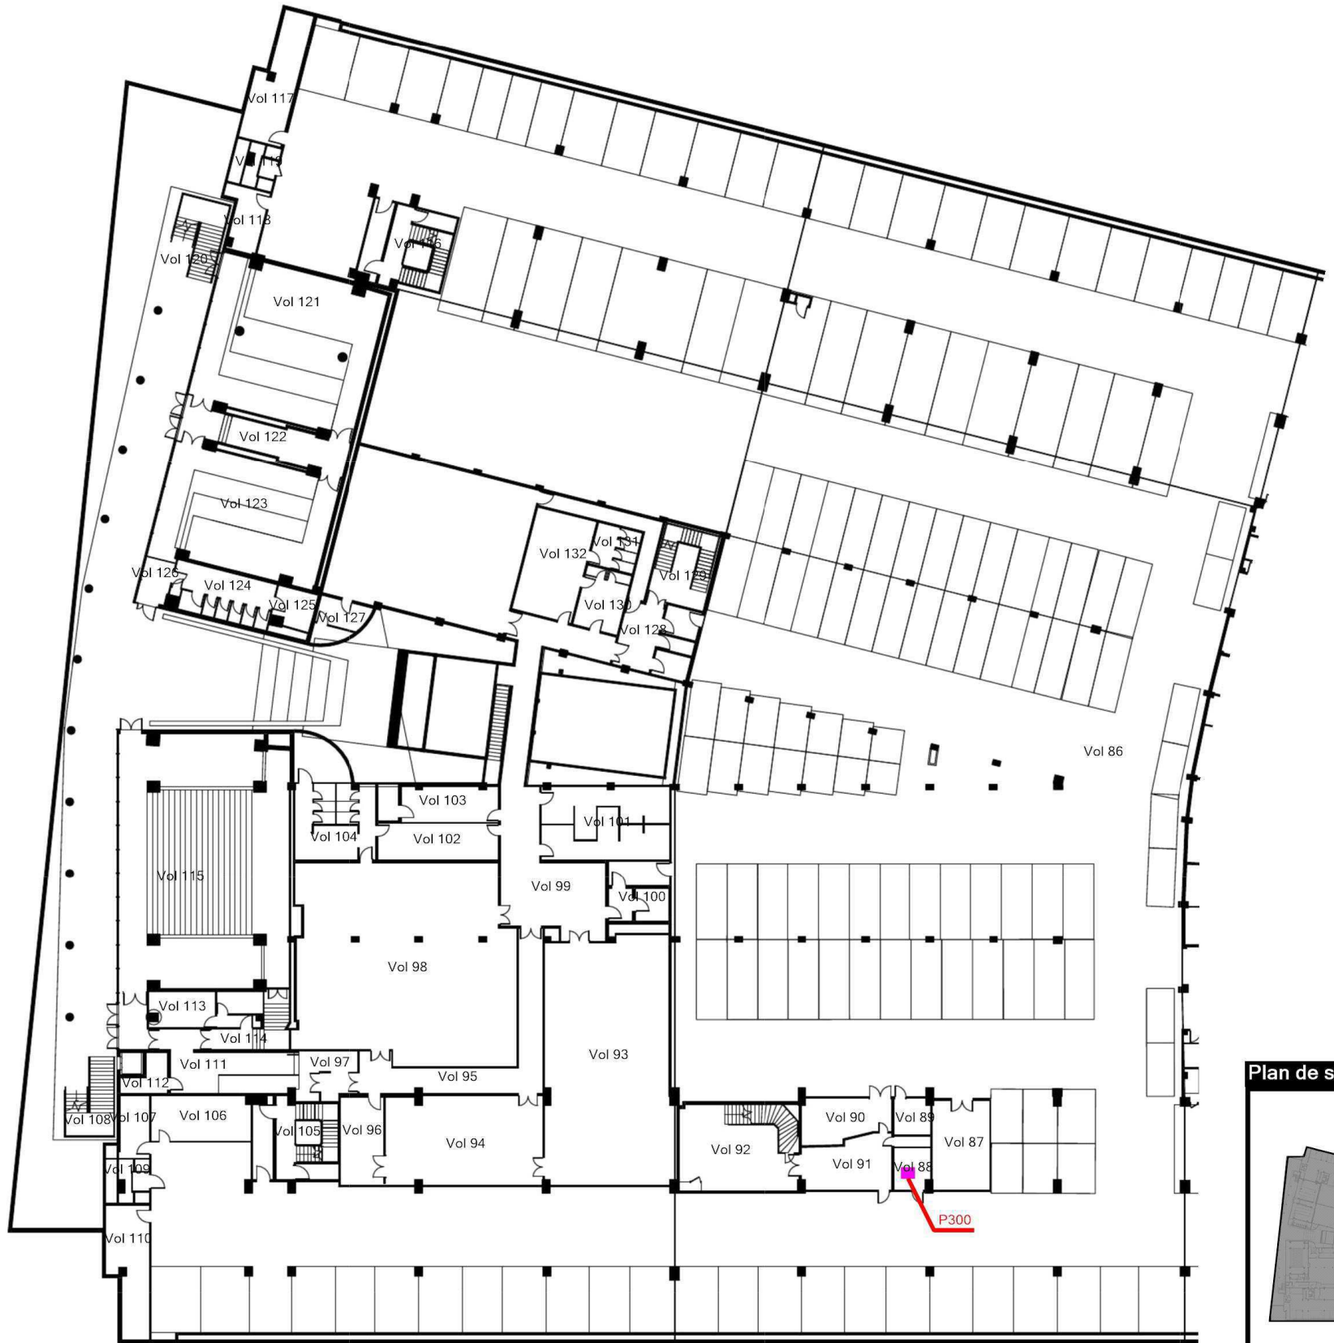

Légende	
	P300 : Frein

Plan de situation

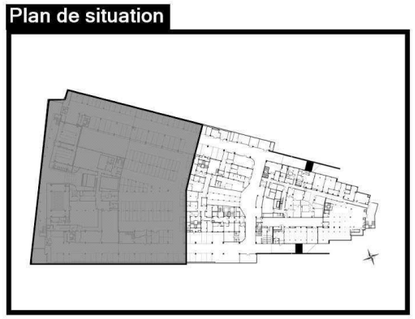

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Aile A
	Aile B
	Aile C
	Aile D
	Aile P

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - PLAN DE REPÉRAGE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5

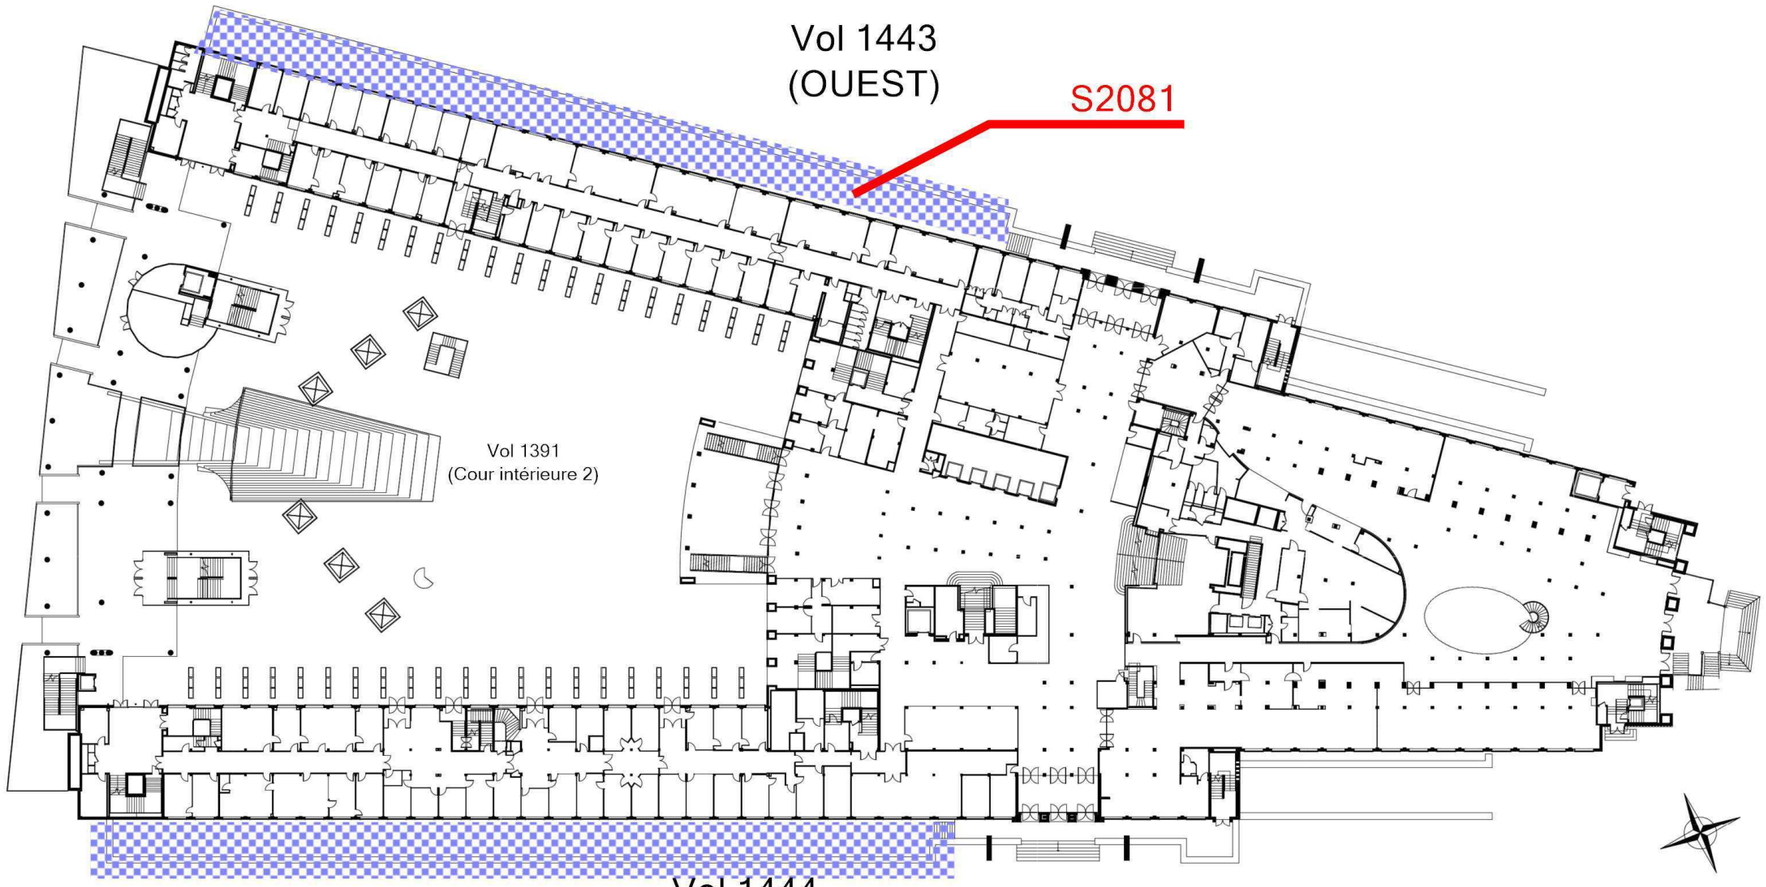


Légende	
	S2081: Joint dilatation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - PLAN DE REPÉRAGE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002KN000189-5

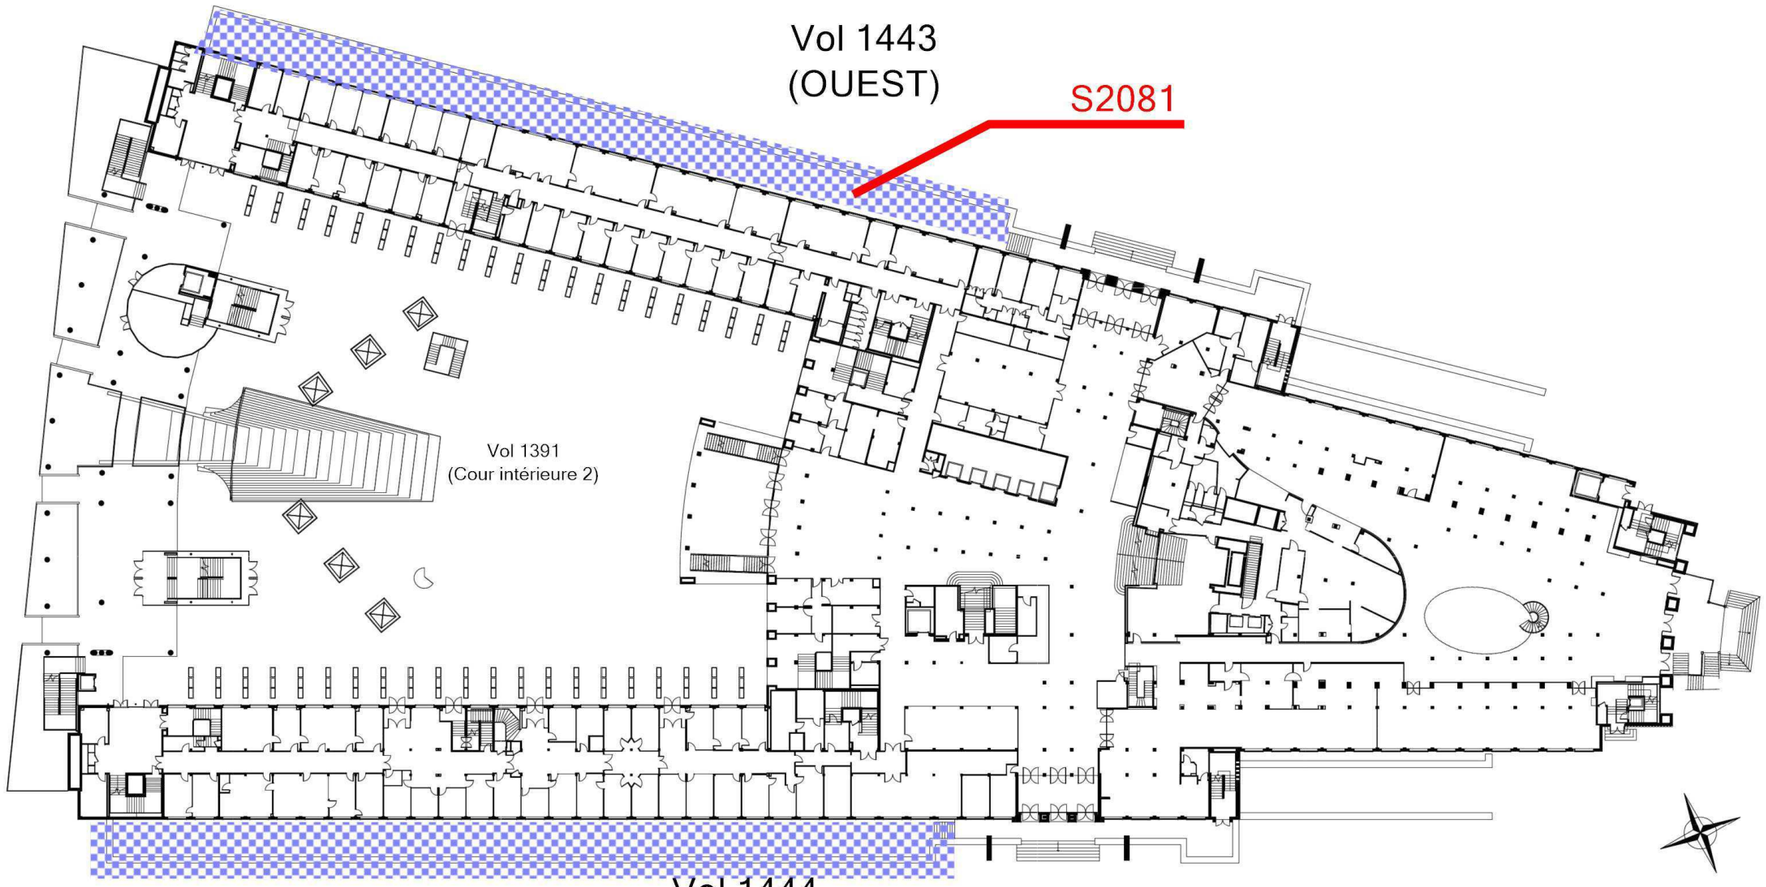

Légende

	S2081: Joint dilatation


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (validité début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PLAN RDC - AILE A - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

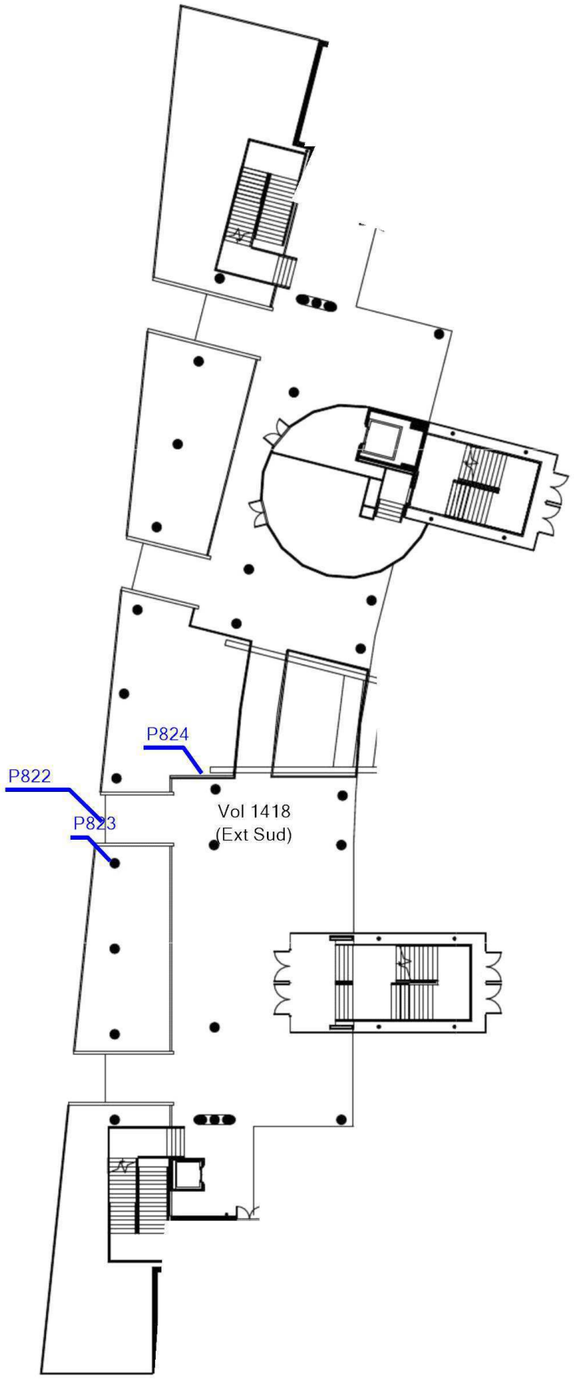

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

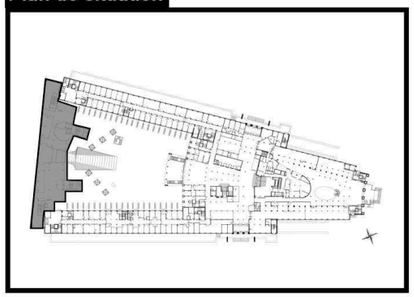


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE B - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

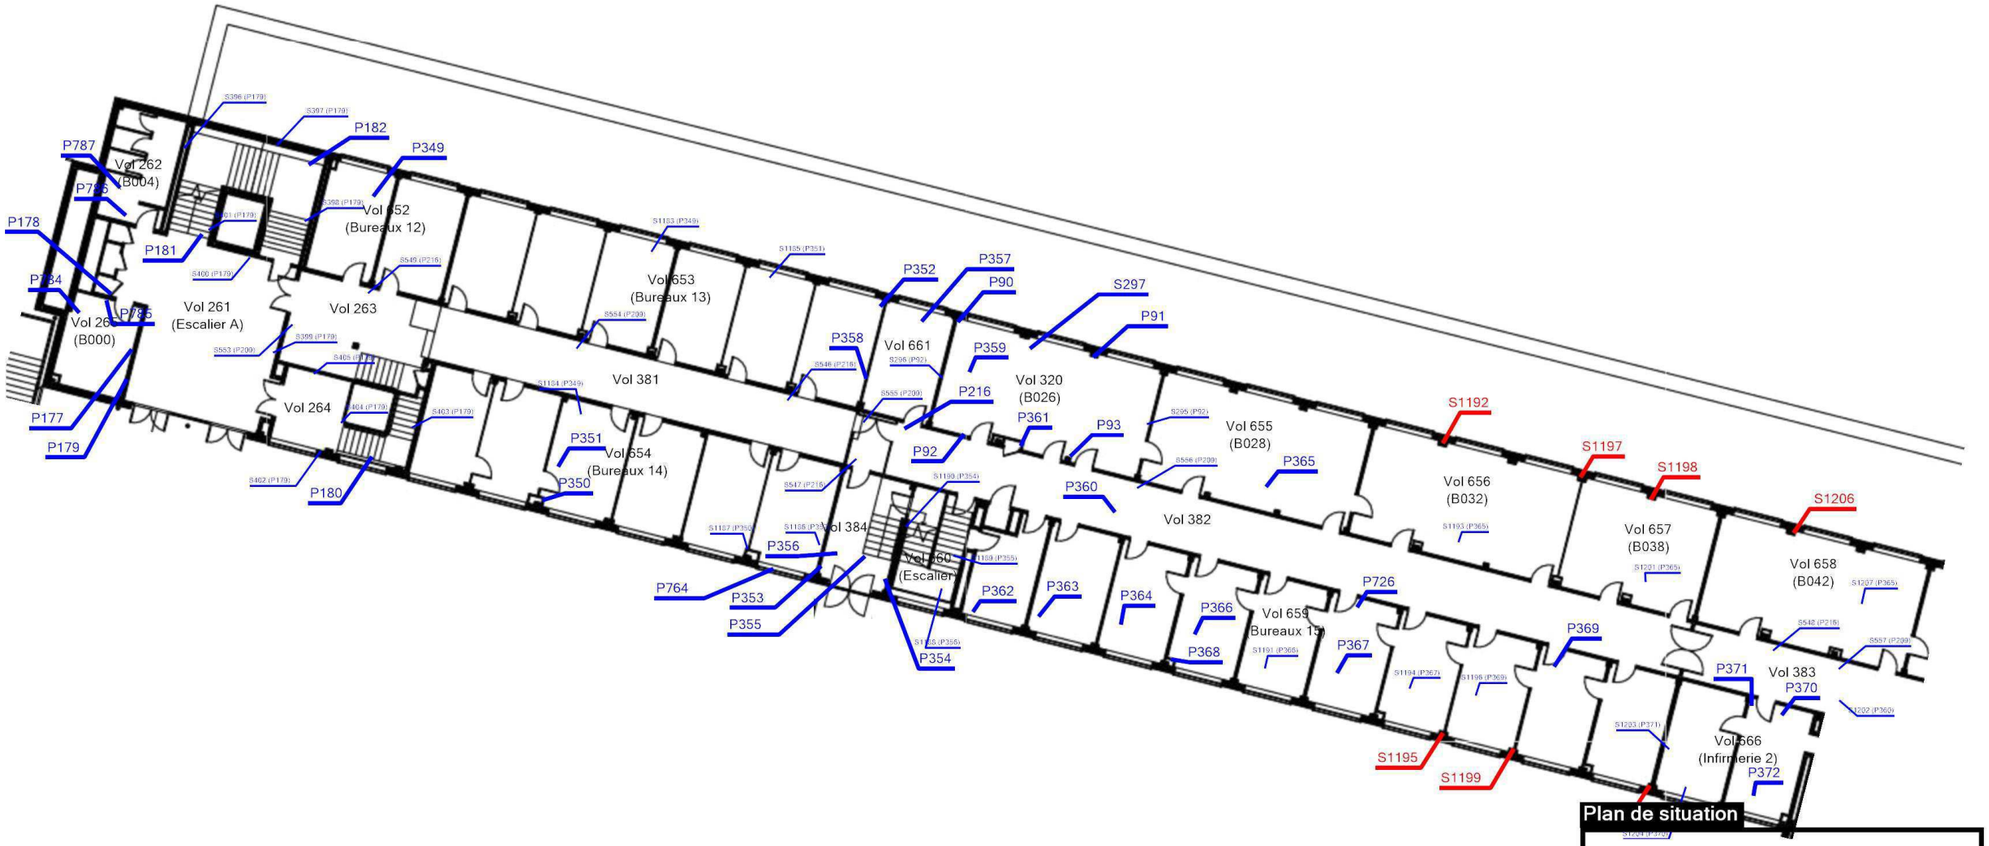

Plan de situation

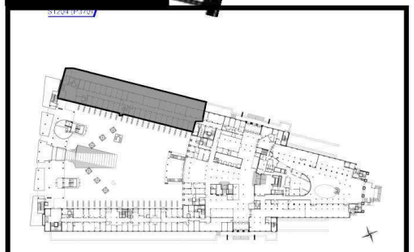


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE B - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5

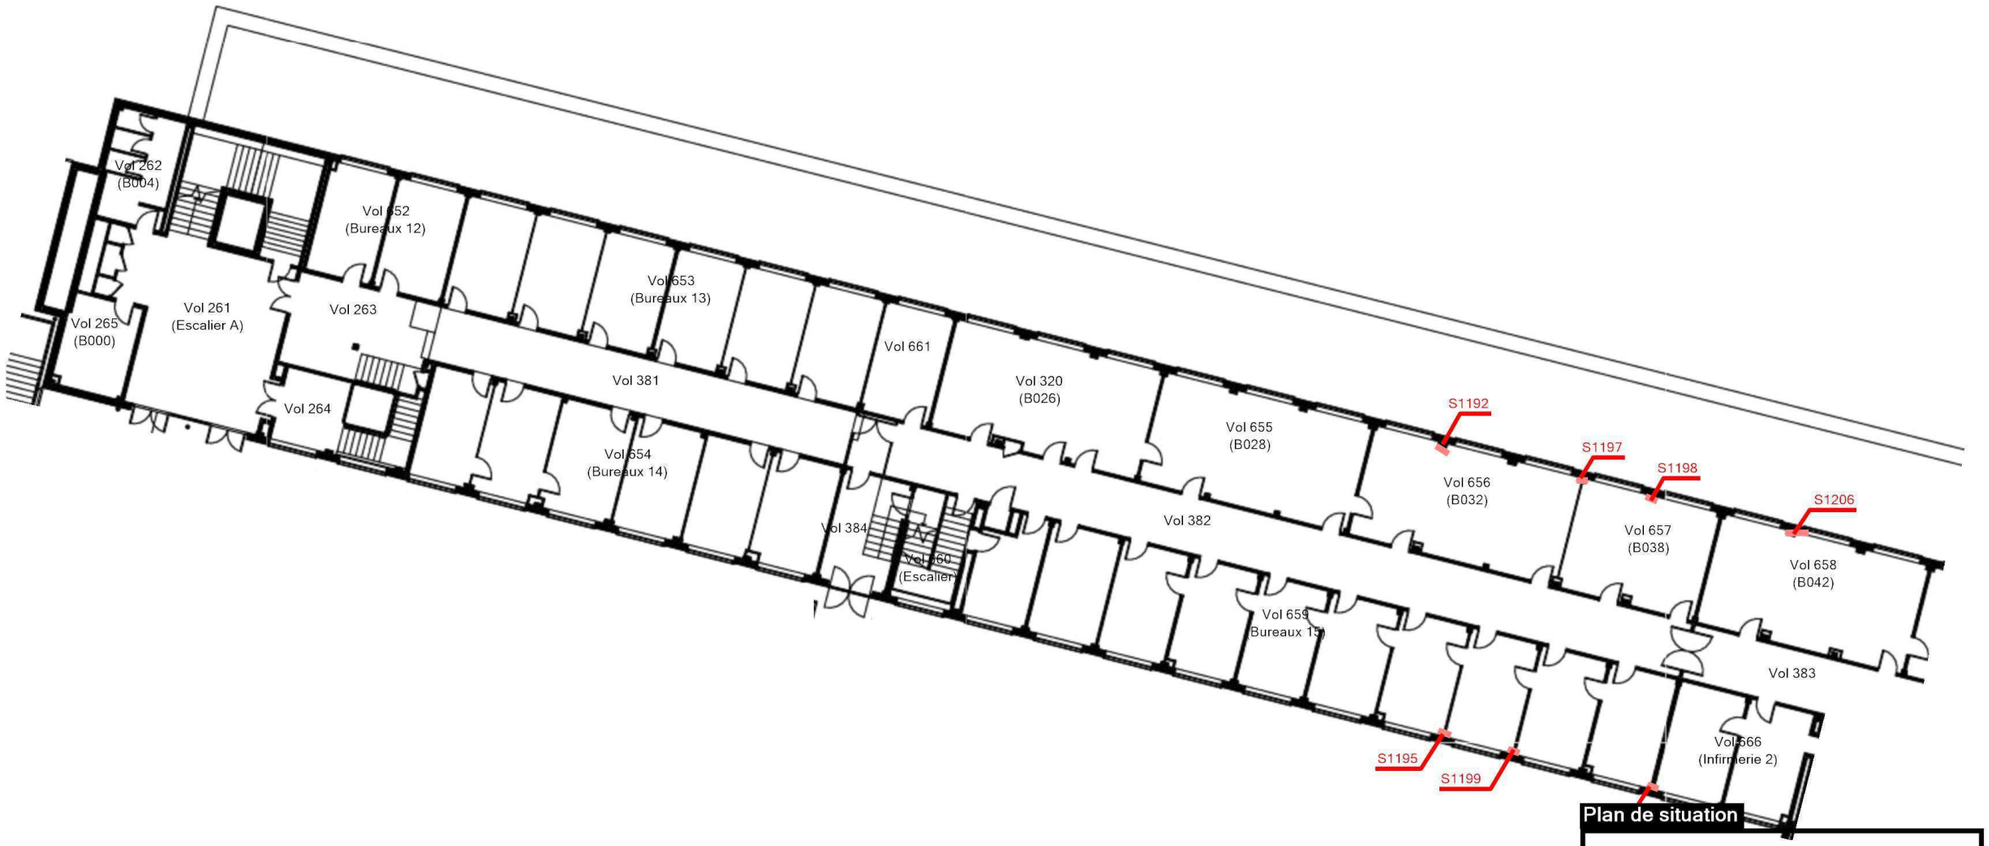

Plan de situation




Légende

	S1198: Panneaux
	S1192: Panneaux
	S1206: Panneaux
	S1200: Panneaux
	S1197: Panneaux
	S1195: Panneaux
	S1199: Panneaux


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE B - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002KN000189-5

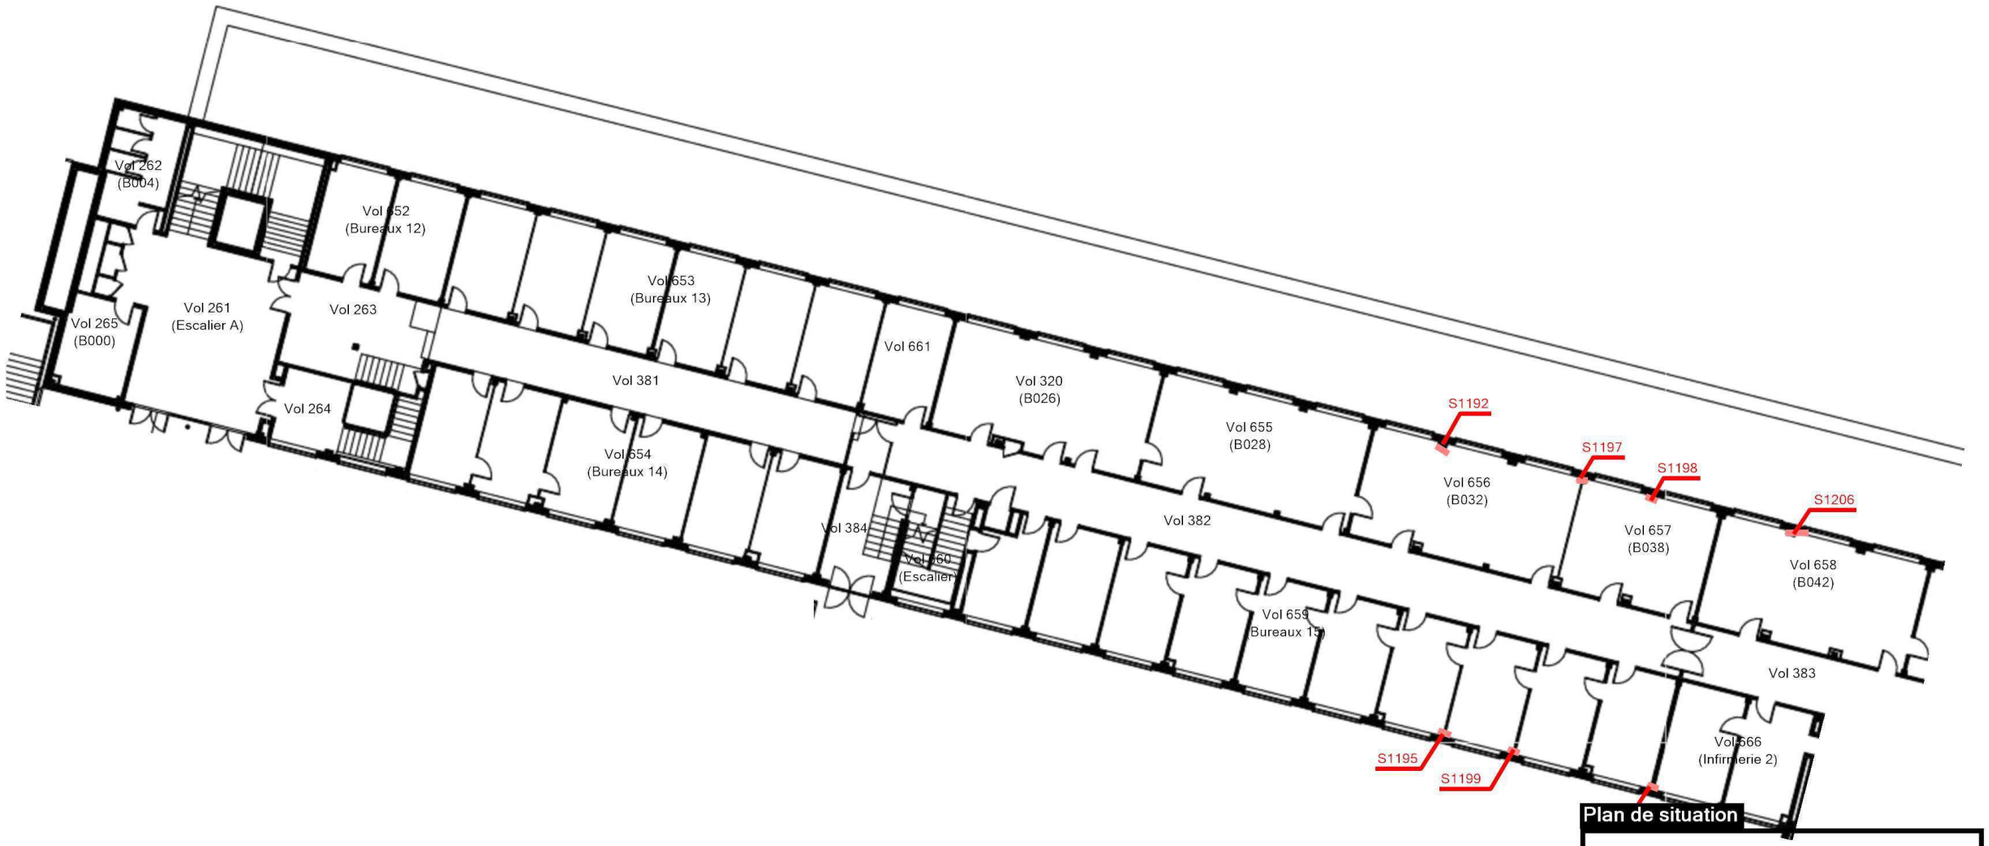

Plan de situation



Légende

	S1198: Panneaux
	S1192: Panneaux
	S1206: Panneaux
	S1200: Panneaux
	S1197: Panneaux
	S1195: Panneaux
	S1199: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE C - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation

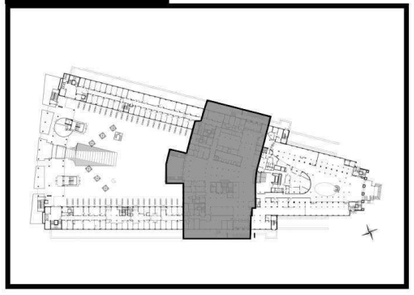

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE C - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

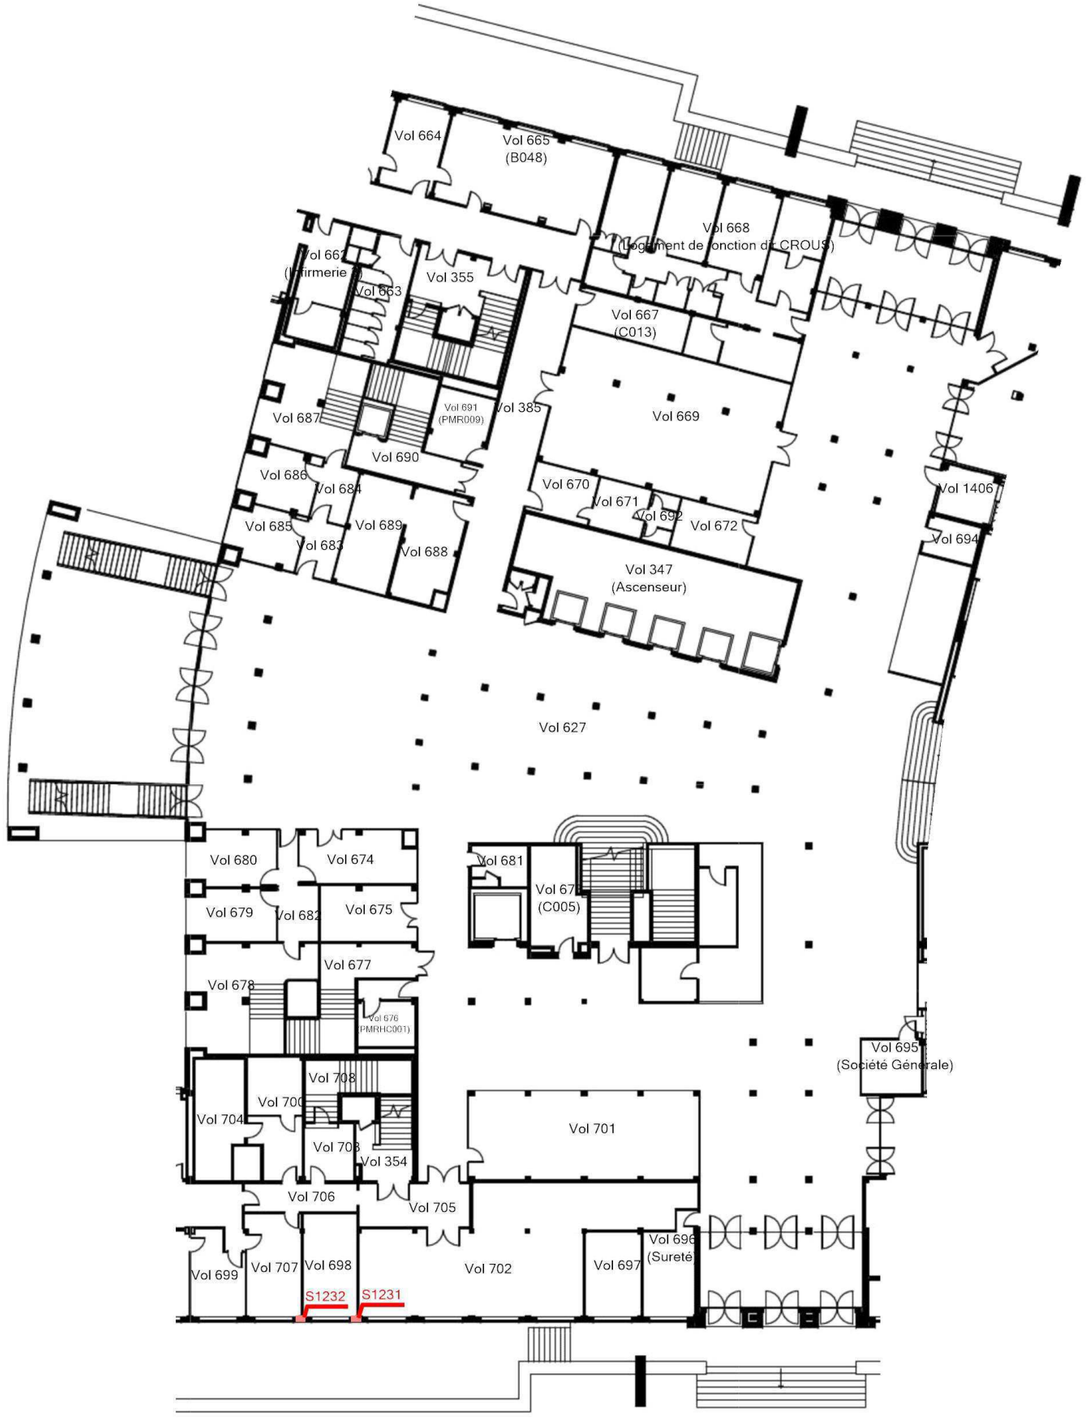

Légende

	S1231: Panneaux
	S1232: Panneaux


Plan de situation

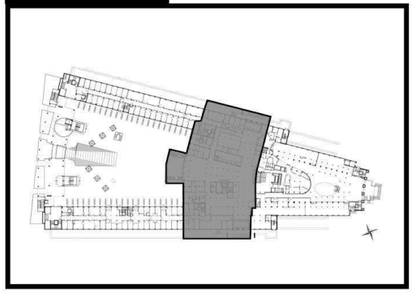

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE C - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002KN000189-5

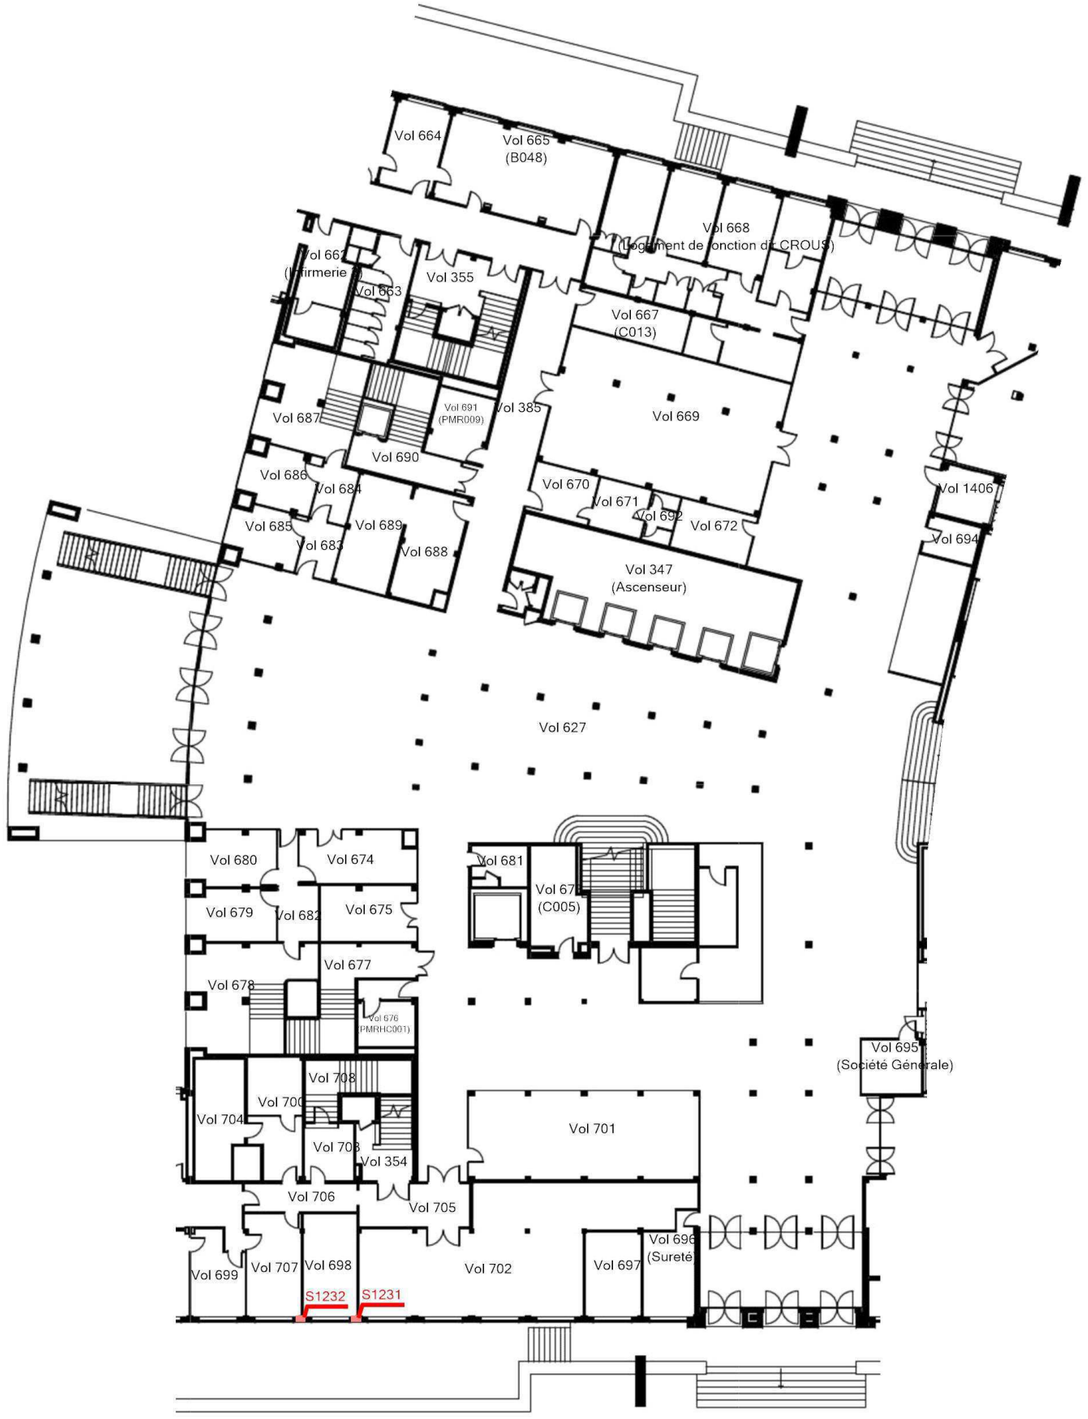

Légende

	S1231: Panneaux
	S1232: Panneaux


Plan de situation

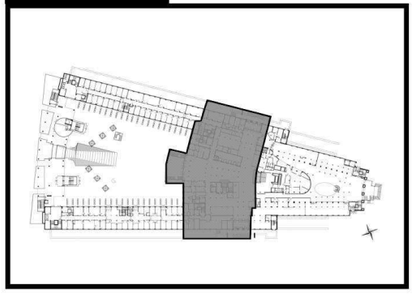

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE D - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

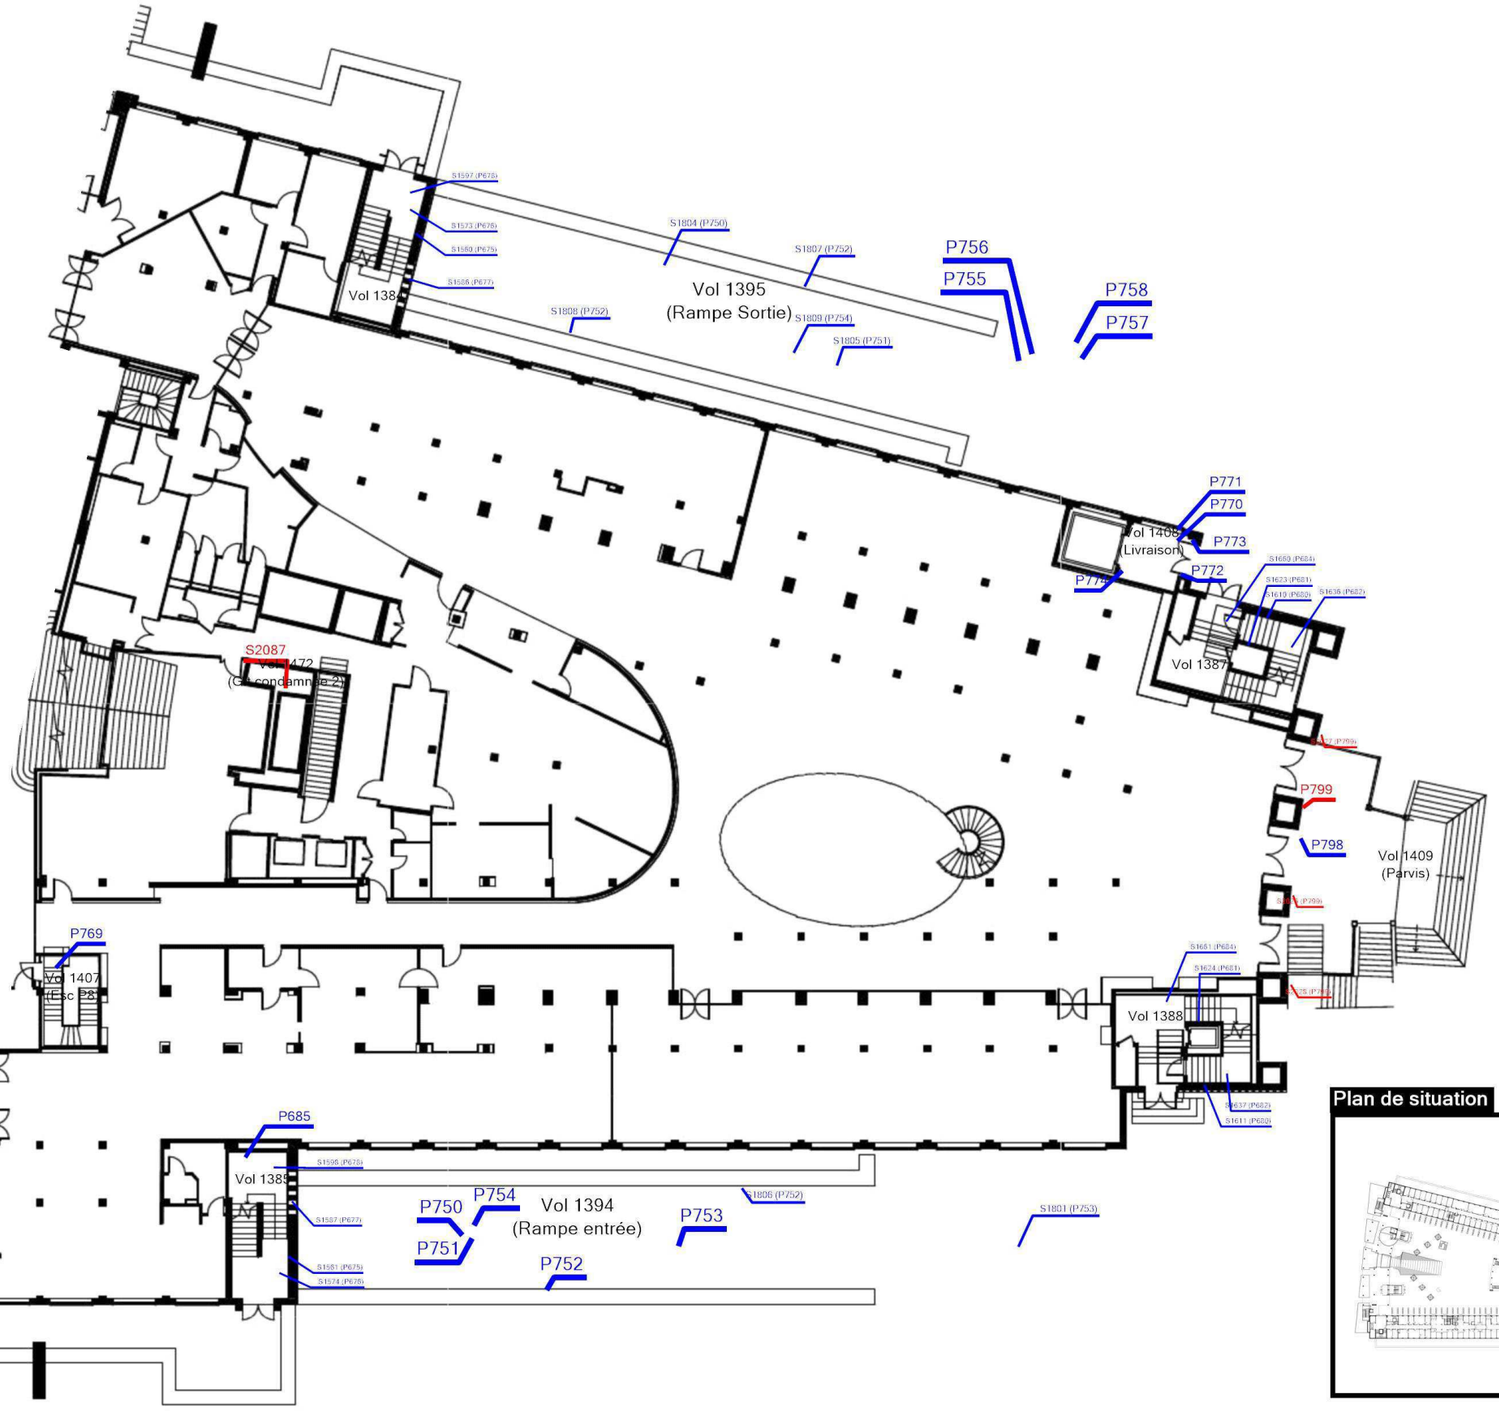

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

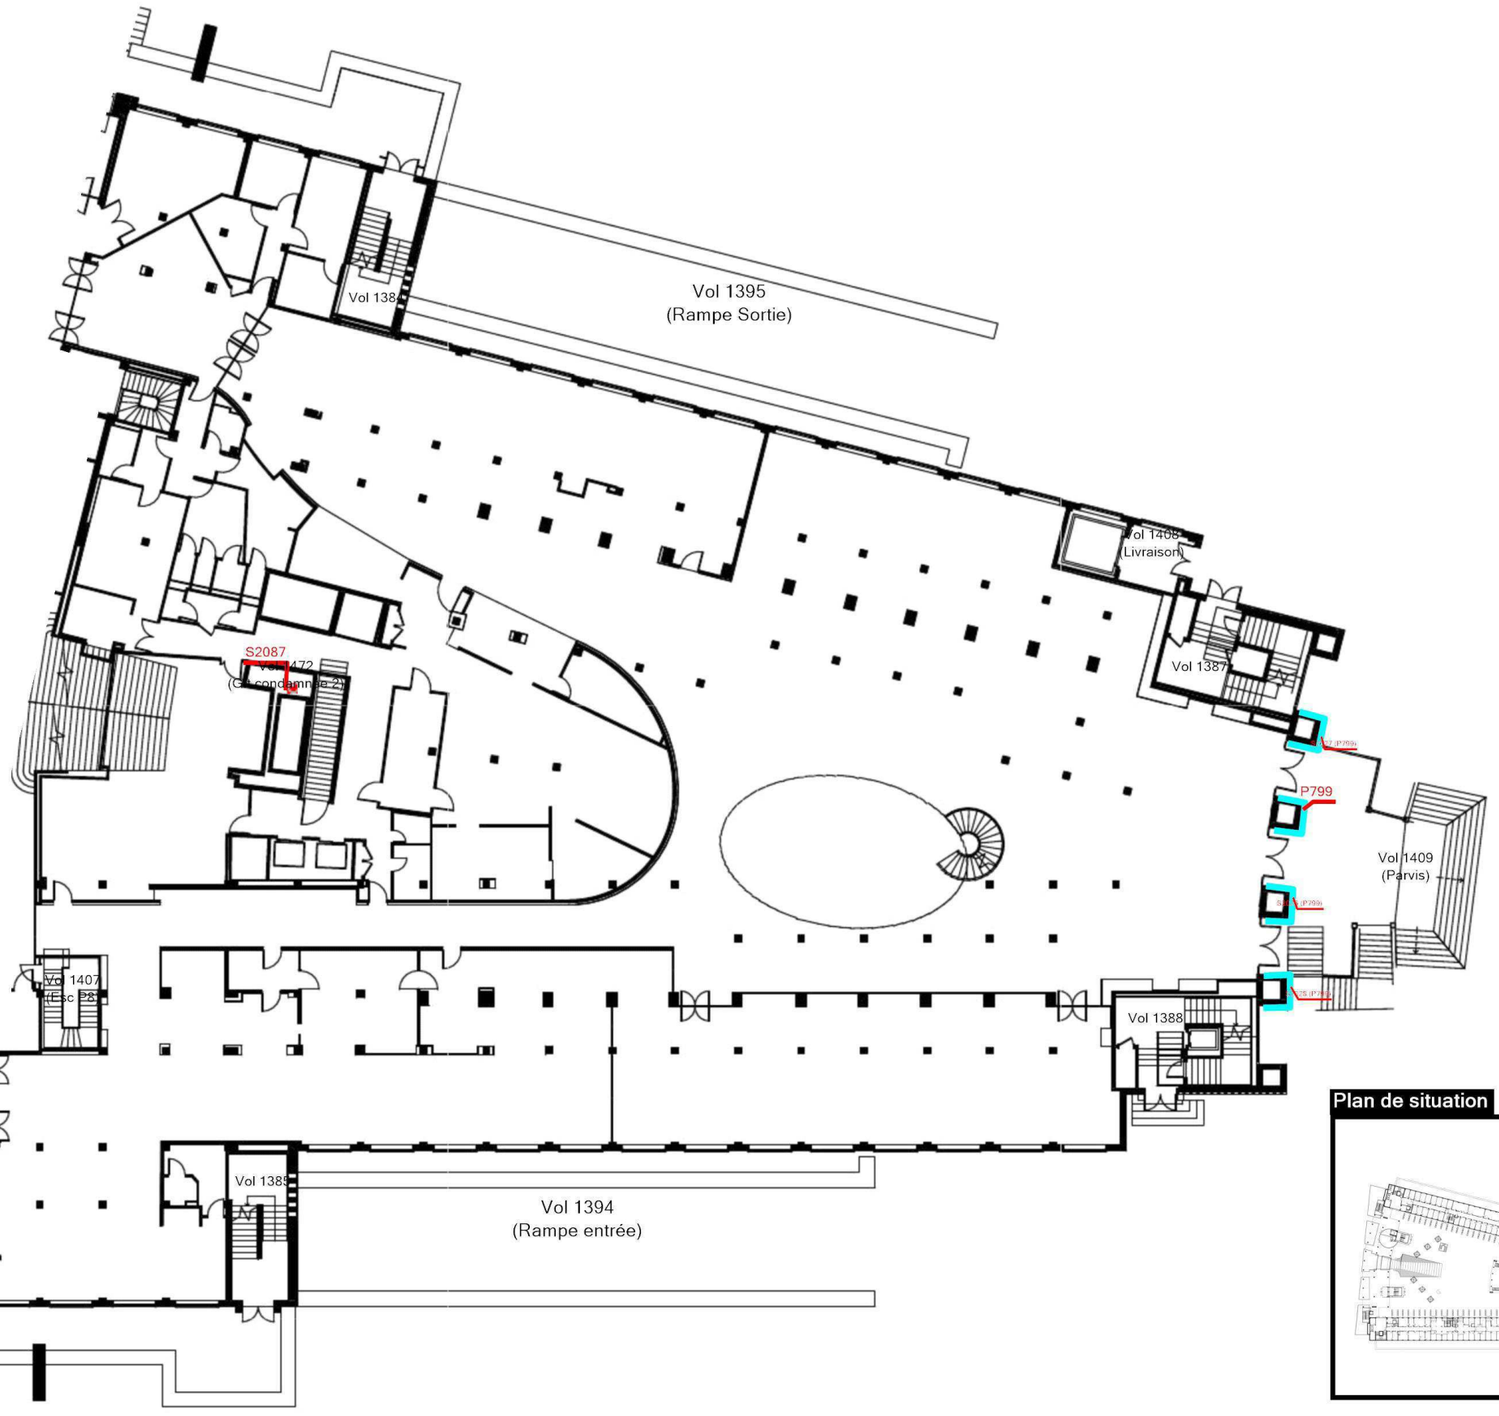

Légende

	P799 : Joint de scellement
	S2087: Conduit en fibres-ciment


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE D - MPCA FAÇADES


Référence:
002KN000189-5

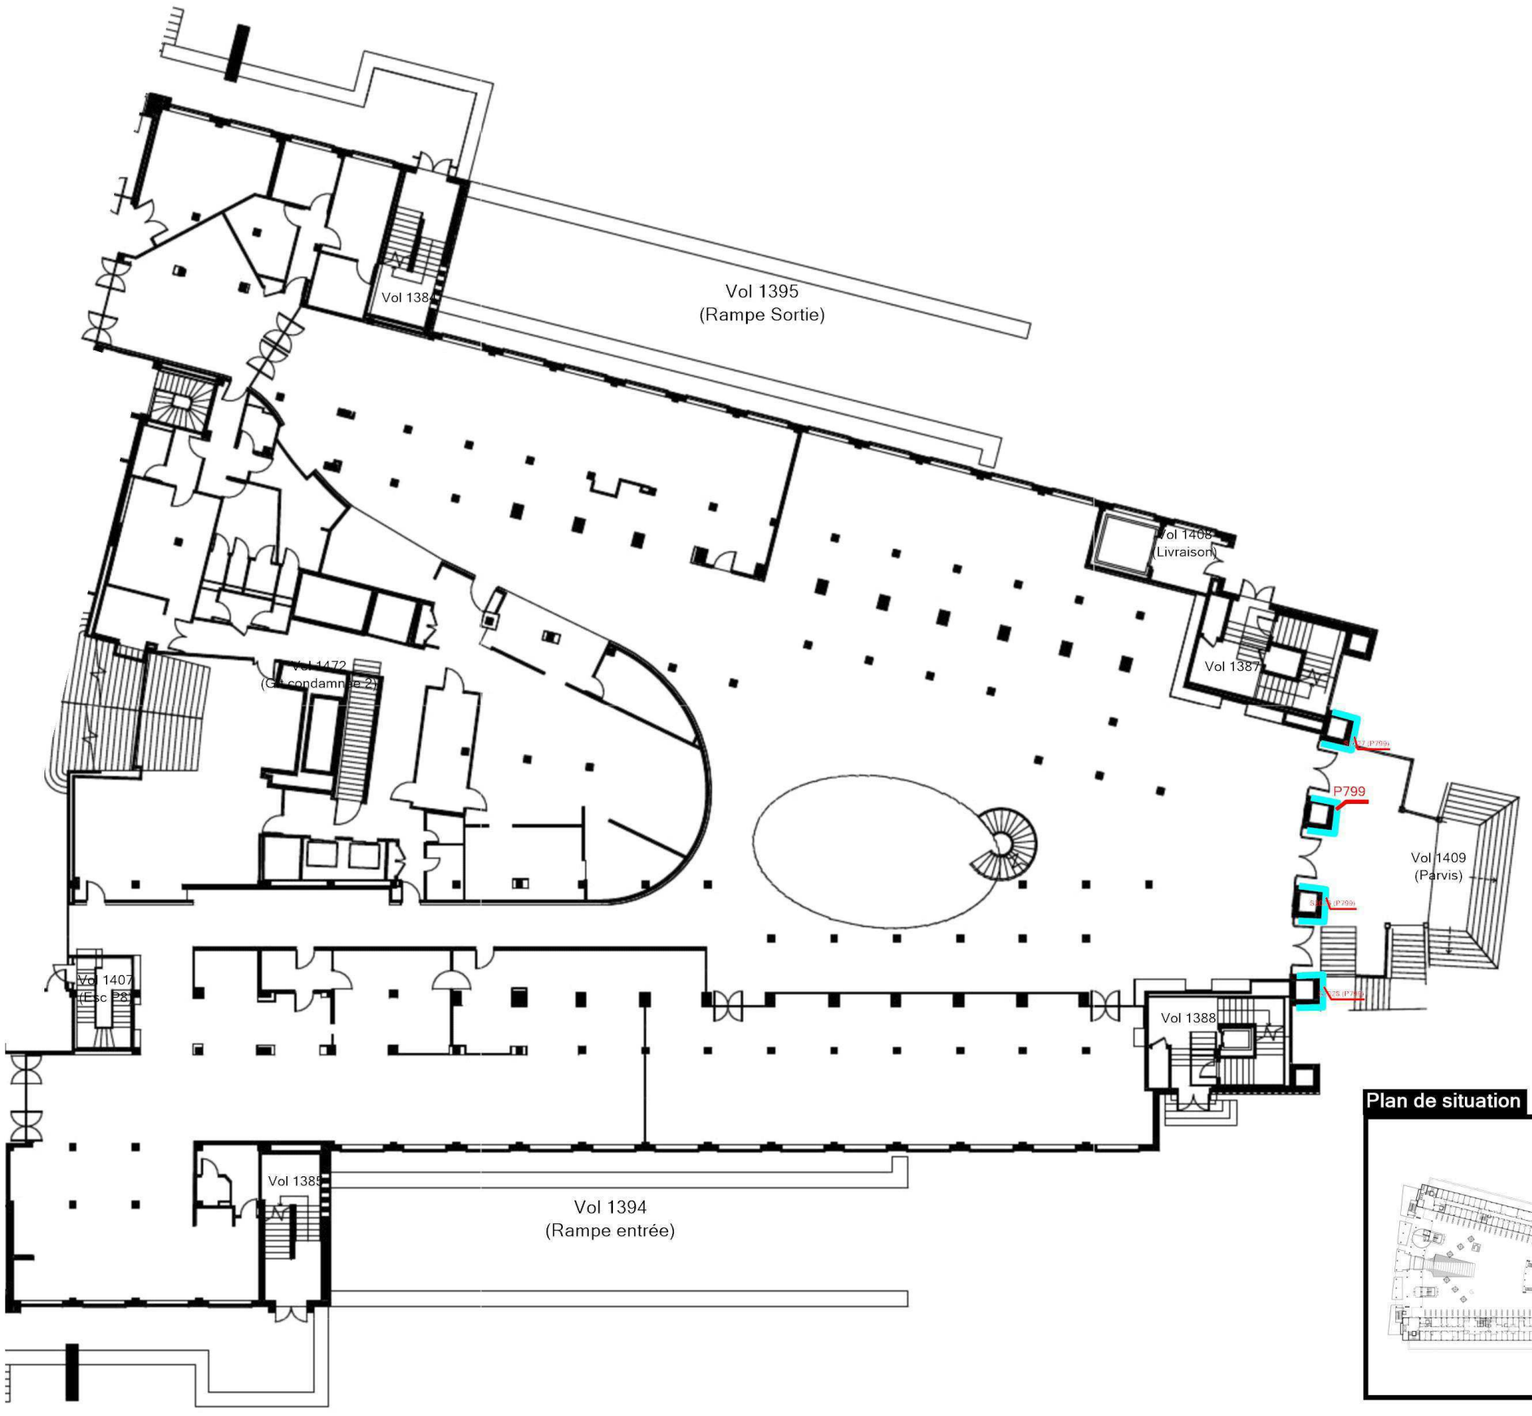

Légende

	P799 : Joint de scellement


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE D - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002KN000189-5

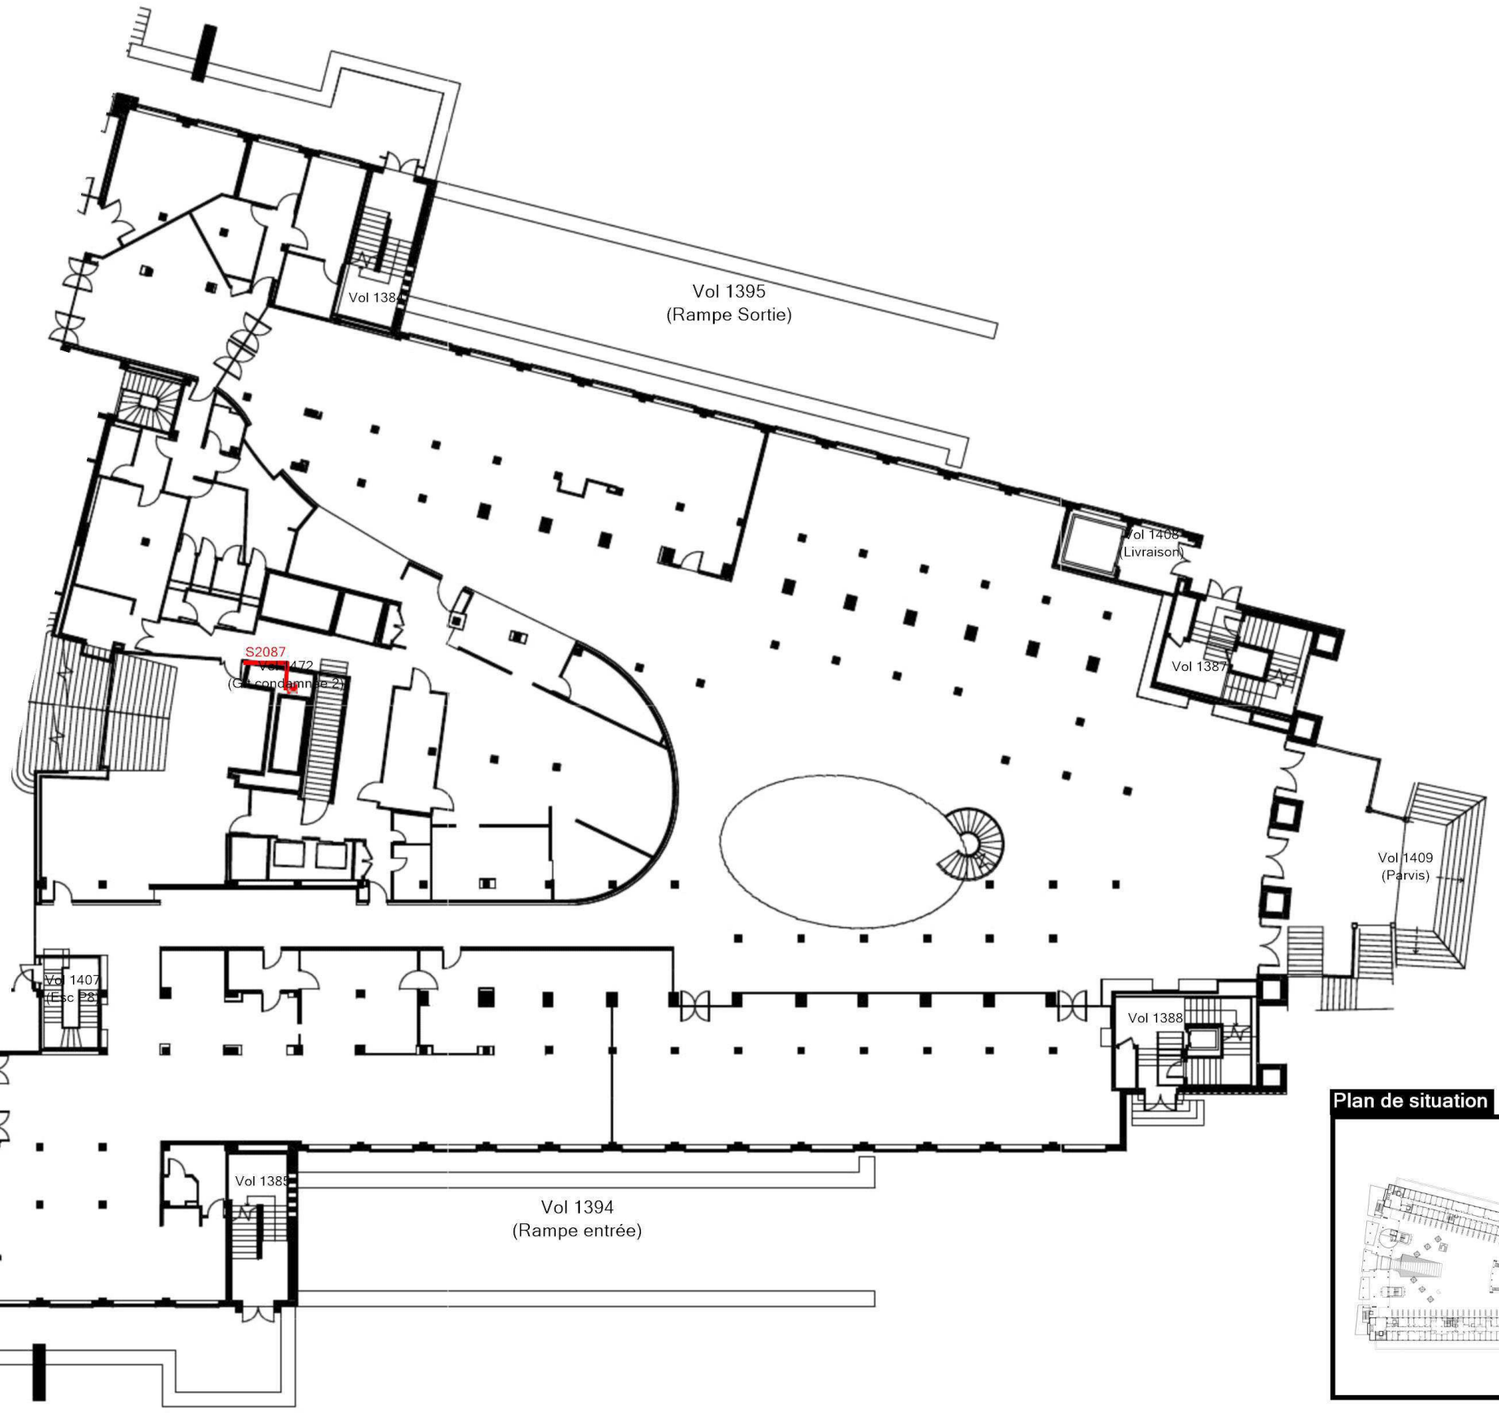

Légende

	S2087: Conduit en fibres-ciment


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE P - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

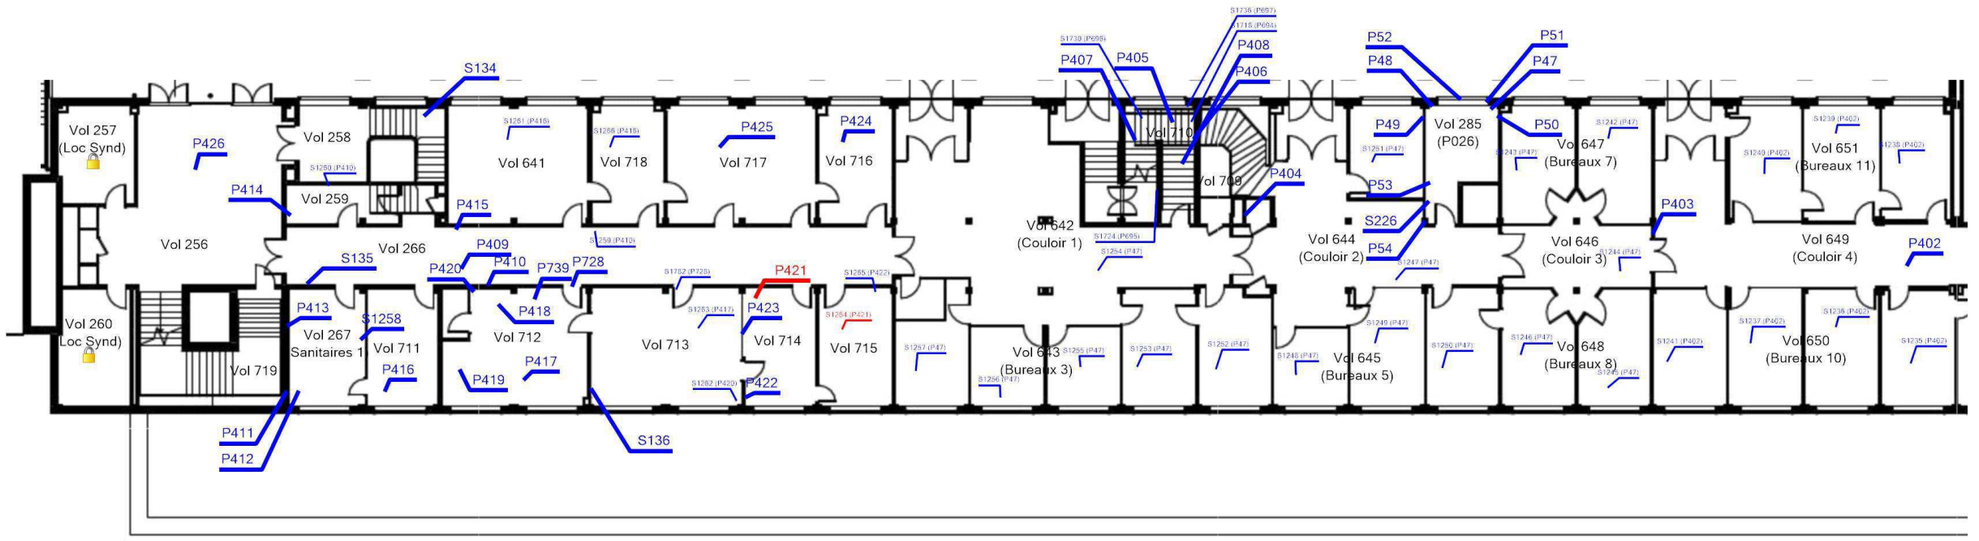

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation

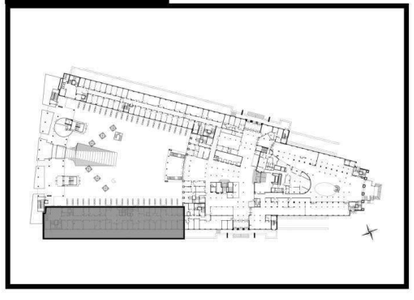

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE P - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

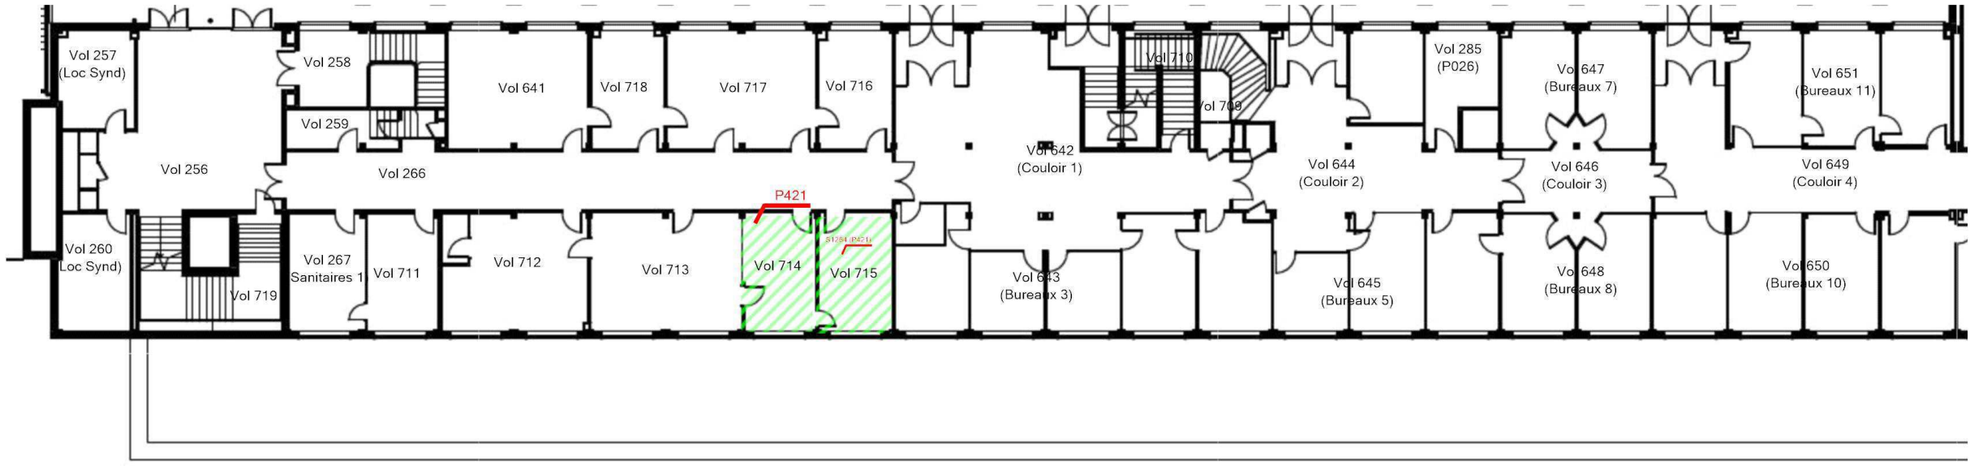

Légende

	P421 : Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige Marron


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN RDC - AILE P - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002KN000189-5

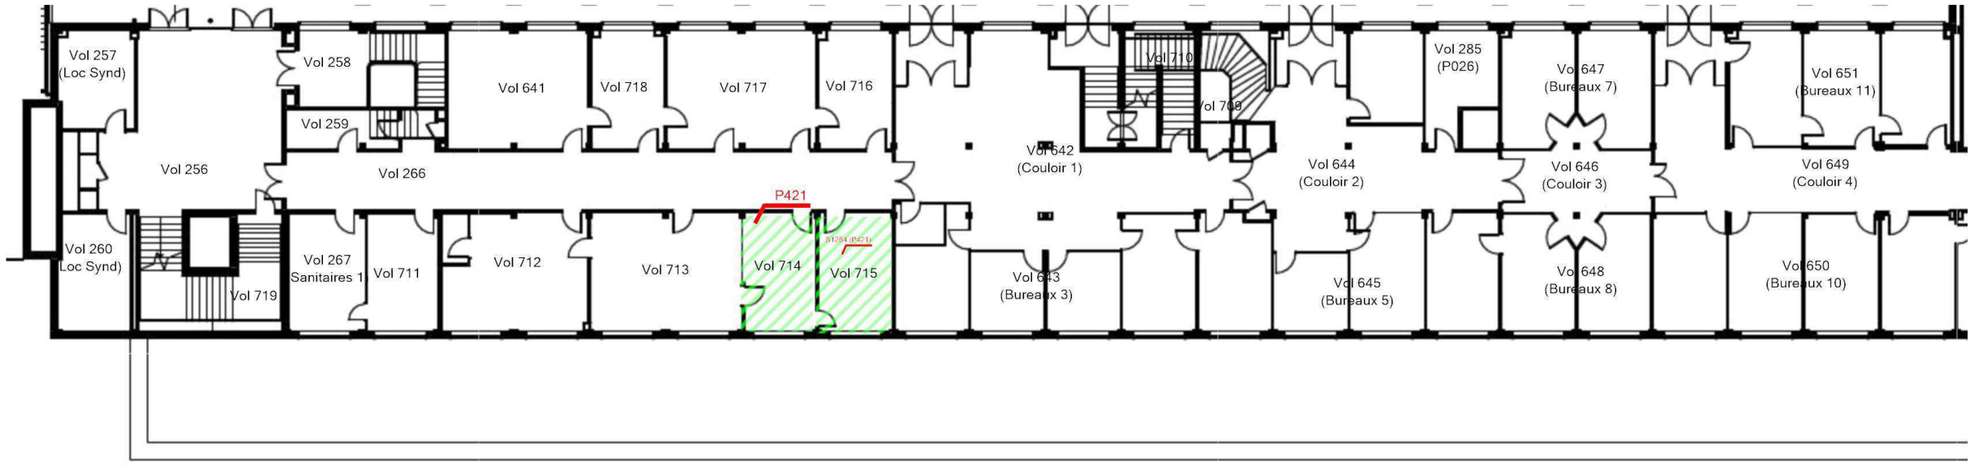

Légende

	P421 : Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige Marron

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5




Légende	
	Aile A
	Aile B
	Aile C
	Aile D
	Aile P

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN R+1 - AILE A - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

Légende

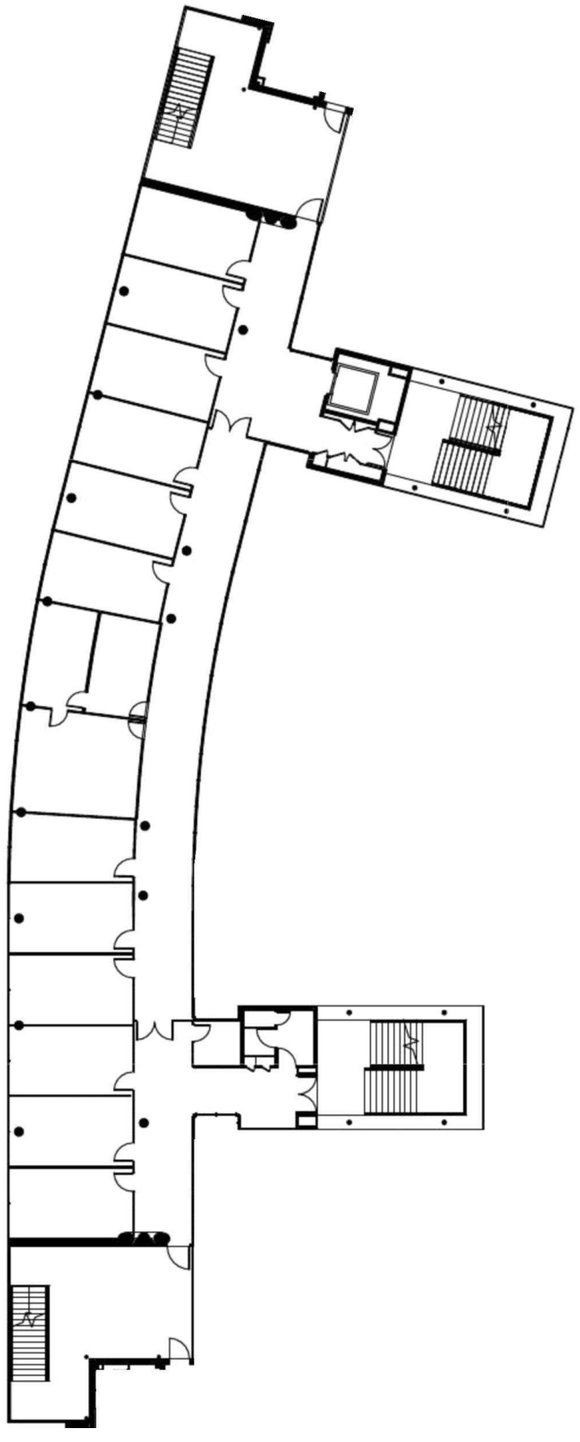

Plan de situation

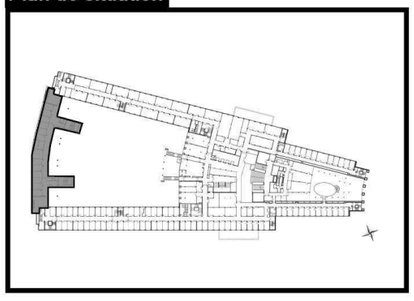


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (validité début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PLAN R+1 - AILE B - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

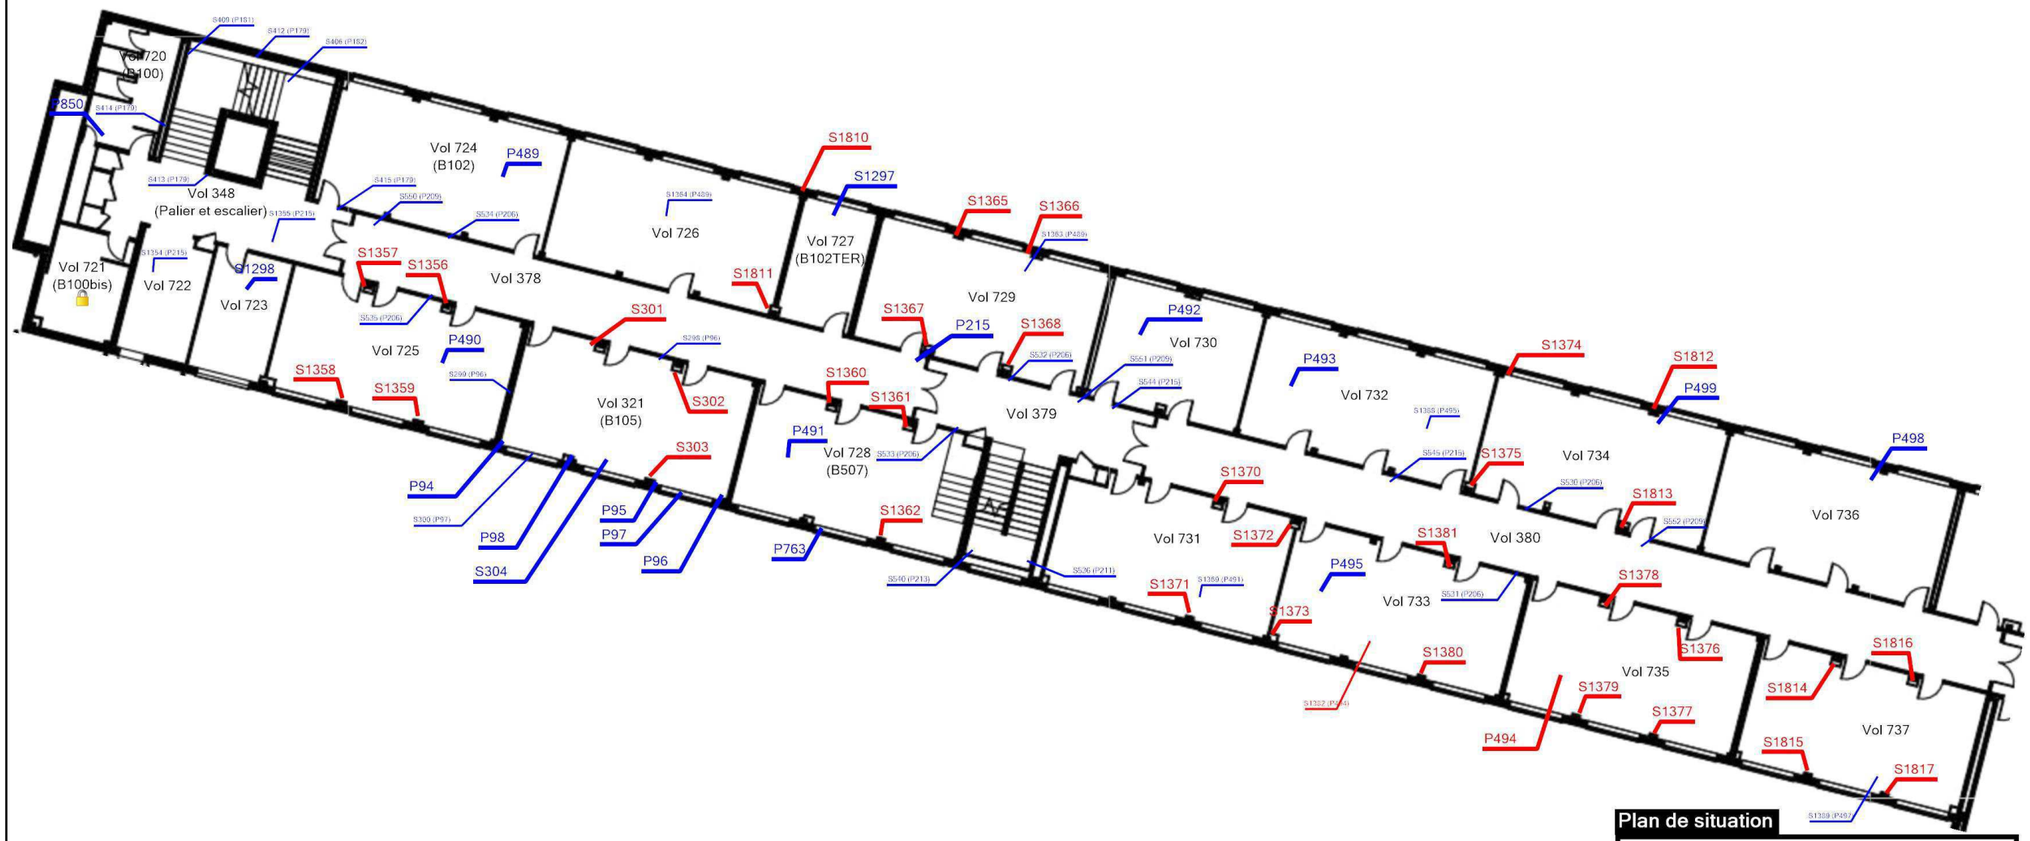

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation

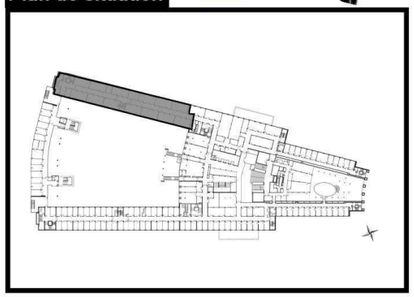


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE B - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5



Plan de situation

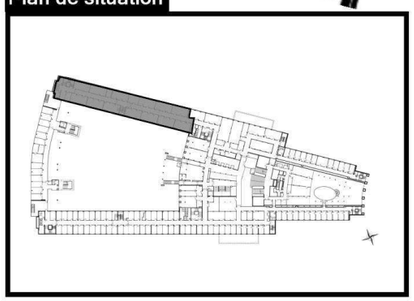

Légende


	S1810: Panneaux
	S1380: Panneaux
	S1375: Panneaux
	S1379: Panneaux
	S1381: Panneaux
	S1374: Panneaux
	S1367: Panneaux
	S1368: Panneaux
	S1817: Panneaux
	S1377: Panneaux
	S1812: Panneaux
	S1372: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE B - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002KN000189-5

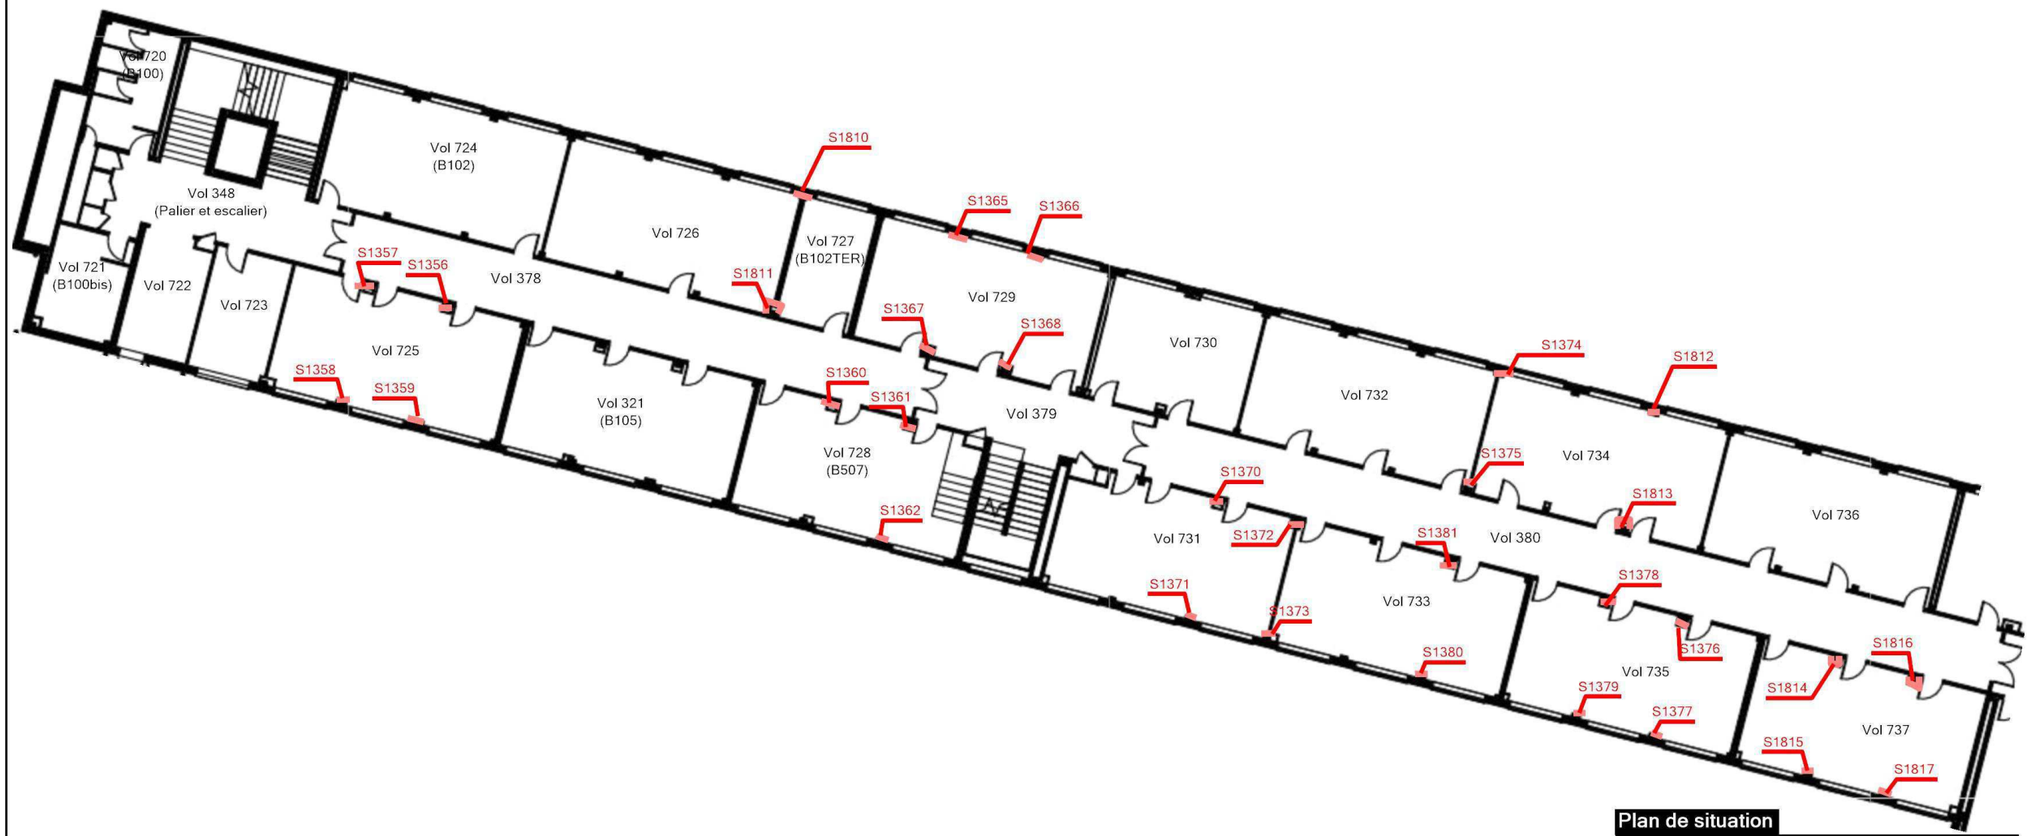

Plan de situation

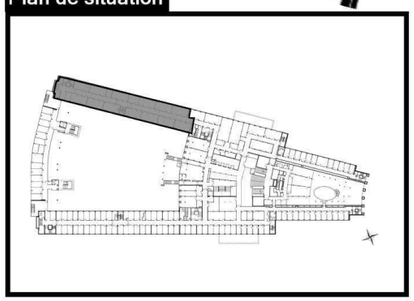

Légende

	S1810: Panneaux
	S1380: Panneaux
	S1375: Panneaux
	S1379: Panneaux
	S1381: Panneaux
	S1374: Panneaux
	S1367: Panneaux
	S1368: Panneaux
	S1817: Panneaux
	S1377: Panneaux
	S1812: Panneaux
	S1372: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE B - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002KN000189-5



Plan de situation

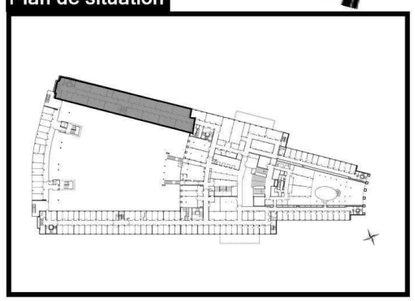

Légende

	P494 : Colle Souple Jaune Revêtement Dur Marron Colle Souple Marron Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE B - MPCA COFFRAGES PERDUS


Référence:
002KN000189-5



Légende

	S302: Elément en fibre ciment
	S301: Elément en fibre ciment
	S303: Elément en fibre ciment

Plan de situation

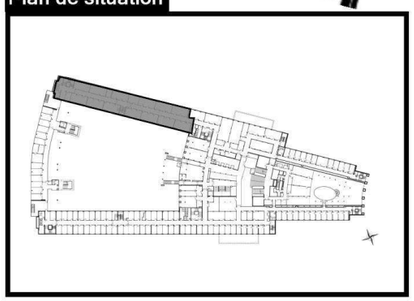

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE C - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation

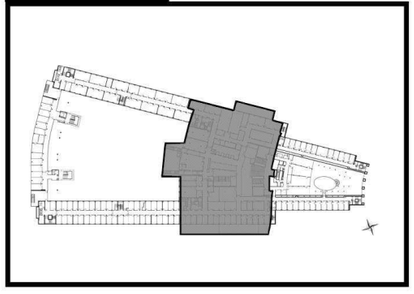

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (validité début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PLAN R+1 - AILE C - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5



Légende

	S581: Elément en fibre ciment
	S583: Elément en fibre ciment
	S1820: Panneaux
	S1822: Panneaux
	S387: Elément en fibre ciment
	S580: Elément en fibre ciment
	S582: Elément en fibre ciment
	S1819: Panneaux
	S1286: Panneaux
	S579: Elément en fibre ciment
	S1825: Panneaux
	S1823: Panneaux

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE C - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002KN000189-5



Légende

	S1820: Panneaux
	S1822: Panneaux
	S1819: Panneaux
	S1286: Panneaux
	S1825: Panneaux
	S1823: Panneaux
	S1821: Panneaux
	S1818: Panneaux
	S1824: Panneaux

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE C - MPCA REVÊTEMENT DE MUR


Référence:
002KN000189-5



Légende

	P817 : Fibralith (colle)

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE C - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence:
002KN000189-5



Plan de situation

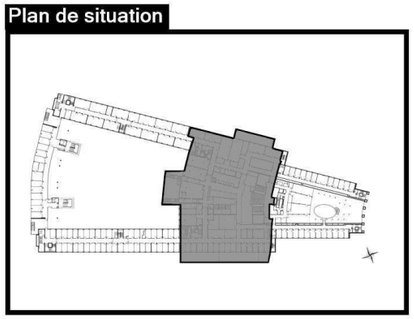

Légende


	S581: Elément en fibre ciment
	S583: Elément en fibre ciment
	S387: Elément en fibre ciment
	S580: Elément en fibre ciment
	S582: Elément en fibre ciment
	S579: Elément en fibre ciment
	S584: Elément en fibre ciment
	S585: Elément en fibre ciment
	S586: Elément en fibre ciment
	S386: Elément en fibre ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

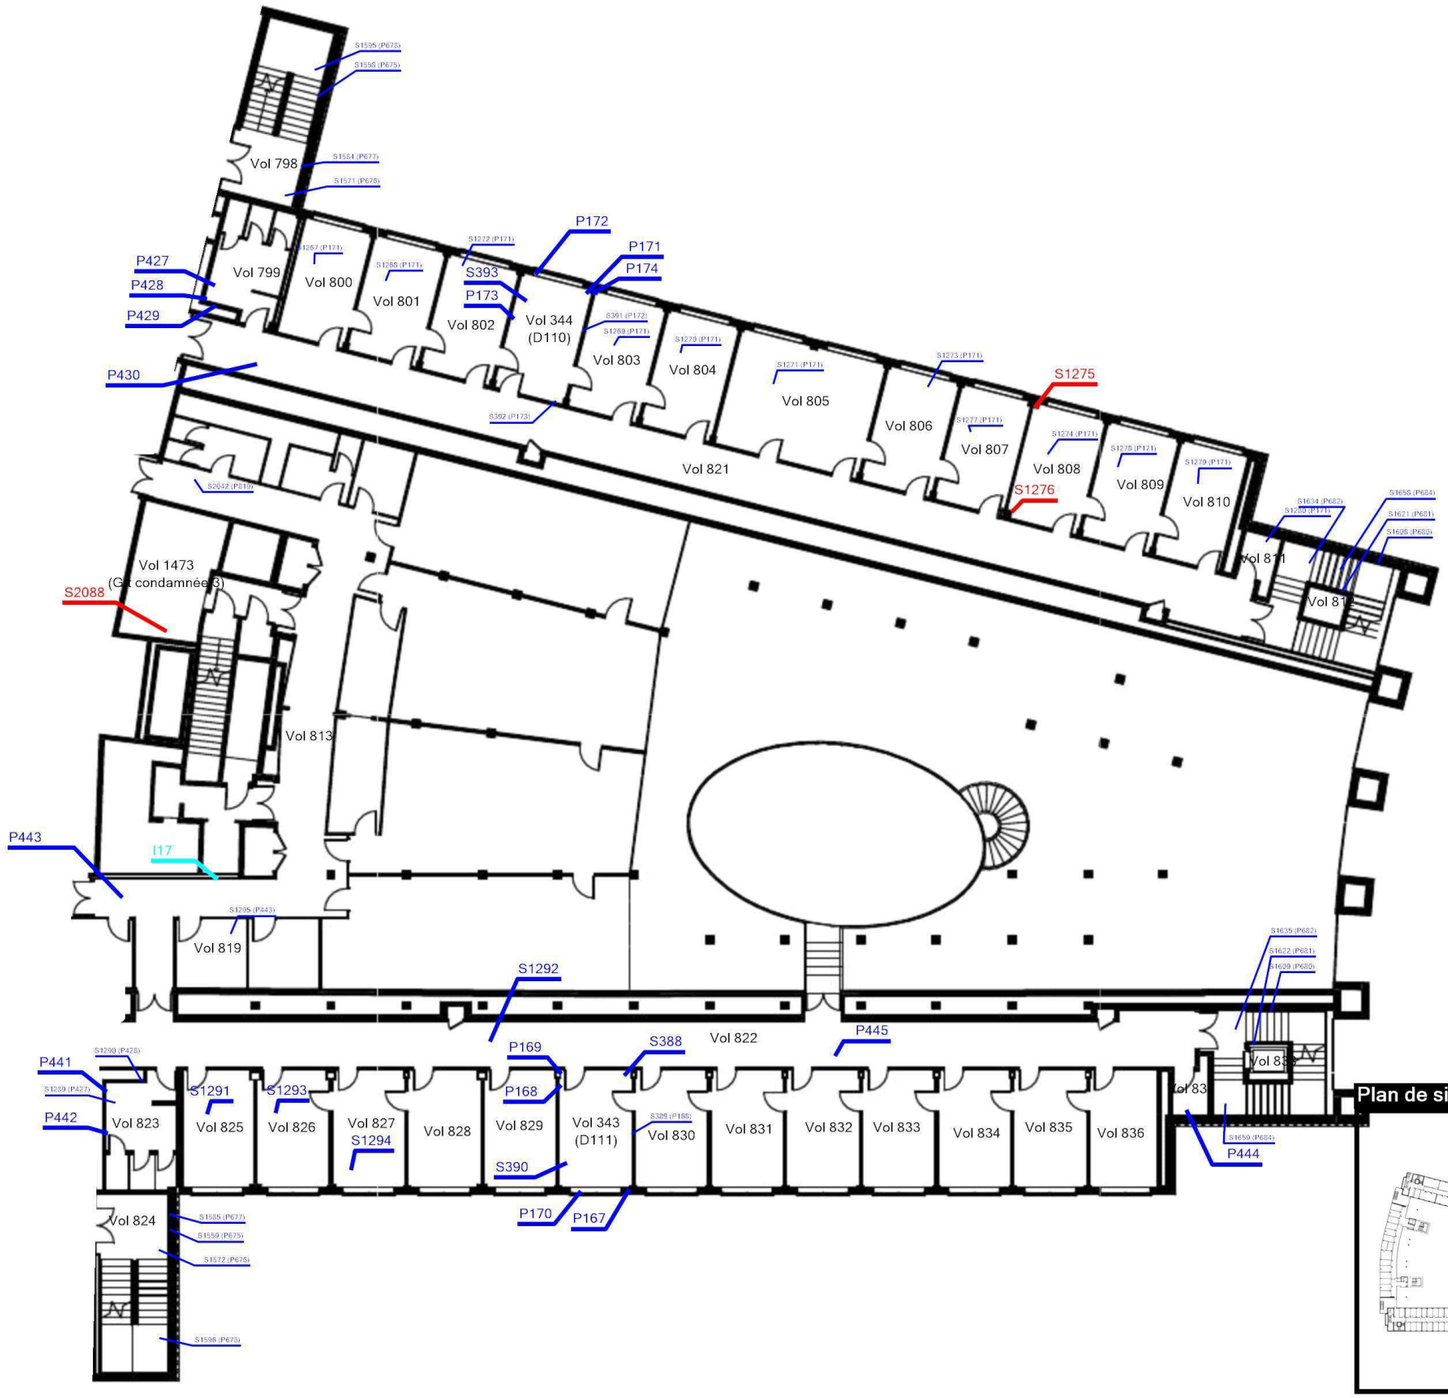


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5

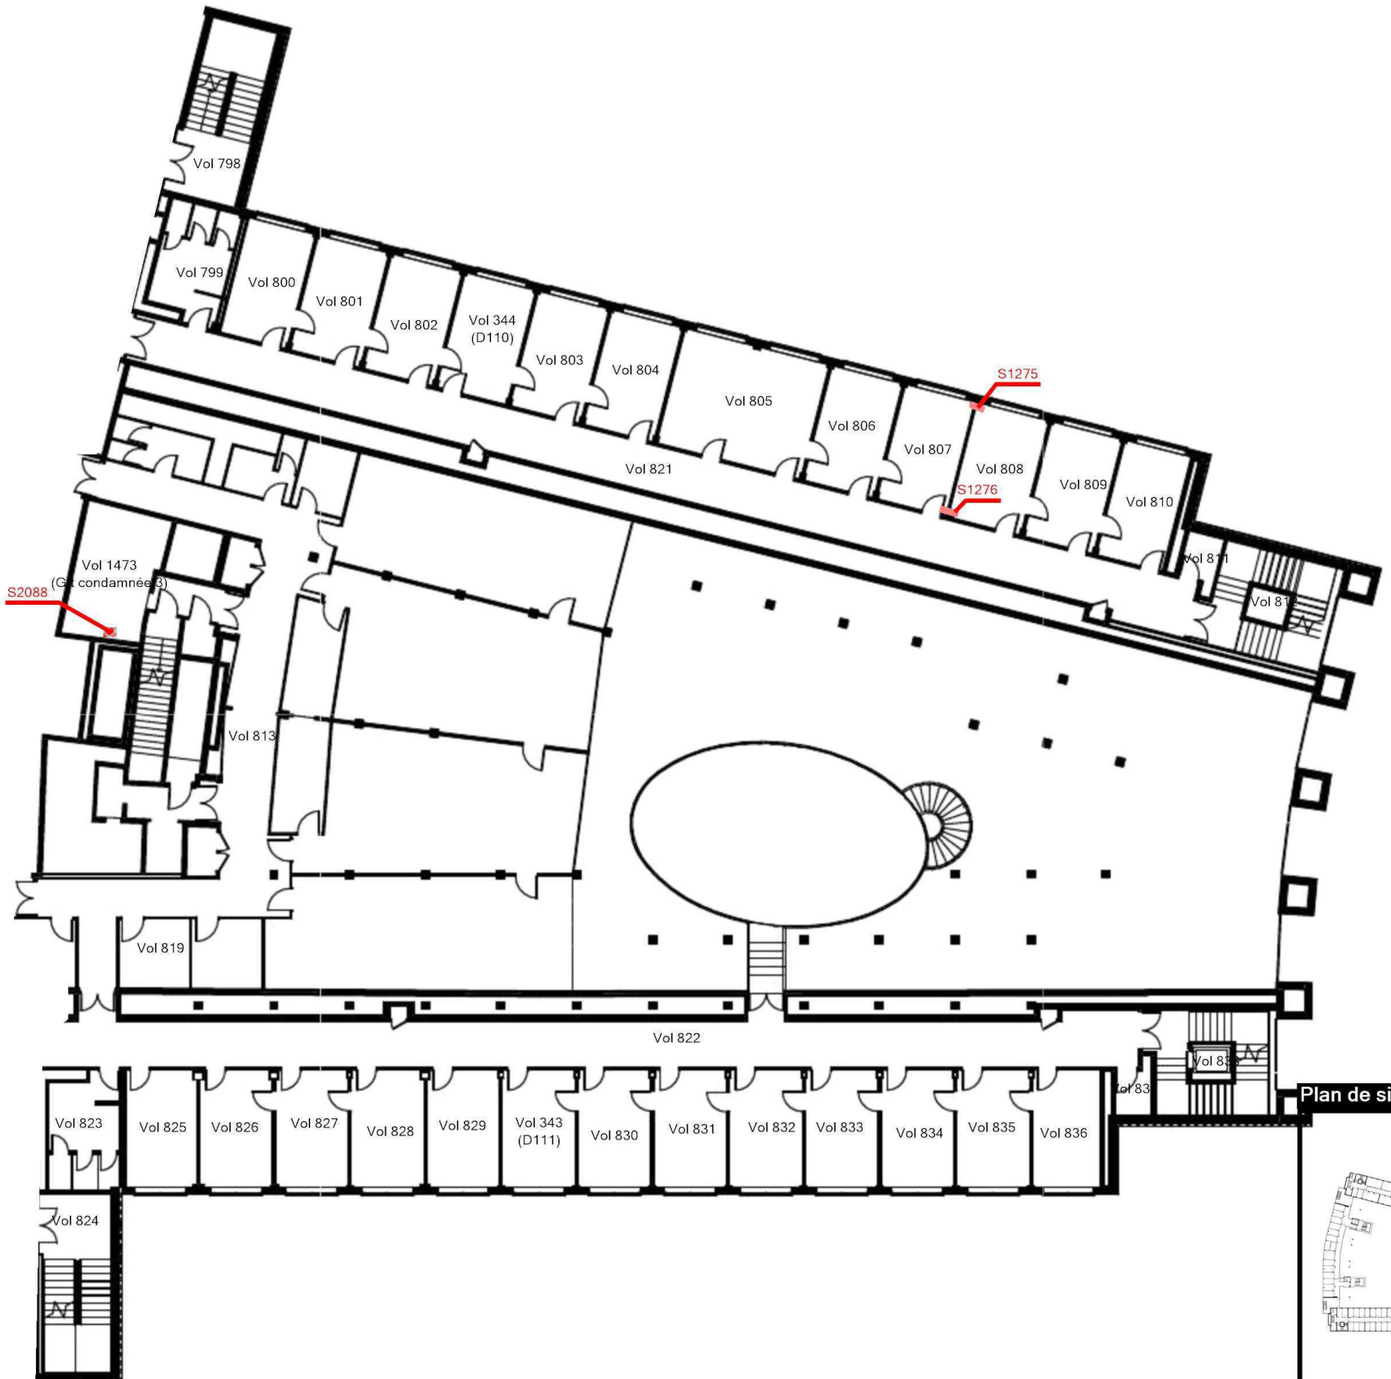

Plan de situation

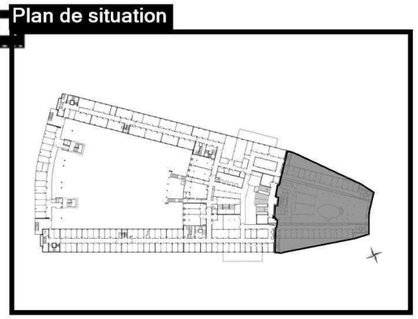


Légende

	S2088: Conduit en fibres-ciment
	S1276: Panneaux
	S1275: Panneaux


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE D - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002KN000189-5

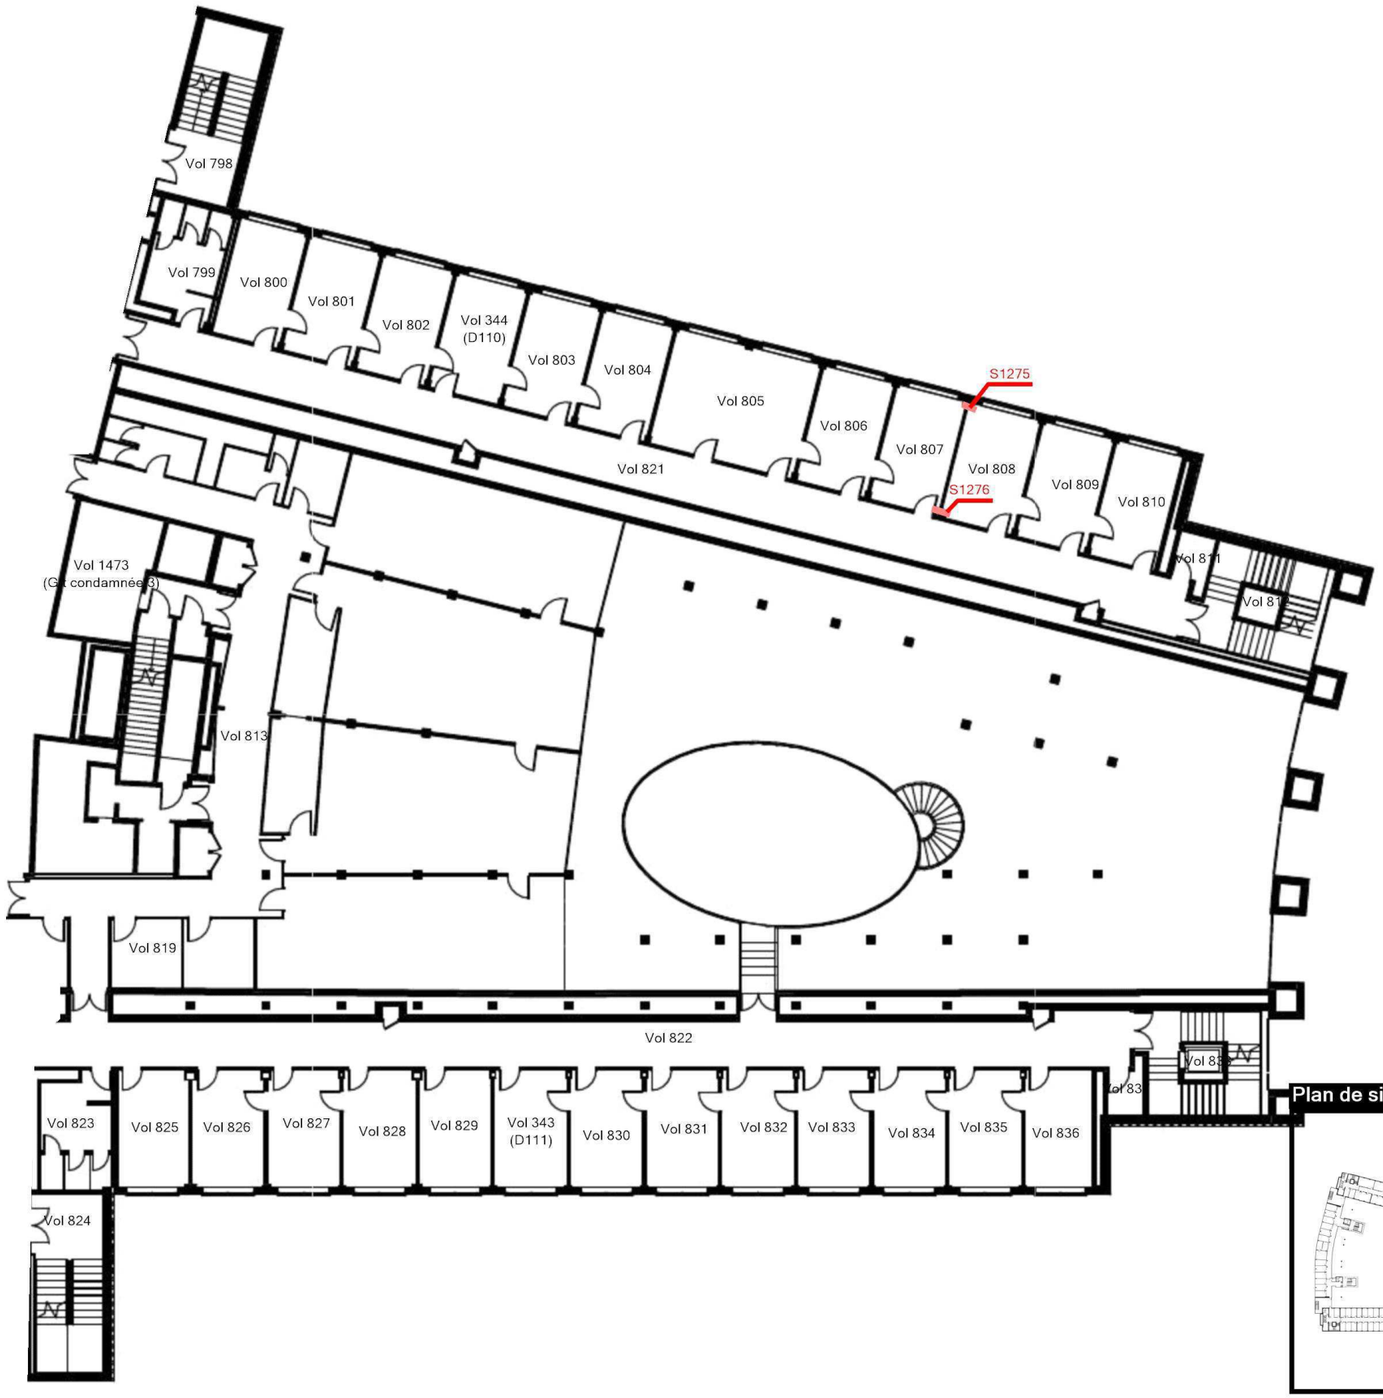

Plan de situation

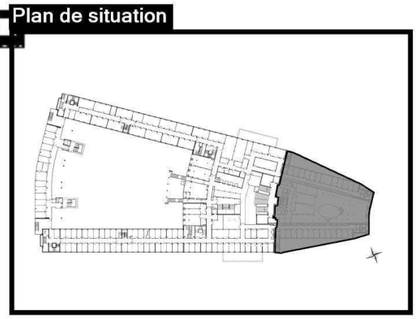


Légende

	S1276: Panneaux
	S1275: Panneaux


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE D - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002KN000189-5

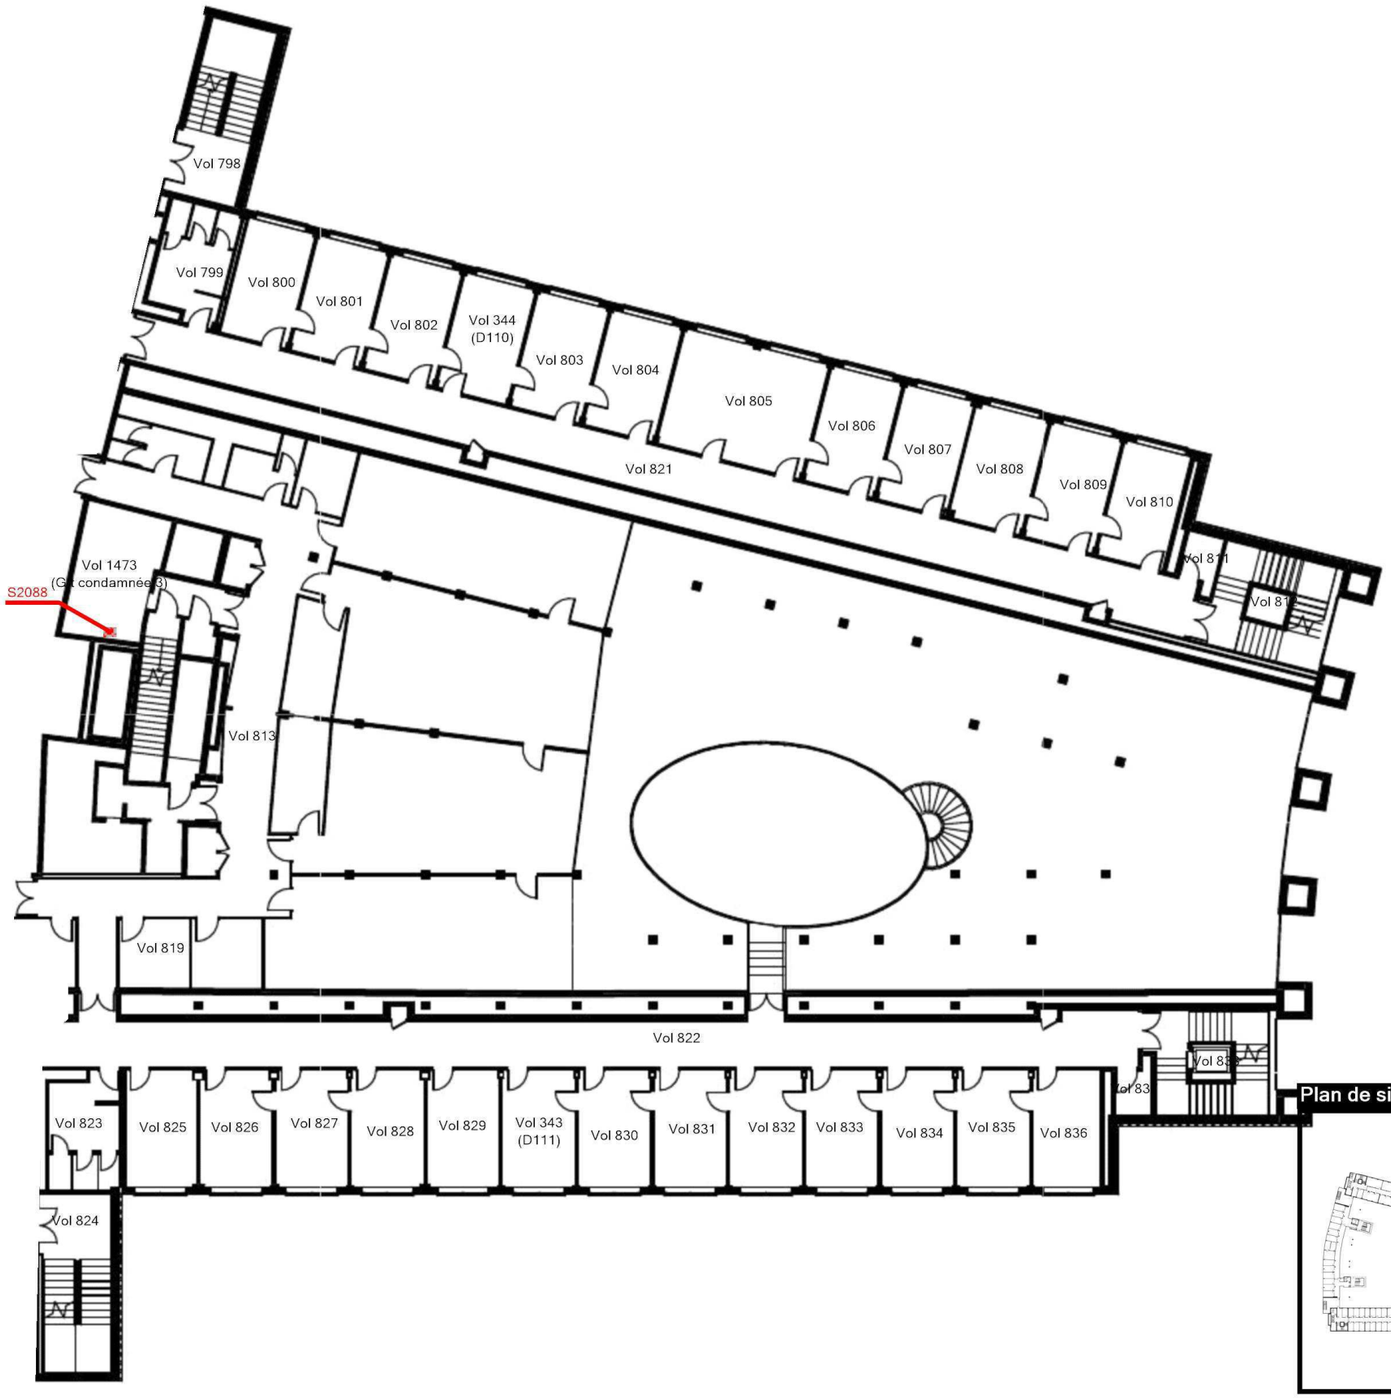

Plan de situation

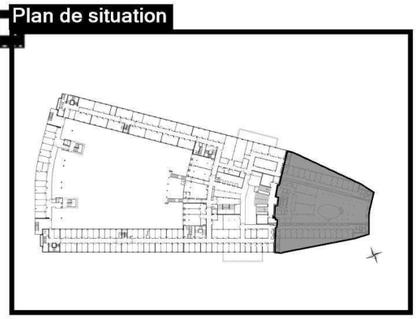


Légende

	S2088: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE P - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

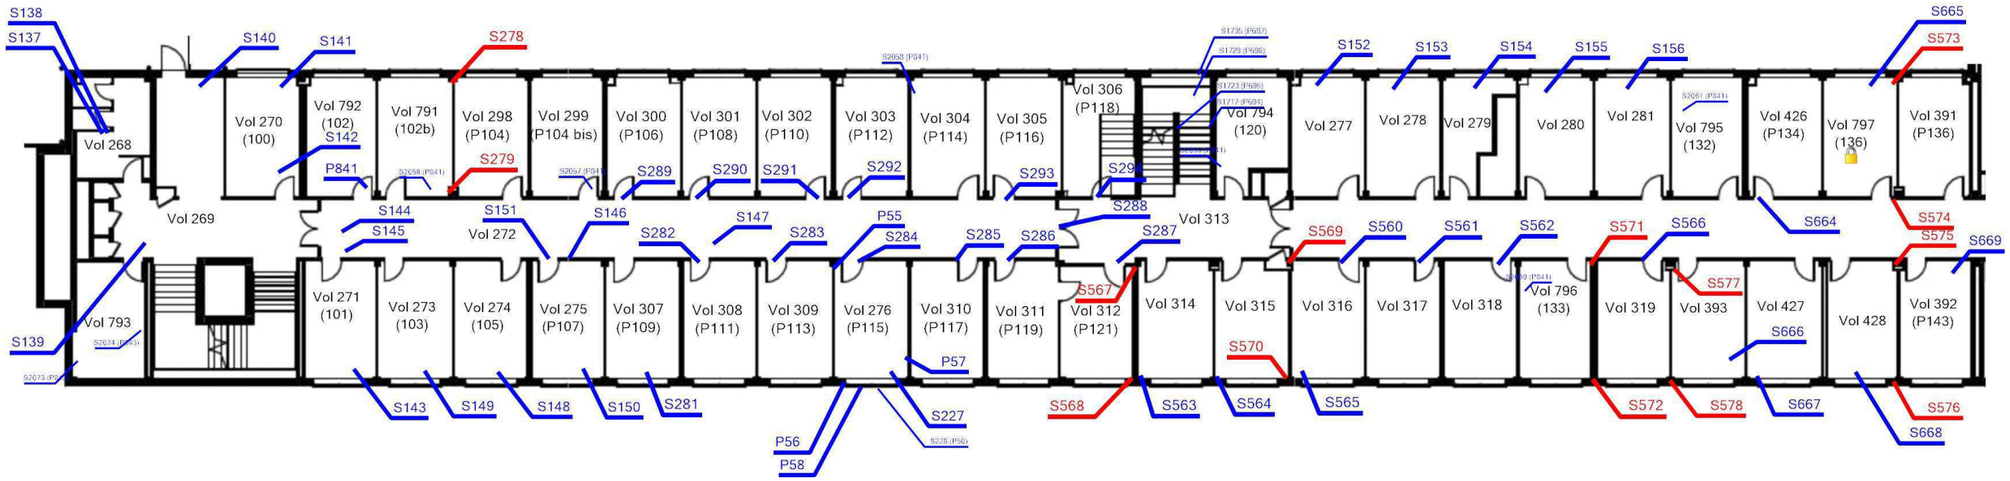

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation

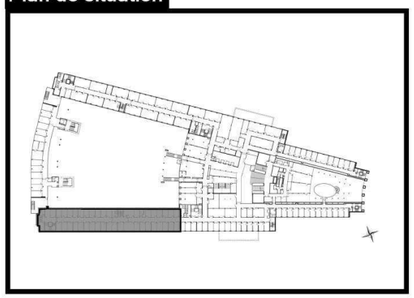


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE P - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5

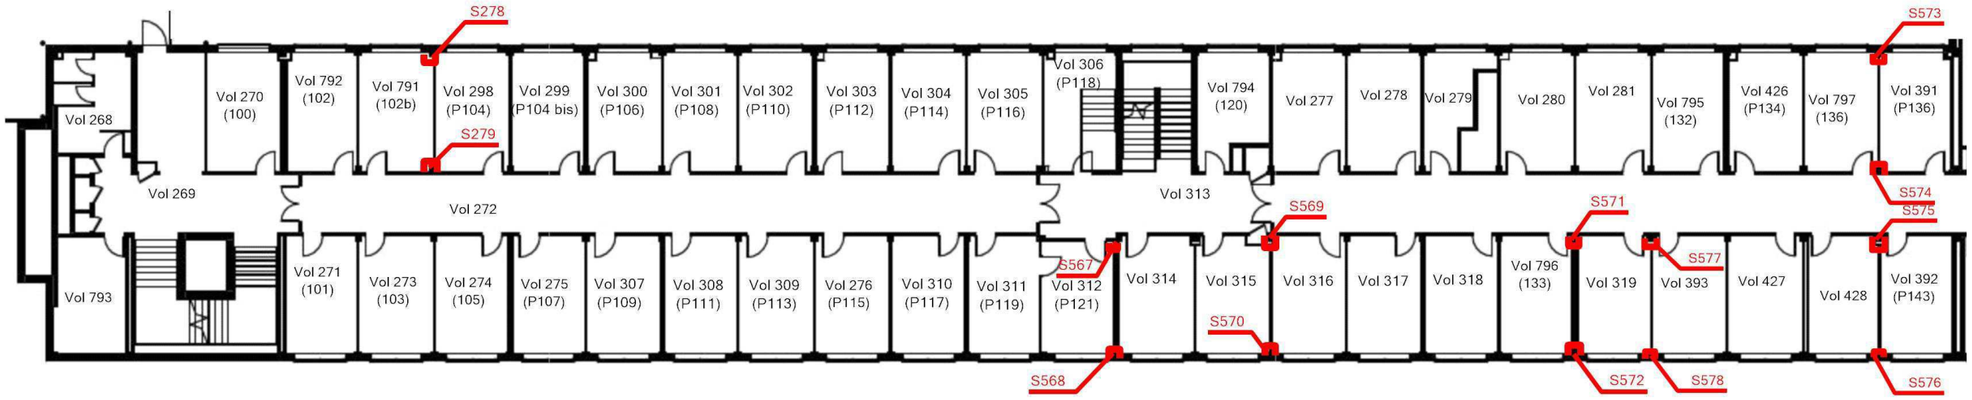

Plan de situation



Légende


	S575: Elément en fibre ciment
	S578: Elément en fibre ciment
	S576: Elément en fibre ciment
	S569: Elément en fibre ciment
	S568: Elément en fibre ciment
	S572: Elément en fibre ciment
	S571: Elément en fibre ciment
	S279: Elément en fibre ciment
	S570: Elément en fibre ciment
	S573: Elément en fibre ciment
	S567: Elément en fibre ciment
	S278: Elément en fibre ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+1 - AILE P - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence:
002KN000189-5

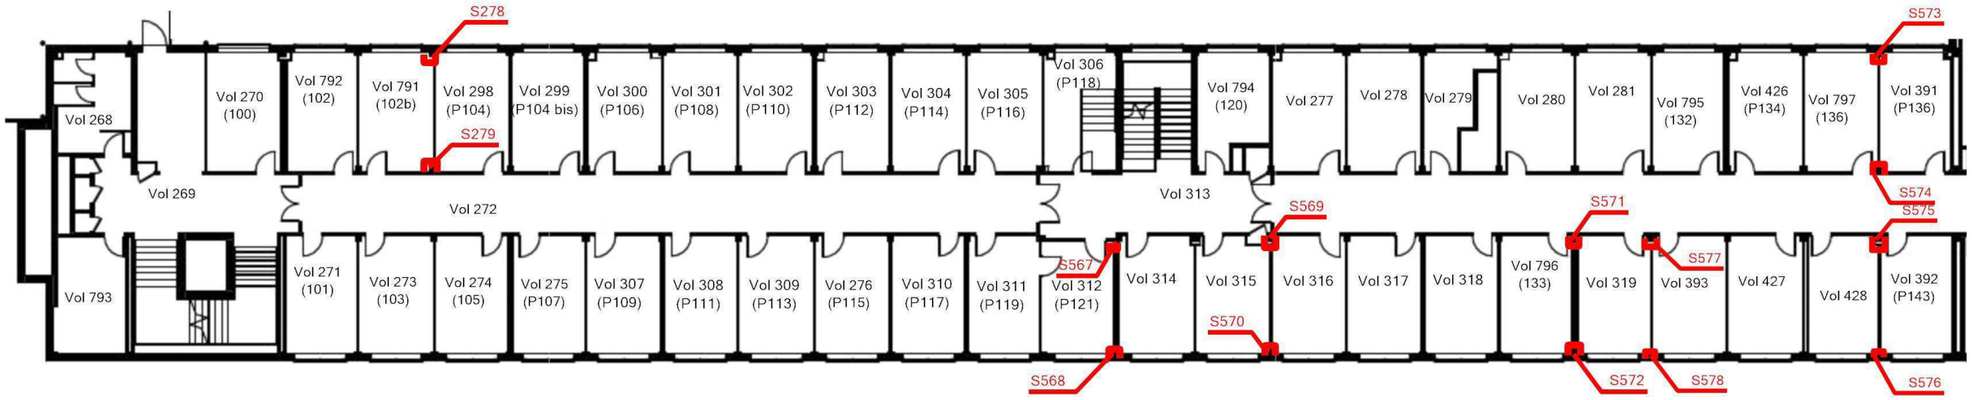

Plan de situation



Légende


	S575: Elément en fibre ciment
	S578: Elément en fibre ciment
	S576: Elément en fibre ciment
	S569: Elément en fibre ciment
	S568: Elément en fibre ciment
	S572: Elément en fibre ciment
	S571: Elément en fibre ciment
	S279: Elément en fibre ciment
	S570: Elément en fibre ciment
	S573: Elément en fibre ciment
	S567: Elément en fibre ciment
	S278: Elément en fibre ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

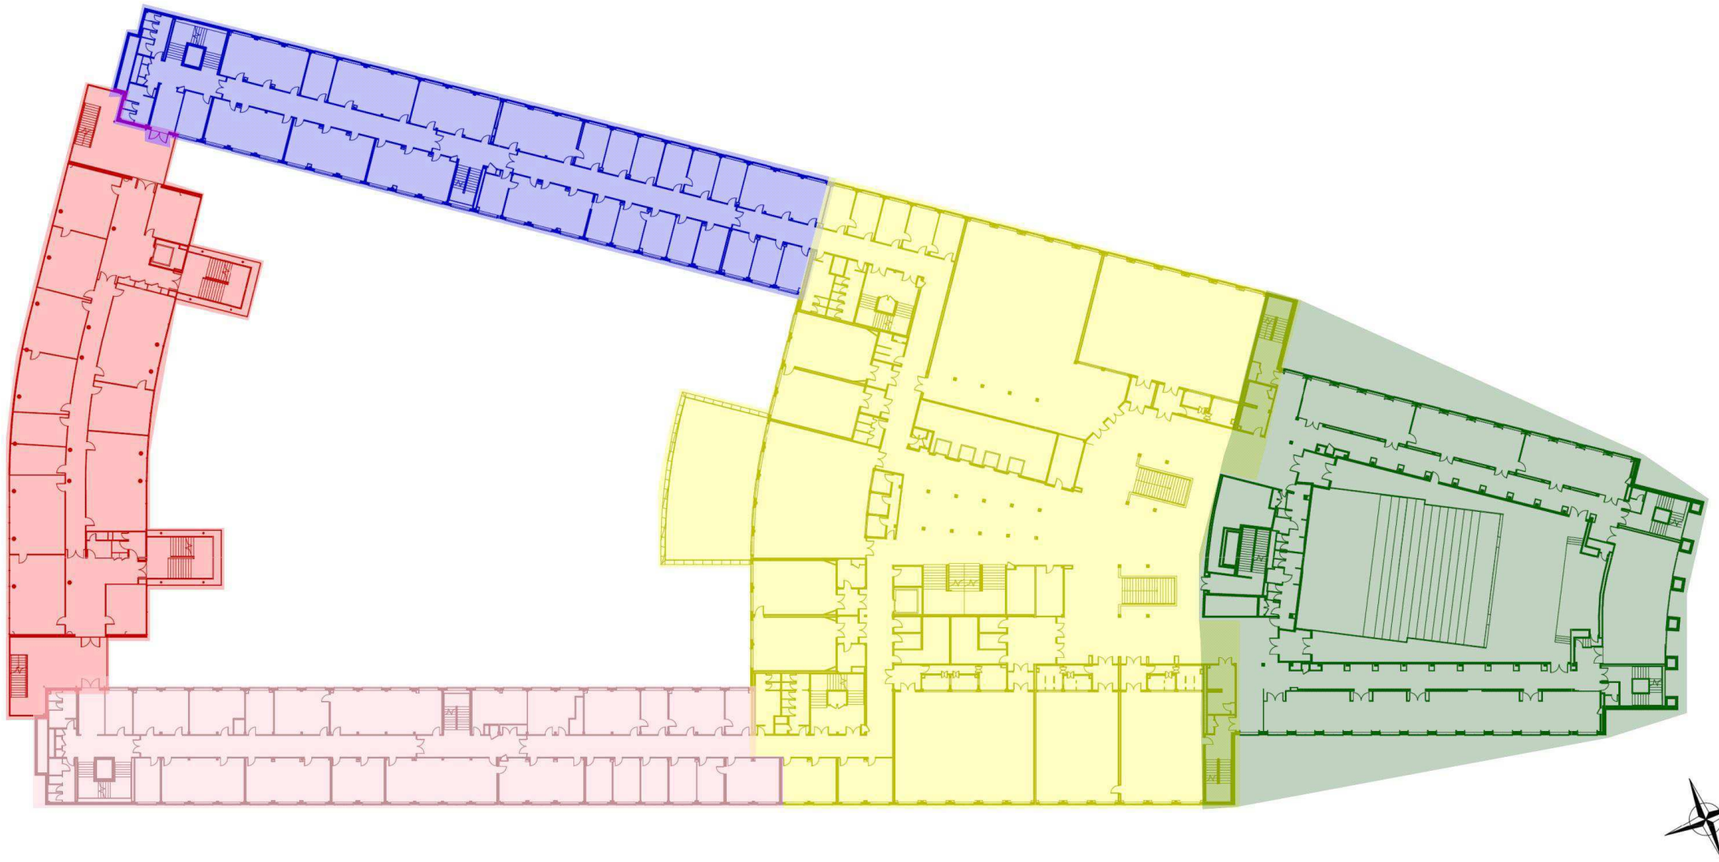

Légende	
	Aile A
	Aile B
	Aile C
	Aile D
	Aile P


AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN R+2 - AILE A - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

Légende

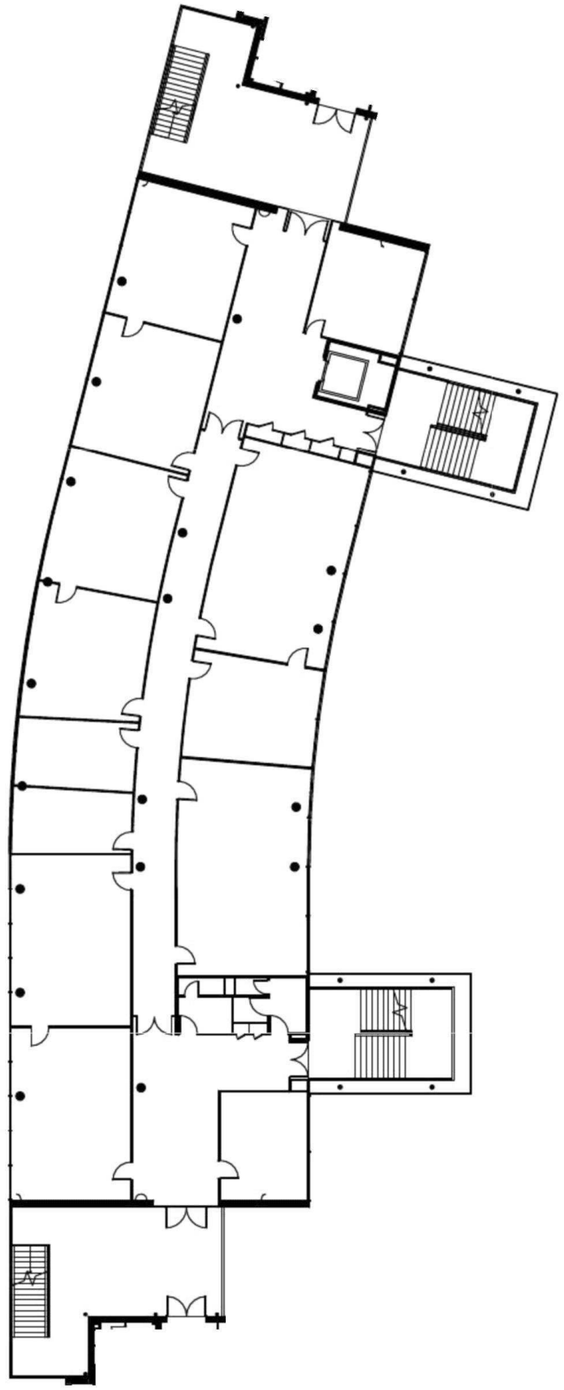


Plan de situation

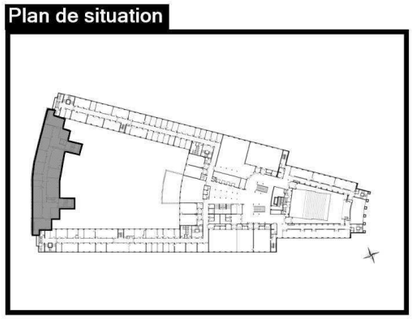


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - AILE B - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

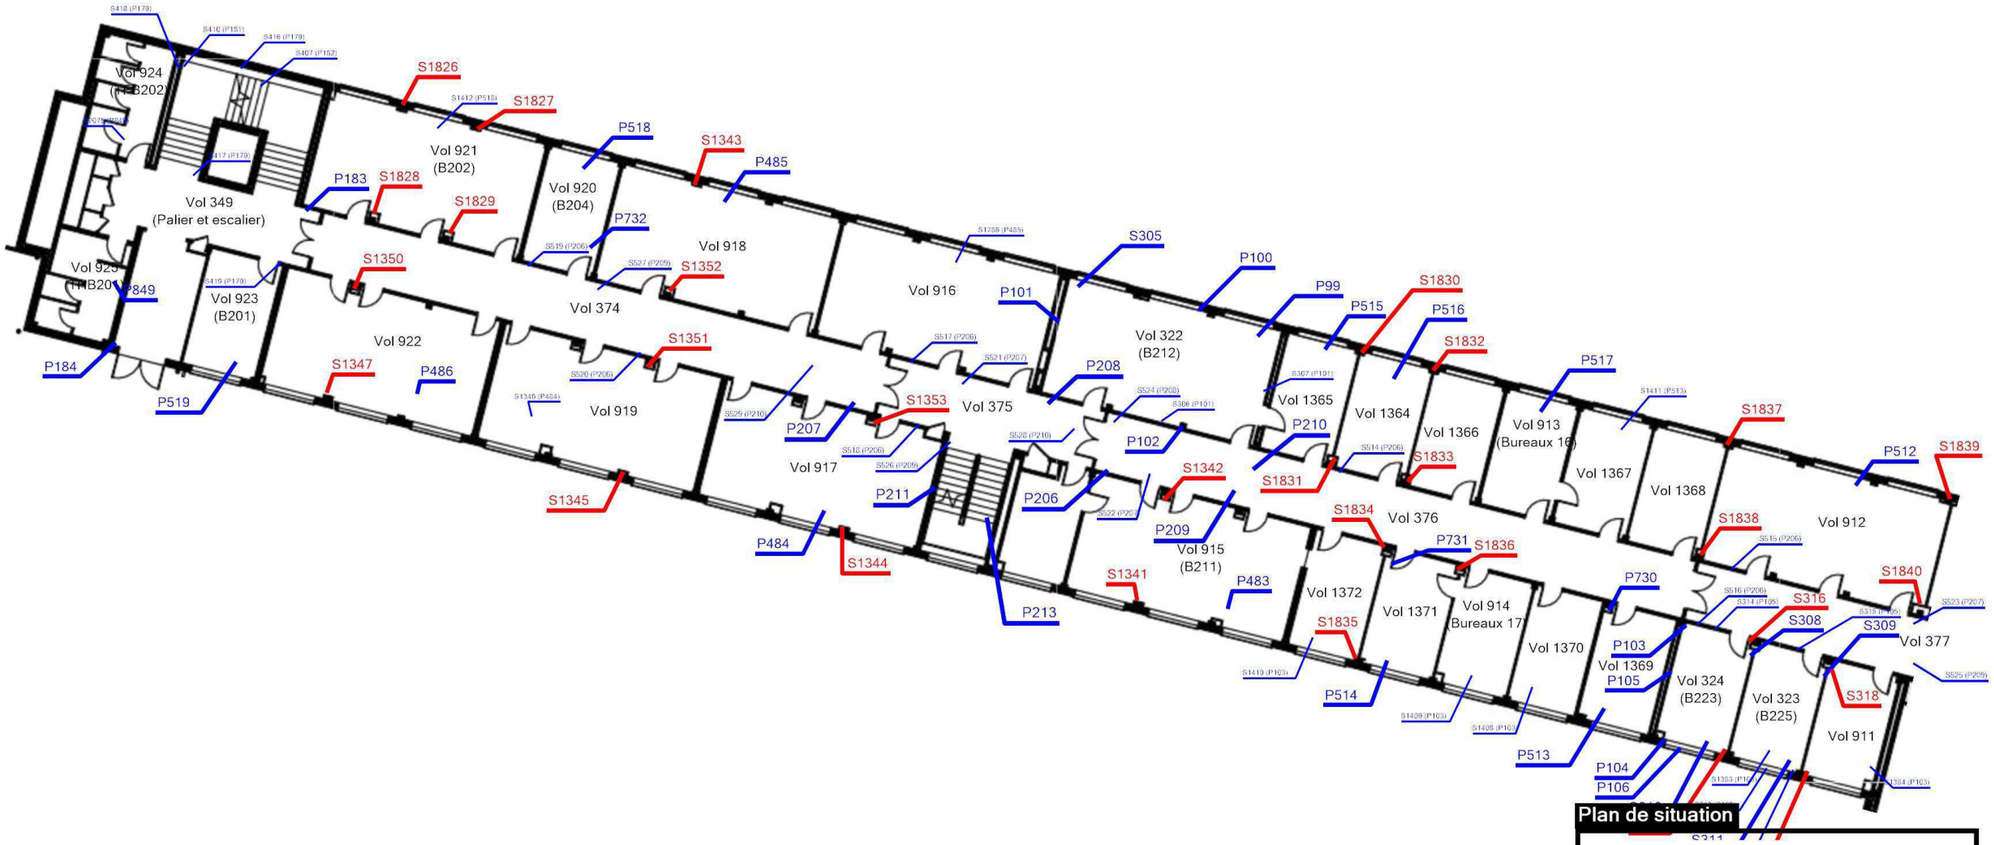

Plan de situation

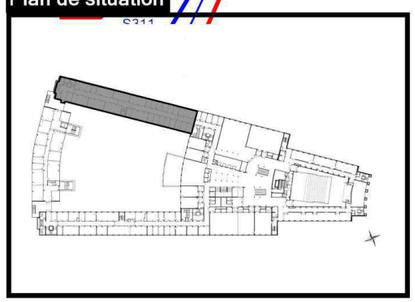


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - AILE B - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5

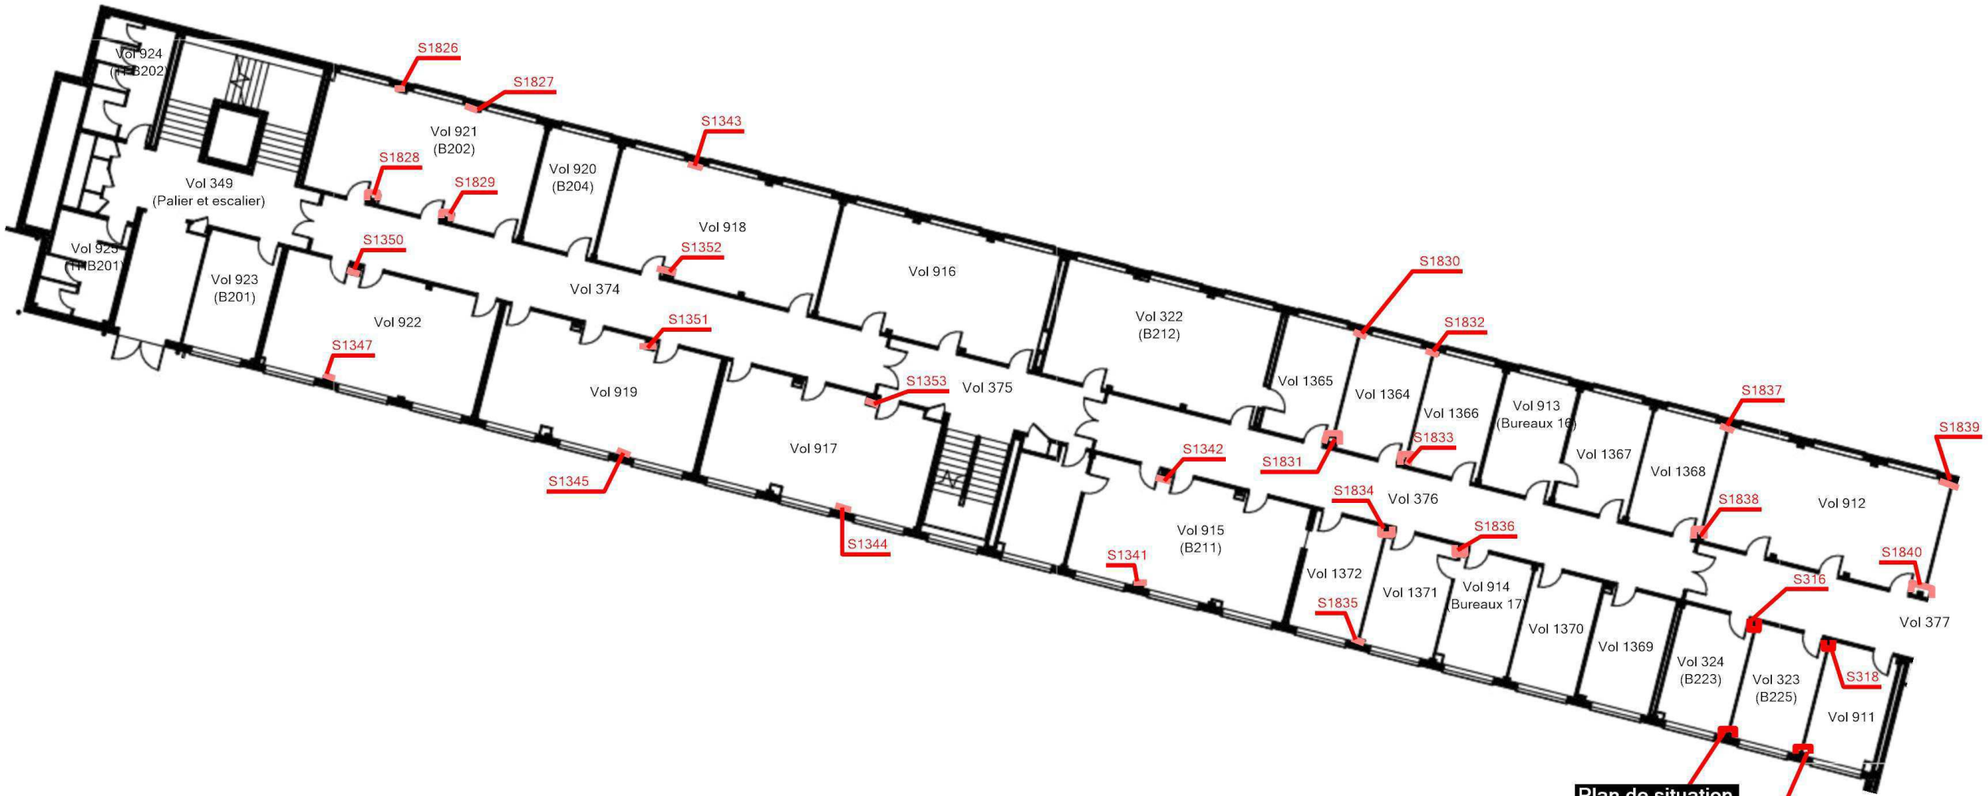

Plan de situation

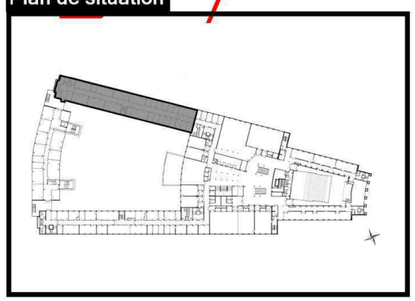

Légende


	S1830: Panneaux
	S1839: Panneaux
	S1350: Panneaux
	S1344: Panneaux
	S1835: Panneaux
	S1840: Panneaux
	S1828: Panneaux
	S1832: Panneaux
	S1836: Panneaux
	S318: Elément en fibre ciment
	S1342: Panneaux
	S319: Elément en fibre ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - AILE B - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002KN000189-5

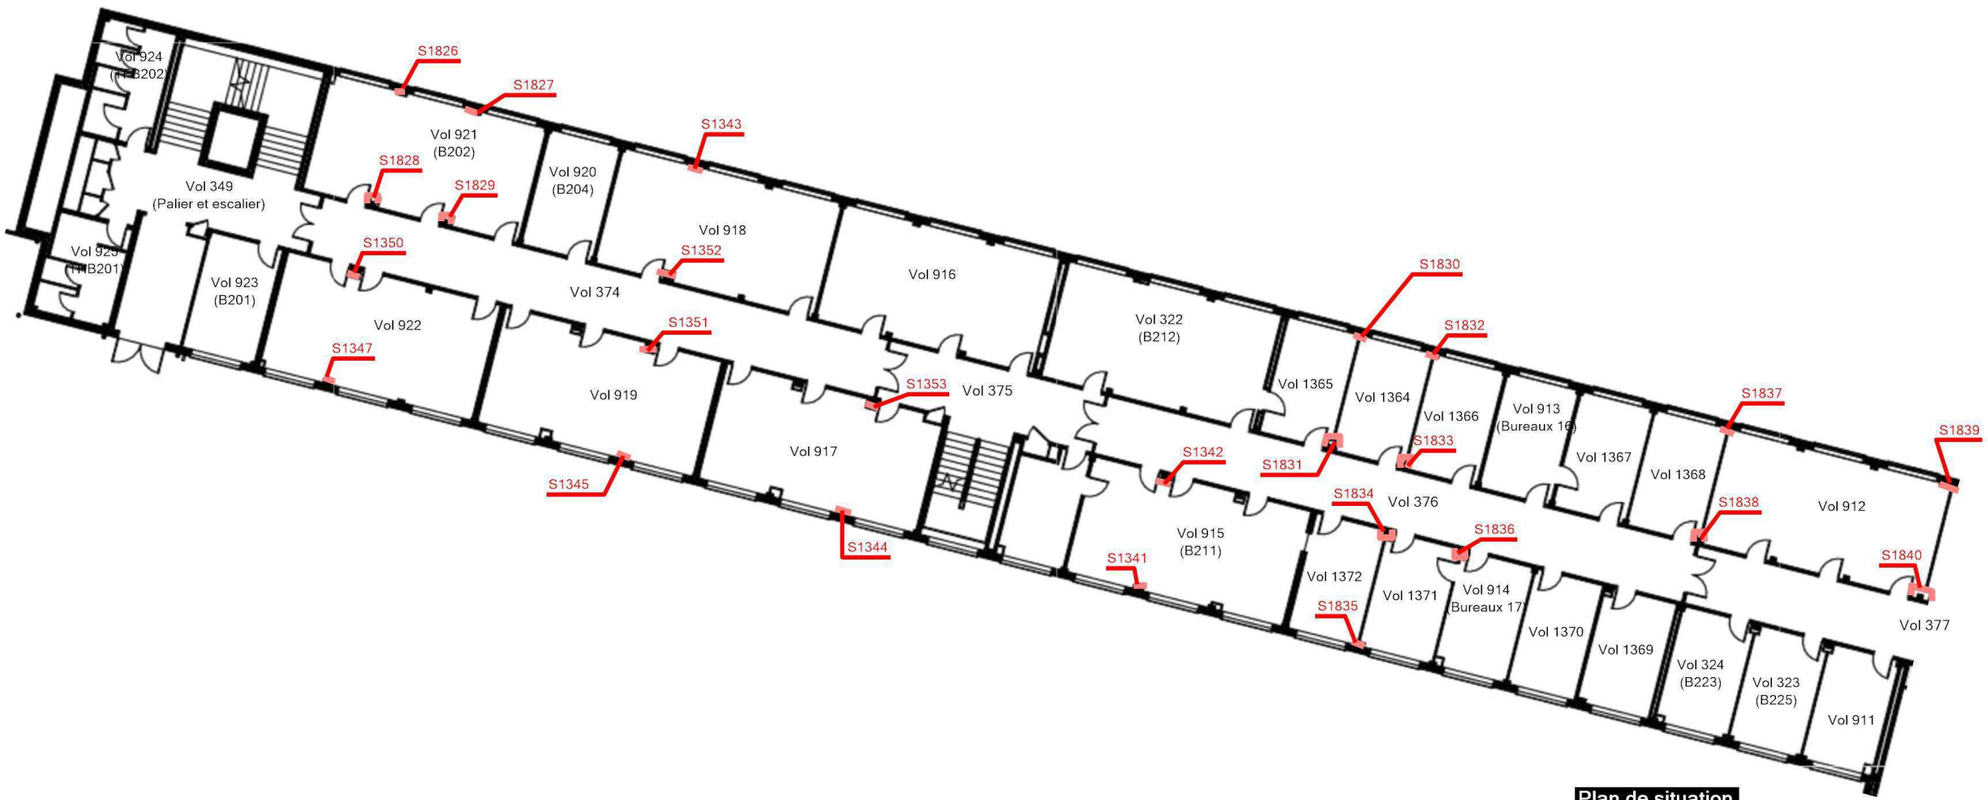

Plan de situation

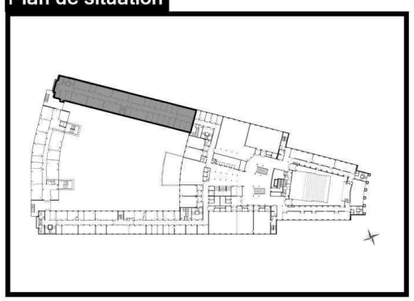

Légende


	S1830: Panneaux
	S1839: Panneaux
	S1350: Panneaux
	S1344: Panneaux
	S1835: Panneaux
	S1840: Panneaux
	S1828: Panneaux
	S1832: Panneaux
	S1836: Panneaux
	S1342: Panneaux
	S1351: Panneaux
	S1834: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - AILE B - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence:
002KN000189-5

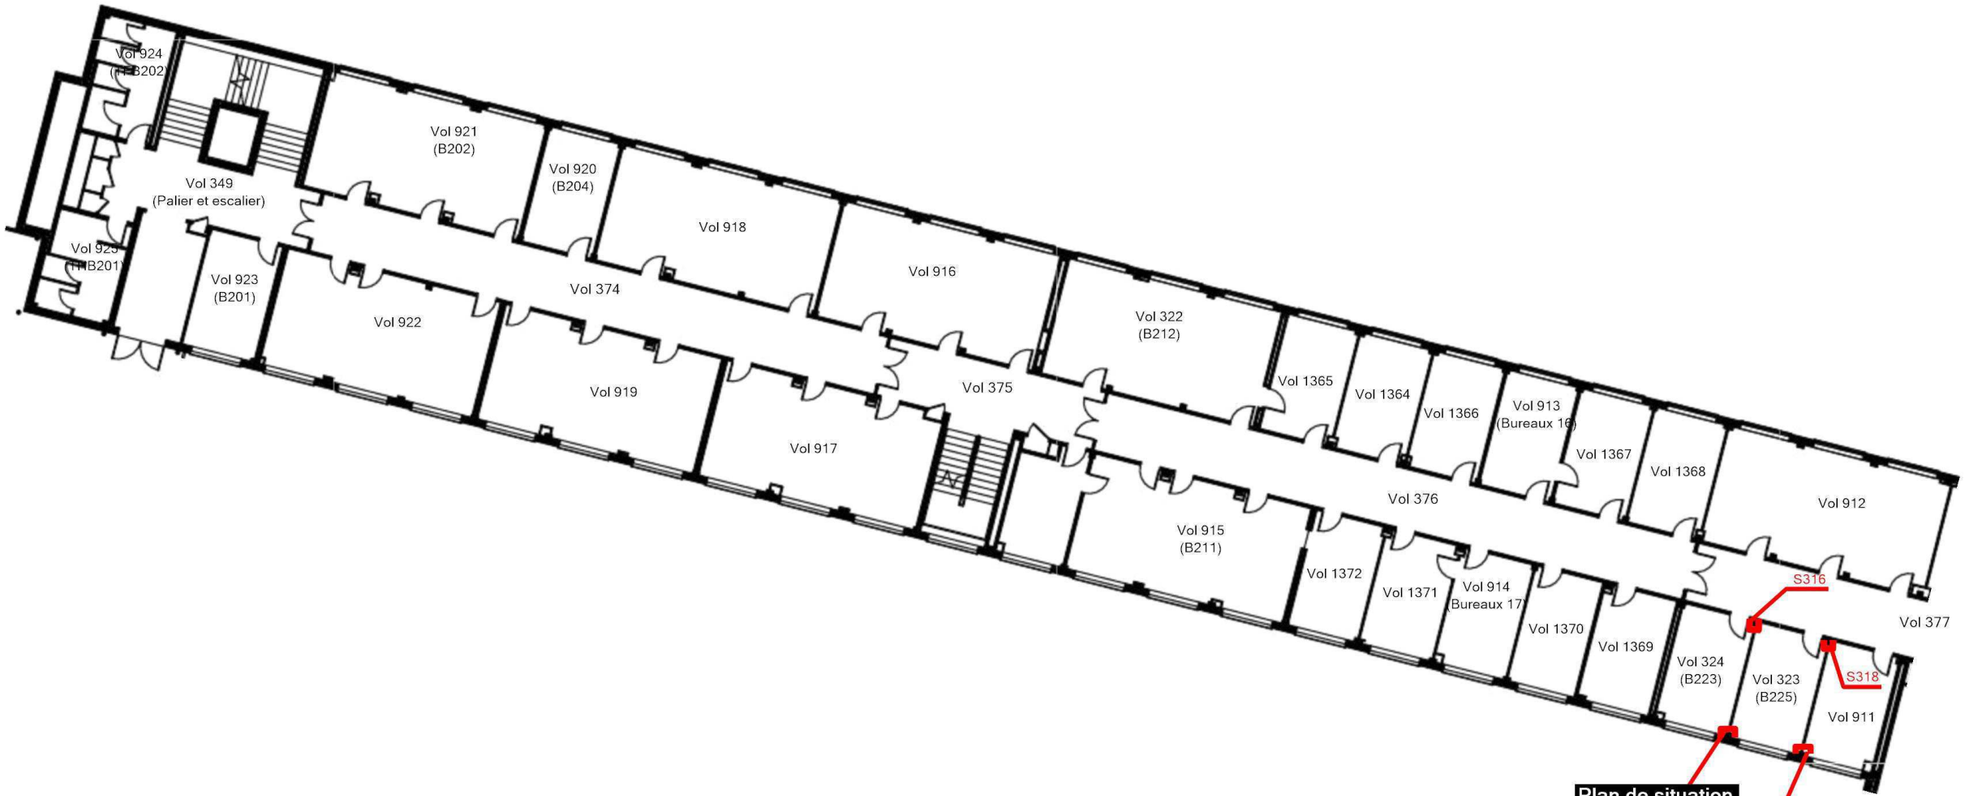

Plan de situation

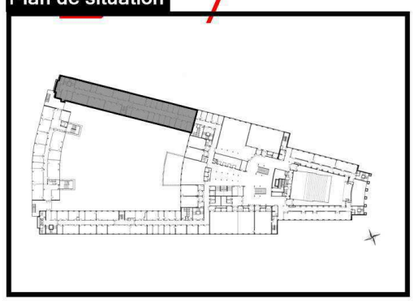

Légende

	S318: Elément en fibre ciment
	S319: Elément en fibre ciment
	S317: Elément en fibre ciment
	S316: Elément en fibre ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - AILE C - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation

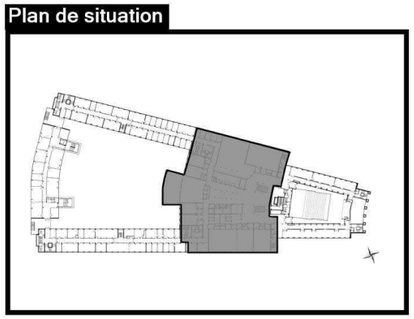


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

PLAN R+2 - AILE C - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

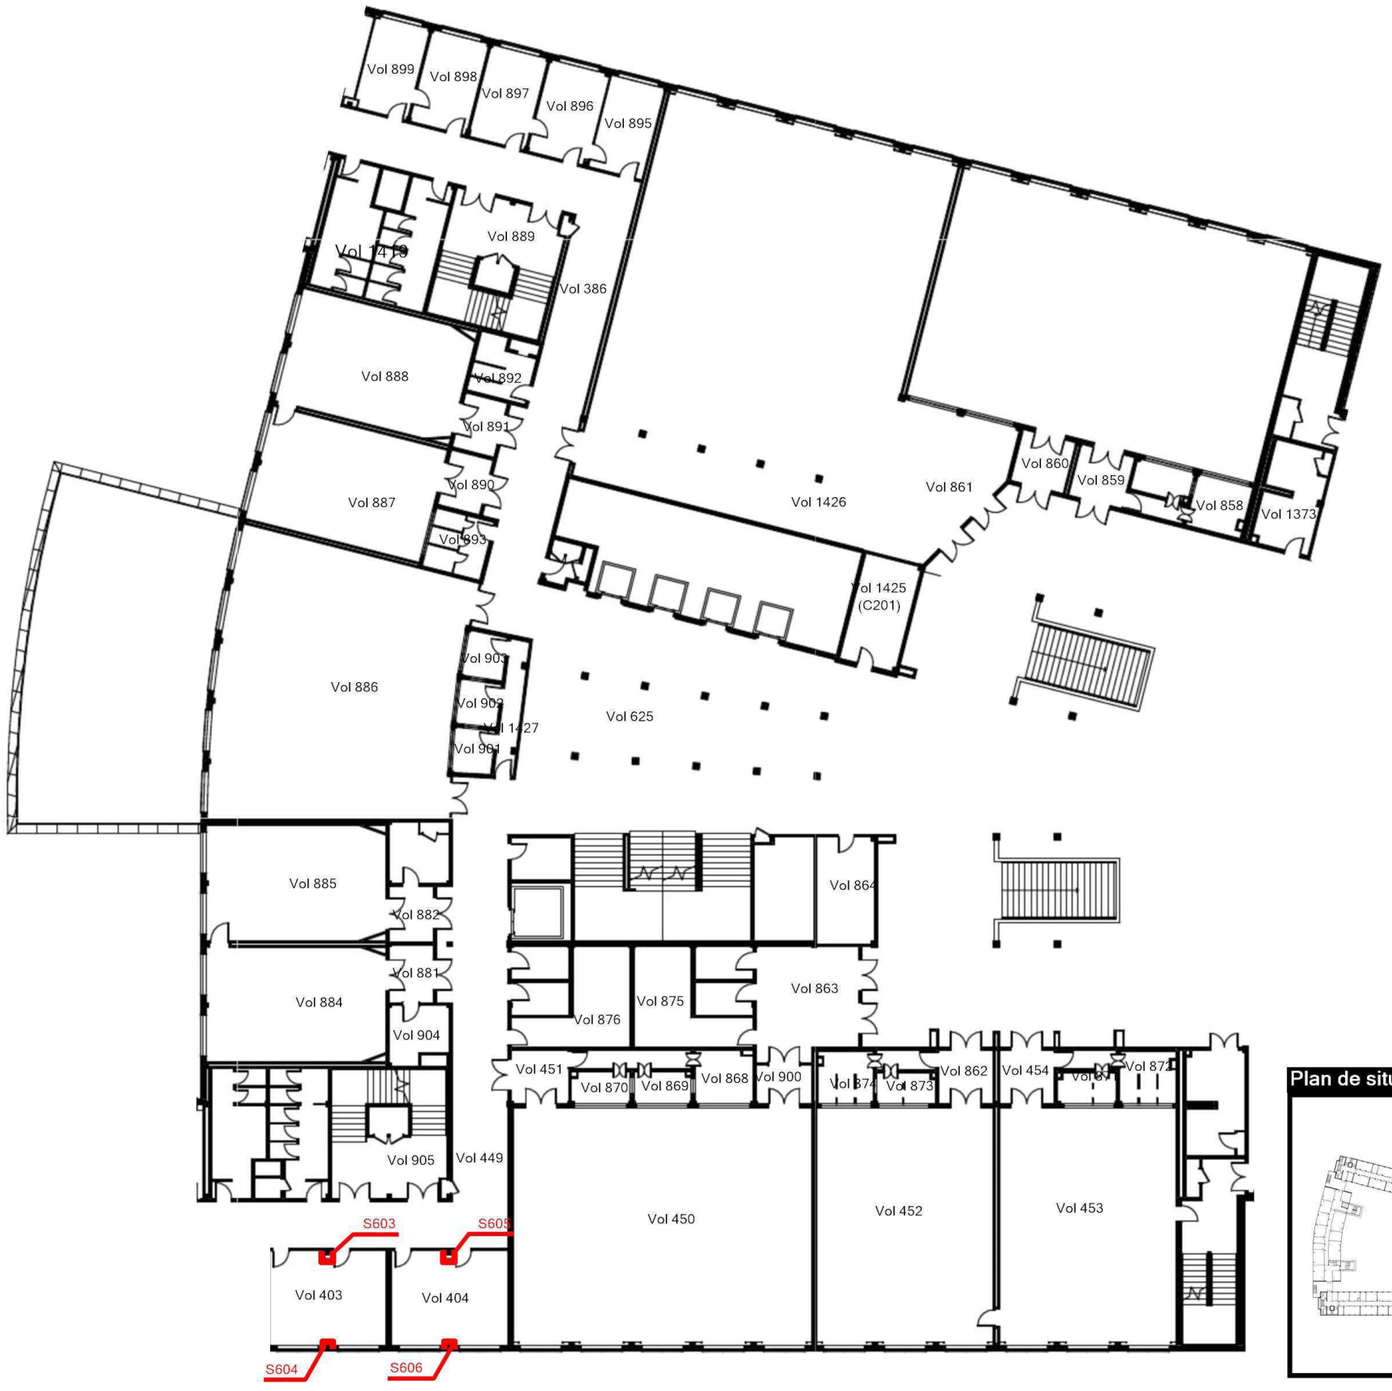

Légende

	S604: Elément en fibre ciment
	S606: Elément en fibre ciment
	S603: Elément en fibre ciment
	S605: Elément en fibre ciment

Plan de situation

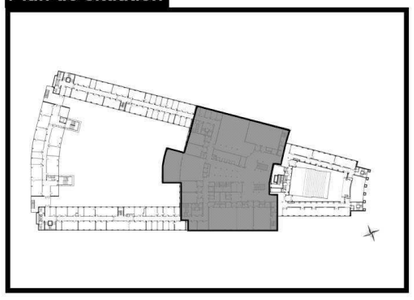


AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - AILE C - MPCA COFFRAGES PERDUS


Référence:
002KN000189-5

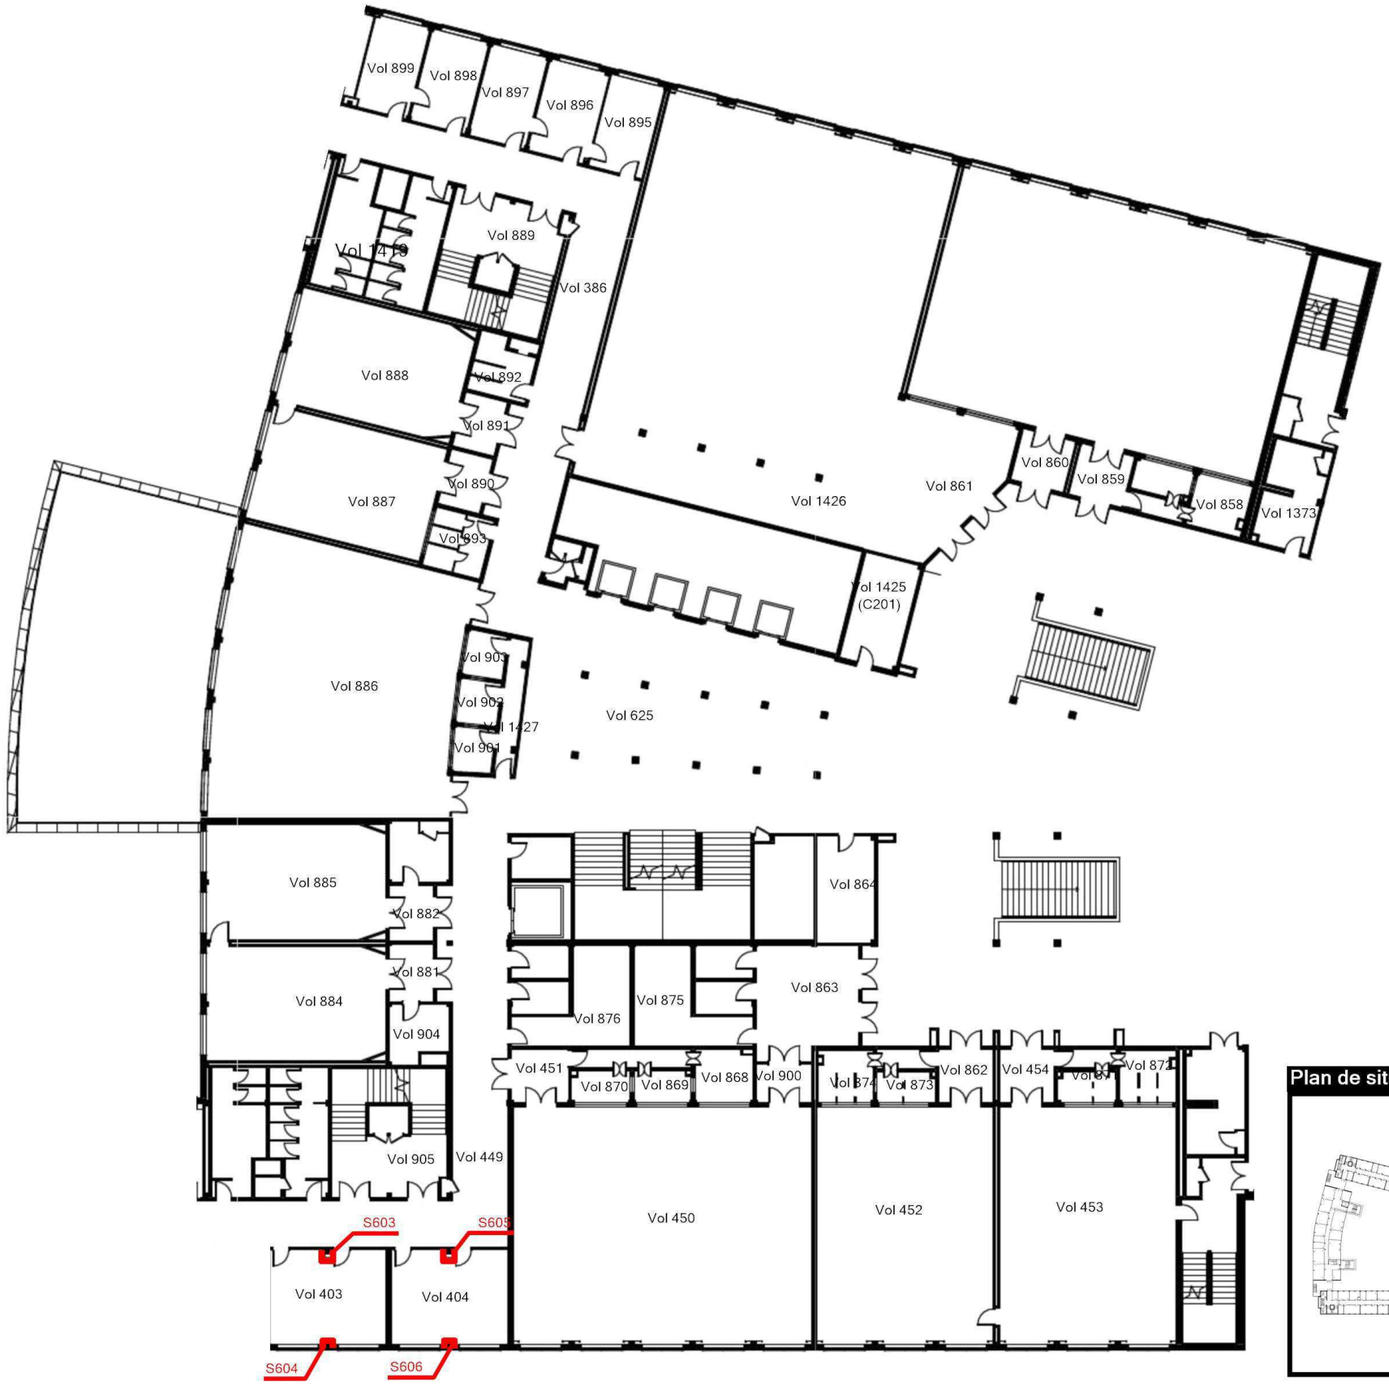

Légende

	S604: Elément en fibre ciment
	S606: Elément en fibre ciment
	S603: Elément en fibre ciment
	S605: Elément en fibre ciment


Plan de situation

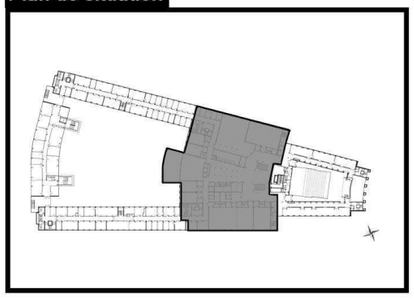

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - AILE D - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

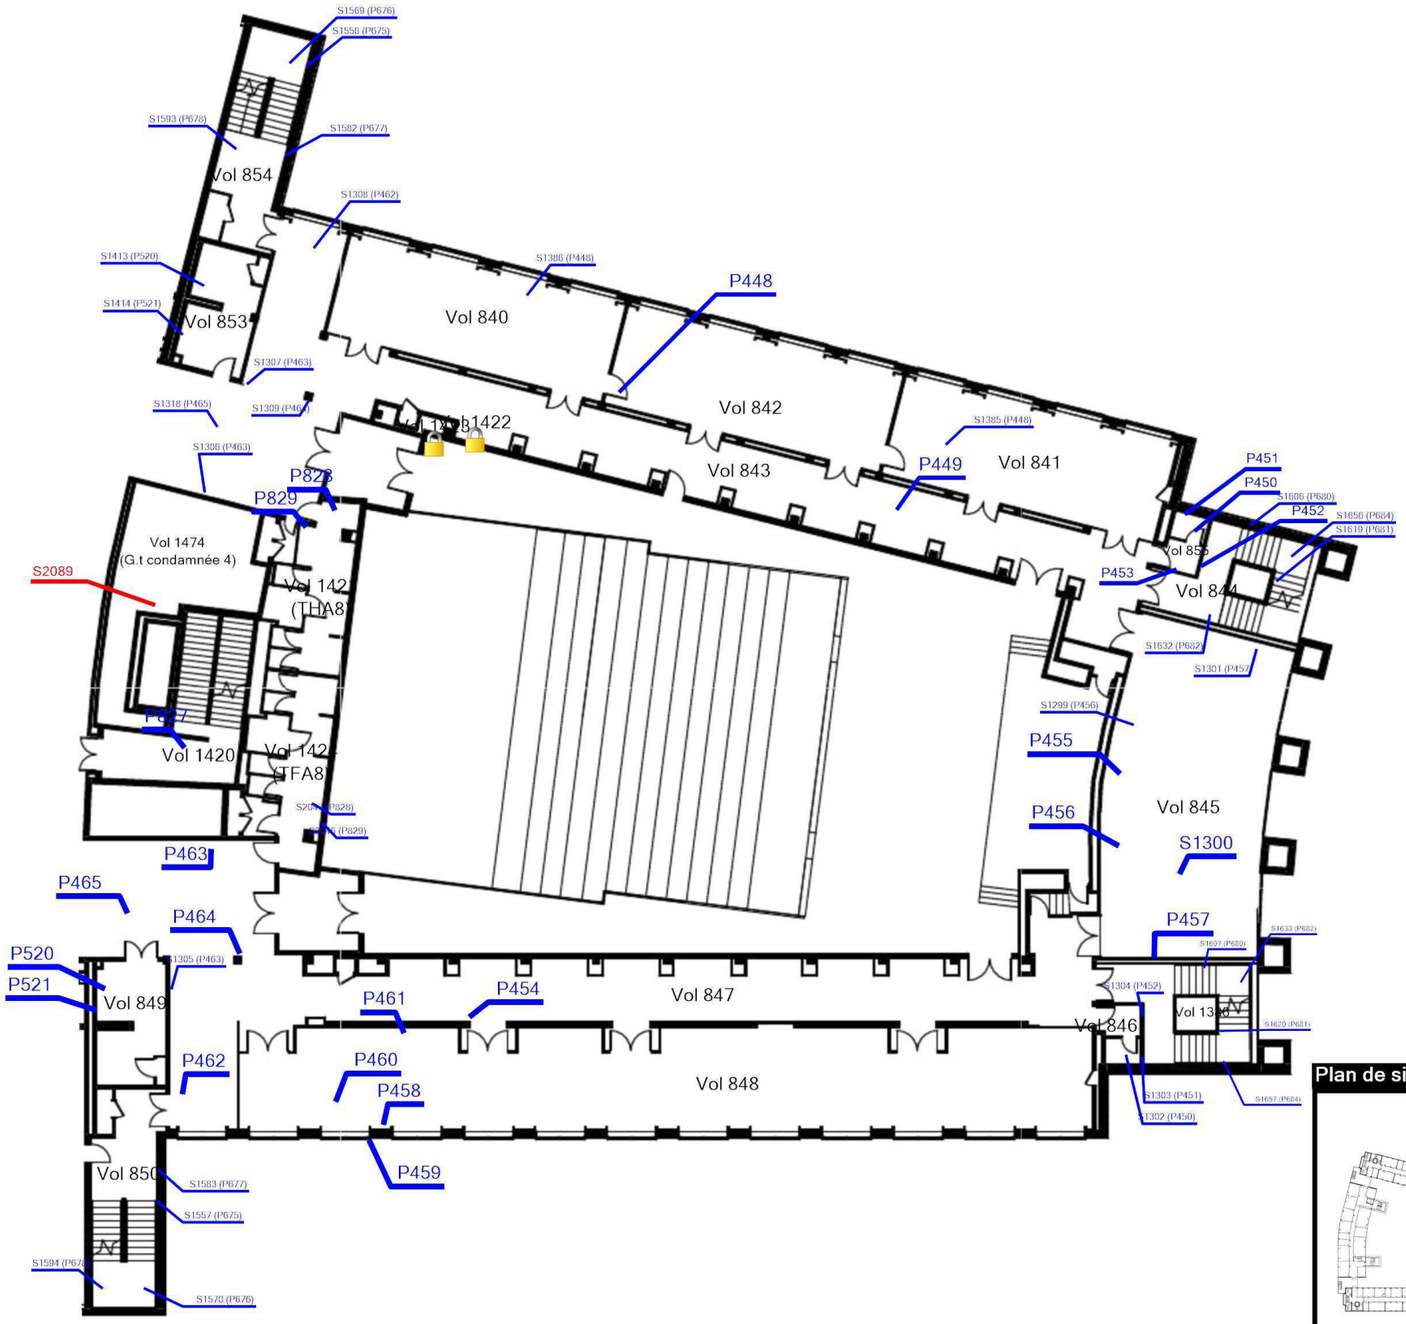

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation

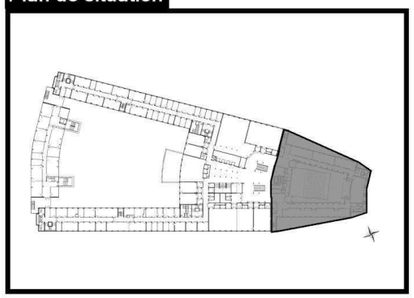


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (validité début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PLAN R+2 - AILE D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

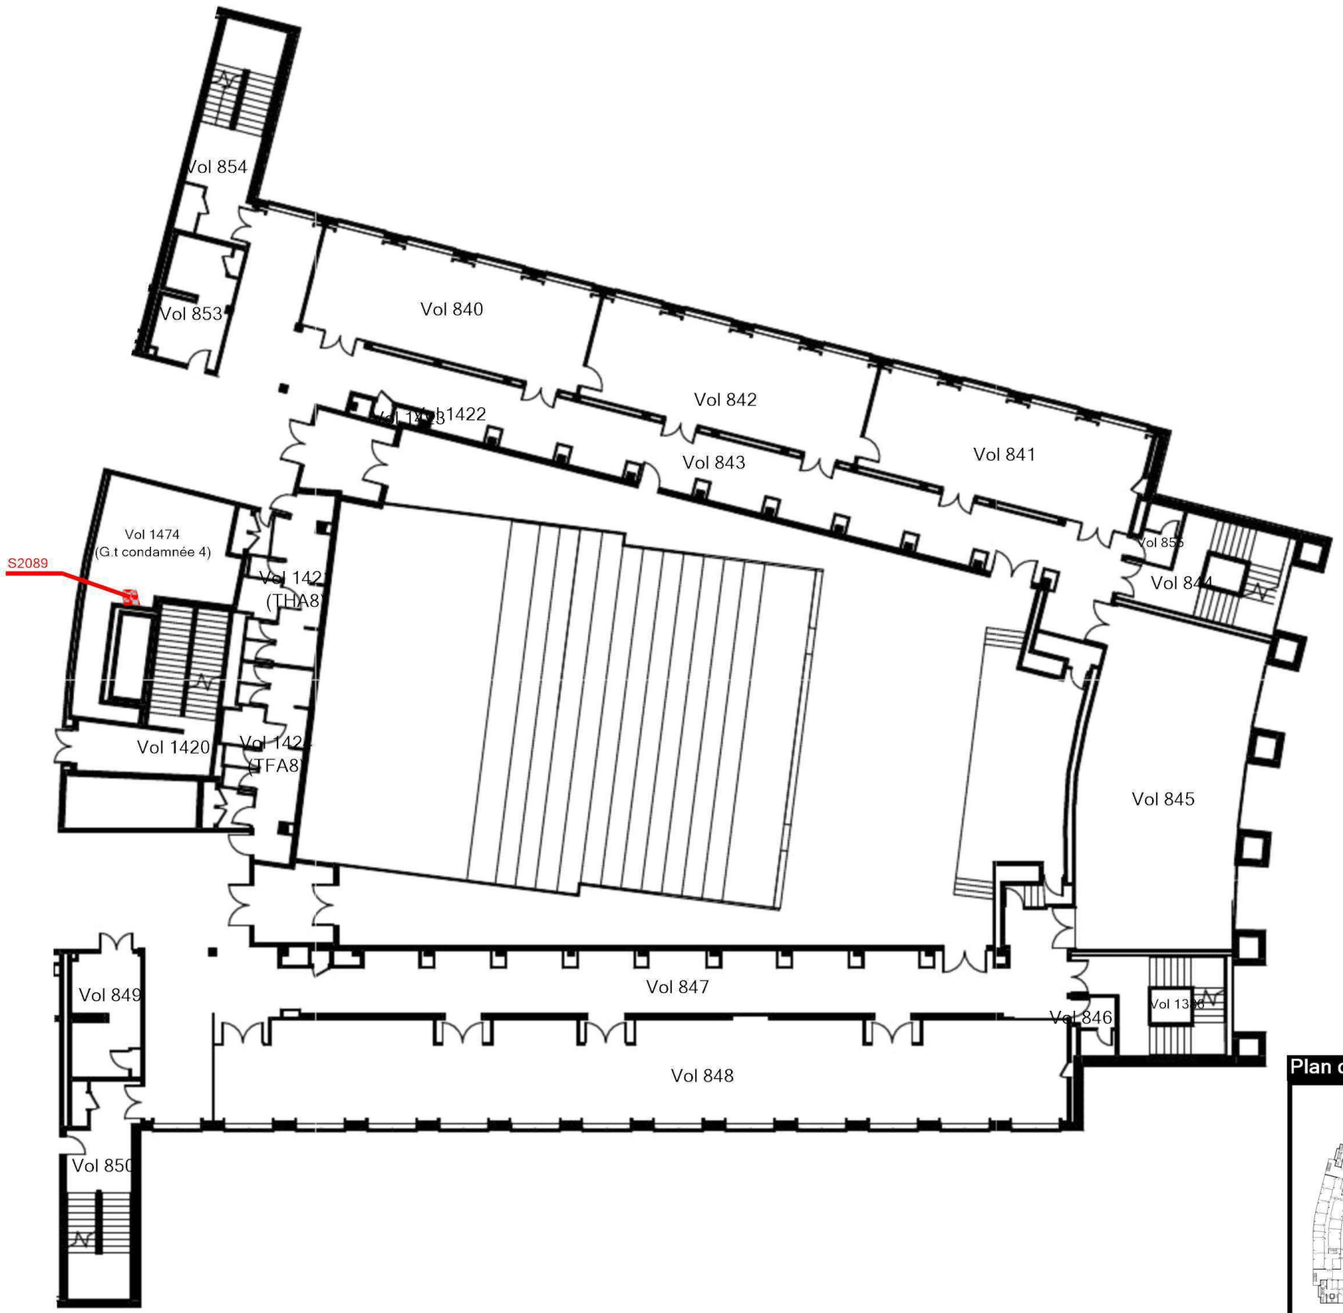

Légende

	S2089: Conduit en fibres-ciment


Plan de situation

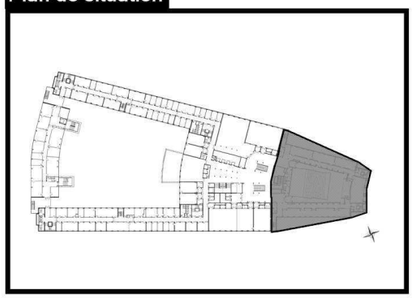

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - AILE D - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002KN000189-5

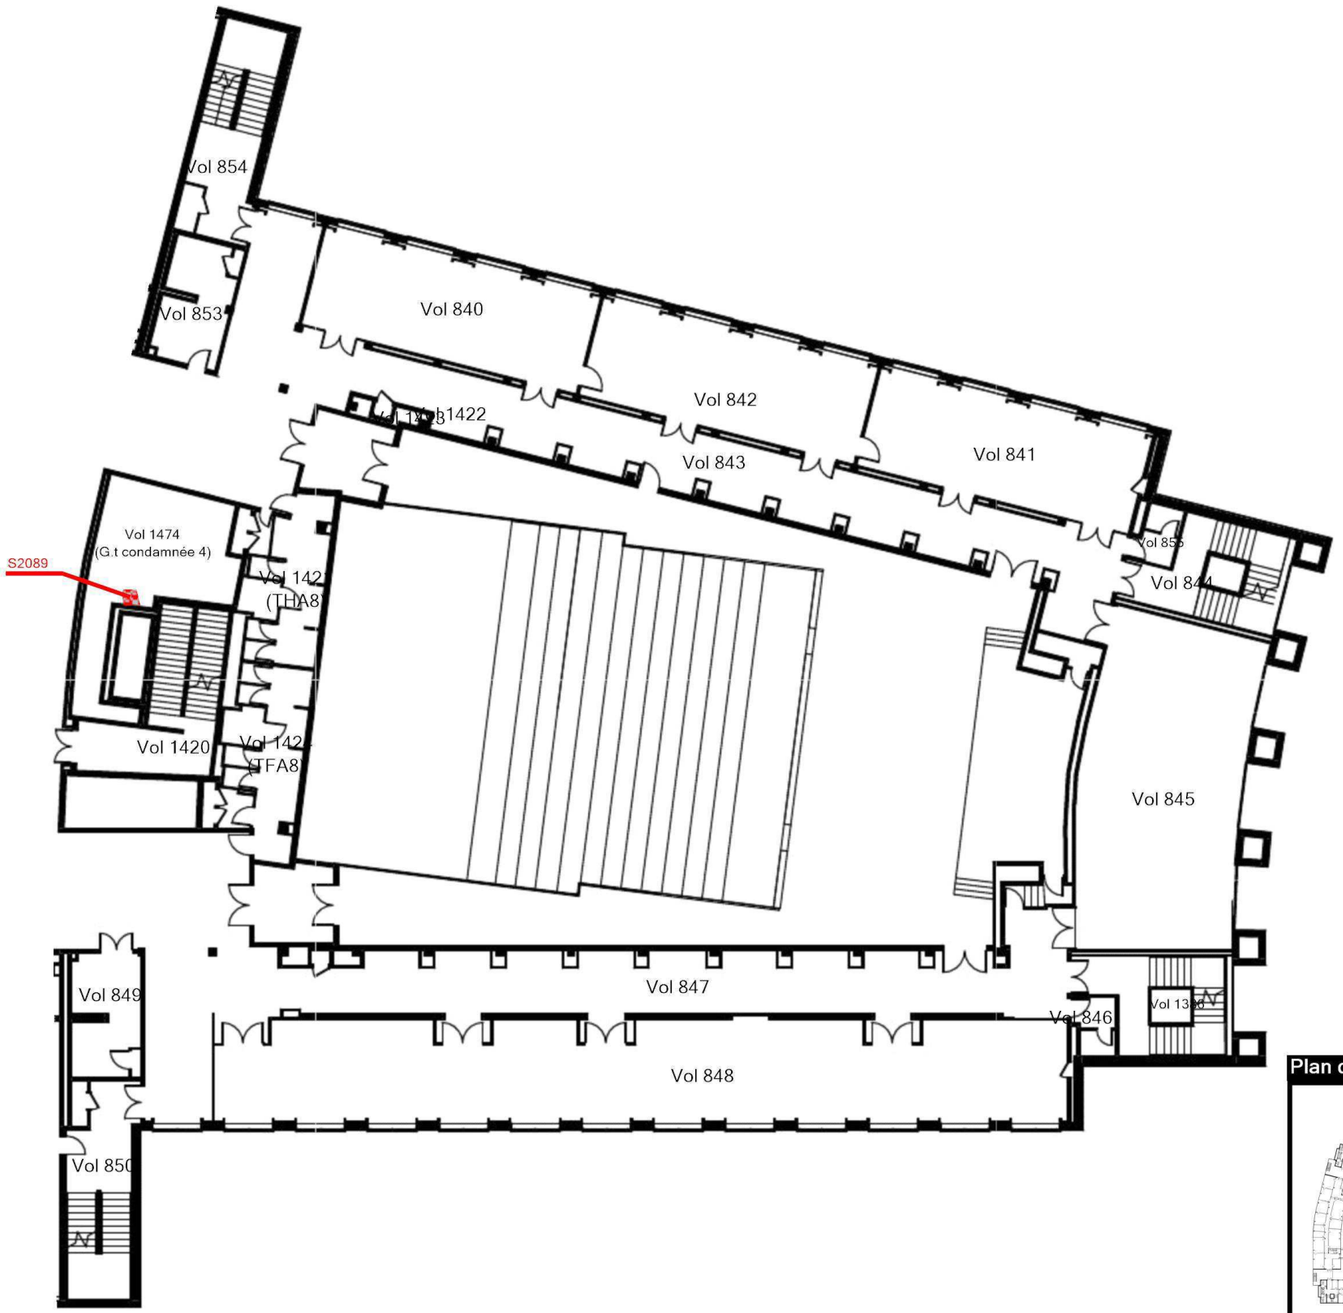

Légende

	S2089: Conduit en fibres-ciment


Plan de situation

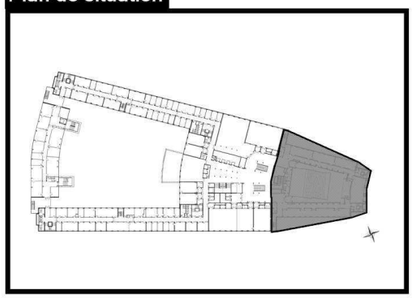

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - AILE P - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

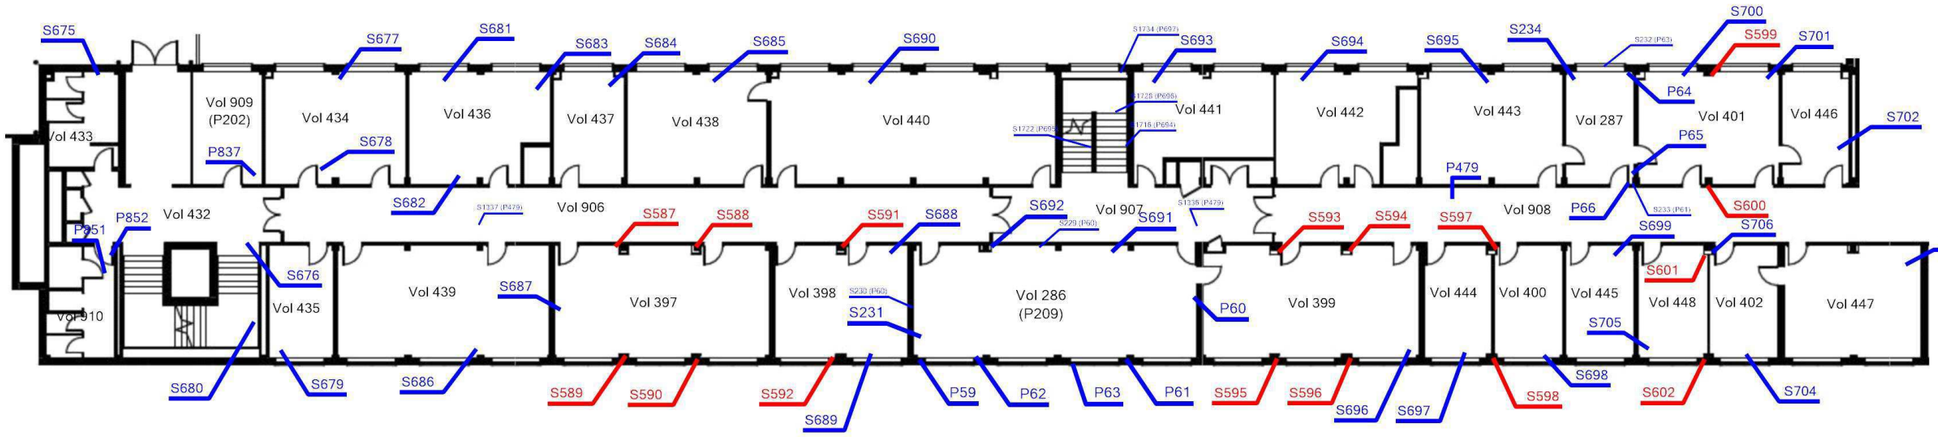

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

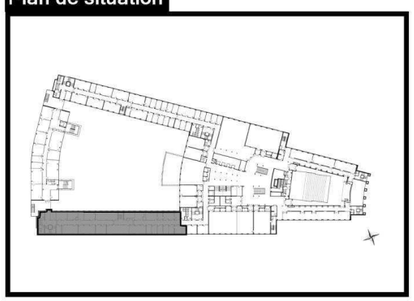

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - AILE P - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

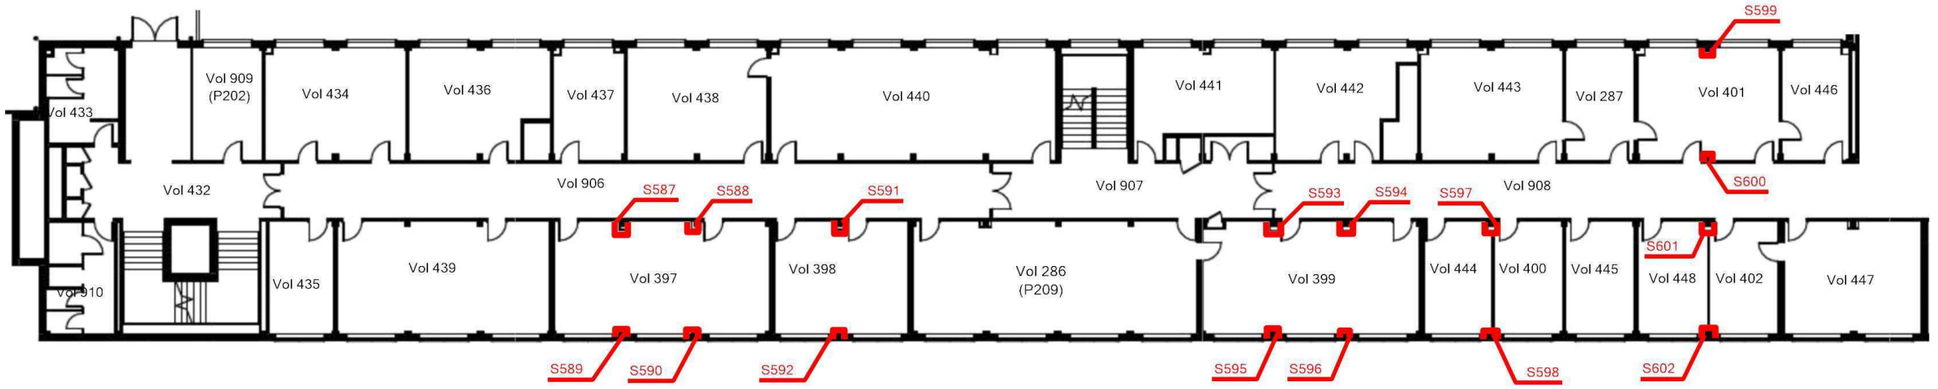

Légende

	S599: Elément en fibre ciment
	S589: Elément en fibre ciment
	S587: Elément en fibre ciment
	S600: Elément en fibre ciment
	S590: Elément en fibre ciment
	S602: Elément en fibre ciment
	S592: Elément en fibre ciment
	S597: Elément en fibre ciment
	S598: Elément en fibre ciment
	S591: Elément en fibre ciment
	S594: Elément en fibre ciment
	S588: Elément en fibre ciment

Plan de situation




AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+2 - AILE P - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence:
002KN000189-5

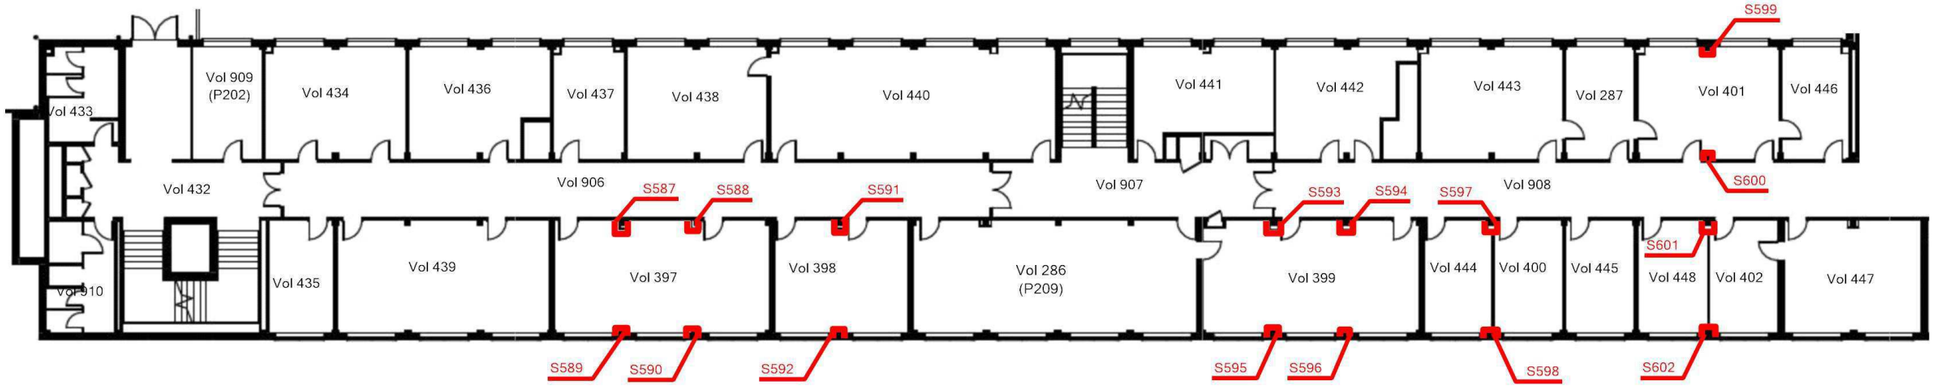

Plan de situation

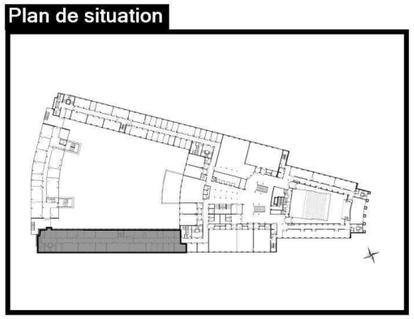

Légende


	S599: Elément en fibre ciment
	S589: Elément en fibre ciment
	S587: Elément en fibre ciment
	S600: Elément en fibre ciment
	S590: Elément en fibre ciment
	S602: Elément en fibre ciment
	S592: Elément en fibre ciment
	S597: Elément en fibre ciment
	S598: Elément en fibre ciment
	S591: Elément en fibre ciment
	S594: Elément en fibre ciment
	S588: Elément en fibre ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

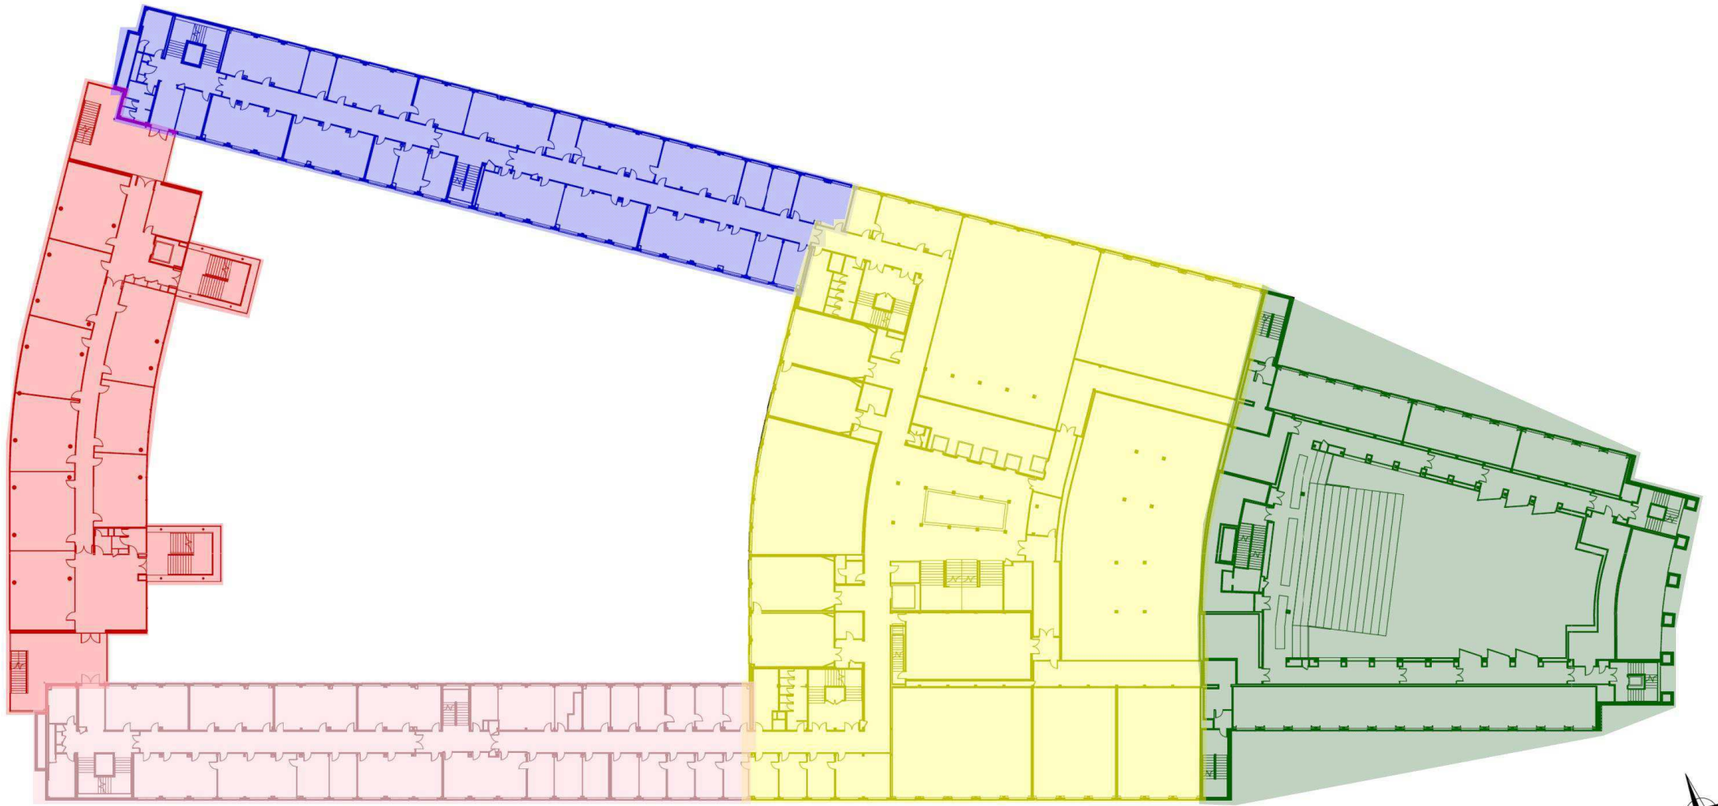


Légende	
	Aile A
	Aile B
	Aile C
	Aile D
	Aile P

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN R+3 - AILE A - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

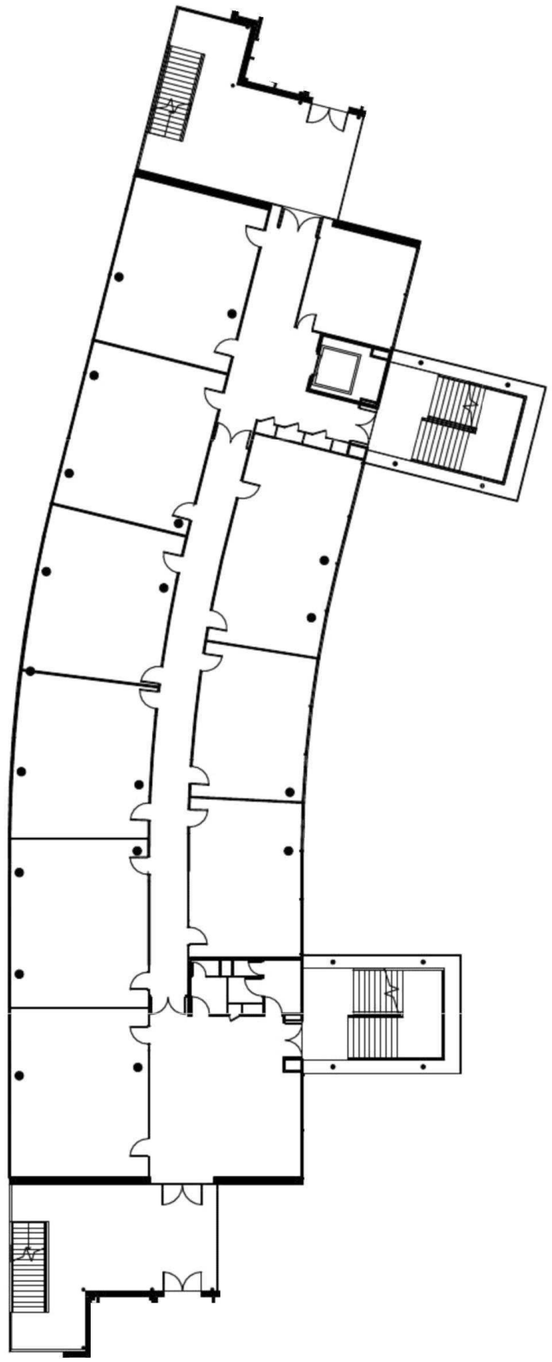

Légende


Plan de situation

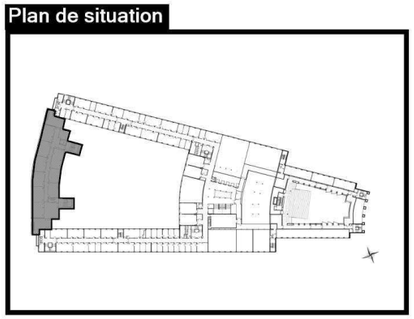


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE B - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

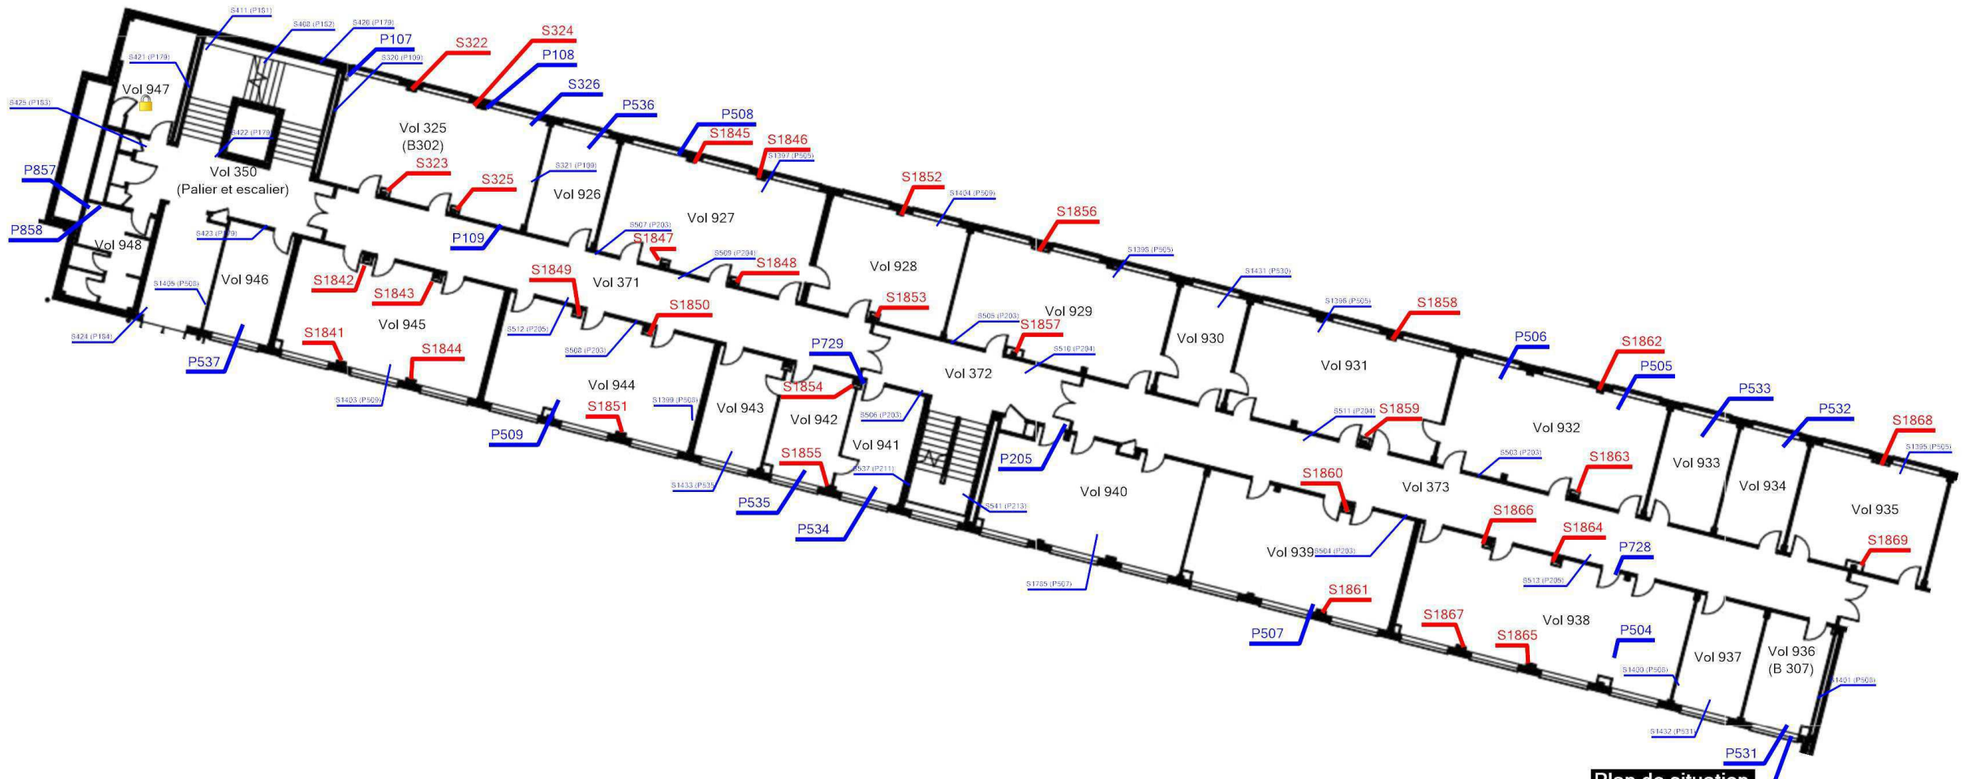

Plan de situation

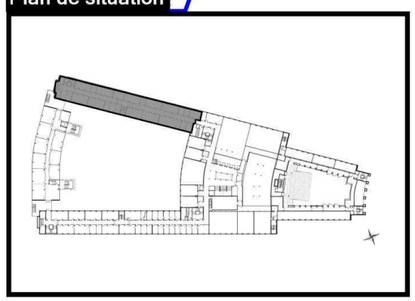

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE B - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5



Plan de situation

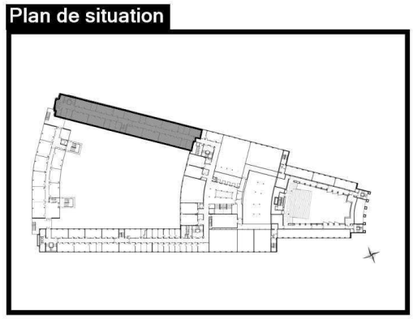

Légende

	S1845: Panneaux
	S1843: Panneaux
	S1866: Panneaux
	S1867: Panneaux
	S1844: Panneaux
	S1850: Panneaux
	S1858: Panneaux
	S325: Elément en fibre ciment
	S1851: Panneaux
	S1853: Panneaux
	S1860: Panneaux
	S1863: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE B - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002KN000189-5



Plan de situation

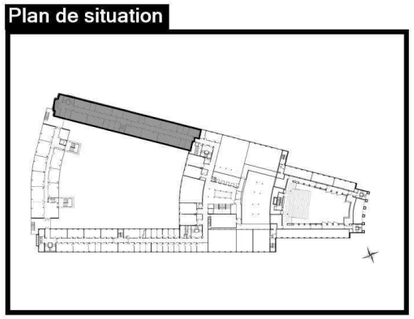

Légende

	S1845: Panneaux
	S1843: Panneaux
	S1866: Panneaux
	S1867: Panneaux
	S1844: Panneaux
	S1850: Panneaux
	S1858: Panneaux
	S1851: Panneaux
	S1853: Panneaux
	S1860: Panneaux
	S1863: Panneaux
	S1865: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE B - MPCA COFFRAGES PERDUS


Référence:
002KN000189-5



Légende

	S325: Elément en fibre ciment
	S324: Elément en fibre ciment
	S323: Elément en fibre ciment
	S322: Elément en fibre ciment

Plan de situation

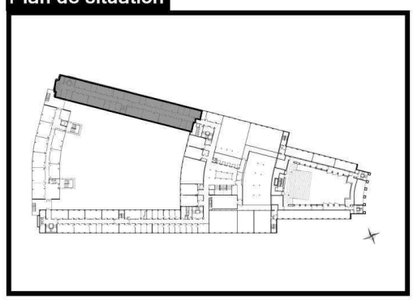

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE C - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation

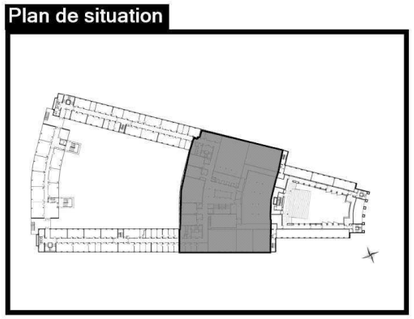

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE C - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

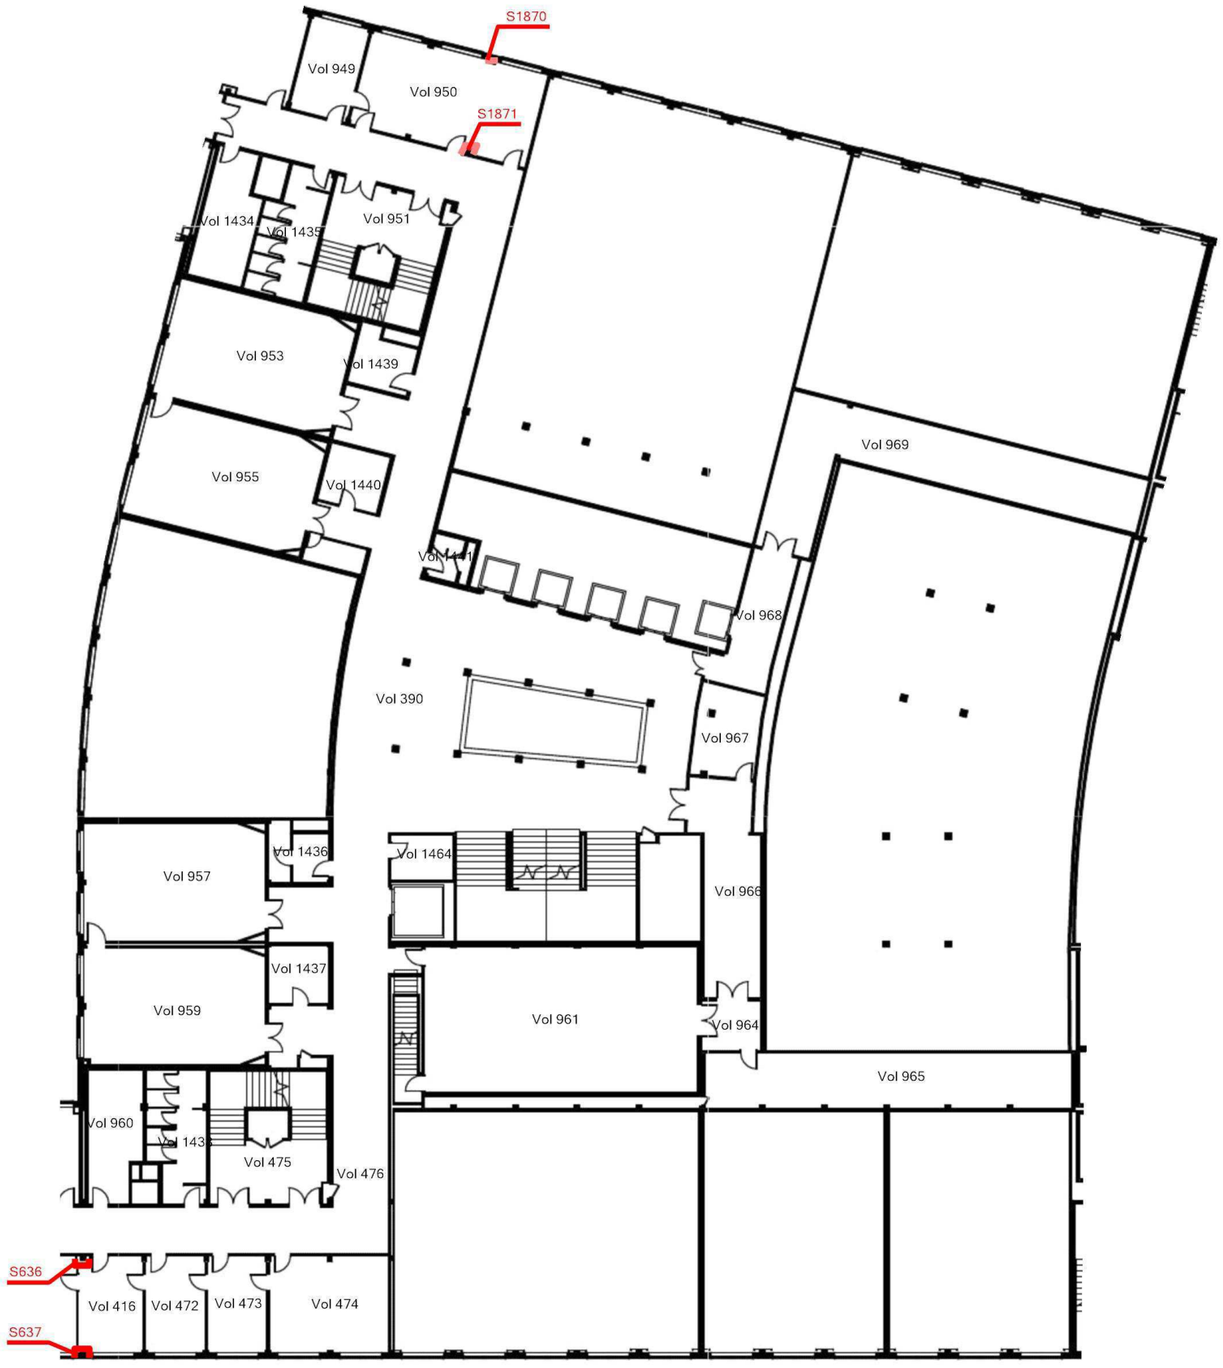

Légende

	S1870: Panneaux
	S1871: Panneaux
	S636: Elément en fibre ciment
	S637: Elément en fibre ciment


Plan de situation

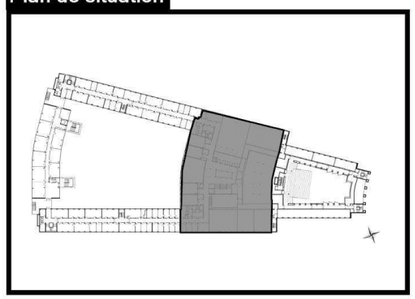

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE C - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002KN000189-5

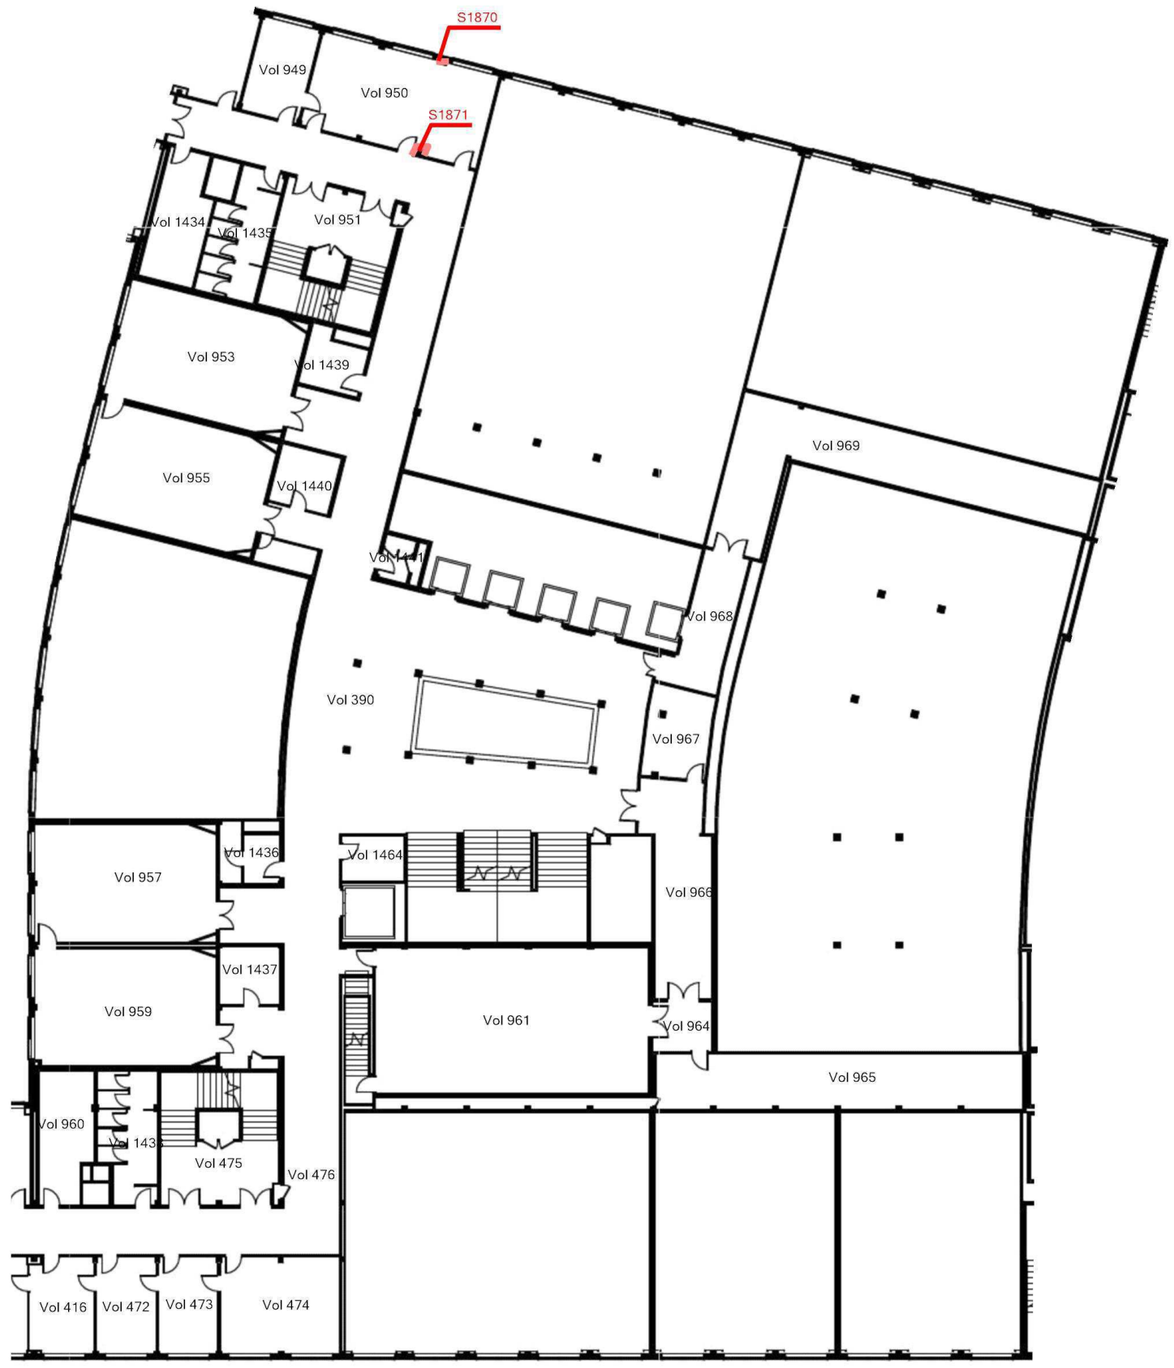

Légende

	S1870: Panneaux
	S1871: Panneaux


Plan de situation

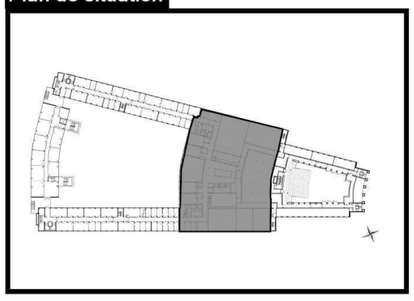

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE C - MPCA COFFRAGES PERDUS


Référence:
002KN000189-5

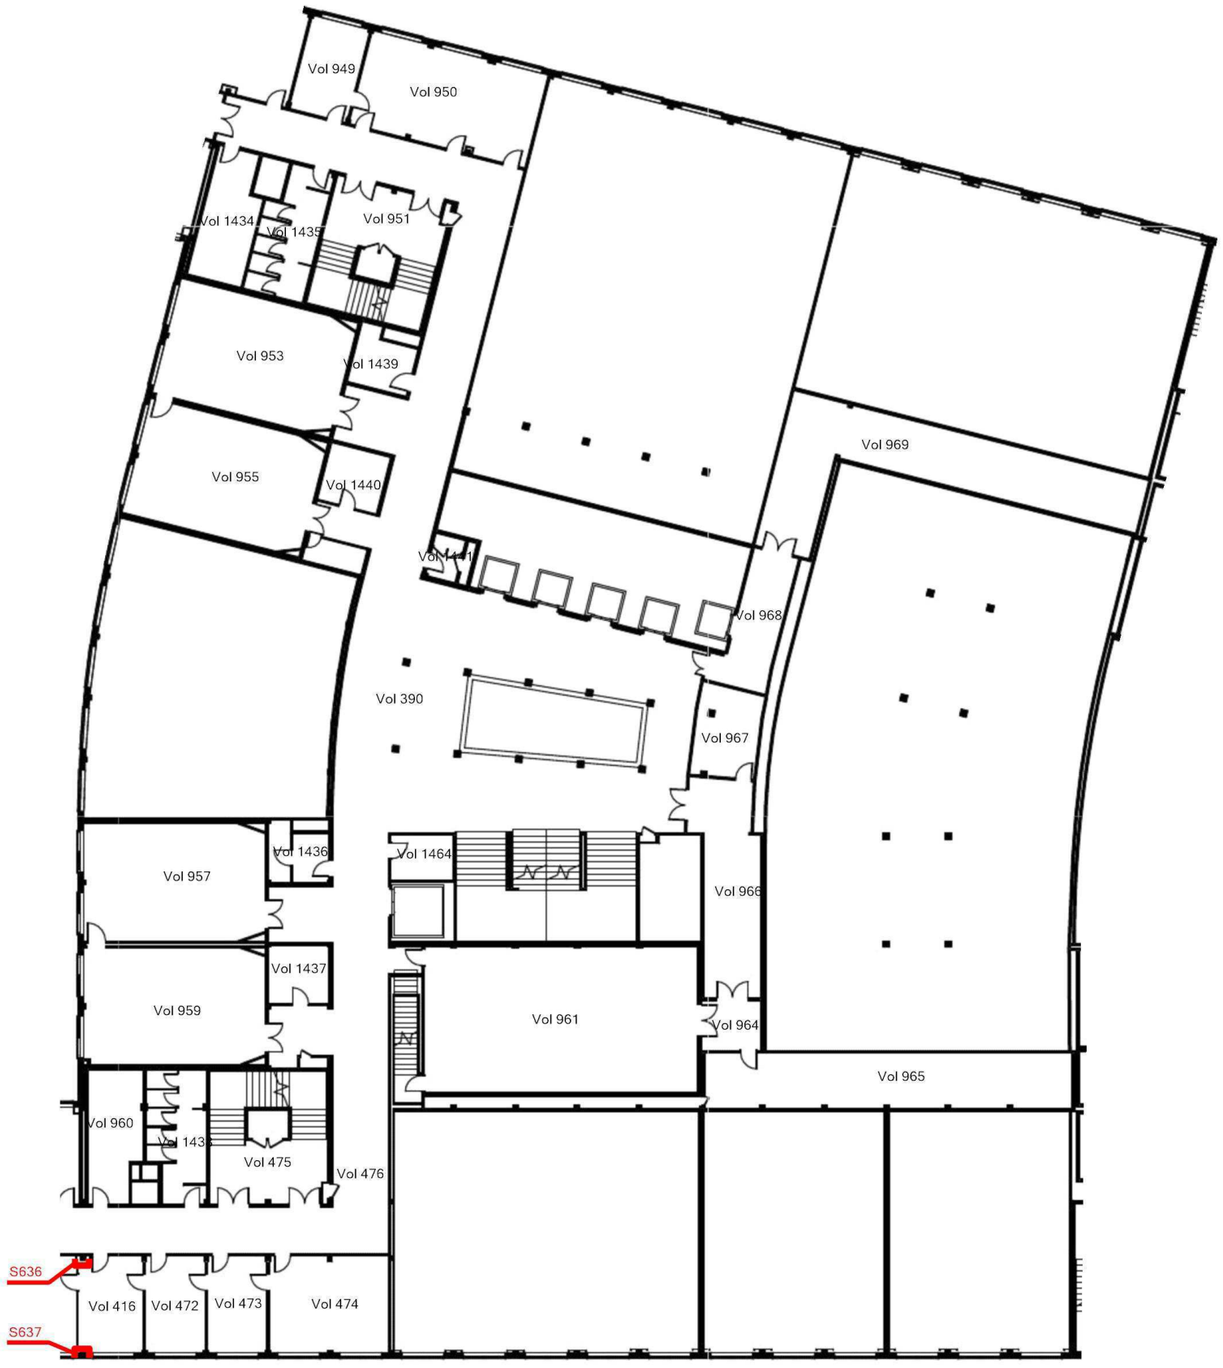

Légende

	S636: Elément en fibre ciment
	S637: Elément en fibre ciment


Plan de situation

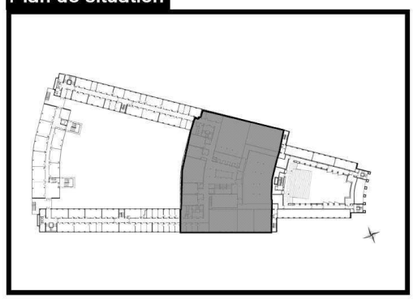

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE D - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

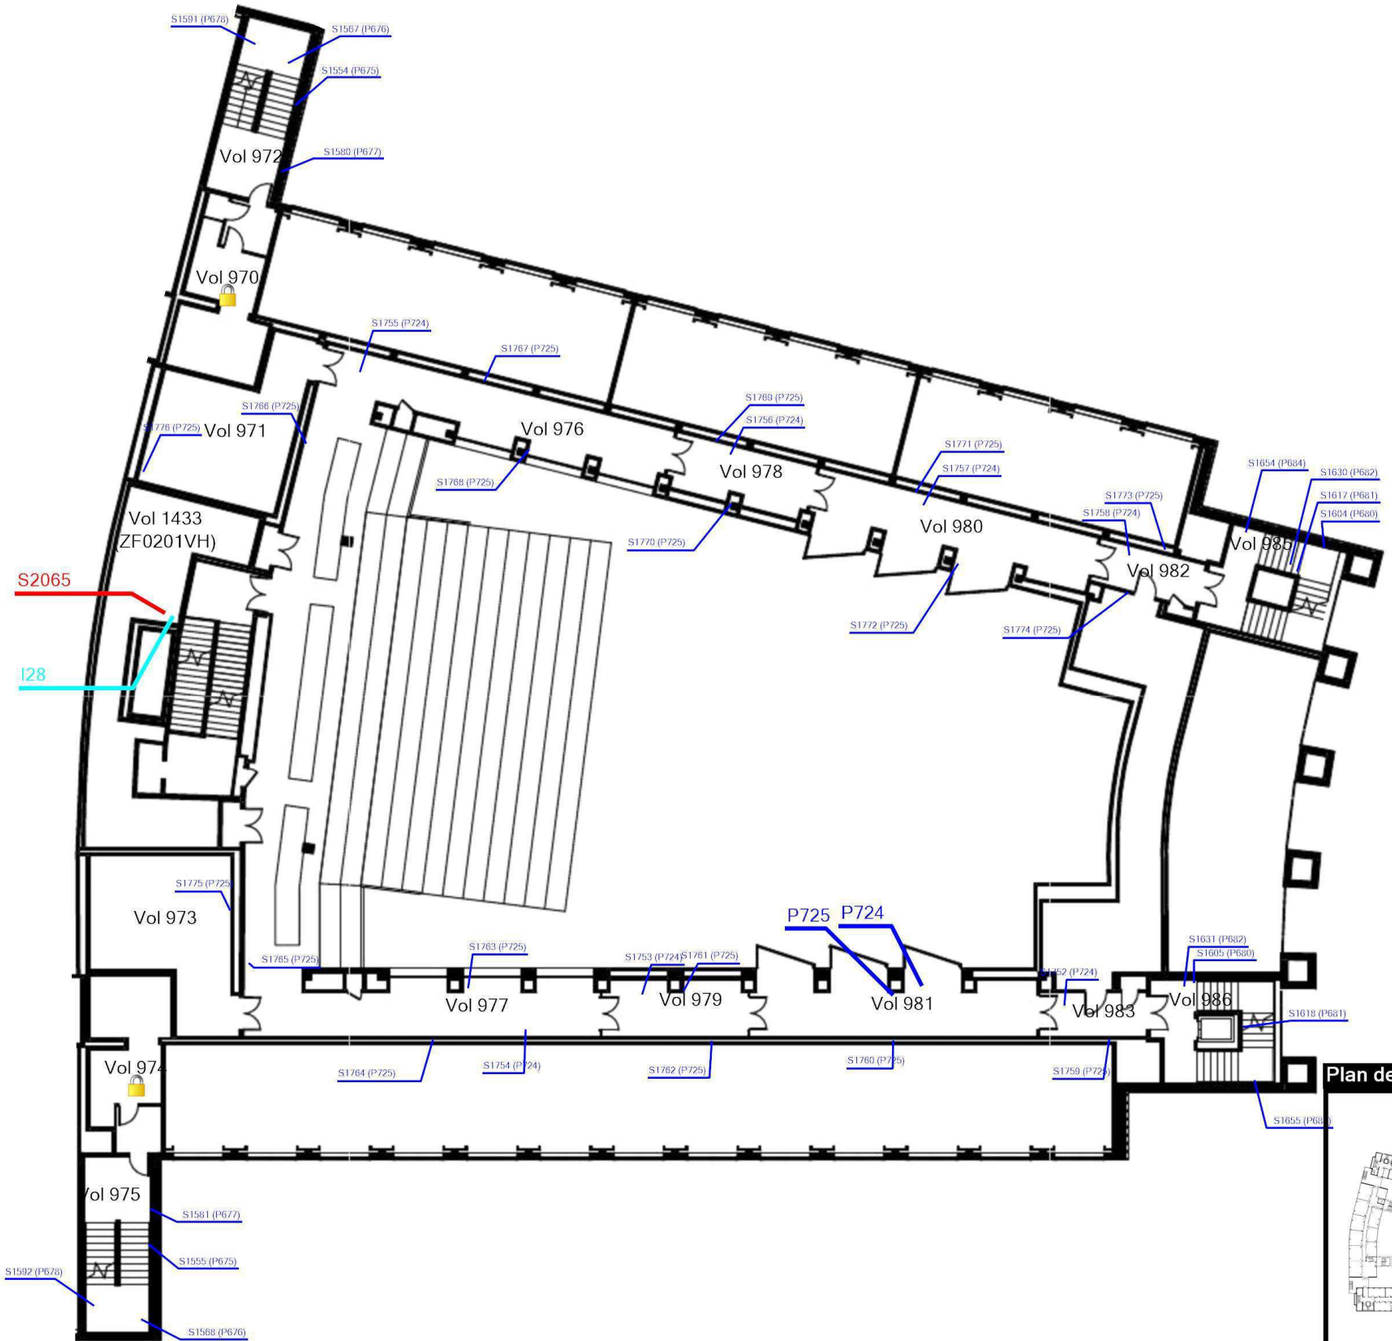

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

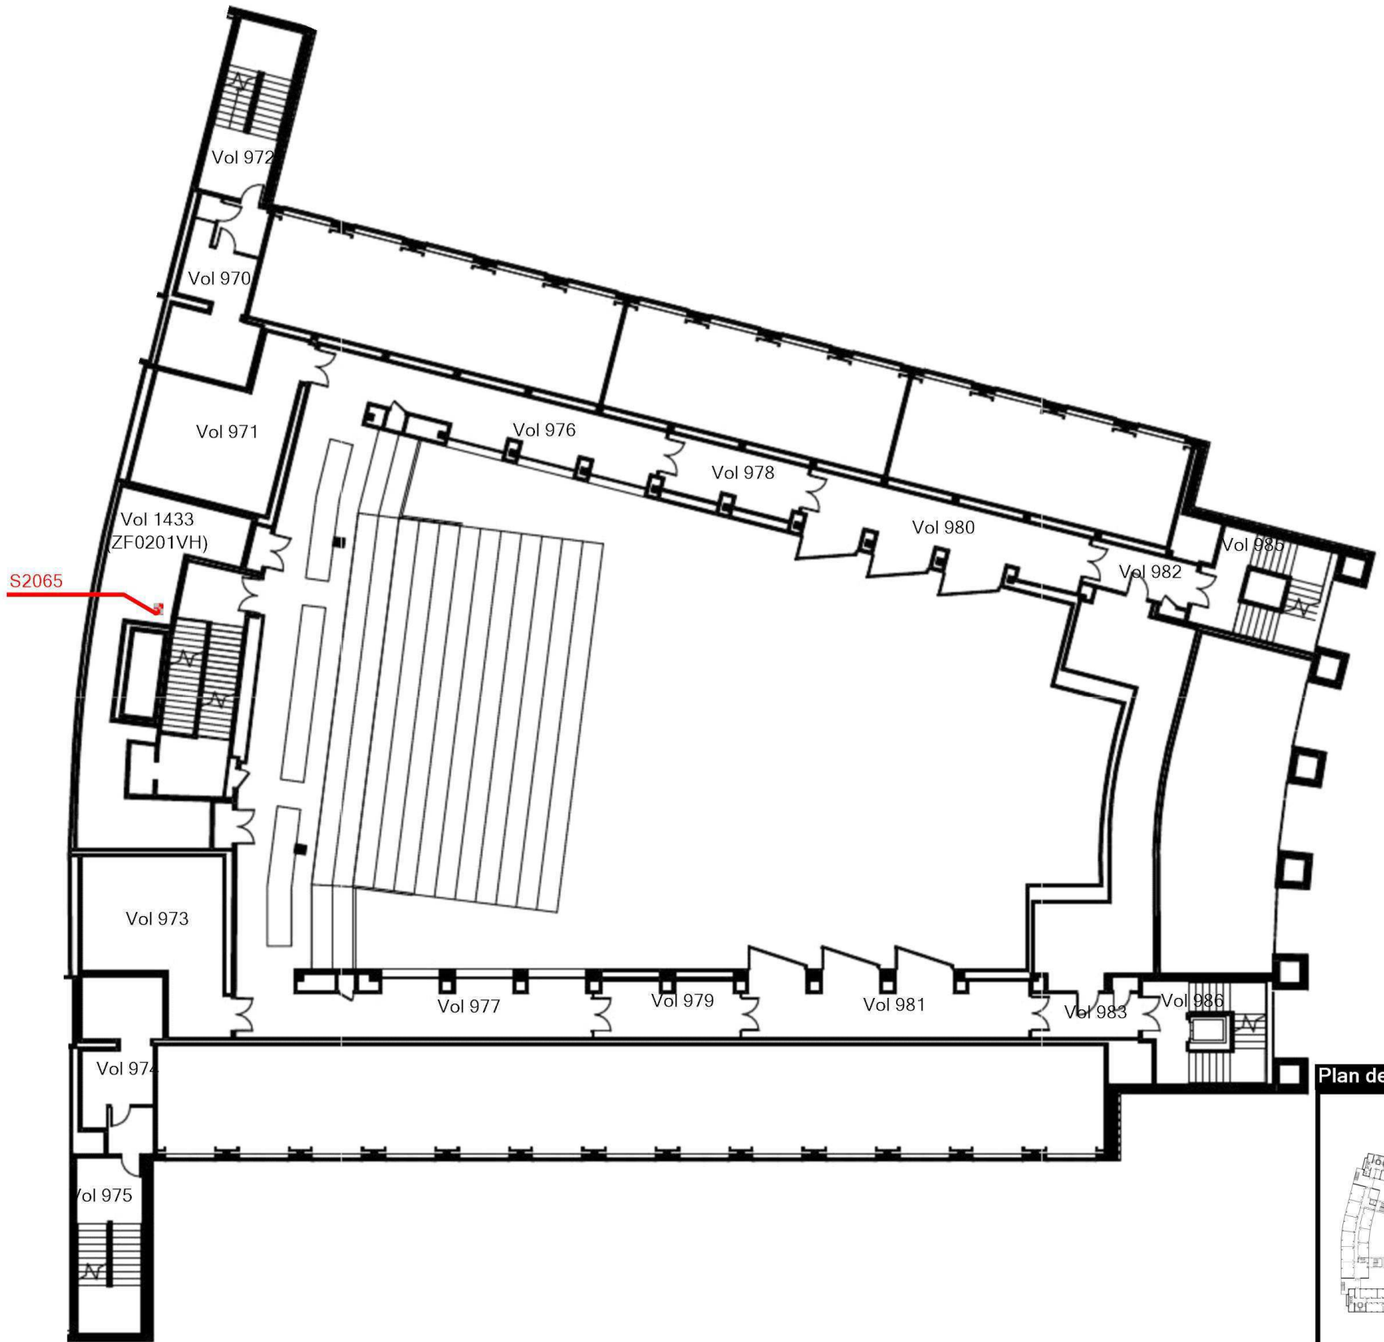

Légende

	S2065: Conduit en fibres-ciment


Plan de situation

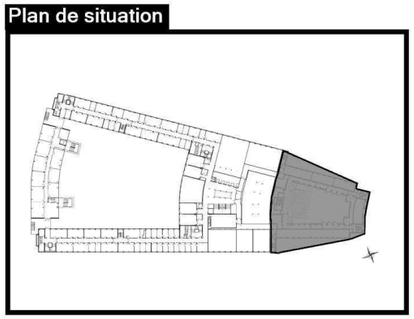

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE D - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002KN000189-5

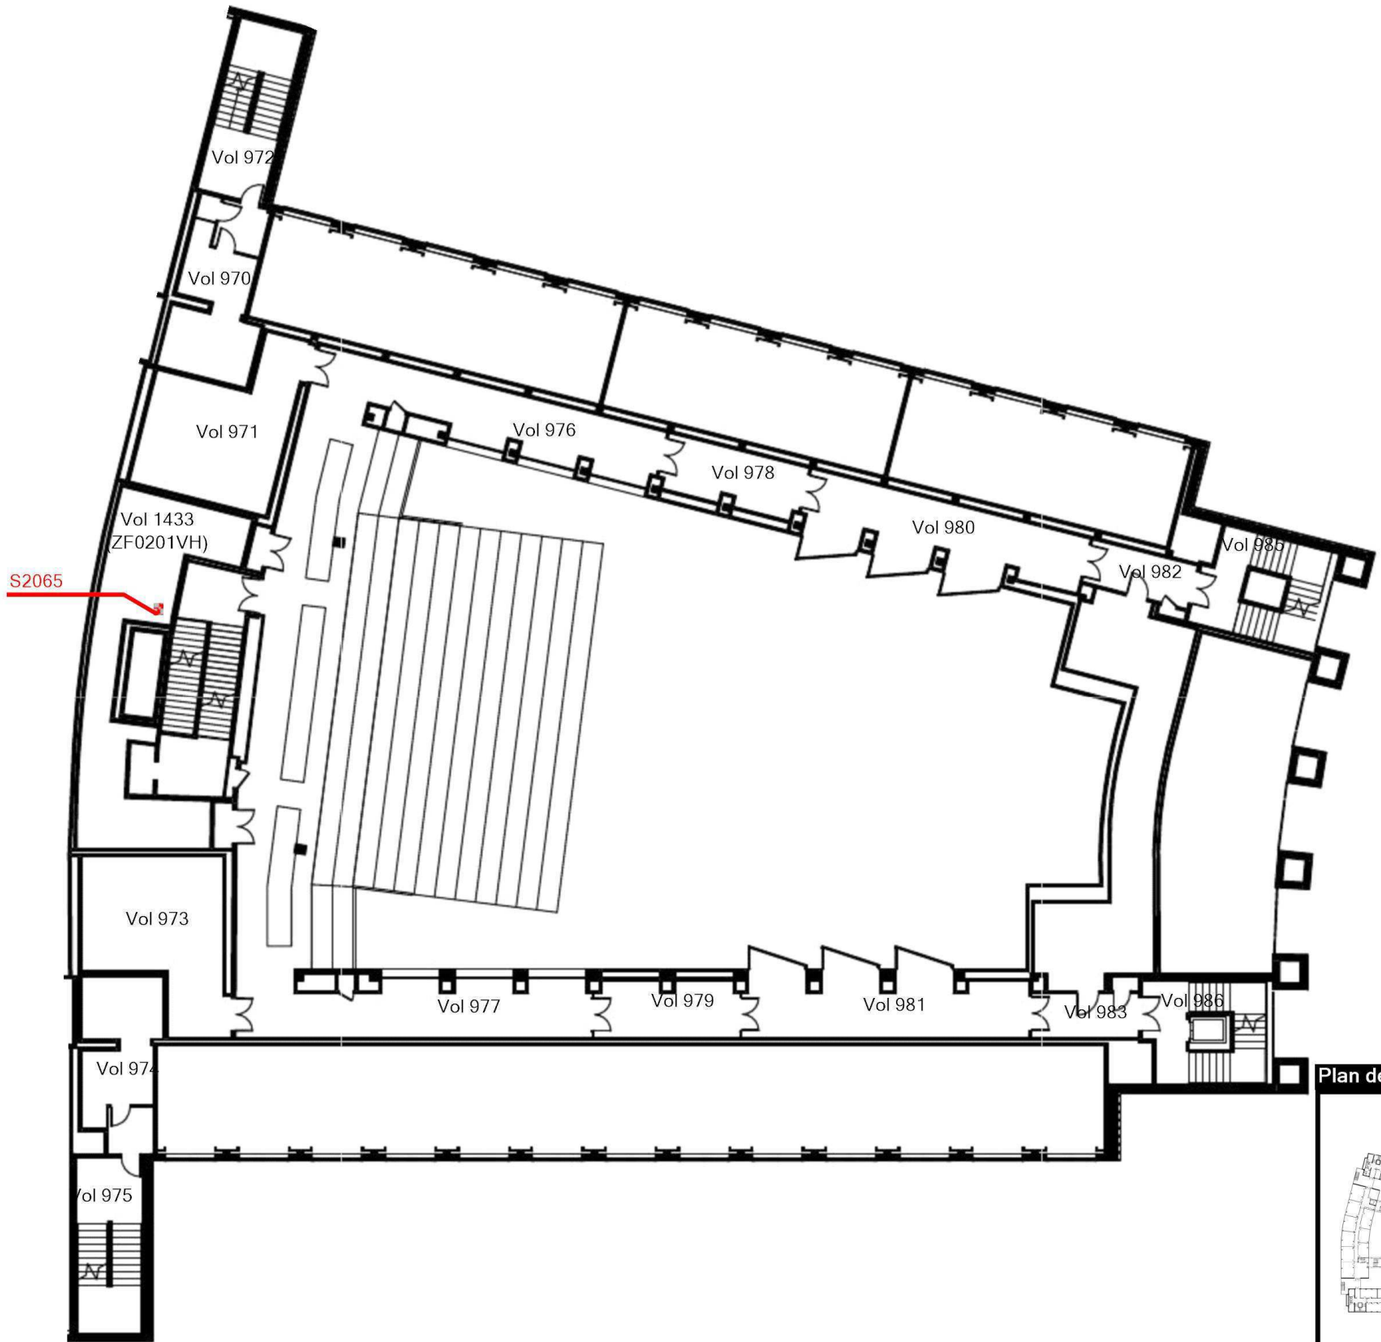

Légende

	S2065: Conduit en fibres-ciment


Plan de situation

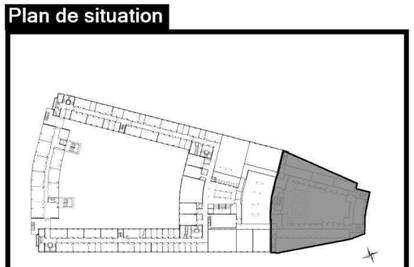

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE P - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

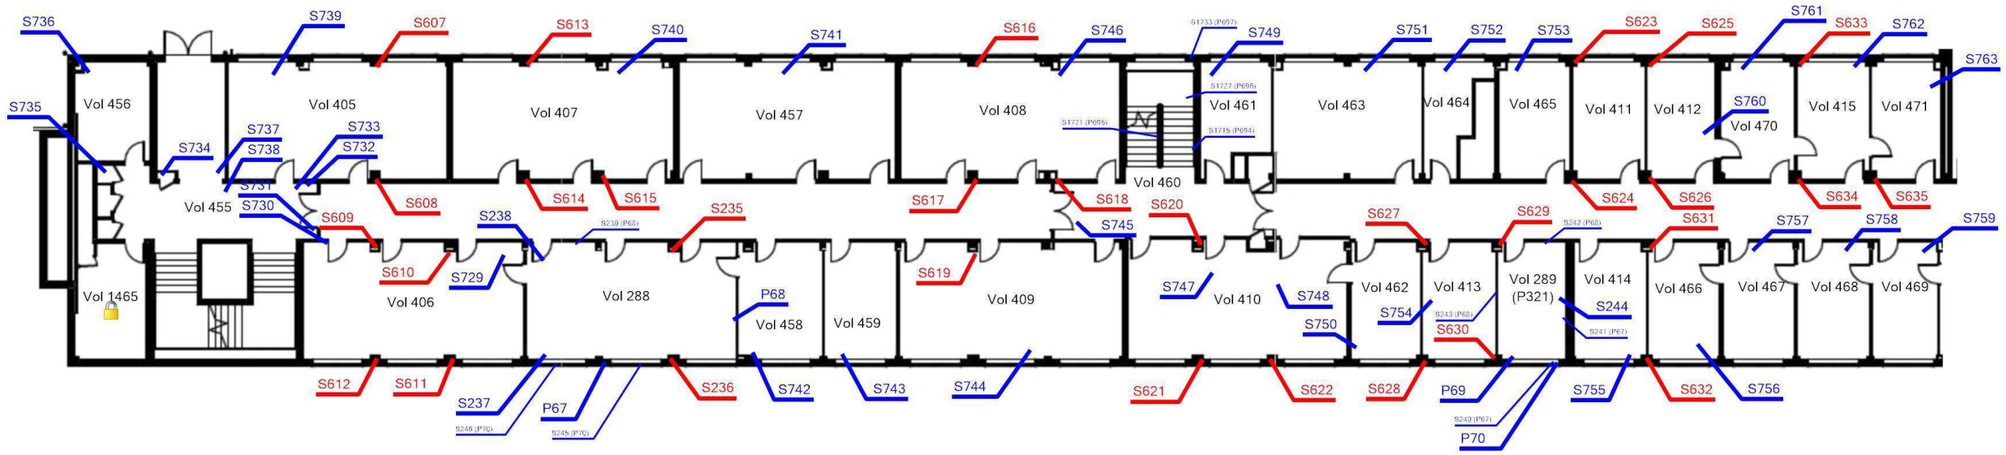

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation

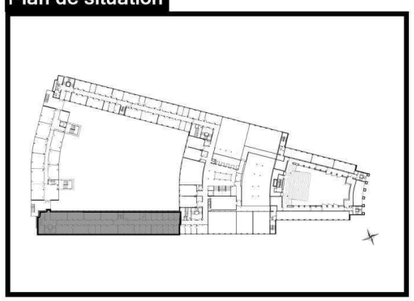

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE P - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

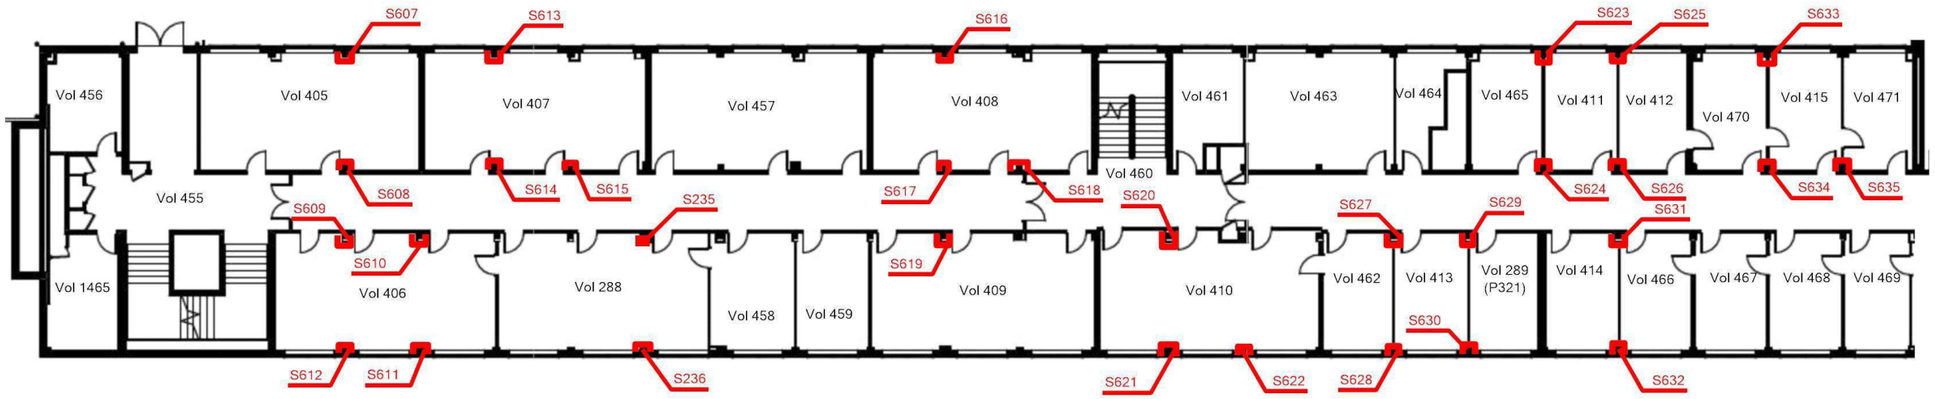

Légende

	S621: Elément en fibre ciment
	S628: Elément en fibre ciment
	S615: Elément en fibre ciment
	S616: Elément en fibre ciment
	S627: Elément en fibre ciment
	S617: Elément en fibre ciment
	S626: Elément en fibre ciment
	S618: Elément en fibre ciment
	S608: Elément en fibre ciment
	S634: Elément en fibre ciment
	S624: Elément en fibre ciment
	S635: Elément en fibre ciment

Plan de situation

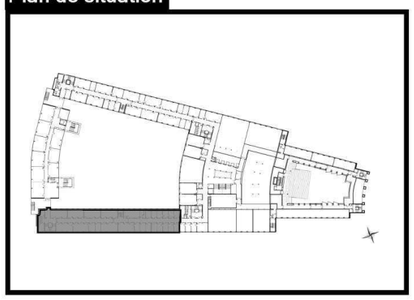


AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+3 - AILE P - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence:
002KN000189-5

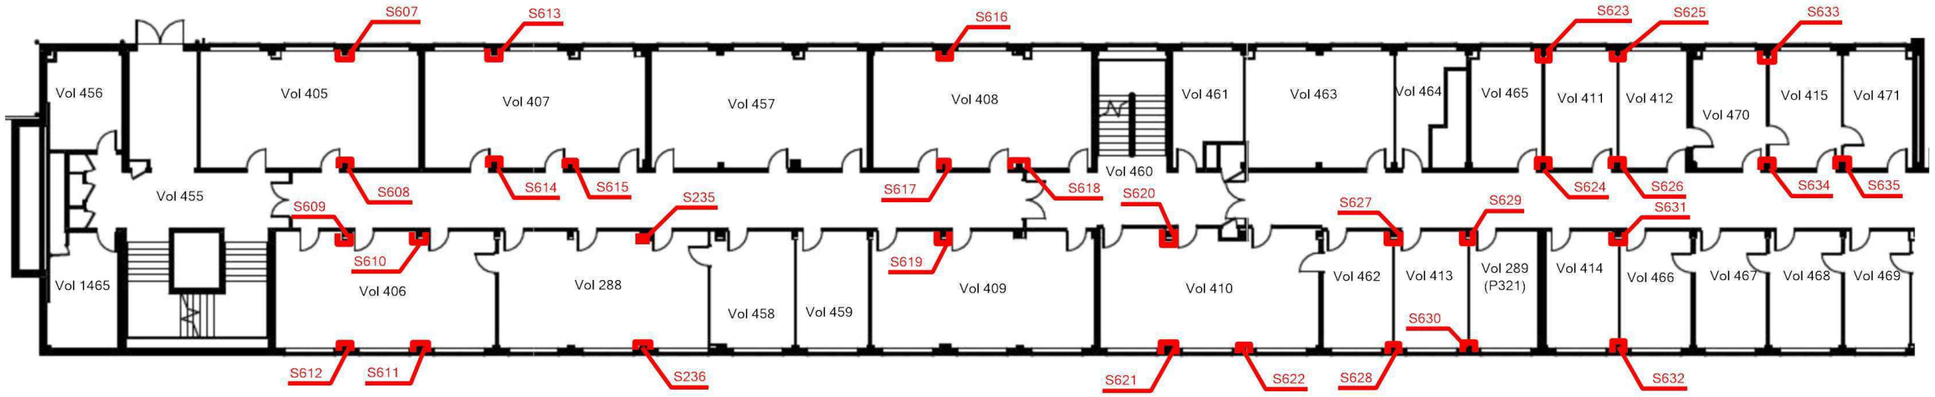

Plan de situation

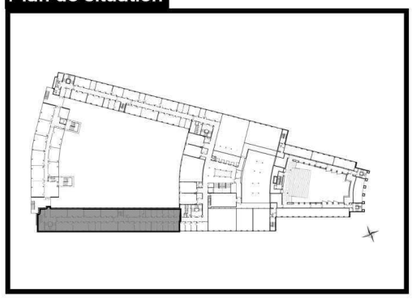

Légende

	S621: Elément en fibre ciment
	S628: Elément en fibre ciment
	S615: Elément en fibre ciment
	S616: Elément en fibre ciment
	S627: Elément en fibre ciment
	S617: Elément en fibre ciment
	S626: Elément en fibre ciment
	S618: Elément en fibre ciment
	S608: Elément en fibre ciment
	S634: Elément en fibre ciment
	S624: Elément en fibre ciment
	S635: Elément en fibre ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5




Légende	
	Aile A
	Aile B
	Aile C
	Aile D
	Aile P

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN R+4 - AILE A - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

Légende

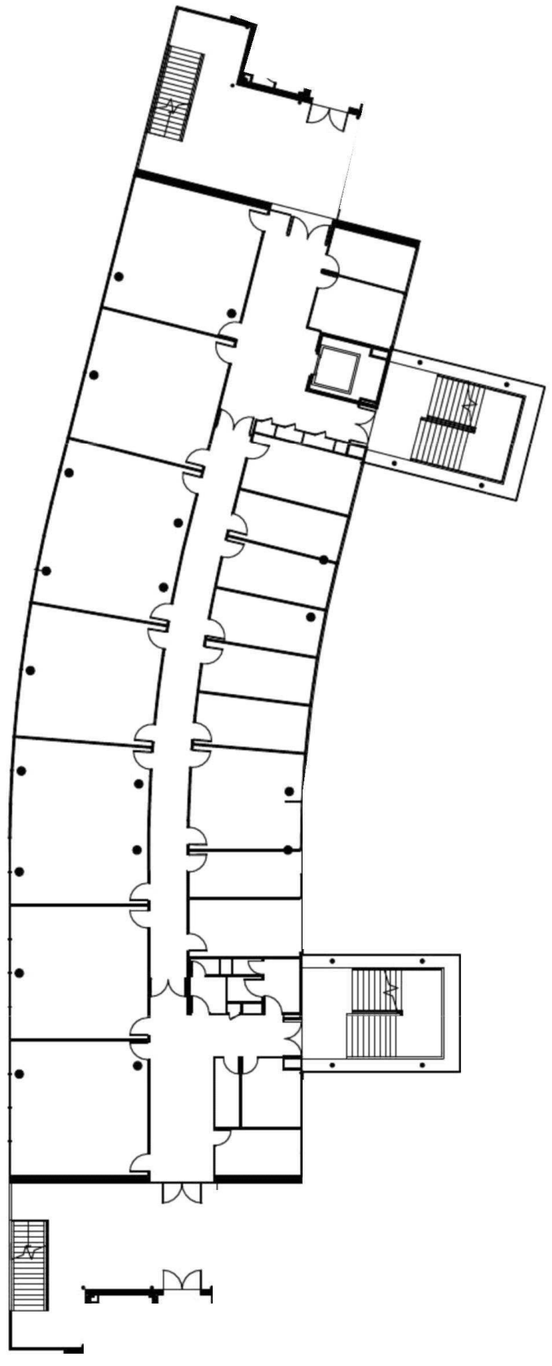


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE B - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

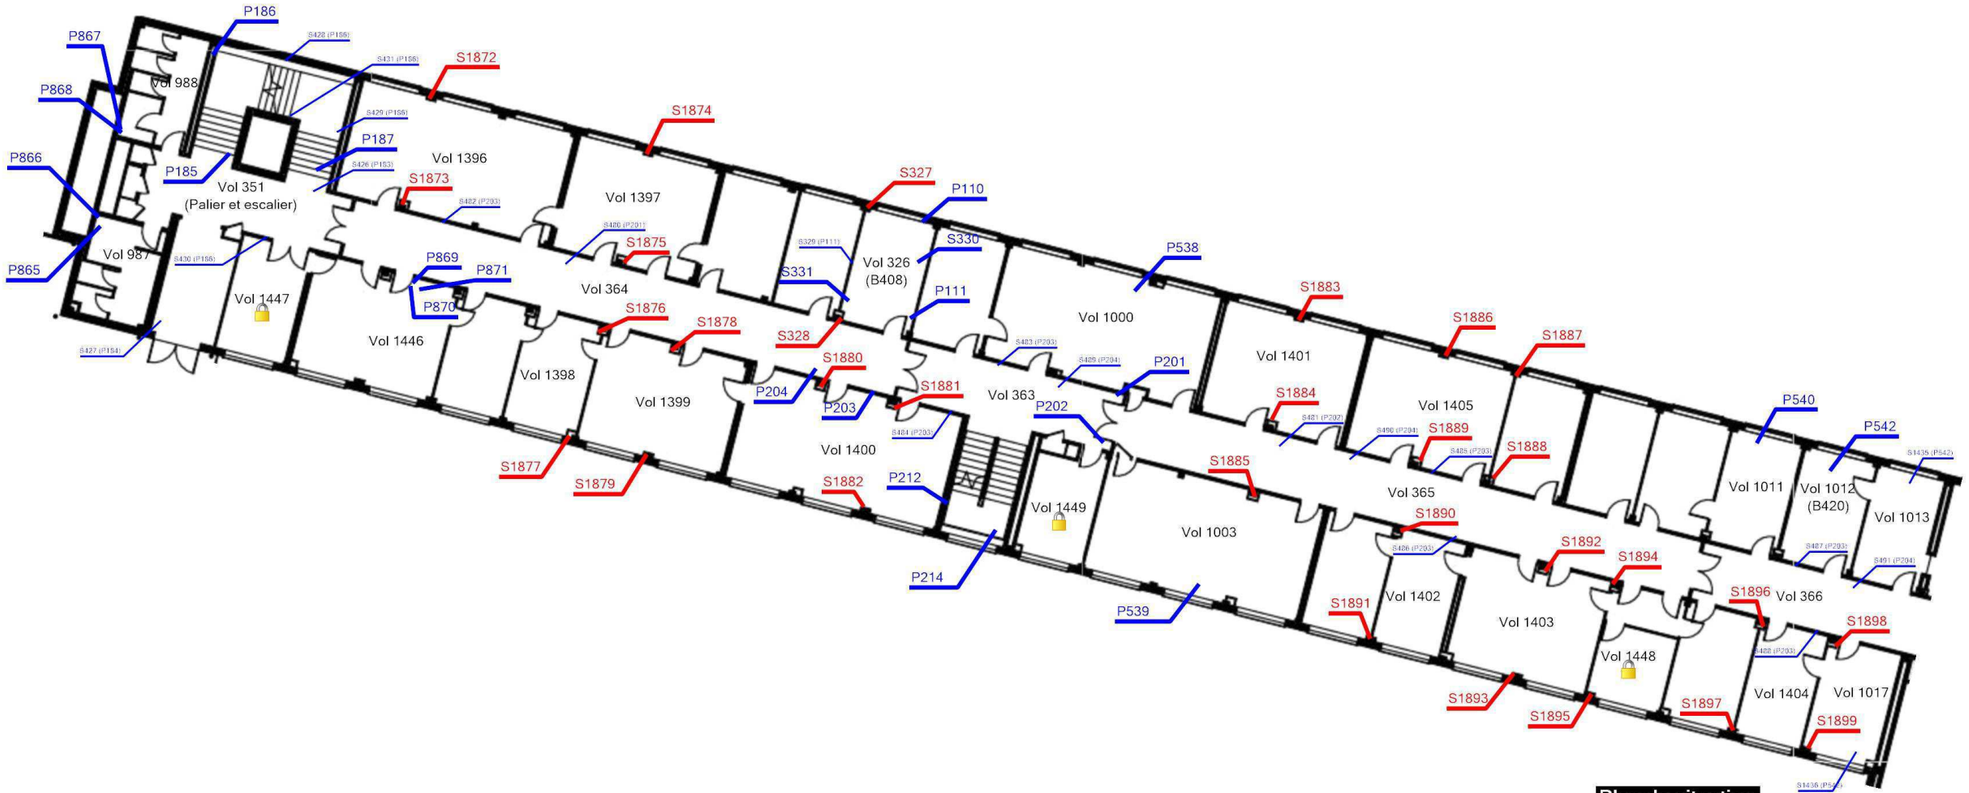

Plan de situation

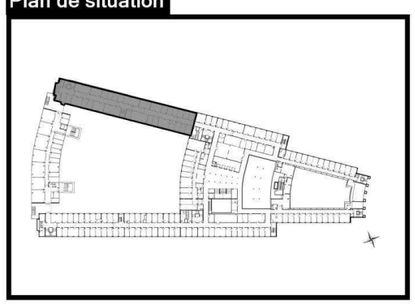


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE B - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5

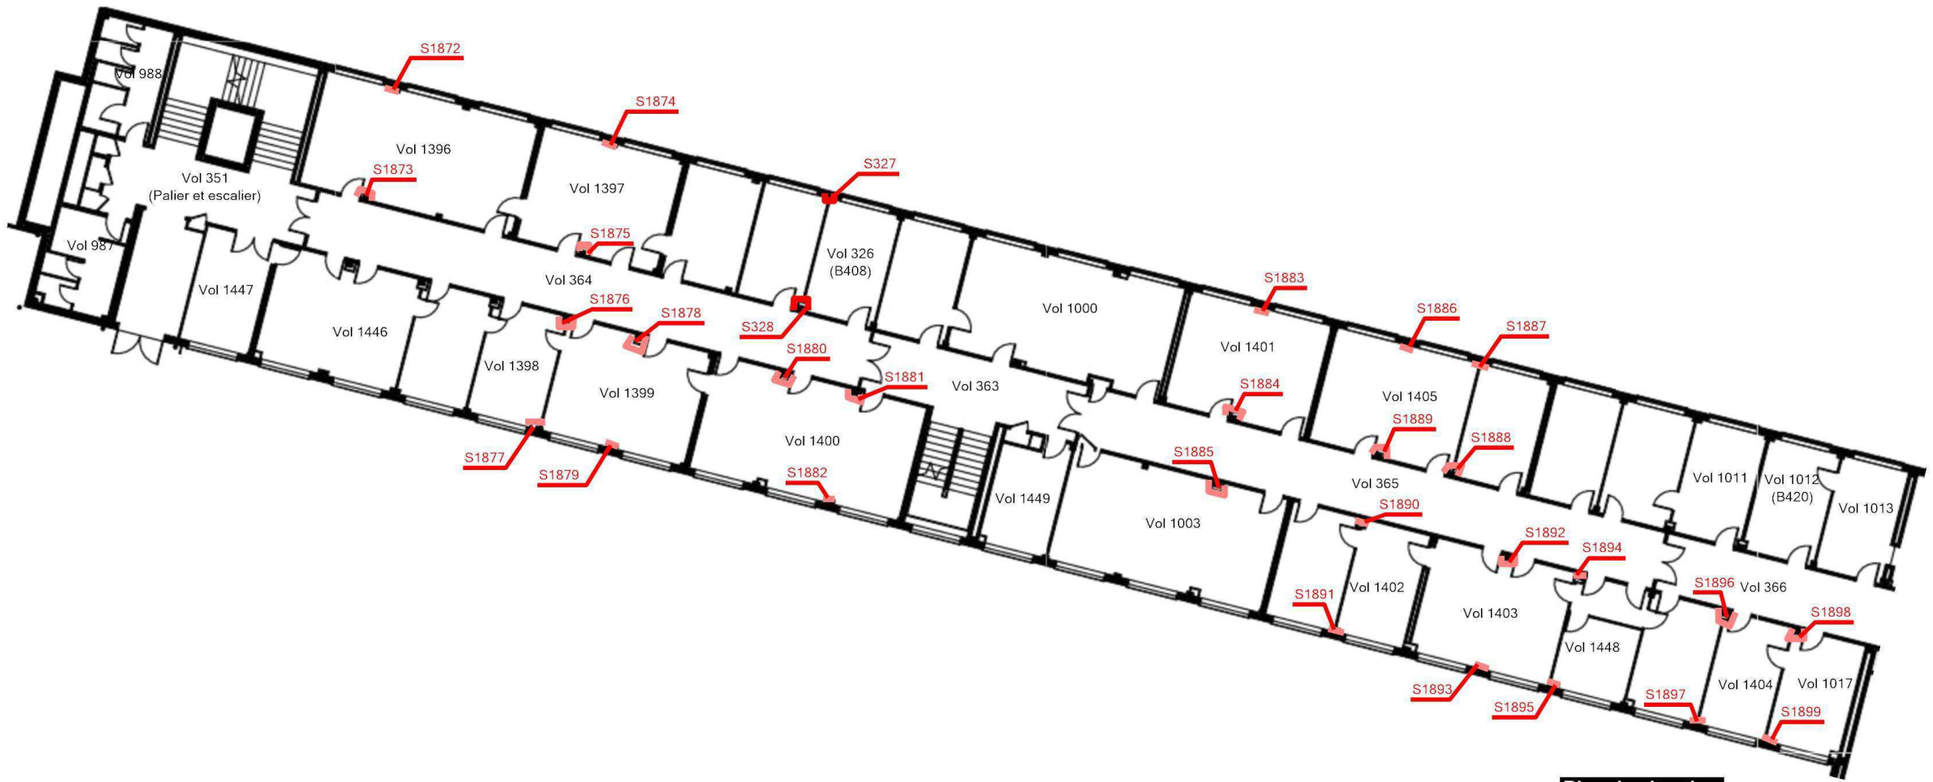

Plan de situation

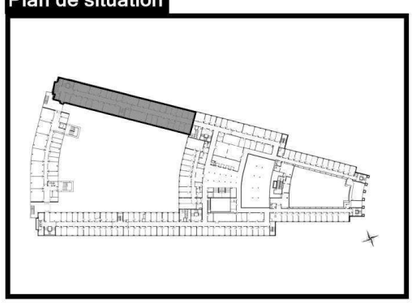

Légende


	S1895: Panneaux
	S1886: Panneaux
	S328: Elément en fibre ciment
	S1892: Panneaux
	S327: Elément en fibre ciment
	S1874: Panneaux
	S1873: Panneaux
	S1872: Panneaux
	S1893: Panneaux
	S1883: Panneaux
	S1888: Panneaux
	S1878: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE B - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002KN000189-5

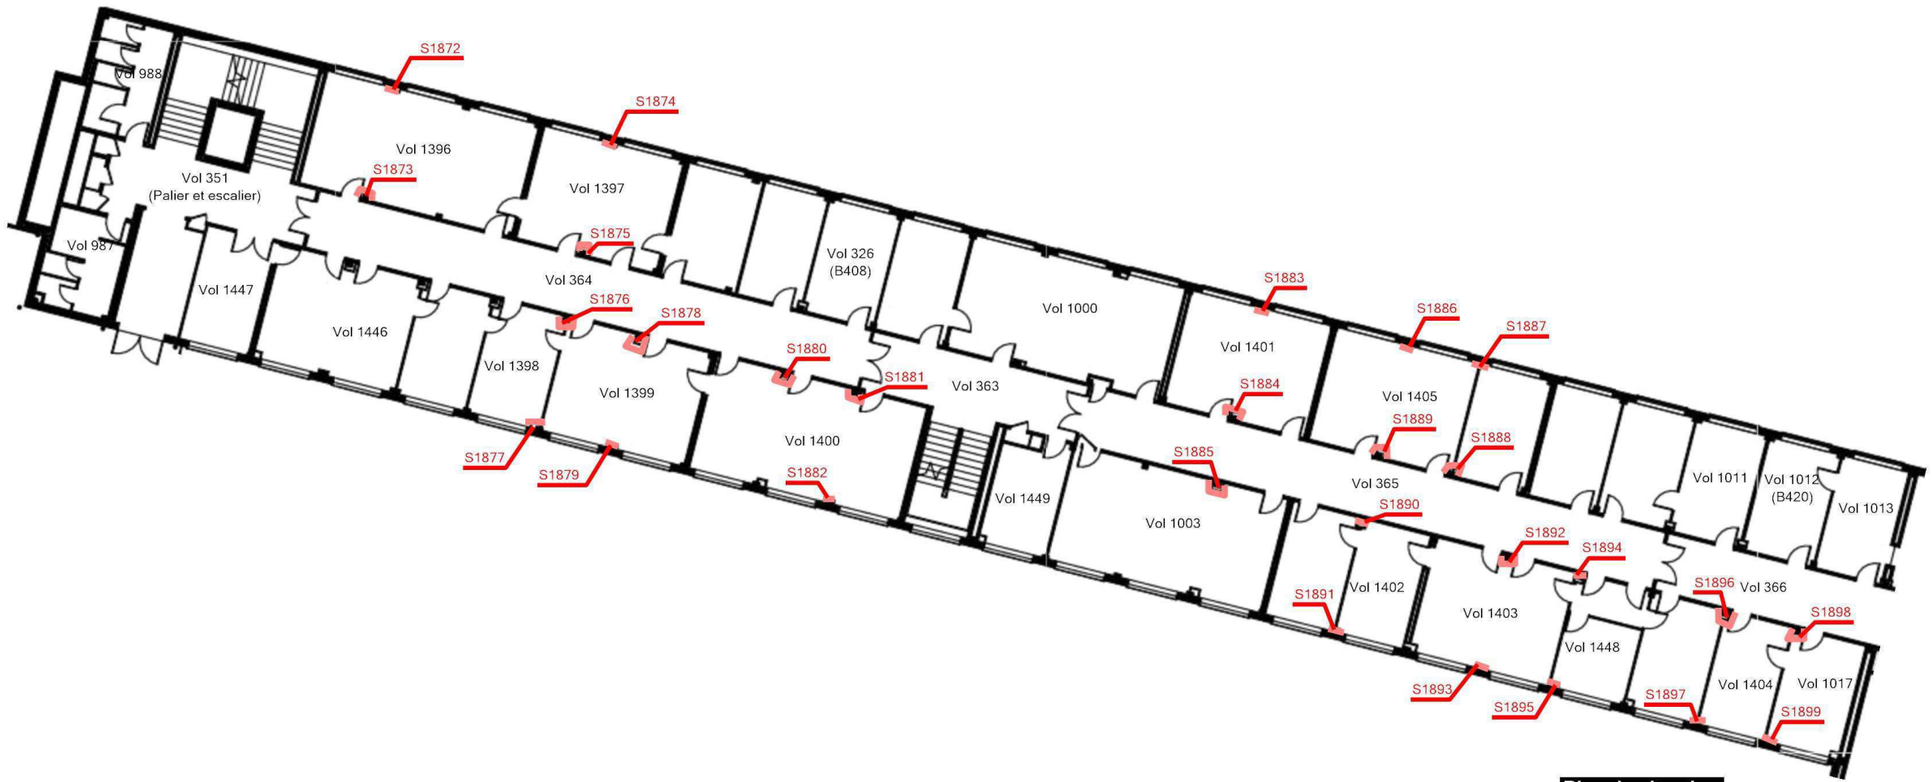

Plan de situation



Légende


	S1895: Panneaux
	S1886: Panneaux
	S1892: Panneaux
	S1874: Panneaux
	S1873: Panneaux
	S1872: Panneaux
	S1893: Panneaux
	S1883: Panneaux
	S1888: Panneaux
	S1878: Panneaux
	S1898: Panneaux
	S1882: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE B - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence:
002KN000189-5

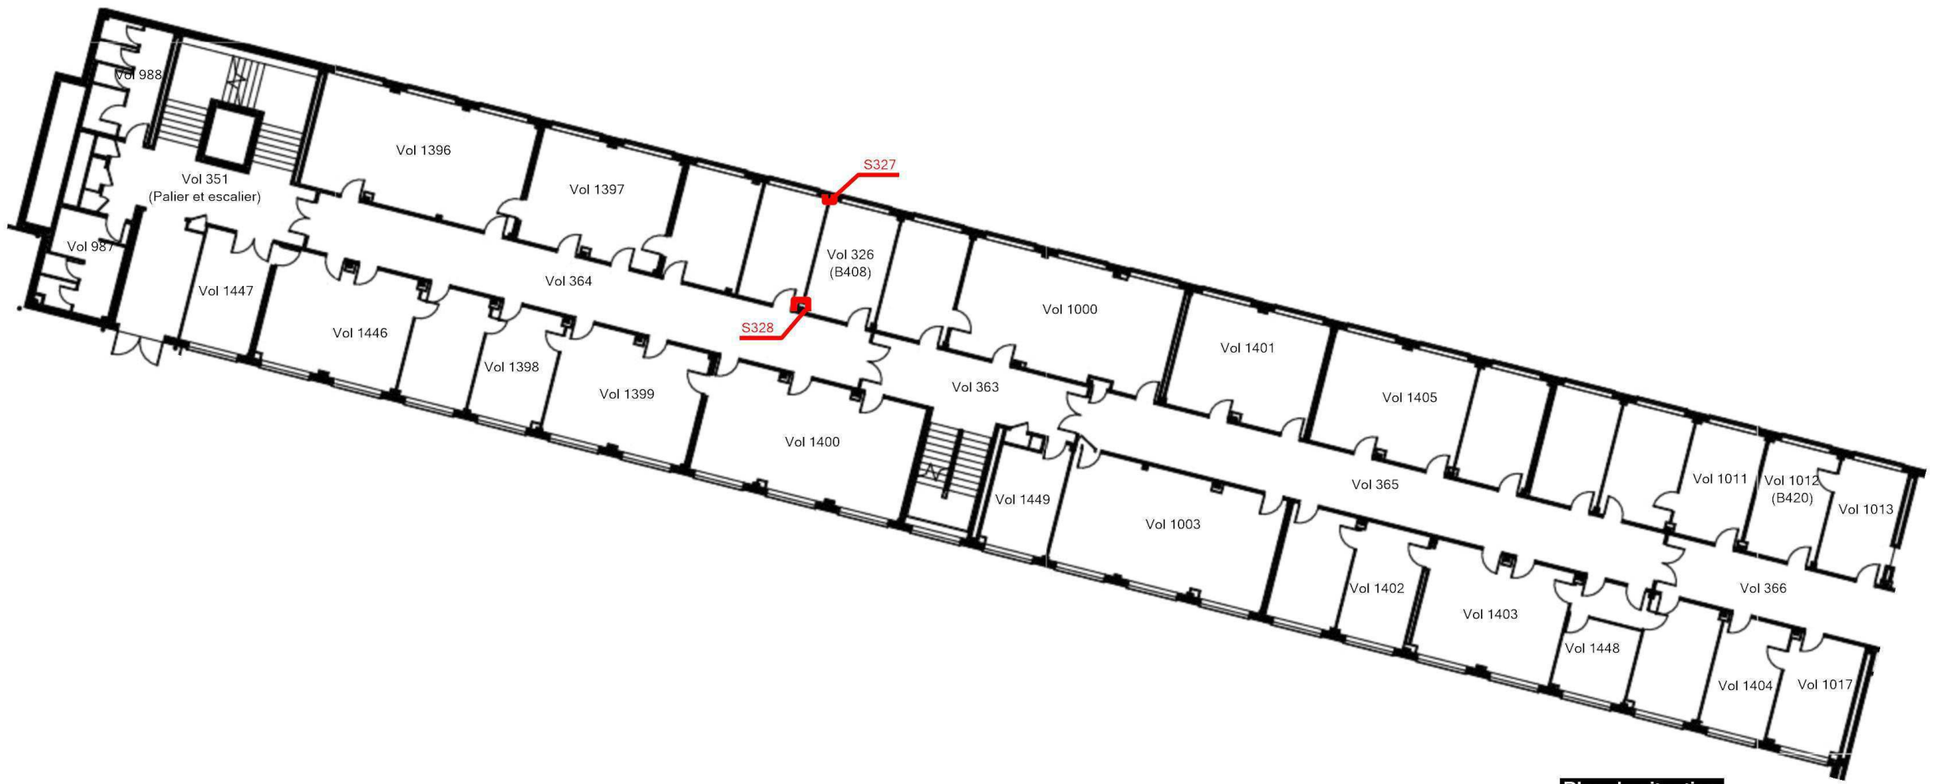

Plan de situation

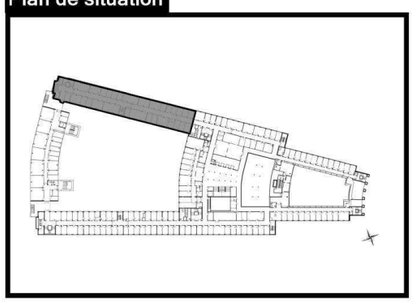

Légende


	S328: Elément en fibre ciment
	S327: Elément en fibre ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE C - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

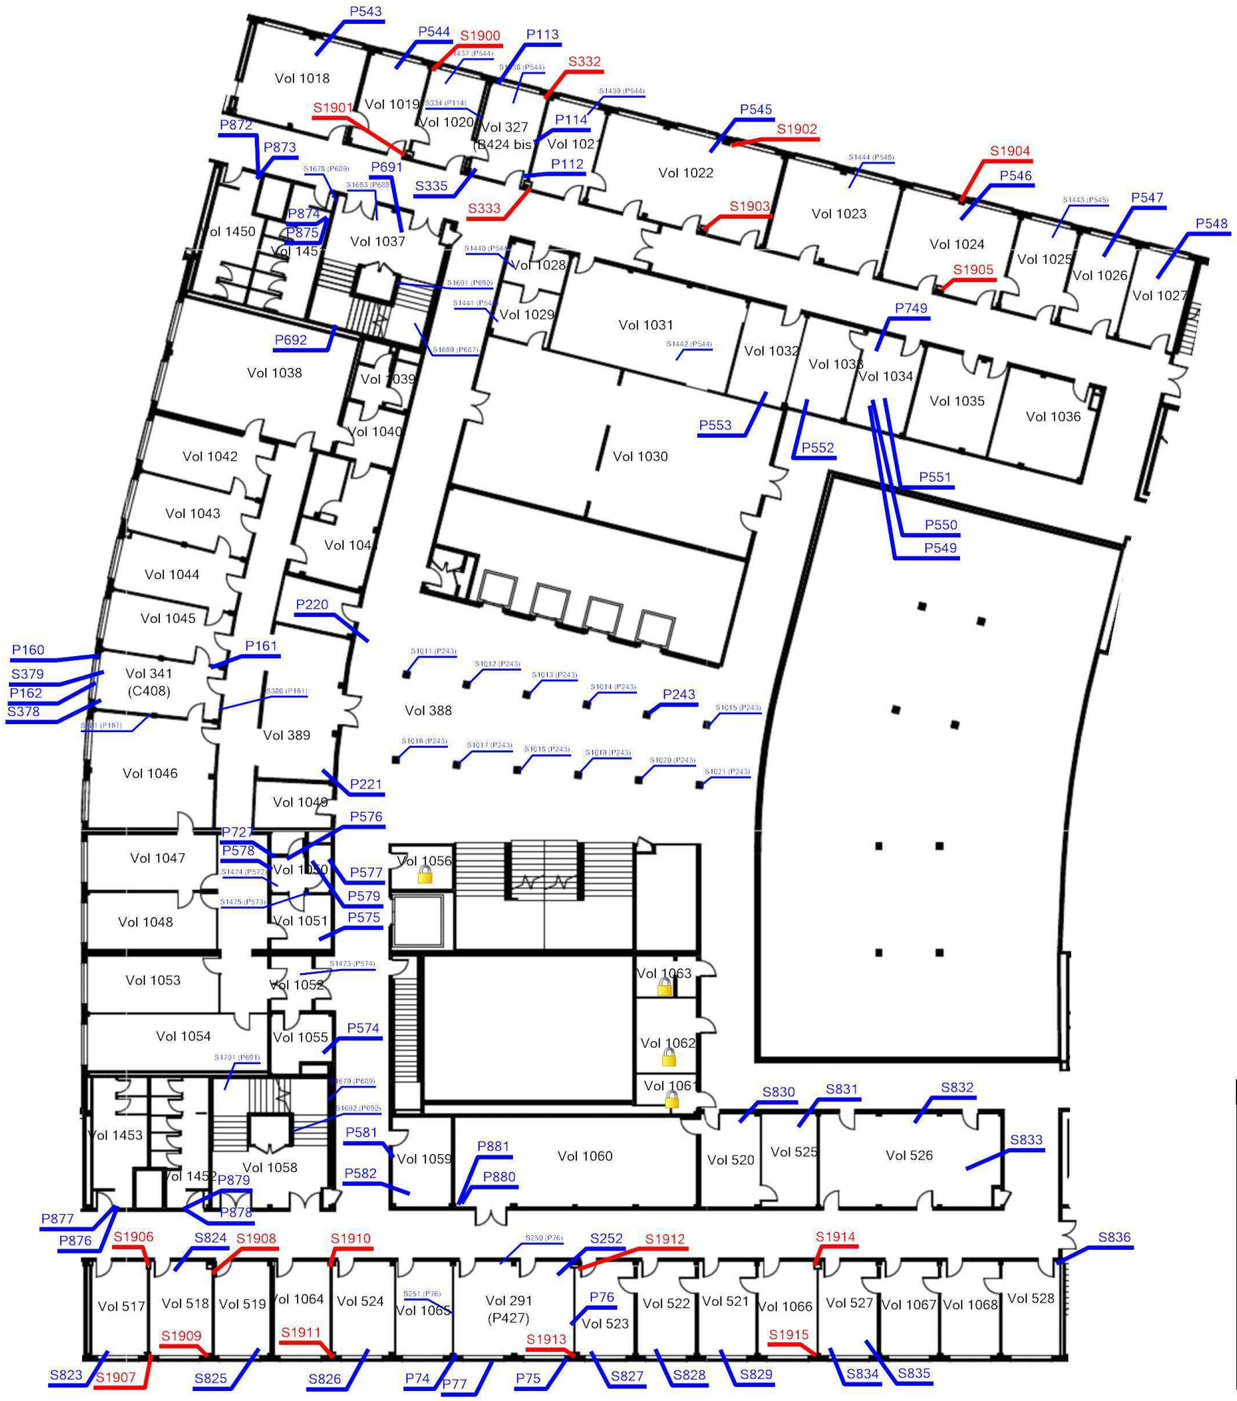

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation

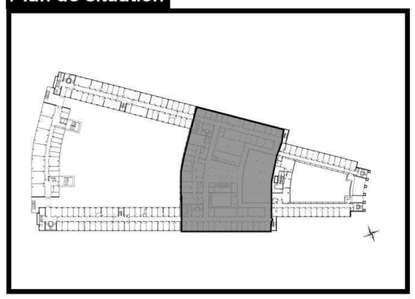

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (validité début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PLAN R+4 - AILE C - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5



Légende

	S1904: Panneaux
	S1910: Panneaux
	S1905: Panneaux
	S333: Elément en fibre ciment
	S1908: Panneaux
	S1900: Panneaux
	S1912: Panneaux
	S1911: Panneaux
	S1913: Panneaux
	S1901: Panneaux
	S1914: Panneaux
	S1902: Panneaux

Plan de situation

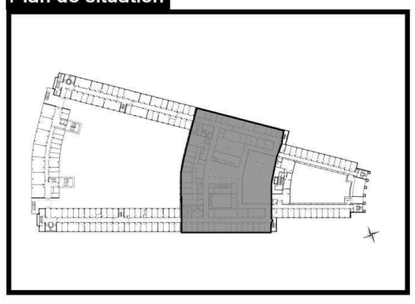

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE C - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002KN000189-5



Légende

	S1904: Panneaux
	S1910: Panneaux
	S1905: Panneaux
	S1908: Panneaux
	S1900: Panneaux
	S1912: Panneaux
	S1911: Panneaux
	S1913: Panneaux
	S1901: Panneaux
	S1914: Panneaux
	S1902: Panneaux
	S1906: Panneaux

Plan de situation



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE C - MPCA COFFRAGES PERDUS


Référence:
002KN000189-5



Légende

	S333: Elément en fibre ciment
	S332: Elément en fibre ciment


Plan de situation

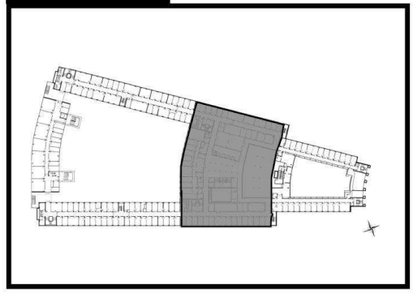

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE D - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

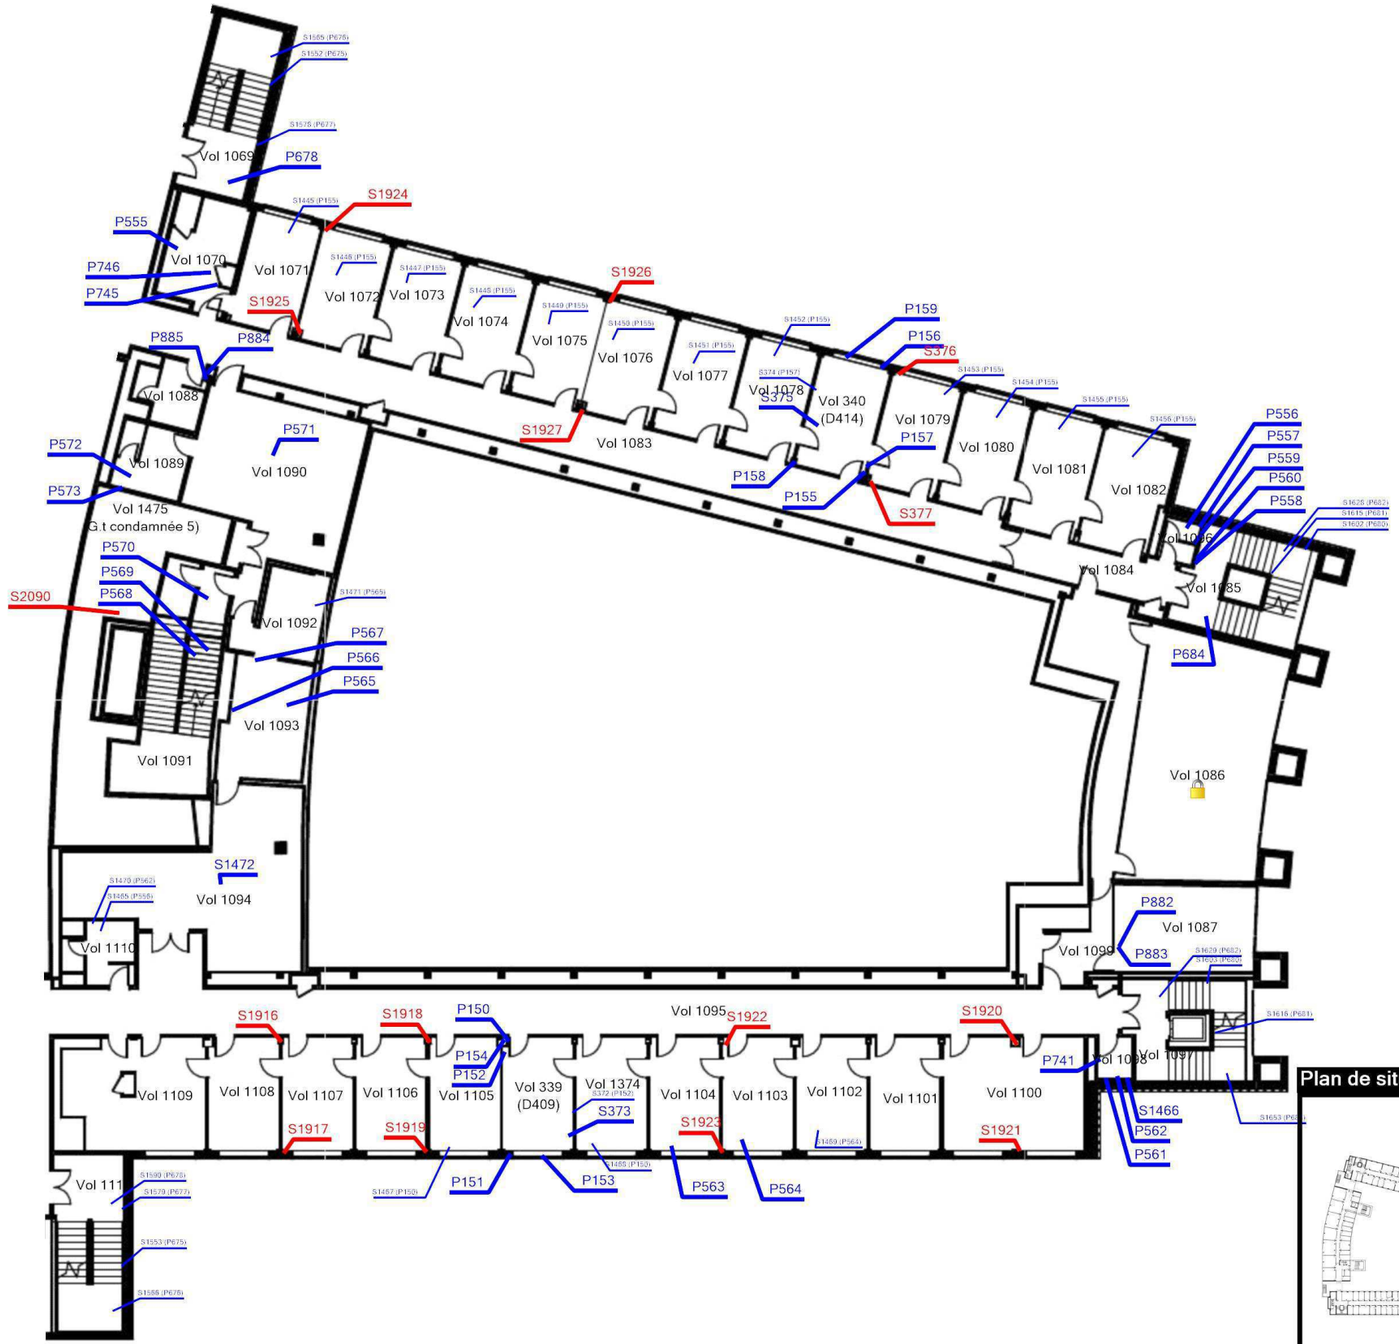

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation

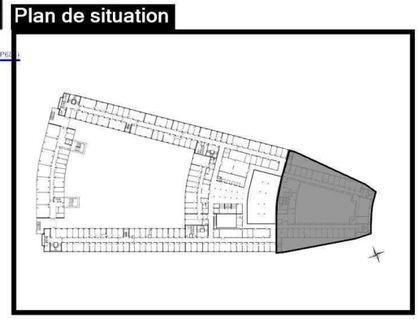


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5

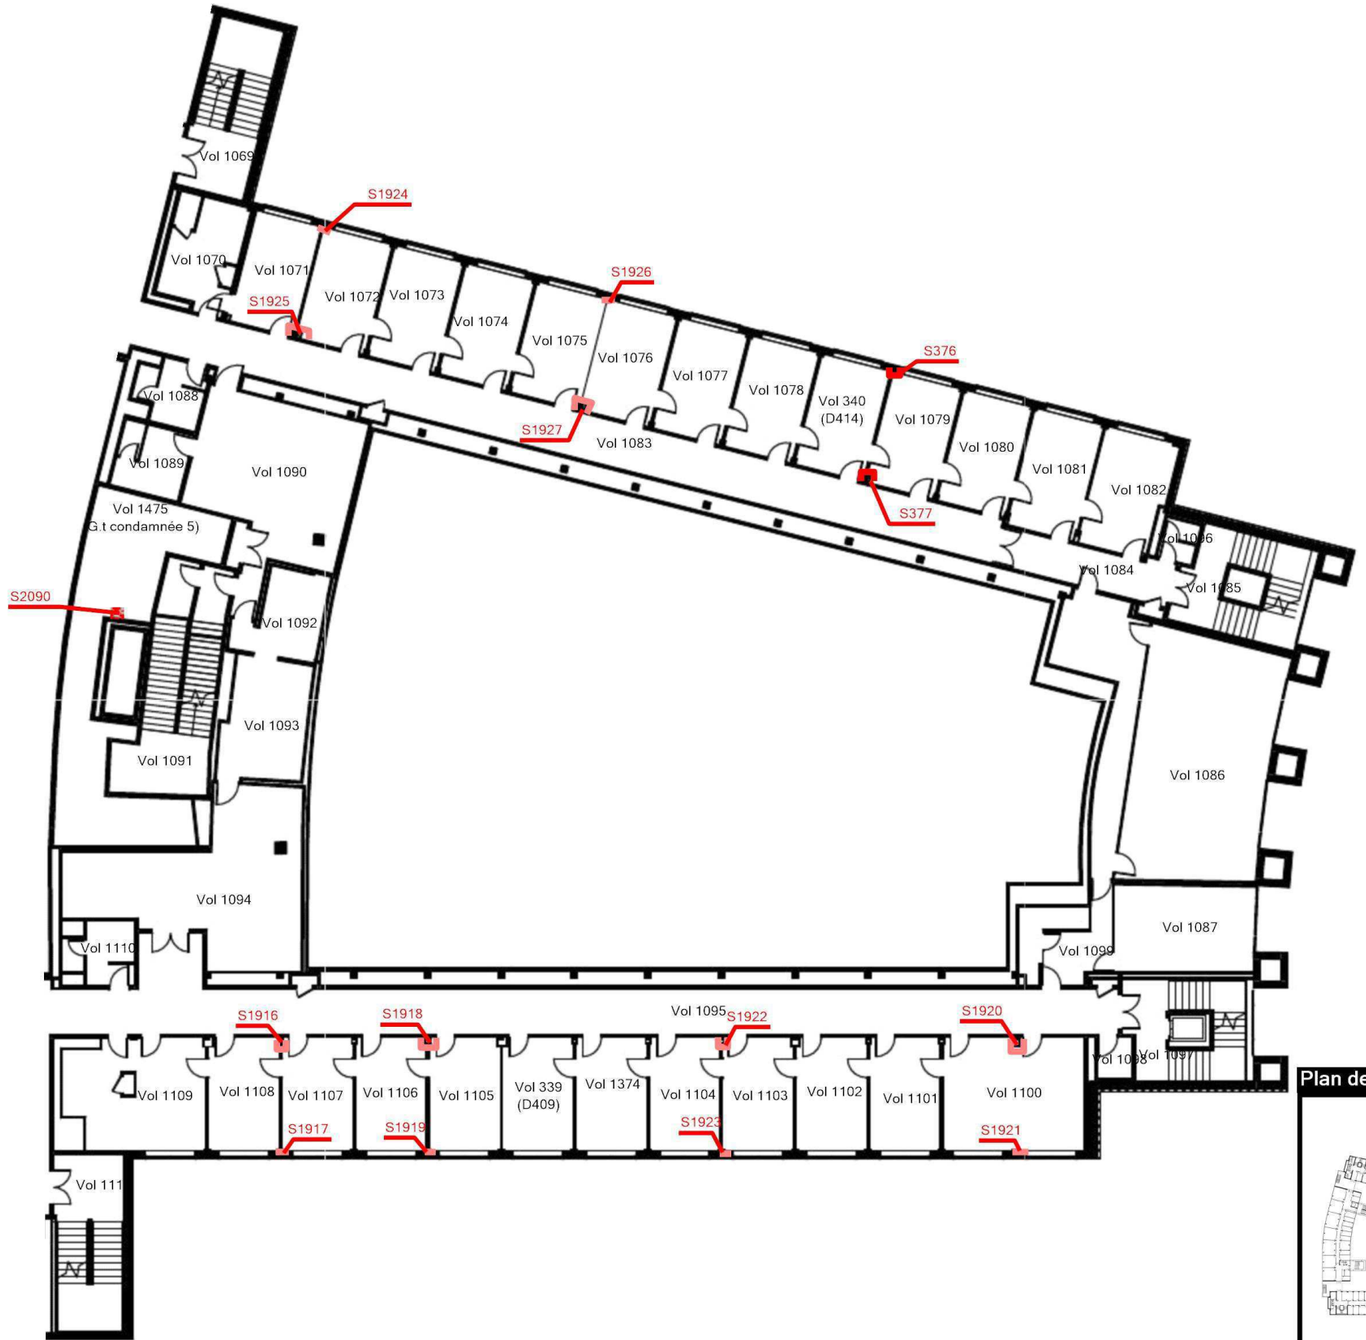

Plan de situation

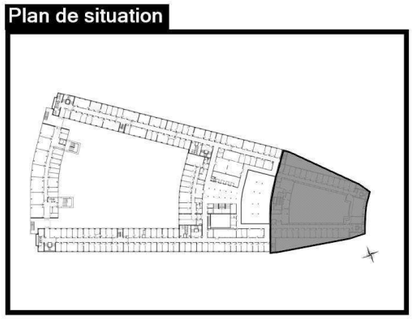

Légende


	S376: Elément en fibre ciment
	S1923: Panneaux
	S1917: Panneaux
	S1924: Panneaux
	S1918: Panneaux
	S1926: Panneaux
	S1922: Panneaux
	S1916: Panneaux
	S1925: Panneaux
	S1920: Panneaux
	S377: Elément en fibre ciment
	S1921: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE D - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002KN000189-5

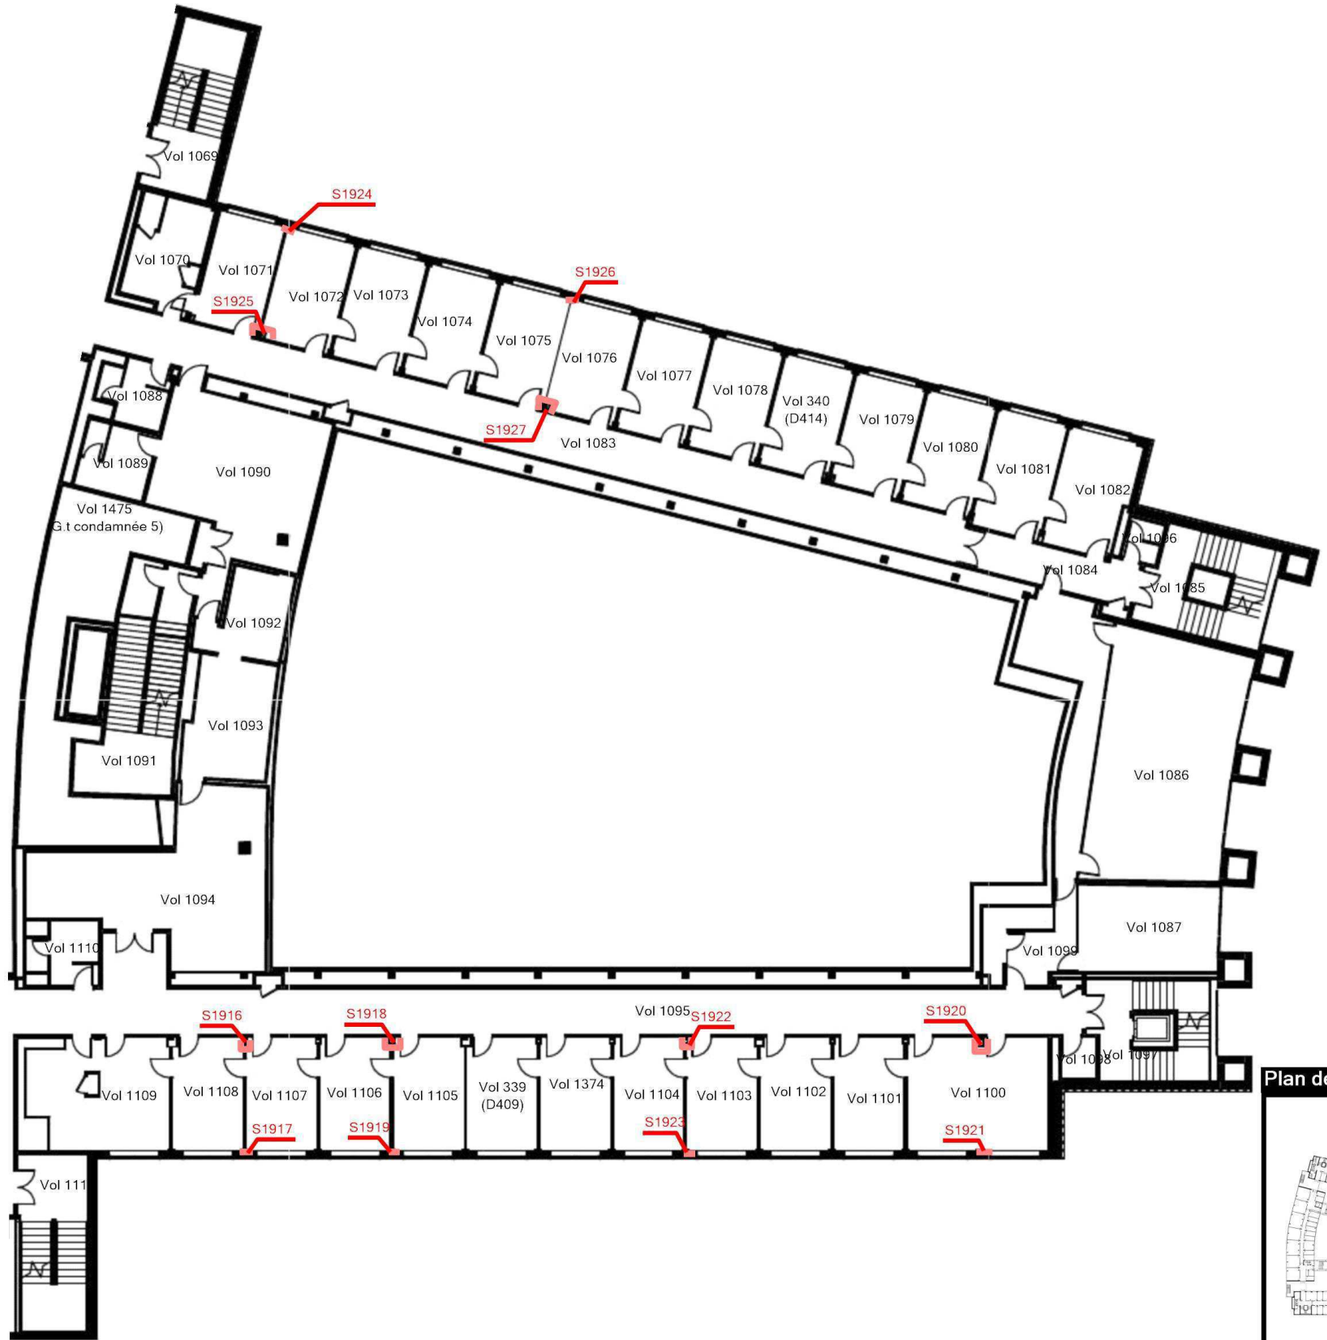

Plan de situation

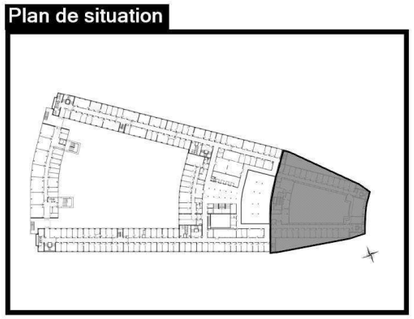

Légende


	S1923: Panneaux
	S1917: Panneaux
	S1924: Panneaux
	S1918: Panneaux
	S1926: Panneaux
	S1922: Panneaux
	S1916: Panneaux
	S1925: Panneaux
	S1920: Panneaux
	S1921: Panneaux
	S1919: Panneaux
	S1927: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE D - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002KN000189-5

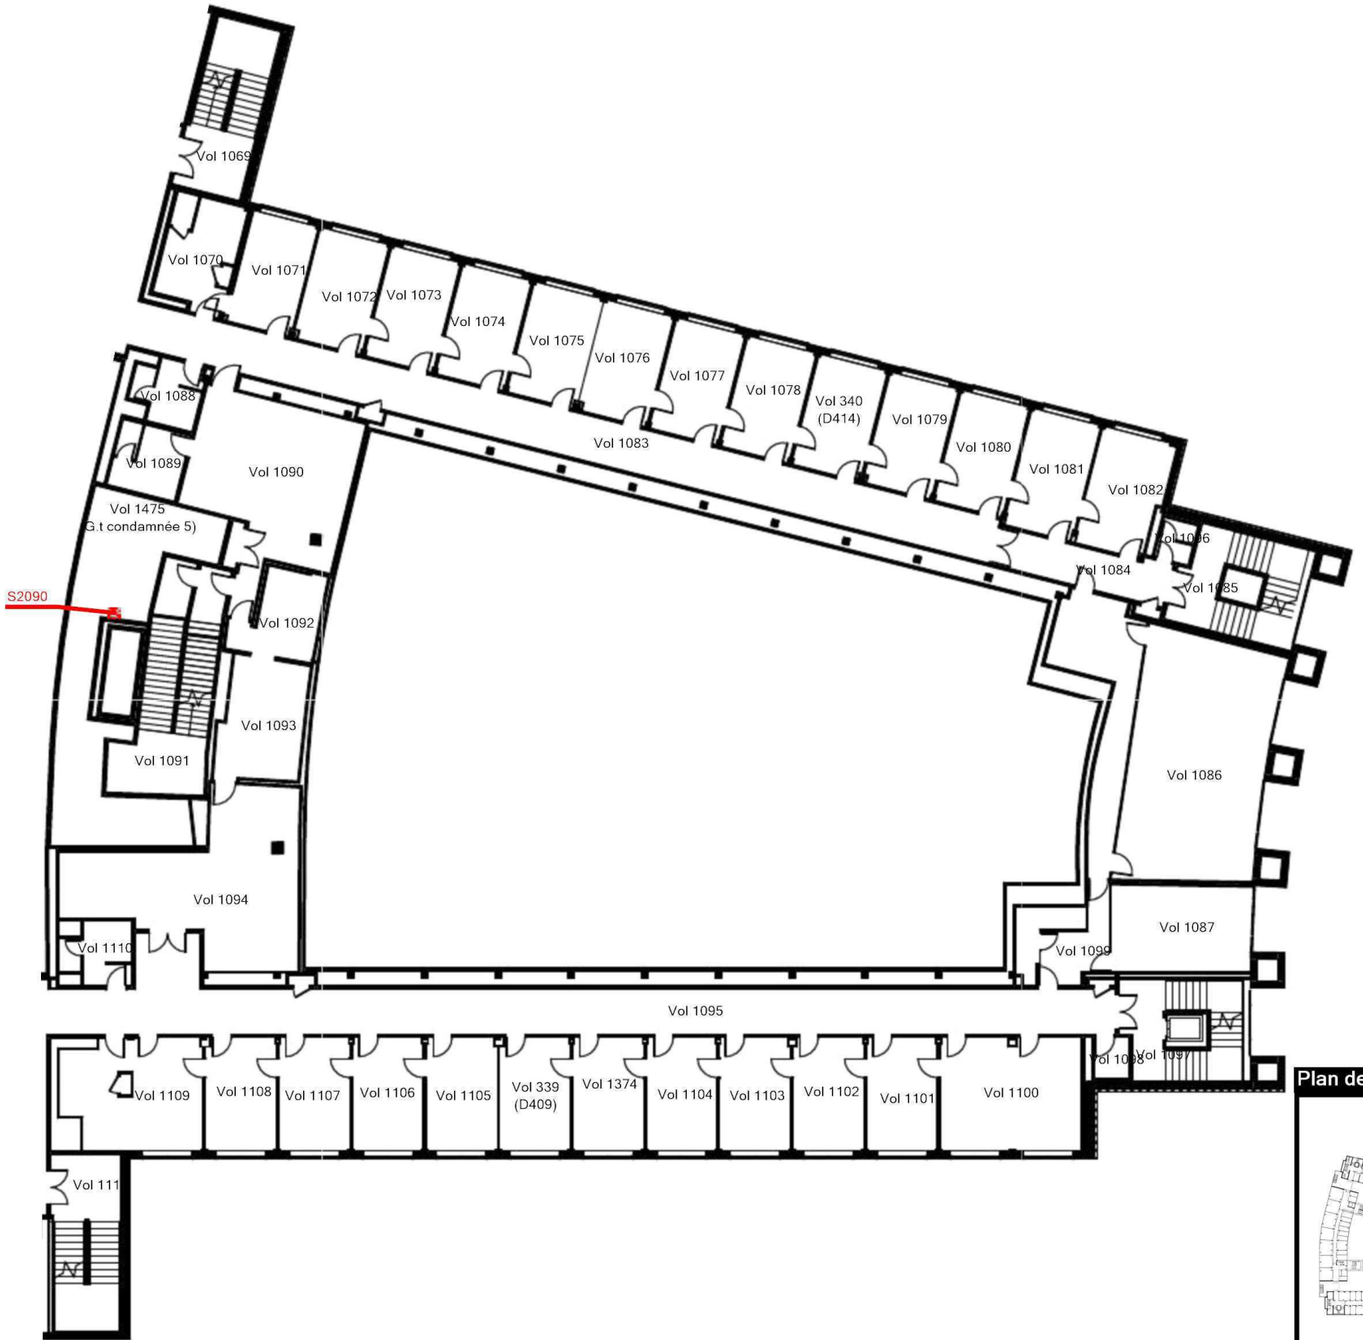

Légende

	S2090: Conduit en fibres-ciment


Plan de situation

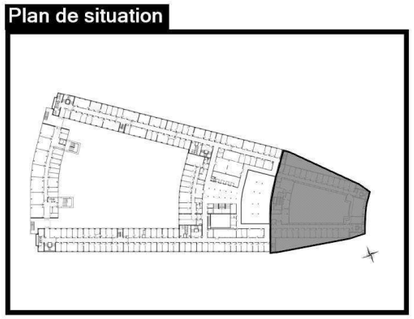


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE D - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence:
002KN000189-5

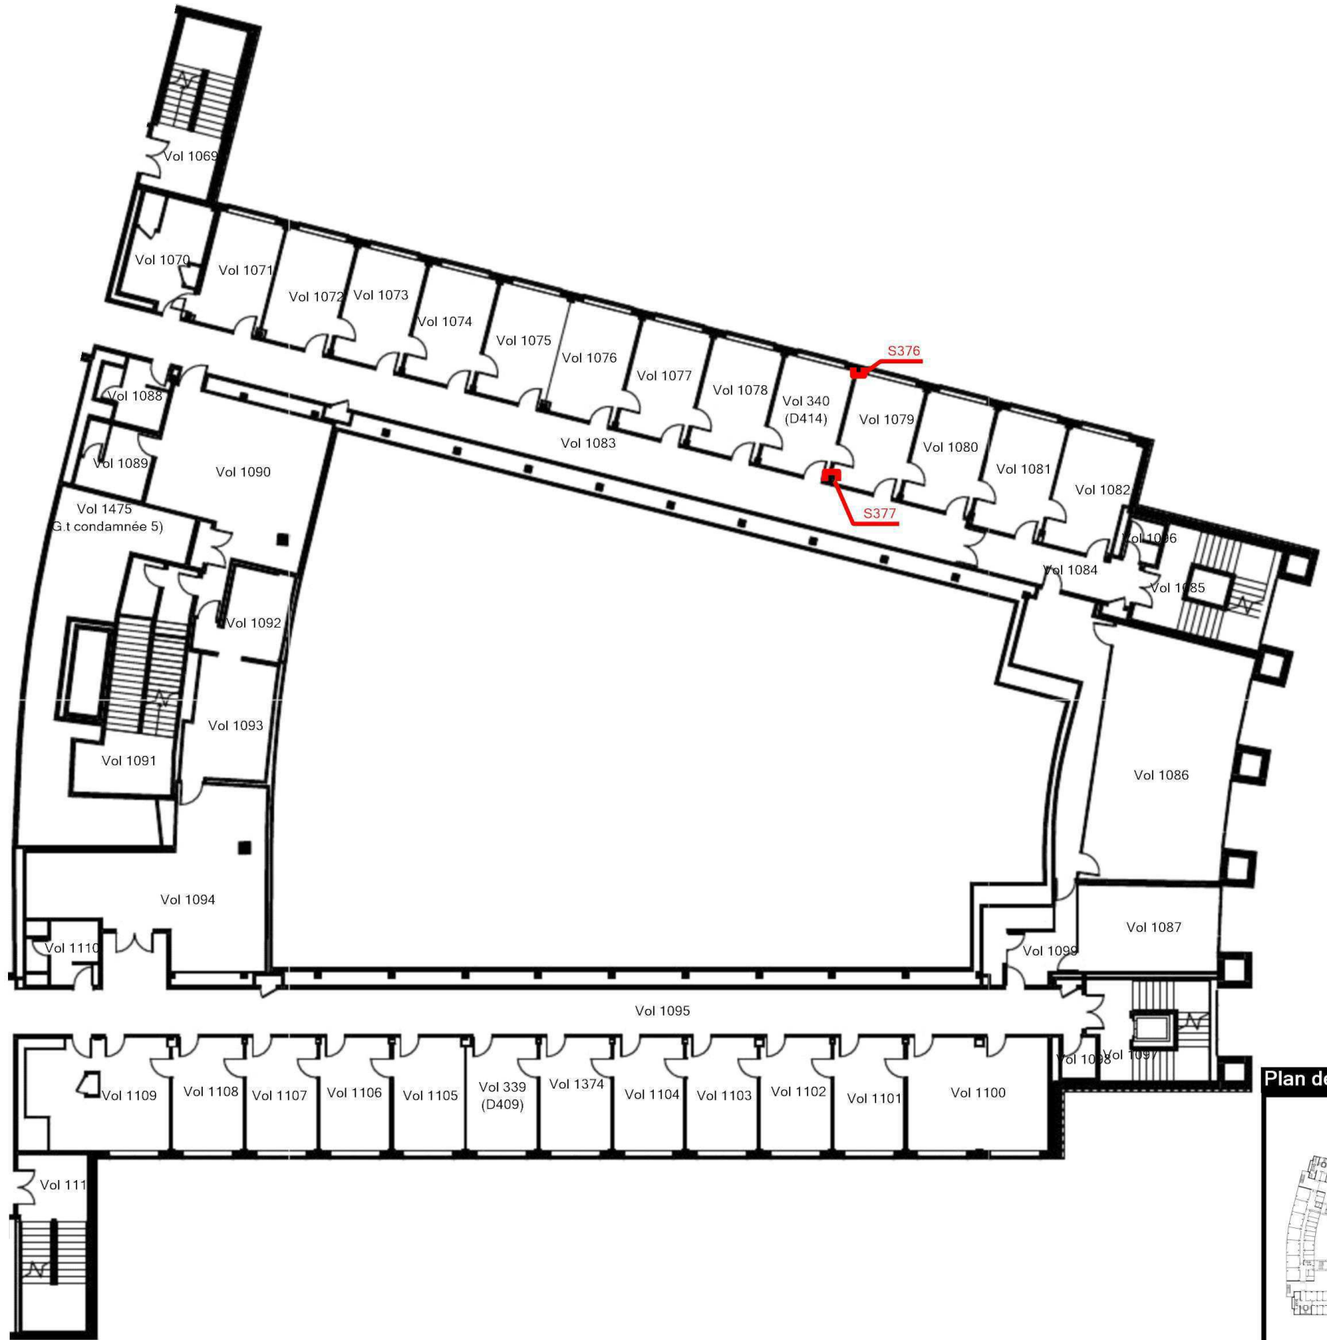

Plan de situation

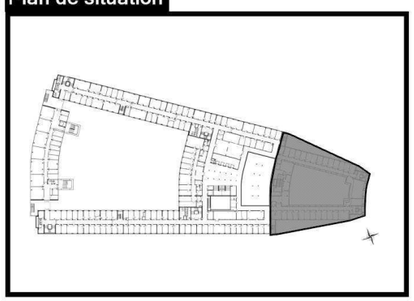


Légende

	S376: Elément en fibre ciment
	S377: Elément en fibre ciment

AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE P - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

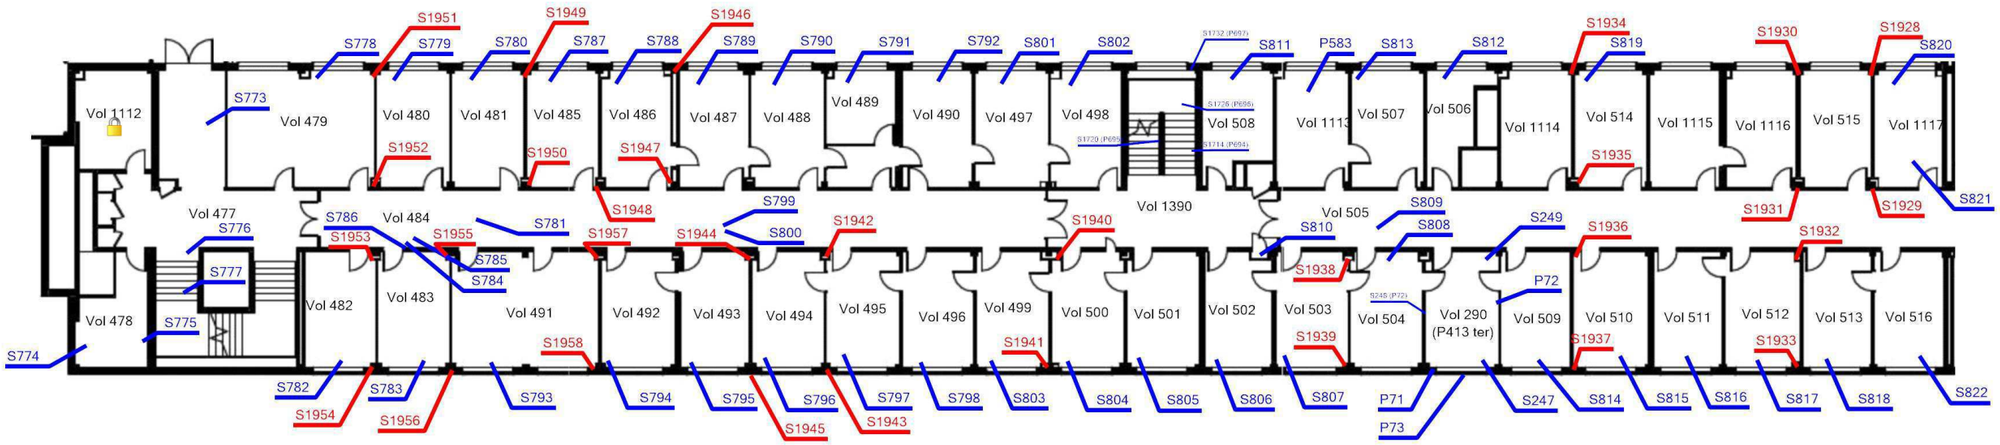

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation

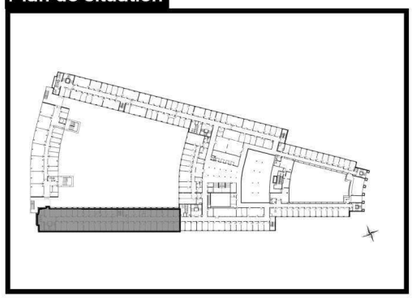

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE P - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

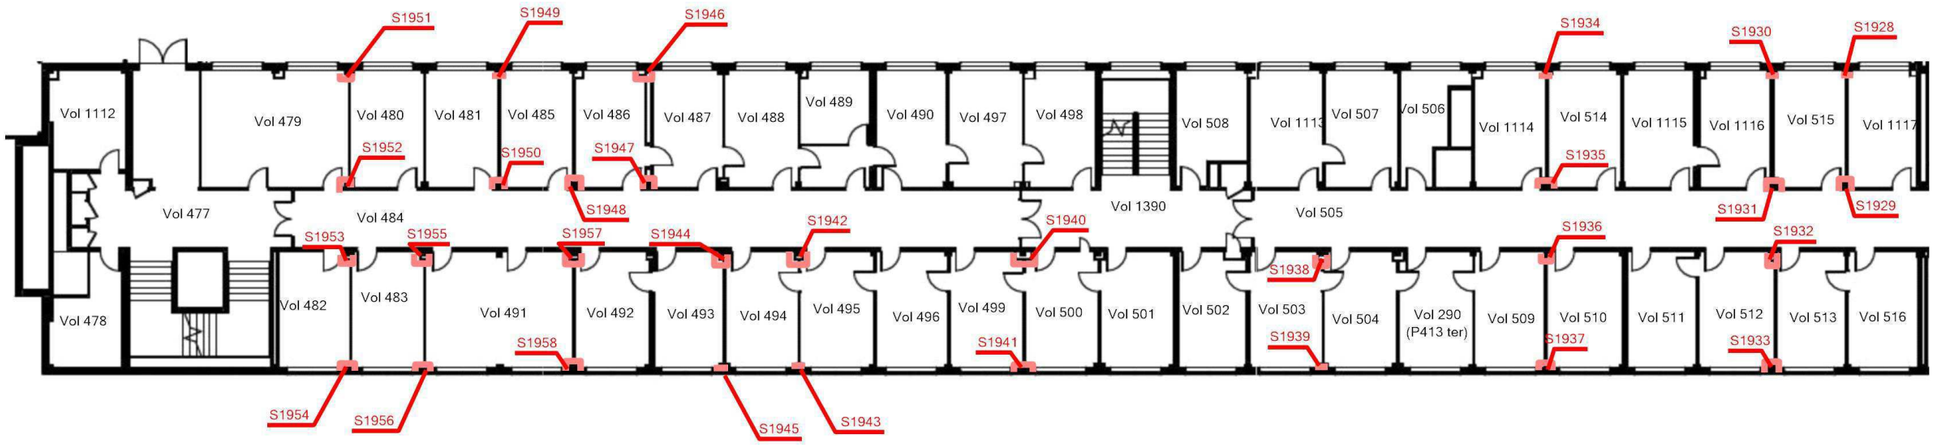

Légende

	S1946: Panneaux
	S1935: Panneaux
	S1953: Panneaux
	S1939: Panneaux
	S1930: Panneaux
	S1929: Panneaux
	S1933: Panneaux
	S1950: Panneaux
	S1942: Panneaux
	S1954: Panneaux
	S1955: Panneaux
	S1937: Panneaux


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+4 - AILE P - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002KN000189-5

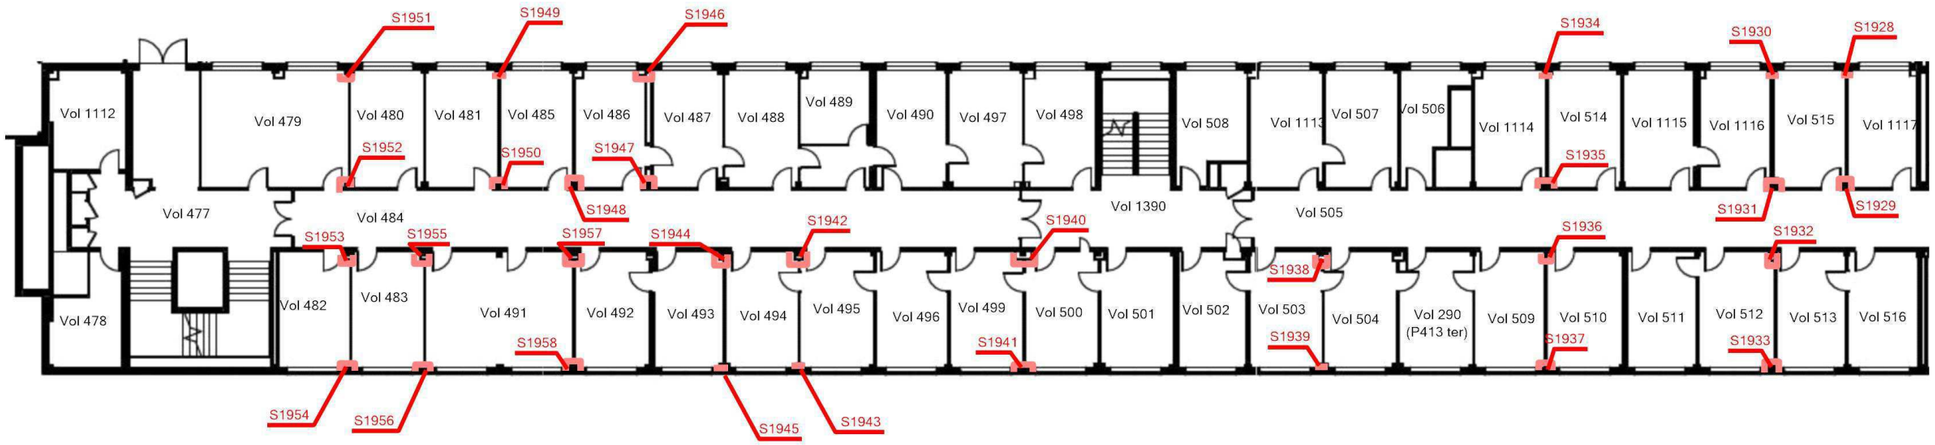

Plan de situation

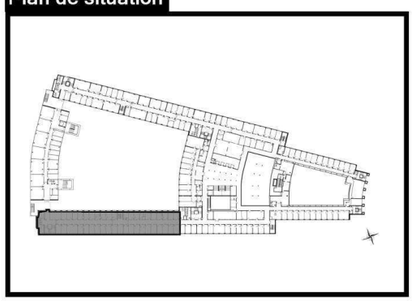

Légende


	S1946: Panneaux
	S1935: Panneaux
	S1953: Panneaux
	S1939: Panneaux
	S1930: Panneaux
	S1929: Panneaux
	S1933: Panneaux
	S1950: Panneaux
	S1942: Panneaux
	S1954: Panneaux
	S1955: Panneaux
	S1937: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

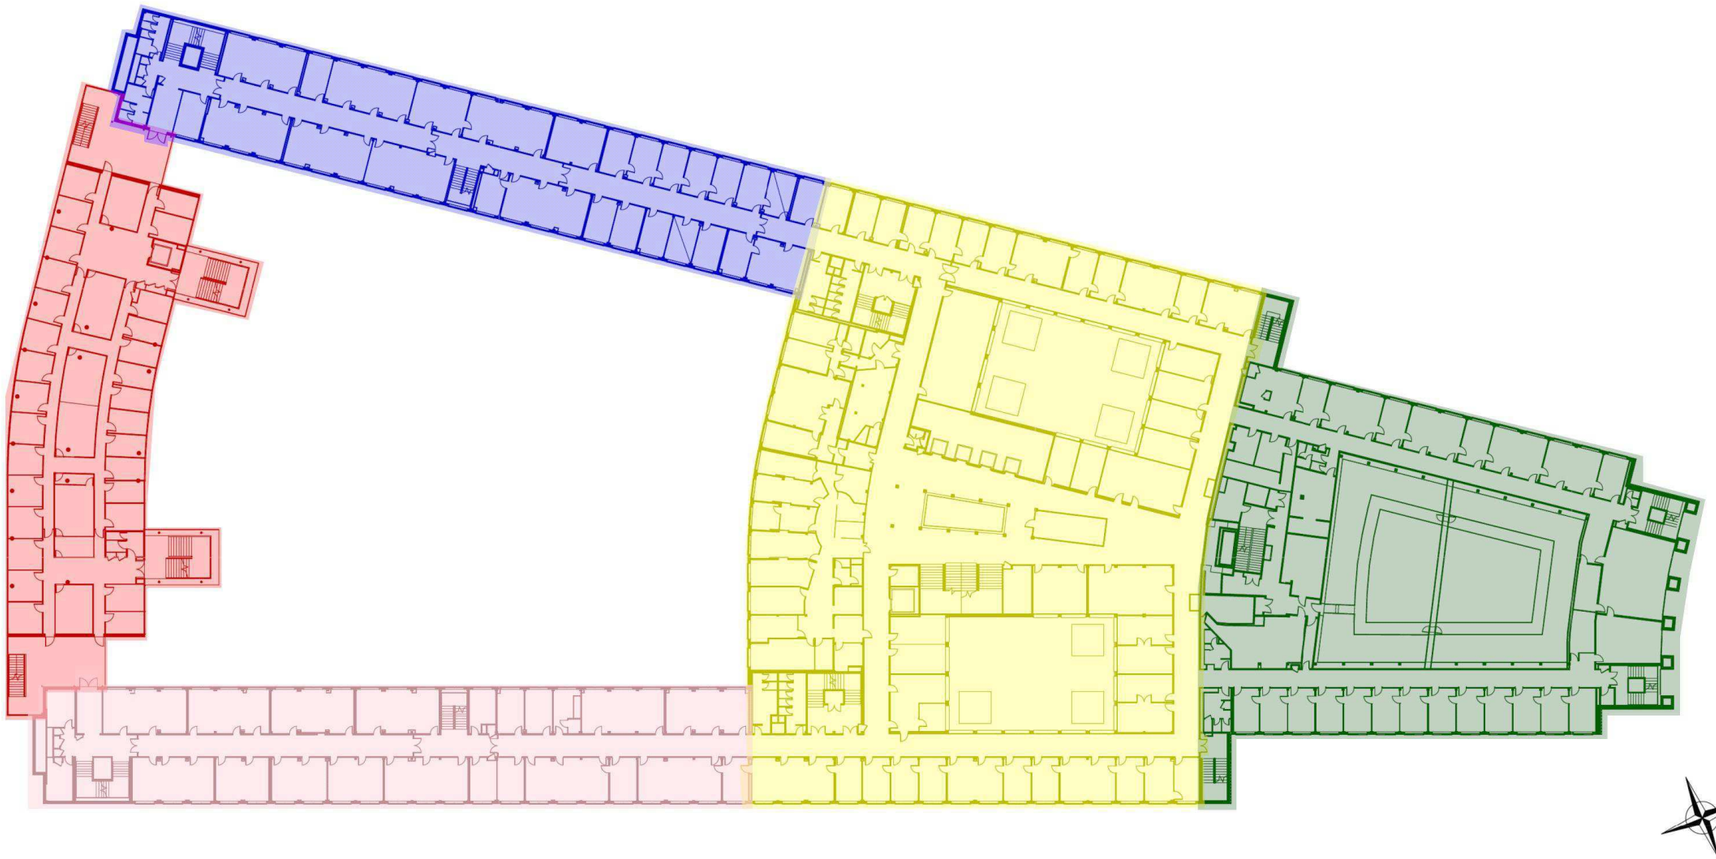


Légende	
	Aile A
	Aile B
	Aile C
	Aile D
	Aile P

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN R+5 - AILE A - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

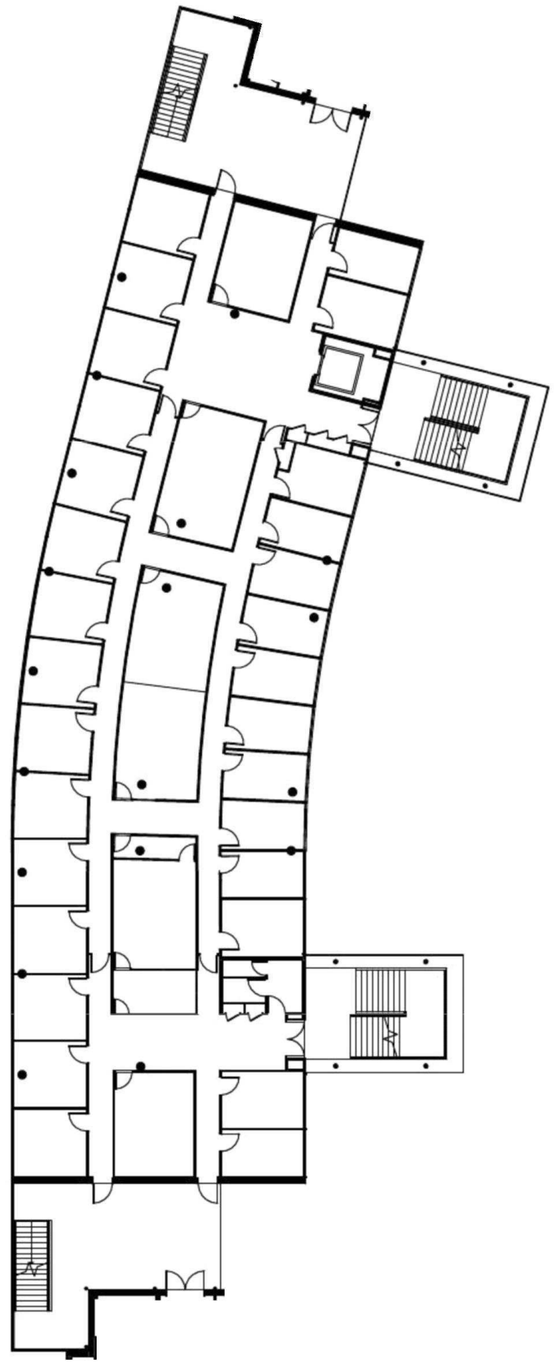

Légende	


Plan de situation

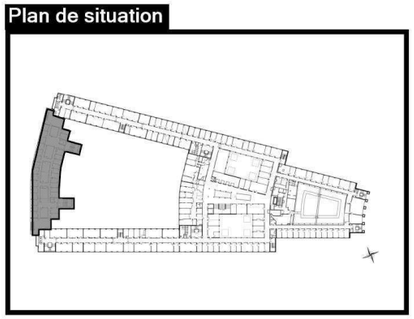

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE B - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

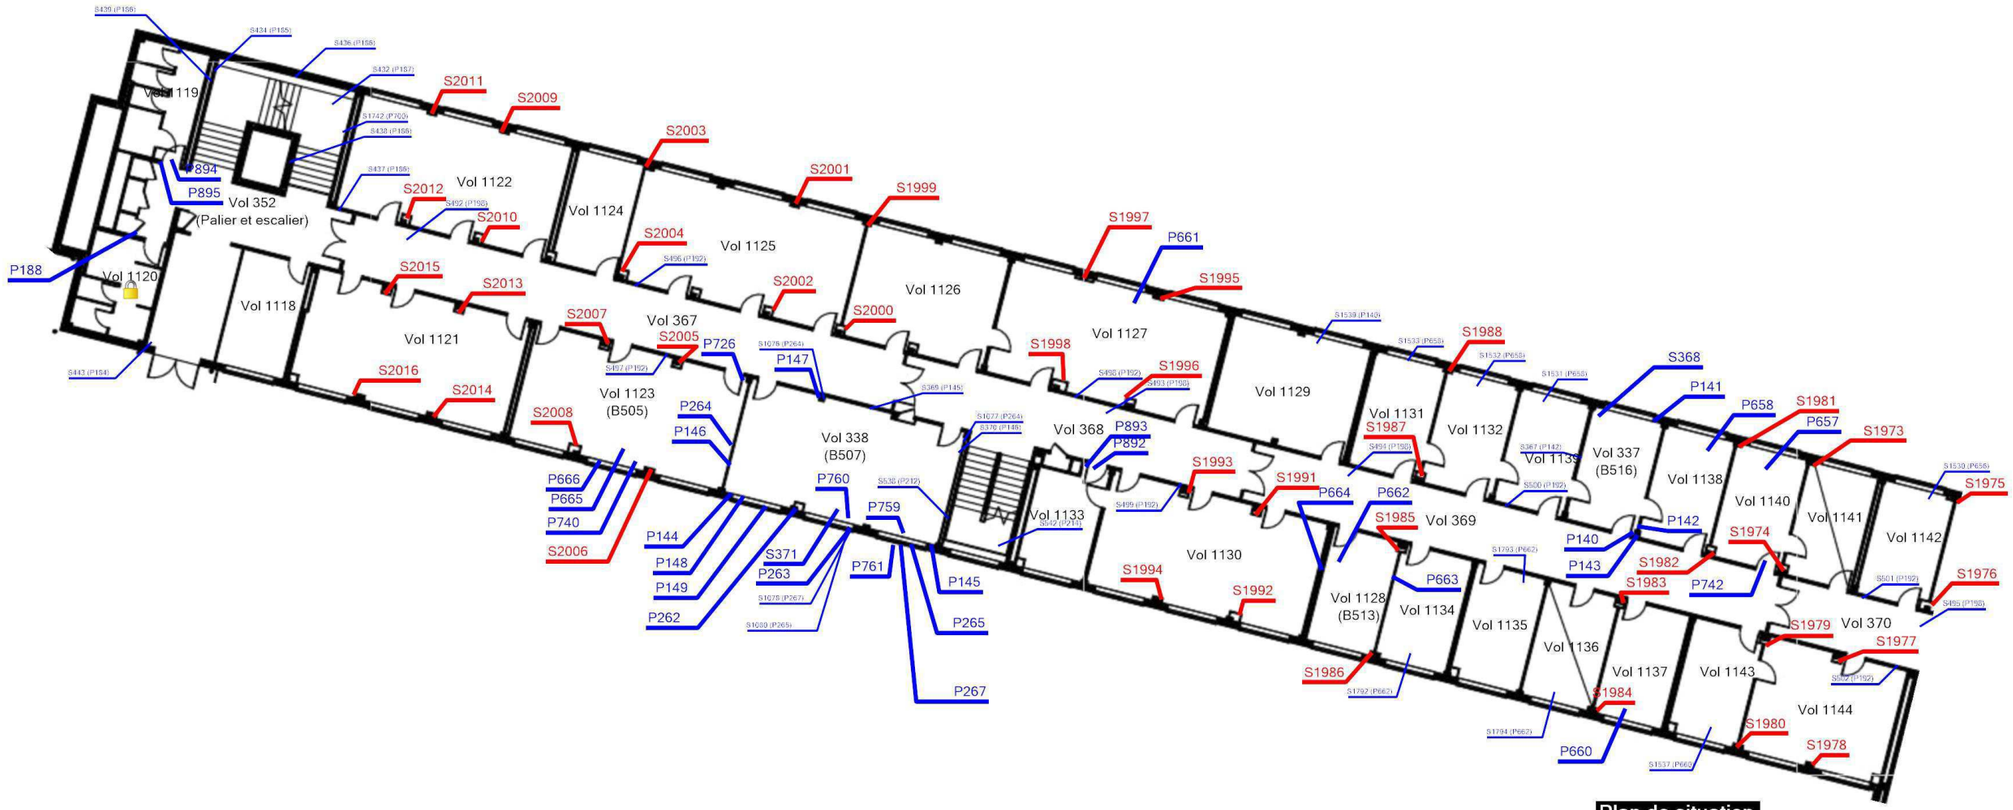

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation

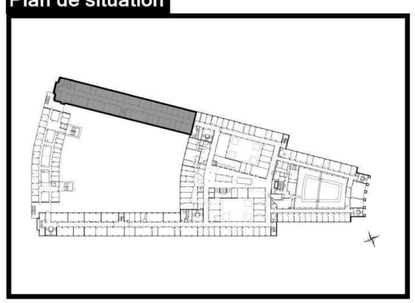


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE B - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5

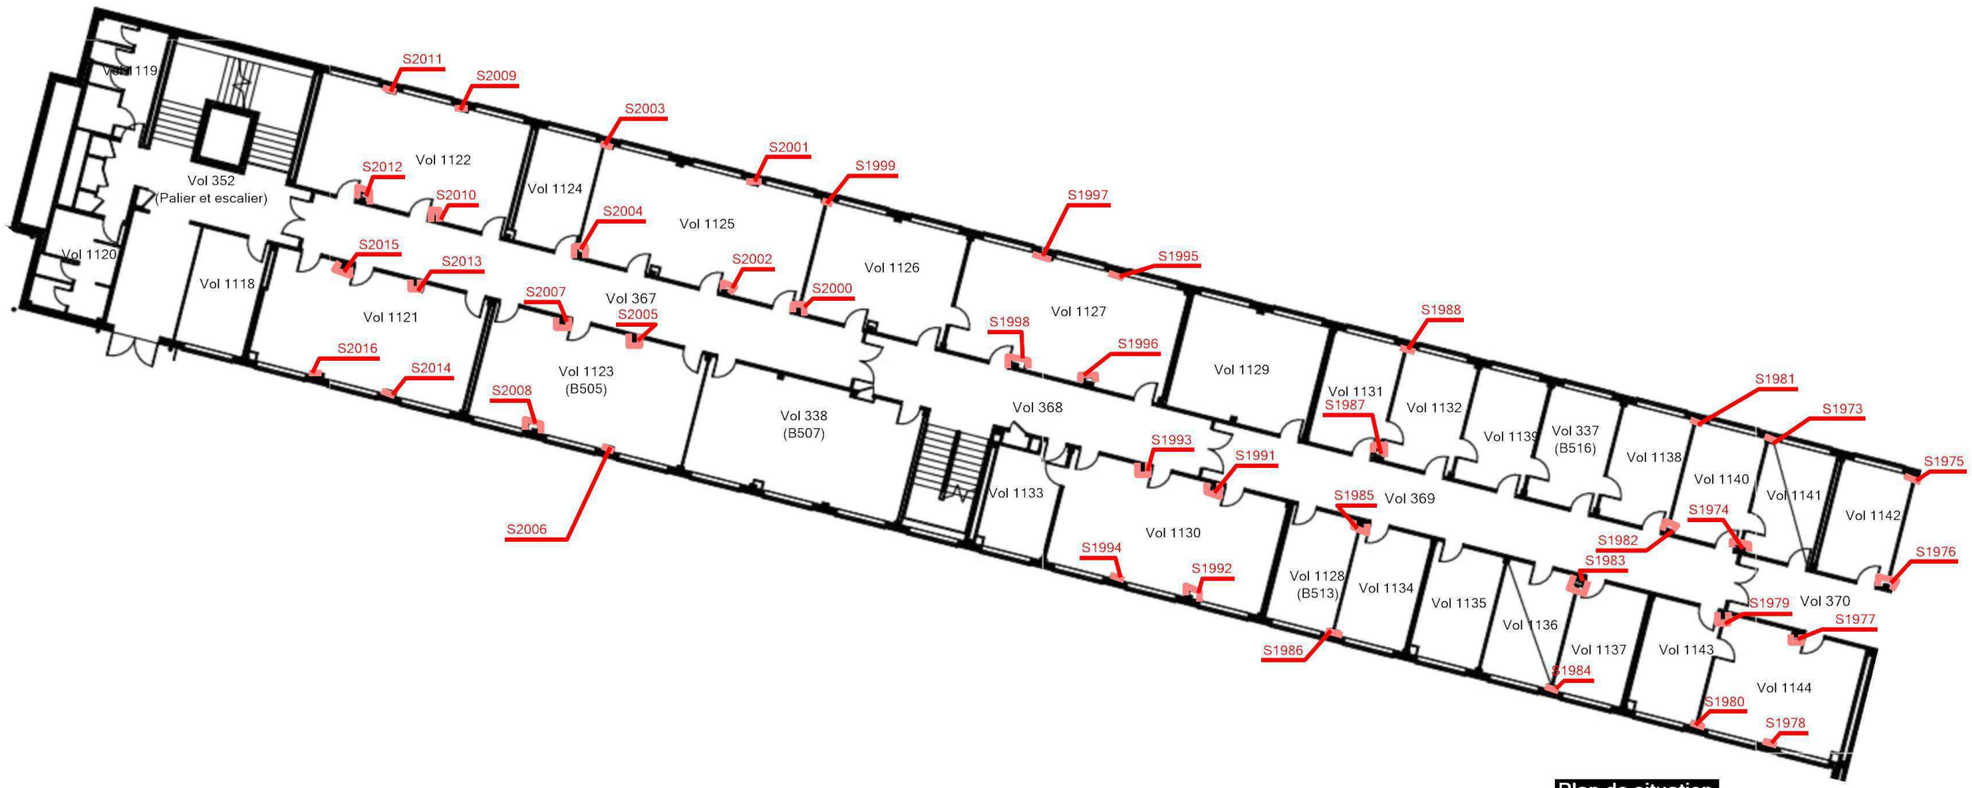

Plan de situation

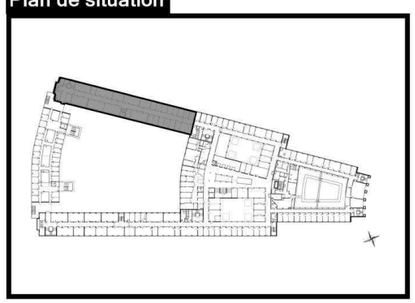

Légende


	S2012: Panneaux
	S1984: Panneaux
	S2009: Panneaux
	S1975: Panneaux
	S2010: Panneaux
	S2016: Panneaux
	S1977: Panneaux
	S1992: Panneaux
	S2008: Panneaux
	S1988: Panneaux
	S1994: Panneaux
	S2007: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE B - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002KN000189-5

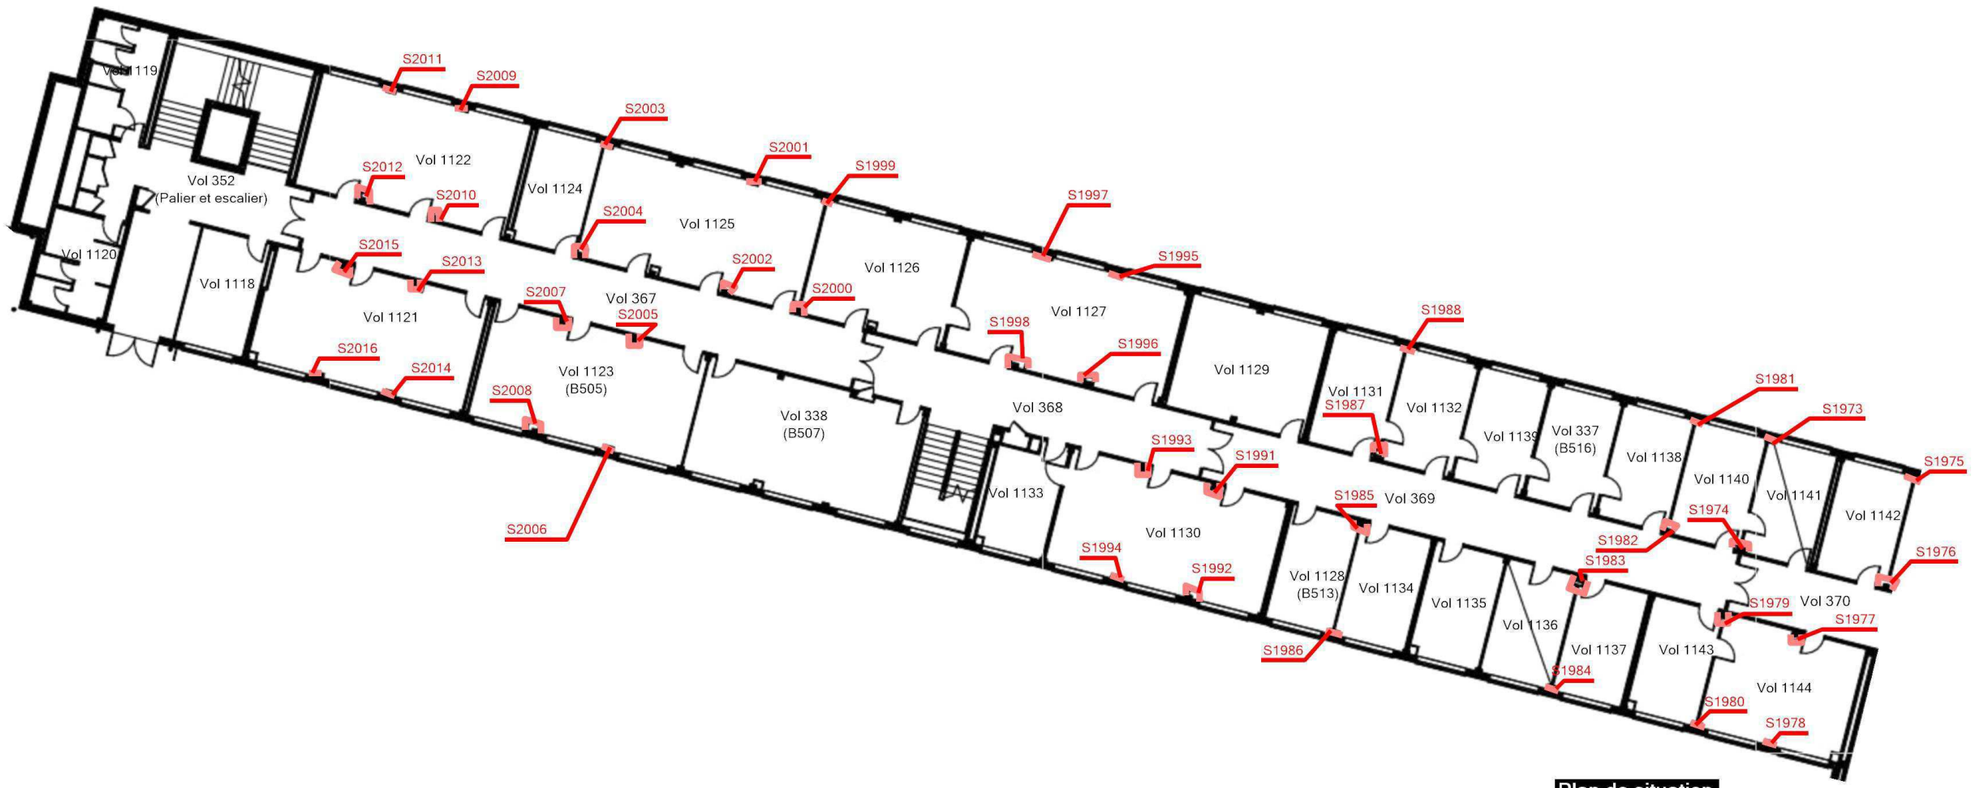

Plan de situation

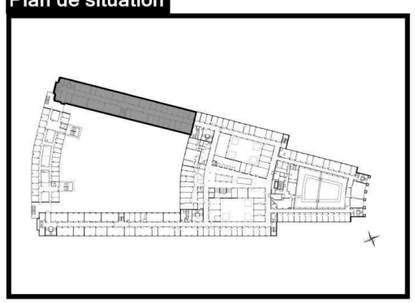

Légende

	S2012: Panneaux
	S1984: Panneaux
	S2009: Panneaux
	S1975: Panneaux
	S2010: Panneaux
	S2016: Panneaux
	S1977: Panneaux
	S1992: Panneaux
	S2008: Panneaux
	S1988: Panneaux
	S1994: Panneaux
	S2007: Panneaux

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE C - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation

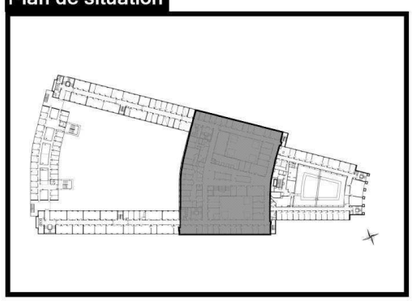

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE C - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5



Légende

	S1962: Panneaux
	S1967: Panneaux
	S1965: Panneaux
	S1972: Panneaux
	S660: Elément en fibre ciment
	S1966: Panneaux
	S1990: Panneaux
	S1969: Panneaux
	S1961: Panneaux
	S1963: Panneaux
	S662: Elément en fibre ciment
	S1970: Panneaux

Plan de situation

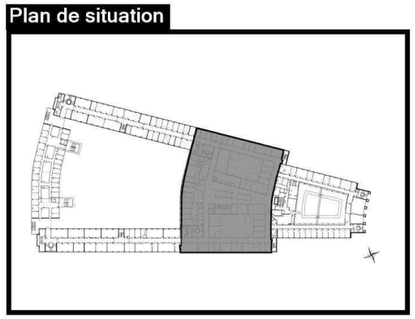

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE C - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002KN000189-5



Légende

	S1962: Panneaux
	S1967: Panneaux
	S1965: Panneaux
	S1972: Panneaux
	S1966: Panneaux
	S1990: Panneaux
	S1969: Panneaux
	S1961: Panneaux
	S1963: Panneaux
	S1970: Panneaux
	S1971: Panneaux
	S1968: Panneaux

Plan de situation

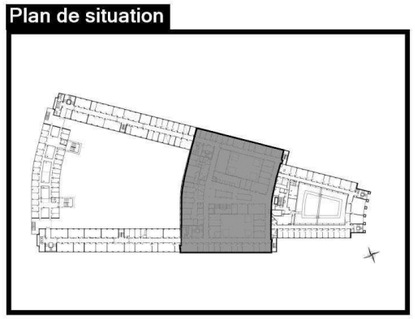

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE C - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence:
002KN000189-5



Plan de situation

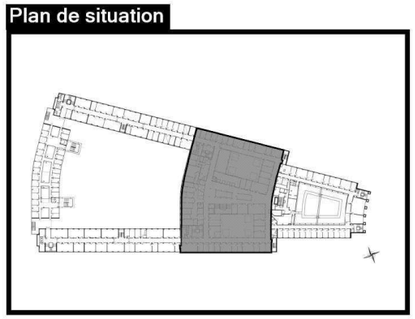


Légende

	S660: Elément en fibre ciment
	S662: Elément en fibre ciment
	S663: Elément en fibre ciment
	S661: Elément en fibre ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE D - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

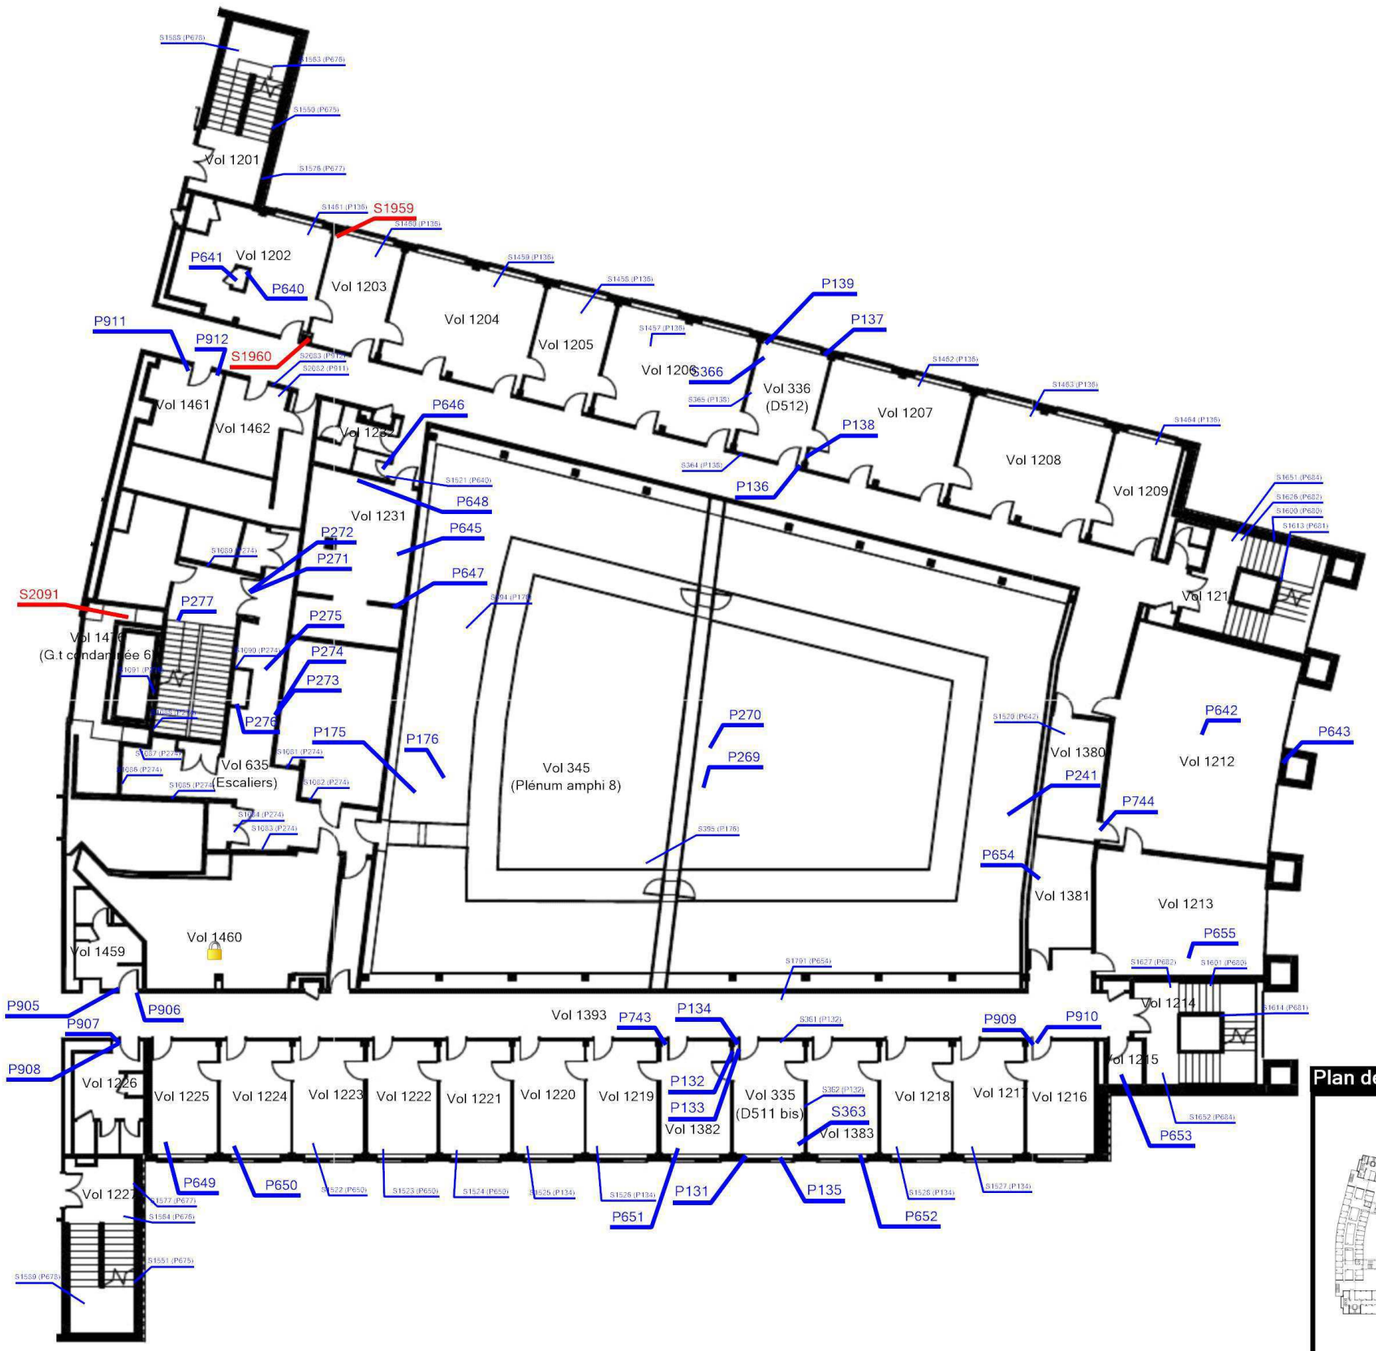

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation

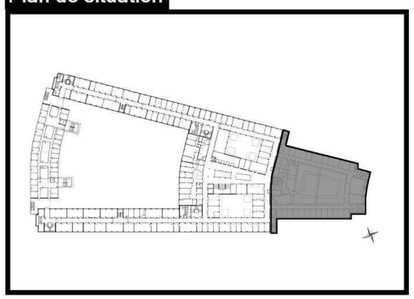


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5

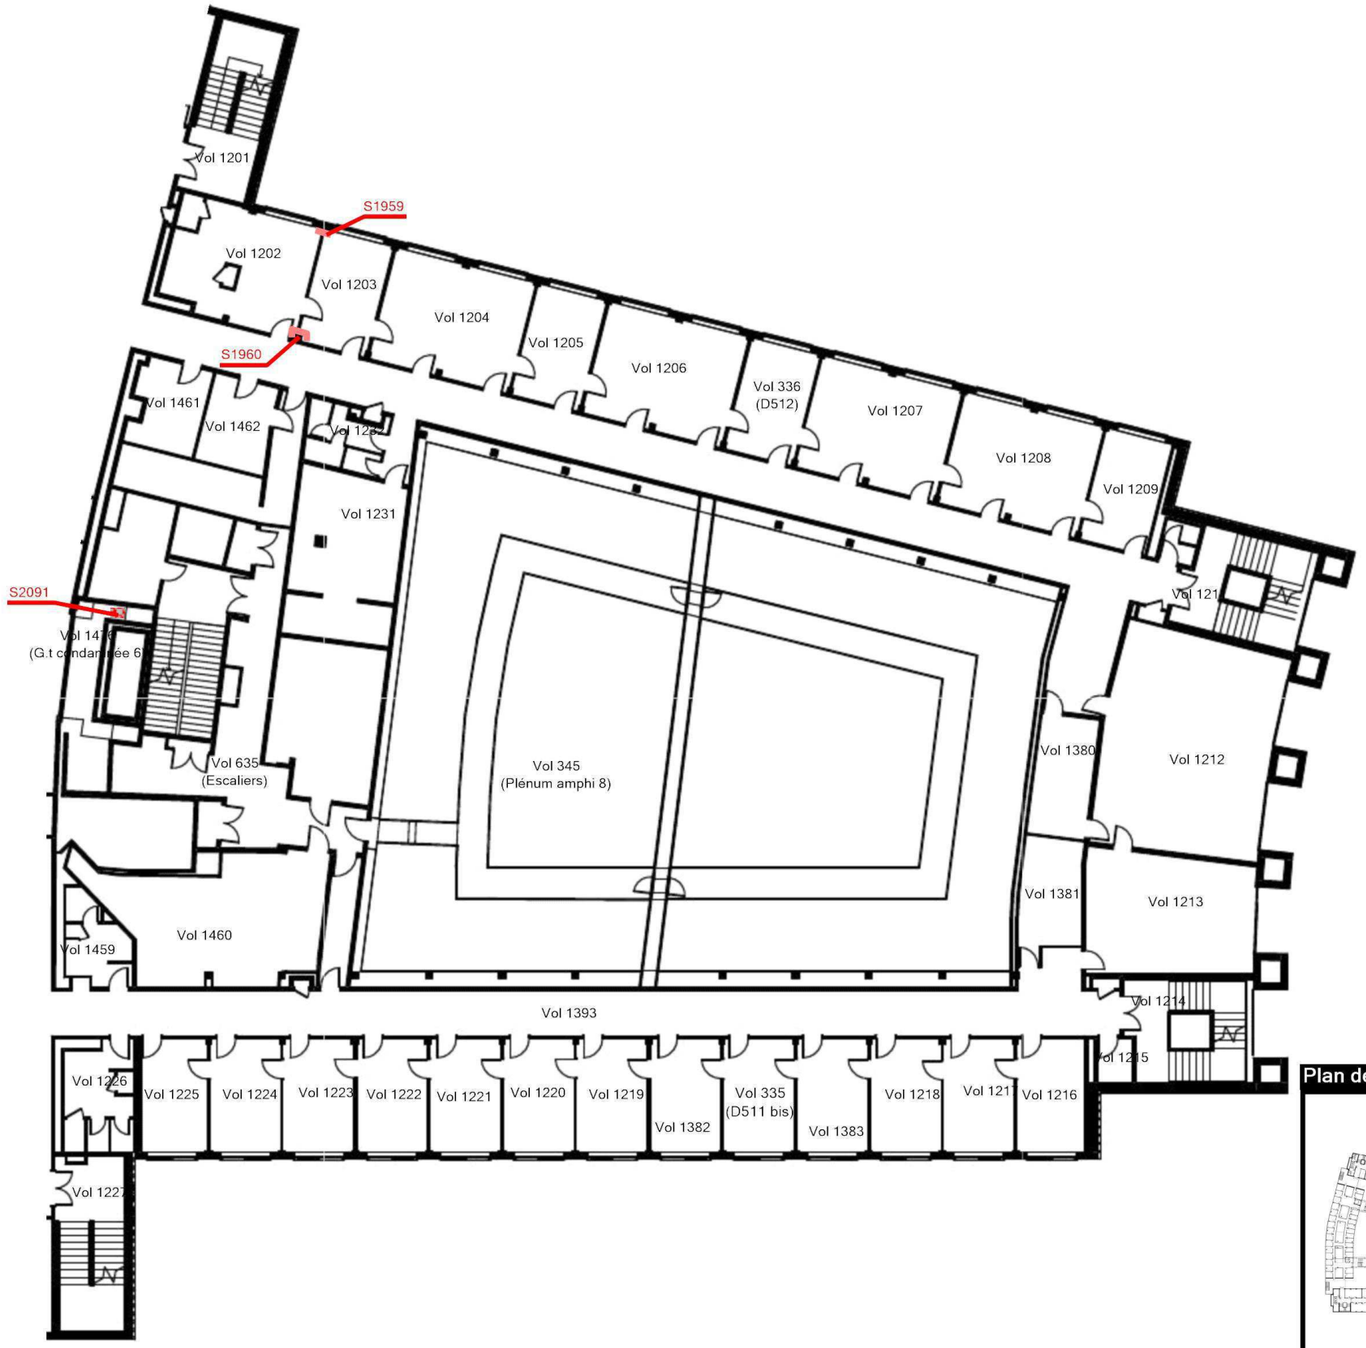

Plan de situation

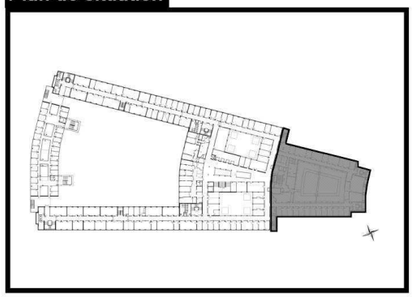


Légende

	S1960: Panneaux
	S1959: Panneaux
	S2091: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE D - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002KN000189-5

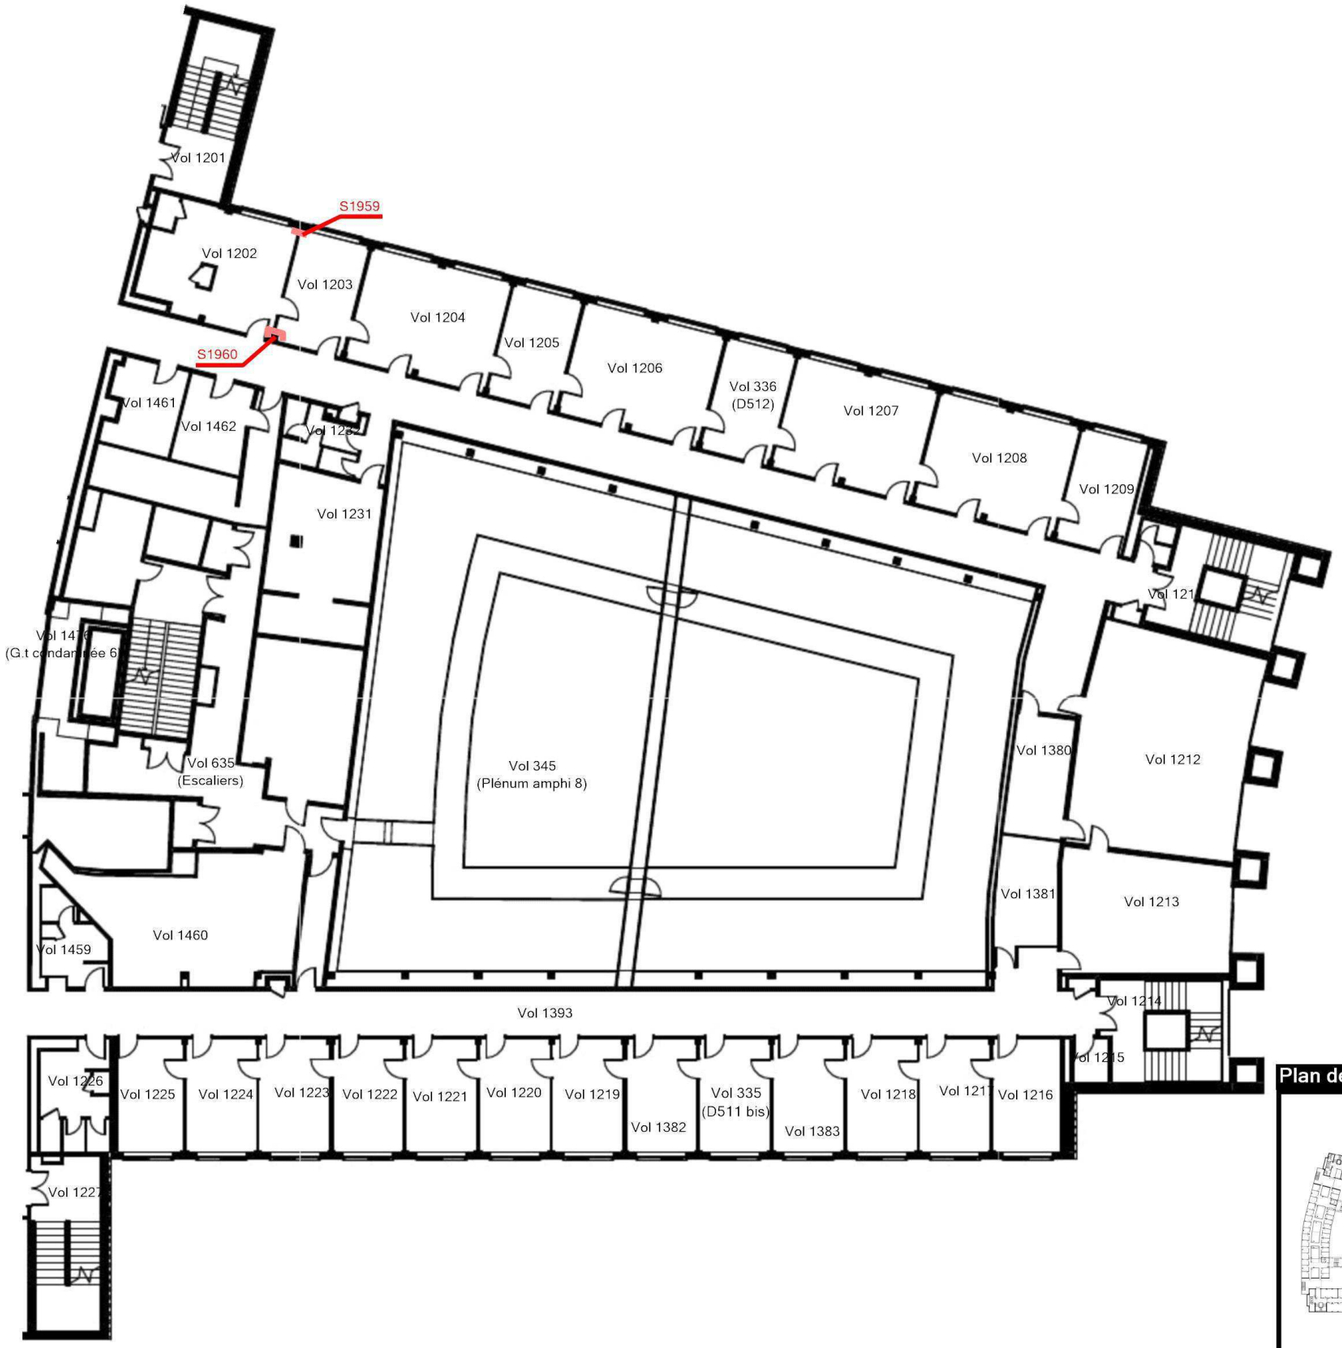

Légende

	S1960: Panneaux
	S1959: Panneaux


Plan de situation

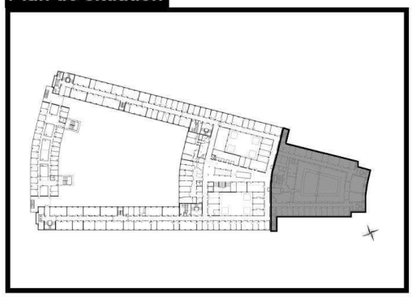

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE D - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002KN000189-5

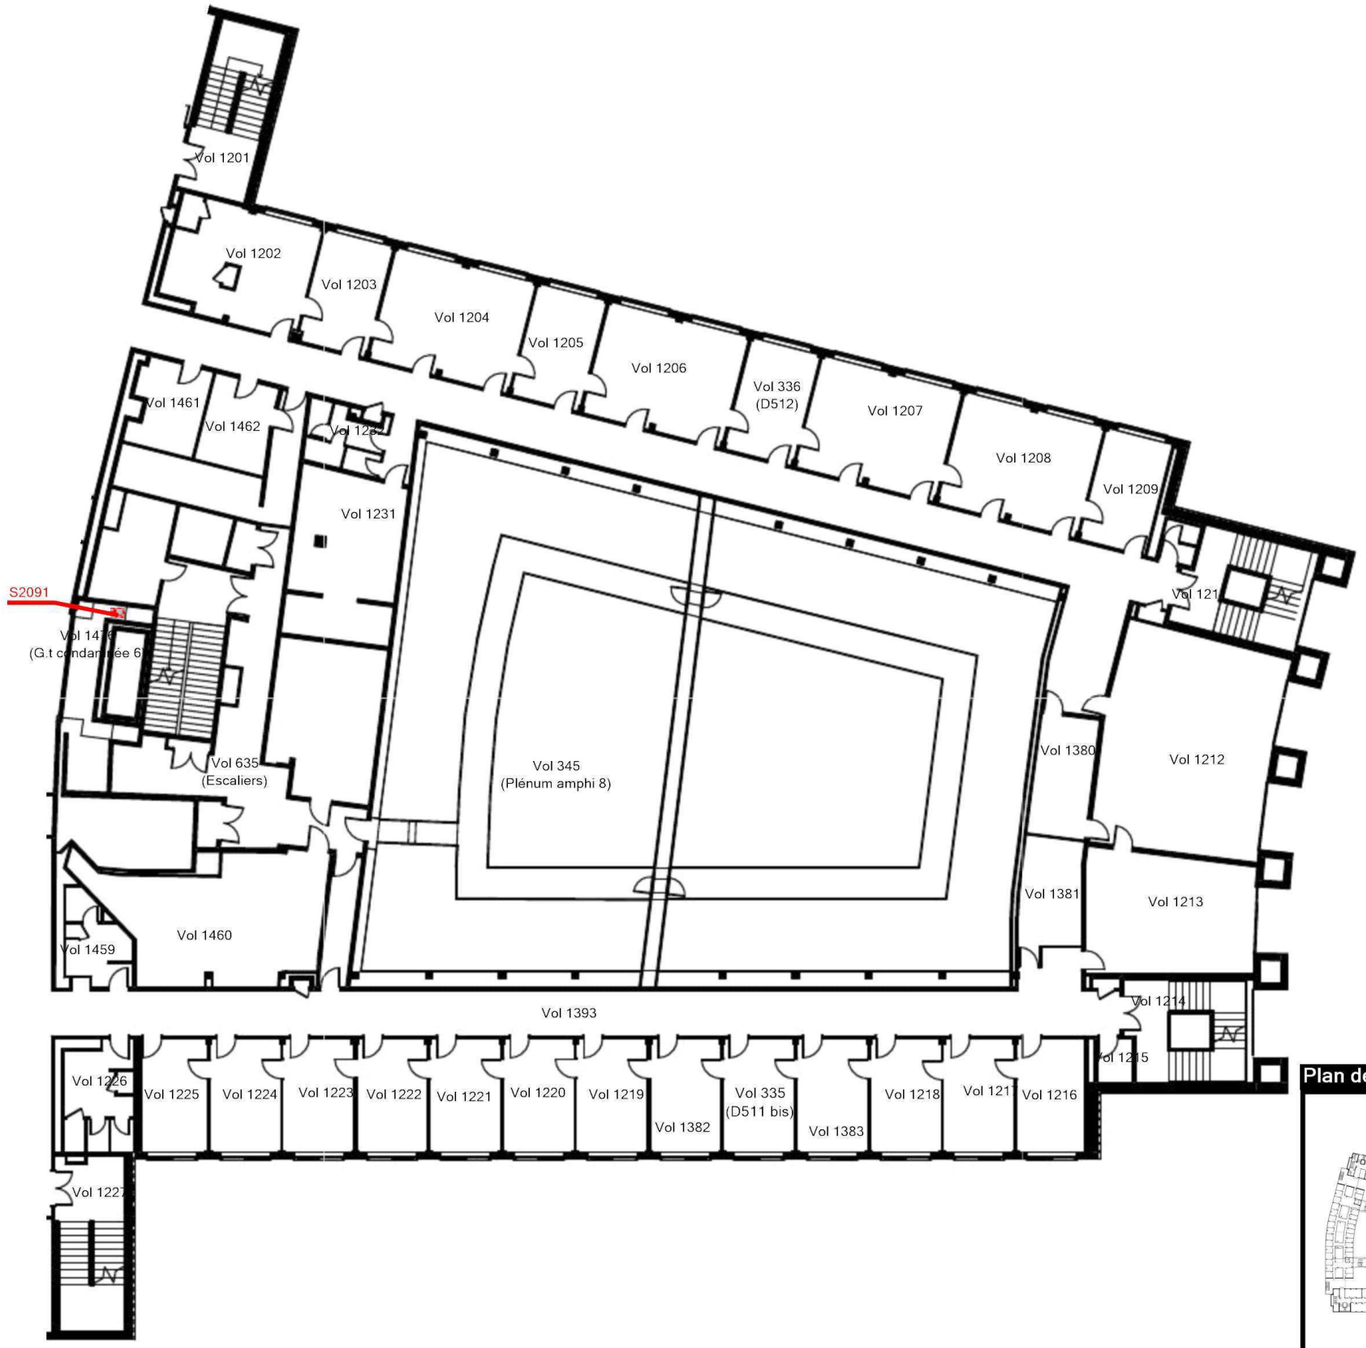

Légende

	S2091: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation

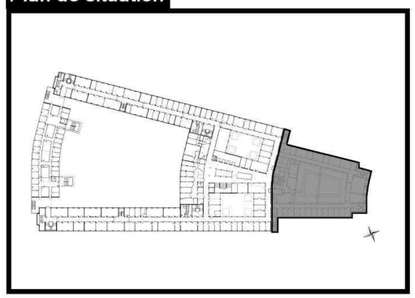


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (validité début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PLAN R+5 - AILE P - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

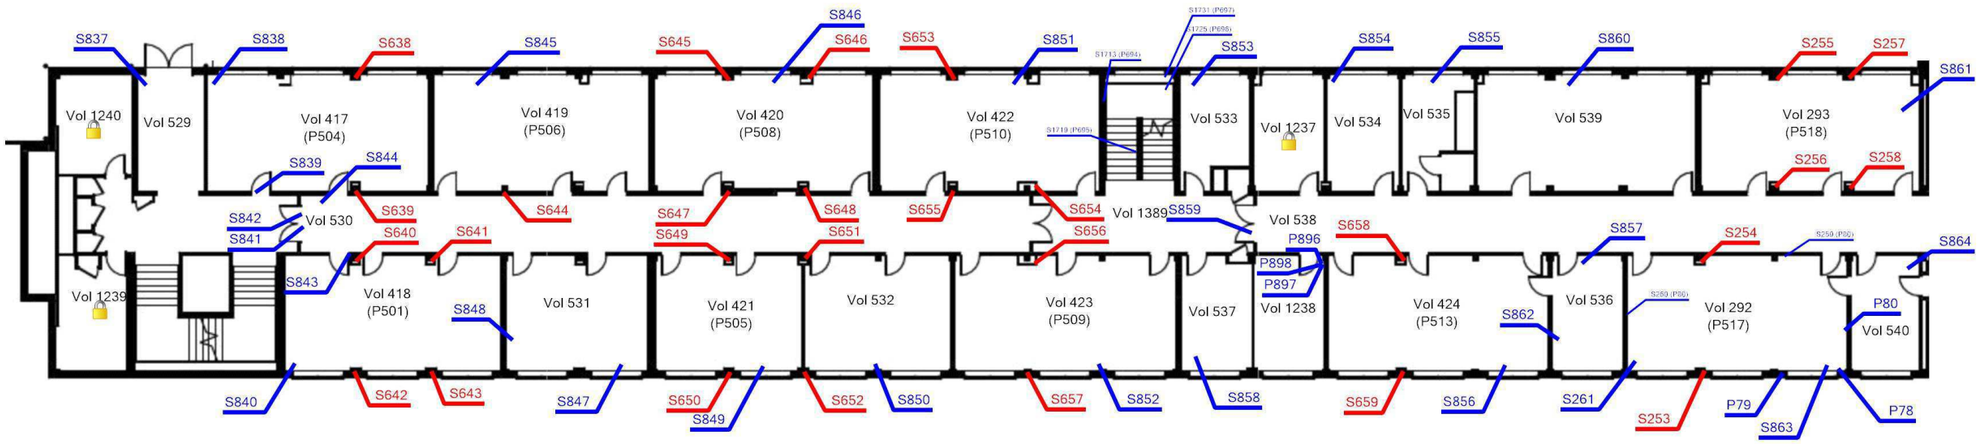

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE P - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5

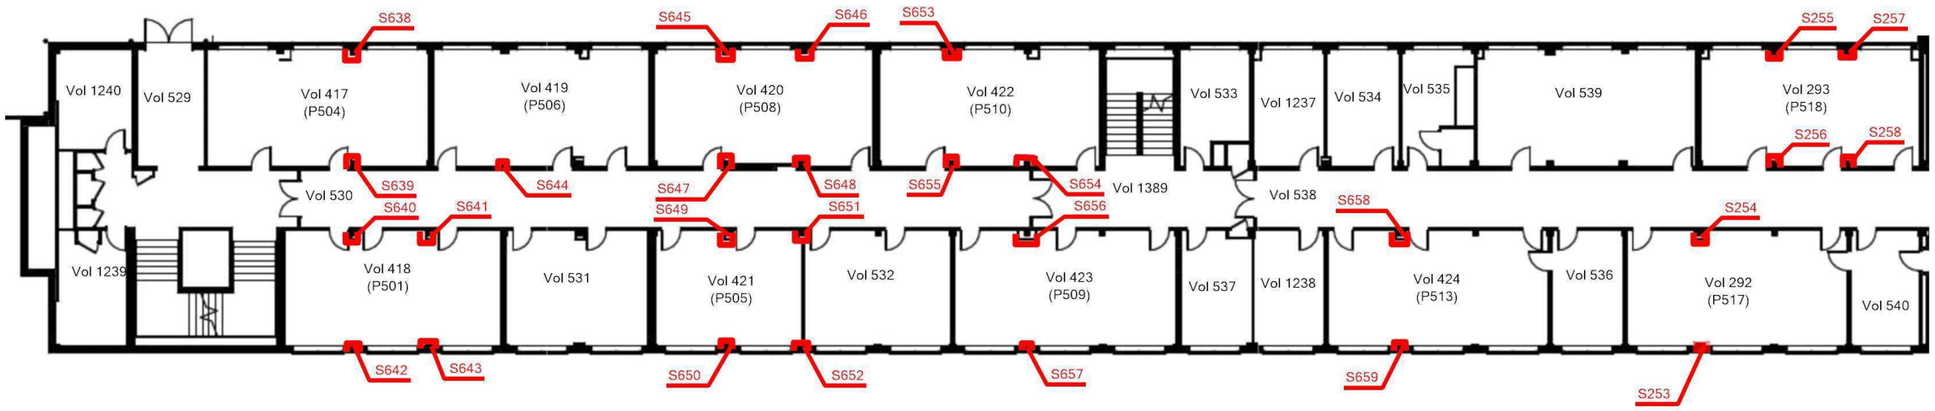

Plan de situation

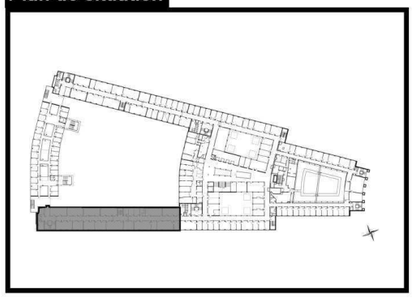

Légende


	S257: Elément en fibre ciment
	S642: Elément en fibre ciment
	S659: Elément en fibre ciment
	S657: Elément en fibre ciment
	S644: Elément en fibre ciment
	S646: Elément en fibre ciment
	S654: Elément en fibre ciment
	S258: Elément en fibre ciment
	S658: Elément en fibre ciment
	S650: Elément en fibre ciment
	S656: Elément en fibre ciment
	S641: Elément en fibre ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+5 - AILE P - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence:
002KN000189-5

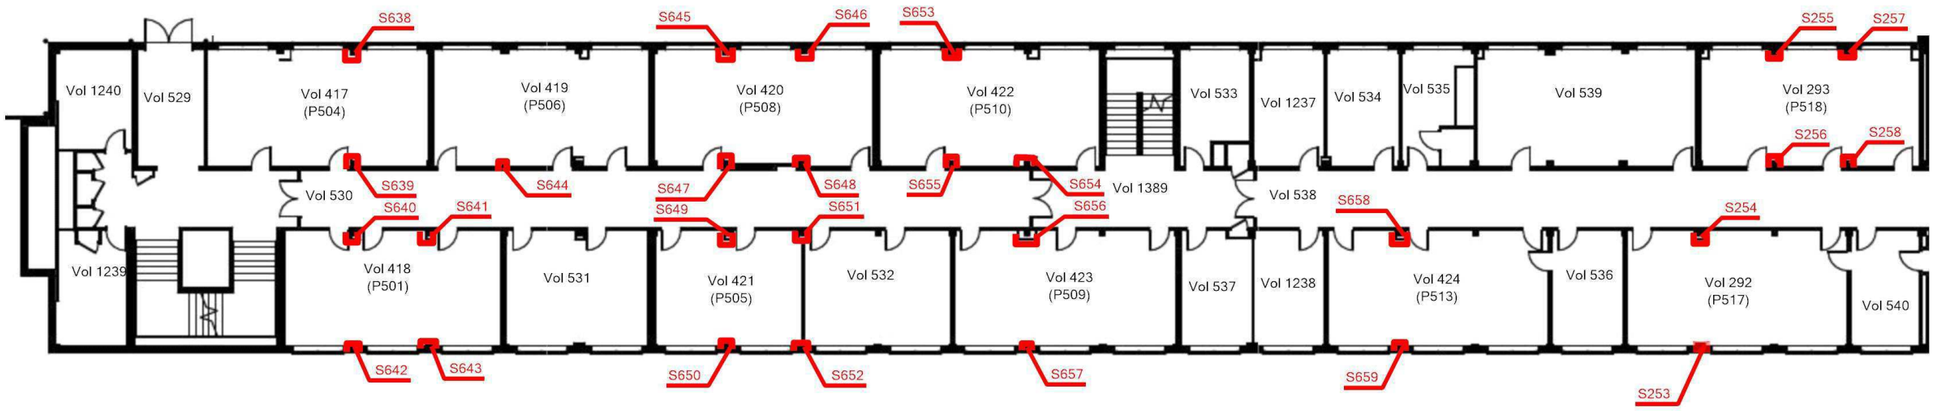

Plan de situation

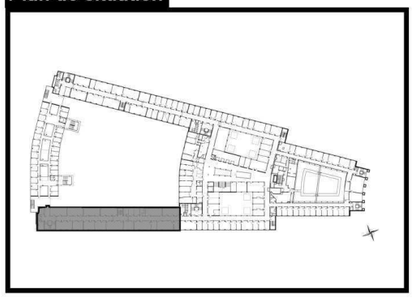

Légende


	S257: Elément en fibre ciment
	S642: Elément en fibre ciment
	S659: Elément en fibre ciment
	S657: Elément en fibre ciment
	S644: Elément en fibre ciment
	S646: Elément en fibre ciment
	S654: Elément en fibre ciment
	S258: Elément en fibre ciment
	S658: Elément en fibre ciment
	S650: Elément en fibre ciment
	S656: Elément en fibre ciment
	S641: Elément en fibre ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

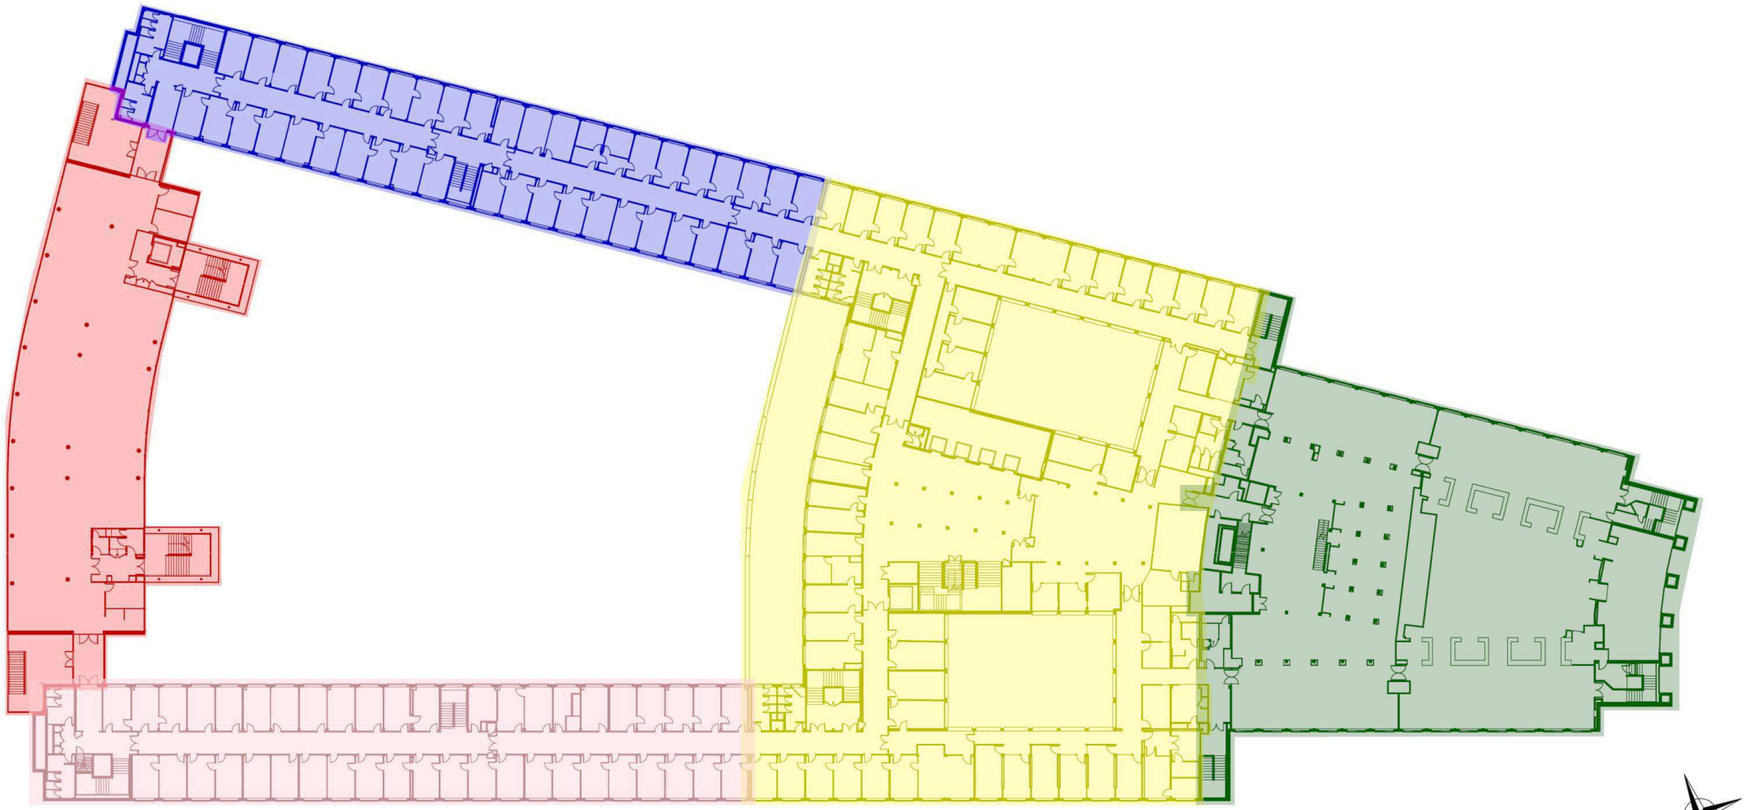


Légende	
	Aile A
	Aile B
	Aile C
	Aile D
	Aile P

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN R+6 - AILE A - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

Légende

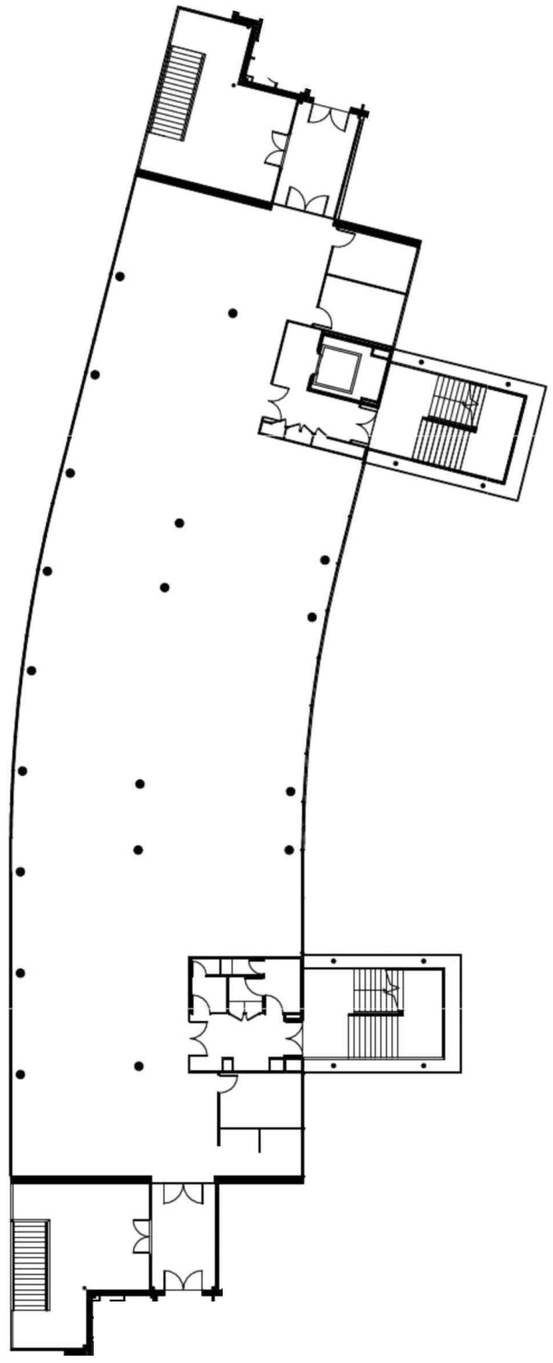


Plan de situation

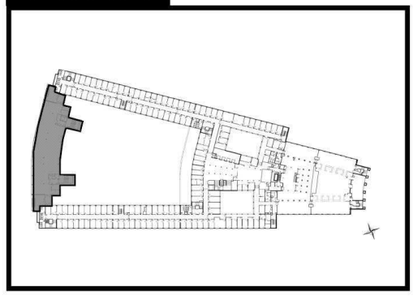


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+6 - AILE B - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

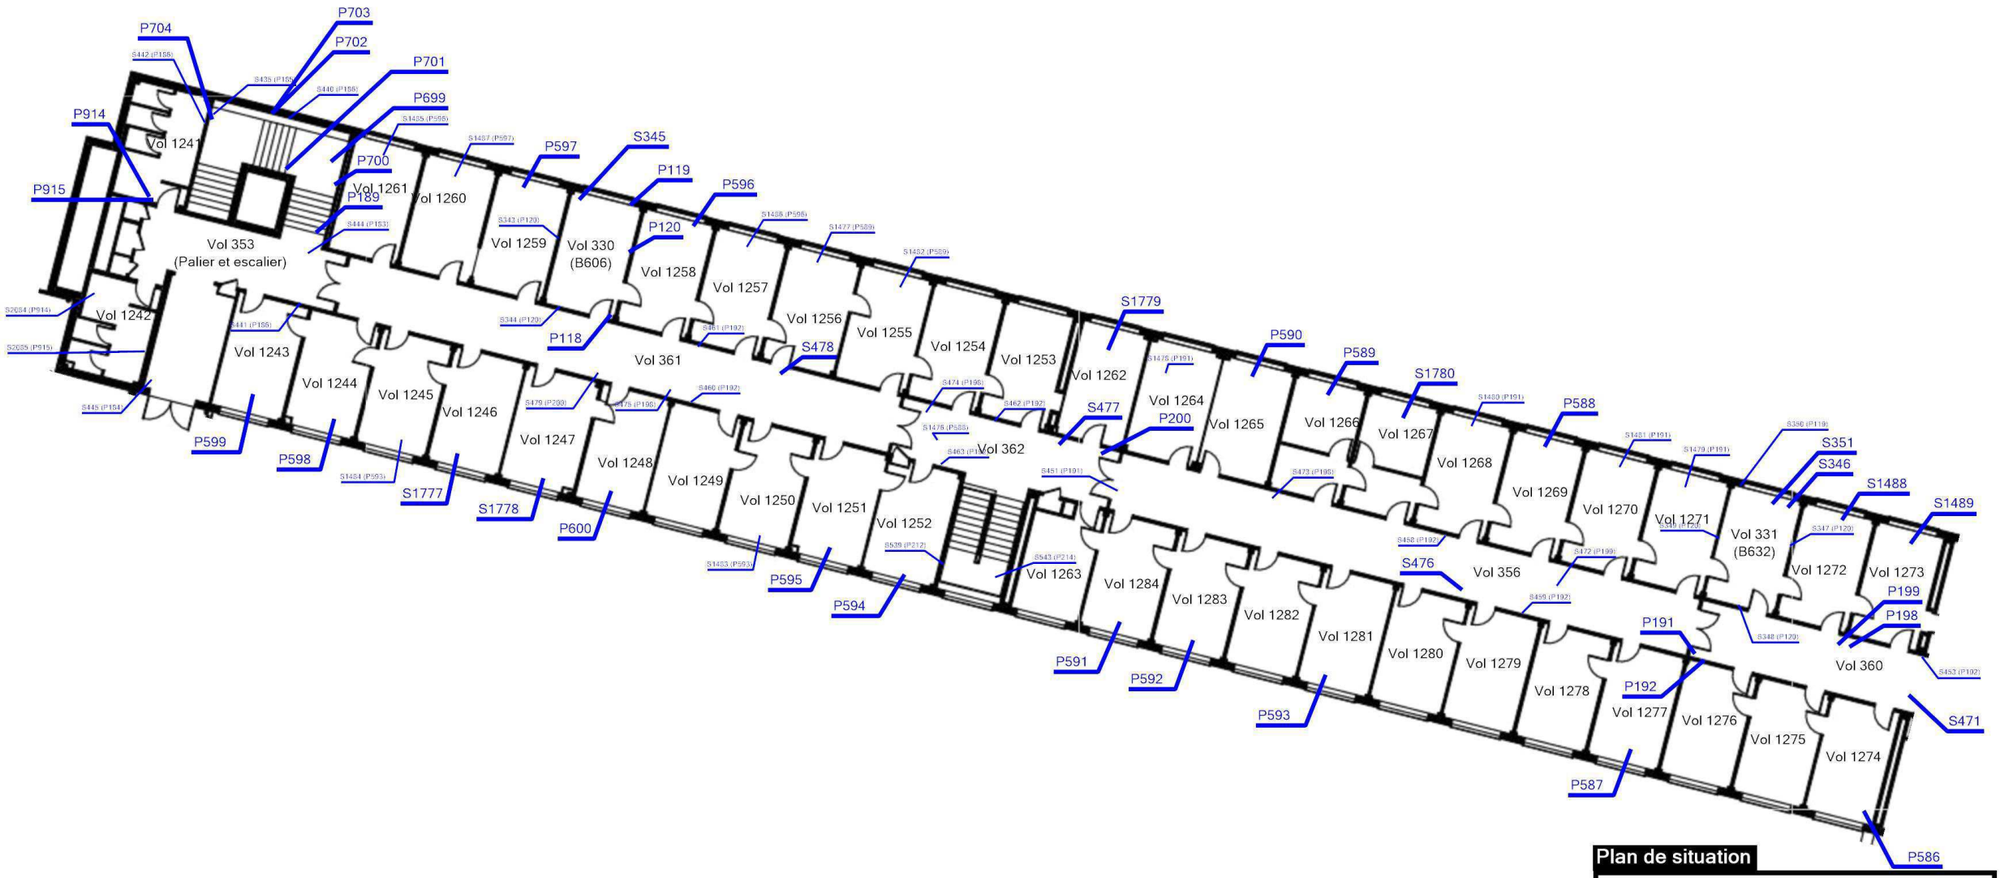

Plan de situation

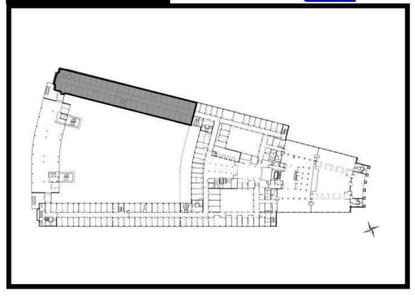

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN R+6 - AILE C - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5


P585
P584
P122
S354
P747
P123
P601
P602
P613
P736
P735
P734
P614
P615
P616
P617
P618
P197
P193
P195
P196
P121
P688
P686
P612
P603
P194
S469
S470
P689
P687
P690
P611
P608
P609
P610
P607
P606
P605
P604
P630
P619
P620
P623
P622
P621
P625
P244
P629
P627
P628
P626
P949
P946
P945
P944
P948
P947
P941
P940
P624
P942
P943
P88
P935
P126
P124
S357
P125

PLAN R+6 - AILE D - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

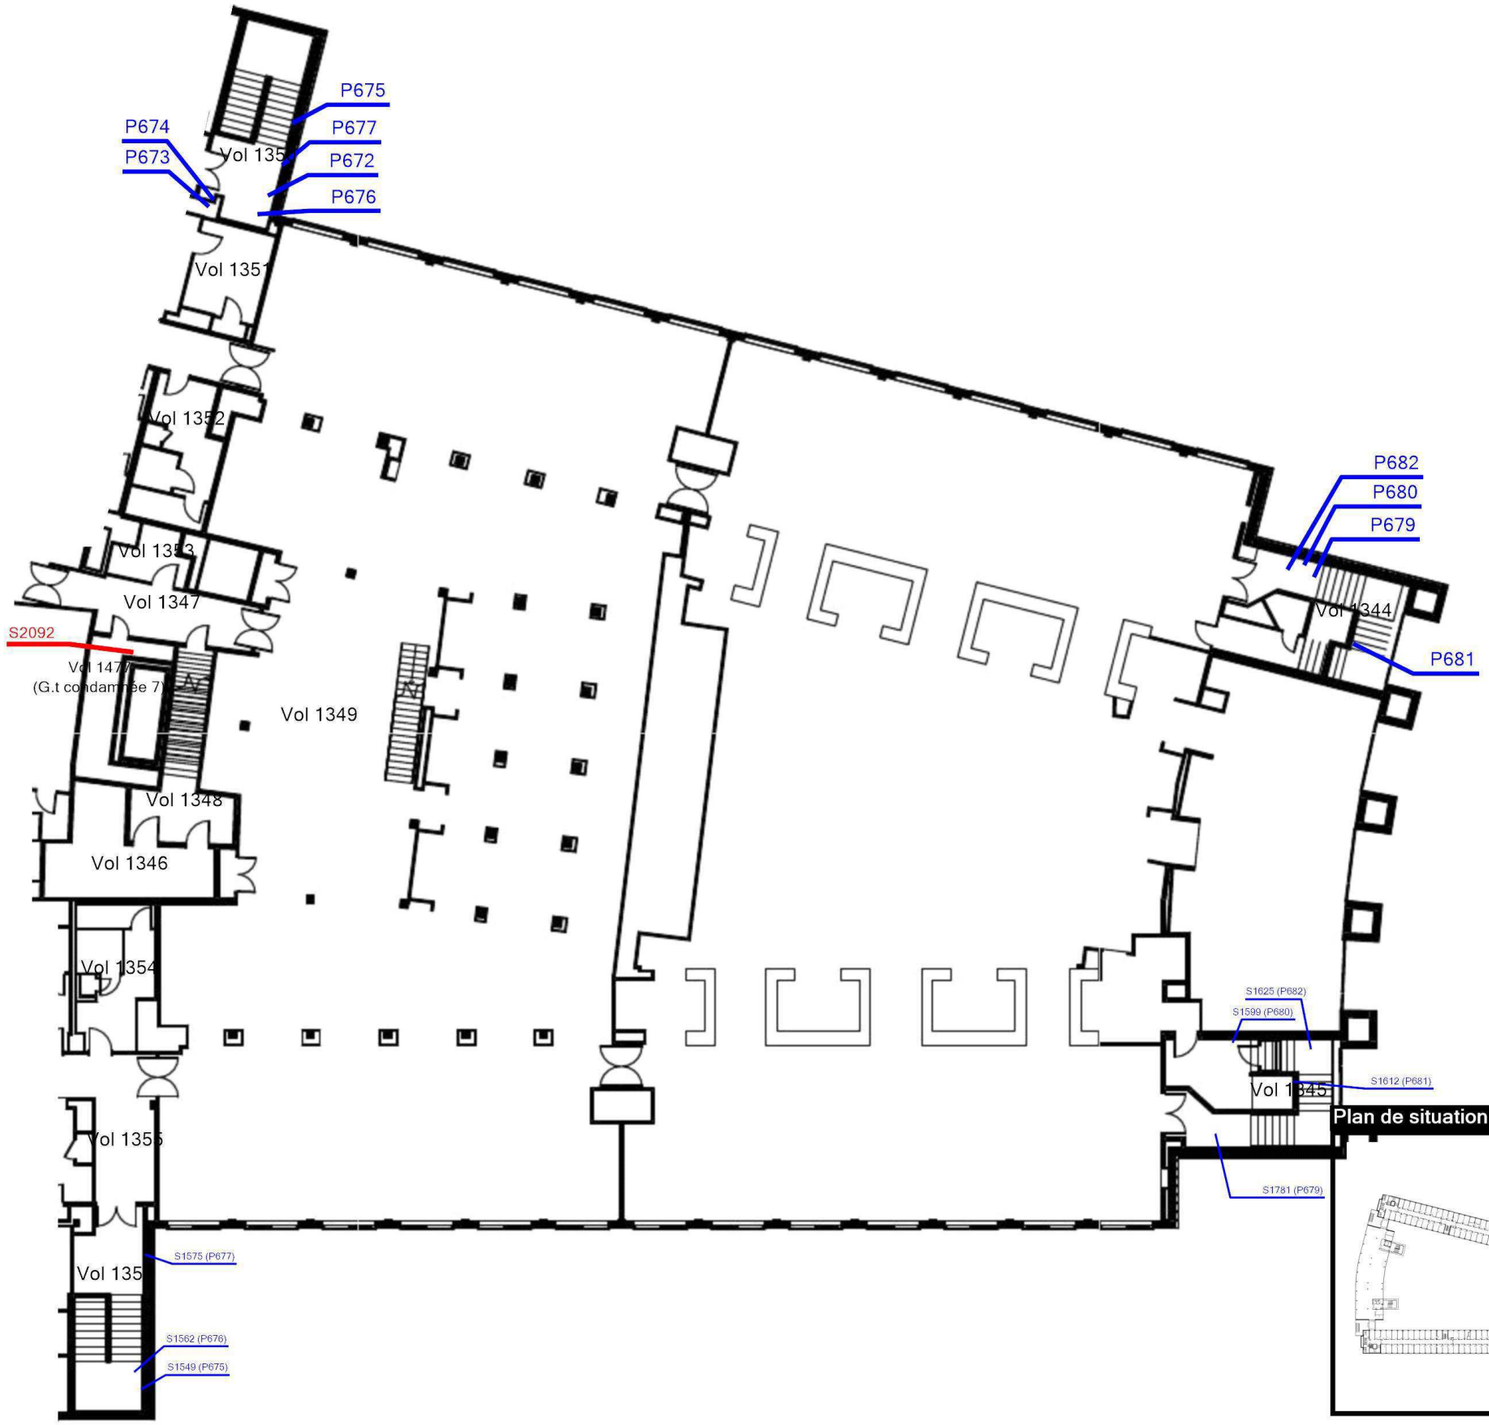

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation

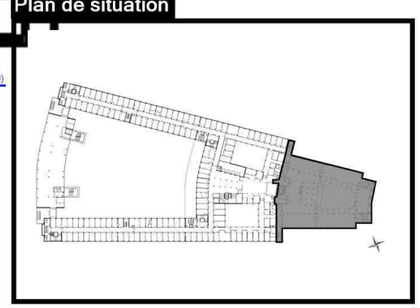


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (validité début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PLAN R+6 - AILE D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002KN000189-5

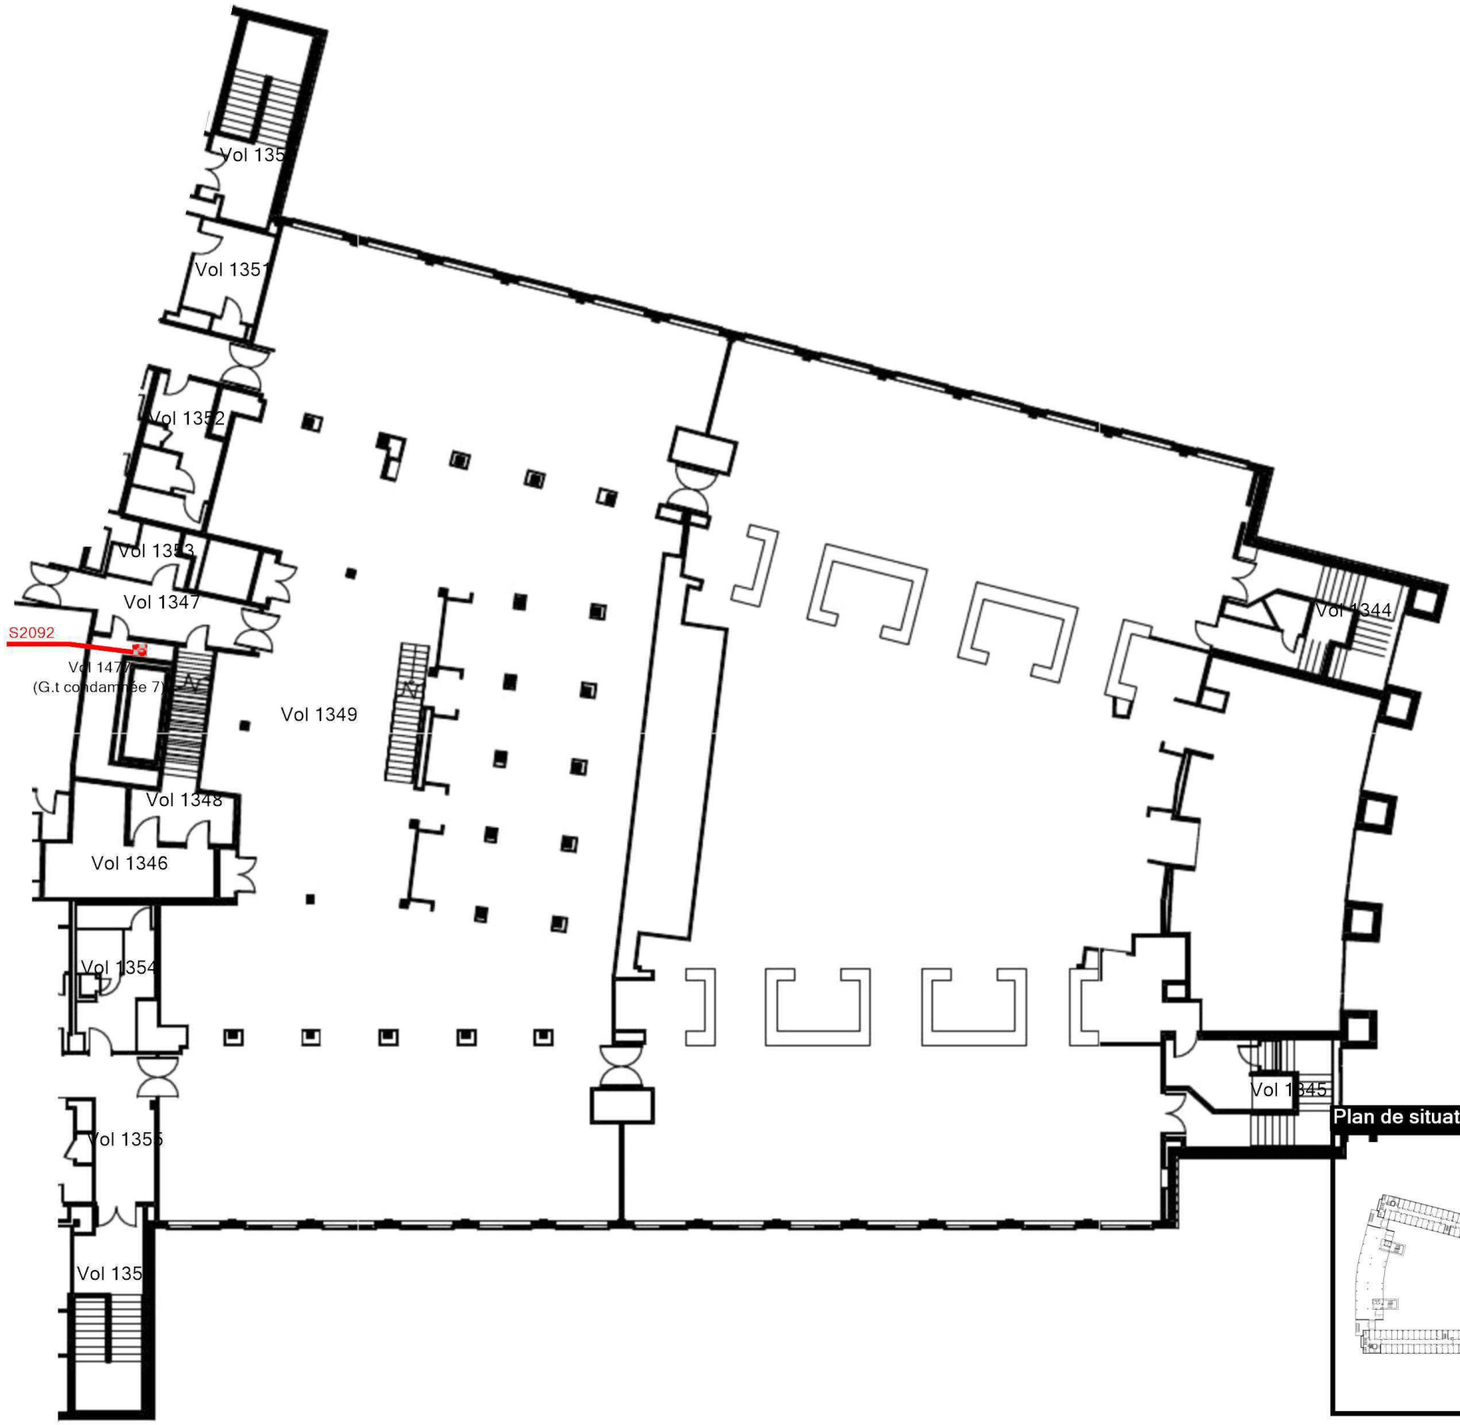

Plan de situation

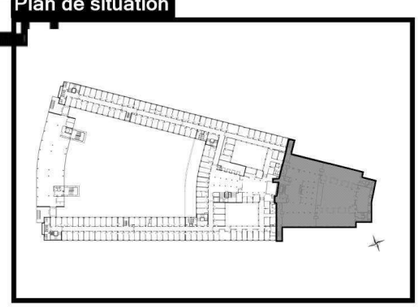


Légende

	S2092: Conduit en fibres-ciment


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+6 - AILE D - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002KN000189-5

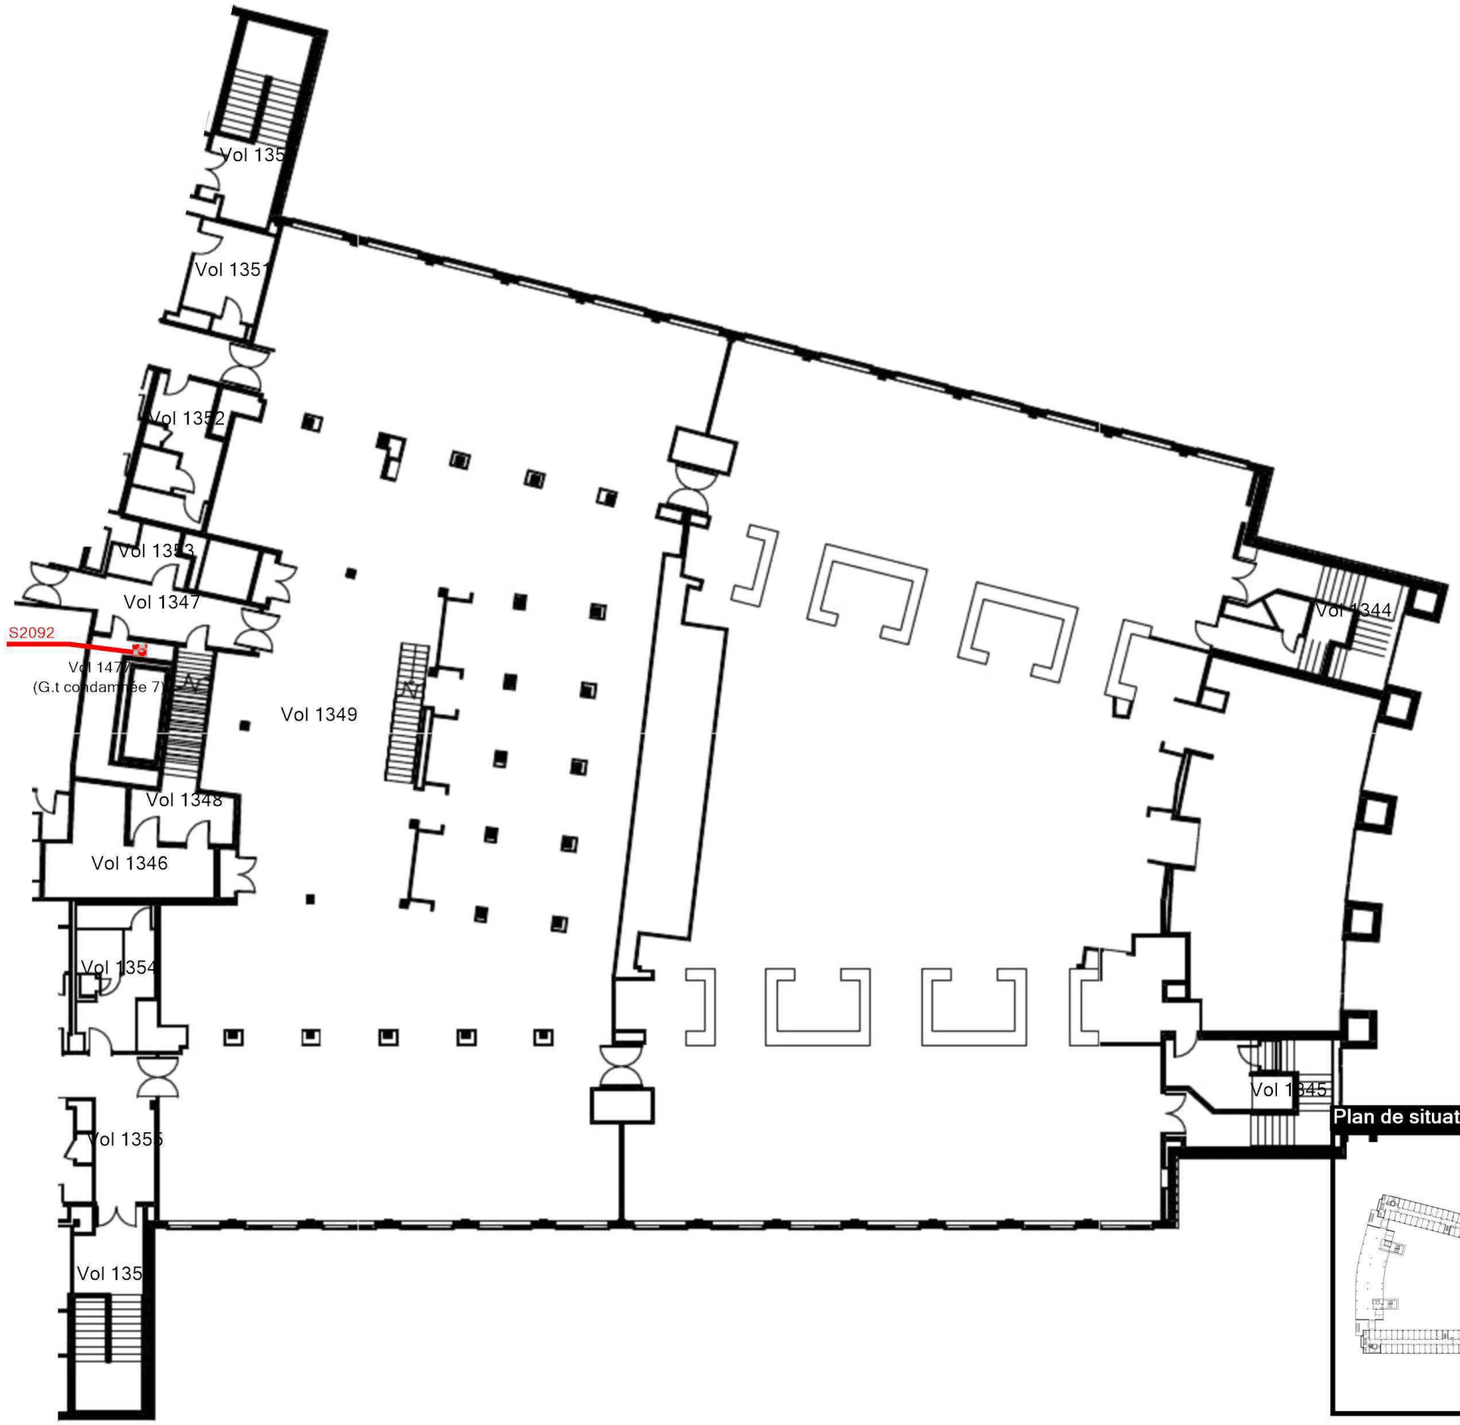

Plan de situation

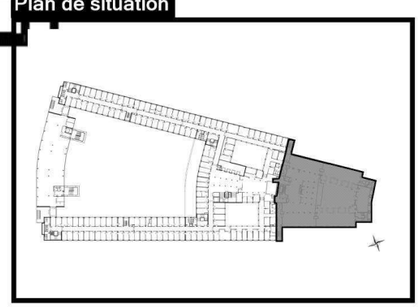


Légende

	S2092: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+6 - AILE P - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5

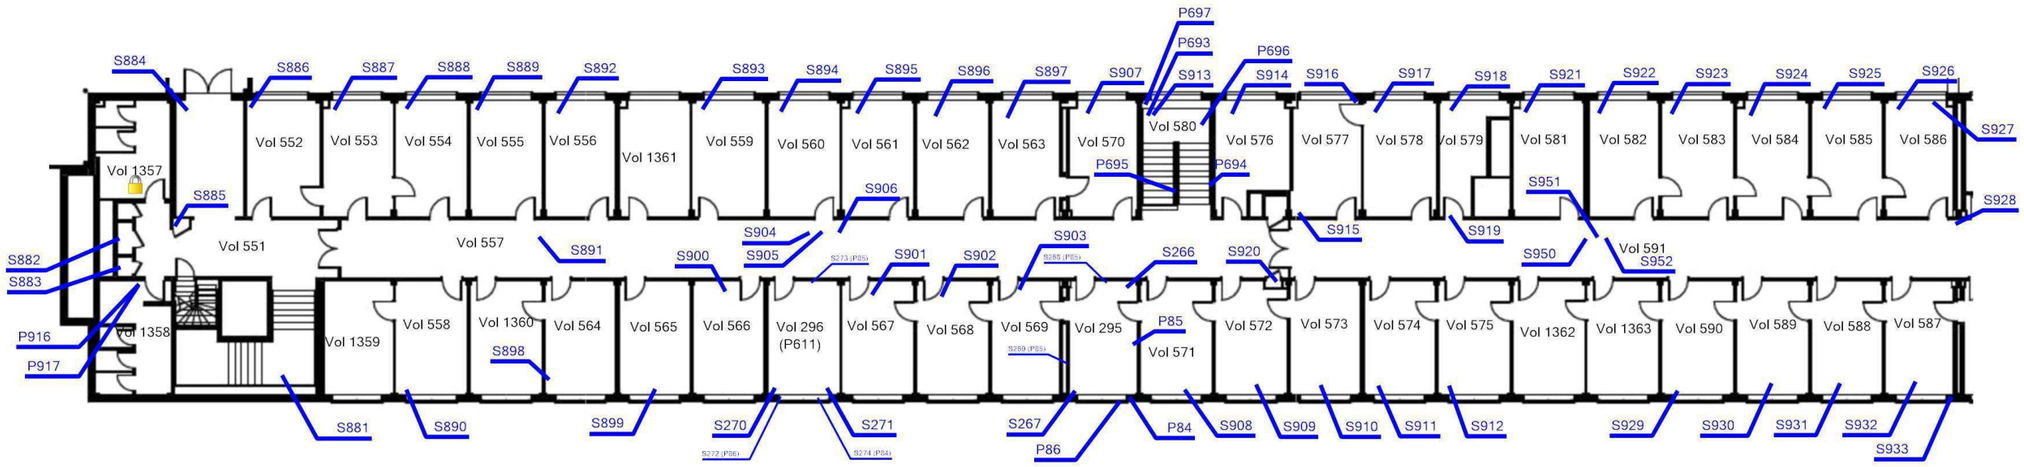

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

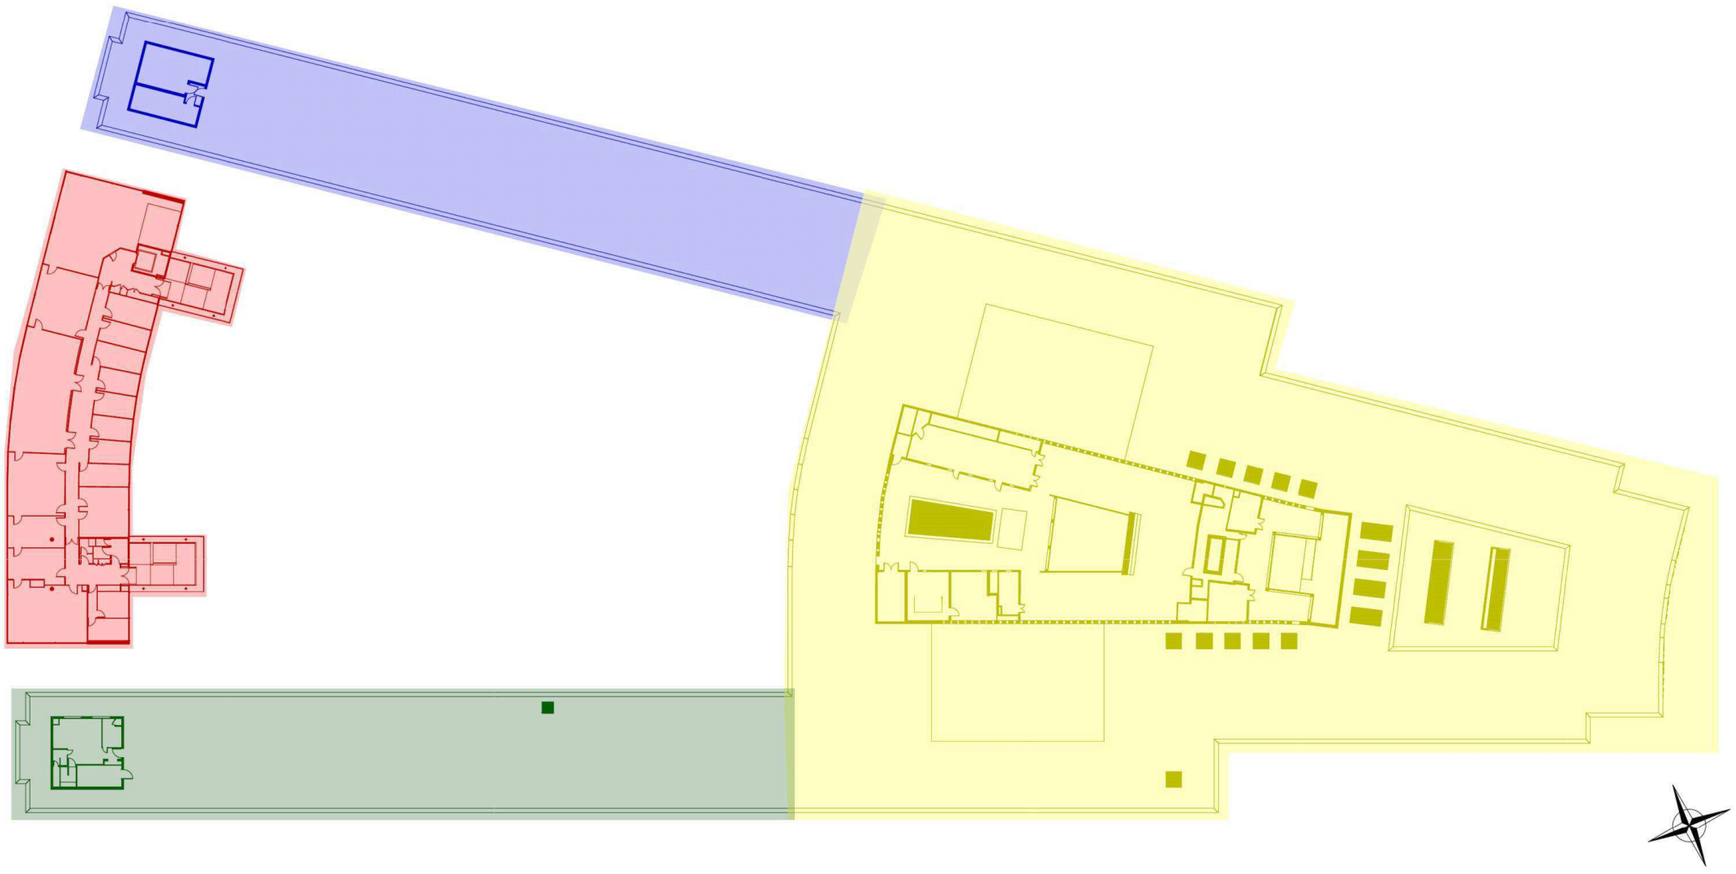


Légende	
	Aile A
	Aile B
	Aile C D
	Aile P

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN R+7 - AILE A - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

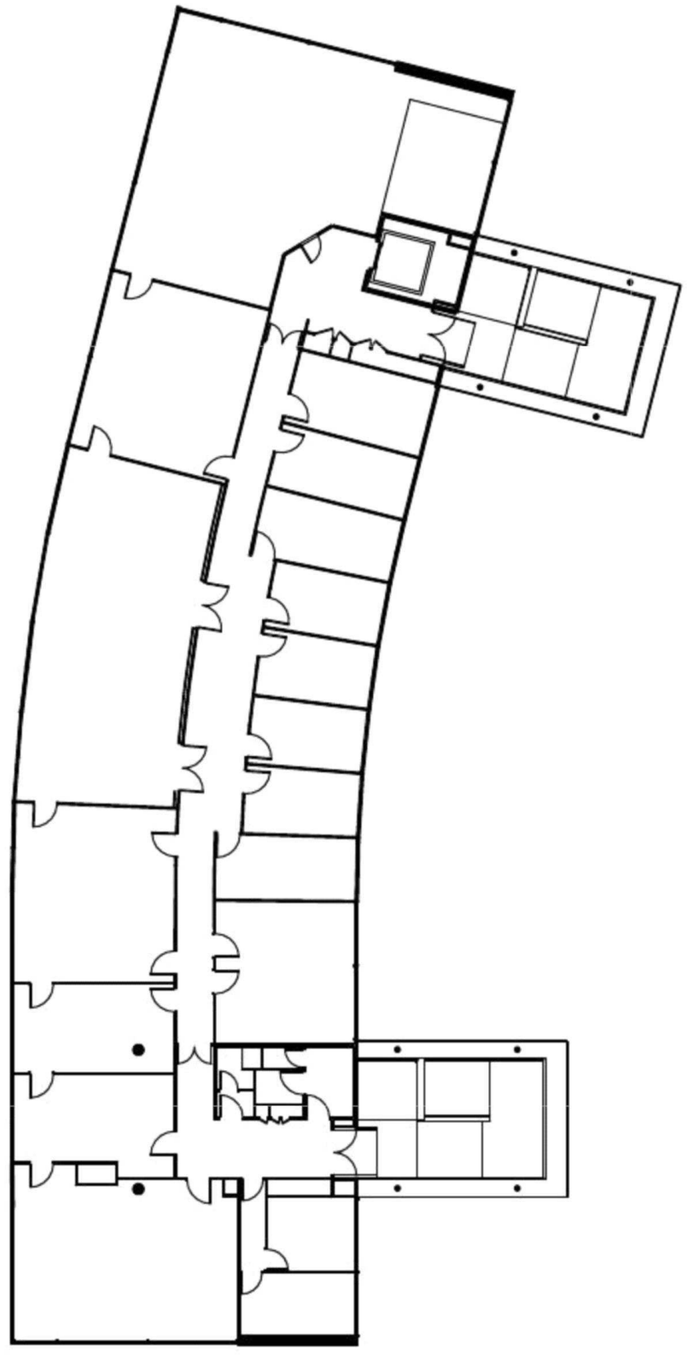

Légende


Plan de situation

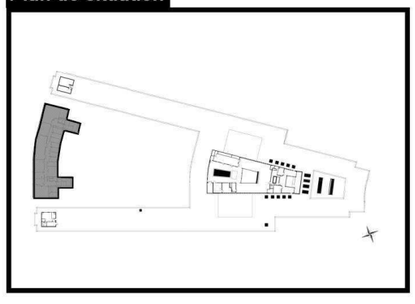


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+7 - AILE B - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

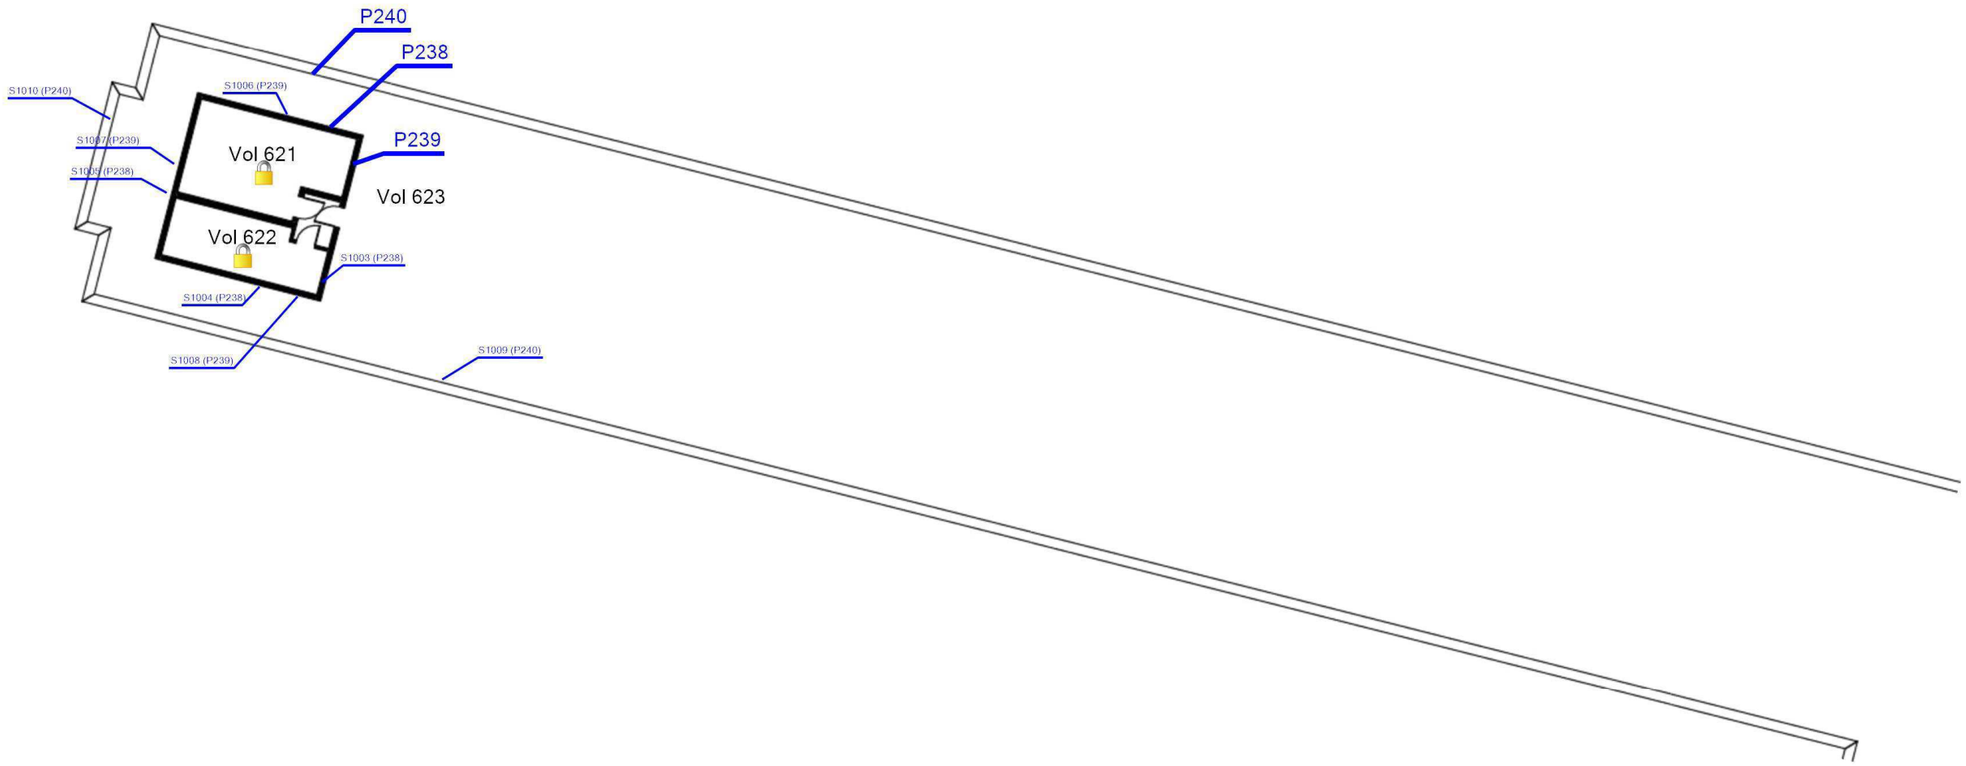

Plan de situation

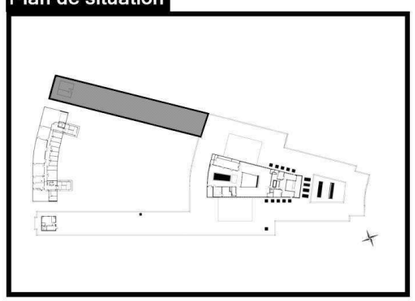

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (validité début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PLAN R+7 - AILE C D - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Plan de situation

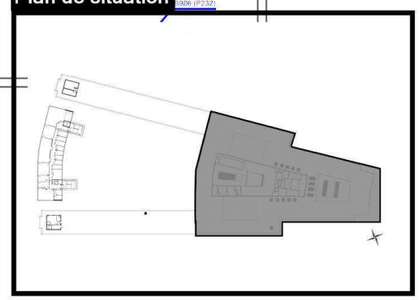

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+7 - AILE P - ACTIONS MENÉES


Référence:
002KN000189-5



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Plan de situation

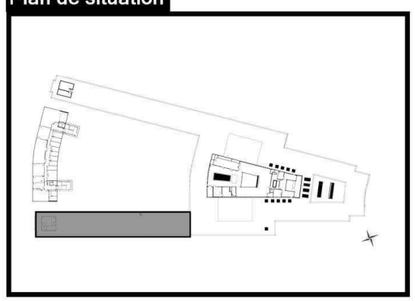


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN R+8 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5


Légende

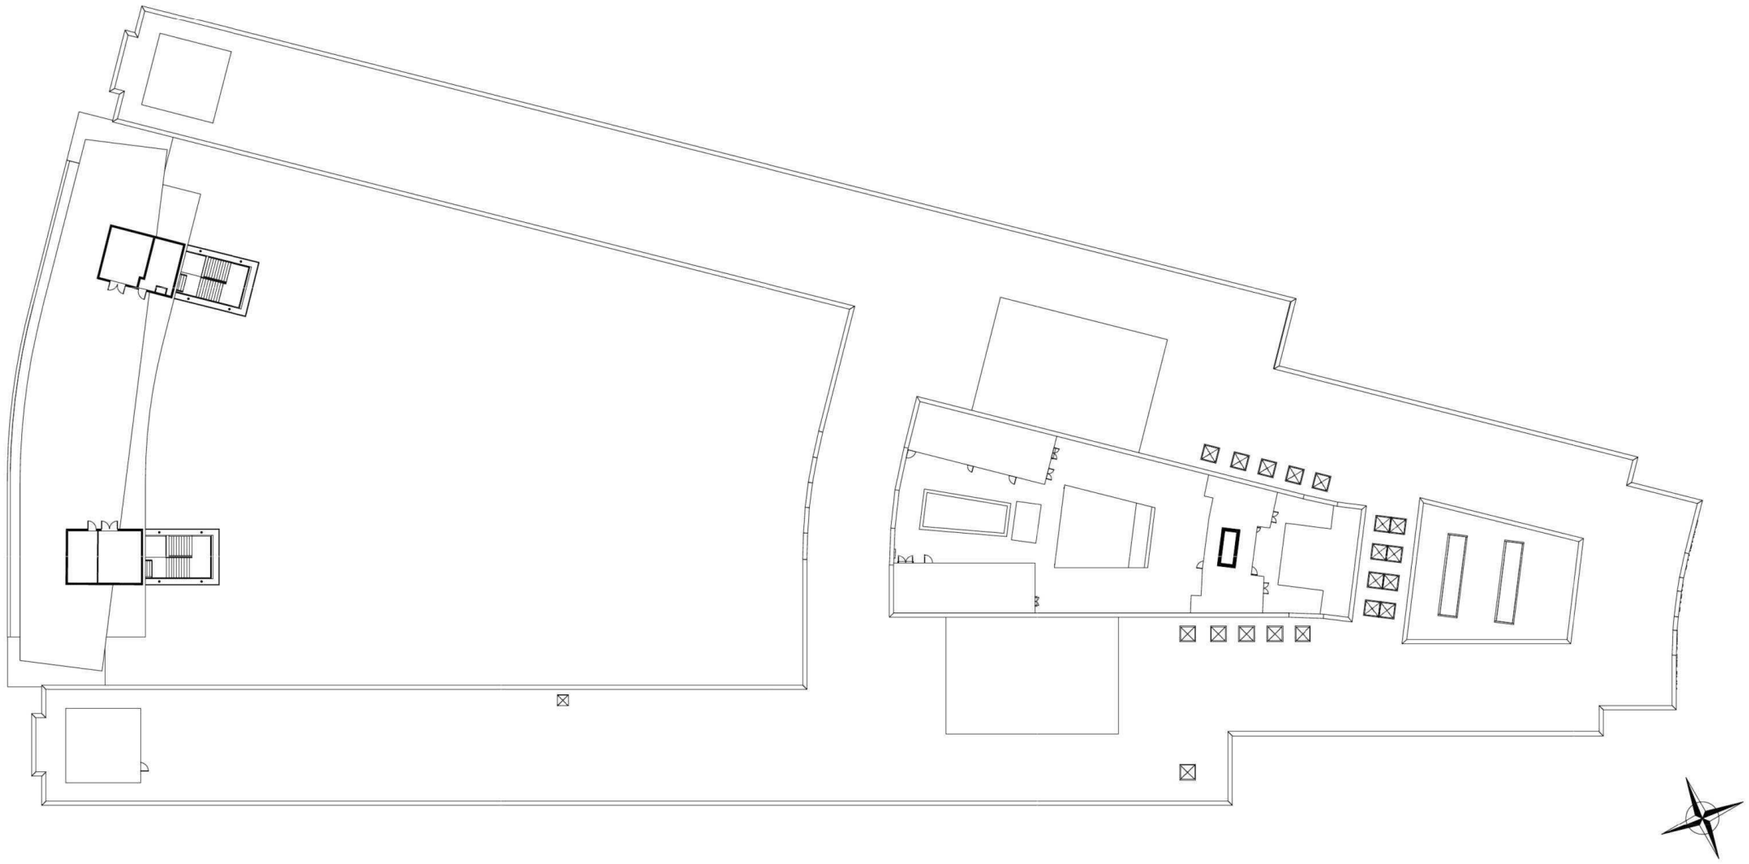

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN FAÇADE INTÉRIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

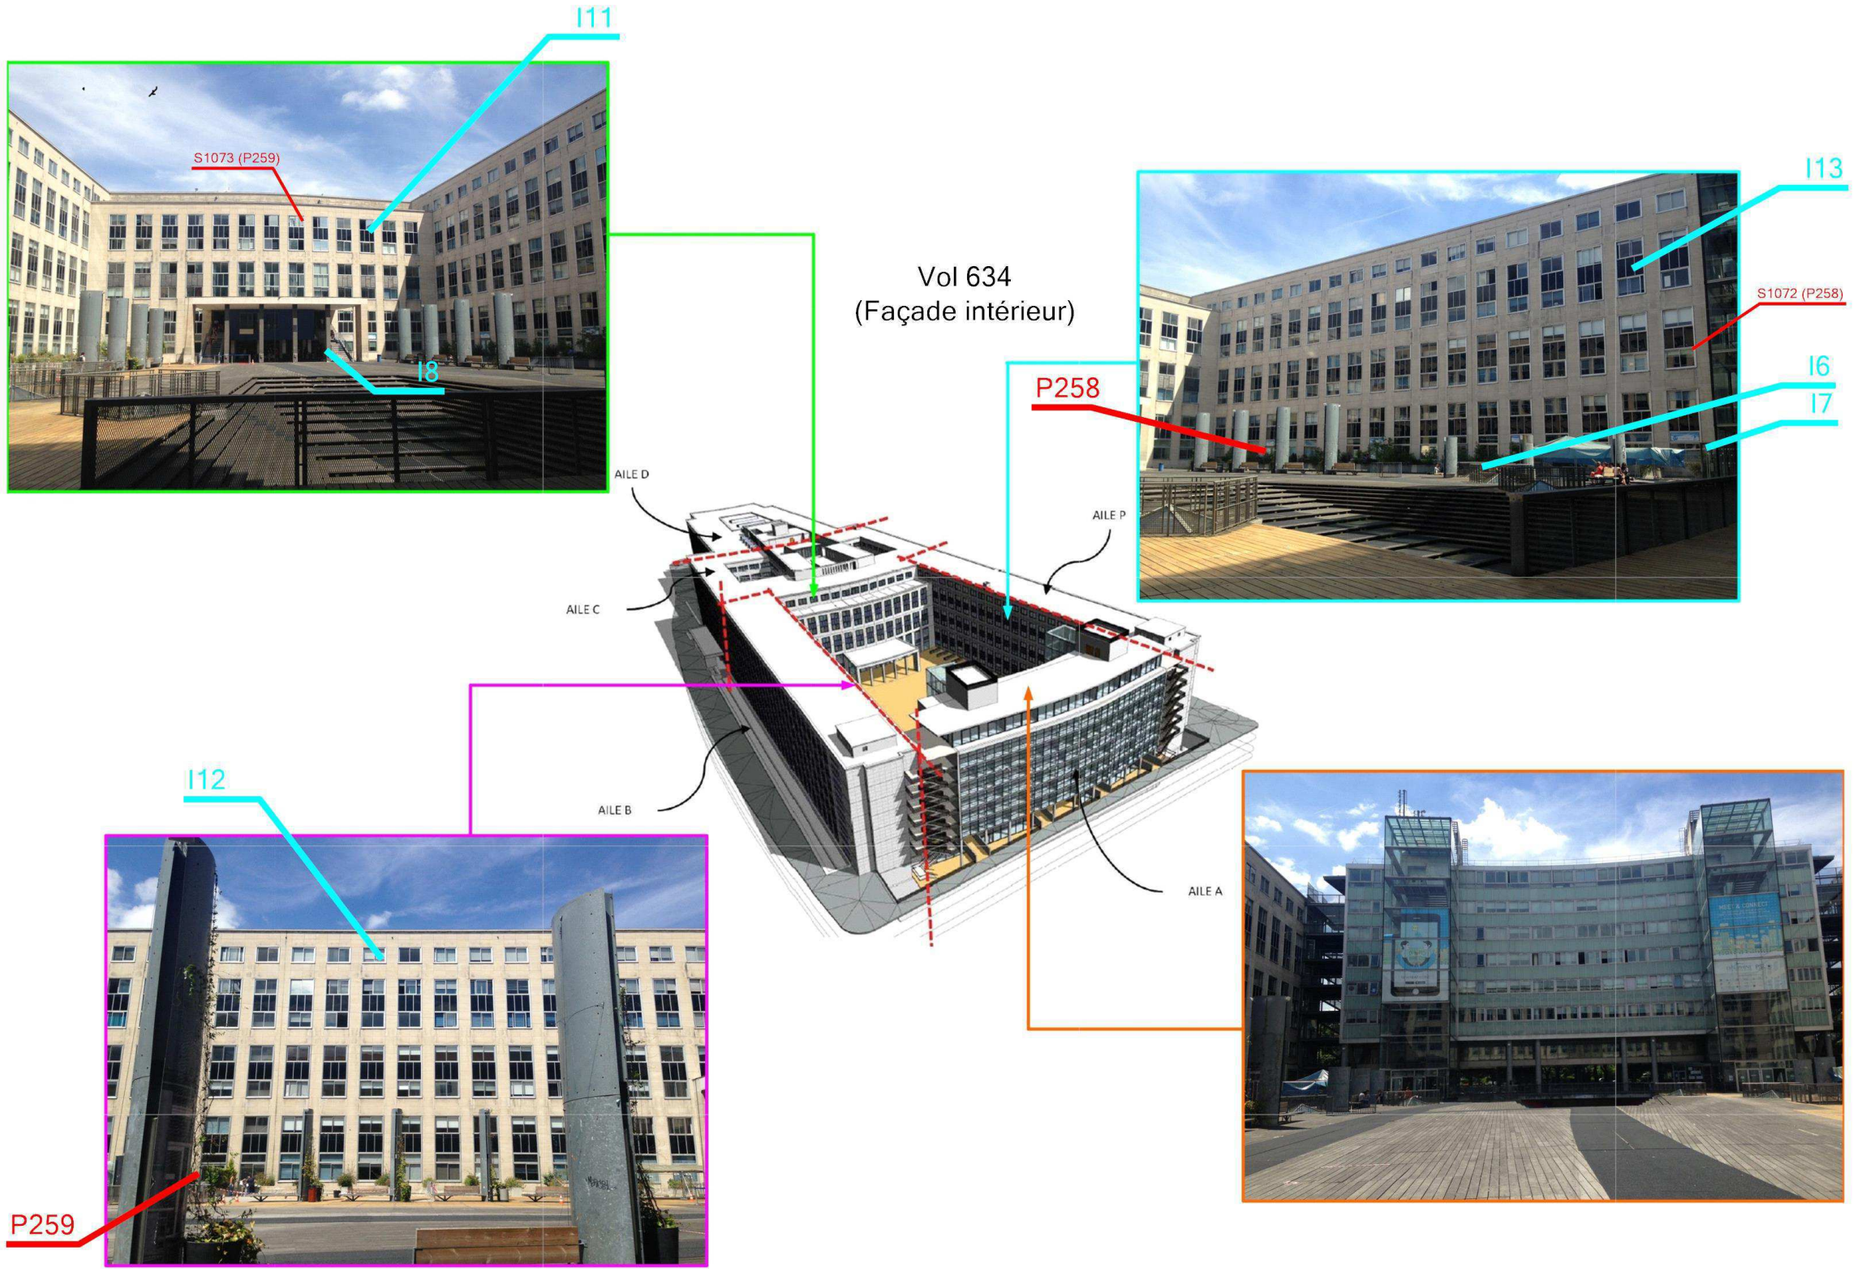


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN FAÇADE INTÉRIEUR - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5

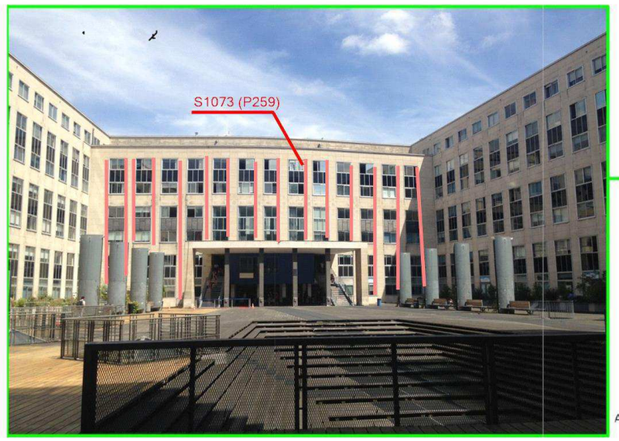


Vol 634
(Façade intérieur)



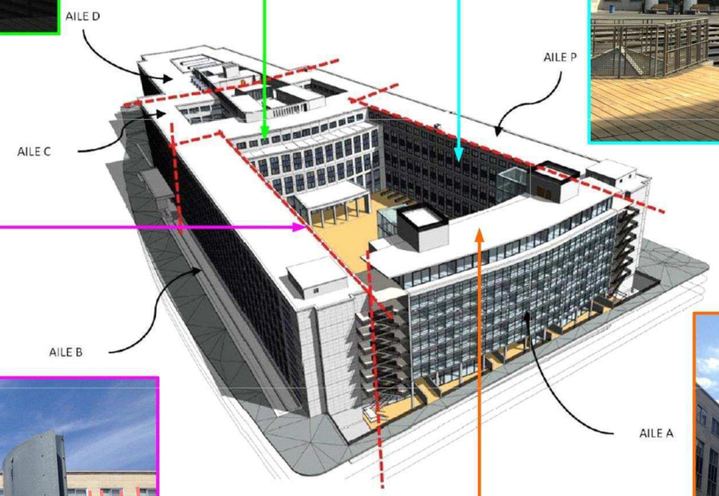

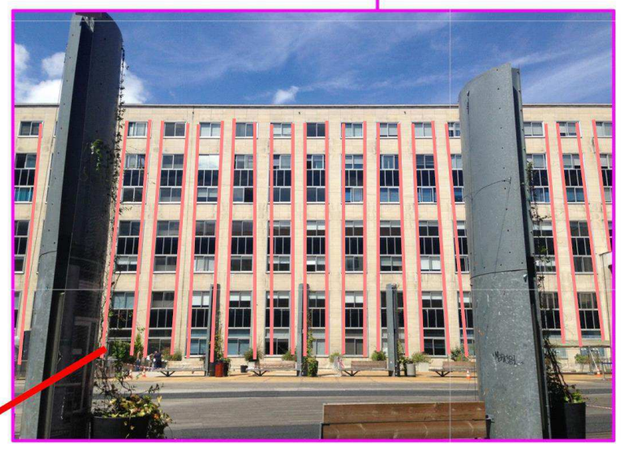

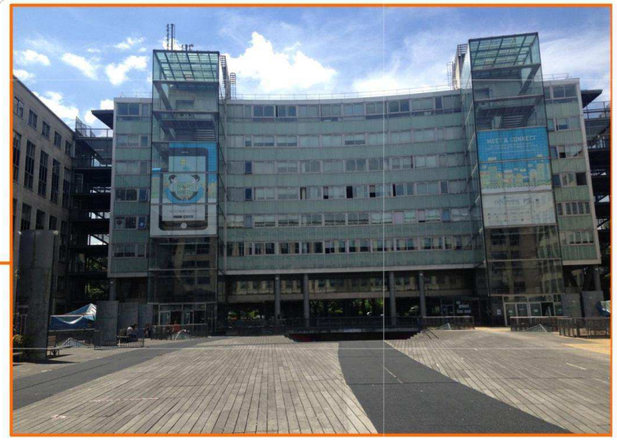


Légende

	P258 : Mastic vitrier
	P259 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN FAÇADE INTÉRIEUR - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002KN000189-5

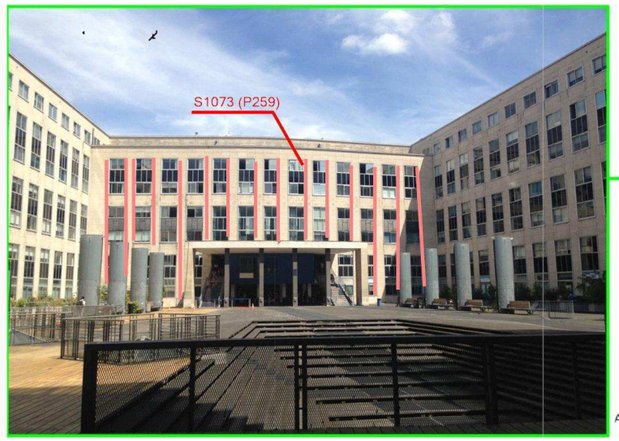


Vol 634
(Façade intérieur)



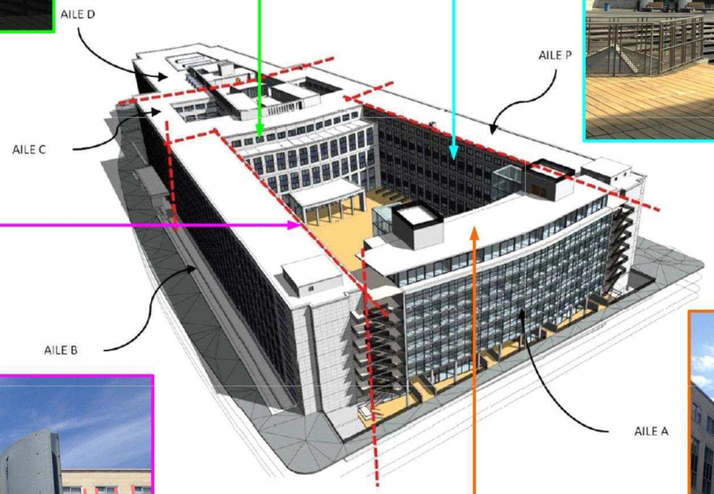

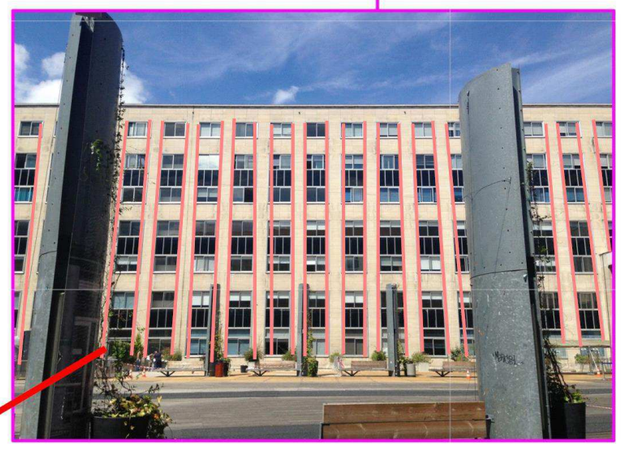

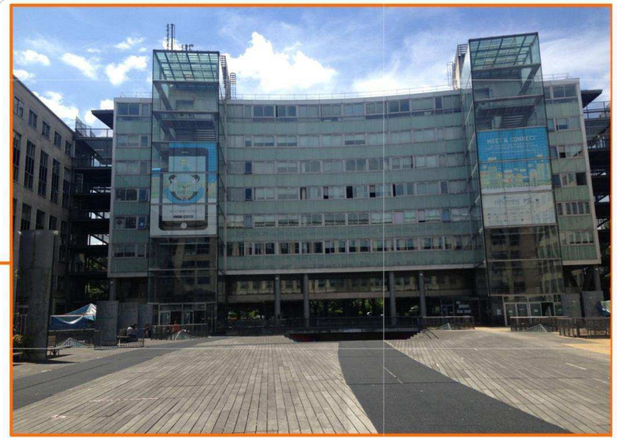

Légende

	P258 : Mastic vitrier
	P259 : Mastic vitrier


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN FAÇADE EXTÉRIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5



Vol 633
(Façade extérieur)

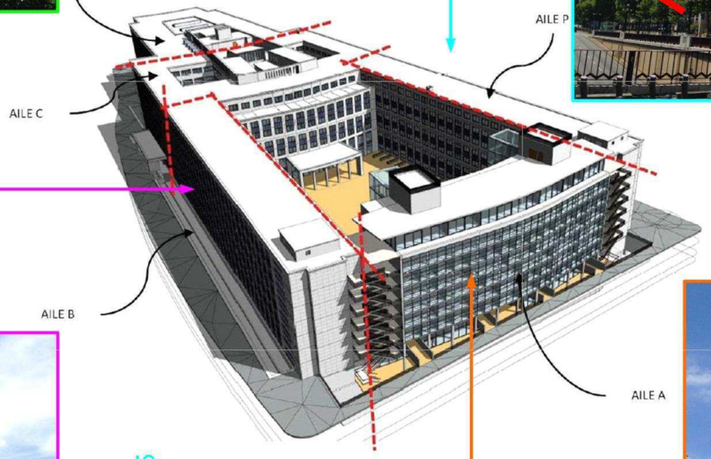


P260




I10

S1074

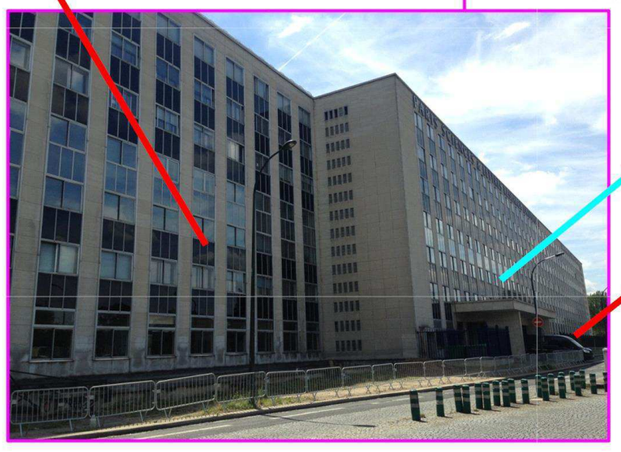

I9

P261

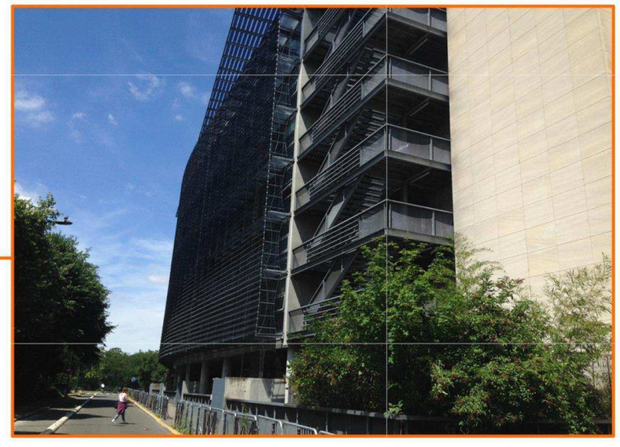

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage positif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN FAÇADE EXTÉRIEUR - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002KN000189-5




Vol 633
(Façade extérieur)

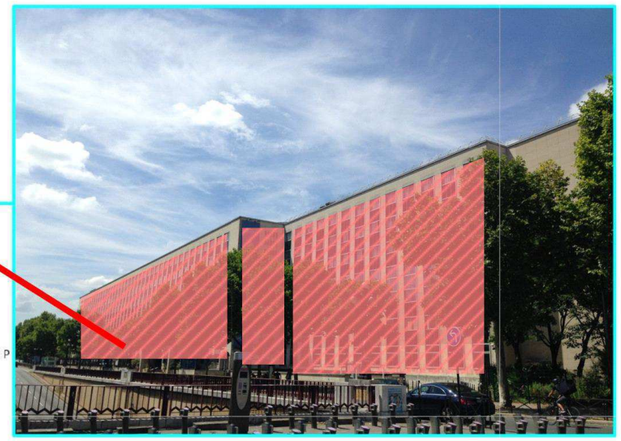

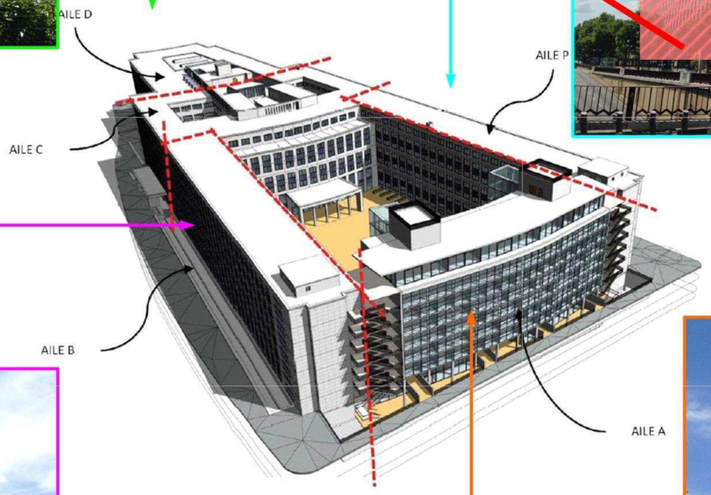

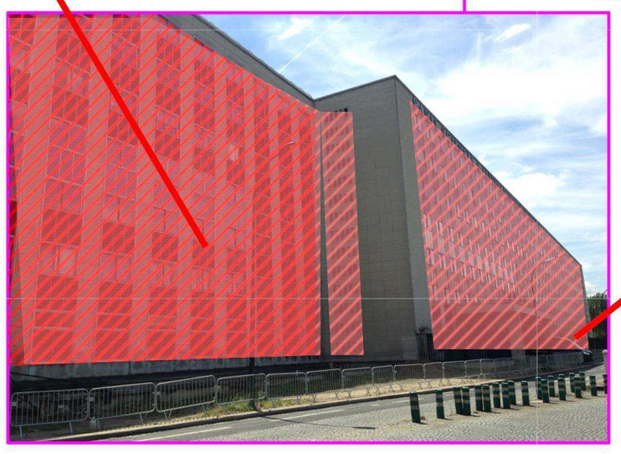

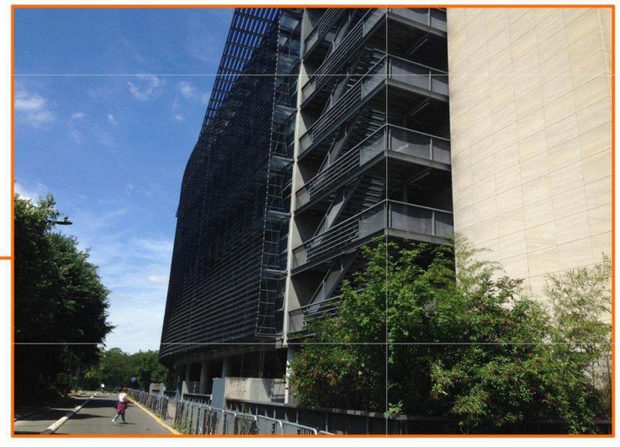

Légende

	P260 : Mastic vitrier
	P261 : Mastic vitrier
	S1074: Joint vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM


PLAN FAÇADE EXTÉRIEUR - MPCA FAÇADES

Référence:
002KN000189-5




Vol 633
(Façade extérieur)



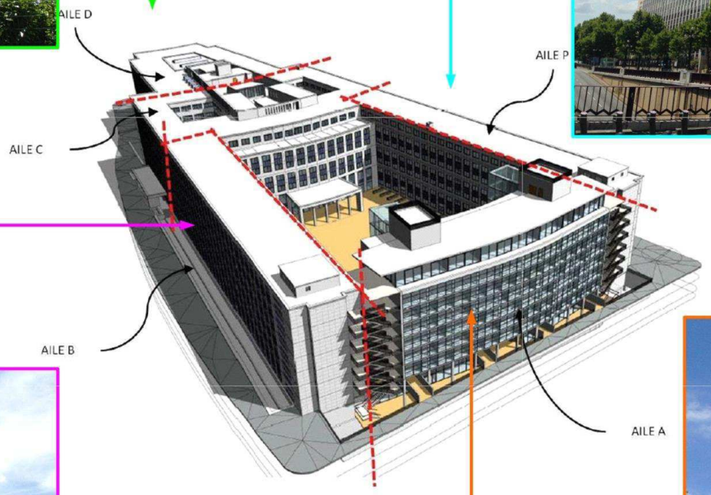

S1074

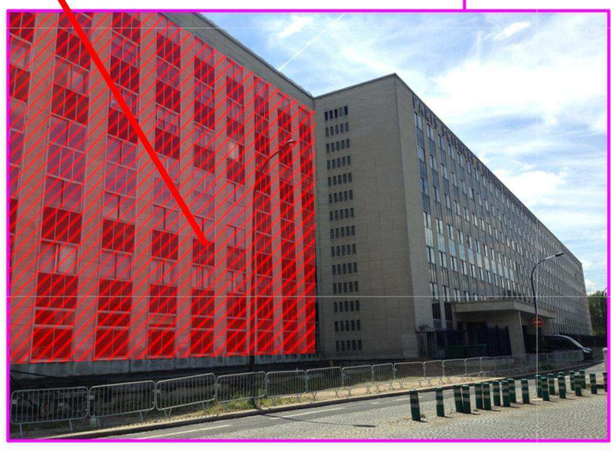



Légende

	S1074: Joint vitrier


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN FAÇADE EXTÉRIEUR - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002KN000189-5




Vol 633
(Façade extérieur)

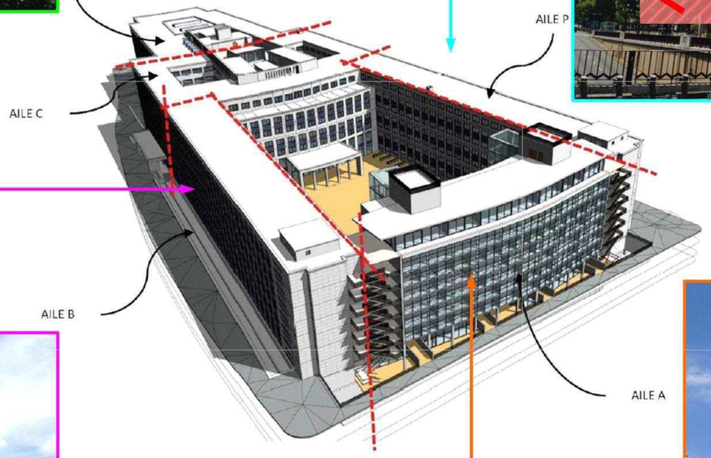


P260

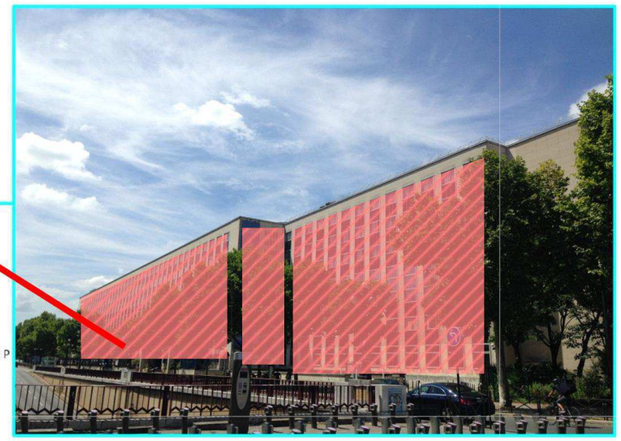

P261

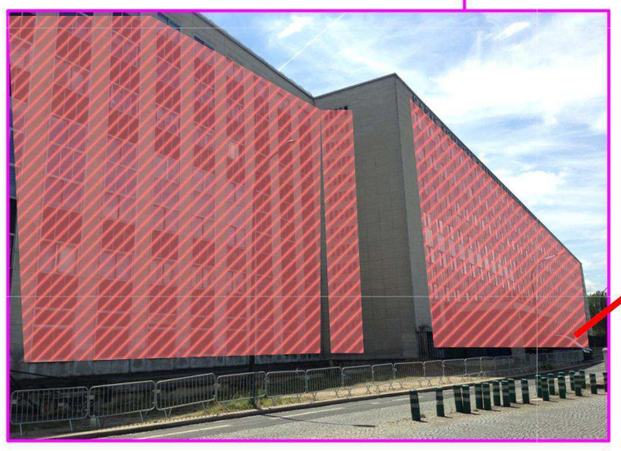

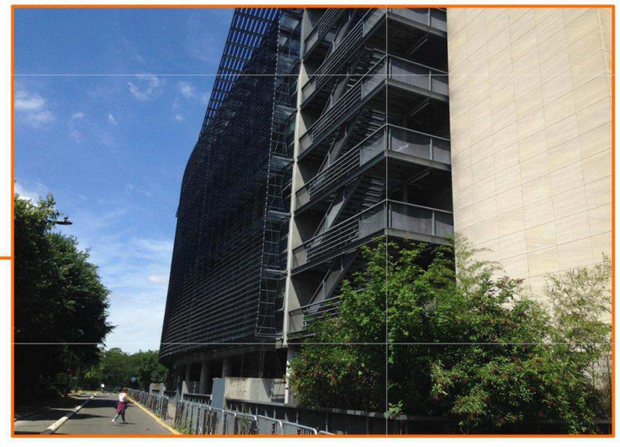


Légende

	P260 : Mastic vitrier
	P261 : Mastic vitrier

AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

PLAN SOUS SOL -3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

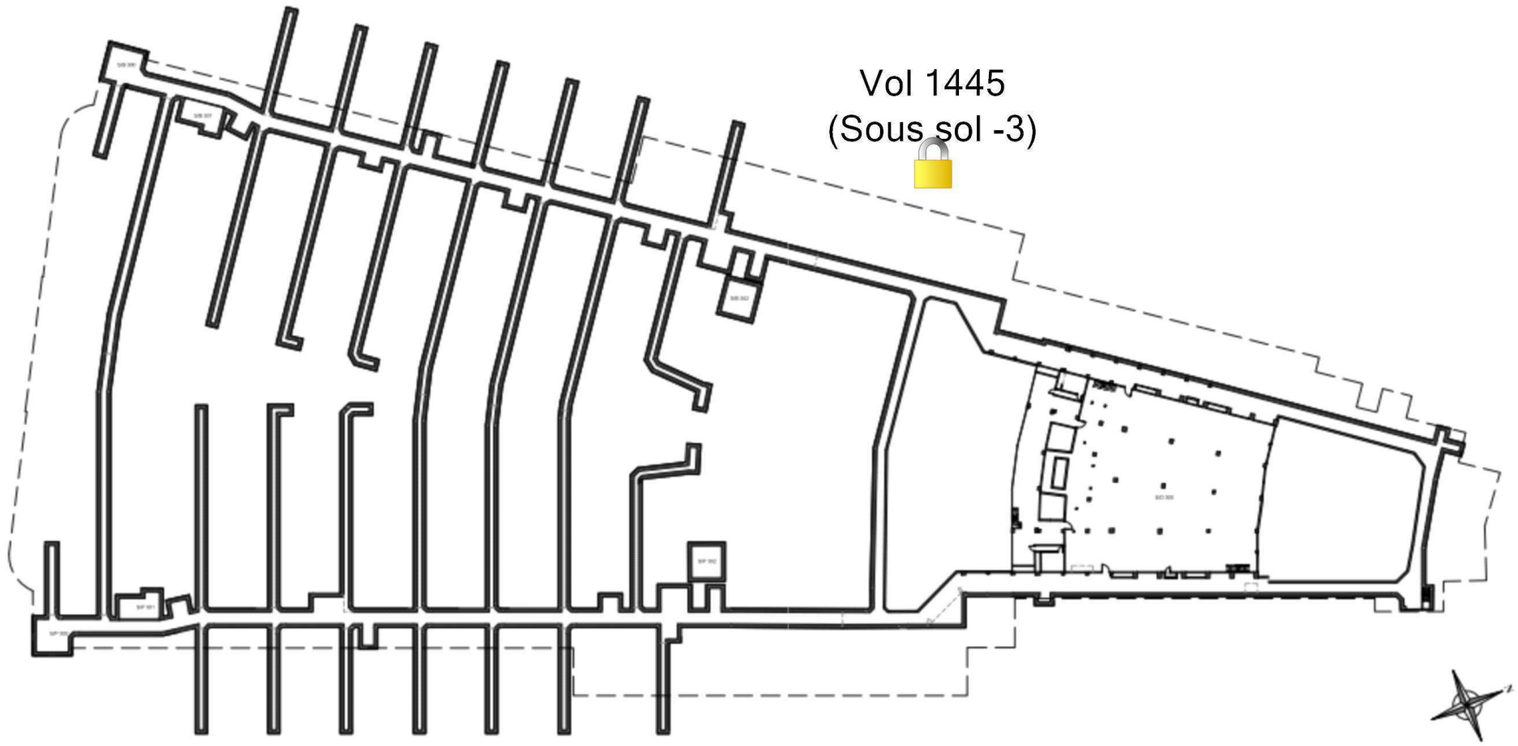


Légende	
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

LOCAL FIOUL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002KN000189-5

Vol 1463
(Local fioul)

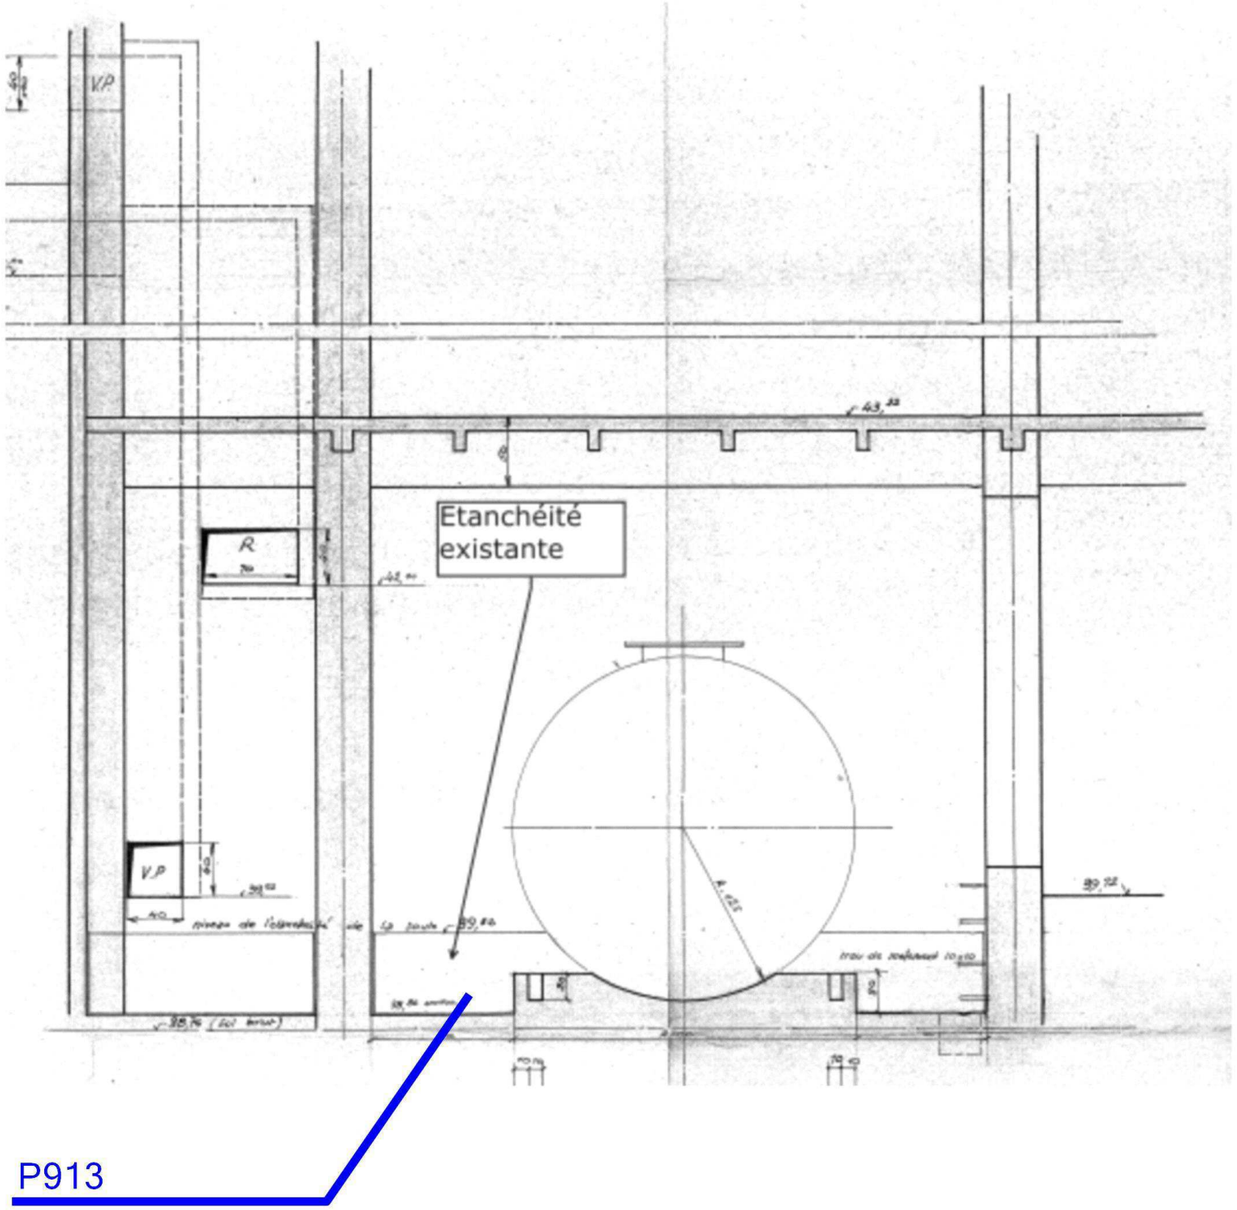

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS	Université Paris-Dauphine - Réhabilitation	09/12/2019	CHAMLAL NAIM

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002KN000189-5 n°913 - 1 (P913)	Local fioul - Vol 1463 (Local fioul)	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°260 - 1 (P260)	Plan façade extérieur - Vol 633 (Façade extérieur)	Prélevement positif
002KN000189-1 n°260 - 2 (P260)	Plan façade extérieur - Vol 633 (Façade extérieur)	Prélevement positif
002KN000189-1 n°261 - 1 (P261)	Plan façade extérieur - Vol 633 (Façade extérieur)	Prélevement positif
002KN000189-1 n°261 - 2 (P261)	Plan façade extérieur - Vol 633 (Façade extérieur)	Prélevement positif
002KN000189-1 n°258 - 1 (P258)	Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur)	Prélevement positif
002KN000189-1 n°259 - 1 (P259)	Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur)	Prélevement positif
	Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur)	I6
	Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur)	I7
	Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur)	I8
002KN000189 n°55 - 1 (P55)	Plan R+1 - Vol 276 (P115)	Prélevement négatif
002KN000189 n°56 - 1 (P56)	Plan R+1 - Vol 276 (P115)	Prélevement négatif
002KN000189 n°57 - 1 (P57)	Plan R+1 - Vol 276 (P115)	Prélevement négatif
002KN000189 n°58 - 1 (P58)	Plan R+1 - Vol 276 (P115)	Prélevement négatif
002KN000189 n°94 - 1 (P94)	Plan R+1 - Vol 321 (B105)	Prélevement négatif
002KN000189 n°95 - 1 (P95)	Plan R+1 - Vol 321 (B105)	Prélevement négatif
002KN000189 n°96 - 1 (P96)	Plan R+1 - Vol 321 (B105)	Prélevement négatif
002KN000189 n°97 - 1 (P97)	Plan R+1 - Vol 321 (B105)	Prélevement négatif
002KN000189 n°98 - 1 (P98)	Plan R+1 - Vol 321 (B105)	Prélevement négatif
002KN000189 n°163 - 1 (P163)	Plan R+1 - Vol 342 (P171)	Prélevement négatif
002KN000189 n°164 - 1 (P164)	Plan R+1 - Vol 342 (P171)	Prélevement négatif
002KN000189 n°165 - 1 (P165)	Plan R+1 - Vol 342 (P171)	Prélevement négatif
002KN000189 n°166 - 1 (P166)	Plan R+1 - Vol 342 (P171)	Prélevement négatif
002KN000189 n°167 - 1 (P167)	Plan R+1 - Vol 343 (D111)	Prélevement négatif
002KN000189 n°168 - 1 (P168)	Plan R+1 - Vol 343 (D111)	Prélevement négatif

002KN000189 n°169 - 1 (P169)	Plan R+1 - Vol 343 (D111)	Prélevement négatif
002KN000189 n°170 - 1 (P170)	Plan R+1 - Vol 343 (D111)	Prélevement négatif
002KN000189 n°171 - 1 (P171)	Plan R+1 - Vol 344 (D110)	Prélevement négatif
002KN000189 n°172 - 1 (P172)	Plan R+1 - Vol 344 (D110)	Prélevement négatif
002KN000189 n°173 - 1 (P173)	Plan R+1 - Vol 344 (D110)	Prélevement négatif
002KN000189 n°174 - 1 (P174)	Plan R+1 - Vol 344 (D110)	Prélevement négatif
002KN000189 n°215 - 1 (P215)	Plan R+1 - Vol 378	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°246 - 1 (P246)	Plan R+1 - Vol 626	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°427 - 1 (P427)	Plan R+1 - Vol 799	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°428 - 1 (P428)	Plan R+1 - Vol 799	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°429 - 1 (P429)	Plan R+1 - Vol 799	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°430 - 1 (P430)	Plan R+1 - Vol 821	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°431 - 1 (P431)	Plan R+1 - Vol 776	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°432 - 1 (P432)	Plan R+1 - Vol 758	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°433 - 1 (P433)	Plan R+1 - Vol 758	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°434 - 1 (P434)	Plan R+1 - Vol 786	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°435 - 1 (P435)	Plan R+1 - Vol 760	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°436 - 1 (P436)	Plan R+1 - Vol 784	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°437 - 1 (P437)	Plan R+1 - Vol 776	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°438 - 1 (P438)	Plan R+1 - Vol 429	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°439 - 1 (P439)	Plan R+1 - Vol 429	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°440 - 1 (P440)	Plan R+1 - Vol 429	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°441 - 1 (P441)	Plan R+1 - Vol 823	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°442 - 1 (P442)	Plan R+1 - Vol 823	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°443 - 1 (P443)	Plan R+1 - Vol 813	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°444 - 1 (P444)	Plan R+1 - Vol 837	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°445 - 1 (P445)	Plan R+1 - Vol 822	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°446 - 1 (P446)	Plan R+1 - Vol 751	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°447 - 1 (P447)	Plan R+1 - Vol 752	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°489 - 1 (P489)	Plan R+1 - Vol 724 (B102)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°490 - 1 (P490)	Plan R+1 - Vol 725	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°491 - 1 (P491)	Plan R+1 - Vol 728 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°492 - 1 (P492)	Plan R+1 - Vol 730	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°493 - 1 (P493)	Plan R+1 - Vol 732	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°494 - 1 (P494)	Plan R+1 - Vol 735	Prélevement positif
002KN000189-3 n°495 - 2 (P495)	Plan R+1 - Vol 733	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°495 - 1 (P495)	Plan R+1 - Vol 733	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°496 - 1 (P496)	Plan R+1 - Vol 781 (B114)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°496 - 2 (P496)	Plan R+1 - Vol 781 (B114)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°497 - 2 (P497)	Plan R+1 - Vol 780 (B112)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°497 - 1 (P497)	Plan R+1 - Vol 780 (B112)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°498 - 2 (P498)	Plan R+1 - Vol 736	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°498 - 1 (P498)	Plan R+1 - Vol 736	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°499 - 2 (P499)	Plan R+1 - Vol 734	Prélevement négatif

002KN000189-3 n°499 - 1 (P499)	Plan R+1 - Vol 734	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°500 - 2 (P500)	Plan R+1 - Vol 783	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°500 - 1 (P500)	Plan R+1 - Vol 783	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°501 - 1 (P501)	Plan R+1 - Vol 788	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°763 - 1 (P763)	Plan R+1 - Vol 728 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°813 - 1 (P813)	Plan R+1 - Vol 1411	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°814 - 1 (P814)	Plan R+1 - Vol 1411	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°815 - 1 (P815)	Plan R+1 - Vol 1411	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°816 - 1 (P816)	Plan R+1 - Vol 1410	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°817 - 1 (P817)	Plan R+1 - Vol 1410	Prélevement positif
002KN000189-5 n°818 - 1 (P818)	Plan R+1 - Vol 1410	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°819 - 1 (P819)	Plan R+1 - Vol 1412	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°819 - 2 (P819)	Plan R+1 - Vol 1412	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°820 - 1 (P820)	Plan R+1 - Vol 1413 (P142)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°821 - 1 (P821)	Plan R+1 - Vol 1415	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°841 - 2 (P841)	Plan R+1 - Vol 792 (102)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°841 - 1 (P841)	Plan R+1 - Vol 792 (102)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°842 - 1 (P842)	Plan R+1 - Vol 739	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°843 - 1 (P843)	Plan R+1 - Vol 739	Prélevement négatif
	Plan R+1 - Vol 813	I17
S227 - 1 (S227)	Plan R+1 - Vol 276 (P115)	
S278 - 2 (S278)	Plan R+1 - Vol 298 (P104)	Présence sur présentation de documents
S279 - 2 (S279)	Plan R+1 - Vol 298 (P104)	Présence sur présentation de documents
S301 - 1 (S301)	Plan R+1 - Vol 321 (B105)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S302 - 1 (S302)	Plan R+1 - Vol 321 (B105)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S303 - 1 (S303)	Plan R+1 - Vol 321 (B105)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S304 - 1 (S304)	Plan R+1 - Vol 321 (B105)	Absence : pas d'amiante par nature
S382 - 1 (S382)	Plan R+1 - Vol 342 (P171)	
S386 - 1 (S386)	Plan R+1 - Vol 342 (P171)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S387 - 2 (S387)	Plan R+1 - Vol 342 (P171)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S388 - 1 (S388)	Plan R+1 - Vol 343 (D111)	
S390 - 1 (S390)	Plan R+1 - Vol 343 (D111)	Absence sur présentation de documents
S393 - 1 (S393)	Plan R+1 - Vol 344 (D110)	Absence sur marquage du materiau
S567 - 2 (S567)	Plan R+1 - Vol 312 (P121)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S568)	Plan R+1 - Vol 312 (P121)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S569)	Plan R+1 - Vol 315	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002KN000189 n°223 - 1 (S570)	Plan R+1 - Vol 315	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S571)	Plan R+1 - Vol 319	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S572)	Plan R+1 - Vol 319	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S573)	Plan R+1 - Vol 391 (P136)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S574)	Plan R+1 - Vol 391 (P136)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S575)	Plan R+1 - Vol 392 (P143)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S576)	Plan R+1 - Vol 392 (P143)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S577)	Plan R+1 - Vol 393	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S578)	Plan R+1 - Vol 393	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S579)	Plan R+1 - Vol 394 (P147)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S580)	Plan R+1 - Vol 394 (P147)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S581)	Plan R+1 - Vol 394 (P147)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S582)	Plan R+1 - Vol 394 (P147)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S583)	Plan R+1 - Vol 395	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S584)	Plan R+1 - Vol 395	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S585)	Plan R+1 - Vol 396	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S586)	Plan R+1 - Vol 396	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S1281 - 1 (S1281)	Plan R+1 - Vol 787	Absence sur présentation de documents
002KN000189-3 n°444 - 1 (S1291)	Plan R+1 - Vol 825	
S1292 - 1 (S1292)	Plan R+1 - Vol 822	Absence sur marquage du materiau
002KN000189-3 n°446 - 1 (S1293)	Plan R+1 - Vol 826	
002KN000189-3 n°446 - 1 (S1294)	Plan R+1 - Vol 827	
S1297 - 1 (S1297)	Plan R+1 - Vol 727 (B102TER)	Absence sur présentation de documents
S1365 - 1 (S1365)	Plan R+1 - Vol 729	Présence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°918 - 1 (S2088)	Plan R+1 - Vol 1473 (G.t condamnée 3)	Présence sur marquage du matériau
002KN000189 n°59 - 1 (P59)	Plan R+2 - Vol 286 (P209)	Prélevement négatif
002KN000189 n°60 - 1 (P60)	Plan R+2 - Vol 286 (P209)	Prélevement négatif
002KN000189 n°61 - 1 (P61)	Plan R+2 - Vol 286 (P209)	Prélevement négatif
002KN000189 n°62 - 1 (P62)	Plan R+2 - Vol 286 (P209)	Prélevement négatif
002KN000189 n°63 - 1 (P63)	Plan R+2 - Vol 286 (P209)	Prélevement négatif
002KN000189 n°64 - 1 (P64)	Plan R+2 - Vol 287	Prélevement négatif
002KN000189 n°65 - 1 (P65)	Plan R+2 - Vol 287	Prélevement négatif

002KN000189 n°66 - 1 (P66)	Plan R+2 - Vol 287	Prélevement négatif
002KN000189 n°99 - 1 (P99)	Plan R+2 - Vol 322 (B212)	Prélevement négatif
002KN000189 n°100 - 1 (P100)	Plan R+2 - Vol 322 (B212)	Prélevement négatif
002KN000189 n°101 - 1 (P101)	Plan R+2 - Vol 322 (B212)	Prélevement négatif
002KN000189 n°102 - 1 (P102)	Plan R+2 - Vol 322 (B212)	Prélevement négatif
002KN000189 n°103 - 1 (P103)	Plan R+2 - Vol 324 (B223)	Prélevement négatif
002KN000189 n°104 - 1 (P104)	Plan R+2 - Vol 324 (B223)	Prélevement négatif
002KN000189 n°105 - 1 (P105)	Plan R+2 - Vol 324 (B223)	Prélevement négatif
002KN000189 n°106 - 1 (P106)	Plan R+2 - Vol 324 (B223)	Prélevement négatif
002KN000189 n°183 - 1 (P183)	Plan R+2 - Vol 349 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189 n°184 - 1 (P184)	Plan R+2 - Vol 349 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189 n°206 - 1 (P206)	Plan R+2 - Vol 376	Prélevement négatif
002KN000189 n°207 - 1 (P207)	Plan R+2 - Vol 374	Prélevement négatif
002KN000189 n°208 - 1 (P208)	Plan R+2 - Vol 375	Prélevement négatif
002KN000189 n°209 - 1 (P209)	Plan R+2 - Vol 376	Prélevement négatif
002KN000189 n°210 - 1 (P210)	Plan R+2 - Vol 376	Prélevement négatif
002KN000189 n°211 - 1 (P211)	Plan R+2 - Vol 375	Prélevement négatif
002KN000189 n°213 - 1 (P213)	Plan R+2 - Vol 375	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°448 - 1 (P448)	Plan R+2 - Vol 842	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°449 - 1 (P449)	Plan R+2 - Vol 843	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°450 - 1 (P450)	Plan R+2 - Vol 855	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°451 - 1 (P451)	Plan R+2 - Vol 855	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°452 - 1 (P452)	Plan R+2 - Vol 855	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°453 - 1 (P453)	Plan R+2 - Vol 855	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°454 - 1 (P454)	Plan R+2 - Vol 847	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°455 - 1 (P455)	Plan R+2 - Vol 845	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°456 - 1 (P456)	Plan R+2 - Vol 845	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°457 - 1 (P457)	Plan R+2 - Vol 845	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°458 - 1 (P458)	Plan R+2 - Vol 848	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°459 - 1 (P459)	Plan R+2 - Vol 848	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°460 - 1 (P460)	Plan R+2 - Vol 848	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°461 - 1 (P461)	Plan R+2 - Vol 848	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°462 - 1 (P462)	Plan R+2 - Vol 847	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°463 - 1 (P463)	Plan R+2 - Vol 847	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°464 - 1 (P464)	Plan R+2 - Vol 847	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°465 - 1 (P465)	Plan R+2 - Vol 847	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°466 - 1 (P466)	Plan R+2 - Vol 625	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°467 - 1 (P467)	Plan R+2 - Vol 625	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°468 - 1 (P468)	Plan R+2 - Vol 859	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°469 - 1 (P469)	Plan R+2 - Vol 859	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°470 - 1 (P470)	Plan R+2 - Vol 862	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°471 - 1 (P471)	Plan R+2 - Vol 863	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°472 - 1 (P472)	Plan R+2 - Vol 864	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°473 - 1 (P473)	Plan R+2 - Vol 886	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°474 - 1 (P474)	Plan R+2 - Vol 886	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°475 - 1 (P475)	Plan R+2 - Vol 881	Prélevement négatif

002KN000189-3 n°476 - 1 (P476)	Plan R+2 - Vol 876	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°477 - 1 (P477)	Plan R+2 - Vol 876	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°478 - 1 (P478)	Plan R+2 - Vol 876	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°479 - 1 (P479)	Plan R+2 - Vol 908	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°480 - 1 (P480)	Plan R+2 - Vol 893	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°481 - 1 (P481)	Plan R+2 - Vol 893	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°482 - 1 (P482)	Plan R+2 - Vol 891	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°483 - 1 (P483)	Plan R+2 - Vol 915 (B211)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°484 - 1 (P484)	Plan R+2 - Vol 917	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°485 - 1 (P485)	Plan R+2 - Vol 918	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°486 - 1 (P486)	Plan R+2 - Vol 922	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°510 - 1 (P510)	Plan R+2 - Vol 895	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°511 - 1 (P511)	Plan R+2 - Vol 899	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°512 - 1 (P512)	Plan R+2 - Vol 912	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°513 - 1 (P513)	Plan R+2 - Vol 1369	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°514 - 1 (P514)	Plan R+2 - Vol 1371	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°515 - 1 (P515)	Plan R+2 - Vol 1365	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°516 - 1 (P516)	Plan R+2 - Vol 1364	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°517 - 1 (P517)	Plan R+2 - Vol 913 (Bureaux 16)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°518 - 1 (P518)	Plan R+2 - Vol 920 (B204)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°519 - 1 (P519)	Plan R+2 - Vol 923 (B201)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°520 - 1 (P520)	Plan R+2 - Vol 849	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°521 - 1 (P521)	Plan R+2 - Vol 849	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°522 - 1 (P522)	Plan R+2 - Vol 871	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°523 - 1 (P523)	Plan R+2 - Vol 872	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°524 - 1 (P524)	Plan R+2 - Vol 872	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°525 - 1 (P525)	Plan R+2 - Vol 872	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°526 - 1 (P526)	Plan R+2 - Vol 871	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°527 - 1 (P527)	Plan R+2 - Vol 451	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°528 - 1 (P528)	Plan R+2 - Vol 451	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°529 - 1 (P529)	Plan R+2 - Vol 868	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°554 - 1 (P554)	Plan R+2 - Vol 1373	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°730 - 1 (P730)	Plan R+2 - Vol 1369	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°731 - 1 (P731)	Plan R+2 - Vol 1371	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°732 - 1 (P732)	Plan R+2 - Vol 920 (B204)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°826 - 1 (P826)	Plan R+2 - Vol 1419	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°827 - 1 (P827)	Plan R+2 - Vol 1420	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°829 - 1 (P829)	Plan R+2 - Vol 1421 (THA8)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°836 - 1 (P836)	Plan R+2 - Vol 1425 (C201)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°837 - 1 (P837)	Plan R+2 - Vol 909 (P202)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°838 - 1 (P838)	Plan R+2 - Vol 1427	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°838 - 2 (P838)	Plan R+2 - Vol 1427	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°840 - 1 (P840)	Plan R+2 - Vol 1427	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°849 - 1 (P849)	Plan R+2 - Vol 925 (THB201)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°851 - 1 (P851)	Plan R+2 - Vol 910	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°852 - 1 (P852)	Plan R+2 - Vol 910	Prélevement négatif

S231 - 1 (S231)	Plan R+2 - Vol 286 (P209)	Absence sur marquage du materiau
S234 - 1 (S234)	Plan R+2 - Vol 287	
S305 - 1 (S305)	Plan R+2 - Vol 322 (B212)	Absence : pas d'amiante par nature
S308 - 1 (S308)	Plan R+2 - Vol 324 (B223)	Absence : pas d'amiante par nature
S309 - 1 (S309)	Plan R+2 - Vol 323 (B225)	Absence : pas d'amiante par nature
S310 - 1 (S310)	Plan R+2 - Vol 324 (B223)	Absence : pas d'amiante par nature
S311 - 1 (S311)	Plan R+2 - Vol 323 (B225)	Absence : pas d'amiante par nature
002KN000189 n°107 - 1 (S316)	Plan R+2 - Vol 324 (B223)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S316 - 2 (S316)	Plan R+2 - Vol 324 (B223)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S317 - 2 (S317)	Plan R+2 - Vol 324 (B223)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S318 - 2 (S318)	Plan R+2 - Vol 323 (B225)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°107 - 1 (S318)	Plan R+2 - Vol 323 (B225)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S319 - 2 (S319)	Plan R+2 - Vol 323 (B225)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°107 - 1 (S319)	Plan R+2 - Vol 323 (B225)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S587)	Plan R+2 - Vol 397	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S588)	Plan R+2 - Vol 397	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S589)	Plan R+2 - Vol 397	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 2 (S590)	Plan R+2 - Vol 397	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S590)	Plan R+2 - Vol 397	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S591)	Plan R+2 - Vol 398	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S592)	Plan R+2 - Vol 398	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S593)	Plan R+2 - Vol 399	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 2 (S594)	Plan R+2 - Vol 399	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S594)	Plan R+2 - Vol 399	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S595)	Plan R+2 - Vol 399	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S596)	Plan R+2 - Vol 399	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S597)	Plan R+2 - Vol 400	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S598)	Plan R+2 - Vol 400	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002KN000189 n°223 - 1 (S599)	Plan R+2 - Vol 401	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S600)	Plan R+2 - Vol 401	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S601)	Plan R+2 - Vol 402	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S602)	Plan R+2 - Vol 402	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S603)	Plan R+2 - Vol 403	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S604)	Plan R+2 - Vol 403	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S605)	Plan R+2 - Vol 404	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S606)	Plan R+2 - Vol 404	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S1300 - 1 (S1300)	Plan R+2 - Vol 845	Absence sur présentation de documents
S1327 - 1 (S1327)	Plan R+2 - Vol 861	Absence sur présentation de documents
S1330 - 1 (S1330)	Plan R+2 - Vol 862	Absence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°918 - 1 (S2089)	Plan R+2 - Vol 1474 (G.t condamnée 4)	Présence sur marquage du matériau
002KN000189 n°67 - 1 (P67)	Plan R+3 - Vol 288	Prélevement négatif
002KN000189 n°68 - 1 (P68)	Plan R+3 - Vol 288	Prélevement négatif
002KN000189 n°69 - 1 (P69)	Plan R+3 - Vol 289 (P321)	Prélevement négatif
002KN000189 n°70 - 1 (P70)	Plan R+3 - Vol 289 (P321)	Prélevement négatif
002KN000189 n°107 - 1 (P107)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Prélevement négatif
002KN000189 n°108 - 1 (P108)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Prélevement négatif
002KN000189 n°109 - 1 (P109)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Prélevement négatif
002KN000189 n°205 - 1 (P205)	Plan R+3 - Vol 372	Prélevement négatif
002KN000189 n°222 - 1 (P222)	Plan R+3 - Vol 390	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°245 - 1 (P245)	Plan R+3 - Vol 390	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°502 - 1 (P502)	Plan R+3 - Vol 955	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°503 - 1 (P503)	Plan R+3 - Vol 953	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°504 - 1 (P504)	Plan R+3 - Vol 938	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°505 - 1 (P505)	Plan R+3 - Vol 932	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°506 - 1 (P506)	Plan R+3 - Vol 932	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°507 - 1 (P507)	Plan R+3 - Vol 939	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°508 - 1 (P508)	Plan R+3 - Vol 927	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°509 - 1 (P509)	Plan R+3 - Vol 944	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°530 - 1 (P530)	Plan R+3 - Vol 949	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°531 - 1 (P531)	Plan R+3 - Vol 936 (B 307)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°532 - 1 (P532)	Plan R+3 - Vol 934	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°533 - 1 (P533)	Plan R+3 - Vol 933	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°534 - 1 (P534)	Plan R+3 - Vol 941	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°535 - 1 (P535)	Plan R+3 - Vol 942	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°536 - 1 (P536)	Plan R+3 - Vol 926	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°537 - 1 (P537)	Plan R+3 - Vol 946	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°724 - 1 (P724)	Plan R+3 - Vol 981	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°725 - 1 (P725)	Plan R+3 - Vol 981	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°728 - 1 (P728)	Plan R+3 - Vol 938	Prélevement négatif

002KN000189-3 n°729 - 1 (P729)	Plan R+3 - Vol 941	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°762 - 1 (P762)	Plan R+3 - Vol 936 (B 307)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°858 - 1 (P858)	Plan R+3 - Vol 948	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°859 - 1 (P859)	Plan R+3 - Vol 1434	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°860 - 1 (P860)	Plan R+3 - Vol 1434	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°861 - 1 (P861)	Plan R+3 - Vol 1436	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°862 - 1 (P862)	Plan R+3 - Vol 1436	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°863 - 1 (P863)	Plan R+3 - Vol 1438	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°864 - 1 (P864)	Plan R+3 - Vol 960	Prélevement négatif
S235 - 1 (S235)	Plan R+3 - Vol 288	Présence sur présentation de documents
S236 - 1 (S236)	Plan R+3 - Vol 288	Présence sur présentation de documents
S237 - 1 (S237)	Plan R+3 - Vol 288	Absence sur présentation de documents
S238 - 1 (S238)	Plan R+3 - Vol 288	
S244 - 1 (S244)	Plan R+3 - Vol 289 (P321)	Absence sur marquage du materiau
S322 - 2 (S322)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°110 - 1 (S322)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S323 - 2 (S323)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°110 - 1 (S323)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S324 - 2 (S324)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°110 - 1 (S324)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	Plan R+3 - Vol 1433 (ZF0201VH)	I28
002KN000189 n°110 - 1 (S325)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S325 - 2 (S325)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S326 - 1 (S326)	Plan R+3 - Vol 325 (B302)	Absence : pas d'amiante par nature
002KN000189 n°223 - 1 (S607)	Plan R+3 - Vol 405	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S608)	Plan R+3 - Vol 405	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S609)	Plan R+3 - Vol 406	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S610)	Plan R+3 - Vol 406	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S611)	Plan R+3 - Vol 406	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S612)	Plan R+3 - Vol 406	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S613)	Plan R+3 - Vol 407	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S614)	Plan R+3 - Vol 407	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S615)	Plan R+3 - Vol 407	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S616)	Plan R+3 - Vol 408	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002KN000189 n°223 - 1 (S617)	Plan R+3 - Vol 408	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S618)	Plan R+3 - Vol 408	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S619)	Plan R+3 - Vol 409	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S620)	Plan R+3 - Vol 410	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S621)	Plan R+3 - Vol 410	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S622)	Plan R+3 - Vol 410	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S623)	Plan R+3 - Vol 411	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S624)	Plan R+3 - Vol 411	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S625)	Plan R+3 - Vol 412	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S626)	Plan R+3 - Vol 412	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S627)	Plan R+3 - Vol 413	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S628)	Plan R+3 - Vol 413	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S629)	Plan R+3 - Vol 413	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S630)	Plan R+3 - Vol 413	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S631)	Plan R+3 - Vol 414	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S632)	Plan R+3 - Vol 414	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S633)	Plan R+3 - Vol 415	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S634)	Plan R+3 - Vol 415	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S635)	Plan R+3 - Vol 415	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S636)	Plan R+3 - Vol 416	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S637)	Plan R+3 - Vol 416	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2065 - 1 (S2065)	Plan R+3 - Vol 1433 (ZF0201VH)	Présence sur marquage du matériau
002KN000189 n°71 - 1 (P71)	Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)	Prélevement négatif
002KN000189 n°72 - 1 (P72)	Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)	Prélevement négatif
002KN000189 n°73 - 1 (P73)	Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)	Prélevement négatif
002KN000189 n°74 - 1 (P74)	Plan R+4 - Vol 291 (P427)	Prélevement négatif
002KN000189 n°75 - 1 (P75)	Plan R+4 - Vol 291 (P427)	Prélevement négatif
002KN000189 n°76 - 1 (P76)	Plan R+4 - Vol 291 (P427)	Prélevement négatif

002KN000189 n°77 - 1 (P77)	Plan R+4 - Vol 291 (P427)	Prélevement négatif
002KN000189 n°110 - 1 (P110)	Plan R+4 - Vol 326 (B408)	Prélevement négatif
002KN000189 n°111 - 1 (P111)	Plan R+4 - Vol 326 (B408)	Prélevement négatif
002KN000189 n°112 - 1 (P112)	Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)	Prélevement négatif
002KN000189 n°113 - 1 (P113)	Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)	Prélevement négatif
002KN000189 n°114 - 1 (P114)	Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)	Prélevement négatif
002KN000189 n°150 - 1 (P150)	Plan R+4 - Vol 339 (D409)	Prélevement négatif
002KN000189 n°151 - 1 (P151)	Plan R+4 - Vol 339 (D409)	Prélevement négatif
002KN000189 n°152 - 1 (P152)	Plan R+4 - Vol 339 (D409)	Prélevement négatif
002KN000189 n°153 - 1 (P153)	Plan R+4 - Vol 339 (D409)	Prélevement négatif
002KN000189 n°154 - 1 (P154)	Plan R+4 - Vol 339 (D409)	Prélevement négatif
002KN000189 n°155 - 1 (P155)	Plan R+4 - Vol 340 (D414)	Prélevement négatif
002KN000189 n°156 - 1 (P156)	Plan R+4 - Vol 340 (D414)	Prélevement négatif
002KN000189 n°157 - 1 (P157)	Plan R+4 - Vol 340 (D414)	Prélevement négatif
002KN000189 n°158 - 1 (P158)	Plan R+4 - Vol 340 (D414)	Prélevement négatif
002KN000189 n°159 - 1 (P159)	Plan R+4 - Vol 340 (D414)	Prélevement négatif
002KN000189 n°160 - 1 (P160)	Plan R+4 - Vol 341 (C408)	Prélevement négatif
002KN000189 n°161 - 1 (P161)	Plan R+4 - Vol 341 (C408)	Prélevement négatif
002KN000189 n°162 - 1 (P162)	Plan R+4 - Vol 341 (C408)	Prélevement négatif
002KN000189 n°185 - 1 (P185)	Plan R+4 - Vol 351 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189 n°186 - 1 (P186)	Plan R+4 - Vol 351 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189 n°186 - 2 (P186)	Plan R+4 - Vol 351 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189 n°187 - 1 (P187)	Plan R+4 - Vol 351 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189 n°187 - 2 (P187)	Plan R+4 - Vol 351 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189 n°201 - 1 (P201)	Plan R+4 - Vol 363	Prélevement négatif
002KN000189 n°202 - 1 (P202)	Plan R+4 - Vol 363	Prélevement négatif
002KN000189 n°203 - 1 (P203)	Plan R+4 - Vol 364	Prélevement négatif
002KN000189 n°204 - 1 (P204)	Plan R+4 - Vol 364	Prélevement négatif
002KN000189 n°212 - 1 (P212)	Plan R+4 - Vol 363	Prélevement négatif
002KN000189 n°214 - 1 (P214)	Plan R+4 - Vol 363	Prélevement négatif
002KN000189 n°220 - 1 (P220)	Plan R+4 - Vol 388	Prélevement négatif
002KN000189 n°221 - 1 (P221)	Plan R+4 - Vol 389	Prélevement négatif

002KN000189-1 n°243 - 1 (P243)	Plan R+4 - Vol 388	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°538 - 1 (P538)	Plan R+4 - Vol 1000	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°539 - 1 (P539)	Plan R+4 - Vol 1003	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°540 - 1 (P540)	Plan R+4 - Vol 1011	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°542 - 1 (P542)	Plan R+4 - Vol 1012 (B420)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°543 - 1 (P543)	Plan R+4 - Vol 1018	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°544 - 1 (P544)	Plan R+4 - Vol 1019	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°545 - 1 (P545)	Plan R+4 - Vol 1022	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°546 - 1 (P546)	Plan R+4 - Vol 1024	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°547 - 1 (P547)	Plan R+4 - Vol 1026	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°548 - 1 (P548)	Plan R+4 - Vol 1027	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°549 - 1 (P549)	Plan R+4 - Vol 1034	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°550 - 1 (P550)	Plan R+4 - Vol 1034	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°551 - 1 (P551)	Plan R+4 - Vol 1034	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°552 - 1 (P552)	Plan R+4 - Vol 1033	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°553 - 1 (P553)	Plan R+4 - Vol 1032	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°555 - 1 (P555)	Plan R+4 - Vol 1070	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°556 - 1 (P556)	Plan R+4 - Vol 1096	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°557 - 1 (P557)	Plan R+4 - Vol 1096	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°558 - 1 (P558)	Plan R+4 - Vol 1096	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°559 - 1 (P559)	Plan R+4 - Vol 1096	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°560 - 1 (P560)	Plan R+4 - Vol 1096	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°561 - 1 (P561)	Plan R+4 - Vol 1098	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°562 - 1 (P562)	Plan R+4 - Vol 1098	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°563 - 1 (P563)	Plan R+4 - Vol 1104	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°564 - 1 (P564)	Plan R+4 - Vol 1103	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°565 - 1 (P565)	Plan R+4 - Vol 1093	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°566 - 1 (P566)	Plan R+4 - Vol 1093	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°567 - 1 (P567)	Plan R+4 - Vol 1093	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°568 - 1 (P568)	Plan R+4 - Vol 1091	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°569 - 1 (P569)	Plan R+4 - Vol 1091	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°570 - 1 (P570)	Plan R+4 - Vol 1091	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°571 - 1 (P571)	Plan R+4 - Vol 1090	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°572 - 1 (P572)	Plan R+4 - Vol 1089	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°573 - 1 (P573)	Plan R+4 - Vol 1089	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°574 - 1 (P574)	Plan R+4 - Vol 1055	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°575 - 1 (P575)	Plan R+4 - Vol 1051	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°576 - 1 (P576)	Plan R+4 - Vol 1050	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°577 - 1 (P577)	Plan R+4 - Vol 1050	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°578 - 1 (P578)	Plan R+4 - Vol 1050	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°579 - 1 (P579)	Plan R+4 - Vol 1050	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°581 - 2 (P581)	Plan R+4 - Vol 1059	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°582 - 1 (P582)	Plan R+4 - Vol 1059	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°583 - 1 (P583)	Plan R+4 - Vol 1113	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°583 - 2 (P583)	Plan R+4 - Vol 1113	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°678 - 1 (P678)	Plan R+4 - Vol 1069	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°684 - 1 (P684)	Plan R+4 - Vol 1085	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°691 - 1 (P691)	Plan R+4 - Vol 1037	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°692 - 1 (P692)	Plan R+4 - Vol 1037	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°727 - 1 (P727)	Plan R+4 - Vol 1050	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°741 - 1 (P741)	Plan R+4 - Vol 1098	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°745 - 1 (P745)	Plan R+4 - Vol 1070	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°746 - 1 (P746)	Plan R+4 - Vol 1070	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°749 - 1 (P749)	Plan R+4 - Vol 1034	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°865 - 1 (P865)	Plan R+4 - Vol 987	Prélevement négatif

002KN000189-5 n°866 - 1 (P866)	Plan R+4 - Vol 987	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°867 - 1 (P867)	Plan R+4 - Vol 988	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°868 - 1 (P868)	Plan R+4 - Vol 988	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°869 - 1 (P869)	Plan R+4 - Vol 1446	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°870 - 1 (P870)	Plan R+4 - Vol 1446	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°871 - 1 (P871)	Plan R+4 - Vol 1446	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°872 - 1 (P872)	Plan R+4 - Vol 1450	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°873 - 1 (P873)	Plan R+4 - Vol 1450	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°874 - 1 (P874)	Plan R+4 - Vol 1451	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°875 - 1 (P875)	Plan R+4 - Vol 1451	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°876 - 1 (P876)	Plan R+4 - Vol 1453	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°877 - 1 (P877)	Plan R+4 - Vol 1453	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°878 - 1 (P878)	Plan R+4 - Vol 1452	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°879 - 1 (P879)	Plan R+4 - Vol 1452	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°880 - 1 (P880)	Plan R+4 - Vol 1060	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°881 - 1 (P881)	Plan R+4 - Vol 1060	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°882 - 1 (P882)	Plan R+4 - Vol 1087	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°883 - 1 (P883)	Plan R+4 - Vol 1087	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°884 - 1 (P884)	Plan R+4 - Vol 1088	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°885 - 1 (P885)	Plan R+4 - Vol 1088	Prélevement négatif
S247 - 1 (S247)	Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)	Absence sur marquage du materiau
S249 - 1 (S249)	Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)	
S252 - 1 (S252)	Plan R+4 - Vol 291 (P427)	Absence sur marquage du materiau
S327 - 1 (S327)	Plan R+4 - Vol 326 (B408)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S328 - 1 (S328)	Plan R+4 - Vol 326 (B408)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S330 - 1 (S330)	Plan R+4 - Vol 326 (B408)	Absence : pas d'amiante par nature
S331 - 1 (S331)	Plan R+4 - Vol 326 (B408)	
S332 - 1 (S332)	Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S333 - 1 (S333)	Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S335 - 1 (S335)	Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)	Absence : pas d'amiante par nature
S373 - 1 (S373)	Plan R+4 - Vol 339 (D409)	Absence : pas d'amiante par nature
S375 - 1 (S375)	Plan R+4 - Vol 340 (D414)	Absence : pas d'amiante par nature
S376 - 1 (S376)	Plan R+4 - Vol 340 (D414)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S377 - 1 (S377)	Plan R+4 - Vol 340 (D414)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S378 - 1 (S378)	Plan R+4 - Vol 341 (C408)	
S379 - 1 (S379)	Plan R+4 - Vol 341 (C408)	Absence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°918 - 1 (S2090)	Plan R+4 - Vol 1475 (G.t condamnée 5)	Présence sur marquage du matériau
002KN000189 n°78 - 1 (P78)	Plan R+5 - Vol 292 (P517)	Prélevement négatif

002KN000189 n°79 - 1 (P79)	Plan R+5 - Vol 292 (P517)	Prélevement négatif
002KN000189 n°80 - 1 (P80)	Plan R+5 - Vol 292 (P517)	Prélevement négatif
002KN000189 n°81 - 1 (P81)	Plan R+5 - Vol 294 (P535)	Prélevement négatif
002KN000189 n°82 - 1 (P82)	Plan R+5 - Vol 294 (P535)	Prélevement négatif
002KN000189 n°83 - 1 (P83)	Plan R+5 - Vol 294 (P535)	Prélevement négatif
002KN000189 n°115 - 1 (P115)	Plan R+5 - Vol 328 (B530)	Prélevement négatif
002KN000189 n°116 - 1 (P116)	Plan R+5 - Vol 328 (B530)	Prélevement négatif
002KN000189 n°117 - 1 (P117)	Plan R+5 - Vol 328 (B530)	Prélevement négatif
002KN000189 n°127 - 1 (P127)	Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002KN000189 n°128 - 1 (P128)	Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002KN000189 n°129 - 1 (P129)	Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002KN000189 n°130 - 1 (P130)	Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002KN000189 n°131 - 1 (P131)	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)	Prélevement négatif
002KN000189 n°132 - 1 (P132)	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)	Prélevement négatif
002KN000189 n°133 - 1 (P133)	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)	Prélevement négatif
002KN000189 n°134 - 1 (P134)	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)	Prélevement négatif
002KN000189 n°135 - 1 (P135)	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)	Prélevement négatif
002KN000189 n°136 - 1 (P136)	Plan R+5 - Vol 336 (D512)	Prélevement négatif
002KN000189 n°137 - 1 (P137)	Plan R+5 - Vol 336 (D512)	Prélevement négatif
002KN000189 n°138 - 1 (P138)	Plan R+5 - Vol 336 (D512)	Prélevement négatif
002KN000189 n°139 - 1 (P139)	Plan R+5 - Vol 336 (D512)	Prélevement négatif
002KN000189 n°140 - 1 (P140)	Plan R+5 - Vol 337 (B516)	Prélevement négatif
002KN000189 n°141 - 1 (P141)	Plan R+5 - Vol 337 (B516)	Prélevement négatif
002KN000189 n°142 - 1 (P142)	Plan R+5 - Vol 337 (B516)	Prélevement négatif
002KN000189 n°143 - 1 (P143)	Plan R+5 - Vol 337 (B516)	Prélevement négatif
002KN000189 n°144 - 1 (P144)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189 n°145 - 1 (P145)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189 n°146 - 1 (P146)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif

002KN000189 n°147 - 1 (P147)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189 n°148 - 1 (P148)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189 n°149 - 1 (P149)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189 n°175 - 1 (P175)	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)	Prélevement négatif
002KN000189 n°176 - 2 (P176)	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)	Prélevement négatif
002KN000189 n°176 - 1 (P176)	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)	Prélevement négatif
002KN000189 n°219 - 1 (P219)	Plan R+5 - Vol 387	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°241 - 2 (P241)	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°241 - 1 (P241)	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°242 - 1 (P242)	Plan R+5 - Vol 387	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°262 - 1 (P262)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°263 - 1 (P263)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°264 - 1 (P264)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°265 - 1 (P265)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°265 - 2 (P265)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°267 - 1 (P267)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°269 - 1 (P269)	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°270 - 1 (P270)	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°271 - 1 (P271)	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°272 - 1 (P272)	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°273 - 1 (P273)	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°274 - 1 (P274)	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°275 - 1 (P275)	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°276 - 1 (P276)	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°277 - 1 (P277)	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°278 - 1 (P278)	Plan R+5 - Vol 636 Salle de reunion	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°279 - 1 (P279)	Plan R+5 - Vol 636 Salle de reunion	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°280 - 1 (P280)	Plan R+5 - Vol 636 Salle de reunion	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°281 - 1 (P281)	Plan R+5 - Vol 636 Salle de reunion	Prélevement négatif

002KN000189-3 n°631 - 1 (P631)	Plan R+5 - Vol 1172	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°632 - 1 (P632)	Plan R+5 - Vol 1171	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°633 - 1 (P633)	Plan R+5 - Vol 1170	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°634 - 1 (P634)	Plan R+5 - Vol 1170	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°635 - 1 (P635)	Plan R+5 - Vol 1169	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°636 - 1 (P636)	Plan R+5 - Vol 1164 (C516)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°637 - 1 (P637)	Plan R+5 - Vol 1166	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°638 - 1 (P638)	Plan R+5 - Vol 1379	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°639 - 1 (P639)	Plan R+5 - Vol 1168	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°640 - 1 (P640)	Plan R+5 - Vol 1202	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°641 - 1 (P641)	Plan R+5 - Vol 1202	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°642 - 1 (P642)	Plan R+5 - Vol 1212	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°643 - 1 (P643)	Plan R+5 - Vol 1212	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°645 - 1 (P645)	Plan R+5 - Vol 1231	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°646 - 1 (P646)	Plan R+5 - Vol 1232	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°647 - 1 (P647)	Plan R+5 - Vol 1231	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°648 - 1 (P648)	Plan R+5 - Vol 1231	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°649 - 1 (P649)	Plan R+5 - Vol 1225	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°650 - 1 (P650)	Plan R+5 - Vol 1224	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°651 - 1 (P651)	Plan R+5 - Vol 1382	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°652 - 1 (P652)	Plan R+5 - Vol 1383	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°653 - 1 (P653)	Plan R+5 - Vol 1215	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°654 - 1 (P654)	Plan R+5 - Vol 1381	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°655 - 1 (P655)	Plan R+5 - Vol 1213	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°656 - 1 (P656)	Plan R+5 - Vol 1146 (B520b)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°657 - 1 (P657)	Plan R+5 - Vol 1140	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°658 - 1 (P658)	Plan R+5 - Vol 1138	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°660 - 1 (P660)	Plan R+5 - Vol 1137	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°661 - 1 (P661)	Plan R+5 - Vol 1127	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°662 - 1 (P662)	Plan R+5 - Vol 1128 (B513)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°663 - 1 (P663)	Plan R+5 - Vol 1128 (B513)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°664 - 1 (P664)	Plan R+5 - Vol 1128 (B513)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°665 - 1 (P665)	Plan R+5 - Vol 1123 (B505)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°666 - 1 (P666)	Plan R+5 - Vol 1123 (B505)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°667 - 2 (P667)	Plan R+5 - Vol 1156	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°670 - 1 (P670)	Plan R+5 - Vol 1183	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°671 - 1 (P671)	Plan R+5 - Vol 1194	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°717 - 1 (P717)	Plan R+5 - Vol 1162	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°718 - 1 (P718)	Plan R+5 - Vol 1158	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°719 - 1 (P719)	Plan R+5 - Vol 1196	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°720 - 1 (P720)	Plan R+5 - Vol 1197	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°721 - 1 (P721)	Plan R+5 - Vol 1198	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°722 - 1 (P722)	Plan R+5 - Vol 1199	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°723 - 1 (P723)	Plan R+5 - Vol 1188	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°726 - 1 (P726)	Plan R+5 - Vol 1123 (B505)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°733 - 1 (P733)	Plan R+5 - Vol 1199	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°742 - 1 (P742)	Plan R+5 - Vol 1140	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°743 - 1 (P743)	Plan R+5 - Vol 1382	Prélevement négatif

002KN000189-3 n°744 - 1 (P744)	Plan R+5 - Vol 1212	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°759 - 1 (P759)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°760 - 1 (P760)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°761 - 1 (P761)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°886 - 1 (P886)	Plan R+5 - Vol 1454	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°887 - 1 (P887)	Plan R+5 - Vol 1454	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°888 - 1 (P888)	Plan R+5 - Vol 1455	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°889 - 1 (P889)	Plan R+5 - Vol 1455	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°890 - 1 (P890)	Plan R+5 - Vol 1165	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°891 - 1 (P891)	Plan R+5 - Vol 1165	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°892 - 1 (P892)	Plan R+5 - Vol 1133	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°893 - 1 (P893)	Plan R+5 - Vol 1133	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°894 - 1 (P894)	Plan R+5 - Vol 1119	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°895 - 1 (P895)	Plan R+5 - Vol 1119	Prélevement négatif
S253 - 1 (S253)	Plan R+5 - Vol 292 (P517)	Présence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°896 - 1 (P896)	Plan R+5 - Vol 1238	Prélevement négatif
S254 - 1 (S254)	Plan R+5 - Vol 292 (P517)	Présence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°897 - 1 (P897)	Plan R+5 - Vol 1238	Prélevement négatif
S255 - 1 (S255)	Plan R+5 - Vol 293 (P518)	Présence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°898 - 1 (P898)	Plan R+5 - Vol 1238	Prélevement négatif
S256 - 1 (S256)	Plan R+5 - Vol 293 (P518)	Présence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°899 - 1 (P899)	Plan R+5 - Vol 1456	Prélevement négatif
S257 - 1 (S257)	Plan R+5 - Vol 293 (P518)	Présence sur présentation de documents
S258 - 1 (S258)	Plan R+5 - Vol 293 (P518)	Présence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°900 - 1 (P900)	Plan R+5 - Vol 1456	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°901 - 1 (P901)	Plan R+5 - Vol 1457	Prélevement négatif
S261 - 1 (S261)	Plan R+5 - Vol 292 (P517)	Absence sur marquage du materiau
002KN000189-5 n°902 - 1 (P902)	Plan R+5 - Vol 1457	Prélevement négatif
S262 - 1 (S262)	Plan R+5 - Vol 294 (P535)	Absence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°903 - 1 (P903)	Plan R+5 - Vol 1458	Prélevement négatif
S265 - 1 (S265)	Plan R+5 - Vol 294 (P535)	Absence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°904 - 1 (P904)	Plan R+5 - Vol 1458	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°905 - 1 (P905)	Plan R+5 - Vol 1459	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°906 - 1 (P906)	Plan R+5 - Vol 1459	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°907 - 1 (P907)	Plan R+5 - Vol 1226	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°908 - 1 (P908)	Plan R+5 - Vol 1226	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°909 - 1 (P909)	Plan R+5 - Vol 1216	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°910 - 1 (P910)	Plan R+5 - Vol 1216	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°911 - 1 (P911)	Plan R+5 - Vol 1461	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°912 - 1 (P912)	Plan R+5 - Vol 1462	Prélevement négatif
S338 - 1 (S338)	Plan R+5 - Vol 329 (B532)	Absence : pas d'amiante par nature
S339 - 1 (S339)	Plan R+5 - Vol 329 (B532)	Absence : pas d'amiante par nature

S359 - 1 (S359)	Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)	Absence : pas d'amiante par nature
S360 - 1 (S360)	Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)	
S363 - 1 (S363)	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)	Absence : pas d'amiante par nature
S366 - 1 (S366)	Plan R+5 - Vol 336 (D512)	Absence : pas d'amiante par nature
S368 - 1 (S368)	Plan R+5 - Vol 337 (B516)	Absence : pas d'amiante par nature
S371 - 1 (S371)	Plan R+5 - Vol 338 (B507)	Absence : pas d'amiante par nature
002KN000189 n°223 - 1 (S638)	Plan R+5 - Vol 417 (P504)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S639)	Plan R+5 - Vol 417 (P504)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S640)	Plan R+5 - Vol 418 (P501)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S641)	Plan R+5 - Vol 418 (P501)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S642)	Plan R+5 - Vol 418 (P501)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S643)	Plan R+5 - Vol 418 (P501)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S644)	Plan R+5 - Vol 419 (P506)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S645)	Plan R+5 - Vol 419 (P506)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S646)	Plan R+5 - Vol 420 (P508)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S647)	Plan R+5 - Vol 420 (P508)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S648)	Plan R+5 - Vol 420 (P508)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S649)	Plan R+5 - Vol 421 (P505)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S650)	Plan R+5 - Vol 421 (P505)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S651)	Plan R+5 - Vol 421 (P505)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S652)	Plan R+5 - Vol 421 (P505)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S653)	Plan R+5 - Vol 422 (P510)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S654)	Plan R+5 - Vol 422 (P510)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S655)	Plan R+5 - Vol 422 (P510)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S656)	Plan R+5 - Vol 423 (P509)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S657)	Plan R+5 - Vol 423 (P509)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S658)	Plan R+5 - Vol 424 (P513)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S659)	Plan R+5 - Vol 424 (P513)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002KN000189 n°223 - 1 (S660)	Plan R+5 - Vol 425 (P521)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S661)	Plan R+5 - Vol 425 (P521)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S662)	Plan R+5 - Vol 425 (P521)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002KN000189 n°223 - 1 (S663)	Plan R+5 - Vol 425 (P521)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S857 - 1 (S857)	Plan R+5 - Vol 536	Absence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°918 - 1 (S2091)	Plan R+5 - Vol 1476 (G.t condamnée 6)	Présence sur marquage du matériau
002KN000189 n°84 - 1 (P84)	Plan R+6 - Vol 295	Prélevement négatif
002KN000189 n°85 - 1 (P85)	Plan R+6 - Vol 295	Prélevement négatif
002KN000189 n°86 - 1 (P86)	Plan R+6 - Vol 295	Prélevement négatif
002KN000189 n°87 - 1 (P87)	Plan R+6 - Vol 297	Prélevement négatif
002KN000189 n°88 - 1 (P88)	Plan R+6 - Vol 297	Prélevement négatif
002KN000189 n°89 - 1 (P89)	Plan R+6 - Vol 297	Prélevement négatif
002KN000189 n°118 - 1 (P118)	Plan R+6 - Vol 330 (B606)	Prélevement négatif
002KN000189 n°119 - 1 (P119)	Plan R+6 - Vol 330 (B606)	Prélevement négatif
002KN000189 n°120 - 1 (P120)	Plan R+6 - Vol 330 (B606)	Prélevement négatif
002KN000189 n°121 - 1 (P121)	Plan R+6 - Vol 332 (B644)	Prélevement négatif
002KN000189 n°122 - 1 (P122)	Plan R+6 - Vol 332 (B644)	Prélevement négatif
002KN000189 n°123 - 1 (P123)	Plan R+6 - Vol 332 (B644)	Prélevement négatif
002KN000189 n°124 - 1 (P124)	Plan R+6 - Vol 333 (C614)	Prélevement négatif
002KN000189 n°125 - 1 (P125)	Plan R+6 - Vol 333 (C614)	Prélevement négatif
002KN000189 n°126 - 1 (P126)	Plan R+6 - Vol 333 (C614)	Prélevement négatif
002KN000189 n°189 - 2 (P189)	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189 n°189 - 1 (P189)	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189 n°191 - 1 (P191)	Plan R+6 - Vol 360	Prélevement négatif
002KN000189 n°192 - 1 (P192)	Plan R+6 - Vol 360	Prélevement négatif
002KN000189 n°193 - 1 (P193)	Plan R+6 - Vol 359	Prélevement négatif
002KN000189 n°194 - 1 (P194)	Plan R+6 - Vol 359	Prélevement négatif
002KN000189 n°195 - 1 (P195)	Plan R+6 - Vol 359	Prélevement négatif
002KN000189 n°196 - 1 (P196)	Plan R+6 - Vol 359	Prélevement négatif
002KN000189 n°197 - 1 (P197)	Plan R+6 - Vol 359	Prélevement négatif
002KN000189 n°198 - 1 (P198)	Plan R+6 - Vol 360	Prélevement négatif
002KN000189 n°199 - 1 (P199)	Plan R+6 - Vol 360	Prélevement négatif
002KN000189 n°200 - 1 (P200)	Plan R+6 - Vol 362	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°244 - 1 (P244)	Plan R+6 - Vol 624	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°585 - 1 (P585)	Plan R+6 - Vol 1285	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°586 - 1 (P586)	Plan R+6 - Vol 1274	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°587 - 1 (P587)	Plan R+6 - Vol 1277	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°588 - 1 (P588)	Plan R+6 - Vol 1269	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°591 - 1 (P591)	Plan R+6 - Vol 1284	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°592 - 1 (P592)	Plan R+6 - Vol 1283	Prélevement négatif

002KN000189-3 n°593 - 1 (P593)	Plan R+6 - Vol 1281	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°594 - 1 (P594)	Plan R+6 - Vol 1252	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°595 - 1 (P595)	Plan R+6 - Vol 1251	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°596 - 1 (P596)	Plan R+6 - Vol 1258	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°597 - 1 (P597)	Plan R+6 - Vol 1259	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°601 - 1 (P601)	Plan R+6 - Vol 1289	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°602 - 1 (P602)	Plan R+6 - Vol 1290	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°602 - 2 (P602)	Plan R+6 - Vol 1290	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°603 - 2 (P603)	Plan R+6 - Vol 1375	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°603 - 1 (P603)	Plan R+6 - Vol 1375	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°604 - 1 (P604)	Plan R+6 - Vol 1306	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°604 - 2 (P604)	Plan R+6 - Vol 1306	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°605 - 1 (P605)	Plan R+6 - Vol 1305	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°605 - 2 (P605)	Plan R+6 - Vol 1305	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°606 - 1 (P606)	Plan R+6 - Vol 1304	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°607 - 1 (P607)	Plan R+6 - Vol 1303	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°607 - 2 (P607)	Plan R+6 - Vol 1303	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°608 - 1 (P608)	Plan R+6 - Vol 1376 (Cour intérieure 1)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°609 - 1 (P609)	Plan R+6 - Vol 1376 (Cour intérieure 1)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°610 - 1 (P610)	Plan R+6 - Vol 1376 (Cour intérieure 1)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°611 - 1 (P611)	Plan R+6 - Vol 1376 (Cour intérieure 1)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°612 - 1 (P612)	Plan R+6 - Vol 1375	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°613 - 1 (P613)	Plan R+6 - Vol 1291	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°613 - 2 (P613)	Plan R+6 - Vol 1291	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°614 - 2 (P614)	Plan R+6 - Vol 1293	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°614 - 1 (P614)	Plan R+6 - Vol 1293	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°615 - 2 (P615)	Plan R+6 - Vol 1294	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°615 - 1 (P615)	Plan R+6 - Vol 1294	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°616 - 1 (P616)	Plan R+6 - Vol 1295	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°616 - 2 (P616)	Plan R+6 - Vol 1295	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°617 - 1 (P617)	Plan R+6 - Vol 1296	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°618 - 1 (P618)	Plan R+6 - Vol 1297	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°619 - 2 (P619)	Plan R+6 - Vol 1377	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°619 - 1 (P619)	Plan R+6 - Vol 1377	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°620 - 1 (P620)	Plan R+6 - Vol 1377	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°621 - 1 (P621)	Plan R+6 - Vol 1378	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°622 - 1 (P622)	Plan R+6 - Vol 1302	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°623 - 1 (P623)	Plan R+6 - Vol 1300	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°624 - 1 (P624)	Plan R+6 - Vol 1325	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°625 - 1 (P625)	Plan R+6 - Vol 1337	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°625 - 2 (P625)	Plan R+6 - Vol 1337	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°626 - 1 (P626)	Plan R+6 - Vol 1321	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°626 - 2 (P626)	Plan R+6 - Vol 1321	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°627 - 2 (P627)	Plan R+6 - Vol 1323	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°627 - 1 (P627)	Plan R+6 - Vol 1323	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°628 - 2 (P628)	Plan R+6 - Vol 1320	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°628 - 1 (P628)	Plan R+6 - Vol 1320	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°629 - 1 (P629)	Plan R+6 - Vol 1318	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°630 - 1 (P630)	Plan R+6 - Vol 1309	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°672 - 1 (P672)	Plan R+6 - Vol 1350	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°673 - 1 (P673)	Plan R+6 - Vol 1350	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°674 - 1 (P674)	Plan R+6 - Vol 1350	Prélevement négatif

002KN000189-3 n°675 - 1 (P675)	Plan R+6 - Vol 1350	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°676 - 1 (P676)	Plan R+6 - Vol 1350	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°677 - 1 (P677)	Plan R+6 - Vol 1350	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°679 - 1 (P679)	Plan R+6 - Vol 1344	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°680 - 1 (P680)	Plan R+6 - Vol 1344	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°681 - 1 (P681)	Plan R+6 - Vol 1344	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°682 - 1 (P682)	Plan R+6 - Vol 1344	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°686 - 2 (P686)	Plan R+6 - Vol 1308	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°686 - 1 (P686)	Plan R+6 - Vol 1308	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°687 - 1 (P687)	Plan R+6 - Vol 1308	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°687 - 2 (P687)	Plan R+6 - Vol 1308	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°688 - 1 (P688)	Plan R+6 - Vol 1308	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°689 - 1 (P689)	Plan R+6 - Vol 1308	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°690 - 1 (P690)	Plan R+6 - Vol 1308	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°693 - 1 (P693)	Plan R+6 - Vol 580	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°694 - 1 (P694)	Plan R+6 - Vol 580	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°695 - 1 (P695)	Plan R+6 - Vol 580	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°696 - 2 (P696)	Plan R+6 - Vol 580	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°696 - 1 (P696)	Plan R+6 - Vol 580	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°697 - 1 (P697)	Plan R+6 - Vol 580	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°699 - 1 (P699)	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°700 - 1 (P700)	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°701 - 1 (P701)	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°702 - 1 (P702)	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°703 - 1 (P703)	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°704 - 1 (P704)	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°704 - 2 (P704)	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°734 - 1 (P734)	Plan R+6 - Vol 1392	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°735 - 1 (P735)	Plan R+6 - Vol 1292	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°736 - 1 (P736)	Plan R+6 - Vol 1292	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°747 - 1 (P747)	Plan R+6 - Vol 1286	Prélevement négatif
	Plan R+6 - Vol 346 (Ascenseur)	I3
S266 - 1 (S266)	Plan R+6 - Vol 295	Absence sur marquage du materiau
S267 - 1 (S267)	Plan R+6 - Vol 295	Absence sur présentation de documents
S270 - 1 (S270)	Plan R+6 - Vol 296 (P611)	Absence sur présentation de documents
S271 - 1 (S271)	Plan R+6 - Vol 296 (P611)	Absence sur marquage du materiau
S275 - 1 (S275)	Plan R+6 - Vol 297	Absence sur présentation de documents
S276 - 1 (S276)	Plan R+6 - Vol 297	
002KN000189-5 n°914 - 1 (P914)	Plan R+6 - Vol 1241	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°915 - 1 (P915)	Plan R+6 - Vol 1241	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°916 - 1 (P916)	Plan R+6 - Vol 1358	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°917 - 1 (P917)	Plan R+6 - Vol 1358	Prélevement négatif
S345 - 1 (S345)	Plan R+6 - Vol 330 (B606)	Absence : pas d'amiante par nature
S346 - 1 (S346)	Plan R+6 - Vol 331 (B632)	Absence : pas d'amiante par nature

S351 - 1 (S351)	Plan R+6 - Vol 331 (B632)	
S354 - 1 (S354)	Plan R+6 - Vol 332 (B644)	Absence : pas d'amiante par nature
S357 - 1 (S357)	Plan R+6 - Vol 333 (C614)	Absence : pas d'amiante par nature
S469 - 1 (S469)	Plan R+6 - Vol 359	
S470 - 1 (S470)	Plan R+6 - Vol 358	
S471 - 1 (S471)	Plan R+6 - Vol 360	
S476 - 1 (S476)	Plan R+6 - Vol 356	
S477 - 1 (S477)	Plan R+6 - Vol 362	
S478 - 1 (S478)	Plan R+6 - Vol 361	
002KN000189-3 n°601 - 1 (S1488)	Plan R+6 - Vol 1272	
002KN000189-3 n°601 - 1 (S1489)	Plan R+6 - Vol 1273	
002KN000189-5 n°918 - 1 (S2092)	Plan R+6 - Vol 1477 (G.t condamnée 7)	Présence sur marquage du matériau
002KN000189-1 n°223 - 1 (P223)	Plan R+7 - Vol 610	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°224 - 1 (P224)	Plan R+7 - Vol 611	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°225 - 1 (P225)	Plan R+7 - Vol 610	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°226 - 1 (P226)	Plan R+7 - Vol 612	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°227 - 1 (P227)	Plan R+7 - Vol 612	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°228 - 1 (P228)	Plan R+7 - Vol 612	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°229 - 1 (P229)	Plan R+7 - Vol 612	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°230 - 1 (P230)	Plan R+7 - Vol 613	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°231 - 1 (P231)	Plan R+7 - Vol 613	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°232 - 1 (P232)	Plan R+7 - Vol 612	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°233 - 1 (P233)	Plan R+7 - Vol 614	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°234 - 1 (P234)	Plan R+7 - Vol 615	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°235 - 1 (P235)	Plan R+7 - Vol 618	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°236 - 1 (P236)	Plan R+7 - Vol 620	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°237 - 1 (P237)	Plan R+7 - Vol 611	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°238 - 1 (P238)	Plan R+7 - Vol 623	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°239 - 1 (P239)	Plan R+7 - Vol 623	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°240 - 1 (P240)	Plan R+7 - Vol 623	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°248 - 1 (P248)	Plan R+7 - Vol 632	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°249 - 1 (P249)	Plan R+7 - Vol 632	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°250 - 1 (P250)	Plan R+7 - Vol 632	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°251 - 1 (P251)	Plan R+7 - Vol 628	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°252 - 1 (P252)	Plan R+7 - Vol 630	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°253 - 1 (P253)	Plan R+7 - Vol 630	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°254 - 1 (P254)	Plan R+7 - Vol 631	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°255 - 1 (P255)	Plan R+7 - Vol 631	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°256 - 1 (P256)	Plan R+7 - Vol 631	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°256 - 2 (P256)	Plan R+7 - Vol 631	Prélevement négatif
S1071 - 1 (S1071)	Plan R+7 - Vol 631	
002KN000189 n°47 - 1 (P47)	Plan Rdc - Vol 285 (P026)	Prélevement négatif
002KN000189 n°48 - 1 (P48)	Plan Rdc - Vol 285 (P026)	Prélevement négatif
002KN000189 n°49 - 1 (P49)	Plan Rdc - Vol 285 (P026)	Prélevement négatif
002KN000189 n°50 - 1 (P50)	Plan Rdc - Vol 285 (P026)	Prélevement négatif
002KN000189 n°51 - 1 (P51)	Plan Rdc - Vol 285 (P026)	Prélevement négatif

002KN000189 n°52 - 1 (P52)	Plan Rdc - Vol 285 (P026)	Prélevement négatif
002KN000189 n°53 - 1 (P53)	Plan Rdc - Vol 285 (P026)	Prélevement négatif
002KN000189 n°54 - 1 (P54)	Plan Rdc - Vol 285 (P026)	Prélevement négatif
002KN000189 n°90 - 1 (P90)	Plan Rdc - Vol 320 (B026)	Prélevement négatif
002KN000189 n°91 - 1 (P91)	Plan Rdc - Vol 320 (B026)	Prélevement négatif
002KN000189 n°92 - 1 (P92)	Plan Rdc - Vol 320 (B026)	Prélevement négatif
002KN000189 n°93 - 1 (P93)	Plan Rdc - Vol 320 (B026)	Prélevement négatif
002KN000189 n°177 - 1 (P177)	Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)	Prélevement négatif
002KN000189 n°178 - 1 (P178)	Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)	Prélevement négatif
002KN000189 n°179 - 1 (P179)	Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)	Prélevement négatif
002KN000189 n°180 - 1 (P180)	Plan Rdc - Vol 264	Prélevement négatif
002KN000189 n°181 - 1 (P181)	Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)	Prélevement négatif
002KN000189 n°216 - 1 (P216)	Plan Rdc - Vol 382	Prélevement négatif
002KN000189 n°217 - 1 (P217)	Plan Rdc - Vol 385	Prélevement négatif
002KN000189 n°218 - 1 (P218)	Plan Rdc - Vol 355	Prélevement négatif
002KN000189-1 n°247 - 1 (P247)	Plan Rdc - Vol 627	Prélevement négatif
002KN000189-2 n°268 - 1 (P268)	Plan Rdc - Vol 627	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°349 - 1 (P349)	Plan Rdc - Vol 652 (Bureaux 12)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°350 - 1 (P350)	Plan Rdc - Vol 654 (Bureaux 14)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°351 - 1 (P351)	Plan Rdc - Vol 654 (Bureaux 14)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°352 - 1 (P352)	Plan Rdc - Vol 653 (Bureaux 13)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°353 - 1 (P353)	Plan Rdc - Vol 384	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°354 - 1 (P354)	Plan Rdc - Vol 384	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°355 - 1 (P355)	Plan Rdc - Vol 384	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°356 - 1 (P356)	Plan Rdc - Vol 384	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°357 - 1 (P357)	Plan Rdc - Vol 661	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°358 - 1 (P358)	Plan Rdc - Vol 661	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°359 - 1 (P359)	Plan Rdc - Vol 320 (B026)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°360 - 1 (P360)	Plan Rdc - Vol 382	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°361 - 1 (P361)	Plan Rdc - Vol 320 (B026)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°362 - 1 (P362)	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°363 - 1 (P363)	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°364 - 1 (P364)	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°365 - 1 (P365)	Plan Rdc - Vol 655 (B028)	Prélevement négatif

002KN000189-3 n°366 - 1 (P366)	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°367 - 1 (P367)	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°368 - 1 (P368)	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°369 - 1 (P369)	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°370 - 1 (P370)	Plan Rdc - Vol 666 (Infirmerie 2)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°371 - 1 (P371)	Plan Rdc - Vol 666 (Infirmerie 2)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°372 - 1 (P372)	Plan Rdc - Vol 666 (Infirmerie 2)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°374 - 1 (P374)	Plan Rdc - Vol 664	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°375 - 1 (P375)	Plan Rdc - Vol 664	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°376 - 1 (P376)	Plan Rdc - Vol 385	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°377 - 1 (P377)	Plan Rdc - Vol 385	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°378 - 1 (P378)	Plan Rdc - Vol 669	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°379 - 1 (P379)	Plan Rdc - Vol 669	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°380 - 1 (P380)	Plan Rdc - Vol 673 (C005)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°381 - 1 (P381)	Plan Rdc - Vol 673 (C005)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°382 - 1 (P382)	Plan Rdc - Vol 673 (C005)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°383 - 1 (P383)	Plan Rdc - Vol 675	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°384 - 1 (P384)	Plan Rdc - Vol 681	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°385 - 1 (P385)	Plan Rdc - Vol 682	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°386 - 1 (P386)	Plan Rdc - Vol 688	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°387 - 1 (P387)	Plan Rdc - Vol 671	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°388 - 1 (P388)	Plan Rdc - Vol 671	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°389 - 1 (P389)	Plan Rdc - Vol 671	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°390 - 1 (P390)	Plan Rdc - Vol 671	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°391 - 1 (P391)	Plan Rdc - Vol 692	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°392 - 1 (P392)	Plan Rdc - Vol 692	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°393 - 1 (P393)	Plan Rdc - Vol 692	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°395 - 1 (P395)	Plan Rdc - Vol 696 (Sureté)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°396 - 1 (P396)	Plan Rdc - Vol 696 (Sureté)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°397 - 1 (P397)	Plan Rdc - Vol 702	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°398 - 1 (P398)	Plan Rdc - Vol 705	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°399 - 1 (P399)	Plan Rdc - Vol 708	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°400 - 1 (P400)	Plan Rdc - Vol 708	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°401 - 1 (P401)	Plan Rdc - Vol 708	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°402 - 1 (P402)	Plan Rdc - Vol 649 (Couloir 4)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°403 - 1 (P403)	Plan Rdc - Vol 649 (Couloir 4)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°404 - 1 (P404)	Plan Rdc - Vol 644 (Couloir 2)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°405 - 1 (P405)	Plan Rdc - Vol 710	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°406 - 1 (P406)	Plan Rdc - Vol 710	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°407 - 1 (P407)	Plan Rdc - Vol 710	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°408 - 1 (P408)	Plan Rdc - Vol 710	Prélevement négatif

002KN000189-3 n°409 - 1 (P409)	Plan Rdc - Vol 641	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°410 - 1 (P410)	Plan Rdc - Vol 266	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°411 - 1 (P411)	Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°412 - 1 (P412)	Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°413 - 1 (P413)	Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°414 - 1 (P414)	Plan Rdc - Vol 259	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°415 - 1 (P415)	Plan Rdc - Vol 266	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°416 - 1 (P416)	Plan Rdc - Vol 711	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°417 - 1 (P417)	Plan Rdc - Vol 712	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°418 - 1 (P418)	Plan Rdc - Vol 712	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°419 - 1 (P419)	Plan Rdc - Vol 712	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°420 - 1 (P420)	Plan Rdc - Vol 712	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°421 - 1 (P421)	Plan Rdc - Vol 714	Prélevement positif
002KN000189-3 n°422 - 1 (P422)	Plan Rdc - Vol 714	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°423 - 1 (P423)	Plan Rdc - Vol 714	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°424 - 1 (P424)	Plan Rdc - Vol 716	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°426 - 1 (P426)	Plan Rdc - Vol 256	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°685 - 1 (P685)	Plan Rdc - Vol 1385	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°713 - 1 (P713)	Plan Rdc - Vol 1391 (Cour intérieure 2)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°750 - 1 (P750)	Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°751 - 1 (P751)	Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°752 - 1 (P752)	Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°753 - 1 (P753)	Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°754 - 1 (P754)	Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°755 - 1 (P755)	Plan Rdc - Vol 1395 (Rampe Sortie)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°756 - 1 (P756)	Plan Rdc - Vol 1395 (Rampe Sortie)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°757 - 1 (P757)	Plan Rdc - Vol 1395 (Rampe Sortie)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°758 - 1 (P758)	Plan Rdc - Vol 1395 (Rampe Sortie)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°764 - 1 (P764)	Plan Rdc - Vol 654 (Bureaux 14)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°768 - 1 (P768)	Plan Rdc - Vol 1406	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°769 - 2 (P769)	Plan Rdc - Vol 1407 (Esc P8)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°769 - 1 (P769)	Plan Rdc - Vol 1407 (Esc P8)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°770 - 1 (P770)	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°771 - 1 (P771)	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°772 - 1 (P772)	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°773 - 1 (P773)	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)	Prélevement négatif

002KN000189-5 n°774 - 1 (P774)	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°775 - 1 (P775)	Plan Rdc - Vol 674	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°775 - 2 (P775)	Plan Rdc - Vol 674	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°777 - 1 (P777)	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°778 - 1 (P778)	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°779 - 1 (P779)	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°781 - 1 (P781)	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°781 - 2 (P781)	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°782 - 1 (P782)	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°783 - 1 (P783)	Plan Rdc - Vol 691 (PMR009)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°784 - 1 (P784)	Plan Rdc - Vol 265 (B000)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°785 - 1 (P785)	Plan Rdc - Vol 265 (B000)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°786 - 1 (P786)	Plan Rdc - Vol 262 (B004)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°787 - 1 (P787)	Plan Rdc - Vol 262 (B004)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°798 - 1 (P798)	Plan Rdc - Vol 1409 (Parvis)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°799 - 1 (P799)	Plan Rdc - Vol 1409 (Parvis)	Prélevement positif
002KN000189-5 n°822 - 1 (P822)	Plan Rdc - Vol 1418 (Ext Sud)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°823 - 1 (P823)	Plan Rdc - Vol 1418 (Ext Sud)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°824 - 1 (P824)	Plan Rdc - Vol 1418 (Ext Sud)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°825 - 1 (P825)	Plan Rdc - Vol 1391 (Cour intérieure 2)	Prélevement négatif
I18 - 1 (P844)	Plan Rdc - Vol 662 (Infirmerie 3)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°844 - 2 (P844)	Plan Rdc - Vol 662 (Infirmerie 3)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°845 - 1 (P845)	Plan Rdc - Vol 662 (Infirmerie 3)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°845 - 2 (P845)	Plan Rdc - Vol 662 (Infirmerie 3)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°853 - 1 (P853)	Plan Rdc - Vol 704	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°854 - 1 (P854)	Plan Rdc - Vol 704	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°855 - 1 (P855)	Plan Rdc - Vol 700	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°856 - 1 (P856)	Plan Rdc - Vol 700	Prélevement négatif
	Plan Rdc - Vol 347 (Ascenseur)	I4
S226 - 1 (S226)	Plan Rdc - Vol 285 (P026)	Absence sur marquage du materiau
S297 - 1 (S297)	Plan Rdc - Vol 320 (B026)	Absence : pas d'amiante par nature

	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	I23
	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	I24
	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	I25
	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	I26
	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)	I27
S1219 - 1 (S1219)	Plan Rdc - Vol 688	Absence sur présentation de documents
S1225 - 1 (S1225)	Plan Rdc - Vol 672	Absence sur présentation de documents
S1258 - 1 (S1258)	Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)	Absence sur présentation de documents
002KN000189-5 n°918 - 1 (S2087)	Plan Rdc - Vol 1472 (G.t condamnée 2)	Présence sur marquage du matériau
002KN000189 n°36 - 1 (P36)	Plan sous-sol -1 - Vol 142	Prélevement négatif
002KN000189 n°37 - 1 (P37)	Plan sous-sol -1 - Vol 142	Prélevement négatif
002KN000189 n°38 - 1 (P38)	Plan sous-sol -1 - Vol 174	Prélevement négatif
002KN000189 n°39 - 1 (P39)	Plan sous-sol -1 - Vol 175	Prélevement négatif
002KN000189 n°39 - 2 (P39)	Plan sous-sol -1 - Vol 175	Prélevement négatif
002KN000189 n°40 - 1 (P40)	Plan sous-sol -1 - Vol 166	Prélevement négatif
002KN000189 n°41 - 1 (P41)	Plan sous-sol -1 - Vol 284	Prélevement négatif
002KN000189 n°42 - 1 (P42)	Plan sous-sol -1 - Vol 152	Prélevement négatif
002KN000189 n°43 - 1 (P43)	Plan sous-sol -1 - Vol 135	Prélevement négatif
002KN000189 n°44 - 1 (P44)	Plan sous-sol -1 - Vol 138	Prélevement négatif
002KN000189 n°44 - 2 (P44)	Plan sous-sol -1 - Vol 138	Prélevement négatif
002KN000189 n°45 - 1 (P45)	Plan sous-sol -1 - Vol 176	Prélevement négatif
002KN000189 n°46 - 1 (P46)	Plan sous-sol -1 - Vol 176	Prélevement négatif
002KN000189 n°190 - 1 (P190)	Plan sous-sol -1 - Vol 156	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°282 - 1 (P282)	Plan sous-sol -1 - Vol 637	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°283 - 1 (P283)	Plan sous-sol -1 - Vol 177	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°284 - 1 (P284)	Plan sous-sol -1 - Vol 177	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°285 - 1 (P285)	Plan sous-sol -1 - Vol 178	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°286 - 1 (P286)	Plan sous-sol -1 - Vol 181	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°287 - 1 (P287)	Plan sous-sol -1 - Vol 181	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°288 - 1 (P288)	Plan sous-sol -1 - Vol 191	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°289 - 1 (P289)	Plan sous-sol -1 - Vol 191	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°290 - 1 (P290)	Plan sous-sol -1 - Vol 179	Prélevement positif
002KN000189-3 n°291 - 1 (P291)	Plan sous-sol -1 - Vol 192	Prélevement positif
002KN000189-3 n°292 - 1 (P292)	Plan sous-sol -1 - Vol 189	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°293 - 1 (P293)	Plan sous-sol -1 - Vol 165	Prélevement positif
002KN000189-3 n°294 - 1 (P294)	Plan sous-sol -1 - Vol 167	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°295 - 1 (P295)	Plan sous-sol -1 - Vol 166	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°297 - 1 (P297)	Plan sous-sol -1 - Vol 106	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°298 - 1 (P298)	Plan sous-sol -1 - Vol 86	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°299 - 1 (P299)	Plan sous-sol -1 - Vol 91	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°300 - 1 (P300)	Plan sous-sol -1 - Vol 88	Prélevement positif
002KN000189-3 n°301 - 1 (P301)	Plan sous-sol -1 - Vol 88	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°302 - 1 (P302)	Plan sous-sol -1 - Vol 87	Prélevement positif
002KN000189-3 n°303 - 1 (P303)	Plan sous-sol -1 - Vol 86	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°304 - 1 (P304)	Plan sous-sol -1 - Vol 97	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°305 - 1 (P305)	Plan sous-sol -1 - Vol 111	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°306 - 1 (P306)	Plan sous-sol -1 - Vol 111	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°307 - 1 (P307)	Plan sous-sol -1 - Vol 113	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°308 - 1 (P308)	Plan sous-sol -1 - Vol 108	Prélevement négatif

002KN000189-3 n°309 - 1 (P309)	Plan sous-sol -1 - Vol 86	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°310 - 1 (P310)	Plan sous-sol -1 - Vol 135	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°311 - 1 (P311)	Plan sous-sol -1 - Vol 135	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°312 - 1 (P312)	Plan sous-sol -1 - Vol 143	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°315 - 1 (P315)	Plan sous-sol -1 - Vol 144	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°316 - 1 (P316)	Plan sous-sol -1 - Vol 284	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°317 - 1 (P317)	Plan sous-sol -1 - Vol 92	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°318 - 1 (P318)	Plan sous-sol -1 - Vol 92	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°319 - 1 (P319)	Plan sous-sol -1 - Vol 92	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°320 - 1 (P320)	Plan sous-sol -1 - Vol 92	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°321 - 1 (P321)	Plan sous-sol -1 - Vol 194	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°322 - 1 (P322)	Plan sous-sol -1 - Vol 194	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°705 - 1 (P705)	Plan sous-sol -1 - Vol 116	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°706 - 1 (P706)	Plan sous-sol -1 - Vol 116	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°707 - 1 (P707)	Plan sous-sol -1 - Vol 116	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°708 - 1 (P708)	Plan sous-sol -1 - Vol 116	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°709 - 1 (P709)	Plan sous-sol -1 - Vol 129	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°710 - 1 (P710)	Plan sous-sol -1 - Vol 129	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°711 - 1 (P711)	Plan sous-sol -1 - Vol 129	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°712 - 1 (P712)	Plan sous-sol -1 - Vol 129	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°714 - 1 (P714)	Plan sous-sol -1 - Vol 242	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°715 - 1 (P715)	Plan sous-sol -1 - Vol 242	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°716 - 1 (P716)	Plan sous-sol -1 - Vol 242	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°788 - 1 (P788)	Plan sous-sol -1 - Vol 159 (S/B106)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°789 - 1 (P789)	Plan sous-sol -1 - Vol 159 (S/B106)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°790 - 1 (P790)	Plan sous-sol -1 - Vol 159 (S/B106)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°791 - 1 (P791)	Plan sous-sol -1 - Vol 89	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°792 - 1 (P792)	Plan sous-sol -1 - Vol 89	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°793 - 1 (P793)	Plan sous-sol -1 - Vol 128	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°794 - 1 (P794)	Plan sous-sol -1 - Vol 128	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°795 - 1 (P795)	Plan sous-sol -1 - Vol 128	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°796 - 1 (P796)	Plan sous-sol -1 - Vol 128	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°796 - 2 (P796)	Plan sous-sol -1 - Vol 128	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°797 - 1 (P797)	Plan sous-sol -1 - Vol 100	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°800 - 1 (P800)	Plan sous-sol -1 - Vol 197	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°801 - 1 (P801)	Plan sous-sol -1 - Vol 197	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°802 - 1 (P802)	Plan sous-sol -1 - Vol 197	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°803 - 1 (P803)	Plan sous-sol -1 - Vol 197	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°804 - 1 (P804)	Plan sous-sol -1 - Vol 198	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°805 - 1 (P805)	Plan sous-sol -1 - Vol 198	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°806 - 1 (P806)	Plan sous-sol -1 - Vol 187	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°807 - 1 (P807)	Plan sous-sol -1 - Vol 187	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°808 - 1 (P808)	Plan sous-sol -1 - Vol 184	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°809 - 1 (P809)	Plan sous-sol -1 - Vol 185	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°810 - 1 (P810)	Plan sous-sol -1 - Vol 187	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°811 - 1 (P811)	Plan sous-sol -1 - Vol 187	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°830 - 1 (P830)	Plan sous-sol -1 - Vol 96	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°831 - 1 (P831)	Plan sous-sol -1 - Vol 96	Prélevement négatif
	Plan sous-sol -1 - Vol 136	I14
	Plan sous-sol -1 - Vol 143	I19
	Plan sous-sol -1 - Vol 152	I20
002KN000189-5 n°918 - 1 (S2086)	Plan sous-sol -1 - Vol 1471 (G.t condamnée 1)	Présence sur marquage du matériau

002KN000189 n°1 - 1 (P1)	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	Prélevement négatif
002KN000189 n°2 - 1 (P2)	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	Prélevement négatif
002KN000189 n°3 - 1 (P3)	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	Prélevement négatif
002KN000189 n°4 - 1 (P4)	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	Prélevement négatif
002KN000189 n°5 - 1 (P5)	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	Prélevement négatif
002KN000189 n°6 - 1 (P6)	Plan sous-sol -2 - Vol 4 (Réserve DI)	Prélevement négatif
002KN000189 n°7 - 1 (P7)	Plan sous-sol -2 - Vol 15 (Esc)	Prélevement négatif
002KN000189 n°8 - 1 (P8)	Plan sous-sol -2 - Vol 15 (Esc)	Prélevement négatif
002KN000189 n°9 - 1 (P9)	Plan sous-sol -2 - Vol 24	Prélevement négatif
002KN000189 n°10 - 1 (P10)	Plan sous-sol -2 - Vol 24	Prélevement négatif
002KN000189 n°11 - 1 (P11)	Plan sous-sol -2 - Vol 2 (Parking centre)	Prélevement négatif
002KN000189 n°12 - 1 (P12)	Plan sous-sol -2 - Vol 51	Prélevement négatif
002KN000189 n°14 - 1 (P14)	Plan sous-sol -2 - Vol 46	Prélevement négatif
002KN000189 n°15 - 1 (P15)	Plan sous-sol -2 - Vol 46	Prélevement négatif
002KN000189 n°16 - 1 (P16)	Plan sous-sol -2 - Vol 37	Prélevement négatif
002KN000189 n°17 - 1 (P17)	Plan sous-sol -2 - Vol 36	Prélevement négatif
002KN000189 n°18 - 1 (P18)	Plan sous-sol -2 - Vol 52	Prélevement négatif
002KN000189 n°19 - 1 (P19)	Plan sous-sol -2 - Vol 52	Prélevement négatif
002KN000189 n°20 - 1 (P20)	Plan sous-sol -2 - Vol 32	Prélevement négatif
002KN000189 n°21 - 1 (P21)	Plan sous-sol -2 - Vol 31	Prélevement négatif
002KN000189 n°22 - 1 (P22)	Plan sous-sol -2 - Vol 31	Prélevement négatif
002KN000189 n°23 - 1 (P23)	Plan sous-sol -2 - Vol 71	Prélevement négatif
002KN000189 n°24 - 1 (P24)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Prélevement négatif
002KN000189 n°25 - 2 (P25)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Prélevement négatif
002KN000189 n°25 - 1 (P25)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Prélevement négatif
002KN000189 n°26 - 1 (P26)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Prélevement négatif
002KN000189 n°27 - 1 (P27)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Prélevement négatif
002KN000189 n°28 - 1 (P28)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Prélevement négatif
002KN000189 n°29 - 1 (P29)	Plan sous-sol -2 - Vol 252	Prélevement négatif
002KN000189 n°30 - 1 (P30)	Plan sous-sol -2 - Vol 253	Prélevement négatif
002KN000189 n°31 - 1 (P31)	Plan sous-sol -2 - Vol 253	Prélevement négatif
002KN000189 n°32 - 1 (P32)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Prélevement négatif
002KN000189 n°33 - 1 (P33)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Prélevement négatif
002KN000189 n°34 - 1 (P34)	Plan sous-sol -2 - Vol 8 (Ventilation amphi)	Prélevement négatif
002KN000189 n°35 - 1 (P35)	Plan sous-sol -2 - Vol 8 (Ventilation amphi)	Prélevement négatif

002KN000189-3 n°323 - 1 (P323)	Plan sous-sol -2 - Vol 69	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°324 - 1 (P324)	Plan sous-sol -2 - Vol 32	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°325 - 1 (P325)	Plan sous-sol -2 - Vol 79	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°326 - 1 (P326)	Plan sous-sol -2 - Vol 79	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°327 - 1 (P327)	Plan sous-sol -2 - Vol 79	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°328 - 1 (P328)	Plan sous-sol -2 - Vol 37	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°329 - 1 (P329)	Plan sous-sol -2 - Vol 46	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°331 - 1 (P331)	Plan sous-sol -2 - Vol 77	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°332 - 1 (P332)	Plan sous-sol -2 - Vol 77	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°333 - 1 (P333)	Plan sous-sol -2 - Vol 76	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°334 - 1 (P334)	Plan sous-sol -2 - Vol 57	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°335 - 1 (P335)	Plan sous-sol -2 - Vol 57	Prélevement positif
002KN000189-3 n°336 - 1 (P336)	Plan sous-sol -2 - Vol 53	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°337 - 1 (P337)	Plan sous-sol -2 - Vol 59	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°338 - 1 (P338)	Plan sous-sol -2 - Vol 59	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°339 - 1 (P339)	Plan sous-sol -2 - Vol 41	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°340 - 1 (P340)	Plan sous-sol -2 - Vol 16 (SB 207)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°341 - 1 (P341)	Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°342 - 1 (P342)	Plan sous-sol -2 - Vol 16 (SB 207)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°343 - 1 (P343)	Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°344 - 1 (P344)	Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°345 - 1 (P345)	Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°346 - 1 (P346)	Plan sous-sol -2 - Vol 25	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°348 - 1 (P348)	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	Prélevement négatif
002KN000189-3 n°748 - 1 (P748)	Plan sous-sol -2 - Vol 77	Prélevement positif
002KN000189-4 n°766 - 1 (P766)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Prélevement négatif
002KN000189-4 n°767 - 1 (P767)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°833 - 1 (P833)	Plan sous-sol -2 - Vol 82	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°834 - 1 (P834)	Plan sous-sol -2 - Vol 82	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°835 - 1 (P835)	Plan sous-sol -2 - Vol 83	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°846 - 3 (P846)	Plan sous-sol -2 - Vol 47	Prélevement négatif
002KN000189-5 n°847 - 1 (P847)	Plan sous-sol -2 - Vol 47	Prélevement négatif
	Plan sous-sol -2 - Vol 34	I15
	Plan sous-sol -2 - Vol 37	I16
	Plan sous-sol -2 - Vol 47	I22
S9 - 1 (S9)	Plan sous-sol -2 - Vol 52	Présence sur présentation de documents
S10 - 1 (S10)	Plan sous-sol -2 - Vol 46	Présence sur présentation de documents
S11 - 1 (S11)	Plan sous-sol -2 - Vol 47	Présence sur présentation de documents
S12 - 1 (S12)	Plan sous-sol -2 - Vol 47	Présence sur présentation de documents
S78 - 1 (S78)	Plan sous-sol -2 - Vol 73	Absence sur présentation de documents
S91 - 1 (S91)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S92 - 1 (S92)	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S1802 - 1 (S1802)	Plan sous-sol -2 - Vol 73	Présence sur présentation de documents
S1803 - 1 (S1803)	Plan sous-sol -2 - Vol 73	Présence sur présentation de documents



002KN000189 n°1 - 1 (P1) - Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)



002KN000189 n°2 - 1 (P2) - Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)




002KN000189 n°3 - 1 (P3) - Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)



002KN000189 n°4 - 1 (P4) - Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)



002KN000189 n°5 - 1 (P5) - Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)

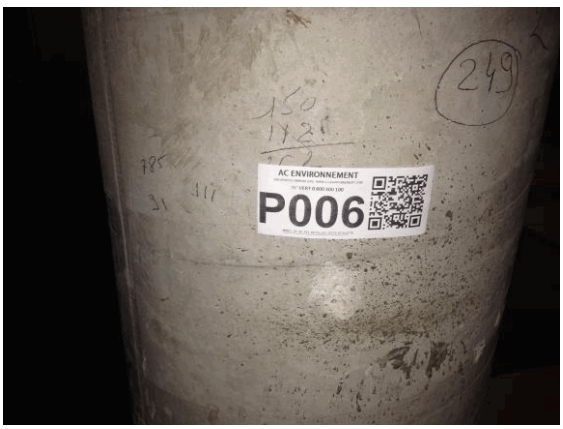

002KN000189 n°6 - 1 (P6) - Plan sous-sol -2 - Vol 4 (Réserve DI)



002KN000189 n°7 - 1 (P7) - Plan sous-sol -2 - Vol 15 (Esc)



002KN000189 n°8 - 1 (P8) - Plan sous-sol -2 - Vol 15 (Esc)



002KN000189 n°9 - 1 (P9) - Plan sous-sol -2 - Vol 24



)02KN000189 n°10 - 1 (P10) - Plan sous-sol -2 - Vol 2



002KN000189 n°11 - 1 (P11) - Plan sous-sol -2 - Vol 2 (Parking centre)



)02KN000189 n°12 - 1 (P12) - Plan sous-sol -2 - Vol 5



002KN000189 n°14 - 1 (P14) - Plan sous-sol -2 - Vol 46



)02KN000189 n°15 - 1 (P15) - Plan sous-sol -2 - Vol 4(



002KN000189 n°16 - 1 (P16) - Plan sous-sol -2 - Vol 37




)02KN000189 n°17 - 1 (P17) - Plan sous-sol -2 - Vol 3(




002KN000189 n°18 - 1 (P18) - Plan sous-sol -2 - Vol 52



)02KN000189 n°19 - 1 (P19) - Plan sous-sol -2 - Vol 5(

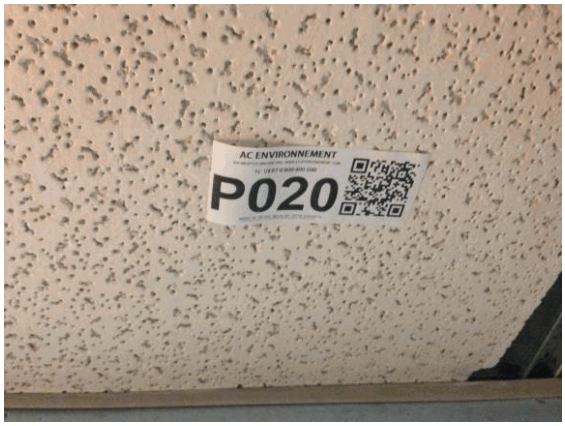

002KN000189 n°20 - 1 (P20) - Plan sous-sol -2 - Vol 32

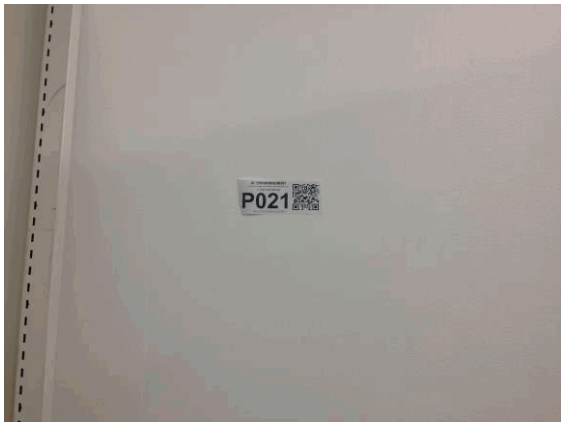

)02KN000189 n°21 - 1 (P21) - Plan sous-sol -2 - Vol 3



002KN000189 n°22 - 1 (P22) - Plan sous-sol -2 - Vol 31



)02KN000189 n°23 - 1 (P23) - Plan sous-sol -2 - Vol 7



)02KN000189 n°24 - 1 (P24) - Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)



002KN000189 n°25 - 2 (P25) - Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)



)02KN000189 n°25 - 1 (P25) - Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)



002KN000189 n°26 - 1 (P26) - Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)



)02KN000189 n°27 - 1 (P27) - Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)



002KN000189 n°28 - 1 (P28) - Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)



)02KN000189 n°29 - 1 (P29) - Plan sous-sol -2 - Vol 252




002KN000189 n°30 - 1 (P30) - Plan sous-sol -2 - Vol 253



)02KN000189 n°31 - 1 (P31) - Plan sous-sol -2 - Vol 253



002KN000189 n°32 - 1 (P32) - Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)

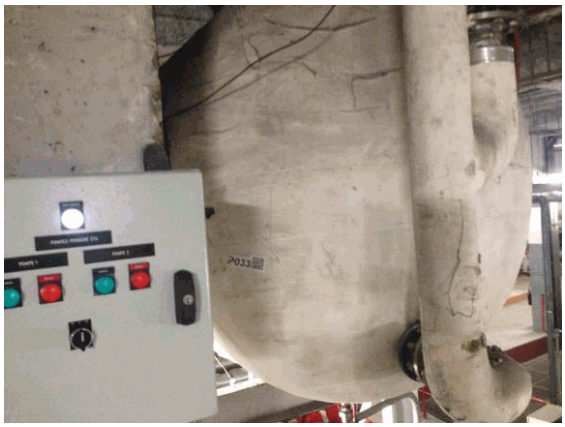

)02KN000189 n°33 - 1 (P33) - Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)



002KN000189 n°34 - 1 (P34) - Plan sous-sol -2 - Vol 8 (Ventilation amphi)



002KN000189 n°35 - 1 (P35) - Plan sous-sol -2 - Vol 8 (Ventilation amphi)



002KN000189 n°36 - 1 (P36) - Plan sous-sol -1 - Vol 142



)02KN000189 n°37 - 1 (P37) - Plan sous-sol -1 - Vol 142



002KN000189 n°38 - 1 (P38) - Plan sous-sol -1 - Vol 174




)02KN000189 n°39 - 1 (P39) - Plan sous-sol -1 - Vol 175



002KN000189 n°39 - 2 (P39) - Plan sous-sol -1 - Vol 175




)02KN000189 n°40 - 1 (P40) - Plan sous-sol -1 - Vol 166

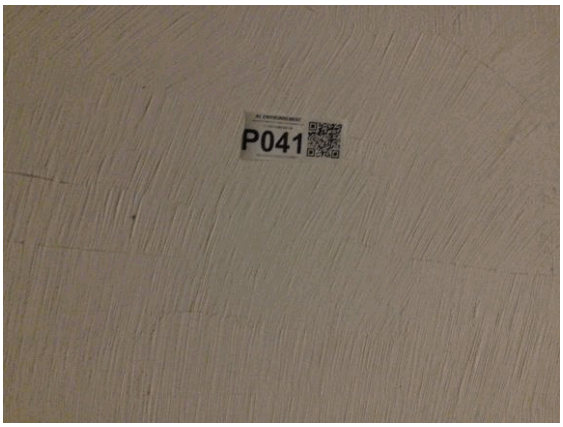

002KN000189 n°41 - 1 (P41) - Plan sous-sol -1 - Vol 284



)02KN000189 n°42 - 1 (P42) - Plan sous-sol -1 - Vol 152

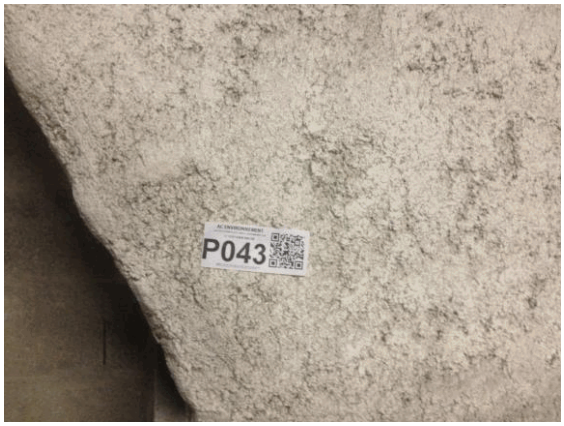

002KN000189 n°43 - 1 (P43) - Plan sous-sol -1 - Vol 135



)02KN000189 n°44 - 1 (P44) - Plan sous-sol -1 - Vol 138



002KN000189 n°44 - 2 (P44) - Plan sous-sol -1 - Vol 138



)02KN000189 n°45 - 1 (P45) - Plan sous-sol -1 - Vol 176



002KN000189 n°46 - 1 (P46) - Plan sous-sol -1 - Vol 176



)02KN000189 n°47 - 1 (P47) - Plan Rdc - Vol 285 (P026



002KN000189 n°48 - 1 (P48) - Plan Rdc - Vol 285 (P026)



)02KN000189 n°49 - 1 (P49) - Plan Rdc - Vol 285 (P026



002KN000189 n°50 - 1 (P50) - Plan Rdc - Vol 285 (P026)




)02KN000189 n°51 - 1 (P51) - Plan Rdc - Vol 285 (P026



002KN000189 n°52 - 1 (P52) - Plan Rdc - Vol 285 (P026)




)02KN000189 n°53 - 1 (P53) - Plan Rdc - Vol 285 (P026

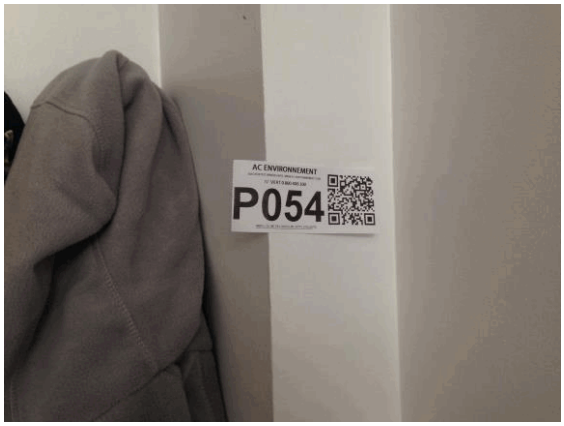

002KN000189 n°54 - 1 (P54) - Plan Rdc - Vol 285 (P026)



)02KN000189 n°55 - 1 (P55) - Plan R+1 - Vol 276 (P115

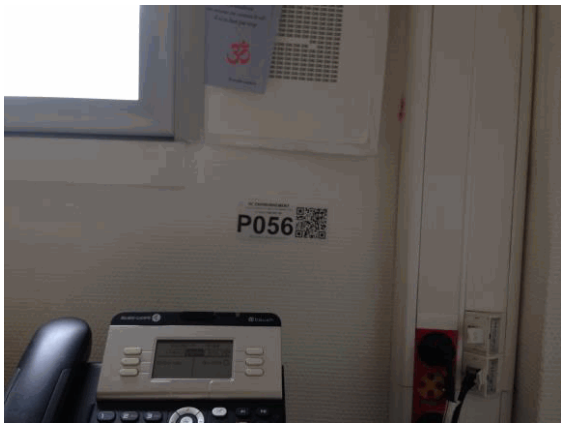

002KN000189 n°56 - 1 (P56) - Plan R+1 - Vol 276 (P115)



)02KN000189 n°57 - 1 (P57) - Plan R+1 - Vol 276 (P115



002KN000189 n°58 - 1 (P58) - Plan R+1 - Vol 276 (P115)



)02KN000189 n°59 - 1 (P59) - Plan R+2 - Vol 286 (P209



002KN000189 n°60 - 1 (P60) - Plan R+2 - Vol 286 (P209)



)02KN000189 n°61 - 1 (P61) - Plan R+2 - Vol 286 (P209



002KN000189 n°62 - 1 (P62) - Plan R+2 - Vol 286 (P209)



)02KN000189 n°63 - 1 (P63) - Plan R+2 - Vol 286 (P209



002KN000189 n°64 - 1 (P64) - Plan R+2 - Vol 287



002KN000189 n°65 - 1 (P65) - Plan R+2 - Vol 287



002KN000189 n°66 - 1 (P66) - Plan R+2 - Vol 287



002KN000189 n°67 - 1 (P67) - Plan R+3 - Vol 288




002KN000189 n°68 - 1 (P68) - Plan R+3 - Vol 288



)02KN000189 n°69 - 1 (P69) - Plan R+3 - Vol 289 (P321



002KN000189 n°70 - 1 (P70) - Plan R+3 - Vol 289 (P321)

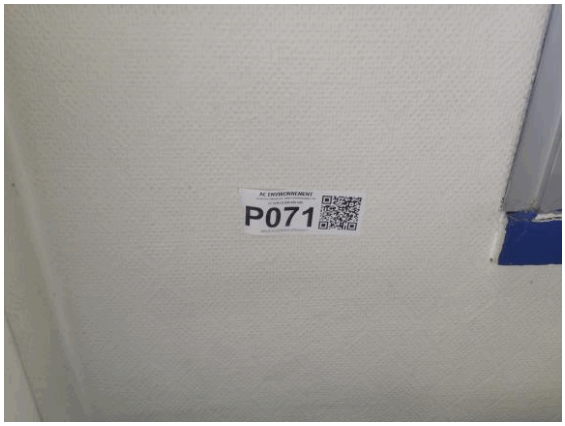

)02KN000189 n°71 - 1 (P71) - Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)



002KN000189 n°72 - 1 (P72) - Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)



)02KN000189 n°73 - 1 (P73) - Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)



002KN000189 n°74 - 1 (P74) - Plan R+4 - Vol 291 (P427)



)02KN000189 n°75 - 1 (P75) - Plan R+4 - Vol 291 (P427



002KN000189 n°76 - 1 (P76) - Plan R+4 - Vol 291 (P427)



)02KN000189 n°77 - 1 (P77) - Plan R+4 - Vol 291 (P427



002KN000189 n°78 - 1 (P78) - Plan R+5 - Vol 292 (P517)




)02KN000189 n°79 - 1 (P79) - Plan R+5 - Vol 292 (P517




002KN000189 n°80 - 1 (P80) - Plan R+5 - Vol 292 (P517)



)02KN000189 n°81 - 1 (P81) - Plan R+5 - Vol 294 (P535

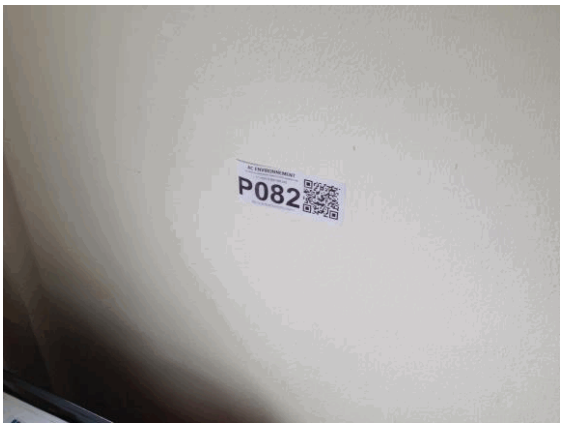

002KN000189 n°82 - 1 (P82) - Plan R+5 - Vol 294 (P535)

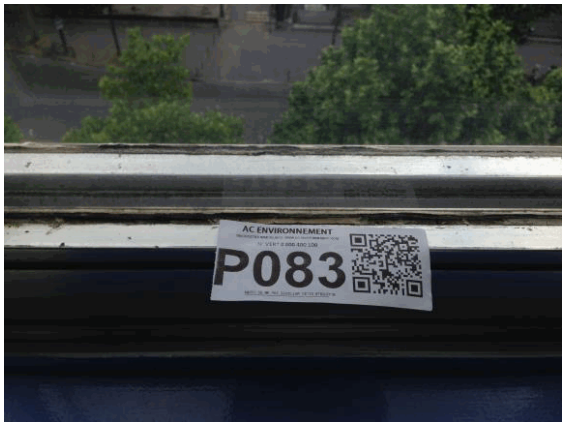

)02KN000189 n°83 - 1 (P83) - Plan R+5 - Vol 294 (P535



002KN000189 n°84 - 1 (P84) - Plan R+6 - Vol 295



002KN000189 n°85 - 1 (P85) - Plan R+6 - Vol 295



002KN000189 n°86 - 1 (P86) - Plan R+6 - Vol 295



002KN000189 n°87 - 1 (P87) - Plan R+6 - Vol 297



002KN000189 n°88 - 1 (P88) - Plan R+6 - Vol 297



002KN000189 n°89 - 1 (P89) - Plan R+6 - Vol 297




002KN000189 n°90 - 1 (P90) - Plan Rdc - Vol 320 (B026)



)02KN000189 n°91 - 1 (P91) - Plan Rdc - Vol 320 (B026



002KN000189 n°92 - 1 (P92) - Plan Rdc - Vol 320 (B026)

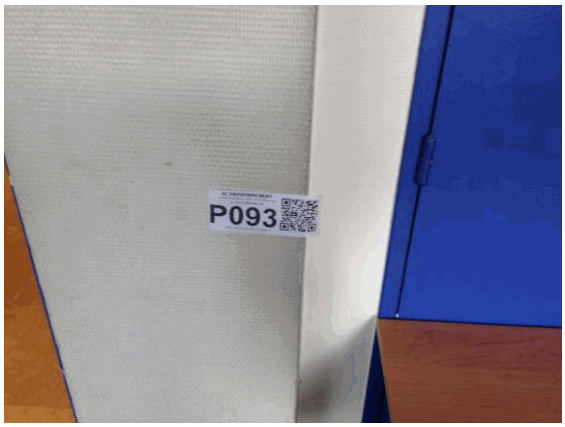

)02KN000189 n°93 - 1 (P93) - Plan Rdc - Vol 320 (B026



002KN000189 n°94 - 1 (P94) - Plan R+1 - Vol 321 (B105)



)02KN000189 n°95 - 1 (P95) - Plan R+1 - Vol 321 (B105



002KN000189 n°96 - 1 (P96) - Plan R+1 - Vol 321 (B105)



)02KN000189 n°97 - 1 (P97) - Plan R+1 - Vol 321 (B105




002KN000189 n°98 - 1 (P98) - Plan R+1 - Vol 321 (B105)



)02KN000189 n°99 - 1 (P99) - Plan R+2 - Vol 322 (B212



002KN000189 n°100 - 1 (P100) - Plan R+2 - Vol 322 (B212)

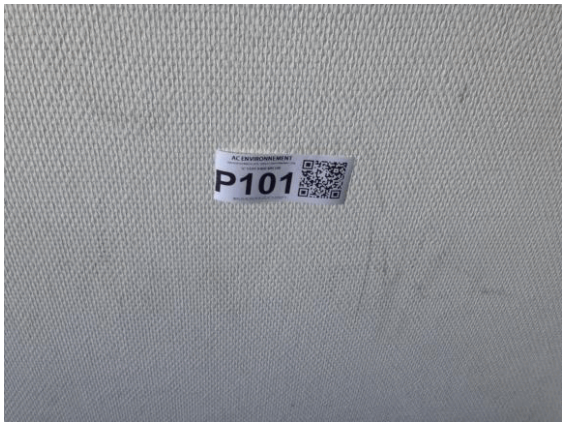


002KN000189 n°101 - 1 (P101) - Plan R+2 - Vol 322 (B212)



002KN000189 n°102 - 1 (P102) - Plan R+2 - Vol 322 (B212)



002KN000189 n°103 - 1 (P103) - Plan R+2 - Vol 324 (B223)

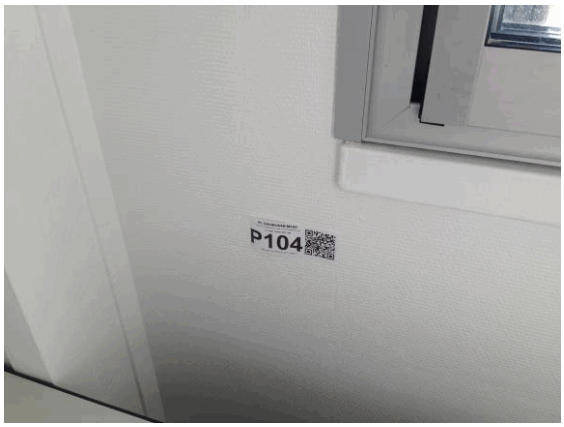

002KN000189 n°104 - 1 (P104) - Plan R+2 - Vol 324 (B223)



002KN000189 n°105 - 1 (P105) - Plan R+2 - Vol 324 (B223)



002KN000189 n°106 - 1 (P106) - Plan R+2 - Vol 324 (B223)



002KN000189 n°107 - 1 (P107) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)



002KN000189 n°108 - 1 (P108) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)



002KN000189 n°109 - 1 (P109) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)



002KN000189 n°110 - 1 (P110) - Plan R+4 - Vol 326 (B408)



002KN000189 n°111 - 1 (P111) - Plan R+4 - Vol 326 (B408)



002KN000189 n°112 - 1 (P112) - Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)



002KN000189 n°113 - 1 (P113) - Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)



002KN000189 n°114 - 1 (P114) - Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)



002KN000189 n°115 - 1 (P115) - Plan R+5 - Vol 328 (B530)



002KN000189 n°116 - 1 (P116) - Plan R+5 - Vol 328 (B530)



002KN000189 n°117 - 1 (P117) - Plan R+5 - Vol 328 (B530)



002KN000189 n°118 - 1 (P118) - Plan R+6 - Vol 330 (B606)



002KN000189 n°119 - 1 (P119) - Plan R+6 - Vol 330 (B606)



002KN000189 n°120 - 1 (P120) - Plan R+6 - Vol 330 (B606)



002KN000189 n°121 - 1 (P121) - Plan R+6 - Vol 332 (B644)



002KN000189 n°122 - 1 (P122) - Plan R+6 - Vol 332 (B644)




002KN000189 n°123 - 1 (P123) - Plan R+6 - Vol 332 (B644)



002KN000189 n°124 - 1 (P124) - Plan R+6 - Vol 333 (C614)



002KN000189 n°125 - 1 (P125) - Plan R+6 - Vol 333 (C614)

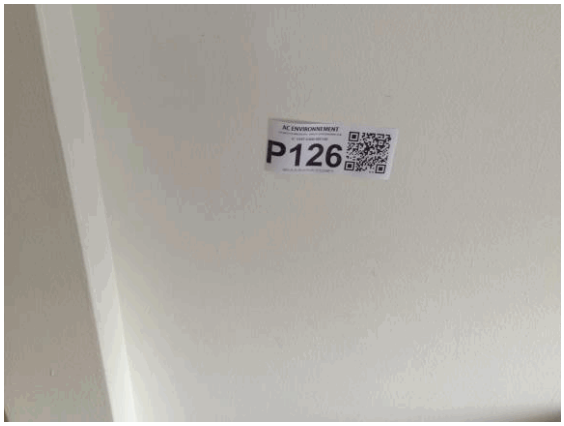

002KN000189 n°126 - 1 (P126) - Plan R+6 - Vol 333 (C614)



002KN000189 n°127 - 1 (P127) - Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)




002KN000189 n°128 - 1 (P128) - Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)



002KN000189 n°129 - 1 (P129) - Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)



002KN000189 n°130 - 1 (P130) - Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)

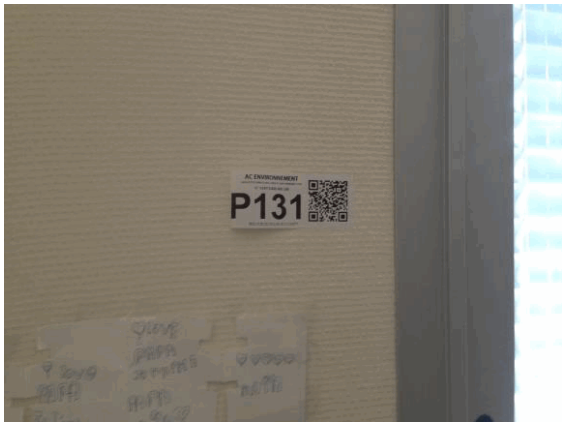

002KN000189 n°131 - 1 (P131) - Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)



002KN000189 n°132 - 1 (P132) - Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)




002KN000189 n°133 - 1 (P133) - Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)



002KN000189 n°134 - 1 (P134) - Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)



002KN000189 n°135 - 1 (P135) - Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)

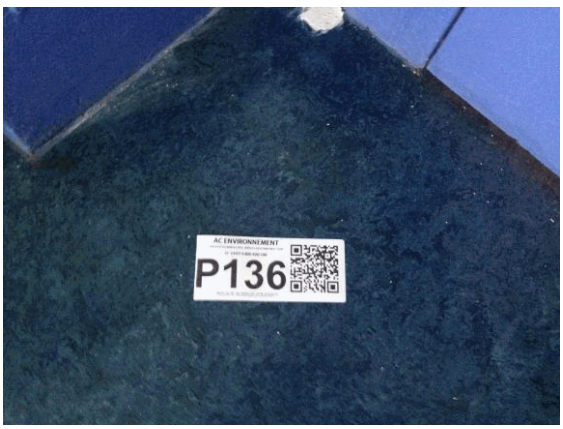


002KN000189 n°136 - 1 (P136) - Plan R+5 - Vol 336 (D512)



002KN000189 n°137 - 1 (P137) - Plan R+5 - Vol 336 (D512)



002KN000189 n°138 - 1 (P138) - Plan R+5 - Vol 336 (D512)

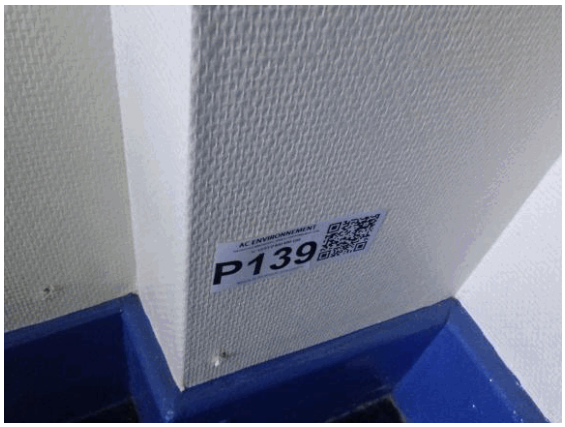

002KN000189 n°139 - 1 (P139) - Plan R+5 - Vol 336 (D512)



002KN000189 n°140 - 1 (P140) - Plan R+5 - Vol 337 (B516)



002KN000189 n°141 - 1 (P141) - Plan R+5 - Vol 337 (B516)



002KN000189 n°142 - 1 (P142) - Plan R+5 - Vol 337 (B516)




002KN000189 n°143 - 1 (P143) - Plan R+5 - Vol 337 (B516)



002KN000189 n°144 - 1 (P144) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)



002KN000189 n°145 - 1 (P145) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)

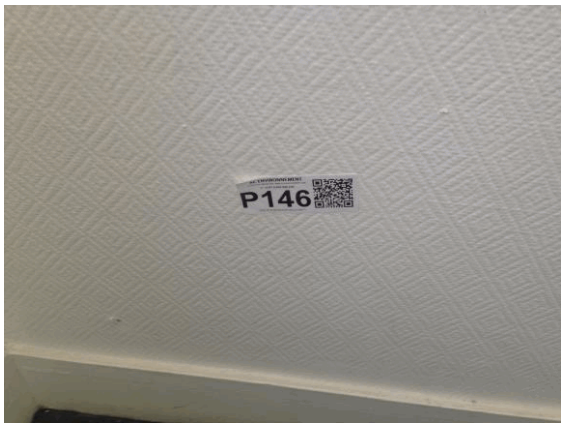

002KN000189 n°146 - 1 (P146) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)



002KN000189 n°147 - 1 (P147) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)



002KN000189 n°148 - 1 (P148) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)




002KN000189 n°149 - 1 (P149) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)



002KN000189 n°150 - 1 (P150) - Plan R+4 - Vol 339 (D409)



002KN000189 n°151 - 1 (P151) - Plan R+4 - Vol 339 (D409)

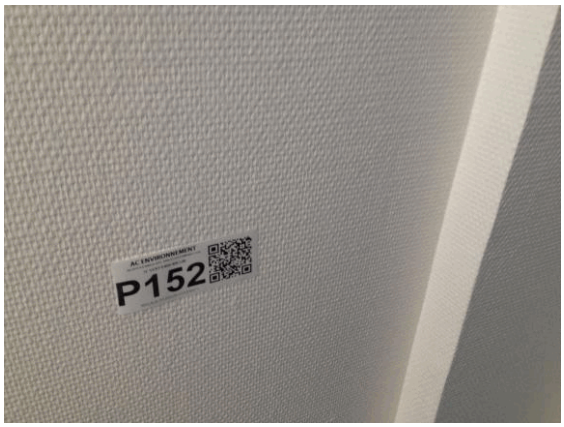

002KN000189 n°152 - 1 (P152) - Plan R+4 - Vol 339 (D409)



002KN000189 n°153 - 1 (P153) - Plan R+4 - Vol 339 (D409)



002KN000189 n°154 - 1 (P154) - Plan R+4 - Vol 339 (D409)



002KN000189 n°155 - 1 (P155) - Plan R+4 - Vol 340 (D414)



002KN000189 n°156 - 1 (P156) - Plan R+4 - Vol 340 (D414)



002KN000189 n°157 - 1 (P157) - Plan R+4 - Vol 340 (D414)



002KN000189 n°158 - 1 (P158) - Plan R+4 - Vol 340 (D414)



002KN000189 n°159 - 1 (P159) - Plan R+4 - Vol 340 (D414)




002KN000189 n°160 - 1 (P160) - Plan R+4 - Vol 341 (C408)



002KN000189 n°161 - 1 (P161) - Plan R+4 - Vol 341 (C408)



002KN000189 n°162 - 1 (P162) - Plan R+4 - Vol 341 (C408)

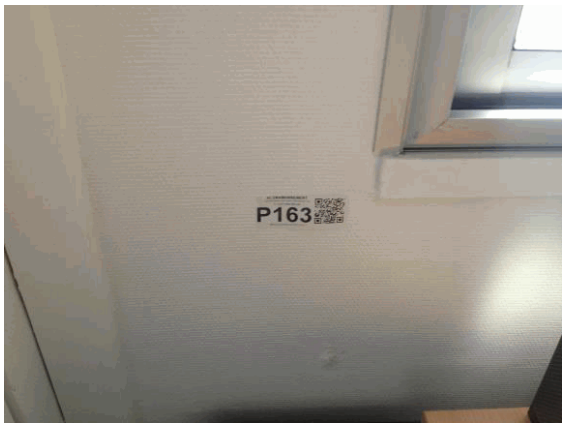

002KN000189 n°163 - 1 (P163) - Plan R+1 - Vol 342 (P171)



002KN000189 n°164 - 1 (P164) - Plan R+1 - Vol 342 (P171)



002KN000189 n°165 - 1 (P165) - Plan R+1 - Vol 342 (P171)



002KN000189 n°166 - 1 (P166) - Plan R+1 - Vol 342 (P171)



002KN000189 n°167 - 1 (P167) - Plan R+1 - Vol 343 (D111)



002KN000189 n°168 - 1 (P168) - Plan R+1 - Vol 343 (D111)




002KN000189 n°169 - 1 (P169) - Plan R+1 - Vol 343 (D111)



002KN000189 n°170 - 1 (P170) - Plan R+1 - Vol 343 (D111)



002KN000189 n°171 - 1 (P171) - Plan R+1 - Vol 344 (D110)

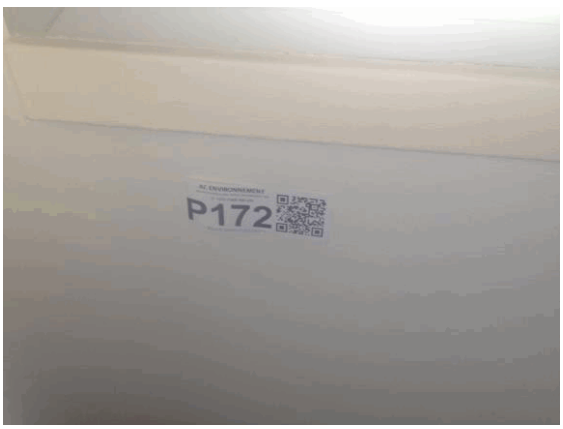

002KN000189 n°172 - 1 (P172) - Plan R+1 - Vol 344 (D110)



002KN000189 n°173 - 1 (P173) - Plan R+1 - Vol 344 (D110)



002KN000189 n°174 - 1 (P174) - Plan R+1 - Vol 344 (D110)



002KN000189 n°175 - 1 (P175) - Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)




002KN000189 n°176 - 2 (P176) - Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)



002KN000189 n°176 - 1 (P176) - Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)



002KN000189 n°177 - 1 (P177) - Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)

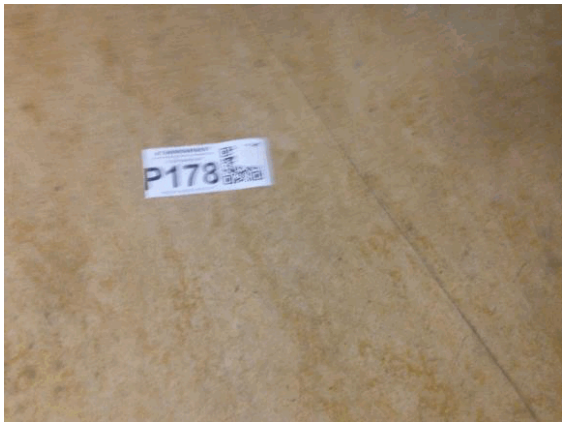

002KN000189 n°178 - 1 (P178) - Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)




002KN000189 n°179 - 1 (P179) - Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)



002KN000189 n°180 - 1 (P180) - Plan Rdc - Vol 264



002KN000189 n°181 - 1 (P181) - Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)

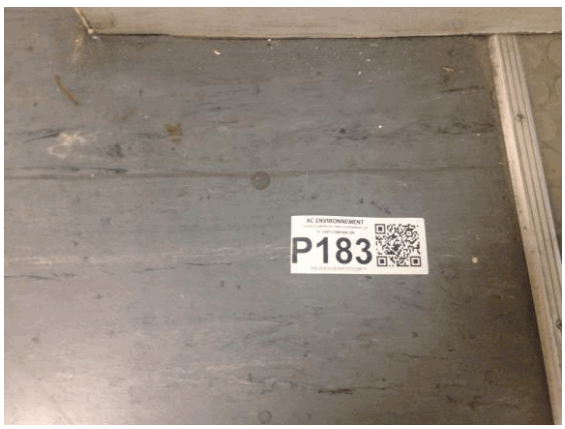

002KN000189 n°183 - 1 (P183) - Plan R+2 - Vol 349 (Palier et escalier)



002KN000189 n°184 - 1 (P184) - Plan R+2 - Vol 349 (Palier et escalier)




002KN000189 n°185 - 1 (P185) - Plan R+4 - Vol 351
(Palier et escalier)




002KN000189 n°186 - 1 (P186) - Plan R+4 - Vol 351
(Palier et escalier)




002KN000189 n°186 - 2 (P186) - Plan R+4 - Vol 351
(Palier et escalier)

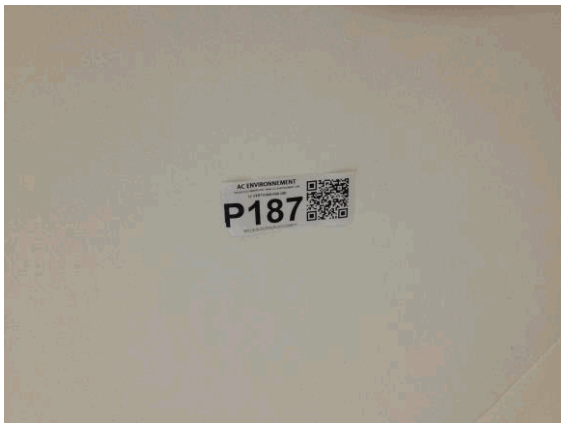


002KN000189 n°187 - 1 (P187) - Plan R+4 - Vol 351
(Palier et escalier)

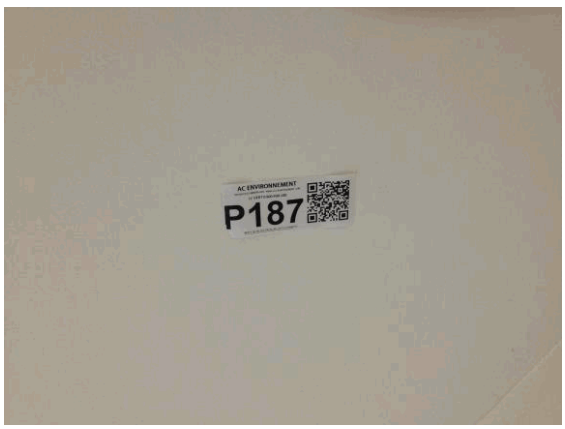

002KN000189 n°187 - 2 (P187) - Plan R+4 - Vol 351
(Palier et escalier)

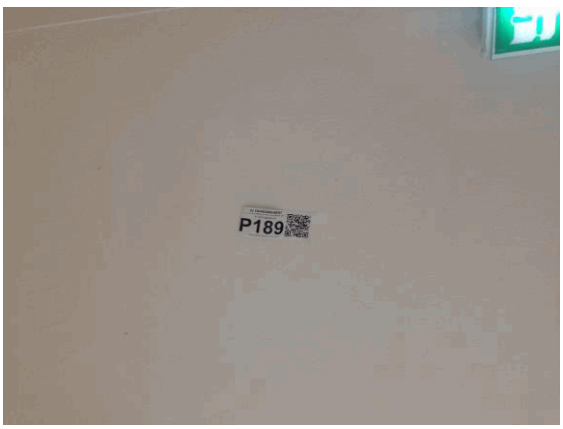

002KN000189 n°189 - 2 (P189) - Plan R+6 - Vol 353
(Palier et escalier)

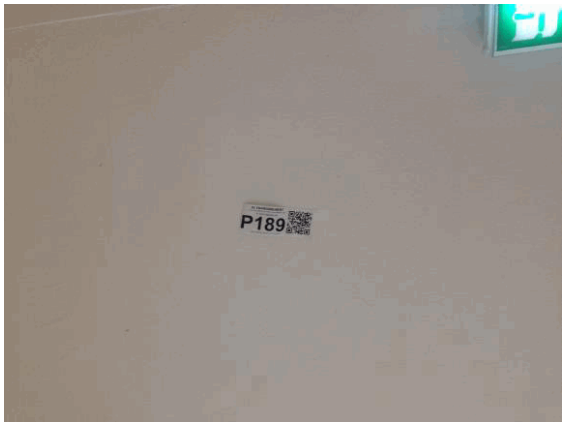

002KN000189 n°189 - 1 (P189) - Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)



002KN000189 n°190 - 1 (P190) - Plan sous-sol -1 - Vo 156




002KN000189 n°191 - 1 (P191) - Plan R+6 - Vol 360



002KN000189 n°192 - 1 (P192) - Plan R+6 - Vol 360



002KN000189 n°193 - 1 (P193) - Plan R+6 - Vol 359

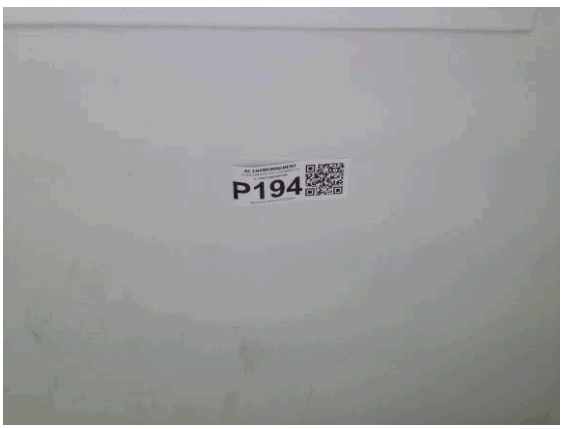

002KN000189 n°194 - 1 (P194) - Plan R+6 - Vol 359



002KN000189 n°195 - 1 (P195) - Plan R+6 - Vol 359



002KN000189 n°196 - 1 (P196) - Plan R+6 - Vol 359



002KN000189 n°197 - 1 (P197) - Plan R+6 - Vol 359



002KN000189 n°198 - 1 (P198) - Plan R+6 - Vol 360



002KN000189 n°199 - 1 (P199) - Plan R+6 - Vol 360



002KN000189 n°200 - 1 (P200) - Plan R+6 - Vol 362



002KN000189 n°201 - 1 (P201) - Plan R+4 - Vol 363



002KN000189 n°202 - 1 (P202) - Plan R+4 - Vol 363



002KN000189 n°203 - 1 (P203) - Plan R+4 - Vol 364



002KN000189 n°204 - 1 (P204) - Plan R+4 - Vol 364




002KN000189 n°205 - 1 (P205) - Plan R+3 - Vol 372



002KN000189 n°206 - 1 (P206) - Plan R+2 - Vol 376



002KN000189 n°207 - 1 (P207) - Plan R+2 - Vol 374

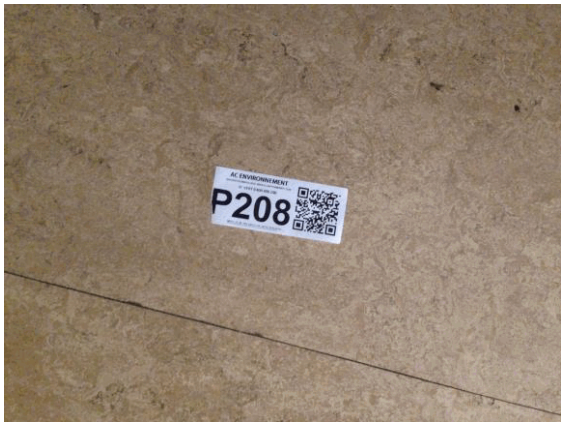

002KN000189 n°208 - 1 (P208) - Plan R+2 - Vol 375



002KN000189 n°209 - 1 (P209) - Plan R+2 - Vol 376



002KN000189 n°210 - 1 (P210) - Plan R+2 - Vol 376



002KN000189 n°211 - 1 (P211) - Plan R+2 - Vol 375



002KN000189 n°212 - 1 (P212) - Plan R+4 - Vol 363



002KN000189 n°213 - 1 (P213) - Plan R+2 - Vol 375



002KN000189 n°214 - 1 (P214) - Plan R+4 - Vol 363



002KN000189 n°215 - 1 (P215) - Plan R+1 - Vol 378




002KN000189 n°216 - 1 (P216) - Plan Rdc - Vol 382



002KN000189 n°217 - 1 (P217) - Plan Rdc - Vol 385




002KN000189 n°218 - 1 (P218) - Plan Rdc - Vol 355

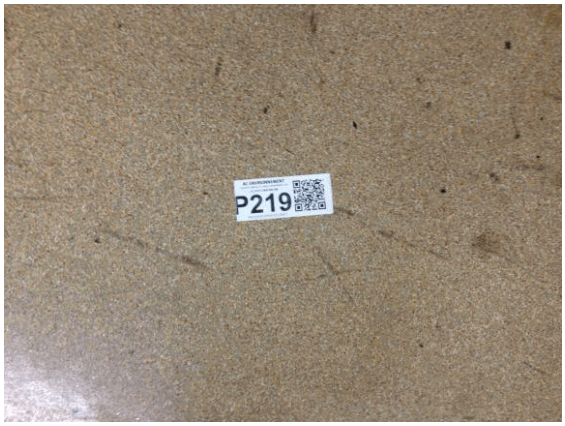

002KN000189 n°219 - 1 (P219) - Plan R+5 - Vol 387



002KN000189 n°220 - 1 (P220) - Plan R+4 - Vol 388

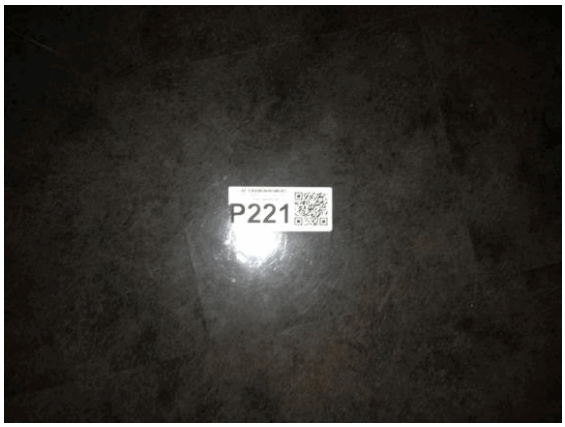

002KN000189 n°221 - 1 (P221) - Plan R+4 - Vol 389



002KN000189 n°222 - 1 (P222) - Plan R+3 - Vol 390



002KN000189-1 n°223 - 1 (P223) - Plan R+7 - Vol 610



002KN000189-1 n°224 - 1 (P224) - Plan R+7 - Vol 611



002KN000189-1 n°225 - 1 (P225) - Plan R+7 - Vol 610



002KN000189-1 n°226 - 1 (P226) - Plan R+7 - Vol 612



002KN000189-1 n°227 - 1 (P227) - Plan R+7 - Vol 612



002KN000189-1 n°228 - 1 (P228) - Plan R+7 - Vol 612



002KN000189-1 n°229 - 1 (P229) - Plan R+7 - Vol 612



002KN000189-1 n°230 - 1 (P230) - Plan R+7 - Vol 613



002KN000189-1 n°231 - 1 (P231) - Plan R+7 - Vol 613



002KN000189-1 n°232 - 1 (P232) - Plan R+7 - Vol 612




002KN000189-1 n°233 - 1 (P233) - Plan R+7 - Vol 614



002KN000189-1 n°234 - 1 (P234) - Plan R+7 - Vol 615



002KN000189-1 n°235 - 1 (P235) - Plan R+7 - Vol 618

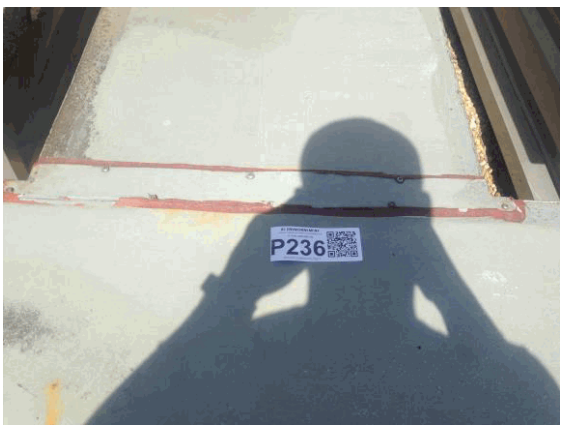

002KN000189-1 n°236 - 1 (P236) - Plan R+7 - Vol 620




002KN000189-1 n°237 - 1 (P237) - Plan R+7 - Vol 611



002KN000189-1 n°238 - 1 (P238) - Plan R+7 - Vol 623



002KN000189-1 n°239 - 1 (P239) - Plan R+7 - Vol 623

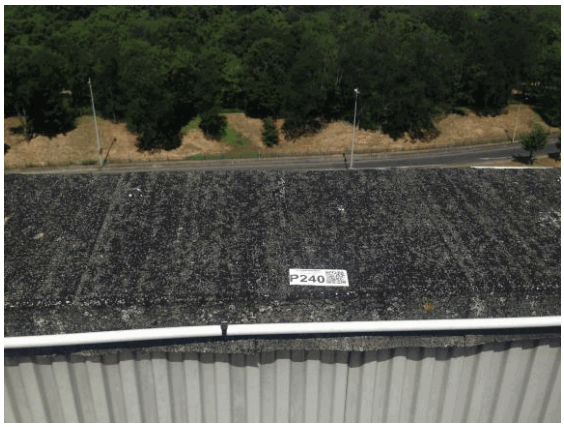

002KN000189-1 n°240 - 1 (P240) - Plan R+7 - Vol 623



002KN000189-1 n°241 - 2 (P241) - Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)



002KN000189-1 n°241 - 1 (P241) - Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)



002KN000189-1 n°242 - 1 (P242) - Plan R+5 - Vol 387



002KN000189-1 n°243 - 1 (P243) - Plan R+4 - Vol 388




002KN000189-1 n°244 - 1 (P244) - Plan R+6 - Vol 624



002KN000189-1 n°245 - 1 (P245) - Plan R+3 - Vol 390



002KN000189-1 n°246 - 1 (P246) - Plan R+1 - Vol 626

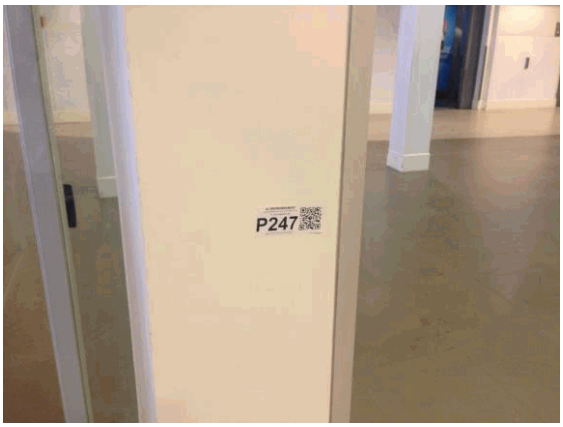

002KN000189-1 n°247 - 1 (P247) - Plan Rdc - Vol 627



002KN000189-1 n°248 - 1 (P248) - Plan R+7 - Vol 632



002KN000189-1 n°249 - 1 (P249) - Plan R+7 - Vol 632



002KN000189-1 n°250 - 1 (P250) - Plan R+7 - Vol 632



002KN000189-1 n°251 - 1 (P251) - Plan R+7 - Vol 628



002KN000189-1 n°252 - 1 (P252) - Plan R+7 - Vol 630



002KN000189-1 n°253 - 1 (P253) - Plan R+7 - Vol 630



002KN000189-1 n°254 - 1 (P254) - Plan R+7 - Vol 631



002KN000189-1 n°255 - 1 (P255) - Plan R+7 - Vol 631



002KN000189-1 n°256 - 1 (P256) - Plan R+7 - Vol 631



002KN000189-1 n°256 - 2 (P256) - Plan R+7 - Vol 631



002KN000189-1 n°258 - 1 (P258) - Plan façade intérieur Vol 634 (Façade intérieur)



002KN000189-1 n°259 - 1 (P259) - Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur)



)02KN000189-1 n°260 - 1 (P260) - Plan façade extérieu - Vol 633 (Façade extérieur)



002KN000189-1 n°260 - 2 (P260) - Plan façade extérieur - Vol 633 (Façade extérieur)



)02KN000189-1 n°261 - 1 (P261) - Plan façade extérieu - Vol 633 (Façade extérieur)



002KN000189-1 n°261 - 2 (P261) - Plan façade extérieur - Vol 633 (Façade extérieur)



002KN000189-2 n°262 - 1 (P262) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)



002KN000189-2 n°263 - 1 (P263) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)




002KN000189-2 n°264 - 1 (P264) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)



002KN000189-2 n°265 - 1 (P265) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)



002KN000189-2 n°265 - 2 (P265) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)

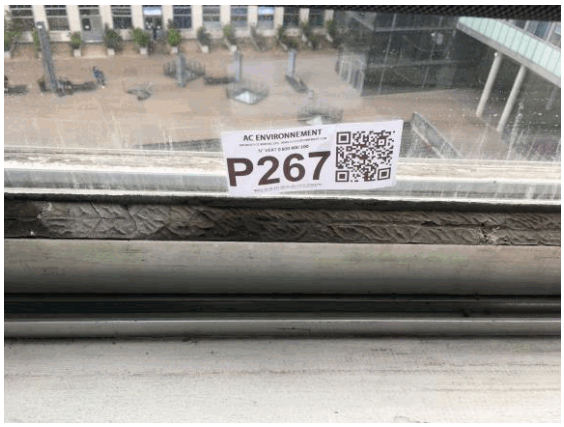

002KN000189-2 n°267 - 1 (P267) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)



002KN000189-2 n°268 - 1 (P268) - Plan Rdc - Vol 627



002KN000189-2 n°269 - 1 (P269) - Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)



002KN000189-2 n°270 - 1 (P270) - Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)



002KN000189-2 n°271 - 1 (P271) - Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)



002KN000189-2 n°272 - 1 (P272) - Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)



002KN000189-2 n°273 - 1 (P273) - Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)




002KN000189-2 n°274 - 1 (P274) - Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)



002KN000189-2 n°275 - 1 (P275) - Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)



002KN000189-2 n°276 - 1 (P276) - Plan R+5 - Vol 635
(Escaliers)

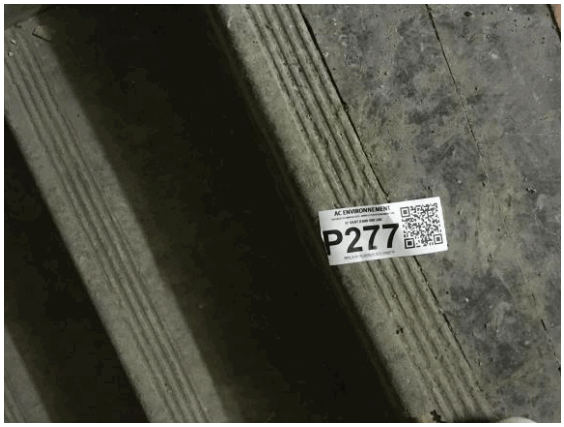

002KN000189-2 n°277 - 1 (P277) - Plan R+5 - Vol 635
(Escaliers)




002KN000189-2 n°278 - 1 (P278) - Plan R+5 - Vol 636
Salle de reunion



002KN000189-2 n°279 - 1 (P279) - Plan R+5 - Vol 636
Salle de reunion



002KN000189-2 n°280 - 1 (P280) - Plan R+5 - Vol 636
Salle de reunion

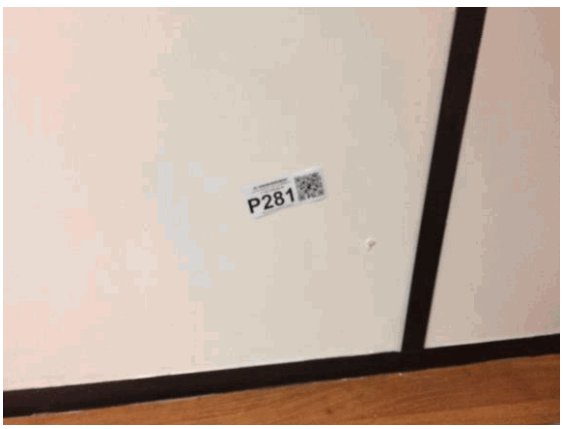

002KN000189-2 n°281 - 1 (P281) - Plan R+5 - Vol 636
Salle de reunion



)02KN000189-3 n°282 - 1 (P282) - Plan sous-sol -1 - Vo 637



002KN000189-3 n°283 - 1 (P283) - Plan sous-sol -1 - Vol 177



)02KN000189-3 n°284 - 1 (P284) - Plan sous-sol -1 - Vo 177



002KN000189-3 n°285 - 1 (P285) - Plan sous-sol -1 - Vol 178



)02KN000189-3 n°286 - 1 (P286) - Plan sous-sol -1 - Vo 181



002KN000189-3 n°287 - 1 (P287) - Plan sous-sol -1 - Vol 181



)02KN000189-3 n°288 - 1 (P288) - Plan sous-sol -1 - Vo 191




002KN000189-3 n°289 - 1 (P289) - Plan sous-sol -1 - Vol 191



)02KN000189-3 n°290 - 1 (P290) - Plan sous-sol -1 - Vo 179



002KN000189-3 n°291 - 1 (P291) - Plan sous-sol -1 - Vol 192

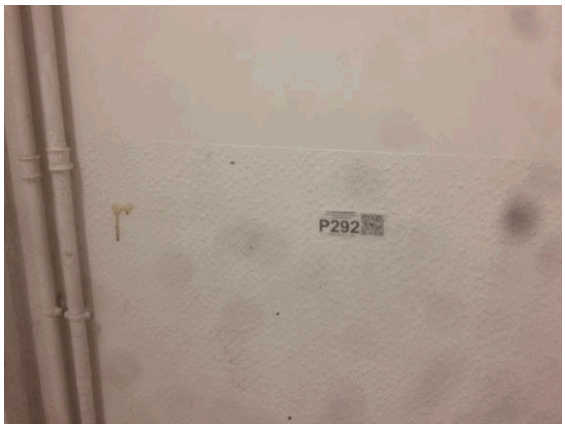

)02KN000189-3 n°292 - 1 (P292) - Plan sous-sol -1 - Vo 189



002KN000189-3 n°293 - 1 (P293) - Plan sous-sol -1 - Vol 165



)02KN000189-3 n°294 - 1 (P294) - Plan sous-sol -1 - Vo 167



002KN000189-3 n°295 - 1 (P295) - Plan sous-sol -1 - Vol 166




)02KN000189-3 n°297 - 1 (P297) - Plan sous-sol -1 - Vo 106



002KN000189-3 n°298 - 1 (P298) - Plan sous-sol -1 - Vol 86



)02KN000189-3 n°299 - 1 (P299) - Plan sous-sol -1 - Vo 91

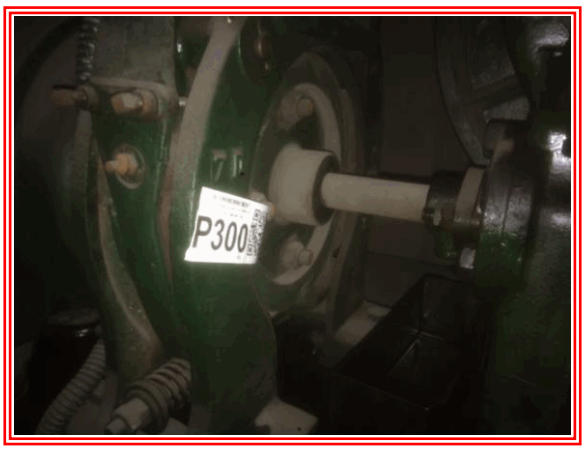

002KN000189-3 n°300 - 1 (P300) - Plan sous-sol -1 - Vol 88



)02KN000189-3 n°301 - 1 (P301) - Plan sous-sol -1 - Vo 88



002KN000189-3 n°302 - 1 (P302) - Plan sous-sol -1 - Vol 87



)02KN000189-3 n°303 - 1 (P303) - Plan sous-sol -1 - Vo 86




002KN000189-3 n°304 - 1 (P304) - Plan sous-sol -1 - Vol 97



)02KN000189-3 n°305 - 1 (P305) - Plan sous-sol -1 - Vo 111



002KN000189-3 n°306 - 1 (P306) - Plan sous-sol -1 - Vol 111

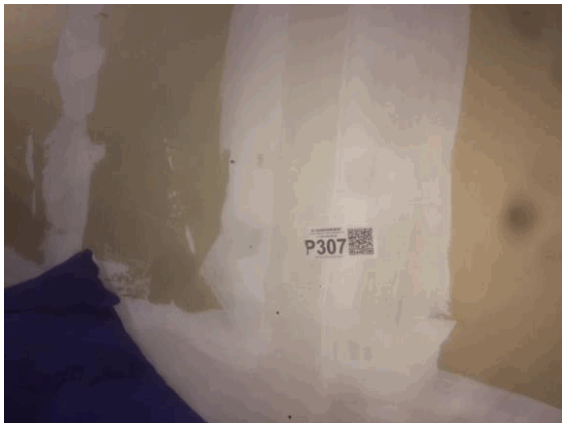

)02KN000189-3 n°307 - 1 (P307) - Plan sous-sol -1 - Vo 113



002KN000189-3 n°308 - 1 (P308) - Plan sous-sol -1 - Vol 108



)02KN000189-3 n°309 - 1 (P309) - Plan sous-sol -1 - Vo 86




002KN000189-3 n°310 - 1 (P310) - Plan sous-sol -1 - Vol 135



)02KN000189-3 n°311 - 1 (P311) - Plan sous-sol -1 - Vo 135



002KN000189-3 n°312 - 1 (P312) - Plan sous-sol -1 - Vol 143

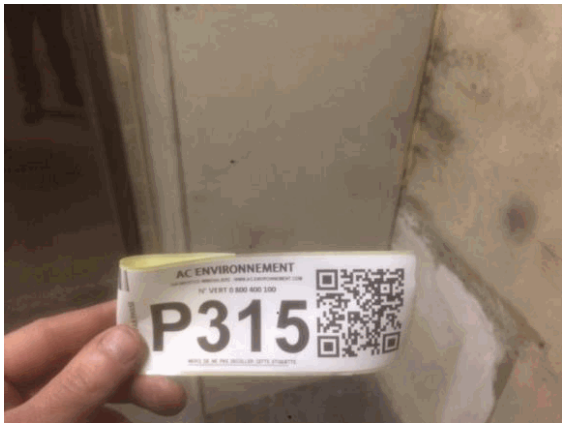

)02KN000189-3 n°315 - 1 (P315) - Plan sous-sol -1 - Vo 144



002KN000189-3 n°316 - 1 (P316) - Plan sous-sol -1 - Vol 284



)02KN000189-3 n°317 - 1 (P317) - Plan sous-sol -1 - Vo 92



002KN000189-3 n°318 - 1 (P318) - Plan sous-sol -1 - Vol 92



)02KN000189-3 n°319 - 1 (P319) - Plan sous-sol -1 - Vo 92



002KN000189-3 n°320 - 1 (P320) - Plan sous-sol -1 - Vol 92



)02KN000189-3 n°321 - 1 (P321) - Plan sous-sol -1 - Vo 194




002KN000189-3 n°322 - 1 (P322) - Plan sous-sol -1 - Vol 194



)02KN000189-3 n°323 - 1 (P323) - Plan sous-sol -2 - Vo 69



002KN000189-3 n°324 - 1 (P324) - Plan sous-sol -2 - Vol 32

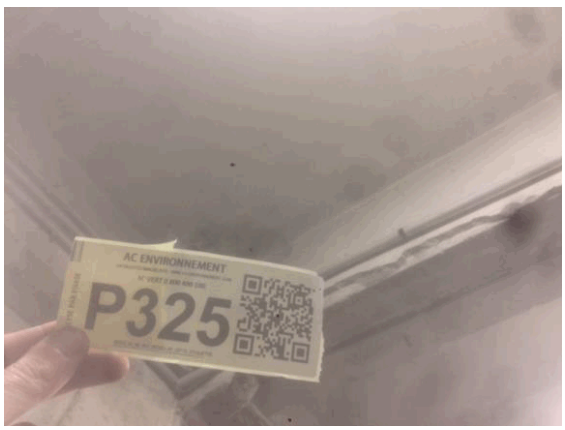

)02KN000189-3 n°325 - 1 (P325) - Plan sous-sol -2 - Vo 79



002KN000189-3 n°326 - 1 (P326) - Plan sous-sol -2 - Vol 79



)02KN000189-3 n°327 - 1 (P327) - Plan sous-sol -2 - Vo 79



002KN000189-3 n°328 - 1 (P328) - Plan sous-sol -2 - Vol 37



)02KN000189-3 n°329 - 1 (P329) - Plan sous-sol -2 - Vo 46



002KN000189-3 n°331 - 1 (P331) - Plan sous-sol -2 - Vol 77



)02KN000189-3 n°332 - 1 (P332) - Plan sous-sol -2 - Vo 77



002KN000189-3 n°333 - 1 (P333) - Plan sous-sol -2 - Vol 76



)02KN000189-3 n°334 - 1 (P334) - Plan sous-sol -2 - Vo 57



002KN000189-3 n°335 - 1 (P335) - Plan sous-sol -2 - Vol 57



)02KN000189-3 n°336 - 1 (P336) - Plan sous-sol -2 - Vo 53



002KN000189-3 n°337 - 1 (P337) - Plan sous-sol -2 - Vol 59



)02KN000189-3 n°338 - 1 (P338) - Plan sous-sol -2 - Vo 59




002KN000189-3 n°339 - 1 (P339) - Plan sous-sol -2 - Vol 41



)02KN000189-3 n°340 - 1 (P340) - Plan sous-sol -2 - Vo 16 (SB 207)



002KN000189-3 n°341 - 1 (P341) - Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)

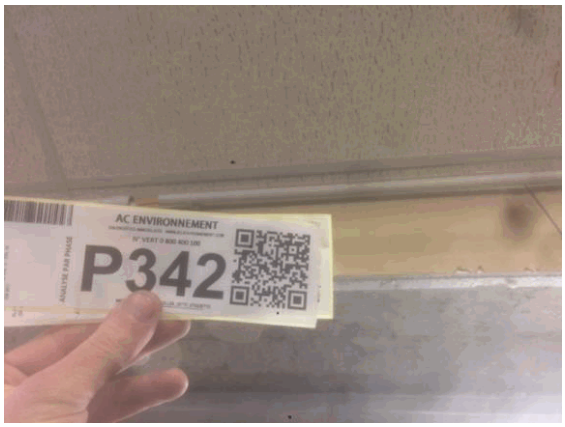

)02KN000189-3 n°342 - 1 (P342) - Plan sous-sol -2 - Vo 16 (SB 207)



002KN000189-3 n°343 - 1 (P343) - Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)



)02KN000189-3 n°344 - 1 (P344) - Plan sous-sol -2 - Vo 17 (SB 209)



002KN000189-3 n°345 - 1 (P345) - Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)



)02KN000189-3 n°346 - 1 (P346) - Plan sous-sol -2 - Vo 25



002KN000189-3 n°348 - 1 (P348) - Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)



002KN000189-3 n°349 - 1 (P349) - Plan Rdc - Vol 652 (Bureaux 12)



002KN000189-3 n°350 - 1 (P350) - Plan Rdc - Vol 654 (Bureaux 14)



002KN000189-3 n°351 - 1 (P351) - Plan Rdc - Vol 654 (Bureaux 14)



002KN000189-3 n°352 - 1 (P352) - Plan Rdc - Vol 653 (Bureaux 13)



002KN000189-3 n°353 - 1 (P353) - Plan Rdc - Vol 384




002KN000189-3 n°354 - 1 (P354) - Plan Rdc - Vol 384



002KN000189-3 n°355 - 1 (P355) - Plan Rdc - Vol 384



002KN000189-3 n°356 - 1 (P356) - Plan Rdc - Vol 384

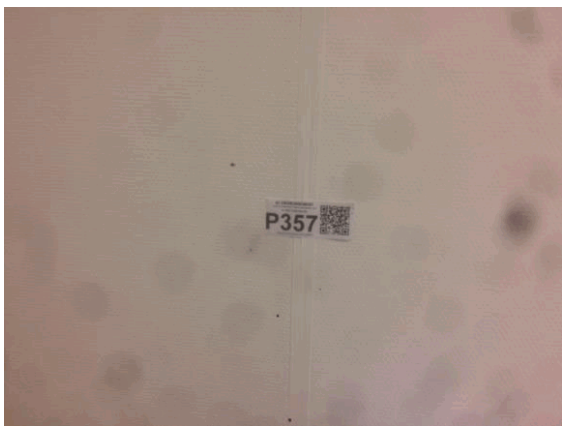

002KN000189-3 n°357 - 1 (P357) - Plan Rdc - Vol 661



002KN000189-3 n°358 - 1 (P358) - Plan Rdc - Vol 661



002KN000189-3 n°359 - 1 (P359) - Plan Rdc - Vol 320 (B026)



002KN000189-3 n°360 - 1 (P360) - Plan Rdc - Vol 382



002KN000189-3 n°361 - 1 (P361) - Plan Rdc - Vol 320 (B026)



002KN000189-3 n°362 - 1 (P362) - Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)



002KN000189-3 n°363 - 1 (P363) - Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)



002KN000189-3 n°364 - 1 (P364) - Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)



002KN000189-3 n°365 - 1 (P365) - Plan Rdc - Vol 655 (B028)



002KN000189-3 n°366 - 1 (P366) - Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)



002KN000189-3 n°367 - 1 (P367) - Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)



002KN000189-3 n°368 - 1 (P368) - Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)



002KN000189-3 n°369 - 1 (P369) - Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)



002KN000189-3 n°370 - 1 (P370) - Plan Rdc - Vol 666 (Infirmerie 2)



002KN000189-3 n°371 - 1 (P371) - Plan Rdc - Vol 666 (Infirmerie 2)



002KN000189-3 n°372 - 1 (P372) - Plan Rdc - Vol 666 (Infirmerie 2)



002KN000189-3 n°374 - 1 (P374) - Plan Rdc - Vol 664



002KN000189-3 n°375 - 1 (P375) - Plan Rdc - Vol 664



002KN000189-3 n°376 - 1 (P376) - Plan Rdc - Vol 385



002KN000189-3 n°377 - 1 (P377) - Plan Rdc - Vol 385



002KN000189-3 n°378 - 1 (P378) - Plan Rdc - Vol 669



002KN000189-3 n°379 - 1 (P379) - Plan Rdc - Vol 669



002KN000189-3 n°380 - 1 (P380) - Plan Rdc - Vol 673 (C005)



002KN000189-3 n°381 - 1 (P381) - Plan Rdc - Vol 673 (C005)



002KN000189-3 n°382 - 1 (P382) - Plan Rdc - Vol 673 (C005)



002KN000189-3 n°383 - 1 (P383) - Plan Rdc - Vol 675



002KN000189-3 n°384 - 1 (P384) - Plan Rdc - Vol 681



002KN000189-3 n°385 - 1 (P385) - Plan Rdc - Vol 682



002KN000189-3 n°386 - 1 (P386) - Plan Rdc - Vol 688



002KN000189-3 n°387 - 1 (P387) - Plan Rdc - Vol 671



002KN000189-3 n°388 - 1 (P388) - Plan Rdc - Vol 671




002KN000189-3 n°389 - 1 (P389) - Plan Rdc - Vol 671



002KN000189-3 n°390 - 1 (P390) - Plan Rdc - Vol 671



002KN000189-3 n°391 - 1 (P391) - Plan Rdc - Vol 692

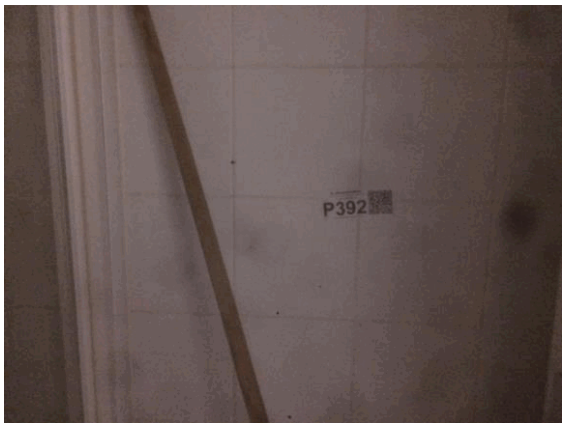

002KN000189-3 n°392 - 1 (P392) - Plan Rdc - Vol 692



002KN000189-3 n°393 - 1 (P393) - Plan Rdc - Vol 692



002KN000189-3 n°395 - 1 (P395) - Plan Rdc - Vol 696 (Sureté)



002KN000189-3 n°396 - 1 (P396) - Plan Rdc - Vol 696 (Sureté)



002KN000189-3 n°397 - 1 (P397) - Plan Rdc - Vol 702



002KN000189-3 n°398 - 1 (P398) - Plan Rdc - Vol 705



002KN000189-3 n°399 - 1 (P399) - Plan Rdc - Vol 708




002KN000189-3 n°400 - 1 (P400) - Plan Rdc - Vol 708



002KN000189-3 n°401 - 1 (P401) - Plan Rdc - Vol 708



002KN000189-3 n°402 - 1 (P402) - Plan Rdc - Vol 649 (Couloir 4)

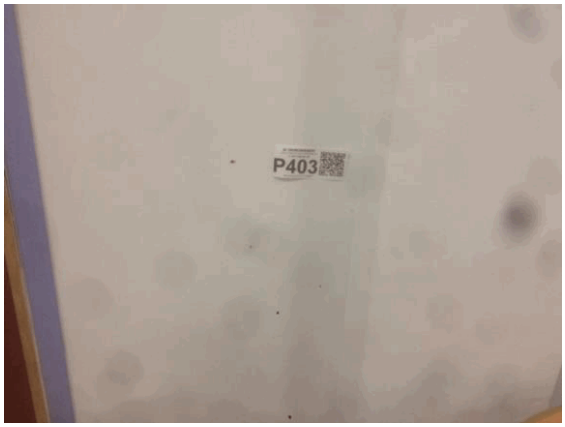

002KN000189-3 n°403 - 1 (P403) - Plan Rdc - Vol 649 (Couloir 4)



002KN000189-3 n°404 - 1 (P404) - Plan Rdc - Vol 644 (Couloir 2)



002KN000189-3 n°405 - 1 (P405) - Plan Rdc - Vol 710



002KN000189-3 n°406 - 1 (P406) - Plan Rdc - Vol 710



002KN000189-3 n°407 - 1 (P407) - Plan Rdc - Vol 710



002KN000189-3 n°408 - 1 (P408) - Plan Rdc - Vol 710



002KN000189-3 n°409 - 1 (P409) - Plan Rdc - Vol 641



002KN000189-3 n°410 - 1 (P410) - Plan Rdc - Vol 266



002KN000189-3 n°411 - 1 (P411) - Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)



002KN000189-3 n°412 - 1 (P412) - Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)



002KN000189-3 n°413 - 1 (P413) - Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)



002KN000189-3 n°414 - 1 (P414) - Plan Rdc - Vol 259



002KN000189-3 n°415 - 1 (P415) - Plan Rdc - Vol 266



002KN000189-3 n°416 - 1 (P416) - Plan Rdc - Vol 711



002KN000189-3 n°417 - 1 (P417) - Plan Rdc - Vol 712



002KN000189-3 n°418 - 1 (P418) - Plan Rdc - Vol 712




002KN000189-3 n°419 - 1 (P419) - Plan Rdc - Vol 712




002KN000189-3 n°420 - 1 (P420) - Plan Rdc - Vol 712




002KN000189-3 n°421 - 1 (P421) - Plan Rdc - Vol 714

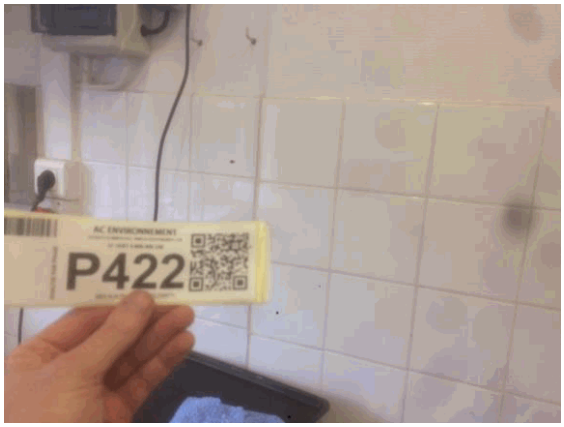

002KN000189-3 n°422 - 1 (P422) - Plan Rdc - Vol 714

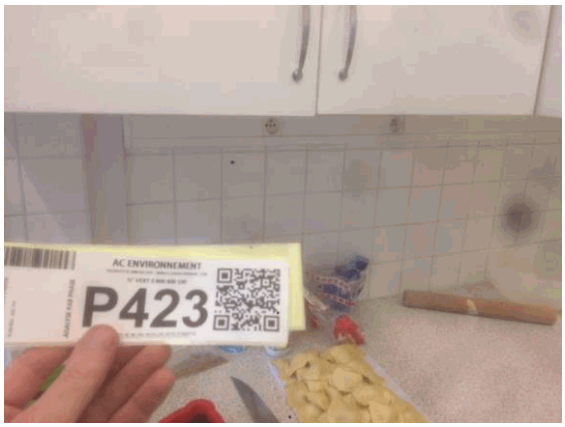

002KN000189-3 n°423 - 1 (P423) - Plan Rdc - Vol 714

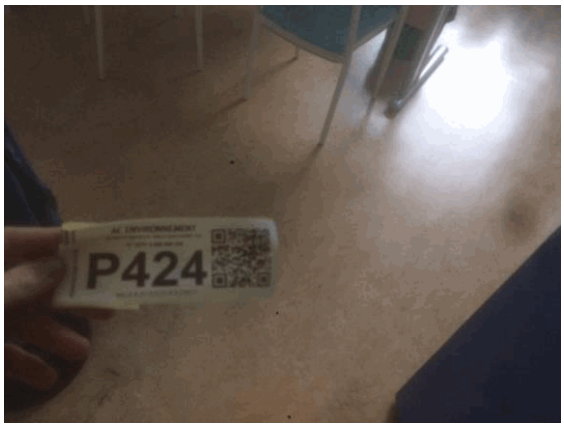

002KN000189-3 n°424 - 1 (P424) - Plan Rdc - Vol 716



002KN000189-3 n°426 - 1 (P426) - Plan Rdc - Vol 256



002KN000189-3 n°427 - 1 (P427) - Plan R+1 - Vol 799




002KN000189-3 n°428 - 1 (P428) - Plan R+1 - Vol 799



002KN000189-3 n°429 - 1 (P429) - Plan R+1 - Vol 799



002KN000189-3 n°430 - 1 (P430) - Plan R+1 - Vol 821

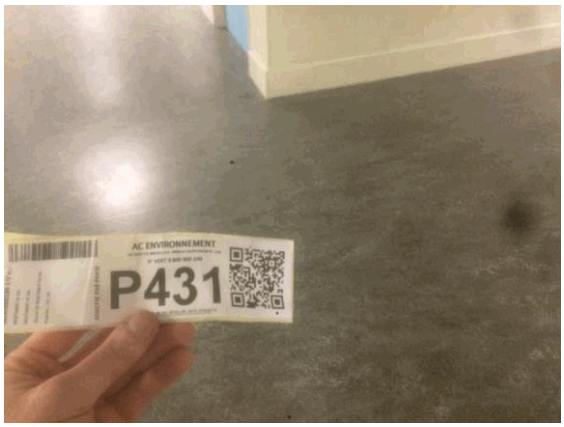

002KN000189-3 n°431 - 1 (P431) - Plan R+1 - Vol 776



002KN000189-3 n°432 - 1 (P432) - Plan R+1 - Vol 758



002KN000189-3 n°433 - 1 (P433) - Plan R+1 - Vol 758



002KN000189-3 n°434 - 1 (P434) - Plan R+1 - Vol 786



002KN000189-3 n°435 - 1 (P435) - Plan R+1 - Vol 760



002KN000189-3 n°436 - 1 (P436) - Plan R+1 - Vol 784



002KN000189-3 n°437 - 1 (P437) - Plan R+1 - Vol 776



002KN000189-3 n°438 - 1 (P438) - Plan R+1 - Vol 429



002KN000189-3 n°439 - 1 (P439) - Plan R+1 - Vol 429



002KN000189-3 n°440 - 1 (P440) - Plan R+1 - Vol 429



002KN000189-3 n°441 - 1 (P441) - Plan R+1 - Vol 823




002KN000189-3 n°442 - 1 (P442) - Plan R+1 - Vol 823




002KN000189-3 n°443 - 1 (P443) - Plan R+1 - Vol 813




002KN000189-3 n°444 - 1 (P444) - Plan R+1 - Vol 837

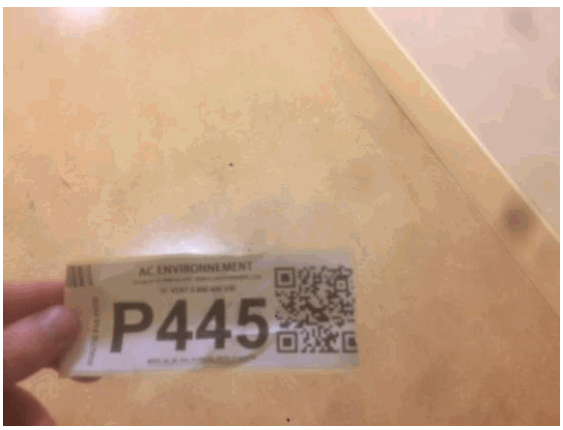


002KN000189-3 n°445 - 1 (P445) - Plan R+1 - Vol 822

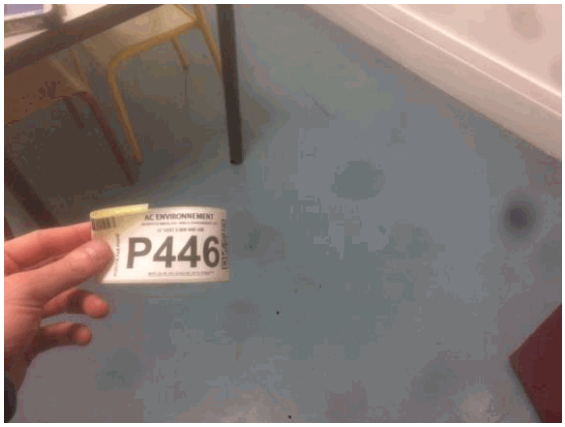

002KN000189-3 n°446 - 1 (P446) - Plan R+1 - Vol 751

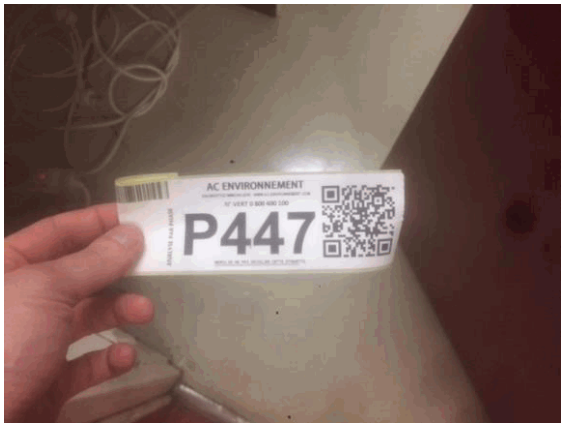

002KN000189-3 n°447 - 1 (P447) - Plan R+1 - Vol 752

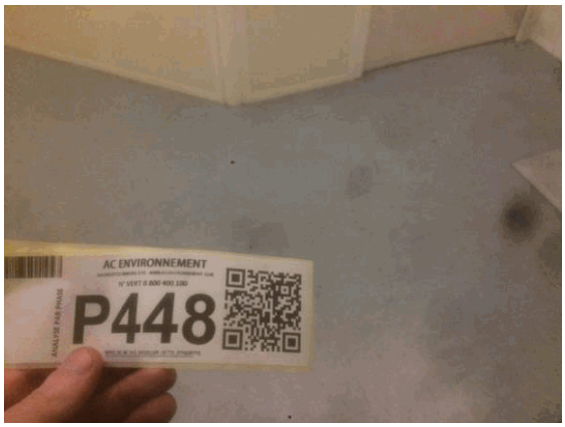

002KN000189-3 n°448 - 1 (P448) - Plan R+2 - Vol 842



002KN000189-3 n°449 - 1 (P449) - Plan R+2 - Vol 843




002KN000189-3 n°450 - 1 (P450) - Plan R+2 - Vol 855



002KN000189-3 n°451 - 1 (P451) - Plan R+2 - Vol 855



002KN000189-3 n°452 - 1 (P452) - Plan R+2 - Vol 855

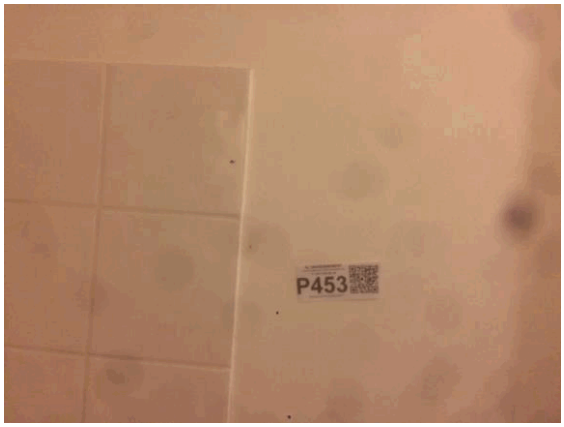

002KN000189-3 n°453 - 1 (P453) - Plan R+2 - Vol 855



002KN000189-3 n°454 - 1 (P454) - Plan R+2 - Vol 847



002KN000189-3 n°455 - 1 (P455) - Plan R+2 - Vol 845



002KN000189-3 n°456 - 1 (P456) - Plan R+2 - Vol 845



002KN000189-3 n°457 - 1 (P457) - Plan R+2 - Vol 845



002KN000189-3 n°458 - 1 (P458) - Plan R+2 - Vol 848



002KN000189-3 n°459 - 1 (P459) - Plan R+2 - Vol 848



002KN000189-3 n°460 - 1 (P460) - Plan R+2 - Vol 848



002KN000189-3 n°461 - 1 (P461) - Plan R+2 - Vol 848



002KN000189-3 n°462 - 1 (P462) - Plan R+2 - Vol 847



002KN000189-3 n°463 - 1 (P463) - Plan R+2 - Vol 847




002KN000189-3 n°464 - 1 (P464) - Plan R+2 - Vol 847




002KN000189-3 n°465 - 1 (P465) - Plan R+2 - Vol 847



002KN000189-3 n°466 - 1 (P466) - Plan R+2 - Vol 625

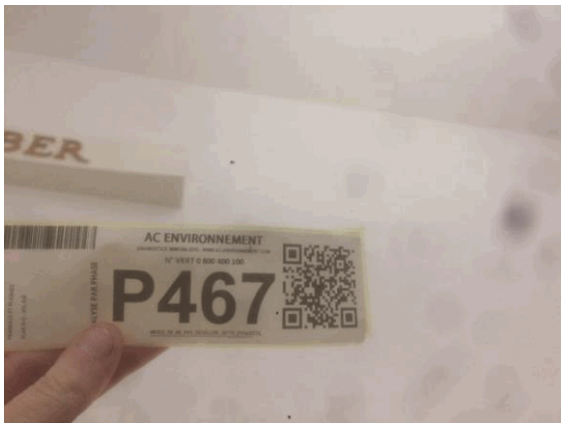

002KN000189-3 n°467 - 1 (P467) - Plan R+2 - Vol 625

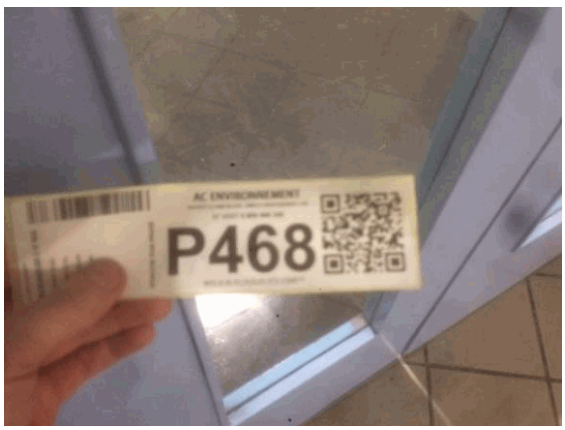

002KN000189-3 n°468 - 1 (P468) - Plan R+2 - Vol 859



002KN000189-3 n°469 - 1 (P469) - Plan R+2 - Vol 859



002KN000189-3 n°470 - 1 (P470) - Plan R+2 - Vol 862



002KN000189-3 n°471 - 1 (P471) - Plan R+2 - Vol 863



002KN000189-3 n°472 - 1 (P472) - Plan R+2 - Vol 864



002KN000189-3 n°473 - 1 (P473) - Plan R+2 - Vol 886



002KN000189-3 n°474 - 1 (P474) - Plan R+2 - Vol 886



002KN000189-3 n°475 - 1 (P475) - Plan R+2 - Vol 881



002KN000189-3 n°476 - 1 (P476) - Plan R+2 - Vol 876




002KN000189-3 n°477 - 1 (P477) - Plan R+2 - Vol 876



002KN000189-3 n°478 - 1 (P478) - Plan R+2 - Vol 876




002KN000189-3 n°479 - 1 (P479) - Plan R+2 - Vol 908

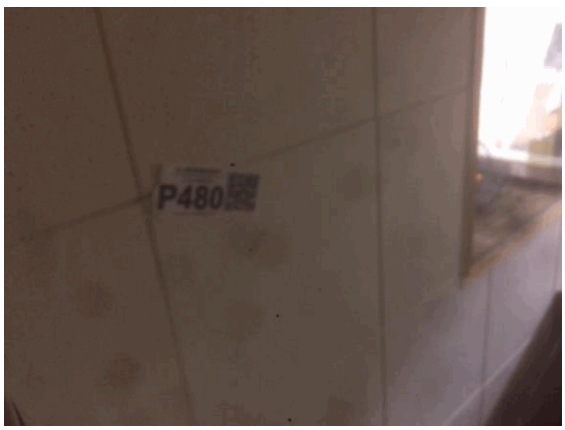

002KN000189-3 n°480 - 1 (P480) - Plan R+2 - Vol 893



002KN000189-3 n°481 - 1 (P481) - Plan R+2 - Vol 893

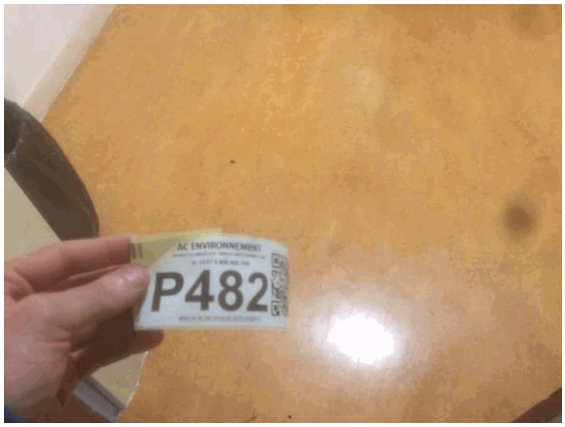

002KN000189-3 n°482 - 1 (P482) - Plan R+2 - Vol 891



002KN000189-3 n°483 - 1 (P483) - Plan R+2 - Vol 915 (B211)



002KN000189-3 n°484 - 1 (P484) - Plan R+2 - Vol 917



002KN000189-3 n°485 - 1 (P485) - Plan R+2 - Vol 918



002KN000189-3 n°486 - 1 (P486) - Plan R+2 - Vol 922



002KN000189-3 n°489 - 1 (P489) - Plan R+1 - Vol 724 (B102)




002KN000189-3 n°490 - 1 (P490) - Plan R+1 - Vol 725



002KN000189-3 n°491 - 1 (P491) - Plan R+1 - Vol 728 (B507)



002KN000189-3 n°492 - 1 (P492) - Plan R+1 - Vol 730

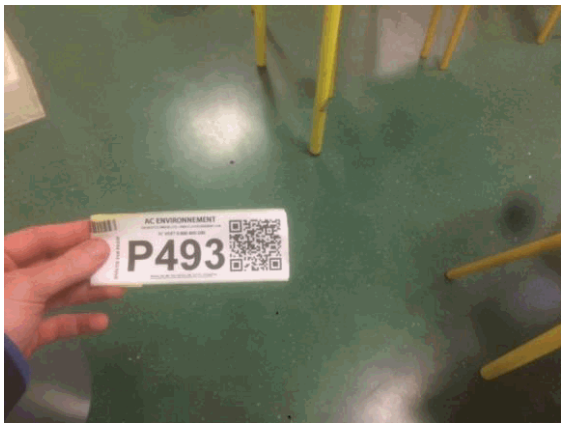

002KN000189-3 n°493 - 1 (P493) - Plan R+1 - Vol 732



002KN000189-3 n°494 - 1 (P494) - Plan R+1 - Vol 735



002KN000189-3 n°495 - 2 (P495) - Plan R+1 - Vol 733



002KN000189-3 n°495 - 1 (P495) - Plan R+1 - Vol 733



002KN000189-3 n°496 - 1 (P496) - Plan R+1 - Vol 781 (B114)



002KN000189-3 n°496 - 2 (P496) - Plan R+1 - Vol 781 (B114)



002KN000189-3 n°497 - 2 (P497) - Plan R+1 - Vol 780 (B112)



002KN000189-3 n°497 - 1 (P497) - Plan R+1 - Vol 780 (B112)



002KN000189-3 n°498 - 2 (P498) - Plan R+1 - Vol 736




002KN000189-3 n°498 - 1 (P498) - Plan R+1 - Vol 736



002KN000189-3 n°499 - 2 (P499) - Plan R+1 - Vol 734



002KN000189-3 n°499 - 1 (P499) - Plan R+1 - Vol 734

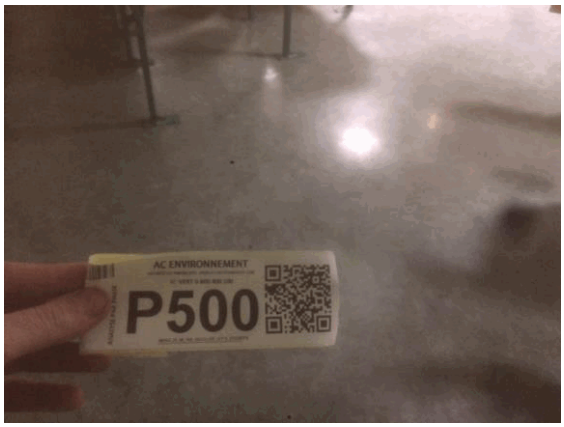

002KN000189-3 n°500 - 2 (P500) - Plan R+1 - Vol 783



002KN000189-3 n°500 - 1 (P500) - Plan R+1 - Vol 783



002KN000189-3 n°501 - 1 (P501) - Plan R+1 - Vol 788



002KN000189-3 n°502 - 1 (P502) - Plan R+3 - Vol 955



002KN000189-3 n°503 - 1 (P503) - Plan R+3 - Vol 953



002KN000189-3 n°504 - 1 (P504) - Plan R+3 - Vol 938



002KN000189-3 n°505 - 1 (P505) - Plan R+3 - Vol 932



002KN000189-3 n°506 - 1 (P506) - Plan R+3 - Vol 932



002KN000189-3 n°507 - 1 (P507) - Plan R+3 - Vol 939




002KN000189-3 n°508 - 1 (P508) - Plan R+3 - Vol 927



002KN000189-3 n°509 - 1 (P509) - Plan R+3 - Vol 944




002KN000189-3 n°510 - 1 (P510) - Plan R+2 - Vol 895

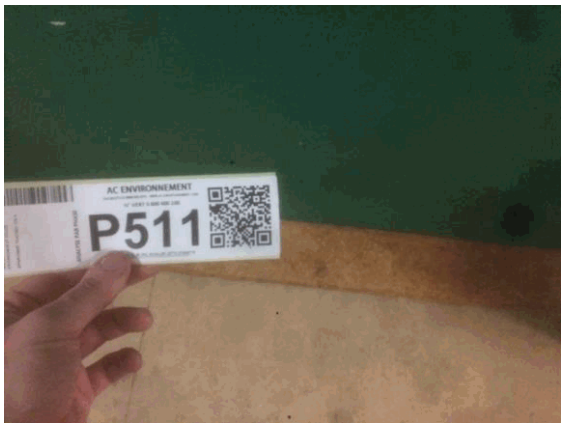

002KN000189-3 n°511 - 1 (P511) - Plan R+2 - Vol 899




002KN000189-3 n°512 - 1 (P512) - Plan R+2 - Vol 912

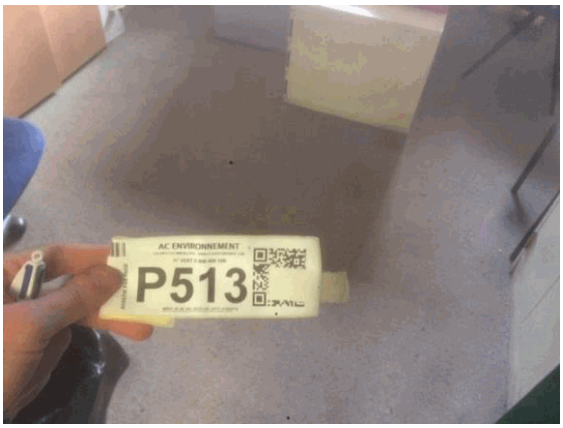

002KN000189-3 n°513 - 1 (P513) - Plan R+2 - Vol 136




002KN000189-3 n°514 - 1 (P514) - Plan R+2 - Vol 1371

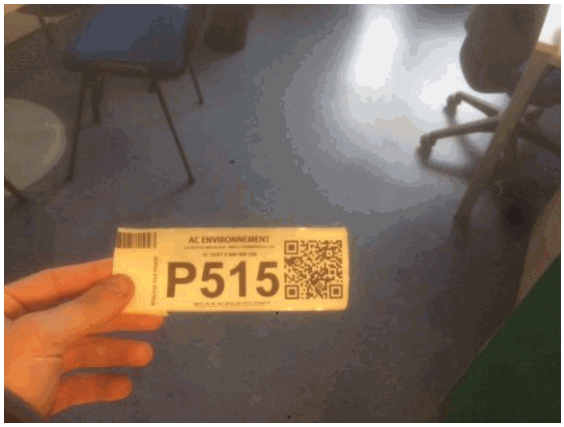

)02KN000189-3 n°515 - 1 (P515) - Plan R+2 - Vol 136



002KN000189-3 n°516 - 1 (P516) - Plan R+2 - Vol 1364

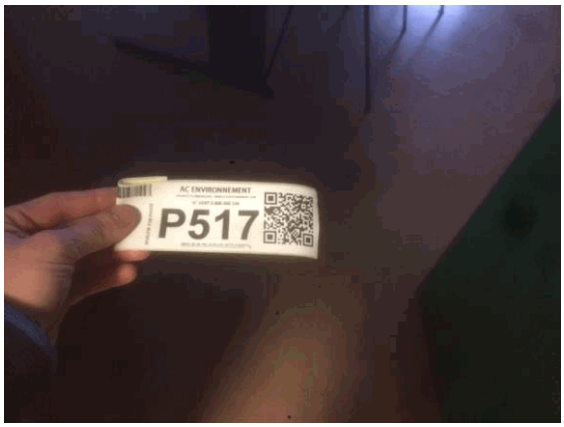

002KN000189-3 n°517 - 1 (P517) - Plan R+2 - Vol 913 (Bureaux 16)



002KN000189-3 n°518 - 1 (P518) - Plan R+2 - Vol 920 (B204)



002KN000189-3 n°519 - 1 (P519) - Plan R+2 - Vol 923 (B201)



002KN000189-3 n°520 - 1 (P520) - Plan R+2 - Vol 849



002KN000189-3 n°521 - 1 (P521) - Plan R+2 - Vol 849



002KN000189-3 n°522 - 1 (P522) - Plan R+2 - Vol 871



002KN000189-3 n°523 - 1 (P523) - Plan R+2 - Vol 872



002KN000189-3 n°524 - 1 (P524) - Plan R+2 - Vol 872



002KN000189-3 n°525 - 1 (P525) - Plan R+2 - Vol 872



002KN000189-3 n°526 - 1 (P526) - Plan R+2 - Vol 871



002KN000189-3 n°527 - 1 (P527) - Plan R+2 - Vol 451




002KN000189-3 n°528 - 1 (P528) - Plan R+2 - Vol 451



002KN000189-3 n°529 - 1 (P529) - Plan R+2 - Vol 868



002KN000189-3 n°530 - 1 (P530) - Plan R+3 - Vol 949

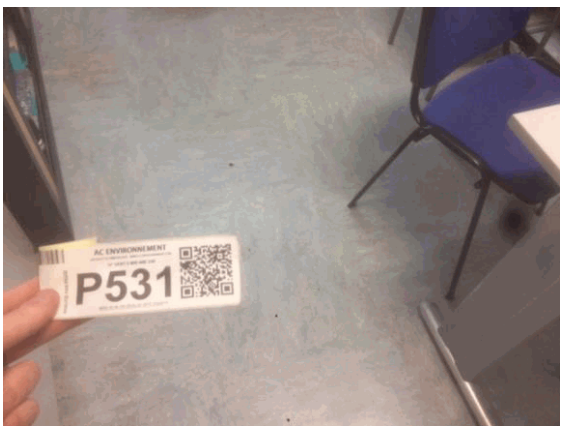

002KN000189-3 n°531 - 1 (P531) - Plan R+3 - Vol 936 (B 307)



002KN000189-3 n°532 - 1 (P532) - Plan R+3 - Vol 934



002KN000189-3 n°533 - 1 (P533) - Plan R+3 - Vol 933



002KN000189-3 n°534 - 1 (P534) - Plan R+3 - Vol 941



002KN000189-3 n°535 - 1 (P535) - Plan R+3 - Vol 942



002KN000189-3 n°536 - 1 (P536) - Plan R+3 - Vol 926



002KN000189-3 n°537 - 1 (P537) - Plan R+3 - Vol 946



002KN000189-3 n°538 - 1 (P538) - Plan R+4 - Vol 1000



)02KN000189-3 n°539 - 1 (P539) - Plan R+4 - Vol 100




002KN000189-3 n°540 - 1 (P540) - Plan R+4 - Vol 1011



)02KN000189-3 n°542 - 1 (P542) - Plan R+4 - Vol 101
(B420)



002KN000189-3 n°543 - 1 (P543) - Plan R+4 - Vol 1018

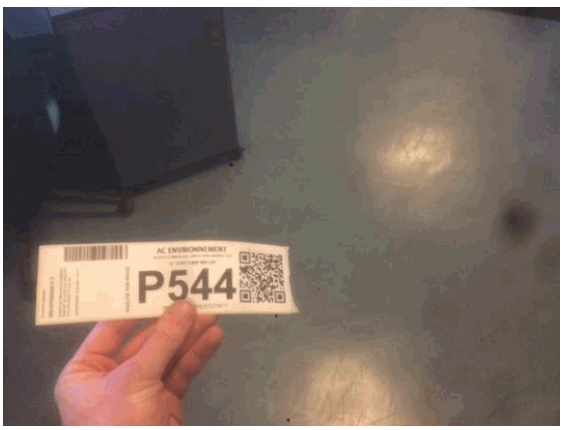


)02KN000189-3 n°544 - 1 (P544) - Plan R+4 - Vol 101



002KN000189-3 n°545 - 1 (P545) - Plan R+4 - Vol 1022



)02KN000189-3 n°546 - 1 (P546) - Plan R+4 - Vol 102

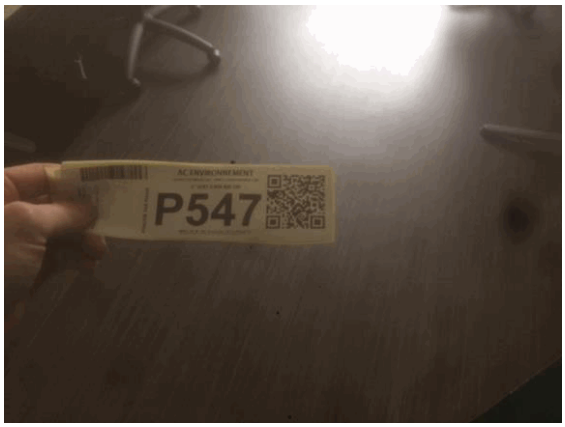

002KN000189-3 n°547 - 1 (P547) - Plan R+4 - Vol 1026



)02KN000189-3 n°548 - 1 (P548) - Plan R+4 - Vol 102



002KN000189-3 n°549 - 1 (P549) - Plan R+4 - Vol 1034



)02KN000189-3 n°550 - 1 (P550) - Plan R+4 - Vol 103



002KN000189-3 n°551 - 1 (P551) - Plan R+4 - Vol 1034



)02KN000189-3 n°552 - 1 (P552) - Plan R+4 - Vol 103



002KN000189-3 n°553 - 1 (P553) - Plan R+4 - Vol 1032



)02KN000189-3 n°554 - 1 (P554) - Plan R+2 - Vol 137



002KN000189-3 n°555 - 1 (P555) - Plan R+4 - Vol 1070



)02KN000189-3 n°556 - 1 (P556) - Plan R+4 - Vol 109



002KN000189-3 n°557 - 1 (P557) - Plan R+4 - Vol 1096



)02KN000189-3 n°558 - 1 (P558) - Plan R+4 - Vol 109(



002KN000189-3 n°559 - 1 (P559) - Plan R+4 - Vol 1096



)02KN000189-3 n°560 - 1 (P560) - Plan R+4 - Vol 109(




002KN000189-3 n°561 - 1 (P561) - Plan R+4 - Vol 1098



)02KN000189-3 n°562 - 1 (P562) - Plan R+4 - Vol 109(



002KN000189-3 n°563 - 1 (P563) - Plan R+4 - Vol 1104

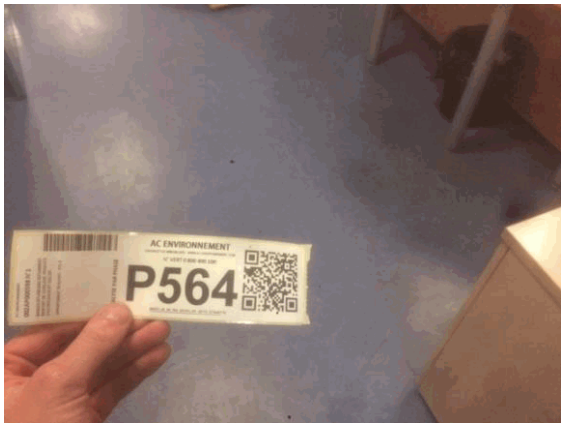

)02KN000189-3 n°564 - 1 (P564) - Plan R+4 - Vol 110



002KN000189-3 n°565 - 1 (P565) - Plan R+4 - Vol 1093



)02KN000189-3 n°566 - 1 (P566) - Plan R+4 - Vol 109



002KN000189-3 n°567 - 1 (P567) - Plan R+4 - Vol 1093



)02KN000189-3 n°568 - 1 (P568) - Plan R+4 - Vol 109



002KN000189-3 n°569 - 1 (P569) - Plan R+4 - Vol 1091



)02KN000189-3 n°570 - 1 (P570) - Plan R+4 - Vol 109



002KN000189-3 n°571 - 1 (P571) - Plan R+4 - Vol 1090




)02KN000189-3 n°572 - 1 (P572) - Plan R+4 - Vol 108



002KN000189-3 n°573 - 1 (P573) - Plan R+4 - Vol 1089



)02KN000189-3 n°574 - 1 (P574) - Plan R+4 - Vol 105

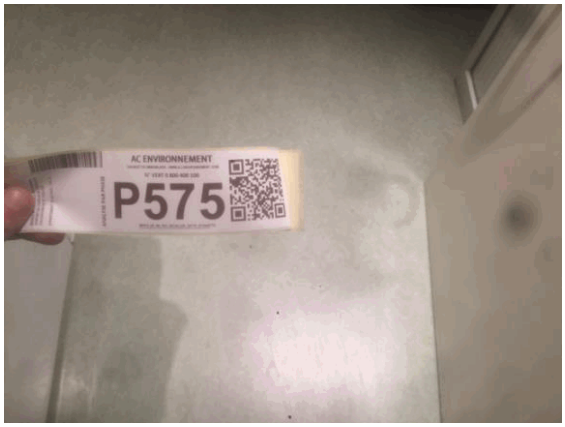

002KN000189-3 n°575 - 1 (P575) - Plan R+4 - Vol 1051



)02KN000189-3 n°576 - 1 (P576) - Plan R+4 - Vol 105(



002KN000189-3 n°577 - 1 (P577) - Plan R+4 - Vol 1050



)02KN000189-3 n°578 - 1 (P578) - Plan R+4 - Vol 105(



002KN000189-3 n°579 - 1 (P579) - Plan R+4 - Vol 1050



)02KN000189-3 n°581 - 2 (P581) - Plan R+4 - Vol 105(



002KN000189-3 n°582 - 1 (P582) - Plan R+4 - Vol 1059



002KN000189-3 n°583 - 1 (P583) - Plan R+4 - Vol 1113



002KN000189-3 n°583 - 2 (P583) - Plan R+4 - Vol 1113



002KN000189-3 n°585 - 1 (P585) - Plan R+6 - Vol 1285



002KN000189-3 n°586 - 1 (P586) - Plan R+6 - Vol 1274



002KN000189-3 n°587 - 1 (P587) - Plan R+6 - Vol 1277



002KN000189-3 n°588 - 1 (P588) - Plan R+6 - Vol 1269



)02KN000189-3 n°591 - 1 (P591) - Plan R+6 - Vol 128



002KN000189-3 n°592 - 1 (P592) - Plan R+6 - Vol 1283



)02KN000189-3 n°593 - 1 (P593) - Plan R+6 - Vol 128



002KN000189-3 n°594 - 1 (P594) - Plan R+6 - Vol 1252



)02KN000189-3 n°595 - 1 (P595) - Plan R+6 - Vol 125



002KN000189-3 n°596 - 1 (P596) - Plan R+6 - Vol 1258



)02KN000189-3 n°597 - 1 (P597) - Plan R+6 - Vol 125



002KN000189-3 n°601 - 1 (P601) - Plan R+6 - Vol 1289



)02KN000189-3 n°602 - 1 (P602) - Plan R+6 - Vol 129(




002KN000189-3 n°602 - 2 (P602) - Plan R+6 - Vol 1290



)02KN000189-3 n°603 - 2 (P603) - Plan R+6 - Vol 137



002KN000189-3 n°603 - 1 (P603) - Plan R+6 - Vol 1375

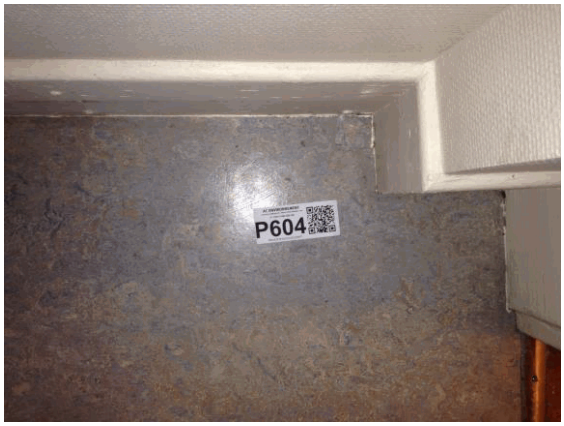

)02KN000189-3 n°604 - 1 (P604) - Plan R+6 - Vol 130



002KN000189-3 n°604 - 2 (P604) - Plan R+6 - Vol 1306



)02KN000189-3 n°605 - 1 (P605) - Plan R+6 - Vol 130



002KN000189-3 n°605 - 2 (P605) - Plan R+6 - Vol 1305



)02KN000189-3 n°606 - 1 (P606) - Plan R+6 - Vol 130



002KN000189-3 n°607 - 1 (P607) - Plan R+6 - Vol 1303



)02KN000189-3 n°607 - 2 (P607) - Plan R+6 - Vol 130



002KN000189-3 n°608 - 1 (P608) - Plan R+6 - Vol 1376
(Cour intérieure 1)



)02KN000189-3 n°609 - 1 (P609) - Plan R+6 - Vol 137
(Cour intérieure 1)



002KN000189-3 n°610 - 1 (P610) - Plan R+6 - Vol 1376
(Cour intérieure 1)



)02KN000189-3 n°611 - 1 (P611) - Plan R+6 - Vol 137
(Cour intérieure 1)



002KN000189-3 n°612 - 1 (P612) - Plan R+6 - Vol 1375



)02KN000189-3 n°613 - 1 (P613) - Plan R+6 - Vol 129



002KN000189-3 n°613 - 2 (P613) - Plan R+6 - Vol 1291



)02KN000189-3 n°614 - 2 (P614) - Plan R+6 - Vol 129



002KN000189-3 n°614 - 1 (P614) - Plan R+6 - Vol 1293



)02KN000189-3 n°615 - 2 (P615) - Plan R+6 - Vol 129



002KN000189-3 n°615 - 1 (P615) - Plan R+6 - Vol 1294



)02KN000189-3 n°616 - 1 (P616) - Plan R+6 - Vol 129



002KN000189-3 n°616 - 2 (P616) - Plan R+6 - Vol 1295



)02KN000189-3 n°617 - 1 (P617) - Plan R+6 - Vol 129




002KN000189-3 n°618 - 1 (P618) - Plan R+6 - Vol 1297



)02KN000189-3 n°619 - 2 (P619) - Plan R+6 - Vol 137



002KN000189-3 n°619 - 1 (P619) - Plan R+6 - Vol 1377

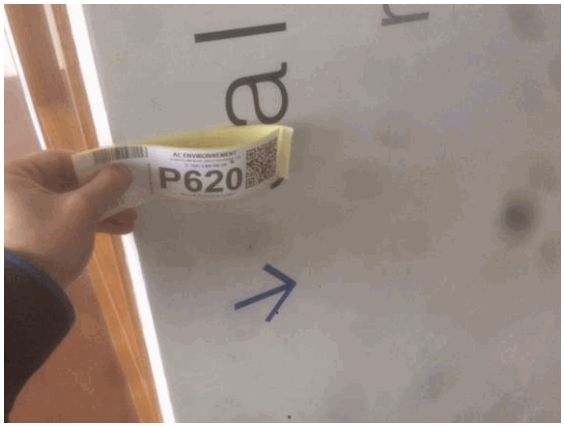

)02KN000189-3 n°620 - 1 (P620) - Plan R+6 - Vol 137



002KN000189-3 n°621 - 1 (P621) - Plan R+6 - Vol 1378



)02KN000189-3 n°622 - 1 (P622) - Plan R+6 - Vol 130



002KN000189-3 n°623 - 1 (P623) - Plan R+6 - Vol 1300



)02KN000189-3 n°624 - 1 (P624) - Plan R+6 - Vol 132



002KN000189-3 n°625 - 1 (P625) - Plan R+6 - Vol 1337




)02KN000189-3 n°625 - 2 (P625) - Plan R+6 - Vol 133



002KN000189-3 n°626 - 1 (P626) - Plan R+6 - Vol 1321



)02KN000189-3 n°626 - 2 (P626) - Plan R+6 - Vol 132

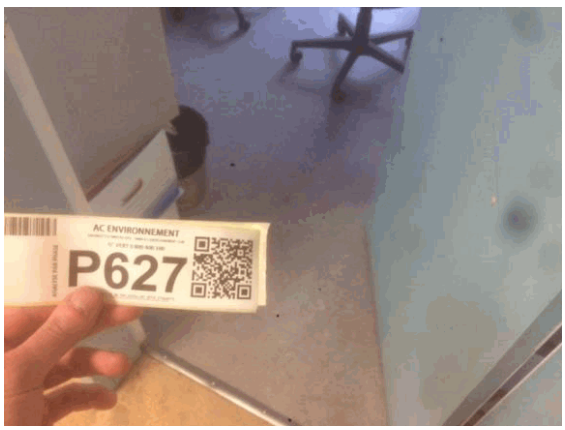

002KN000189-3 n°627 - 2 (P627) - Plan R+6 - Vol 1323



)02KN000189-3 n°627 - 1 (P627) - Plan R+6 - Vol 132



002KN000189-3 n°628 - 2 (P628) - Plan R+6 - Vol 1320



)02KN000189-3 n°628 - 1 (P628) - Plan R+6 - Vol 132(




002KN000189-3 n°629 - 1 (P629) - Plan R+6 - Vol 1318



)02KN000189-3 n°630 - 1 (P630) - Plan R+6 - Vol 130




002KN000189-3 n°631 - 1 (P631) - Plan R+5 - Vol 1172

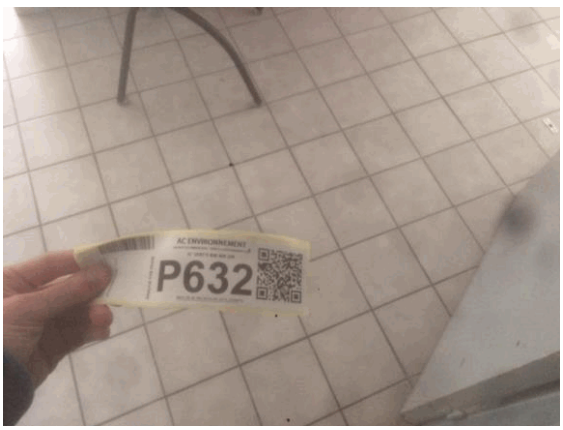

)02KN000189-3 n°632 - 1 (P632) - Plan R+5 - Vol 117



002KN000189-3 n°633 - 1 (P633) - Plan R+5 - Vol 1170

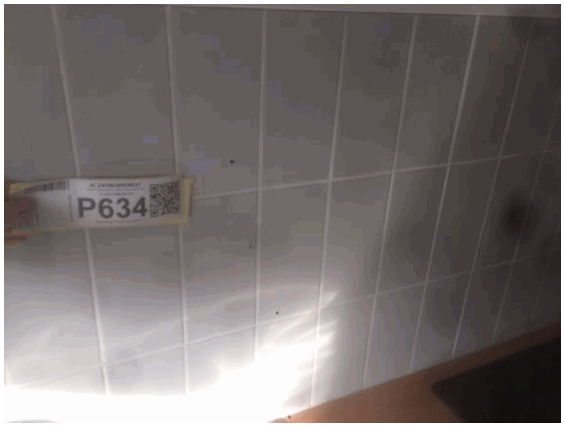

)02KN000189-3 n°634 - 1 (P634) - Plan R+5 - Vol 117(



002KN000189-3 n°635 - 1 (P635) - Plan R+5 - Vol 1169



)02KN000189-3 n°636 - 1 (P636) - Plan R+5 - Vol 116(
(C516)



002KN000189-3 n°637 - 1 (P637) - Plan R+5 - Vol 1166



)02KN000189-3 n°638 - 1 (P638) - Plan R+5 - Vol 137(




002KN000189-3 n°639 - 1 (P639) - Plan R+5 - Vol 1168




)02KN000189-3 n°640 - 1 (P640) - Plan R+5 - Vol 120



002KN000189-3 n°641 - 1 (P641) - Plan R+5 - Vol 1202

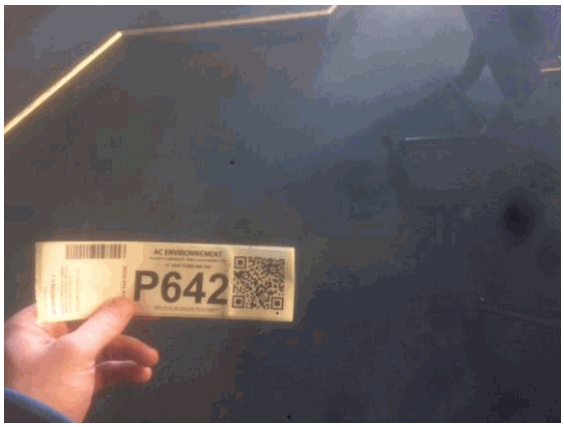

)02KN000189-3 n°642 - 1 (P642) - Plan R+5 - Vol 121

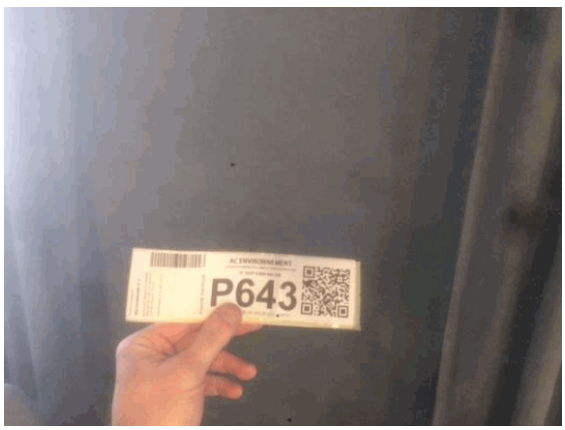

002KN000189-3 n°643 - 1 (P643) - Plan R+5 - Vol 1212




)02KN000189-3 n°645 - 1 (P645) - Plan R+5 - Vol 123



002KN000189-3 n°646 - 1 (P646) - Plan R+5 - Vol 1232



)02KN000189-3 n°647 - 1 (P647) - Plan R+5 - Vol 123

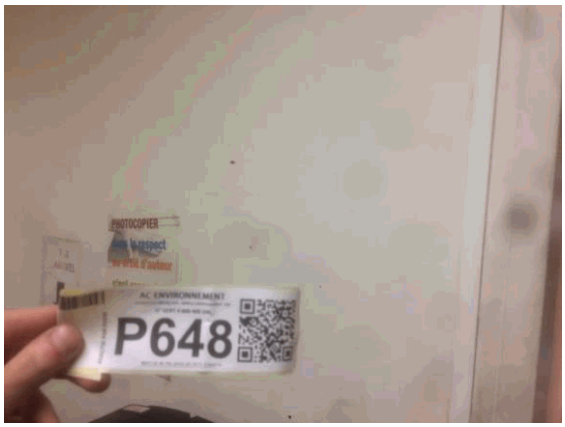

002KN000189-3 n°648 - 1 (P648) - Plan R+5 - Vol 1231



)02KN000189-3 n°649 - 1 (P649) - Plan R+5 - Vol 122



002KN000189-3 n°650 - 1 (P650) - Plan R+5 - Vol 1224




)02KN000189-3 n°651 - 1 (P651) - Plan R+5 - Vol 138



002KN000189-3 n°652 - 1 (P652) - Plan R+5 - Vol 1383



)02KN000189-3 n°653 - 1 (P653) - Plan R+5 - Vol 121

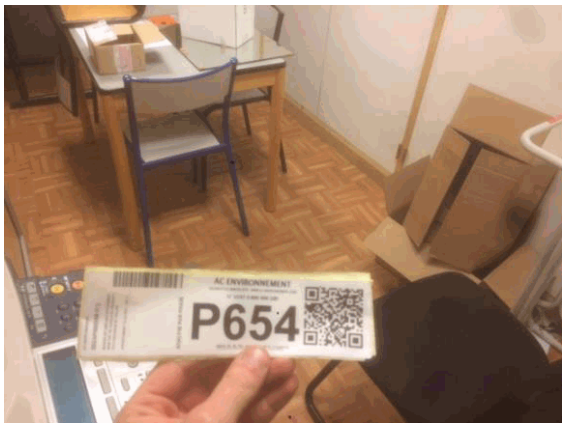

002KN000189-3 n°654 - 1 (P654) - Plan R+5 - Vol 1381




)02KN000189-3 n°655 - 1 (P655) - Plan R+5 - Vol 121



002KN000189-3 n°656 - 1 (P656) - Plan R+5 - Vol 1146 (B520b)



)02KN000189-3 n°657 - 1 (P657) - Plan R+5 - Vol 114(

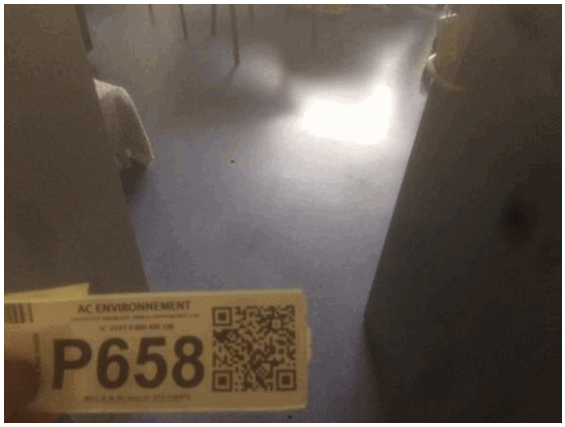


002KN000189-3 n°658 - 1 (P658) - Plan R+5 - Vol 1138



)02KN000189-3 n°660 - 1 (P660) - Plan R+5 - Vol 113




002KN000189-3 n°661 - 1 (P661) - Plan R+5 - Vol 1127

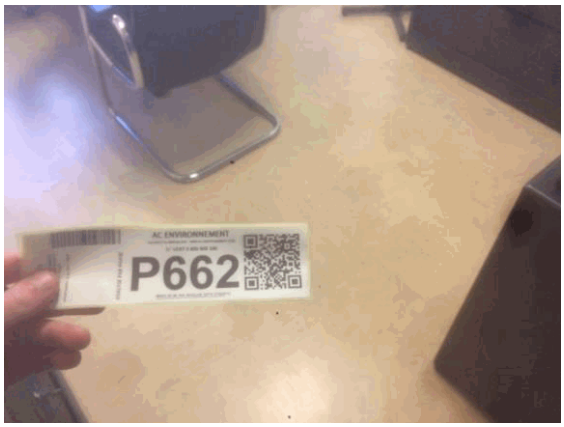

)02KN000189-3 n°662 - 1 (P662) - Plan R+5 - Vol 112
(B513)




002KN000189-3 n°663 - 1 (P663) - Plan R+5 - Vol 1128
(B513)

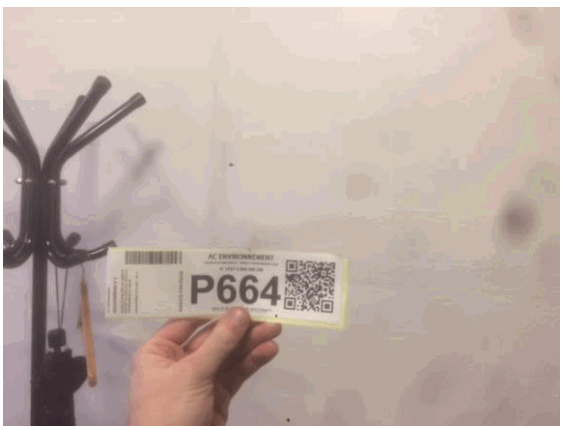

)02KN000189-3 n°664 - 1 (P664) - Plan R+5 - Vol 112
(B513)




002KN000189-3 n°665 - 1 (P665) - Plan R+5 - Vol 1123 (B505)

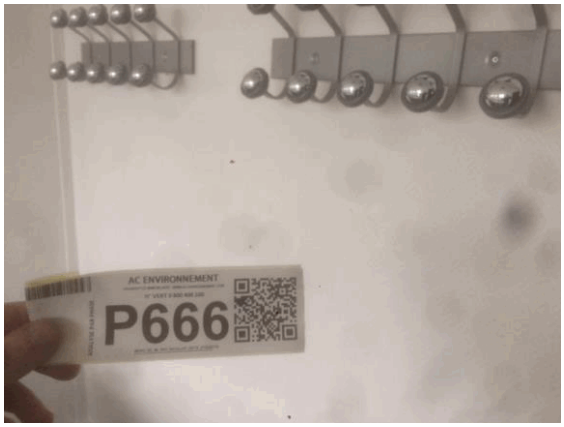

)02KN000189-3 n°666 - 1 (P666) - Plan R+5 - Vol 112((B505)




002KN000189-3 n°667 - 2 (P667) - Plan R+5 - Vol 1156

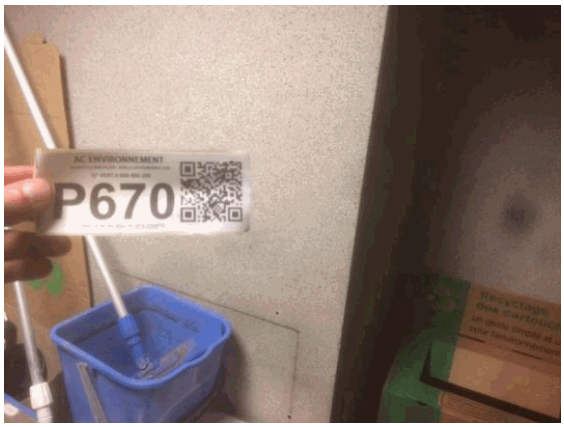

)02KN000189-3 n°670 - 1 (P670) - Plan R+5 - Vol 118(



002KN000189-3 n°671 - 1 (P671) - Plan R+5 - Vol 1194

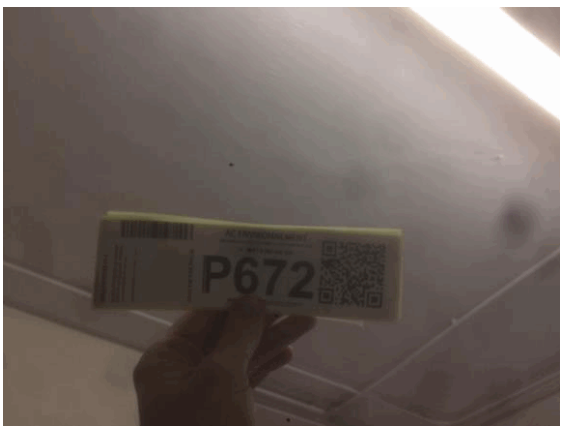

)02KN000189-3 n°672 - 1 (P672) - Plan R+6 - Vol 135(



002KN000189-3 n°673 - 1 (P673) - Plan R+6 - Vol 1350




)02KN000189-3 n°674 - 1 (P674) - Plan R+6 - Vol 135(




002KN000189-3 n°675 - 1 (P675) - Plan R+6 - Vol 1350



)02KN000189-3 n°676 - 1 (P676) - Plan R+6 - Vol 135(

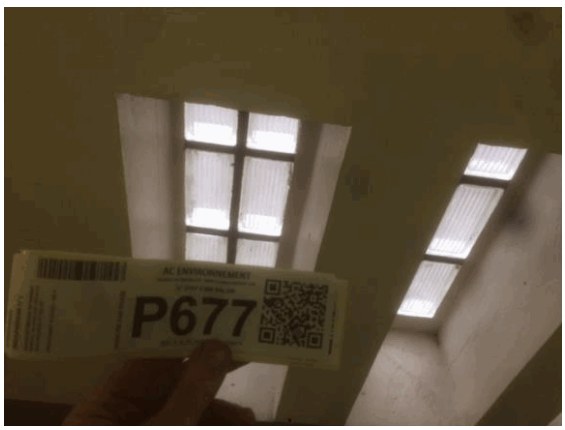

002KN000189-3 n°677 - 1 (P677) - Plan R+6 - Vol 1350

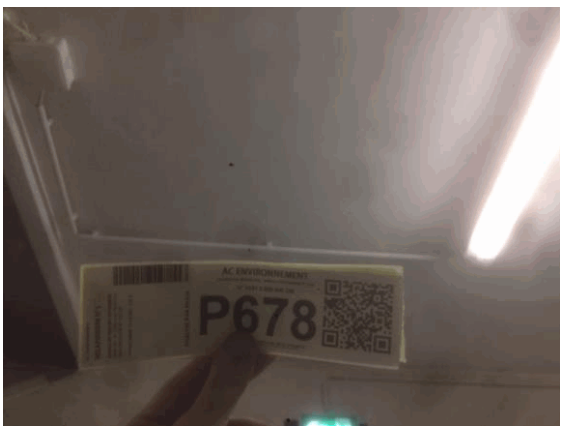

)02KN000189-3 n°678 - 1 (P678) - Plan R+4 - Vol 106(



002KN000189-3 n°679 - 1 (P679) - Plan R+6 - Vol 1344




)02KN000189-3 n°680 - 1 (P680) - Plan R+6 - Vol 134



002KN000189-3 n°681 - 1 (P681) - Plan R+6 - Vol 1344



)02KN000189-3 n°682 - 1 (P682) - Plan R+6 - Vol 134

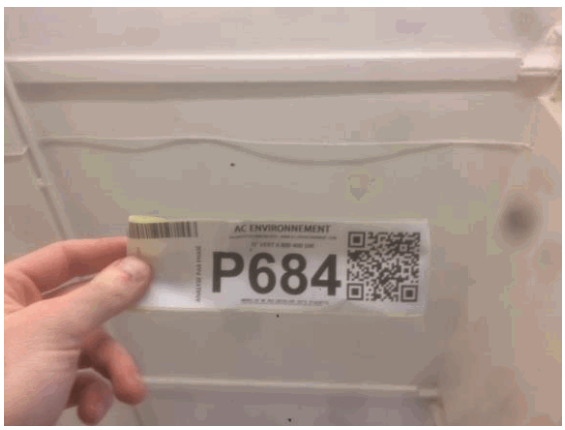

002KN000189-3 n°684 - 1 (P684) - Plan R+4 - Vol 1085



)02KN000189-3 n°685 - 1 (P685) - Plan Rdc - Vol 138



002KN000189-3 n°686 - 2 (P686) - Plan R+6 - Vol 1308




)02KN000189-3 n°686 - 1 (P686) - Plan R+6 - Vol 130



002KN000189-3 n°687 - 1 (P687) - Plan R+6 - Vol 1308



)02KN000189-3 n°687 - 2 (P687) - Plan R+6 - Vol 130

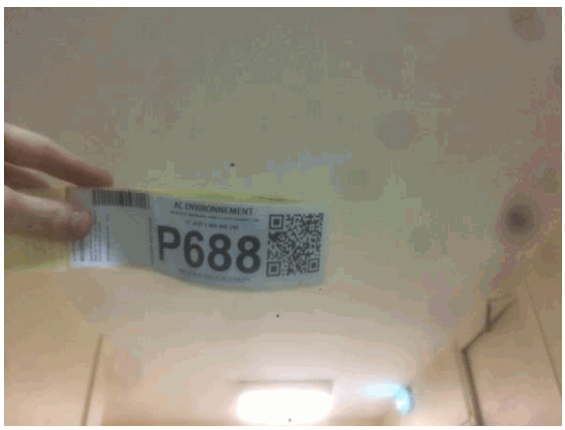

002KN000189-3 n°688 - 1 (P688) - Plan R+6 - Vol 1308



)02KN000189-3 n°689 - 1 (P689) - Plan R+6 - Vol 130



002KN000189-3 n°690 - 1 (P690) - Plan R+6 - Vol 1308



002KN000189-3 n°691 - 1 (P691) - Plan R+4 - Vol 103



002KN000189-3 n°692 - 1 (P692) - Plan R+4 - Vol 1037



002KN000189-3 n°693 - 1 (P693) - Plan R+6 - Vol 580



002KN000189-3 n°694 - 1 (P694) - Plan R+6 - Vol 580



002KN000189-3 n°695 - 1 (P695) - Plan R+6 - Vol 580




002KN000189-3 n°696 - 2 (P696) - Plan R+6 - Vol 580




002KN000189-3 n°696 - 1 (P696) - Plan R+6 - Vol 580




002KN000189-3 n°697 - 1 (P697) - Plan R+6 - Vol 580

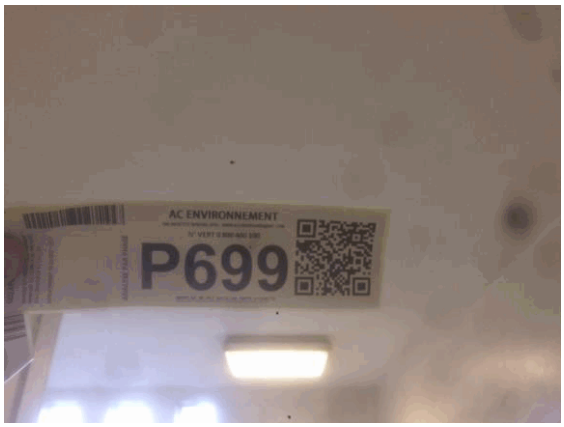


002KN000189-3 n°699 - 1 (P699) - Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)

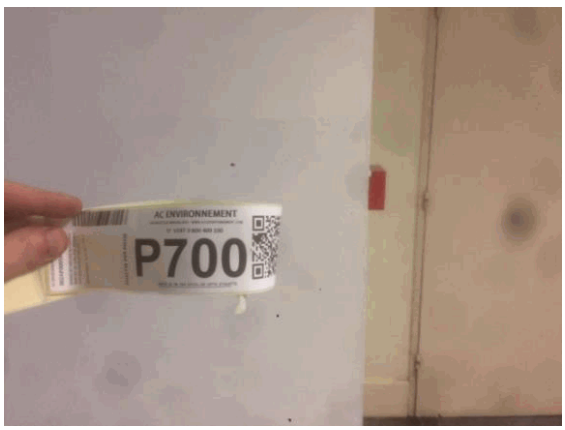

002KN000189-3 n°700 - 1 (P700) - Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)

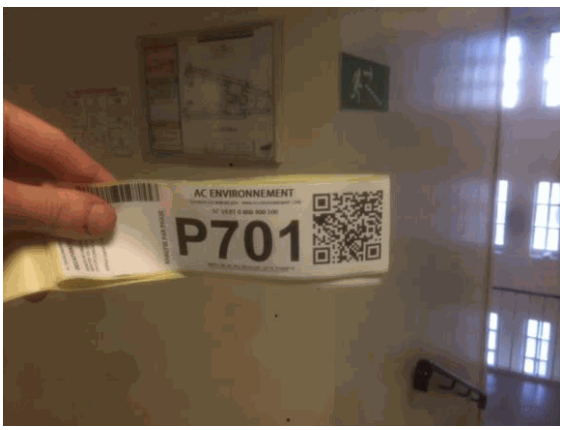

002KN000189-3 n°701 - 1 (P701) - Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)

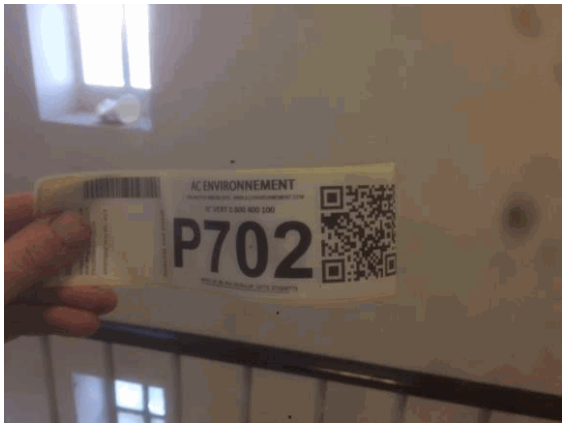


002KN000189-3 n°702 - 1 (P702) - Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)



002KN000189-3 n°703 - 1 (P703) - Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)



002KN000189-3 n°704 - 1 (P704) - Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)

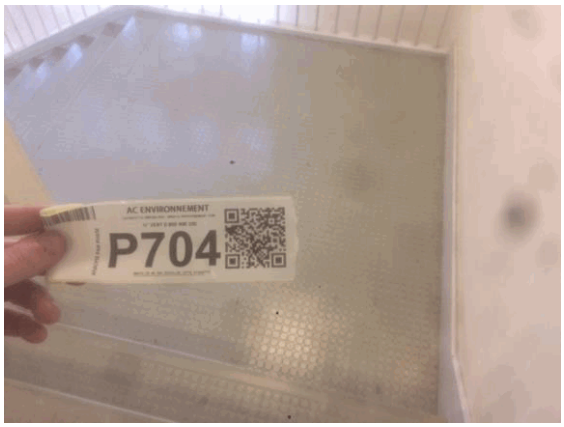

002KN000189-3 n°704 - 2 (P704) - Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)



002KN000189-3 n°705 - 1 (P705) - Plan sous-sol -1 - Vo 116




002KN000189-3 n°706 - 1 (P706) - Plan sous-sol -1 - Vol 116



)02KN000189-3 n°707 - 1 (P707) - Plan sous-sol -1 - Vo 116



002KN000189-3 n°708 - 1 (P708) - Plan sous-sol -1 - Vol 116

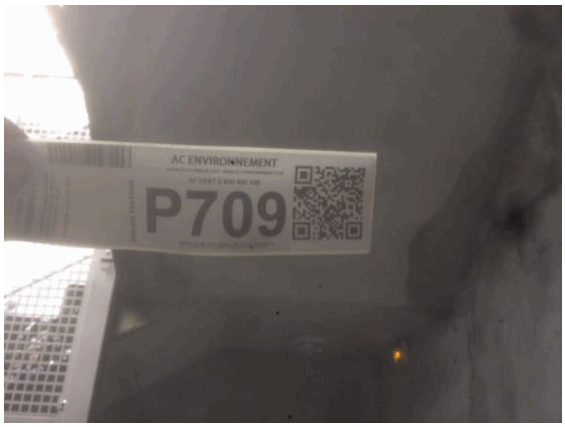

)02KN000189-3 n°709 - 1 (P709) - Plan sous-sol -1 - Vo 129



002KN000189-3 n°710 - 1 (P710) - Plan sous-sol -1 - Vol 129



)02KN000189-3 n°711 - 1 (P711) - Plan sous-sol -1 - Vo 129




002KN000189-3 n°712 - 1 (P712) - Plan sous-sol -1 - Vol 129



002KN000189-3 n°713 - 1 (P713) - Plan Rdc - Vol 1391 (Cour intérieure 2)



002KN000189-3 n°714 - 1 (P714) - Plan sous-sol -1 - Vol 242

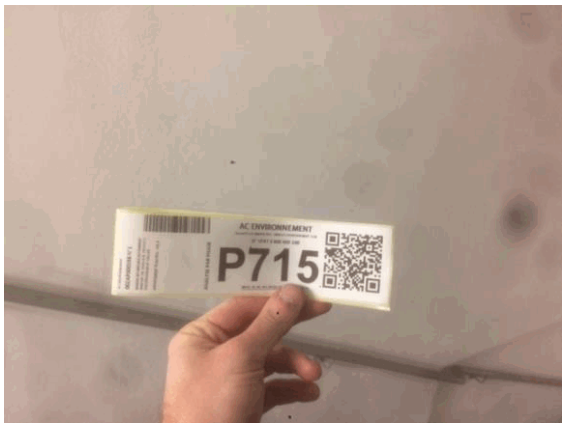


)02KN000189-3 n°715 - 1 (P715) - Plan sous-sol -1 - Vo 242



002KN000189-3 n°716 - 1 (P716) - Plan sous-sol -1 - Vol 242



002KN000189-3 n°717 - 1 (P717) - Plan R+5 - Vol 1162

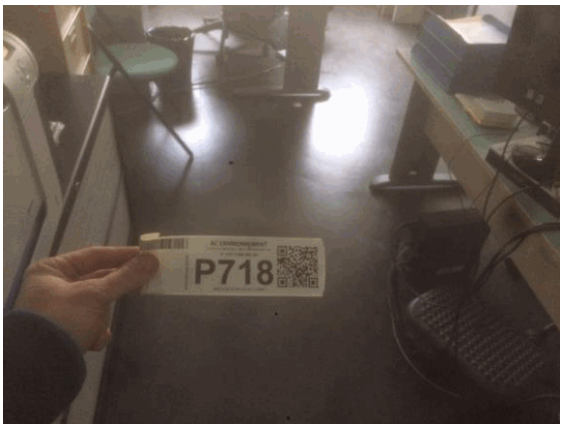

)02KN000189-3 n°718 - 1 (P718) - Plan R+5 - Vol 115



002KN000189-3 n°719 - 1 (P719) - Plan R+5 - Vol 1196



002KN000189-3 n°720 - 1 (P720) - Plan R+5 - Vol 119




002KN000189-3 n°721 - 1 (P721) - Plan R+5 - Vol 1198




002KN000189-3 n°722 - 1 (P722) - Plan R+5 - Vol 119



002KN000189-3 n°723 - 1 (P723) - Plan R+5 - Vol 1188

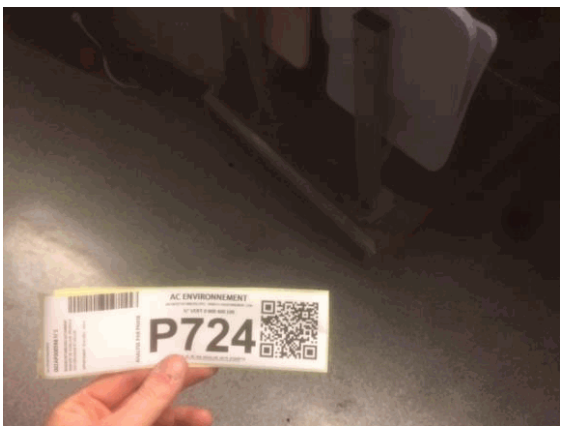

002KN000189-3 n°724 - 1 (P724) - Plan R+3 - Vol 981

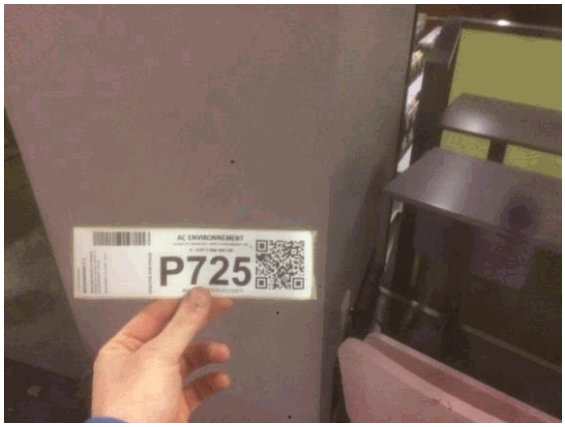

002KN000189-3 n°725 - 1 (P725) - Plan R+3 - Vol 981



)02KN000189-3 n°726 - 1 (P726) - Plan R+5 - Vol 112
(B505)



002KN000189-3 n°727 - 1 (P727) - Plan R+4 - Vol 1050



002KN000189-3 n°728 - 1 (P728) - Plan R+3 - Vol 938



002KN000189-3 n°729 - 1 (P729) - Plan R+3 - Vol 941



)02KN000189-3 n°730 - 1 (P730) - Plan R+2 - Vol 136



002KN000189-3 n°731 - 1 (P731) - Plan R+2 - Vol 1371



002KN000189-3 n°732 - 1 (P732) - Plan R+2 - Vol 920 (B204)



002KN000189-3 n°733 - 1 (P733) - Plan R+5 - Vol 1199



002KN000189-3 n°734 - 1 (P734) - Plan R+6 - Vol 139



002KN000189-3 n°735 - 1 (P735) - Plan R+6 - Vol 1292



002KN000189-3 n°736 - 1 (P736) - Plan R+6 - Vol 129



002KN000189-3 n°741 - 1 (P741) - Plan R+4 - Vol 1098



)02KN000189-3 n°742 - 1 (P742) - Plan R+5 - Vol 114(



002KN000189-3 n°743 - 1 (P743) - Plan R+5 - Vol 1382



)02KN000189-3 n°744 - 1 (P744) - Plan R+5 - Vol 121



002KN000189-3 n°745 - 1 (P745) - Plan R+4 - Vol 1070



)02KN000189-3 n°746 - 1 (P746) - Plan R+4 - Vol 107(



002KN000189-3 n°747 - 1 (P747) - Plan R+6 - Vol 1286



002KN000189-3 n°748 - 1 (P748) - Plan sous-sol -2 - Vol 77



002KN000189-3 n°749 - 1 (P749) - Plan R+4 - Vol 1034



)02KN000189-4 n°750 - 1 (P750) - Plan Rdc - Vol 139⁴ (Rampe entrée)



002KN000189-4 n°751 - 1 (P751) - Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)



)02KN000189-4 n°752 - 1 (P752) - Plan Rdc - Vol 139⁴ (Rampe entrée)



002KN000189-4 n°753 - 1 (P753) - Plan Rdc - Vol 1394
(Rampe entrée)



)02KN000189-4 n°754 - 1 (P754) - Plan Rdc - Vol 139
(Rampe entrée)



002KN000189-4 n°755 - 1 (P755) - Plan Rdc - Vol 1395
(Rampe Sortie)



)02KN000189-4 n°756 - 1 (P756) - Plan Rdc - Vol 139
(Rampe Sortie)




002KN000189-4 n°757 - 1 (P757) - Plan Rdc - Vol 1395
(Rampe Sortie)



)02KN000189-4 n°758 - 1 (P758) - Plan Rdc - Vol 139
(Rampe Sortie)



002KN000189-4 n°759 - 1 (P759) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)

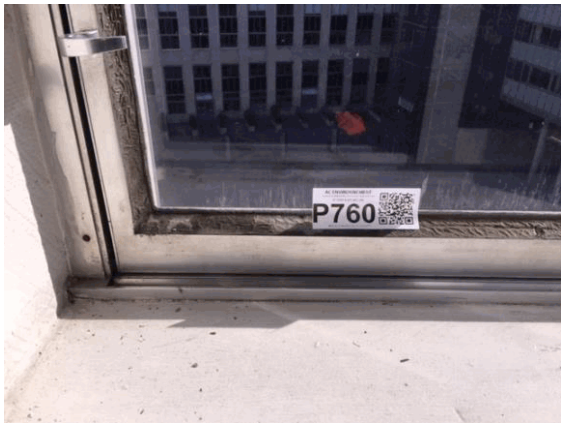

002KN000189-4 n°760 - 1 (P760) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)



002KN000189-4 n°761 - 1 (P761) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)



002KN000189-4 n°762 - 1 (P762) - Plan R+3 - Vol 936 (B 307)



002KN000189-4 n°763 - 1 (P763) - Plan R+1 - Vol 728 (B507)



002KN000189-4 n°764 - 1 (P764) - Plan Rdc - Vol 654 (Bureaux 14)



)02KN000189-4 n°766 - 1 (P766) - Plan sous-sol -2 - Vo 251 (Sous-station)



002KN000189-4 n°767 - 1 (P767) - Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)



002KN000189-5 n°768 - 1 (P768) - Plan Rdc - Vol 1406



)02KN000189-5 n°769 - 2 (P769) - Plan Rdc - Vol 140 (Esc P8)



002KN000189-5 n°769 - 1 (P769) - Plan Rdc - Vol 1407 (Esc P8)



)02KN000189-5 n°770 - 1 (P770) - Plan Rdc - Vol 140 (Livraison)



002KN000189-5 n°771 - 1 (P771) - Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)




)02KN000189-5 n°772 - 1 (P772) - Plan Rdc - Vol 140((Livraison)




002KN000189-5 n°773 - 1 (P773) - Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)



)02KN000189-5 n°774 - 1 (P774) - Plan Rdc - Vol 140((Livraison)

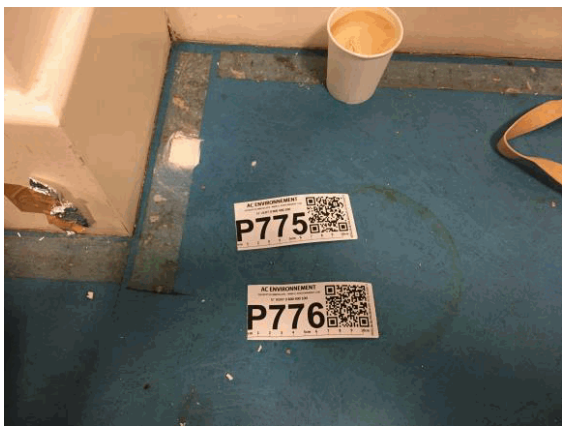

002KN000189-5 n°775 - 1 (P775) - Plan Rdc - Vol 674

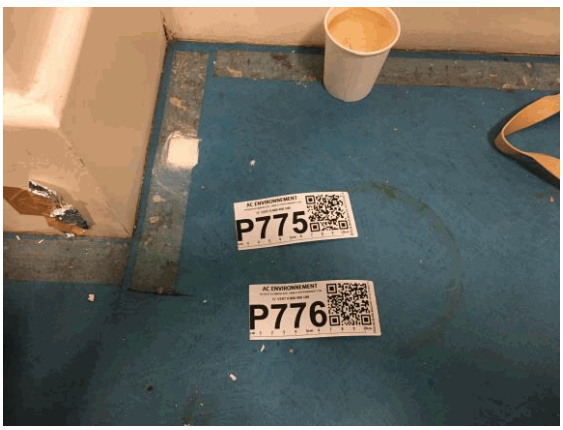

002KN000189-5 n°775 - 2 (P775) - Plan Rdc - Vol 674



002KN000189-5 n°777 - 1 (P777) - Plan Rdc - Vol 668
(Logement de fonction dir CROUS)



002KN000189-5 n°778 - 1 (P778) - Plan Rdc - Vol 668
(Logement de fonction dir CROUS)



002KN000189-5 n°779 - 1 (P779) - Plan Rdc - Vol 668
(Logement de fonction dir CROUS)



002KN000189-5 n°781 - 1 (P781) - Plan Rdc - Vol 668
(Logement de fonction dir CROUS)



002KN000189-5 n°781 - 2 (P781) - Plan Rdc - Vol 668
(Logement de fonction dir CROUS)



002KN000189-5 n°782 - 1 (P782) - Plan Rdc - Vol 668
(Logement de fonction dir CROUS)



002KN000189-5 n°783 - 1 (P783) - Plan Rdc - Vol 691 (PMR009)




002KN000189-5 n°784 - 1 (P784) - Plan Rdc - Vol 265 (B000)



002KN000189-5 n°785 - 1 (P785) - Plan Rdc - Vol 265 (B000)



002KN000189-5 n°786 - 1 (P786) - Plan Rdc - Vol 262 (B004)

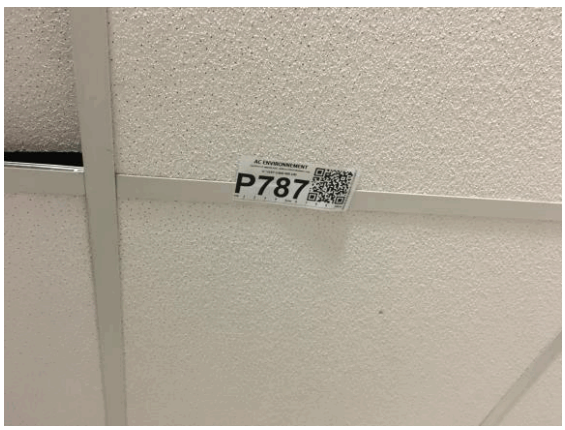

002KN000189-5 n°787 - 1 (P787) - Plan Rdc - Vol 262 (B004)



002KN000189-5 n°788 - 1 (P788) - Plan sous-sol -1 - Vol 159 (S/B106)




)02KN000189-5 n°789 - 1 (P789) - Plan sous-sol -1 - Vo 159 (S/B106)



002KN000189-5 n°790 - 1 (P790) - Plan sous-sol -1 - Vol 159 (S/B106)




)02KN000189-5 n°791 - 1 (P791) - Plan sous-sol -1 - Vo 89

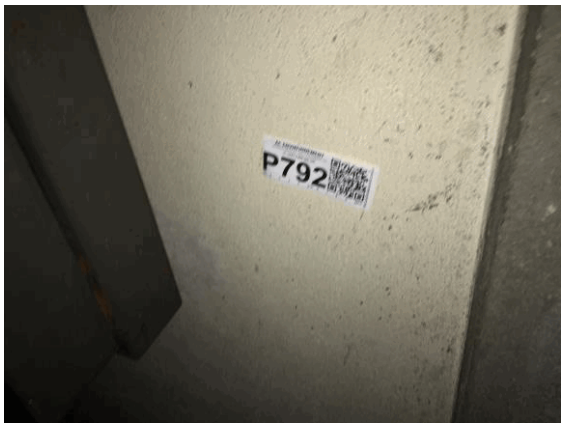

002KN000189-5 n°792 - 1 (P792) - Plan sous-sol -1 - Vol 89



)02KN000189-5 n°793 - 1 (P793) - Plan sous-sol -1 - Vo 128

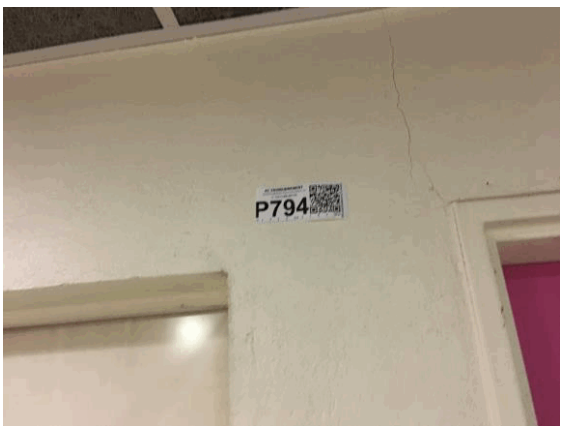

002KN000189-5 n°794 - 1 (P794) - Plan sous-sol -1 - Vol 128



)02KN000189-5 n°795 - 1 (P795) - Plan sous-sol -1 - Vo 128



002KN000189-5 n°796 - 1 (P796) - Plan sous-sol -1 - Vol 128



)02KN000189-5 n°796 - 2 (P796) - Plan sous-sol -1 - Vo 128



002KN000189-5 n°797 - 1 (P797) - Plan sous-sol -1 - Vol 100




002KN000189-5 n°798 - 1 (P798) - Plan Rdc - Vol 1409 (Parvis)



)02KN000189-5 n°799 - 1 (P799) - Plan Rdc - Vol 140((Parvis)



)02KN000189-5 n°800 - 1 (P800) - Plan sous-sol -1 - Vo 197

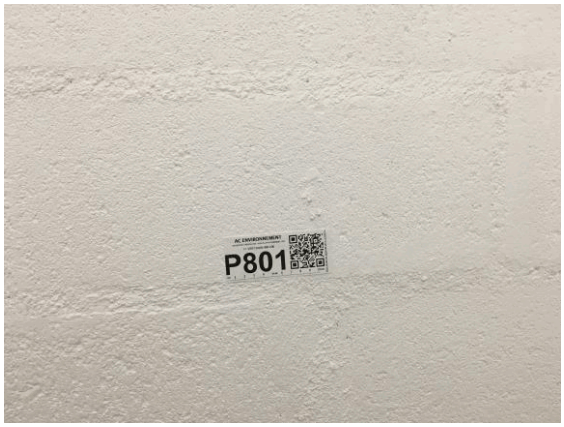

002KN000189-5 n°801 - 1 (P801) - Plan sous-sol -1 - Vol 197



)02KN000189-5 n°802 - 1 (P802) - Plan sous-sol -1 - Vo 197



002KN000189-5 n°803 - 1 (P803) - Plan sous-sol -1 - Vol 197



)02KN000189-5 n°804 - 1 (P804) - Plan sous-sol -1 - Vo 198



002KN000189-5 n°805 - 1 (P805) - Plan sous-sol -1 - Vol 198



)02KN000189-5 n°806 - 1 (P806) - Plan sous-sol -1 - Vo 187



002KN000189-5 n°807 - 1 (P807) - Plan sous-sol -1 - Vol 187



)02KN000189-5 n°808 - 1 (P808) - Plan sous-sol -1 - Vo 184



002KN000189-5 n°809 - 1 (P809) - Plan sous-sol -1 - Vol 185



)02KN000189-5 n°810 - 1 (P810) - Plan sous-sol -1 - Vo 187



002KN000189-5 n°811 - 1 (P811) - Plan sous-sol -1 - Vol 187



002KN000189-5 n°813 - 1 (P813) - Plan R+1 - Vol 1411



)02KN000189-5 n°814 - 1 (P814) - Plan R+1 - Vol 141



002KN000189-5 n°815 - 1 (P815) - Plan R+1 - Vol 1411



)02KN000189-5 n°816 - 1 (P816) - Plan R+1 - Vol 141(



002KN000189-5 n°817 - 1 (P817) - Plan R+1 - Vol 1410



)02KN000189-5 n°818 - 1 (P818) - Plan R+1 - Vol 141(



002KN000189-5 n°819 - 1 (P819) - Plan R+1 - Vol 1412



)02KN000189-5 n°819 - 2 (P819) - Plan R+1 - Vol 141



002KN000189-5 n°820 - 1 (P820) - Plan R+1 - Vol 1413 (P142)



)02KN000189-5 n°821 - 1 (P821) - Plan R+1 - Vol 141



002KN000189-5 n°822 - 1 (P822) - Plan Rdc - Vol 1418 (Ext Sud)



)02KN000189-5 n°823 - 1 (P823) - Plan Rdc - Vol 141 (Ext Sud)



002KN000189-5 n°824 - 1 (P824) - Plan Rdc - Vol 1418 (Ext Sud)



)02KN000189-5 n°825 - 1 (P825) - Plan Rdc - Vol 139' (Cour intérieure 2)



002KN000189-5 n°826 - 1 (P826) - Plan R+2 - Vol 1419



)02KN000189-5 n°827 - 1 (P827) - Plan R+2 - Vol 142(



002KN000189-5 n°829 - 1 (P829) - Plan R+2 - Vol 1421 (THA8)



002KN000189-5 n°830 - 1 (P830) - Plan sous-sol -1 - Vol 96




)02KN000189-5 n°831 - 1 (P831) - Plan sous-sol -1 - Vo 96



002KN000189-5 n°833 - 1 (P833) - Plan sous-sol -2 - Vol 82




)02KN000189-5 n°834 - 1 (P834) - Plan sous-sol -2 - Vo 82

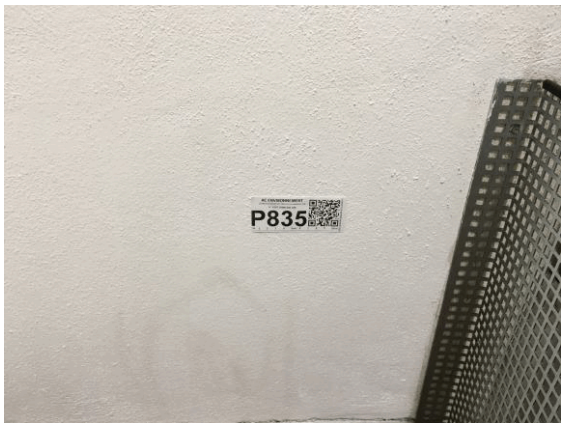


002KN000189-5 n°835 - 1 (P835) - Plan sous-sol -2 - Vol 83




002KN000189-5 n°836 - 1 (P836) - Plan R+2 - Vol 1425 (C201)

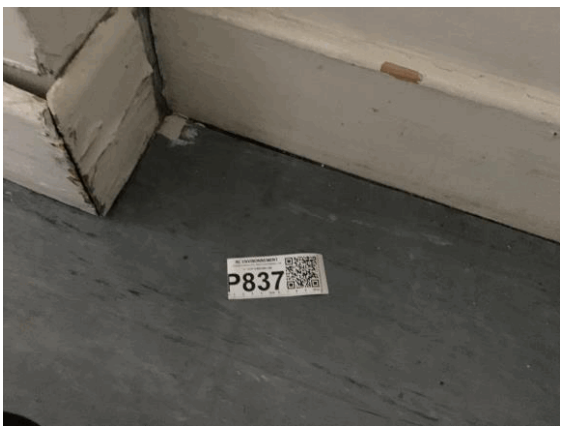

002KN000189-5 n°837 - 1 (P837) - Plan R+2 - Vol 909 (P202)

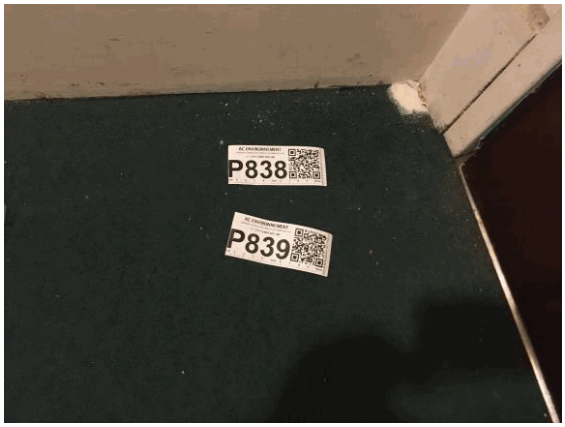

002KN000189-5 n°838 - 1 (P838) - Plan R+2 - Vol 1427

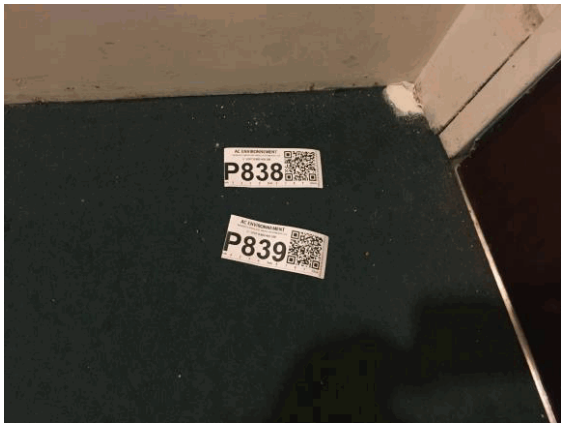

)02KN000189-5 n°838 - 2 (P838) - Plan R+2 - Vol 142



002KN000189-5 n°840 - 1 (P840) - Plan R+2 - Vol 1427



002KN000189-5 n°841 - 2 (P841) - Plan R+1 - Vol 792 (102)



002KN000189-5 n°841 - 1 (P841) - Plan R+1 - Vol 792 (102)



002KN000189-5 n°842 - 1 (P842) - Plan R+1 - Vol 739



002KN000189-5 n°843 - 1 (P843) - Plan R+1 - Vol 739



I18 - 1 (P844) - Plan Rdc - Vol 662 (Infirmerie 3)



002KN000189-5 n°844 - 2 (P844) - Plan Rdc - Vol 662 (Infirmerie 3)



002KN000189-5 n°845 - 1 (P845) - Plan Rdc - Vol 662 (Infirmerie 3)



002KN000189-5 n°845 - 2 (P845) - Plan Rdc - Vol 662 (Infirmerie 3)




002KN000189-5 n°846 - 3 (P846) - Plan sous-sol -2 - Vol 47



)02KN000189-5 n°847 - 1 (P847) - Plan sous-sol -2 - Vo
47



002KN000189-5 n°849 - 1 (P849) - Plan R+2 - Vol 925
(THB201)

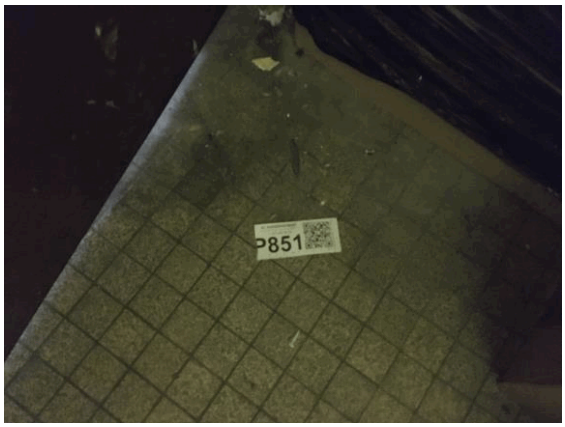

002KN000189-5 n°851 - 1 (P851) - Plan R+2 - Vol 910




002KN000189-5 n°852 - 1 (P852) - Plan R+2 - Vol 910



002KN000189-5 n°853 - 1 (P853) - Plan Rdc - Vol 704



002KN000189-5 n°854 - 1 (P854) - Plan Rdc - Vol 704

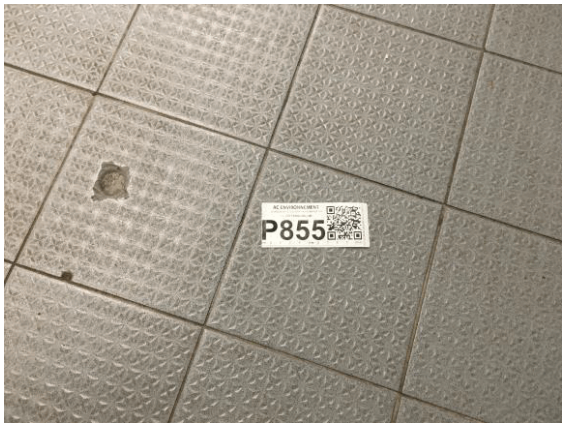

002KN000189-5 n°855 - 1 (P855) - Plan Rdc - Vol 700



002KN000189-5 n°856 - 1 (P856) - Plan Rdc - Vol 700



I3 - 1 - Plan R+6 - Vol 346 (Ascenseur)



002KN000189-5 n°858 - 1 (P858) - Plan R+3 - Vol 948



002KN000189-5 n°859 - 1 (P859) - Plan R+3 - Vol 1434



I4 - 1 - Plan Rdc - Vol 347 (Ascenseur)



002KN000189-5 n°860 - 1 (P860) - Plan R+3 - Vol 1434



6 - 1 - Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur



002KN000189-5 n°861 - 1 (P861) - Plan R+3 - Vol 1436



7 - 1 - Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur



002KN000189-5 n°862 - 1 (P862) - Plan R+3 - Vol 1436



8 - 1 - Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur



I14 - 1 - Plan sous-sol -1 - Vol 136



)02KN000189-5 n°863 - 1 (P863) - Plan R+3 - Vol 143



I15 - 1 - Plan sous-sol -2 - Vol 34



002KN000189-5 n°864 - 1 (P864) - Plan R+3 - Vol 960



I16 - 1 - Plan sous-sol -2 - Vol 37



002KN000189-5 n°865 - 1 (P865) - Plan R+4 - Vol 987



I17 - 1 - Plan R+1 - Vol 813



002KN000189-5 n°866 - 1 (P866) - Plan R+4 - Vol 987



I19 - 1 - Plan sous-sol -1 - Vol 143



002KN000189-5 n°867 - 1 (P867) - Plan R+4 - Vol 988



002KN000189-5 n°868 - 1 (P868) - Plan R+4 - Vol 988



I20 - 1 - Plan sous-sol -1 - Vol 152



002KN000189-5 n°869 - 1 (P869) - Plan R+4 - Vol 1446



002KN000189-3 n°330 - 1 - Plan sous-sol -2 - Vol 47



002KN000189-5 n°870 - 1 (P870) - Plan R+4 - Vol 1446



)02KN000189-5 n°871 - 1 (P871) - Plan R+4 - Vol 144(



002KN000189-5 n°872 - 1 (P872) - Plan R+4 - Vol 1450



)02KN000189-5 n°873 - 1 (P873) - Plan R+4 - Vol 145(



002KN000189-5 n°874 - 1 (P874) - Plan R+4 - Vol 1451



)02KN000189-5 n°875 - 1 (P875) - Plan R+4 - Vol 145



002KN000189-5 n°876 - 1 (P876) - Plan R+4 - Vol 1453



S9 - 1 (S9) - Plan sous-sol -2 - Vol 52



002KN000189-5 n°877 - 1 (P877) - Plan R+4 - Vol 1453



S10 - 1 (S10) - Plan sous-sol -2 - Vol 46



002KN000189-5 n°878 - 1 (P878) - Plan R+4 - Vol 1452



S11 - 1 (S11) - Plan sous-sol -2 - Vol 47



002KN000189-5 n°879 - 1 (P879) - Plan R+4 - Vol 1452



S12 - 1 (S12) - Plan sous-sol -2 - Vol 47



S78 - 1 (S78) - Plan sous-sol -2 - Vol 73



)02KN000189-5 n°880 - 1 (P880) - Plan R+4 - Vol 106(



S91 - 1 (S91) - Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)



)02KN000189-5 n°881 - 1 (P881) - Plan R+4 - Vol 106(



002KN000189-5 n°882 - 1 (P882) - Plan R+4 - Vol 1087



S92 - 1 (S92) - Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)



002KN000189-5 n°883 - 1 (P883) - Plan R+4 - Vol 1087



S226 - 1 (S226) - Plan Rdc - Vol 285 (P026)



002KN000189-5 n°884 - 1 (P884) - Plan R+4 - Vol 1088



S227 - 1 (S227) - Plan R+1 - Vol 276 (P115)



002KN000189-5 n°885 - 1 (P885) - Plan R+4 - Vol 1088



S231 - 1 (S231) - Plan R+2 - Vol 286 (P209)



S234 - 1 (S234) - Plan R+2 - Vol 287




)02KN000189-5 n°886 - 1 (P886) - Plan R+5 - Vol 145



002KN000189-5 n°887 - 1 (P887) - Plan R+5 - Vol 1454



S235 - 1 (S235) - Plan R+3 - Vol 288

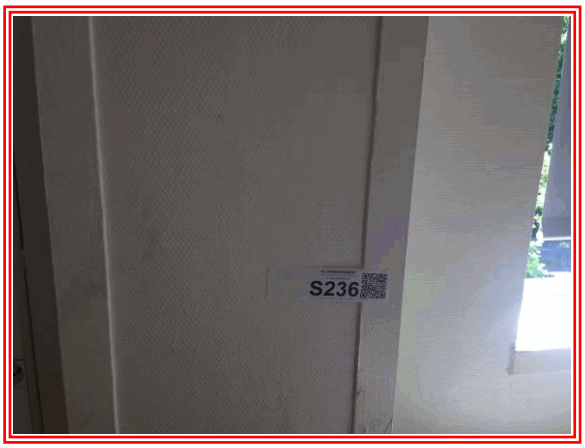

S236 - 1 (S236) - Plan R+3 - Vol 288



)02KN000189-5 n°888 - 1 (P888) - Plan R+5 - Vol 145



S237 - 1 (S237) - Plan R+3 - Vol 288



)02KN000189-5 n°889 - 1 (P889) - Plan R+5 - Vol 145



S238 - 1 (S238) - Plan R+3 - Vol 288



)02KN000189-5 n°890 - 1 (P890) - Plan R+5 - Vol 116



S244 - 1 (S244) - Plan R+3 - Vol 289 (P321)



)02KN000189-5 n°891 - 1 (P891) - Plan R+5 - Vol 116



S247 - 1 (S247) - Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)



)02KN000189-5 n°892 - 1 (P892) - Plan R+5 - Vol 113



002KN000189-5 n°893 - 1 (P893) - Plan R+5 - Vol 1133



S249 - 1 (S249) - Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)



002KN000189-5 n°894 - 1 (P894) - Plan R+5 - Vol 1119



S252 - 1 (S252) - Plan R+4 - Vol 291 (P427)



002KN000189-5 n°895 - 1 (P895) - Plan R+5 - Vol 1119



S253 - 1 (S253) - Plan R+5 - Vol 292 (P517)



002KN000189-5 n°896 - 1 (P896) - Plan R+5 - Vol 1238



S254 - 1 (S254) - Plan R+5 - Vol 292 (P517)



002KN000189-5 n°897 - 1 (P897) - Plan R+5 - Vol 1238



S255 - 1 (S255) - Plan R+5 - Vol 293 (P518)



002KN000189-5 n°898 - 1 (P898) - Plan R+5 - Vol 1238



S256 - 1 (S256) - Plan R+5 - Vol 293 (P518)



002KN000189-5 n°899 - 1 (P899) - Plan R+5 - Vol 1456



S257 - 1 (S257) - Plan R+5 - Vol 293 (P518)



S258 - 1 (S258) - Plan R+5 - Vol 293 (P518)



)02KN000189-5 n°900 - 1 (P900) - Plan R+5 - Vol 145(



002KN000189-5 n°901 - 1 (P901) - Plan R+5 - Vol 1457



S261 - 1 (S261) - Plan R+5 - Vol 292 (P517)



002KN000189-5 n°902 - 1 (P902) - Plan R+5 - Vol 1457



S262 - 1 (S262) - Plan R+5 - Vol 294 (P535)



002KN000189-5 n°903 - 1 (P903) - Plan R+5 - Vol 1458



S265 - 1 (S265) - Plan R+5 - Vol 294 (P535)



002KN000189-5 n°904 - 1 (P904) - Plan R+5 - Vol 1458



S266 - 1 (S266) - Plan R+6 - Vol 295



002KN000189-5 n°905 - 1 (P905) - Plan R+5 - Vol 1459



S267 - 1 (S267) - Plan R+6 - Vol 295



S270 - 1 (S270) - Plan R+6 - Vol 296 (P611)



)02KN000189-5 n°906 - 1 (P906) - Plan R+5 - Vol 145



S271 - 1 (S271) - Plan R+6 - Vol 296 (P611)



)02KN000189-5 n°907 - 1 (P907) - Plan R+5 - Vol 122



S275 - 1 (S275) - Plan R+6 - Vol 297



)02KN000189-5 n°908 - 1 (P908) - Plan R+5 - Vol 122(



002KN000189-5 n°909 - 1 (P909) - Plan R+5 - Vol 1216



S276 - 1 (S276) - Plan R+6 - Vol 297



S278 - 2 (S278) - Plan R+1 - Vol 298 (P104)



)02KN000189-5 n°910 - 1 (P910) - Plan R+5 - Vol 121(



002KN000189-5 n°911 - 1 (P911) - Plan R+5 - Vol 1461



S279 - 2 (S279) - Plan R+1 - Vol 298 (P104)



S297 - 1 (S297) - Plan Rdc - Vol 320 (B026)



)02KN000189-5 n°912 - 1 (P912) - Plan R+5 - Vol 146



S301 - 1 (S301) - Plan R+1 - Vol 321 (B105)



002KN000189-5 n°913 - 1 (P913) - Local fioul - Vol 1463 (Local fioul)



S302 - 1 (S302) - Plan R+1 - Vol 321 (B105)



)02KN000189-5 n°914 - 1 (P914) - Plan R+6 - Vol 124




S303 - 1 (S303) - Plan R+1 - Vol 321 (B105)



)02KN000189-5 n°915 - 1 (P915) - Plan R+6 - Vol 124



S304 - 1 (S304) - Plan R+1 - Vol 321 (B105)

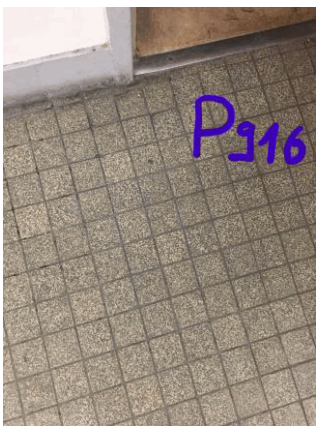

)02KN000189-5 n°916 - 1 (P916) - Plan R+6 - Vol 135



002KN000189-5 n°917 - 1 (P917) - Plan R+6 - Vol 1358



S305 - 1 (S305) - Plan R+2 - Vol 322 (B212)



S308 - 1 (S308) - Plan R+2 - Vol 324 (B223)



S309 - 1 (S309) - Plan R+2 - Vol 323 (B225)



S310 - 1 (S310) - Plan R+2 - Vol 324 (B223)



S311 - 1 (S311) - Plan R+2 - Vol 323 (B225)



002KN000189 n°107 - 1 (S316) - Plan R+2 - Vol 324 (B223)



S316 - 2 (S316) - Plan R+2 - Vol 324 (B223)



S317 - 2 (S317) - Plan R+2 - Vol 324 (B223)



S318 - 2 (S318) - Plan R+2 - Vol 323 (B225)



002KN000189 n°107 - 1 (S318) - Plan R+2 - Vol 323 (B225)



S319 - 2 (S319) - Plan R+2 - Vol 323 (B225)



002KN000189 n°107 - 1 (S319) - Plan R+2 - Vol 323 (B225)



S322 - 2 (S322) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)



002KN000189 n°110 - 1 (S322) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)



I23 - 1 - Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)



I24 - 1 - Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)



S323 - 2 (S323) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)



I25 - 1 - Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)



002KN000189 n°110 - 1 (S323) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)



S324 - 2 (S324) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)




I26 - 1 - Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)



I27 - 1 - Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)



002KN000189 n°110 - 1 (S324) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)

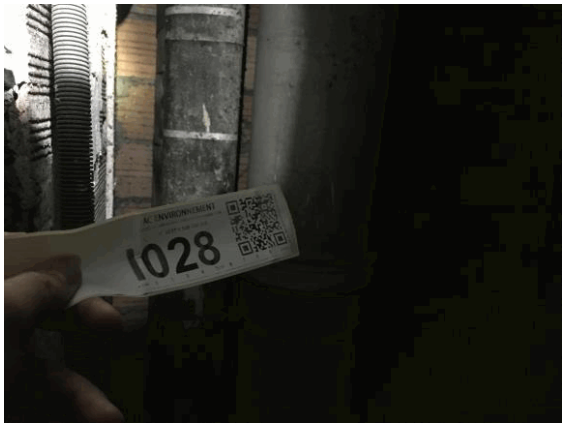

I28 - 1 - Plan R+3 - Vol 1433 (ZF0201VH)



002KN000189 n°110 - 1 (S325) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)



S325 - 2 (S325) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)



S326 - 1 (S326) - Plan R+3 - Vol 325 (B302)



S327 - 1 (S327) - Plan R+4 - Vol 326 (B408)



S328 - 1 (S328) - Plan R+4 - Vol 326 (B408)



S330 - 1 (S330) - Plan R+4 - Vol 326 (B408)



S331 - 1 (S331) - Plan R+4 - Vol 326 (B408)



S332 - 1 (S332) - Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)



S333 - 1 (S333) - Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)



S335 - 1 (S335) - Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)



S338 - 1 (S338) - Plan R+5 - Vol 329 (B532)



S339 - 1 (S339) - Plan R+5 - Vol 329 (B532)



S345 - 1 (S345) - Plan R+6 - Vol 330 (B606)



S346 - 1 (S346) - Plan R+6 - Vol 331 (B632)



S351 - 1 (S351) - Plan R+6 - Vol 331 (B632)



S354 - 1 (S354) - Plan R+6 - Vol 332 (B644)



S357 - 1 (S357) - Plan R+6 - Vol 333 (C614)



S359 - 1 (S359) - Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)



S360 - 1 (S360) - Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)



S363 - 1 (S363) - Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)



S366 - 1 (S366) - Plan R+5 - Vol 336 (D512)



S368 - 1 (S368) - Plan R+5 - Vol 337 (B516)




S371 - 1 (S371) - Plan R+5 - Vol 338 (B507)



S373 - 1 (S373) - Plan R+4 - Vol 339 (D409)



S375 - 1 (S375) - Plan R+4 - Vol 340 (D414)

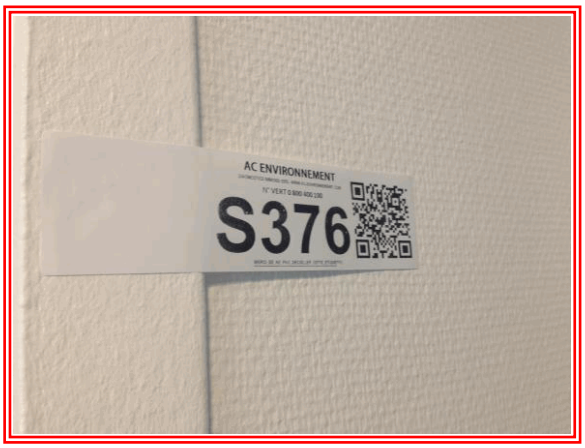

S376 - 1 (S376) - Plan R+4 - Vol 340 (D414)



S377 - 1 (S377) - Plan R+4 - Vol 340 (D414)



S378 - 1 (S378) - Plan R+4 - Vol 341 (C408)



S379 - 1 (S379) - Plan R+4 - Vol 341 (C408)



S382 - 1 (S382) - Plan R+1 - Vol 342 (P171)



S386 - 1 (S386) - Plan R+1 - Vol 342 (P171)




S387 - 2 (S387) - Plan R+1 - Vol 342 (P171)



S388 - 1 (S388) - Plan R+1 - Vol 343 (D111)



S390 - 1 (S390) - Plan R+1 - Vol 343 (D111)

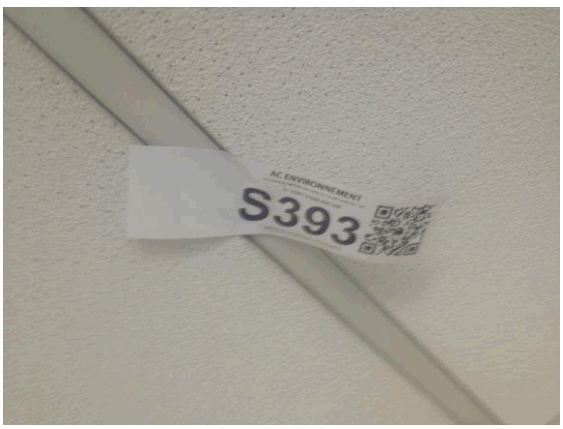

S393 - 1 (S393) - Plan R+1 - Vol 344 (D110)




S469 - 1 (S469) - Plan R+6 - Vol 359




S470 - 1 (S470) - Plan R+6 - Vol 358




S471 - 1 (S471) - Plan R+6 - Vol 360

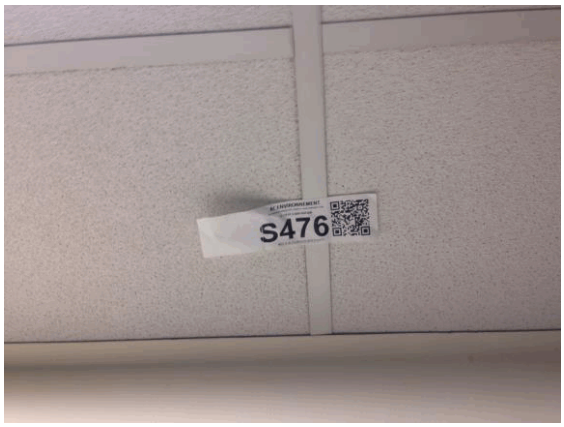

S476 - 1 (S476) - Plan R+6 - Vol 356

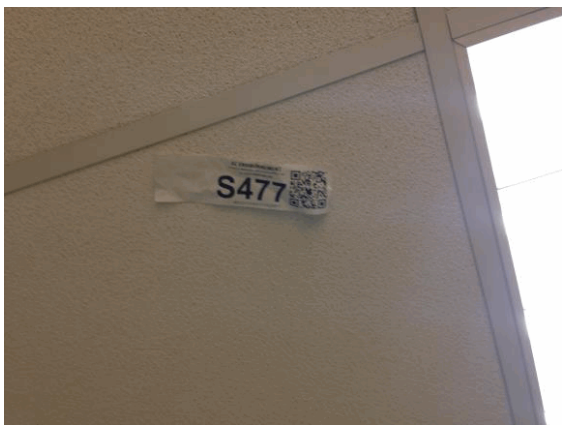

S477 - 1 (S477) - Plan R+6 - Vol 362

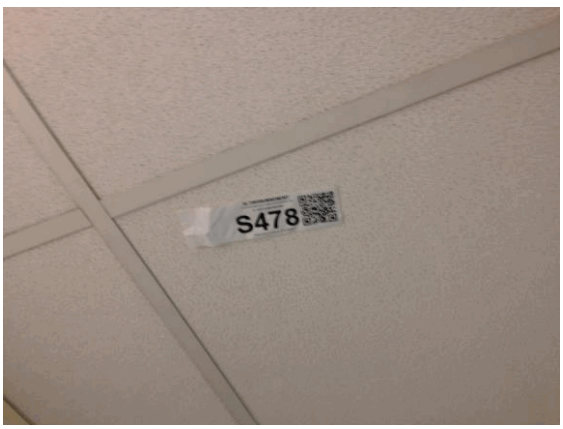

S478 - 1 (S478) - Plan R+6 - Vol 361



S567 - 2 (S567) - Plan R+1 - Vol 312 (P121)



002KN000189 n°223 - 1 (S568) - Plan R+1 - Vol 312 (P121)



002KN000189 n°223 - 1 (S569) - Plan R+1 - Vol 315



002KN000189 n°223 - 1 (S570) - Plan R+1 - Vol 315



002KN000189 n°223 - 1 (S571) - Plan R+1 - Vol 319



002KN000189 n°223 - 1 (S572) - Plan R+1 - Vol 319



002KN000189 n°223 - 1 (S573) - Plan R+1 - Vol 391 (P136)



002KN000189 n°223 - 1 (S574) - Plan R+1 - Vol 391 (P136)



002KN000189 n°223 - 1 (S575) - Plan R+1 - Vol 392 (P143)



002KN000189 n°223 - 1 (S576) - Plan R+1 - Vol 392 (P143)



002KN000189 n°223 - 1 (S577) - Plan R+1 - Vol 393



002KN000189 n°223 - 1 (S578) - Plan R+1 - Vol 393



002KN000189 n°223 - 1 (S579) - Plan R+1 - Vol 394 (P147)



002KN000189 n°223 - 1 (S580) - Plan R+1 - Vol 394 (P147)



002KN000189 n°223 - 1 (S581) - Plan R+1 - Vol 394 (P147)



002KN000189 n°223 - 1 (S582) - Plan R+1 - Vol 394 (P147)



002KN000189 n°223 - 1 (S583) - Plan R+1 - Vol 395



002KN000189 n°223 - 1 (S584) - Plan R+1 - Vol 395



002KN000189 n°223 - 1 (S585) - Plan R+1 - Vol 396



002KN000189 n°223 - 1 (S586) - Plan R+1 - Vol 396



002KN000189 n°223 - 1 (S587) - Plan R+2 - Vol 397



002KN000189 n°223 - 1 (S588) - Plan R+2 - Vol 397



002KN000189 n°223 - 1 (S589) - Plan R+2 - Vol 397



002KN000189 n°223 - 2 (S590) - Plan R+2 - Vol 397



002KN000189 n°223 - 1 (S590) - Plan R+2 - Vol 397



002KN000189 n°223 - 1 (S591) - Plan R+2 - Vol 398



002KN000189 n°223 - 1 (S592) - Plan R+2 - Vol 398



002KN000189 n°223 - 1 (S593) - Plan R+2 - Vol 399



002KN000189 n°223 - 2 (S594) - Plan R+2 - Vol 399



002KN000189 n°223 - 1 (S594) - Plan R+2 - Vol 399



002KN000189 n°223 - 1 (S595) - Plan R+2 - Vol 399



002KN000189 n°223 - 1 (S596) - Plan R+2 - Vol 399



002KN000189 n°223 - 1 (S597) - Plan R+2 - Vol 400



002KN000189 n°223 - 1 (S598) - Plan R+2 - Vol 400



002KN000189 n°223 - 1 (S599) - Plan R+2 - Vol 401



002KN000189 n°223 - 1 (S600) - Plan R+2 - Vol 401



002KN000189 n°223 - 1 (S601) - Plan R+2 - Vol 402



002KN000189 n°223 - 1 (S602) - Plan R+2 - Vol 402



002KN000189 n°223 - 1 (S603) - Plan R+2 - Vol 403



002KN000189 n°223 - 1 (S604) - Plan R+2 - Vol 403



002KN000189 n°223 - 1 (S605) - Plan R+2 - Vol 404



002KN000189 n°223 - 1 (S606) - Plan R+2 - Vol 404



002KN000189 n°223 - 1 (S607) - Plan R+3 - Vol 405



002KN000189 n°223 - 1 (S608) - Plan R+3 - Vol 405



002KN000189 n°223 - 1 (S609) - Plan R+3 - Vol 406



002KN000189 n°223 - 1 (S610) - Plan R+3 - Vol 406



002KN000189 n°223 - 1 (S611) - Plan R+3 - Vol 406



002KN000189 n°223 - 1 (S612) - Plan R+3 - Vol 406



002KN000189 n°223 - 1 (S613) - Plan R+3 - Vol 407



002KN000189 n°223 - 1 (S614) - Plan R+3 - Vol 407



002KN000189 n°223 - 1 (S615) - Plan R+3 - Vol 407



002KN000189 n°223 - 1 (S616) - Plan R+3 - Vol 408



002KN000189 n°223 - 1 (S617) - Plan R+3 - Vol 408



002KN000189 n°223 - 1 (S618) - Plan R+3 - Vol 408



002KN000189 n°223 - 1 (S619) - Plan R+3 - Vol 409



002KN000189 n°223 - 1 (S620) - Plan R+3 - Vol 410



002KN000189 n°223 - 1 (S621) - Plan R+3 - Vol 410



002KN000189 n°223 - 1 (S622) - Plan R+3 - Vol 410



002KN000189 n°223 - 1 (S623) - Plan R+3 - Vol 411



002KN000189 n°223 - 1 (S624) - Plan R+3 - Vol 411



002KN000189 n°223 - 1 (S625) - Plan R+3 - Vol 412



002KN000189 n°223 - 1 (S626) - Plan R+3 - Vol 412



002KN000189 n°223 - 1 (S627) - Plan R+3 - Vol 413



002KN000189 n°223 - 1 (S628) - Plan R+3 - Vol 413



002KN000189 n°223 - 1 (S629) - Plan R+3 - Vol 413



002KN000189 n°223 - 1 (S630) - Plan R+3 - Vol 413



002KN000189 n°223 - 1 (S631) - Plan R+3 - Vol 414



002KN000189 n°223 - 1 (S632) - Plan R+3 - Vol 414



002KN000189 n°223 - 1 (S633) - Plan R+3 - Vol 415



002KN000189 n°223 - 1 (S634) - Plan R+3 - Vol 415



002KN000189 n°223 - 1 (S635) - Plan R+3 - Vol 415



002KN000189 n°223 - 1 (S636) - Plan R+3 - Vol 416



002KN000189 n°223 - 1 (S637) - Plan R+3 - Vol 416



002KN000189 n°223 - 1 (S638) - Plan R+5 - Vol 417 (P504)



002KN000189 n°223 - 1 (S639) - Plan R+5 - Vol 417 (P504)



002KN000189 n°223 - 1 (S640) - Plan R+5 - Vol 418 (P501)



002KN000189 n°223 - 1 (S641) - Plan R+5 - Vol 418 (P501)



002KN000189 n°223 - 1 (S642) - Plan R+5 - Vol 418 (P501)



002KN000189 n°223 - 1 (S643) - Plan R+5 - Vol 418 (P501)



002KN000189 n°223 - 1 (S644) - Plan R+5 - Vol 419 (P506)



002KN000189 n°223 - 1 (S645) - Plan R+5 - Vol 419 (P506)



002KN000189 n°223 - 1 (S646) - Plan R+5 - Vol 420 (P508)



002KN000189 n°223 - 1 (S647) - Plan R+5 - Vol 420 (P508)



002KN000189 n°223 - 1 (S648) - Plan R+5 - Vol 420 (P508)



002KN000189 n°223 - 1 (S649) - Plan R+5 - Vol 421 (P505)



002KN000189 n°223 - 1 (S650) - Plan R+5 - Vol 421 (P505)



002KN000189 n°223 - 1 (S651) - Plan R+5 - Vol 421 (P505)



002KN000189 n°223 - 1 (S652) - Plan R+5 - Vol 421 (P505)



002KN000189 n°223 - 1 (S653) - Plan R+5 - Vol 422 (P510)



002KN000189 n°223 - 1 (S654) - Plan R+5 - Vol 422 (P510)



002KN000189 n°223 - 1 (S655) - Plan R+5 - Vol 422 (P510)



002KN000189 n°223 - 1 (S656) - Plan R+5 - Vol 423 (P509)



002KN000189 n°223 - 1 (S657) - Plan R+5 - Vol 423 (P509)



002KN000189 n°223 - 1 (S658) - Plan R+5 - Vol 424 (P513)



002KN000189 n°223 - 1 (S659) - Plan R+5 - Vol 424 (P513)



002KN000189 n°223 - 1 (S660) - Plan R+5 - Vol 425 (P521)



002KN000189 n°223 - 1 (S661) - Plan R+5 - Vol 425 (P521)



002KN000189 n°223 - 1 (S662) - Plan R+5 - Vol 425 (P521)



002KN000189 n°223 - 1 (S663) - Plan R+5 - Vol 425 (P521)



S1071 - 1 (S1071) - Plan R+7 - Vol 631



S1219 - 1 (S1219) - Plan Rdc - Vol 688



S1225 - 1 (S1225) - Plan Rdc - Vol 672



S1258 - 1 (S1258) - Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)



S1281 - 1 (S1281) - Plan R+1 - Vol 787



002KN000189-3 n°444 - 1 (S1291) - Plan R+1 - Vol 825



S1292 - 1 (S1292) - Plan R+1 - Vol 822




002KN000189-3 n°446 - 1 (S1293) - Plan R+1 - Vol 826



)02KN000189-3 n°446 - 1 (S1294) - Plan R+1 - Vol 82



S1297 - 1 (S1297) - Plan R+1 - Vol 727 (B102TER)

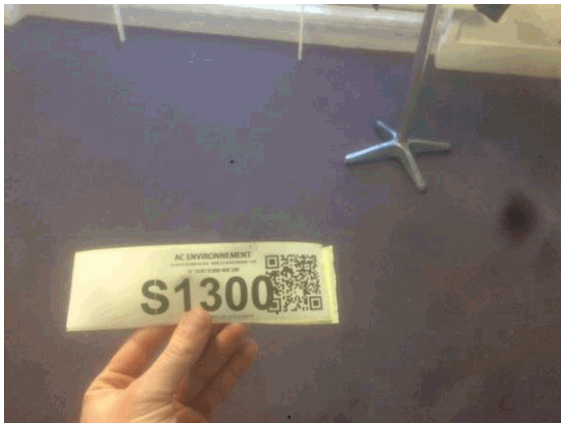

S1300 - 1 (S1300) - Plan R+2 - Vol 845



S1327 - 1 (S1327) - Plan R+2 - Vol 861



S1330 - 1 (S1330) - Plan R+2 - Vol 862



S1365 - 1 (S1365) - Plan R+1 - Vol 729



002KN000189-3 n°601 - 1 (S1488) - Plan R+6 - Vol 1272



)02KN000189-3 n°601 - 1 (S1489) - Plan R+6 - Vol 1273




S1802 - 1 (S1802) - Plan sous-sol -2 - Vol 73




S1803 - 1 (S1803) - Plan sous-sol -2 - Vol 73




S857 - 1 (S857) - Plan R+5 - Vol 536

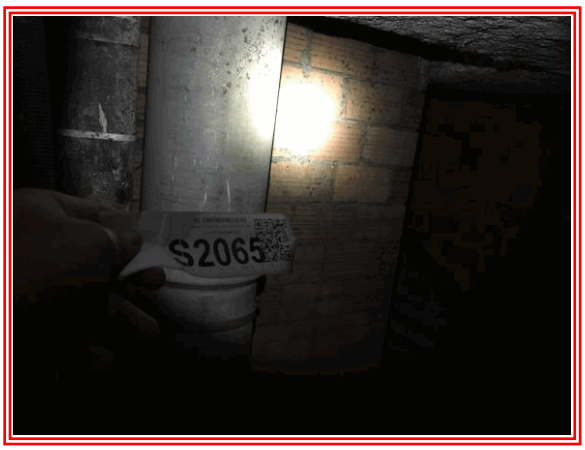


S2065 - 1 (S2065) - Plan R+3 - Vol 1433 (ZF0201VH)

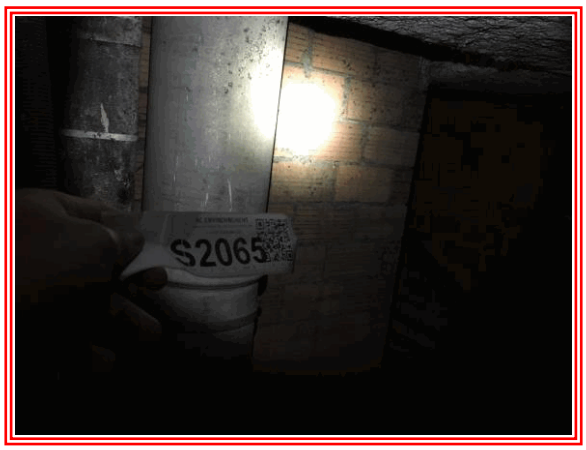


002KN000189-5 n°918 - 1 (S2086) - Plan sous-sol -1 - Vol 1471 (G.t condamnée 1)

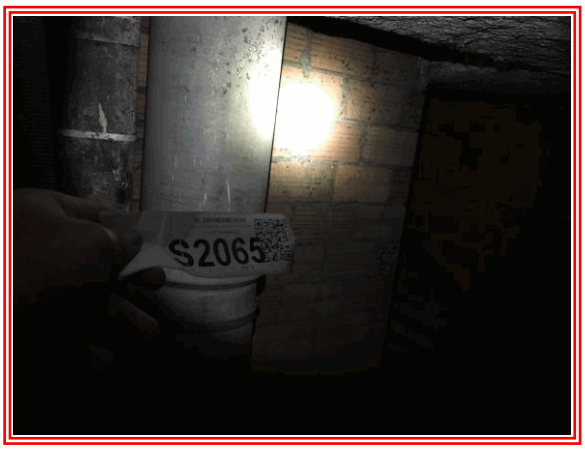


)02KN000189-5 n°918 - 1 (S2087) - Plan Rdc - Vol 1472 (G.t condamnée 2)

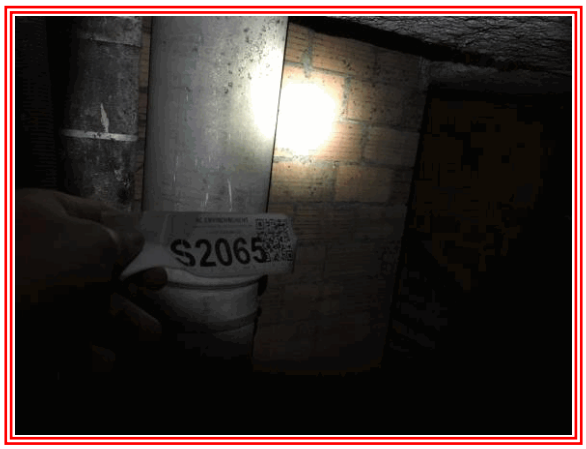


002KN000189-5 n°918 - 1 (S2088) - Plan R+1 - Vol 1473 (G.t condamnée 3)

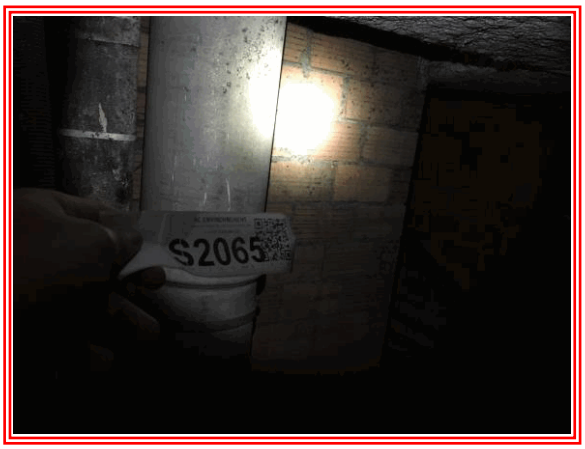


)02KN000189-5 n°918 - 1 (S2089) - Plan R+2 - Vol 1474 (G.t condamnée 4)

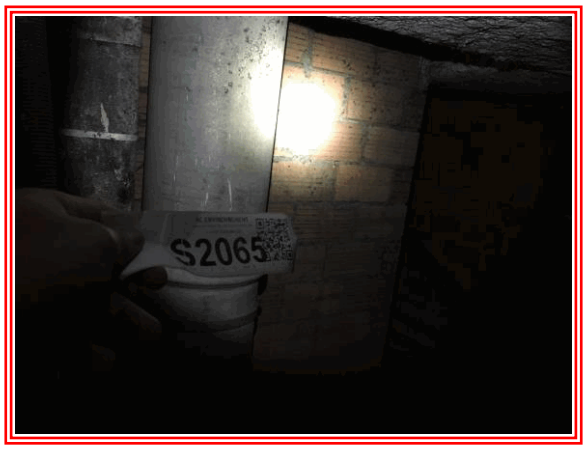

002KN000189-5 n°918 - 1 (S2090) - Plan R+4 - Vol 1475 (G.t condamnée 5)

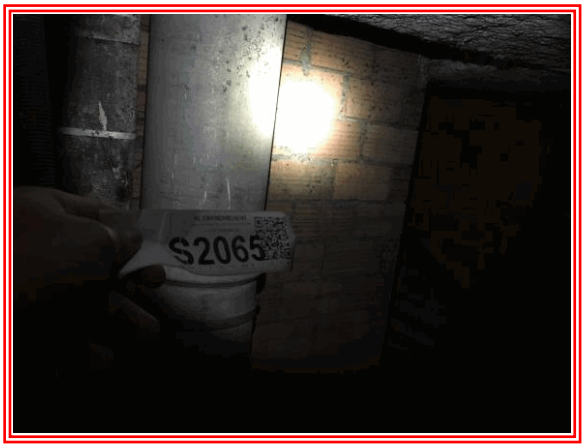

)02KN000189-5 n°918 - 1 (S2091) - Plan R+5 - Vol 1476 (G.t condamnée 6)

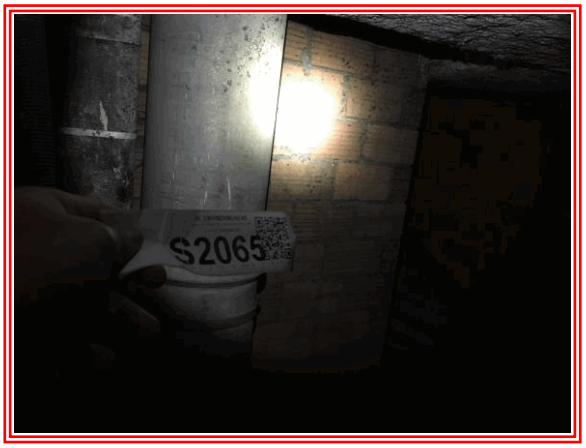

002KN000189-5 n°918 - 1 (S2092) - Plan R+6 - Vol 1477 (G.t condamnée 7)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002KN000189 n°1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu - -	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	
002KN000189 n°2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment - -	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	
002KN000189 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu - -	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	
002KN000189 n°4	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Beige - -	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	
002KN000189 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Fibreux Souple Marron - -	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)	
002KN000189 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment Effritable Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 4 (Réserve DI)	
002KN000189 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 15 (Esc)	
002KN000189 n°8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Rose - -	Plan sous-sol -2 - Vol 15 (Esc)	
002KN000189 n°9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Flocage Fibreux Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 24	
002KN000189 n°10	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc Matériau Effritable Noir - -	Plan sous-sol -2 - Vol 24	
002KN000189 n°11	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Carton Fibreux Souple Marron Matériau Effritable Noir - -	Plan sous-sol -2 - Vol 2 (Parking centre)	
002KN000189 n°12	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre Effritable Blanc Tresse Fibreux Souple Marron - -	Plan sous-sol -2 - Vol 51	

002KN000189 n°13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Fibreux Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)
002KN000189 n°14	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Orange Plâtre Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 46
002KN000189 n°15	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 46
002KN000189 n°16	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Plâtre Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 37
002KN000189 n°17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan sous-sol -2 - Vol 36
002KN000189 n°18	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Marron Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron - -	Plan sous-sol -2 - Vol 52
002KN000189 n°19	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Laine Fibreux Souple Jaune Papier Fibreux Souple Beige Matériau Effritable Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 52
002KN000189 n°20	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques - -	Plan sous-sol -2 - Vol 32
002KN000189 n°21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Carton Fibreux Souple Marron Peinture Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 31
002KN000189 n°22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 31
002KN000189 n°23	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Jaune Toile Fibreux Souple Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 71
002KN000189 n°24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Rouge Matériau Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)

002KN000189 n°25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Marron - -	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)
002KN000189 n°26	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Bitumineux Noir Toile Fibreux Souple Marron - -	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)
002KN000189 n°27	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau Bitumineux Noir Polystyrène Souple Blanc Toile Fibreux Souple Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)
002KN000189 n°28	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Jaune Aluminium Souple Gris Fibres Souple Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)
002KN000189 n°29	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau Bitumineux Noir Polystyrène Souple Blanc Matériau Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 252
002KN000189 n°30	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 253
002KN000189 n°31	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc Matériau Effritable Noir - -	Plan sous-sol -2 - Vol 253
002KN000189 n°32	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Bitumineux Noir - -	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)
002KN000189 n°33	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)
002KN000189 n°34	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Flocage Fibreux Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 8 (Ventilation amphi)

002KN000189 n°35	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile Fibreux Souple Marron Matériau Souple Beige Matériau Bitumineux Noir Polystyrène Souple Bleu - -	Plan sous-sol -2 - Vol 8 (Ventilation amphi)
002KN000189 n°36	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Jaune Plâtre Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 142
002KN000189 n°37	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Plâtre Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 142
002KN000189 n°38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 174
002KN000189 n°39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Effritable Rose - -	Plan sous-sol -1 - Vol 175
002KN000189 n°40	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages - -	Plan sous-sol -1 - Vol 166
002KN000189 n°41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 284
002KN000189 n°42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Blanc Ragréage Effritable Rose - -	Plan sous-sol -1 - Vol 152
002KN000189 n°43	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Flocage Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 135
002KN000189 n°44	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Fibreux Effritable Blanc Papier Fibreux Souple Multicolore - -	Plan sous-sol -1 - Vol 138
002KN000189 n°45	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques - -	Plan sous-sol -1 - Vol 176
002KN000189 n°46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Beige Colle Souple Jaune Moquette Fibreux Souple Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 176
002KN000189 n°47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage - -	Plan Rdc - Vol 285 (P026)

002KN000189 n°48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 285 (P026)
002KN000189 n°49	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 285 (P026)
002KN000189 n°50	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe - -	Plan Rdc - Vol 285 (P026)
002KN000189 n°51	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan Rdc - Vol 285 (P026)
002KN000189 n°52	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture Effritable Noir Bois Dur Fibreux Marron Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Gris Mastic Dur Gris - -	Plan Rdc - Vol 285 (P026)
002KN000189 n°53	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Fibreux Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 285 (P026)
002KN000189 n°54	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Blanc Vert Peinture Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 285 (P026)
002KN000189 n°55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Marron Toile Souple Fibreux Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 276 (P115)
002KN000189 n°56	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 276 (P115)
002KN000189 n°57	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron Papier peint Souple Fibreux Blanc - -	Plan R+1 - Vol 276 (P115)

002KN000189 n°58	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Dur Marron Noir - -	Plan R+1 - Vol 276 (P115)
002KN000189 n°59	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan R+2 - Vol 286 (P209)
002KN000189 n°60	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	Plan R+2 - Vol 286 (P209)
002KN000189 n°61	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan R+2 - Vol 286 (P209)
002KN000189 n°62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Revêtement Souple Marron Matériau Effritable Blanc Beige - -	Plan R+2 - Vol 286 (P209)
002KN000189 n°63	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Effritable Marron Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Noir - -	Plan R+2 - Vol 286 (P209)
002KN000189 n°64	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Vert Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 287
002KN000189 n°65	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 287

002KN000189 n°66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune Revêtement Souple Marron Matériau Effritable Beige - -	Plan R+2 - Vol 287
002KN000189 n°67	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+3 - Vol 288
002KN000189 n°68	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+3 - Vol 288
002KN000189 n°69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Beige Revêtement Souple Gris Toile Souple Fibreux Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Bois Dur Fibreux Marron - -	Plan R+3 - Vol 289 (P321)
002KN000189 n°70	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Marron Peinture Effritable Noir Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+3 - Vol 289 (P321)
002KN000189 n°71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Vert Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige - -	Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)
002KN000189 n°72	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)

002KN000189 n°73	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Marron Matériau Effritable Noir Blanc - -	Plan R+4 - Vol 290 (P413 ter)
002KN000189 n°74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Joint Souple Blanc Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 291 (P427)
002KN000189 n°75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	Plan R+4 - Vol 291 (P427)
002KN000189 n°76	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 291 (P427)
002KN000189 n°77	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Marron Blanc Noir - -	Plan R+4 - Vol 291 (P427)
002KN000189 n°78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Noir Sous-couche Souple Fibreux Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Matériau Souple Blanc - -	Plan R+5 - Vol 292 (P517)
002KN000189 n°79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 292 (P517)
002KN000189 n°80	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 292 (P517)
002KN000189 n°81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 294 (P535)
002KN000189 n°82	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 294 (P535)

002KN000189 n°83	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris - -	Plan R+5 - Vol 294 (P535)
002KN000189 n°84	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 295
002KN000189 n°85	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 295
002KN000189 n°86	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Beige Matériau Effritable Blanc Gris - -	Plan R+6 - Vol 295
002KN000189 n°87	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 297
002KN000189 n°88	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 297
002KN000189 n°89	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Beige Matériau Effritable Gris Blanc - -	Plan R+6 - Vol 297
002KN000189 n°90	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Translucide Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 320 (B026)
002KN000189 n°91	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	Plan Rdc - Vol 320 (B026)
002KN000189 n°92	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert - -	Plan Rdc - Vol 320 (B026)
002KN000189 n°93	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés - -	Plan Rdc - Vol 320 (B026)

002KN000189 n°94	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Gris Beige Vert Revêtement Semi-dur Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan R+1 - Vol 321 (B105)
002KN000189 n°95	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 321 (B105)
002KN000189 n°96	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc Bleu - -	Plan R+1 - Vol 321 (B105)
002KN000189 n°97	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Bois Dur Fibreux Marron Mastic Effritable Marron - -	Plan R+1 - Vol 321 (B105)
002KN000189 n°98	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan R+1 - Vol 321 (B105)
002KN000189 n°99	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 322 (B212)
002KN000189 n°100	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 322 (B212)
002KN000189 n°101	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 322 (B212)
002KN000189 n°102	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 322 (B212)
002KN000189 n°103	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche - -	Plan R+2 - Vol 324 (B223)
002KN000189 n°104	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige - -	Plan R+2 - Vol 324 (B223)
002KN000189 n°105	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 324 (B223)

002KN000189 n°106	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Bois Dur Fibreux Marron Mastic Dur Gris Beige - -	Plan R+2 - Vol 324 (B223)
002KN000189 n°107	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Rose Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune - -	Plan R+3 - Vol 325 (B302)
002KN000189 n°108	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert - -	Plan R+3 - Vol 325 (B302)
002KN000189 n°109	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Toile Fibreux Souple Blanc - -	Plan R+3 - Vol 325 (B302)
002KN000189 n°110	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 326 (B408)
002KN000189 n°111	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 326 (B408)
002KN000189 n°112	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)
002KN000189 n°113	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)
002KN000189 n°114	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - -	Plan R+4 - Vol 327 (B424 bis)
002KN000189 n°115	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche - -	Plan R+5 - Vol 328 (B530)
002KN000189 n°116	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan R+5 - Vol 328 (B530)
002KN000189 n°117	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 328 (B530)

002KN000189 n°118	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 330 (B606)
002KN000189 n°119	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige - -	Plan R+6 - Vol 330 (B606)
002KN000189 n°120	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Blanc - -	Plan R+6 - Vol 330 (B606)
002KN000189 n°121	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche - -	Plan R+6 - Vol 332 (B644)
002KN000189 n°122	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune - -	Plan R+6 - Vol 332 (B644)
002KN000189 n°123	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Fibres Souple Blanc - -	Plan R+6 - Vol 332 (B644)
002KN000189 n°124	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche - -	Plan R+6 - Vol 333 (C614)
002KN000189 n°125	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 333 (C614)
002KN000189 n°126	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 333 (C614)
002KN000189 n°127	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)
002KN000189 n°128	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)
002KN000189 n°129	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau Effritable Blanc Noir - -	Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)

002KN000189 n°130	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 334 (Bureau 4)
002KN000189 n°131	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)
002KN000189 n°132	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)
002KN000189 n°133	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc - -	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)
002KN000189 n°134	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)
002KN000189 n°135	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige Blanc - -	Plan R+5 - Vol 335 (D511 bis)
002KN000189 n°136	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche - -	Plan R+5 - Vol 336 (D512)
002KN000189 n°137	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 336 (D512)
002KN000189 n°138	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 336 (D512)
002KN000189 n°139	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 336 (D512)
002KN000189 n°140	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	Plan R+5 - Vol 337 (B516)
002KN000189 n°141	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 337 (B516)
002KN000189 n°142	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 337 (B516)
002KN000189 n°143	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige - -	Plan R+5 - Vol 337 (B516)

002KN000189 n°144	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Noir Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Revêtement Souple Fibreux Marron - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189 n°145	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189 n°146	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189 n°147	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Blanc - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189 n°148	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Gris Noir - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189 n°149	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Noir Beige Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189 n°150	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	Plan R+4 - Vol 339 (D409)
002KN000189 n°151	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Beige Blanc - -	Plan R+4 - Vol 339 (D409)
002KN000189 n°152	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Marron Toile Fibreux Souple Blanc - -	Plan R+4 - Vol 339 (D409)
002KN000189 n°153	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Noir Beige Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 339 (D409)
002KN000189 n°154	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Beige Blanc - -	Plan R+4 - Vol 339 (D409)
002KN000189 n°155	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu - -	Plan R+4 - Vol 340 (D414)

002KN000189 n°156	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris Toile Fibreux Souple Blanc - -	Plan R+4 - Vol 340 (D414)
002KN000189 n°157	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc - -	Plan R+4 - Vol 340 (D414)
002KN000189 n°158	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Toile Fibreux Souple Blanc - -	Plan R+4 - Vol 340 (D414)
002KN000189 n°159	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Gris Mastic Dur Blanc Matériau Souple Noir - -	Plan R+4 - Vol 340 (D414)
002KN000189 n°160	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc - -	Plan R+4 - Vol 341 (C408)
002KN000189 n°161	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Beige - -	Plan R+4 - Vol 341 (C408)
002KN000189 n°162	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Blanc Matériau Effritable Noir Marron - -	Plan R+4 - Vol 341 (C408)
002KN000189 n°163	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Orange Fibres Souple Blanc - -	Plan R+1 - Vol 342 (P171)
002KN000189 n°164	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Orange Beige Toile Fibreux Souple Beige Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 342 (P171)
002KN000189 n°165	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Bande peinte Effritable Fibreux Blanc - -	Plan R+1 - Vol 342 (P171)

002KN000189 n°166	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Bois Dur Fibreux Marron Peinture Effritable Noir Mastic Dur Blanc - -	Plan R+1 - Vol 342 (P171)
002KN000189 n°167	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron - -	Plan R+1 - Vol 343 (D111)
002KN000189 n°168	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron - -	Plan R+1 - Vol 343 (D111)
002KN000189 n°169	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 343 (D111)
002KN000189 n°170	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Marron Beige Matériau Effritable Noir Gris - -	Plan R+1 - Vol 343 (D111)
002KN000189 n°171 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Marron Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige - -	Plan R+1 - Vol 344 (D110)
002KN000189 n°171 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Vert Colle Souple Jaune - -	Plan R+1 - Vol 344 (D110)
002KN000189 n°171 Phase 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 344 (D110)
002KN000189 n°172	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan R+1 - Vol 344 (D110)
002KN000189 n°173	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 344 (D110)
002KN000189 n°174	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 344 (D110)
002KN000189 n°175	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau Effritable Beige Jaune - -	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)
002KN000189 n°176	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages - -	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)

002KN000189 n°177	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Vert Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Dur Noir Matériau Effritable Beige Gris Ciment Dur Gris - -	Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)
002KN000189 n°178	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Fibreux Souple Marron Ragréage Effritable Gris Rose Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)
002KN000189 n°179	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc - -	Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)
002KN000189 n°180	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris Rouge - -	Plan Rdc - Vol 264
002KN000189 n°181	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)
002KN000189 n°182	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Bois Dur Fibreux Marron - -	Plan Rdc - Vol 261 (Escalier A)
002KN000189 n°183 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan R+2 - Vol 349 (Palier et escalier)
002KN000189 n°183 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 349 (Palier et escalier)
002KN000189 n°184 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris Colle Bitumineux Noir - -	Plan R+2 - Vol 349 (Palier et escalier)
002KN000189 n°184 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Marron Colle Souple Jaune Matériau Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 349 (Palier et escalier)
002KN000189 n°184 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Plan R+2 - Vol 349 (Palier et escalier)

002KN000189 n°185	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron - -	Plan R+4 - Vol 351 (Palier et escalier)
002KN000189 n°186	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan R+4 - Vol 351 (Palier et escalier)
002KN000189 n°187	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan R+4 - Vol 351 (Palier et escalier)
002KN000189 n°188 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 352 (Palier et escalier)
002KN000189 n°188 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Noir Gris - -	Plan R+5 - Vol 352 (Palier et escalier)
002KN000189 n°189	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc - -	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)
002KN000189 n°190	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Rose - -	Plan sous-sol -1 - Vol 156
002KN000189 n°191	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche - -	Plan R+6 - Vol 360
002KN000189 n°192	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige - -	Plan R+6 - Vol 360
002KN000189 n°193	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris Joint Dur Gris - -	Plan R+6 - Vol 359
002KN000189 n°194	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - -	Plan R+6 - Vol 359
002KN000189 n°195	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - -	Plan R+6 - Vol 359
002KN000189 n°196	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - -	Plan R+6 - Vol 359
002KN000189 n°197	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 359

002KN000189 n°198	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Fibreux Effritable Beige Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 360
002KN000189 n°199	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Jaune Tresse Fibreux Souple Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 360
002KN000189 n°200	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 362
002KN000189 n°201	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Ragréage Effritable Gris Rose Colle Souple Jaune - -	Plan R+4 - Vol 363
002KN000189 n°202	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Matériau Effritable Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune - -	Plan R+4 - Vol 363
002KN000189 n°203	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - -	Plan R+4 - Vol 364
002KN000189 n°204	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Effritable Fibreux Beige - -	Plan R+4 - Vol 364
002KN000189 n°205	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune - -	Plan R+3 - Vol 372
002KN000189 n°206	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan R+2 - Vol 376

002KN000189 n°207	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Jaune Toile Fibreux Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 374
002KN000189 n°208	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+2 - Vol 375
002KN000189 n°209	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Fibreux Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 376
002KN000189 n°210	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Jaune Tresse Fibreux Souple Beige Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 376
002KN000189 n°211	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 375
002KN000189 n°212	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 363
002KN000189 n°213	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+2 - Vol 375
002KN000189 n°214	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+4 - Vol 363
002KN000189 n°215	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche - -	Plan R+1 - Vol 378
002KN000189 n°216	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche - -	Plan Rdc - Vol 382
002KN000189 n°217	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris Bois Dur Fibreux Marron - -	Plan Rdc - Vol 385
002KN000189 n°218	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 355
002KN000189 n°219 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Plan R+5 - Vol 387

002KN000189 n°219 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 387
002KN000189 n°219 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Souple Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan R+5 - Vol 387
002KN000189 n°220	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Fibreux Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 388
002KN000189 n°221 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Noir Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 389
002KN000189 n°221 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 389
002KN000189 n°222	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Noir Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+3 - Vol 390
002KN000189 -1 n°223	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris - -	Plan R+7 - Vol 610
002KN000189 -1 n°224	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+7 - Vol 611
002KN000189 -1 n°225	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris - -	Plan R+7 - Vol 610
002KN000189 -1 n°226	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Laine Fibreux Souple Jaune Carton Souple Fibreux Marron Bande peinte Effritable Fibreux Blanc - -	Plan R+7 - Vol 612
002KN000189 -1 n°227	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris - -	Plan R+7 - Vol 612
002KN000189 -1 n°228	Façades	Murs	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris - -	Plan R+7 - Vol 612
002KN000189 -1 n°229	Façades	Murs	Ciment Dur Gris Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc - -	Plan R+7 - Vol 612
002KN000189 -1 n°230	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris - -	Plan R+7 - Vol 613
002KN000189 -1 n°231	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris - -	Plan R+7 - Vol 613

002KN000189-1 n°232	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Bitumineux Fibreux Noir - -	Plan R+7 - Vol 612
002KN000189-1 n°233	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Plan R+7 - Vol 614
002KN000189-1 n°234	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Flocage Fibreux Effritable Gris - -	Plan R+7 - Vol 615
002KN000189-1 n°235	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Flocage Fibreux Effritable Gris - -	Plan R+7 - Vol 618
002KN000189-1 n°236	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Joint Souple Rouge Peinture Effritable Gris - -	Plan R+7 - Vol 620
002KN000189-1 n°237	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+7 - Vol 611
002KN000189-1 n°238	Façades	Murs	Matériau Effritable Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+7 - Vol 623
002KN000189-1 n°239	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris - -	Plan R+7 - Vol 623
002KN000189-1 n°240	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle Bitumineux Fibreux Gris Noir Aluminium Souple Gris Matériau Effritable Marron - -	Plan R+7 - Vol 623
002KN000189-1 n°241	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Beige - -	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)
002KN000189-1 n°242	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron - -	Plan R+5 - Vol 387
002KN000189-1 n°243	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 388
002KN000189-1 n°244	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Noir Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan R+6 - Vol 624

002KN000189-1 n°245	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan R+3 - Vol 390
002KN000189-1 n°246	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits lissés - -	Plan R+1 - Vol 626
002KN000189-1 n°247	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit Effritable Beige Blanc Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Plan Rdc - Vol 627
002KN000189-1 n°248	Façades	Murs	Ciment Dur Gris Peinture Souple Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+7 - Vol 632
002KN000189-1 n°249	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris - -	Plan R+7 - Vol 632
002KN000189-1 n°250	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Aluminium Souple Gris - -	Plan R+7 - Vol 632
002KN000189-1 n°251	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris - -	Plan R+7 - Vol 628
002KN000189-1 n°252	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Bleu Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+7 - Vol 630
002KN000189-1 n°253	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Papier Fibreux Souple Beige - -	Plan R+7 - Vol 630
002KN000189-1 n°254	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Blanc Bleu - -	Plan R+7 - Vol 631

002KN000189-1 n°255	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+7 - Vol 631
002KN000189-1 n°256	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc - -	Plan R+7 - Vol 631
002KN000189-1 n°257	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc Joint Souple Blanc - -	Plan R+7 - Vol 631
002KN000189-1 n°258	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Gris Matériau Effritable Noir - -	Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur)
002KN000189-1 n°259	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Gris Matériau Effritable Noir - -	Plan façade intérieur - Vol 634 (Façade intérieur)
002KN000189-1 n°260	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Gris - -	Plan façade extérieur - Vol 633 (Façade extérieur)
002KN000189-1 n°261	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Gris - -	Plan façade extérieur - Vol 633 (Façade extérieur)
002KN000189-2 n°262	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Bois Dur Fibreux Marron - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189-2 n°263	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189-2 n°264	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189-2 n°265	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Souple Noir - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189-2 n°267	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic d'étanchéité - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189-2 n°268	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Papier peint Souple Fibreux Rose Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 627

002KN000189-2 n°269	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Poussière sur lingette Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)
002KN000189-2 n°270	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine Fibreux Jaune - Au sol -	Plan R+5 - Vol 345 (Plénum amphi 8)
002KN000189-2 n°271	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Orange Noir Matériau Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)
002KN000189-2 n°272	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Matériau Souple Gris - -	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)
002KN000189-2 n°273	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Dur Blanc Peinture Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)
002KN000189-2 n°274	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Gris Marron Ciment Dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)
002KN000189-2 n°275	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Dur Blanc Bois Dur Fibreux Marron - -	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)
002KN000189-2 n°276	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Flocage Fibreux Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)
002KN000189-2 n°277	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Gris Colle Souple Jaune Matériau Souple Vert - -	Plan R+5 - Vol 635 (Escaliers)
002KN000189-2 n°278	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 636 Salle de reunion
002KN000189-2 n°279	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 636 Salle de reunion
002KN000189-2 n°280	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Marron Vert - -	Plan R+5 - Vol 636 Salle de reunion
002KN000189-2 n°281	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 636 Salle de reunion
002KN000189-3 n°282	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Beige - -	Plan sous-sol -1 - Vol 637
002KN000189-3 n°283	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture Effritable Multicolore Matériau Souple Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 177

002KN000189 -3 n°284 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 177
002KN000189 -3 n°284 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Orange Joint Effritable Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 177
002KN000189 -3 n°285 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Orange Matériau Souple Fibreux Beige - -	Plan sous-sol -1 - Vol 178
002KN000189 -3 n°285 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Vert - -	Plan sous-sol -1 - Vol 178
002KN000189 -3 n°286	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 181
002KN000189 -3 n°287	Revêtement de sol	Faux plancher	Colle Souple Jaune - -	Plan sous-sol -1 - Vol 181
002KN000189 -3 n°288	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 191
002KN000189 -3 n°289	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Béton Dur Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 191
002KN000189 -3 n°290	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) - -	Plan sous-sol -1 - Vol 179
002KN000189 -3 n°291	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 192
002KN000189 -3 n°292	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Gris Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 189
002KN000189 -3 n°293	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment - -	Plan sous-sol -1 - Vol 165
002KN000189 -3 n°294	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau Résineux Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 167
002KN000189 -3 n°295	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau Fibreux Souple Blanc Matériau Effritable Noir - -	Plan sous-sol -1 - Vol 166

002KN000189 -3 n°297	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Beige - -	Plan sous-sol -1 - Vol 106
002KN000189 -3 n°298	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Blanc Matériau Effritable Marron - -	Plan sous-sol -1 - Vol 86
002KN000189 -3 n°299	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint Souple Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 91
002KN000189 -3 n°300	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Frein - -	Plan sous-sol -1 - Vol 88
002KN000189 -3 n°301	Revêtement de sol	Massif	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 88
002KN000189 -3 n°302	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Plaques menuiserie - -	Plan sous-sol -1 - Vol 87
002KN000189 -3 n°303	Plafond et faux-plafonds	Interface entre structures	Peinture Effritable Blanc Matériau Fibreux Souple Marron - -	Plan sous-sol -1 - Vol 86
002KN000189 -3 n°304 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Vert Toile Souple Fibreux Jaune Colle Souple Jaune - -	Plan sous-sol -1 - Vol 97
002KN000189 -3 n°304 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 97
002KN000189 -3 n°305 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 111
002KN000189 -3 n°305 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Bitumineux Noir Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 111
002KN000189 -3 n°306 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Rouge - -	Plan sous-sol -1 - Vol 111
002KN000189 -3 n°306 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Beige - -	Plan sous-sol -1 - Vol 111
002KN000189 -3 n°306 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose Peinture Effritable Rose Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 111

002KN000189-3 n°307	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 113
002KN000189-3 n°308	Façades	Murs	Ciment Effritable Fibreux Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 108
002KN000189-3 n°309	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Flocage Fibreux Souple Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 86
002KN000189-3 n°310	Conduits, canalisations et équipements	Clapets/volet Coupe feu	Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Beige - -	Plan sous-sol -1 - Vol 135
002KN000189-3 n°311	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 135
002KN000189-3 n°312	Conduits, canalisations et équipements	Clapets/volet Coupe feu	Matériau Effritable Fibreux Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 143
002KN000189-3 n°315	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Matériau Dur Fibreux Blanc Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 144
002KN000189-3 n°316	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau Bitumineux Noir Toile Souple Fibreux Beige Laine Souple Fibreux Jaune - -	Plan sous-sol -1 - Vol 284
002KN000189-3 n°317 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Rose - -	Plan sous-sol -1 - Vol 92
002KN000189-3 n°317 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 92
002KN000189-3 n°317 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Bois Effritable Fibreux Beige - -	Plan sous-sol -1 - Vol 92
002KN000189-3 n°318	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Souple Blanc Jaune Revêtement Semi-dur Noir - -	Plan sous-sol -1 - Vol 92
002KN000189-3 n°319	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 92
002KN000189-3 n°320	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Gris Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 92

002KN000189-3 n°321	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 194
002KN000189-3 n°322	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Blanc Matériau Effritable Beige - -	Plan sous-sol -1 - Vol 194
002KN000189-3 n°323	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 69
002KN000189-3 n°324	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 32
002KN000189-3 n°325	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Béton Dur Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 79
002KN000189-3 n°326	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Souple Fibreux Marron Matériau Effritable Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 79
002KN000189-3 n°327	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Fibreux Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 79
002KN000189-3 n°328	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Ciment Effritable Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 37
002KN000189-3 n°329	Equipements divers et accessoires	Aérothermes	Laine Souple Fibreux Noir Jaune Matériau Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 46
002KN000189-3 n°331	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Toile Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Plan sous-sol -2 - Vol 77
002KN000189-3 n°332	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine Souple Fibreux Noir Matériau Effritable Noir - -	Plan sous-sol -2 - Vol 77
002KN000189-3 n°333	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture Effritable Blanc Joint Dur Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 76
002KN000189-3 n°334	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint Effritable Gris Matériau Souple Fibreux Marron - -	Plan sous-sol -2 - Vol 57
002KN000189-3 n°335	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment - -	Plan sous-sol -2 - Vol 57
002KN000189-3 n°336	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Souple Fibreux Marron Matériau Effritable Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 53
002KN000189-3 n°337	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 59

002KN000189 -3 n°338	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 59
002KN000189 -3 n°339	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ragréage Effritable Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 41
002KN000189 -3 n°340	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Souple Fibreux Marron - -	Plan sous-sol -2 - Vol 16 (SB 207)
002KN000189 -3 n°341	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Souple Fibreux Marron - -	Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)
002KN000189 -3 n°342	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Papier Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Polystyrène Souple Blanc Peinture Effritable Blanc Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 16 (SB 207)
002KN000189 -3 n°343	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Mousse Souple Beige Tresse Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Marron - -	Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)
002KN000189 -3 n°344	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture Effritable Vert Enduit Effritable Beige Matériau Dur Gris Matériau Souple Translucide - -	Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)
002KN000189 -3 n°345	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau Effritable Marron - -	Plan sous-sol -2 - Vol 17 (SB 209)
002KN000189 -3 n°346	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau Effritable Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 25
002KN000189 -3 n°348	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 1 (Parking nord)
002KN000189 -3 n°349 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan Rdc - Vol 652 (Bureaux 12)
002KN000189 -3 n°349 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 652 (Bureaux 12)
002KN000189 -3 n°350	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 654 (Bureaux 14)

002KN000189 -3 n°351 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Marron - -	Plan Rdc - Vol 654 (Bureaux 14)
002KN000189 -3 n°351 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 654 (Bureaux 14)
002KN000189 -3 n°352	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Papier Souple Fibreux Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 653 (Bureaux 13)
002KN000189 -3 n°353	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Plan Rdc - Vol 384
002KN000189 -3 n°354	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 384
002KN000189 -3 n°355 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan Rdc - Vol 384
002KN000189 -3 n°355 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 384
002KN000189 -3 n°356 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan Rdc - Vol 384
002KN000189 -3 n°356 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 384
002KN000189 -3 n°357 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan Rdc - Vol 661
002KN000189 -3 n°357 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan Rdc - Vol 661

002KN000189 -3 n°358	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint Souple Fibreux Bleu Toile Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Fibres Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 661
002KN000189 -3 n°359 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan Rdc - Vol 320 (B026)
002KN000189 -3 n°359 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 320 (B026)
002KN000189 -3 n°360 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Marron - -	Plan Rdc - Vol 382
002KN000189 -3 n°360 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige - -	Plan Rdc - Vol 382
002KN000189 -3 n°361	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron - -	Plan Rdc - Vol 320 (B026)
002KN000189 -3 n°362 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Bleu Revêtement Semi-dur Rose Toile Souple Fibreux Marron - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189 -3 n°362 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Souple Fibreux Multicolore - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189 -3 n°363 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Multicolore Colle Souple Jaune - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)

002KN000189 -3 n°363 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Marron Matériau Effritable Beige - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189 -3 n°364 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Orange Toile Souple Fibreux Jaune - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189 -3 n°364 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Gris Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189 -3 n°365 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Orange Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Jaune - -	Plan Rdc - Vol 655 (B028)
002KN000189 -3 n°365 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 655 (B028)
002KN000189 -3 n°366 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Orange Toile Souple Fibreux Jaune Colle Souple Jaune - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189 -3 n°366 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Multicolore Joint Souple Gris - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189 -3 n°366 Phase 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189 -3 n°367	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Peinture Effritable Gris Colle Souple Jaune - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189 -3 n°368	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Gris Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189 -3 n°369 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Souple Gris Peinture Effritable Bleu - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189 -3 n°369 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Jaune Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)

002KN000189-3 n°369 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Bleu Colle Souple Marron - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189-3 n°369 Phase 8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 659 (Bureaux 15)
002KN000189-3 n°370	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Rose - -	Plan Rdc - Vol 666 (Infirmerie 2)
002KN000189-3 n°371 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Gris - -	Plan Rdc - Vol 666 (Infirmerie 2)
002KN000189-3 n°371 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Plan Rdc - Vol 666 (Infirmerie 2)
002KN000189-3 n°372	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 666 (Infirmerie 2)
002KN000189-3 n°374	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Gris Revêtement Dur Bleu Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 664
002KN000189-3 n°375	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Noir Ragréage Effritable Beige Ciment Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 664
002KN000189-3 n°376 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 385
002KN000189-3 n°376 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Gris - -	Plan Rdc - Vol 385
002KN000189-3 n°377 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Blanc Vert Joint Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 385
002KN000189-3 n°377 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Plan Rdc - Vol 385
002KN000189-3 n°378 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Blanc Matériau Effritable Noir - -	Plan Rdc - Vol 669
002KN000189-3 n°378 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Bleu - -	Plan Rdc - Vol 669

002KN000189 -3 n°379 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan Rdc - Vol 669
002KN000189 -3 n°379 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Bleu Ragréage Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 669
002KN000189 -3 n°380 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune - -	Plan Rdc - Vol 673 (C005)
002KN000189 -3 n°380 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Blanc - -	Plan Rdc - Vol 673 (C005)
002KN000189 -3 n°381	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 673 (C005)
002KN000189 -3 n°382	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 673 (C005)
002KN000189 -3 n°383 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu - -	Plan Rdc - Vol 675
002KN000189 -3 n°383 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan Rdc - Vol 675
002KN000189 -3 n°384 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Gris Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune - -	Plan Rdc - Vol 681
002KN000189 -3 n°384 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 681
002KN000189 -3 n°385 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu - -	Plan Rdc - Vol 682
002KN000189 -3 n°385 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 682
002KN000189 -3 n°386	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Beige Ragréage Dur Rose - -	Plan Rdc - Vol 688

002KN000189 -3 n°387 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 671
002KN000189 -3 n°387 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 671
002KN000189 -3 n°387 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 671
002KN000189 -3 n°388	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Beige - -	Plan Rdc - Vol 671
002KN000189 -3 n°389 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Plan Rdc - Vol 671
002KN000189 -3 n°389 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Souple Blanc - -	Plan Rdc - Vol 671
002KN000189 -3 n°389 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 671
002KN000189 -3 n°390	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Noir Matériau Souple Translucide - -	Plan Rdc - Vol 671
002KN000189 -3 n°391 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 692
002KN000189 -3 n°391 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 692
002KN000189 -3 n°392 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Beige Blanc - -	Plan Rdc - Vol 692
002KN000189 -3 n°392 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Beige Marron - -	Plan Rdc - Vol 692
002KN000189 -3 n°393	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Beige Bleu - -	Plan Rdc - Vol 692
002KN000189 -3 n°395 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan Rdc - Vol 696 (Sureté)
002KN000189 -3 n°395 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ragréage Effritable Rose - -	Plan Rdc - Vol 696 (Sureté)

002KN000189 -3 n°396	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 696 (Sureté)
002KN000189 -3 n°397 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan Rdc - Vol 702
002KN000189 -3 n°397 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Souple Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 702
002KN000189 -3 n°398	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 705
002KN000189 -3 n°399	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 708
002KN000189 -3 n°400	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Papier peint Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 708
002KN000189 -3 n°401	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 708
002KN000189 -3 n°402	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 649 (Couloir 4)
002KN000189 -3 n°403	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 649 (Couloir 4)
002KN000189 -3 n°404	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Bleu - -	Plan Rdc - Vol 644 (Couloir 2)
002KN000189 -3 n°405 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Rouge - -	Plan Rdc - Vol 710

002KN000189-3 n°405 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Toile Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 710
002KN000189-3 n°406	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 710
002KN000189-3 n°407	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 710
002KN000189-3 n°408	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Fibreux Souple Blanc - -	Plan Rdc - Vol 710
002KN000189-3 n°409 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Jaune - -	Plan Rdc - Vol 641
002KN000189-3 n°409 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan Rdc - Vol 641
002KN000189-3 n°410	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 266
002KN000189-3 n°411	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)
002KN000189-3 n°412 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)
002KN000189-3 n°412 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)
002KN000189-3 n°413 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)
002KN000189-3 n°413 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Blanc Joint Dur Blanc - -	Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)
002KN000189-3 n°413 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 267 (Sanitaires 1)
002KN000189-3 n°414 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige - -	Plan Rdc - Vol 259

002KN000189-3 n°414 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Plan Rdc - Vol 259
002KN000189-3 n°415 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement Souple Blanc Marron - -	Plan Rdc - Vol 266
002KN000189-3 n°415 Phase 2	Revêtement de mur	Matériau Résineux Noir Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 266
002KN000189-3 n°416 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Bleu Revêtement Souple Bleu - -	Plan Rdc - Vol 711
002KN000189-3 n°416 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan Rdc - Vol 711
002KN000189-3 n°417 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Jaune - -	Plan Rdc - Vol 712
002KN000189-3 n°417 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 712
002KN000189-3 n°418	Revêtement de sol	Peinture Effritable Bleu Revêtement Souple Jaune Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Marron - -	Plan Rdc - Vol 712
002KN000189-3 n°419	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 712
002KN000189-3 n°420 Phase 1	Revêtement de mur	Peinture Effritable Multicolore Joint Dur Blanc - -	Plan Rdc - Vol 712
002KN000189-3 n°420 Phase 3	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Plan Rdc - Vol 712
002KN000189-3 n°420 Phase 4	Revêtement de mur	Plâtre Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 712
002KN000189-3 n°421 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Bleu Joint Dur Gris - -	Plan Rdc - Vol 714

002KN000189-3 n°421 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige Marron - -	Plan Rdc - Vol 714
002KN000189-3 n°422	Revêtement de mur	Peinture Effritable Blanc Colle Dur Blanc - -	Plan Rdc - Vol 714
002KN000189-3 n°423	Revêtement de mur	Peinture Effritable Multicolore Colle Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 714
002KN000189-3 n°424 Phase 1	Revêtement de sol	Joint Souple Blanc - -	Plan Rdc - Vol 716
002KN000189-3 n°424 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan Rdc - Vol 716
002KN000189-3 n°424 Phase 5	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris - -	Plan Rdc - Vol 716
002KN000189-3 n°425 Phase 1	Revêtement de sol	Joint Souple Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 717
002KN000189-3 n°425 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Plan Rdc - Vol 717
002KN000189-3 n°425 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Marron - -	Plan Rdc - Vol 717
002KN000189-3 n°426 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan Rdc - Vol 256
002KN000189-3 n°426 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan Rdc - Vol 256
002KN000189-3 n°427 Phase 1	Revêtement de sol	Joint Dur Gris - -	Plan R+1 - Vol 799
002KN000189-3 n°427 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris - -	Plan R+1 - Vol 799
002KN000189-3 n°428 Phase 1	Revêtement de mur	Peinture Effritable Multicolore Joint Dur Gris - -	Plan R+1 - Vol 799

002KN000189 -3 n°428 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 799
002KN000189 -3 n°429	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 799
002KN000189 -3 n°430 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune - -	Plan R+1 - Vol 821
002KN000189 -3 n°430 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 821
002KN000189 -3 n°431 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Souple Gris Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+1 - Vol 776
002KN000189 -3 n°431 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Gris - -	Plan R+1 - Vol 776
002KN000189 -3 n°432	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 758
002KN000189 -3 n°433	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc - -	Plan R+1 - Vol 758
002KN000189 -3 n°434	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Translucide - -	Plan R+1 - Vol 786
002KN000189 -3 n°435 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Marron Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+1 - Vol 760
002KN000189 -3 n°435 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 760
002KN000189 -3 n°436 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Beige - -	Plan R+1 - Vol 784

002KN000189-3 n°436 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Noir - -	Plan R+1 - Vol 784
002KN000189-3 n°436 Phase 5	Revêtement de sol	Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 784
002KN000189-3 n°437 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Multicolore Joint Souple Beige - -	Plan R+1 - Vol 776
002KN000189-3 n°437 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+1 - Vol 776
002KN000189-3 n°437 Phase 5	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Plan R+1 - Vol 776
002KN000189-3 n°438 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan R+1 - Vol 429
002KN000189-3 n°438 Phase 3	Revêtement de sol	Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Ciment Dur Gris - -	Plan R+1 - Vol 429
002KN000189-3 n°439 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Peinture Effritable Multicolore - -	Plan R+1 - Vol 429
002KN000189-3 n°439 Phase 3	Revêtement de sol	Matériau Effritable Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan R+1 - Vol 429
002KN000189-3 n°440 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau Effritable Gris Revêtement Semi-dur Rouge Toile Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 429
002KN000189-3 n°440 Phase 5	Revêtement de sol	Colle Souple Blanc Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Noir Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+1 - Vol 429
002KN000189-3 n°441	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 823

002KN000189 -3 n°442	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 823
002KN000189 -3 n°443 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Sous-couche Souple Fibreux Blanc - -	Plan R+1 - Vol 813
002KN000189 -3 n°443 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Beige Ragréage Dur Rose Peinture Effritable Multicolore - -	Plan R+1 - Vol 813
002KN000189 -3 n°444 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Rouge Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+1 - Vol 837
002KN000189 -3 n°444 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 837
002KN000189 -3 n°445 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune - -	Plan R+1 - Vol 822
002KN000189 -3 n°445 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 822
002KN000189 -3 n°446 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune - -	Plan R+1 - Vol 751
002KN000189 -3 n°446 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 751
002KN000189 -3 n°447 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan R+1 - Vol 752
002KN000189 -3 n°447 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+1 - Vol 752

002KN000189 -3 n°447 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 752
002KN000189 -3 n°448 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+2 - Vol 842
002KN000189 -3 n°448 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+2 - Vol 842
002KN000189 -3 n°449 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Fibreux Gris - -	Plan R+2 - Vol 843
002KN000189 -3 n°449 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 843
002KN000189 -3 n°450	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 855
002KN000189 -3 n°451	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 855
002KN000189 -3 n°452 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Blanc Bleu Joint Dur Blanc - -	Plan R+2 - Vol 855
002KN000189 -3 n°452 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Souple Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 855
002KN000189 -3 n°453	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 855
002KN000189 -3 n°454 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Beige Revêtement Souple Fibreux Gris - -	Plan R+2 - Vol 847
002KN000189 -3 n°454 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 847
002KN000189 -3 n°455 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Noir - -	Plan R+2 - Vol 845

002KN000189 -3 n°455 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Bois Dur Fibreux Beige Peinture Effritable Orange Carton Souple Fibreux Marron - -	Plan R+2 - Vol 845
002KN000189 -3 n°456	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Noir Matériau Souple Translucide - -	Plan R+2 - Vol 845
002KN000189 -3 n°457	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Rouge Matériau Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 845
002KN000189 -3 n°458	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 848
002KN000189 -3 n°459	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 848
002KN000189 -3 n°460	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Fibreux Semi-dur Gris Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Plan R+2 - Vol 848
002KN000189 -3 n°461	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 848
002KN000189 -3 n°462	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Toile Souple Beige Colle Souple Jaune - -	Plan R+2 - Vol 847
002KN000189 -3 n°463 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau Effritable Blanc Joint Dur Gris - -	Plan R+2 - Vol 847

002KN000189-3 n°463 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Noir - -	Plan R+2 - Vol 847
002KN000189-3 n°464	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune Rouge - -	Plan R+2 - Vol 847
002KN000189-3 n°465 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Joint Dur Gris - -	Plan R+2 - Vol 847
002KN000189-3 n°465 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Fibreux Gris - -	Plan R+2 - Vol 847
002KN000189-3 n°466	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 625
002KN000189-3 n°467	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Fibreux Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 625
002KN000189-3 n°468 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Noir - -	Plan R+2 - Vol 859
002KN000189-3 n°468 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 859
002KN000189-3 n°469 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Noir - -	Plan R+2 - Vol 859
002KN000189-3 n°469 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Bleu Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 859
002KN000189-3 n°469 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Plan R+2 - Vol 859
002KN000189-3 n°470 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Translucide Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+2 - Vol 862
002KN000189-3 n°470 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 862

002KN000189-3 n°471	Revêtement de sol	Colle Dur Fibreux Gris Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Rose - -	Plan R+2 - Vol 863
002KN000189-3 n°472 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune - -	Plan R+2 - Vol 864
002KN000189-3 n°472 Phase 3	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Revêtement Souple Fibreux Marron - -	Plan R+2 - Vol 864
002KN000189-3 n°472 Phase 6	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Revêtement Souple Fibreux Beige Colle Souple Orange Matériau Effritable Blanc Matériau Souple Blanc Jaune - -	Plan R+2 - Vol 864
002KN000189-3 n°472 Phase 11	Revêtement de sol	Matériau Effritable Fibreux Blanc - -	Plan R+2 - Vol 864
002KN000189-3 n°473 Phase 1	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Vert - -	Plan R+2 - Vol 886
002KN000189-3 n°473 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Matériau Dur Beige - -	Plan R+2 - Vol 886
002KN000189-3 n°473 Phase 6	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Beige Matériau Effritable Marron Béton Dur Gris Ciment Dur Gris - -	Plan R+2 - Vol 886
002KN000189-3 n°474	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris - -	Plan R+2 - Vol 886
002KN000189-3 n°475 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris - -	Plan R+2 - Vol 881
002KN000189-3 n°475 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 881

002KN000189 -3 n°476 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Fibreux Gris - -	Plan R+2 - Vol 876
002KN000189 -3 n°476 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Gris - -	Plan R+2 - Vol 876
002KN000189 -3 n°477	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Peinture Effritable Vert - -	Plan R+2 - Vol 876
002KN000189 -3 n°478 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Fibreux Blanc - -	Plan R+2 - Vol 876
002KN000189 -3 n°478 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Vert Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 876
002KN000189 -3 n°479 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige - -	Plan R+2 - Vol 908
002KN000189 -3 n°479 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Souple Beige Matériau Effritable Gris Colle Souple Marron Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+2 - Vol 908
002KN000189 -3 n°480	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Fibreux Beige - -	Plan R+2 - Vol 893
002KN000189 -3 n°481 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Souple Blanc - -	Plan R+2 - Vol 893
002KN000189 -3 n°481 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Beige - -	Plan R+2 - Vol 893
002KN000189 -3 n°481 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 893
002KN000189 -3 n°482 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Marron - -	Plan R+2 - Vol 891

002KN000189-3 n°482 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Peinture Effritable Bleu Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+2 - Vol 891
002KN000189-3 n°482 Phase 7	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 891
002KN000189-3 n°483 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Fibreux Semi-dur Multicolore Joint Souple Blanc - -	Plan R+2 - Vol 915 (B211)
002KN000189-3 n°483 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+2 - Vol 915 (B211)
002KN000189-3 n°483 Phase 6	Revêtement de sol	Peinture Effritable Beige Revêtement Souple Marron Colle Souple Marron - -	Plan R+2 - Vol 915 (B211)
002KN000189-3 n°484 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan R+2 - Vol 917
002KN000189-3 n°484 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 917
002KN000189-3 n°485 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Gris - -	Plan R+2 - Vol 918
002KN000189-3 n°485 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 918
002KN000189-3 n°486 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige - -	Plan R+2 - Vol 922
002KN000189-3 n°486 Phase 4	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 922
002KN000189-3 n°489 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige - -	Plan R+1 - Vol 724 (B102)

002KN000189 -3 n°489 Phase 4	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+1 - Vol 724 (B102)
002KN000189 -3 n°490 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Joint Souple Blanc - -	Plan R+1 - Vol 725
002KN000189 -3 n°490 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Marron Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige - -	Plan R+1 - Vol 725
002KN000189 -3 n°490 Phase 6	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+1 - Vol 725
002KN000189 -3 n°491 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau Effritable Gris Revêtement Semi-dur Bleu Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige - -	Plan R+1 - Vol 728 (B507)
002KN000189 -3 n°491 Phase 5	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Gris Blanc - -	Plan R+1 - Vol 728 (B507)
002KN000189 -3 n°492 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Marron Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige - -	Plan R+1 - Vol 730
002KN000189 -3 n°492 Phase 5	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 730
002KN000189 -3 n°493 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau Souple Jaune Revêtement Semi-dur Bleu - -	Plan R+1 - Vol 732
002KN000189 -3 n°493 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Gris Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 732
002KN000189 -3 n°494 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau Effritable Blanc Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+1 - Vol 735

002KN000189 -3 n°494 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Marron Colle Souple Marron Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 735
002KN000189 -3 n°495	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+1 - Vol 733
002KN000189 -3 n°496 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Gris Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige - -	Plan R+1 - Vol 781 (B114)
002KN000189 -3 n°496 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 781 (B114)
002KN000189 -3 n°497 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan R+1 - Vol 780 (B112)
002KN000189 -3 n°497 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 780 (B112)
002KN000189 -3 n°498 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Beige Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige - -	Plan R+1 - Vol 736
002KN000189 -3 n°498 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 736
002KN000189 -3 n°499 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Marron Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige - -	Plan R+1 - Vol 734
002KN000189 -3 n°499 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+1 - Vol 734

002KN000189-3 n°500 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige - -	Plan R+1 - Vol 783
002KN000189-3 n°500 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Vert - -	Plan R+1 - Vol 783
002KN000189-3 n°501 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Gris Revêtement Semi-dur Vert Colle Souple Jaune Toile Fibreux Souple Beige - -	Plan R+1 - Vol 788
002KN000189-3 n°501 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+1 - Vol 788
002KN000189-3 n°502 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris - -	Plan R+3 - Vol 955
002KN000189-3 n°502 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+3 - Vol 955
002KN000189-3 n°502 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Noir Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+3 - Vol 955
002KN000189-3 n°503 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+3 - Vol 953
002KN000189-3 n°503 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+3 - Vol 953
002KN000189-3 n°503 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+3 - Vol 953
002KN000189-3 n°504 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu - -	Plan R+3 - Vol 938
002KN000189-3 n°504 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+3 - Vol 938
002KN000189-3 n°505 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Bleu - -	Plan R+3 - Vol 932

002KN000189Revêtement de sol -3 n°505 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+3 - Vol 932
002KN000189Revêtement de sol -3 n°505 Phase 6	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Plan R+3 - Vol 932
002KN000189Revêtement de sol -3 n°506	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Plan R+3 - Vol 932
002KN000189Revêtement de sol -3 n°507 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+3 - Vol 939
002KN000189Revêtement de sol -3 n°507 Phase 3	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+3 - Vol 939
002KN000189Revêtement de mur -3 n°508	Revêtement de mur	Colle Souple Jaune Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris - -	Plan R+3 - Vol 927
002KN000189Revêtement de sol -3 n°509	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+3 - Vol 944
002KN000189Revêtement de sol -3 n°510 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+2 - Vol 895
002KN000189Revêtement de sol -3 n°510 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 895
002KN000189Revêtement de sol -3 n°511 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Orange Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+2 - Vol 899
002KN000189Revêtement de sol -3 n°511 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 899
002KN000189Revêtement de sol -3 n°512 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+2 - Vol 912

002KN000189 -3 n°512 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Blanc Ragréage Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 912
002KN000189 -3 n°513 Phase 1	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Gris - -	Plan R+2 - Vol 1369
002KN000189 -3 n°513 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 1369
002KN000189 -3 n°514 Phase 1	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Gris Toile Souple Fibreux Blanc - -	Plan R+2 - Vol 1371
002KN000189 -3 n°514 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 1371
002KN000189 -3 n°515 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Colle Souple Translucide Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Blanc - -	Plan R+2 - Vol 1365
002KN000189 -3 n°515 Phase 5	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Marron Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 1365
002KN000189 -3 n°516 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+2 - Vol 1364
002KN000189 -3 n°516 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 1364

002KN000189 -3 n°517 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Blanc Beige Revêtement Semi-dur Marron - -	Plan R+2 - Vol 913 (Bureaux 16)
002KN000189 -3 n°517 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 913 (Bureaux 16)
002KN000189 -3 n°518	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Souple Beige Matériau Effritable Marron Noir Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 920 (B204)
002KN000189 -3 n°519 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan R+2 - Vol 923 (B201)
002KN000189 -3 n°519 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Beige Revêtement Souple Marron - -	Plan R+2 - Vol 923 (B201)
002KN000189 -3 n°519 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige - -	Plan R+2 - Vol 923 (B201)
002KN000189 -3 n°519 Phase 8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Joint Souple Blanc Matériau Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 923 (B201)
002KN000189 -3 n°520	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Plan R+2 - Vol 849
002KN000189 -3 n°521 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Multicolore - -	Plan R+2 - Vol 849
002KN000189 -3 n°521 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 849
002KN000189 -3 n°522	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 871
002KN000189 -3 n°523	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 872

002KN000189 -3 n°524	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Laine Souple Fibreux Vert Matériau Effritable Marron - -	Plan R+2 - Vol 872
002KN000189 -3 n°525	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige Blanc - -	Plan R+2 - Vol 872
002KN000189 -3 n°526 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Souple Blanc Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+2 - Vol 871
002KN000189 -3 n°526 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 871
002KN000189 -3 n°527 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu Gris - -	Plan R+2 - Vol 451
002KN000189 -3 n°527 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+2 - Vol 451
002KN000189 -3 n°527 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Plan R+2 - Vol 451
002KN000189 -3 n°528 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan R+2 - Vol 451
002KN000189 -3 n°528 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Noir Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 451
002KN000189 -3 n°529	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Plan R+2 - Vol 868
002KN000189 -3 n°530 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Beige - -	Plan R+3 - Vol 949
002KN000189 -3 n°530 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+3 - Vol 949
002KN000189 -3 n°530 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+3 - Vol 949
002KN000189 -3 n°531 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Vert - -	Plan R+3 - Vol 936 (B 307)
002KN000189 -3 n°531 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ciment Effritable Gris - -	Plan R+3 - Vol 936 (B 307)

002KN000189-3 n°532	Revêtement de sol	Colle Souple Blanc Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+3 - Vol 934
002KN000189-3 n°533 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Beige Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+3 - Vol 933
002KN000189-3 n°533 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+3 - Vol 933
002KN000189-3 n°534 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Revêtement Semi-dur Fibreux Gris - -	Plan R+3 - Vol 941
002KN000189-3 n°534 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Jaune - -	Plan R+3 - Vol 941
002KN000189-3 n°535 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Plan R+3 - Vol 942
002KN000189-3 n°535 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Marron - -	Plan R+3 - Vol 942
002KN000189-3 n°536	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris - -	Plan R+3 - Vol 926
002KN000189-3 n°537 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Plan R+3 - Vol 946
002KN000189-3 n°537 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris - -	Plan R+3 - Vol 946
002KN000189-3 n°538 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+4 - Vol 1000
002KN000189-3 n°538 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 1000
002KN000189-3 n°539 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune - -	Plan R+4 - Vol 1003
002KN000189-3 n°539 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris - -	Plan R+4 - Vol 1003

002KN000189 -3 n°539 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1003
002KN000189 -3 n°540 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+4 - Vol 1011
002KN000189 -3 n°540 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Plan R+4 - Vol 1011
002KN000189 -3 n°540 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Noir - -	Plan R+4 - Vol 1011
002KN000189 -3 n°540 Phase 6	Revêtement de sol	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 1011
002KN000189 -3 n°540 Phase 8	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1011
002KN000189 -3 n°542 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau Effritable Bleu - -	Plan R+4 - Vol 1012 (B420)
002KN000189 -3 n°542 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1012 (B420)
002KN000189 -3 n°542 Phase 5	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Beige Ciment Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1012 (B420)
002KN000189 -3 n°543 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1018
002KN000189 -3 n°543 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Fibreux Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1018
002KN000189 -3 n°544 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau Effritable Noir Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+4 - Vol 1019
002KN000189 -3 n°544 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1019
002KN000189 -3 n°545 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Translucide Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+4 - Vol 1022
002KN000189 -3 n°545 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1022

002KN000189 -3 n°546	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1024
002KN000189 -3 n°547 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Plan R+4 - Vol 1026
002KN000189 -3 n°547 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1026
002KN000189 -3 n°548 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Bleu - -	Plan R+4 - Vol 1027
002KN000189 -3 n°548 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1027
002KN000189 -3 n°549	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1034
002KN000189 -3 n°550	Plafond et faux-plafonds	Ouverture	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 1034
002KN000189 -3 n°551 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Vert - -	Plan R+4 - Vol 1034
002KN000189 -3 n°551 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 1034
002KN000189 -3 n°552 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Vert - -	Plan R+4 - Vol 1033
002KN000189 -3 n°552 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1033
002KN000189 -3 n°553 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Vert - -	Plan R+4 - Vol 1032
002KN000189 -3 n°553 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1032
002KN000189 -3 n°554 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+2 - Vol 1373

002KN000189 -3 n°554 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+2 - Vol 1373
002KN000189 -3 n°555 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige - -	Plan R+4 - Vol 1070
002KN000189 -3 n°555 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Noir - -	Plan R+4 - Vol 1070
002KN000189 -3 n°555 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1070
002KN000189 -3 n°556 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1096
002KN000189 -3 n°556 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1096
002KN000189 -3 n°557 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Multicolore - -	Plan R+4 - Vol 1096
002KN000189 -3 n°557 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1096
002KN000189 -3 n°558	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1096
002KN000189 -3 n°559	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1096
002KN000189 -3 n°560	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Orange - -	Plan R+4 - Vol 1096
002KN000189 -3 n°561 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Marron Bleu - -	Plan R+4 - Vol 1098
002KN000189 -3 n°561 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1098
002KN000189 -3 n°562 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1098
002KN000189 -3 n°562 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1098

002KN000189-3 n°563 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Plan R+4 - Vol 1104
002KN000189-3 n°563 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1104
002KN000189-3 n°564	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Marron - -	Plan R+4 - Vol 1103
002KN000189-3 n°565	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Beige - -	Plan R+4 - Vol 1093
002KN000189-3 n°566	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Rose Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1093
002KN000189-3 n°567	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Violet Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige Ciment Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 1093
002KN000189-3 n°568 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+4 - Vol 1091
002KN000189-3 n°568 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1091
002KN000189-3 n°569	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Semi-dur Multicolore Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige - -	Plan R+4 - Vol 1091
002KN000189-3 n°570	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Gris Enduit Dur Blanc Toile Fibreux Souple Marron - -	Plan R+4 - Vol 1091
002KN000189-3 n°571 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan R+4 - Vol 1090

002KN000189 -3 n°571 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1090
002KN000189 -3 n°572 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1089
002KN000189 -3 n°572 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1089
002KN000189 -3 n°573	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1089
002KN000189 -3 n°574 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Gris - -	Plan R+4 - Vol 1055
002KN000189 -3 n°574 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1055
002KN000189 -3 n°575 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+4 - Vol 1051
002KN000189 -3 n°575 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Blanc Béton Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1051
002KN000189 -3 n°576	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Beige - -	Plan R+4 - Vol 1050
002KN000189 -3 n°577	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1050
002KN000189 -3 n°578	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Blanc Colle Dur Beige - -	Plan R+4 - Vol 1050
002KN000189 -3 n°579	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 1050
002KN000189 -3 n°581	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre - -	Plan R+4 - Vol 1059
002KN000189 -3 n°582	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 1059
002KN000189 -3 n°583 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Fibreux Souple Gris Toile Fibreux Souple Beige Toile Fibreux Souple Rose - -	Plan R+4 - Vol 1113
002KN000189 -3 n°583 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Beige Ciment Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 1113

002KN000189-3 n°584 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Fibreux Souple Beige - -	Plan R+6 - Vol 1286
002KN000189-3 n°584 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Gris Jaune - -	Plan R+6 - Vol 1286
002KN000189-3 n°585 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Peinture Effritable Multicolore - -	Plan R+6 - Vol 1285
002KN000189-3 n°585 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1285
002KN000189-3 n°586	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Marron Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1274
002KN000189-3 n°587 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Plan R+6 - Vol 1277
002KN000189-3 n°587 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1277
002KN000189-3 n°588 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune - -	Plan R+6 - Vol 1269
002KN000189-3 n°588 Phase 3	Revêtement de sol	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1269
002KN000189-3 n°589 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Fibreux Semi-dur Gris - -	Plan R+6 - Vol 1266
002KN000189-3 n°589 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1266
002KN000189-3 n°590 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Vert Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+6 - Vol 1265
002KN000189-3 n°590 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Rose - -	Plan R+6 - Vol 1265
002KN000189-3 n°591 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Noir - -	Plan R+6 - Vol 1284

002KN000189-3 n°591 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Plan R+6 - Vol 1284
002KN000189-3 n°592	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Rose - -	Plan R+6 - Vol 1283
002KN000189-3 n°593	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Plan R+6 - Vol 1281
002KN000189-3 n°594 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Blanc Bleu Matériau Effritable Orange Revêtement Semi-dur Bleu - -	Plan R+6 - Vol 1252
002KN000189-3 n°594 Phase 5	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Plan R+6 - Vol 1252
002KN000189-3 n°595	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1251
002KN000189-3 n°596	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir - -	Plan R+6 - Vol 1258
002KN000189-3 n°597	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Fibres Souple Fibreux Blanc Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1259
002KN000189-3 n°598 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+6 - Vol 1244
002KN000189-3 n°598 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Fibreux Jaune - -	Plan R+6 - Vol 1244
002KN000189-3 n°599 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1243
002KN000189-3 n°599 Phase 3	Revêtement de sol	Toile Souple Fibreux Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1243

002KN000189-3 n°599 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1243
002KN000189-3 n°600 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Orange Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1248
002KN000189-3 n°600 Phase 5	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Rose Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1248
002KN000189-3 n°601	Revêtement de sol	Ragréage - -	Plan R+6 - Vol 1289
002KN000189-3 n°602 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu - -	Plan R+6 - Vol 1290
002KN000189-3 n°602 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1290
002KN000189-3 n°602 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1290
002KN000189-3 n°603 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1375
002KN000189-3 n°603 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Rose Colle Souple Marron Ciment Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1375
002KN000189-3 n°604	Revêtement de sol	Colle Souple Fibreux Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+6 - Vol 1306
002KN000189-3 n°605	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Béton Dur Gris Colle Souple Marron - -	Plan R+6 - Vol 1305
002KN000189-3 n°606 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Bleu - -	Plan R+6 - Vol 1304

002KN000189 -3 n°606 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1304
002KN000189 -3 n°607 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris Peinture Effritable Rouge - -	Plan R+6 - Vol 1303
002KN000189 -3 n°607 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+6 - Vol 1303
002KN000189 -3 n°607 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Plan R+6 - Vol 1303
002KN000189 -3 n°608	Façades	Appui de fenêtre	Peinture Effritable Gris Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1376 (Cour intérieure 1)
002KN000189 -3 n°609 Phase 1	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Beige - -	Plan R+6 - Vol 1376 (Cour intérieure 1)
002KN000189 -3 n°609 Phase 2	Façades	Menuiseries	Joint Souple Gris - -	Plan R+6 - Vol 1376 (Cour intérieure 1)
002KN000189 -3 n°610	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Matériau Effritable Noir - -	Plan R+6 - Vol 1376 (Cour intérieure 1)
002KN000189 -3 n°611	Façades	Murs	Enduit Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige - -	Plan R+6 - Vol 1376 (Cour intérieure 1)
002KN000189 -3 n°612	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige - -	Plan R+6 - Vol 1375
002KN000189 -3 n°613	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1291
002KN000189 -3 n°614 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+6 - Vol 1293
002KN000189 -3 n°614 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+6 - Vol 1293
002KN000189 -3 n°615 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Noir Peinture Effritable Rose Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+6 - Vol 1294

002KN000189 -3 n°615 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1294
002KN000189 -3 n°616 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+6 - Vol 1295
002KN000189 -3 n°616 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+6 - Vol 1295
002KN000189 -3 n°617 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Gris Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+6 - Vol 1296
002KN000189 -3 n°617 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1296
002KN000189 -3 n°618 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Bleu Revêtement Semi-dur Vert Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+6 - Vol 1297
002KN000189 -3 n°618 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1297
002KN000189 -3 n°619	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1377
002KN000189 -3 n°620	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Gris Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1377

002KN000189-3 n°621	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron - -	Plan R+6 - Vol 1378
002KN000189-3 n°622	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1302
002KN000189-3 n°623 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Plan R+6 - Vol 1300
002KN000189-3 n°623 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1300
002KN000189-3 n°624 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Beige Rouge - -	Plan R+6 - Vol 1325
002KN000189-3 n°624 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1325
002KN000189-3 n°625	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1337
002KN000189-3 n°626	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Plan R+6 - Vol 1321
002KN000189-3 n°627	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1323
002KN000189-3 n°628 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+6 - Vol 1320
002KN000189-3 n°628 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1320
002KN000189-3 n°629	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1318
002KN000189-3 n°630 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Gris - -	Plan R+6 - Vol 1309

002KN000189-3 n°630 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1309
002KN000189-3 n°631	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1172
002KN000189-3 n°632 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Dur Fibreux Gris - -	Plan R+5 - Vol 1171
002KN000189-3 n°632 Phase 2	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Marron - -	Plan R+5 - Vol 1171
002KN000189-3 n°633 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Dur Fibreux Gris - -	Plan R+5 - Vol 1170
002KN000189-3 n°633 Phase 2	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Beige Gris - -	Plan R+5 - Vol 1170
002KN000189-3 n°634	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Matériau Effritable Fibreux Blanc Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1170
002KN000189-3 n°635	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Rose - -	Plan R+5 - Vol 1169
002KN000189-3 n°636 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan R+5 - Vol 1164 (C516)
002KN000189-3 n°636 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1164 (C516)
002KN000189-3 n°637	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 1166
002KN000189-3 n°638	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 1379
002KN000189-3 n°639	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Rose - -	Plan R+5 - Vol 1168
002KN000189-3 n°640 Phase 1	Revêtement de mur	Peinture Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1202
002KN000189-3 n°640 Phase 2	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1202

002KN000189 -3 n°641 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Plan R+5 - Vol 1202
002KN000189 -3 n°641 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1202
002KN000189 -3 n°642	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1212
002KN000189 -3 n°643	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1212
002KN000189 -3 n°645 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Souple Beige Toile Souple Fibreux Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1231
002KN000189 -3 n°645 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1231
002KN000189 -3 n°646	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 1232
002KN000189 -3 n°647	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 1231
002KN000189 -3 n°648	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1231
002KN000189 -3 n°649	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Beige - -	Plan R+5 - Vol 1225
002KN000189 -3 n°650	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Bleu - -	Plan R+5 - Vol 1224

002KN000189-3 n°651	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Souple Beige Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1382
002KN000189-3 n°652 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Marron - -	Plan R+5 - Vol 1383
002KN000189-3 n°652 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1383
002KN000189-3 n°653 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Translucide Revêtement Souple Gris - -	Plan R+5 - Vol 1215
002KN000189-3 n°653 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1215
002KN000189-3 n°654 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Beige - -	Plan R+5 - Vol 1381
002KN000189-3 n°654 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1381
002KN000189-3 n°655 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Beige Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 1213
002KN000189-3 n°655 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Beige Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+5 - Vol 1213
002KN000189-3 n°655 Phase 6	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige Ciment Dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 1213
002KN000189-3 n°656 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu - -	Plan R+5 - Vol 1146 (B520b)
002KN000189-3 n°656 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1146 (B520b)
002KN000189-3 n°657 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Beige - -	Plan R+5 - Vol 1140

002KN000189 -3 n°657 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1140
002KN000189 -3 n°658 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Translucide Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu Toile Souple Fibreux Translucide - -	Plan R+5 - Vol 1138
002KN000189 -3 n°658 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Semi-dur Gris Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1138
002KN000189 -3 n°660 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige Toile Souple Fibreux Translucide - -	Plan R+5 - Vol 1137
002KN000189 -3 n°660 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1137
002KN000189 -3 n°661 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu - -	Plan R+5 - Vol 1127
002KN000189 -3 n°661 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Colle Souple Beige Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1127
002KN000189 -3 n°661 Phase 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1127
002KN000189 -3 n°662 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan R+5 - Vol 1128 (B513)
002KN000189 -3 n°662 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1128 (B513)
002KN000189 -3 n°663	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Vert - -	Plan R+5 - Vol 1128 (B513)

002KN000189 -3 n°664	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Translucide Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1128 (B513)
002KN000189 -3 n°665	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1123 (B505)
002KN000189 -3 n°666	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Translucide Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1123 (B505)
002KN000189 -3 n°667 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Plan R+5 - Vol 1156
002KN000189 -3 n°667 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Multicolore Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1156
002KN000189 -3 n°668 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris - -	Plan R+5 - Vol 1184
002KN000189 -3 n°668 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1184
002KN000189 -3 n°669 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige - -	Plan R+5 - Vol 1183
002KN000189 -3 n°669 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1183
002KN000189 -3 n°670	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Matériau Effritable Gris Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1183

002KN000189-3 n°671	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1194
002KN000189-3 n°672	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1350
002KN000189-3 n°673	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau Effritable Noir Laine Souple Fibreux Jaune Tresse Souple Fibreux Beige Tresse Souple Fibreux Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1350
002KN000189-3 n°674	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Dur Blanc Matériau Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1350
002KN000189-3 n°675	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1350
002KN000189-3 n°676	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1350
002KN000189-3 n°677	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture Effritable Gris Joint Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1350
002KN000189-3 n°678	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge - -	Plan R+4 - Vol 1069
002KN000189-3 n°679	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1344

002KN000189-3 n°680	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1344
002KN000189-3 n°681	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1344
002KN000189-3 n°682	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1344
002KN000189-3 n°684	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Rouge - -	Plan R+4 - Vol 1085
002KN000189-3 n°685	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture Effritable Multicolore Joint Dur Gris - -	Plan Rdc - Vol 1385
002KN000189-3 n°686	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige - -	Plan R+6 - Vol 1308
002KN000189-3 n°687	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1308
002KN000189-3 n°688	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1308
002KN000189-3 n°689	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore - -	Plan R+6 - Vol 1308
002KN000189-3 n°690	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1308

002KN000189-3 n°691	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Bois Effritable Fibreux Marron - -	Plan R+4 - Vol 1037
002KN000189-3 n°692	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Bois Dur Fibreux Marron - -	Plan R+4 - Vol 1037
002KN000189-3 n°693	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Fibreux Blanc - -	Plan R+6 - Vol 580
002KN000189-3 n°694	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris - -	Plan R+6 - Vol 580
002KN000189-3 n°695	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 580
002KN000189-3 n°696	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Plan R+6 - Vol 580
002KN000189-3 n°697	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 580
002KN000189-3 n°699	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)
002KN000189-3 n°700	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)
002KN000189-3 n°701	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)
002KN000189-3 n°702	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Blanc Plâtre Effritable Blanc Matériau Souple Translucide - -	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)

002KN000189-3 n°703	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)
002KN000189-3 n°704	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 353 (Palier et escalier)
002KN000189-3 n°705	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Marron - -	Plan sous-sol -1 - Vol 116
002KN000189-3 n°706	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 116
002KN000189-3 n°707	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Rouge Ciment Dur Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 116
002KN000189-3 n°708	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Beige - -	Plan sous-sol -1 - Vol 116
002KN000189-3 n°709	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 129
002KN000189-3 n°710	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 129
002KN000189-3 n°711	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 129
002KN000189-3 n°712	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Matériau Effritable Gris Beige Ciment Dur Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 129
002KN000189-3 n°713	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Plan Rdc - Vol 1391 (Cour intérieure 2)
002KN000189-3 n°714	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 242
002KN000189-3 n°715	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Beige Ciment Dur Gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 242
002KN000189-3 n°716	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Fibres Souple Fibreux Blanc - -	Plan sous-sol -1 - Vol 242

002KN000189-3 n°717 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Beige Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+5 - Vol 1162
002KN000189-3 n°717 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1162
002KN000189-3 n°718 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Bleu Revêtement Semi-dur Noir Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+5 - Vol 1158
002KN000189-3 n°718 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Plan R+5 - Vol 1158
002KN000189-3 n°719 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+5 - Vol 1196
002KN000189-3 n°719 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 1196
002KN000189-3 n°720 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+5 - Vol 1197
002KN000189-3 n°720 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Plan R+5 - Vol 1197
002KN000189-3 n°721 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+5 - Vol 1198
002KN000189-3 n°721 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ragréage Dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 1198
002KN000189-3 n°722 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 1199
002KN000189-3 n°722 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris - -	Plan R+5 - Vol 1199
002KN000189-3 n°723	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Plan R+5 - Vol 1188
002KN000189-3 n°724 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Plan R+3 - Vol 981
002KN000189-3 n°724 Phase 3	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Plan R+3 - Vol 981

002KN000189 -3 n°725	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Marron Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron - -	Plan R+3 - Vol 981
002KN000189 -3 n°726 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+5 - Vol 1123 (B505)
002KN000189 -3 n°726 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1123 (B505)
002KN000189 -3 n°727	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Matériau Effritable Noir - -	Plan R+4 - Vol 1050
002KN000189 -3 n°728 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Gris Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+3 - Vol 938
002KN000189 -3 n°728 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ciment Dur Gris - -	Plan R+3 - Vol 938
002KN000189 -3 n°729 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Blanc - -	Plan R+3 - Vol 941
002KN000189 -3 n°729 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan R+3 - Vol 941
002KN000189 -3 n°729 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Beige Ragréage Dur Rose - -	Plan R+3 - Vol 941
002KN000189 -3 n°730 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Jaune - -	Plan R+2 - Vol 1369
002KN000189 -3 n°730 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Colle Souple Marron Ragréage Effritable Beige Ciment Dur Gris - -	Plan R+2 - Vol 1369
002KN000189 -3 n°731 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan R+2 - Vol 1371
002KN000189 -3 n°731 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+2 - Vol 1371

002KN000189-3 n°732 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Blanc - -	Plan R+2 - Vol 920 (B204)
002KN000189-3 n°732 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Marron Colle Souple Marron Matériau Effritable Noir - -	Plan R+2 - Vol 920 (B204)
002KN000189-3 n°733 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Fibres Souple Fibreux Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1199
002KN000189-3 n°733 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 1199
002KN000189-3 n°733 Phase 5	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+5 - Vol 1199
002KN000189-3 n°734 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Revêtement Semi-dur Fibreux Jaune Toile Souple Fibreux Blanc Tresse Souple Fibreux Bleu Rouge - -	Plan R+6 - Vol 1392
002KN000189-3 n°734 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Plan R+6 - Vol 1392
002KN000189-3 n°734 Phase 6	Revêtement de sol	Matériau Effritable Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+6 - Vol 1392
002KN000189-3 n°735	Revêtement de sol	Matériau Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Multicolore Ciment Dur Gris - -	Plan R+6 - Vol 1292
002KN000189-3 n°736 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Translucide Revêtement Semi-dur Orange Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+6 - Vol 1292

002KN000189-3 n°736 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Semi-dur Bleu Colle Souple Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Plan R+6 - Vol 1292
002KN000189-3 n°737 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris Rouge Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan R+1 - Vol 790
002KN000189-3 n°737 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+1 - Vol 790
002KN000189-3 n°738	Revêtement de sol	Peinture Effritable Blanc Bleu Revêtement Semi-dur Bleu Rouge Colle Souple Translucide Matériau Effritable Beige - -	Plan R+1 - Vol 786
002KN000189-3 n°739 Phase 1	Revêtement de sol	Peinture Effritable Bleu Revêtement Semi-dur Beige Toile Souple Fibreux Beige - -	Plan Rdc - Vol 712
002KN000189-3 n°739 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Dur Gris - -	Plan Rdc - Vol 712
002KN000189-3 n°740 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Beige Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Beige - -	Plan R+5 - Vol 1123 (B505)
002KN000189-3 n°740 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Beige - -	Plan R+5 - Vol 1123 (B505)
002KN000189-3 n°740 Phase 5	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1123 (B505)
002KN000189-3 n°741 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Plan R+4 - Vol 1098
002KN000189-3 n°741 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 1098

002KN000189 -3 n°742 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Revêtement Semi-dur Gris - -	Plan R+5 - Vol 1140
002KN000189 -3 n°742 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1140
002KN000189 -3 n°743 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+5 - Vol 1382
002KN000189 -3 n°743 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Matériau Effritable Blanc Beige Ragréage Effritable Gris - -	Plan R+5 - Vol 1382
002KN000189 -3 n°744	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Gris Vert Colle Souple Jaune - -	Plan R+5 - Vol 1212
002KN000189 -3 n°745	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Beige Enduit Effritable Blanc - -	Plan R+4 - Vol 1070
002KN000189 -3 n°746 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Beige Joint Dur Gris - -	Plan R+4 - Vol 1070
002KN000189 -3 n°746 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris - -	Plan R+4 - Vol 1070
002KN000189 -3 n°747 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu - -	Plan R+6 - Vol 1286
002KN000189 -3 n°747 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Matériau Effritable Orange Ragréage Effritable Gris Colle Souple Fibreux Jaune - -	Plan R+6 - Vol 1286
002KN000189 -3 n°748	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau Souple Marron Noir Ciment Effritable Gris - -	Plan sous-sol -2 - Vol 77
002KN000189 -3 n°749	Façades	Menuiseries	Peinture Effritable Blanc Gris Matériau Effritable Blanc Mastic Effritable Beige - -	Plan R+4 - Vol 1034
002KN000189 -4 n°750	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)
002KN000189 -4 n°751	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau plâtreux gris en vrac avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)

002KN000189-4 n°752	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris en vrac hétérogène avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)
002KN000189-4 n°753	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)
002KN000189-4 n°754	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Plan Rdc - Vol 1394 (Rampe entrée)
002KN000189-4 n°755	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 1395 (Rampe Sortie)
002KN000189-4 n°756	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact en vrac hétérogène avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 1395 (Rampe Sortie)
002KN000189-4 n°757	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Matériau bitumineux noir en vrac hétérogène avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 1395 (Rampe Sortie)
002KN000189-4 n°758	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Matériau bitumineux noir avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 1395 (Rampe Sortie)
002KN000189-4 n°759	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189-4 n°760	Façades	Menuiseries	Matériau compact gris avec poussières + peinture non séparable - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189-4 n°761	Façades	Menuiseries	Matériau beige et gris en vrac hétérogène avec poussières + peinture non séparable - -	Plan R+5 - Vol 338 (B507)
002KN000189-4 n°762	Façades	Menuiseries	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable - -	Plan R+3 - Vol 936 (B 307)
002KN000189-4 n°763	Façades	Menuiseries	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable - -	Plan R+1 - Vol 728 (B507)
002KN000189-4 n°764	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable - -	Plan Rdc - Vol 654 (Bureaux 14)
002KN000189-4 n°765	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau fibreux beige avec poussières - -	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)
002KN000189-4 n°766	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières + peinture non séparable - -	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)

002KN000189-4 n°767	Equipements divers et accessoires	Etuves	Matériau beige en vrac hétérogène avec fibres + peinture avec poussières non séparable - -	Plan sous-sol -2 - Vol 251 (Sous-station)
P768	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable - -	Plan Rdc - Vol 1406
P769	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène avec couche en toile non séparable - -	Plan Rdc - Vol 1407 (Esc P8)
P770	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)
P771	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)
P772	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable - -	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)
P773 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - -	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)
P773 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - -	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)
P774 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - -	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)
P774 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - -	Plan Rdc - Vol 1408 (Livraison)
P775 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère incolore avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 674
P775 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	Plan Rdc - Vol 674
P775 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable - -	Plan Rdc - Vol 674
P776	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan Rdc - Vol 674

P777 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + matériau cartonné non séparable - -	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)
P777 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Couche plâtreuse blanche - -	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)
P778	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)
P779	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)
P780	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)
P781	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)
P782	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Plan Rdc - Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)
P783	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Plan Rdc - Vol 691 (PMR009)
P784 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant rouge avec couche en toile - -	Plan Rdc - Vol 265 (B000)
P784 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	Plan Rdc - Vol 265 (B000)
P785	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Plan Rdc - Vol 265 (B000)
P786 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige avec couche en toile - -	Plan Rdc - Vol 262 (B004)
P786 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	Plan Rdc - Vol 262 (B004)

P787	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 262 (B004)
P788 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint cassant gris - -	Plan sous-sol -1 - Vol 159 (S/B106)
P788 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige en vrac hétérogène - -	Plan sous-sol -1 - Vol 159 (S/B106)
P789 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - -	Plan sous-sol -1 - Vol 159 (S/B106)
P789 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	Plan sous-sol -1 - Vol 159 (S/B106)
P790	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 159 (S/B106)
P791	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Plan sous-sol -1 - Vol 89
P792	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 89
P793 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant vert avec couche en toile - -	Plan sous-sol -1 - Vol 128
P793 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 128
P794	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 128
P795	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux bleu en vrac non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 128
P796	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 128

P797	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 100
P798	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Plan Rdc - Vol 1409 (Parvis)
P799	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène - -	Plan Rdc - Vol 1409 (Parvis)
P800 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 197
P800 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge - -	Plan sous-sol -1 - Vol 197
P801	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Plan sous-sol -1 - Vol 197
P802	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 197
P803	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	Plan sous-sol -1 - Vol 197
P804	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène - -	Plan sous-sol -1 - Vol 198
P805	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène avec couche en toile - -	Plan sous-sol -1 - Vol 198
P806	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 187
P807	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 187
P808 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - -	Plan sous-sol -1 - Vol 184
P808 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 184

P809	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 185
P810	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières - -	Plan sous-sol -1 - Vol 187
P811	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 187
P812 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu avec couche en toile - -	Plan sous-sol -1 - Vol 187
P812 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple beige avec poussières - -	Plan sous-sol -1 - Vol 187
P813	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Plan R+1 - Vol 1411
P814 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples - -	Plan R+1 - Vol 1411
P814 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris en vrac hétérogène avec poussières - -	Plan R+1 - Vol 1411
P815	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières - -	Plan R+1 - Vol 1411
P816 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle marron en vrac - -	Plan R+1 - Vol 1410
P816 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau fibreux beige - -	Plan R+1 - Vol 1410
P817	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau beige avec poussières non séparable + matériau gris non séparable + bois en faible quantité en vrac non séparable - -	Plan R+1 - Vol 1410
P818	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	Plan R+1 - Vol 1410
P819 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige avec couche en toile - -	Plan R+1 - Vol 1412

P819 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris - -	Plan R+1 - Vol 1412
P819 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau mousse beige - -	Plan R+1 - Vol 1412
P820 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant orange avec couche en toile - -	Plan R+1 - Vol 1413 (P142)
P820 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Plan R+1 - Vol 1413 (P142)
P821 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris - -	Plan R+1 - Vol 1415
P821 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène - -	Plan R+1 - Vol 1415
P822	Façades	Murs	Peinture non séparable + enduit gris en vrac - -	Plan Rdc - Vol 1418 (Ext Sud)
P823	Façades	Poteaux	Enduit compact gris hétérogène - -	Plan Rdc - Vol 1418 (Ext Sud)
P824 Phase 1	Façades	Murs	Matériau compact gris - -	Plan Rdc - Vol 1418 (Ext Sud)
P824 Phase 2	Façades	Murs	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Plan Rdc - Vol 1418 (Ext Sud)
P825	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 1391 (Cour intérieure 2)
P826	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Plan R+2 - Vol 1419
P827 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	Plan R+2 - Vol 1420
P827 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Plan R+2 - Vol 1420
P828	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Plan R+2 - Vol 1421 (THA8)
P829	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac - -	Plan R+2 - Vol 1421 (THA8)

P830 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige avec couche en toile - -	Plan sous-sol -1 - Vol 96
P830 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - -	Plan sous-sol -1 - Vol 96
P831	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable - -	Plan sous-sol -1 - Vol 96
P832	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - -	Plan sous-sol -1 - Vol 96
P833	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact rouge non séparable + ragréage gris hétérogène - -	Plan sous-sol -2 - Vol 82
P834	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple noir avec couche en papier + colle polymère jaune non séparable - -	Plan sous-sol -2 - Vol 82
P835	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène - -	Plan sous-sol -2 - Vol 83
P836 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	Plan R+2 - Vol 1425 (C201)
P836 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris avec couche en toile - -	Plan R+2 - Vol 1425 (C201)
P837 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris - -	Plan R+2 - Vol 909 (P202)
P837 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable - -	Plan R+2 - Vol 909 (P202)
P838 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable - -	Plan R+2 - Vol 1427
P838 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris et rouge - -	Plan R+2 - Vol 1427
P838 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+2 - Vol 1427

P839 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable - -	Plan R+2 - Vol 1427
P839 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant rouge + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Plan R+2 - Vol 1427
P840	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - -	Plan R+2 - Vol 1427
P841 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile - -	Plan R+1 - Vol 792 (102)
P841 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable - -	Plan R+1 - Vol 792 (102)
P842	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + ragréage gris hétérogène - -	Plan R+1 - Vol 739
P843	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - -	Plan R+1 - Vol 739
P844	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable - -	Plan Rdc - Vol 662 (Infirmerie 3)
P845	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle beige - -	Plan Rdc - Vol 662 (Infirmerie 3)
P846	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières - -	Plan sous-sol -2 - Vol 47
P847	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau bitumineux noir avec poussières non séparable + matériau en liège marron en vrac non séparable - -	Plan sous-sol -2 - Vol 47

P848 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige - -	Plan Rdc - Vol 667 (C013)
P848 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable - -	Plan Rdc - Vol 667 (C013)
P848 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 667 (C013)
P849	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable - -	Plan R+2 - Vol 925 (THB201)
P850 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant vert avec couche en toile - -	Plan R+1 - Vol 720 (B100)
P850 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peintures multiples non séparable - -	Plan R+1 - Vol 720 (B100)
P851	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - -	Plan R+2 - Vol 910
P852	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peintures multiples non séparable - -	Plan R+2 - Vol 910
P853	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Plan Rdc - Vol 704
P854	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carton en faible quantité non séparable - -	Plan Rdc - Vol 704
P855	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Plan Rdc - Vol 700
P856 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières - -	Plan Rdc - Vol 700
P856 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ragréage gris - -	Plan Rdc - Vol 700
P857	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+3 - Vol 948
P858 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Plan R+3 - Vol 948
P858 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris - -	Plan R+3 - Vol 948
P859	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable - -	Plan R+3 - Vol 1434

P860 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	Plan R+3 - Vol 1434
P860 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ragréage gris - -	Plan R+3 - Vol 1434
P861	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+3 - Vol 1436
P862	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en faible quantité en vrac - -	Plan R+3 - Vol 1436
P863	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable - -	Plan R+3 - Vol 1438
P864	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac non séparable + colle grise en vrac non séparable - -	Plan R+3 - Vol 960
P865	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + ragréage rose en faible quantité non séparable - -	Plan R+4 - Vol 987
P866	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - -	Plan R+4 - Vol 987
P867	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Plan R+4 - Vol 988
P868 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris - -	Plan R+4 - Vol 988
P868 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan R+4 - Vol 988
P869 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité - -	Plan R+4 - Vol 1446
P869 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	Plan R+4 - Vol 1446
P869 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Plan R+4 - Vol 1446
P869 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige en faible quantité avec couche en toile - -	Plan R+4 - Vol 1446
P870 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage gris non séparable - -	Plan R+4 - Vol 1446
P870 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple blanc non séparable + peinture non séparable - -	Plan R+4 - Vol 1446

P870	Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige avec couche en toile - -	Plan R+4 - Vol 1446
P871		Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+4 - Vol 1446
P872	Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Plan R+4 - Vol 1450
P872	Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint cassant blanc en vrac - -	Plan R+4 - Vol 1450
P873		Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Plan R+4 - Vol 1450
P874	Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint cassant blanc - -	Plan R+4 - Vol 1451
P874	Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + ragréage rose non séparable - -	Plan R+4 - Vol 1451
P875		Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Plan R+4 - Vol 1451
P876	Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène - -	Plan R+4 - Vol 1453
P876	Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint cassant blanc - -	Plan R+4 - Vol 1453
P877	Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - -	Plan R+4 - Vol 1453
P877	Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan R+4 - Vol 1453
P878	Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture - -	Plan R+4 - Vol 1452
P878	Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint cassant blanc - -	Plan R+4 - Vol 1452
P878	Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Plan R+4 - Vol 1452
P879	Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	Plan R+4 - Vol 1452
P879	Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan R+4 - Vol 1452
P880		Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+4 - Vol 1060
P881	Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	Plan R+4 - Vol 1060

P881 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	Plan R+4 - Vol 1060
P882	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec fibres - -	Plan R+4 - Vol 1087
P883 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris avec couche en toile - -	Plan R+4 - Vol 1087
P883 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	Plan R+4 - Vol 1087
P884 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + joint cassant gris non séparable - -	Plan R+4 - Vol 1088
P884 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige en vrac - -	Plan R+4 - Vol 1088
P885	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Plan R+4 - Vol 1088
P886	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige en vrac non séparable + papier gris non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1454
P887	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1454
P888	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1455
P889	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1455
P890	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1165
P891 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture - -	Plan R+5 - Vol 1165
P891 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	Plan R+5 - Vol 1165
P891 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières - -	Plan R+5 - Vol 1165

P892 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige avec couche en toile - -	Plan R+5 - Vol 1133
P892 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1133
P893	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1133
P894	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1119
P895 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris - -	Plan R+5 - Vol 1119
P895 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1119
P896	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1238
P897 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige avec couche en toile - -	Plan R+5 - Vol 1238
P897 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1238
P898 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1238
P898 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	Plan R+5 - Vol 1238
P899	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1456
P900	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1456

P901	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1457
P902 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	Plan R+5 - Vol 1457
P902 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1457
P903 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture - -	Plan R+5 - Vol 1458
P903 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	Plan R+5 - Vol 1458
P903 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1458
P904	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1458
P905 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint cassant gris avec poussières - -	Plan R+5 - Vol 1459
P905 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène - -	Plan R+5 - Vol 1459
P906 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - -	Plan R+5 - Vol 1459
P906 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1459
P907	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1226
P908 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	Plan R+5 - Vol 1226
P908 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1226
P909 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples - -	Plan R+5 - Vol 1216
P909 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	Plan R+5 - Vol 1216

P909 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1216
P910	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1216
P911	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Plan R+5 - Vol 1461
P912	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan R+5 - Vol 1462
P913	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	Local fioul - Vol 1463 (Local fioul)
P914	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - -	Plan R+6 - Vol 1241
P915	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Plan R+6 - Vol 1241
P916	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène non séparable + ragréage beige en faible quantité en vrac non séparable - -	Plan R+6 - Vol 1358
P917 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - -	Plan R+6 - Vol 1358
P917 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Plan R+6 - Vol 1358

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012017218908**
Adresse chantier :	Commande : 002KN000189 Affaire : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 26/06/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017218908 (222 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01445591

Date de réception : 16/06/2017 — **Date de préparation : 16/06/2017** — **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_001 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 1 (Parking nord)	1 2 3	Ciment Matériau Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Bleu	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445592

Date de réception : 16/06/2017 — **Date de préparation : 24/06/2017** — **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_002 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 1 (Parking nord)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445593

Date de réception : 16/06/2017 — **Date de préparation : 16/06/2017** — **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_003 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 1 (Parking nord)	1 2 3	Ciment Matériau Peinture	Dur Effritable Effritable	Gris Blanc Bleu	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445594

Date de réception : 16/06/2017 — **Date de préparation : 16/06/2017** — **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_004 Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduit ciment Vol 1 (Parking nord)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445595

Date de réception : 16/06/2017 — **Date de préparation : 16/06/2017** — **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de dilatation Vol 1 (Parking nord)	1	Matériau	Fibreux Souple	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445596

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_006 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Coffrage perdu Vol 4 (Réserve DI)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445597

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_007 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 15 (Esc)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445598

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_008 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 15 (Esc)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Rose	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445599

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_009 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Flocages Vol 24	1	Flocage	Fibreux Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445600

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_010 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 24	1 2 3 4	Laine Matériau Toile Matériau	Fibreux Souple Effritable Fibreux Souple Effritable	Jaune Blanc Blanc Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445601

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_011 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 2 (Parking centre)	1 2 3 4	Laine Toile Carton Matériau	Fibreux Souple Fibreux Souple Fibreux Souple Effritable	Beige Beige Marron Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445602

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_012 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 51	1 2	Plâtre Tresse	Effritable Fibreux Souple	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445603

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_013 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 251 (Sous-station)	1	Flocage	Fibreux Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445604

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_014 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 46	1 2	Laine Plâtre	Fibreux Souple Effritable	Orange Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445605

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_015 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 46	1 2 3	Laine Plâtre Toile	Fibreux Souple Effritable Fibreux Souple	Jaune Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445606

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_016 Plafond et faux-plafonds / Gaines et coffre horizontaux / Enduit platre Vol 37	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445607

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_017 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 36	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445608

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_018 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 52	1 2 3 4	Laine Matériau Aluminium Carton	Fibreux Souple Bitumineux Souple Souple Fibreux	Marron Noir Gris Marron	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445609

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_019 Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Calorifugeage Vol 52	1 2 3	Laine Papier Matériau	Fibreux Souple Fibreux Souple Effritable	Jaune Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445610

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_020 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 32	1 2	Faux plafond Peinture	Fibreux Souple Effritable	Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445611

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_021 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 31	1 2 3	Plâtre Carton Peinture	Effritable Fibreux Fibreux Souple Effritable	Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445612

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_022 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) Vol 31	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445613

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_023 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 71	1 2 3	Laine Toile Plâtre	Fibreux Souple Fibreux Souple Effritable	Jaune Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445614

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_024 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (Socle) Vol 251 (Sous-station)	1 2 3	Ciment Peinture Matériau	Effritable Effritable Effritable	Gris Rouge Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445615

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_025 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) Vol 251 (Sous-station)	1 2	Ciment Matériau	Effritable Effritable	Gris Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445616

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_026 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 251 (Sous-station)	1 2 3	Laine Matériau Toile	Fibreux Souple Bitumineux Fibreux Souple	Jaune Noir Marron	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445617

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_027 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 251 (Sous-station)	1 2 3	Matériau Polystyrène Toile	Bitumineux Souple Fibreux Souple	Noir Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445618

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_028 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 251 (Sous-station)	1 2 3	Laine Aluminium Fibres	Fibreux Souple Souple Souple	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445619

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_029 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 252	1 2 3	Matériau Polystyrène Matériau	Bitumineux Souple Effritable	Noir Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445620

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_030 Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Calorifugeage Vol 253	1 2 3	Laine Matériau Aluminium	Fibreux Souple Bitumineux Souple	Jaune Noir Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445621

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_031 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 253	1 2 3 4	Laine Plâtre Toile Matériau	Fibreux Souple Effritable Fibreux Souple Effritable	Jaune Blanc Blanc Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445622

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_032 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 251 (Sous-station)	1 2	Laine Matériau	Fibreux Souple Bitumineux	Jaune Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445623

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_033 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage Vol 251 (Sous-station)	1 2 3	Laine Plâtre Toile	Fibreux Souple Effritable Fibreux Souple	Jaune Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445624

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_034 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Flocages Vol 8 (Ventilation amphi)	1	Flocage	Fibreux Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445625

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_035 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 8 (Ventilation amphi)	1 2 3 4	Toile Matériau Matériau Polystyrène	Fibreux Souple Souple Bitumineux Souple	Marron Beige Noir Bleu	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445626

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_036 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 142	1 2 3	Laine Plâtre Toile	Fibreux Souple Effritable Souple Fibreux	Jaune Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445627

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_037 Plafond et faux-plafonds / Gaines et coffre horizontaux / Enduit platre Vol 142	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445628

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_038 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 174	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445629

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_039 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 175	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Rose	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445630

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_040 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 166	1	Flocage	Fibreux Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445631

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_041 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 284	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445632

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_042 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 152	1 2 3 4	Revêtement Colle Toile Ragréage	Semi-dur Souple Souple Fibreux Effritable	Vert Jaune Blanc Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445633

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_043 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Flocages Vol 135	1	Flocage	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445634

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_044 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 138	1 2	Flocage Papier	Fibreux Effritable Fibreux Souple	Blanc Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445635

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_045 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 176	1 2	Polystyrène Matériau	Souple Effritable	Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445636

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_046 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 176	1 2 3 4	Ciment Matériau Colle Moquette	Effritable Effritable Souple Fibreux Souple	Gris Beige Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445637

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_047 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 285 (P026)	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445638

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_048 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 285 (P026)	1 2 3	Plâtre Toile Peinture	Effritable Fibreux Souple Effritable	Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445639

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_049 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 285 (P026)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445640

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_050 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe Vol 285 (P026)	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445641

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_051 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 285 (P026)	1 2	Matériau Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445642

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_052 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 285 (P026)	1 2 3 4 5	Peinture Bois Matériau Matériau Mastic	Effritable Dur Fibreux Effritable Effritable Dur	Noir Marron Blanc Gris Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445643

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_053 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 285 (P026)	1	Flocage	Fibreux Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445644

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_054 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 285 (P026)	1 2 3 4	Plâtre Enduit Peinture Peinture	Effritable Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Beige Blanc Vert Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445645

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_055 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 276 (P115)	1 2 3 4 5	Revêtement Toile Colle Ragréage Matériau	Souple Souple Fibreux Souple Effritable Effritable	Marron Marron Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445646

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_056 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 276 (P115)	1 2 3 4	Plâtre Enduit Toile Peinture	Effritable Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445647

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_057 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 276 (P115)	1 2 3	Plâtre Carton Papier peint	Effritable Fibreux Souple Souple Fibreux	Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445648

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 26/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_058 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 276 (P115)	1	Joint	Dur	Marron Noir	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445649

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_059 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 286 (P209)	1 2 3 4 5	Plâtre Enduit Peinture Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Beige Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445650

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 16/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_060 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 286 (P209)	1 2 3 4 5	Plâtre Enduit Peinture Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Beige Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445651

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 16/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_061 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits projetés Vol 286 (P209)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445652

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 26/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_062 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 286 (P209)	1 2 3 4	Ragréage Matériau Revêtement Matériau	Effritable Effritable Souple Effritable	Gris Noir Marron Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445653

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 16/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_063 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 286 (P209)	1 2 3	Joint Matériau Matériau	Effritable Effritable Effritable	Marron Blanc Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445654

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 16/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_064 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 287	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Vert Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445655

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 16/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_065 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 287	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445656

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_066 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 287	1 2 3 4 5	Ciment Ragréage Colle Revêtement Matériau	Effritable Effritable Souple Souple Effritable	Gris Gris Jaune Marron Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445657

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_067 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 288	1 2 3 4	Peinture Toile Enduit Plâtre	Effritable Fibreux Souple Effritable Effritable	Blanc Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445658

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_068 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 288	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445659

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_069 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 289 (P321)	1 2 3 4 5 6	Matériau Revêtement Toile Colle Ragréage Bois	Effritable Souple Souple Fibreux Souple Effritable Dur Fibreux	Beige Gris Blanc Jaune Gris Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445660

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_070 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 289 (P321)	1 2 3	Mastic Peinture Matériau	Effritable Effritable Effritable	Marron Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445661

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_071 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 290 (P413 ter)	1 2 3 4 5	Plâtre Enduit Matériau Enduit Papier	Effritable Effritable Effritable Effritable Souple Fibreux	Blanc Beige Vert Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445662

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_072 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 290 (P413 ter)	1 2 3 4	Peinture Enduit Papier Plâtre	Effritable Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Beige Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445663

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_073 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 290 (P413 ter)	1 2	Mastic Matériau	Dur Effritable	Marron Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445664

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_074 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 291 (P427)	1 2 3 4 5 6	Revêtement Joint Toile Colle Matériau Ragréage	Souple Souple Souple Fibreux Souple Effritable Effritable	Beige Blanc Beige Jaune Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445665

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_075 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 291 (P427)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445666

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_076 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 291 (P427)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445667

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_077 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 291 (P427)	1	Mastic	Dur	Marron Blanc Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445668

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 16/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_078 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 292 (P517)	1 2 3 4 5 6	Revêtement Sous-couche Colle Ragréage Matériau Matériau	Semi-dur Souple Fibreux Souple Effritable Effritable Souple	Noir Marron Jaune Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445669

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 16/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_079 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 292 (P517)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445670

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 16/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_080 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 292 (P517)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445671

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 16/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_081 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 294 (P535)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445672

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 16/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_082 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 294 (P535)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445673

Date de réception : 16/06/2017 | Date de préparation : 16/06/2017 | Date d'analyse : 26/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_083 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 294 (P535)	1 2	Mastic Matériau	Effritable Effritable	Beige Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445674

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_084 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 295	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445675

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_085 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 295	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445676

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_086 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 295	1 2	Mastic Matériau	Dur Effritable	Beige Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445677

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_087 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 297	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445678

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_088 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 297	1 2	Peinture Enduit	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445679

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_089 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 297	1 2	Mastic Matériau	Dur Effritable	Beige Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445680

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_090 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 320 (B026)	1 2 3 4 5	Colle Revêtement Colle Ragréage Matériau	Souple Souple Souple Effritable Effritable	Translucide Gris Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445681

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_091 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 320 (B026)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445682

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_092 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 320 (B026)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445683

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_093 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 320 (B026)	1 2 3 4	Plâtre Enduit Toile Peinture	Effritable Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Beige Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445684

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_094 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 321 (B105)	1 2 3 4 5	Peinture Revêtement Colle Ragréage Ciment	Effritable Semi-dur Souple Effritable Effritable	Gris Beige Vert Marron Jaune Gris Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445685

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_095 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 321 (B105)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445686

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_096 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 321 (B105)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445687

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_097 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 321 (B105)	1 2	Bois Mastic	Dur Fibreux Effritable	Marron Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445688

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 26/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_098 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 321 (B105)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445689

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 26/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_099 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 322 (B212)	1 2 3 4	Revêtement Toile Colle Ragréage	Semi-dur Souple Fibreux Souple Effritable	Bleu Beige Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445690

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_100 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 322 (B212)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445691

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_101 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 322 (B212)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445692

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_102 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 322 (B212)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445693

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_103 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 324 (B223)	1 2 3 4	Revêtement Colle Ragréage Matériau	Semi-dur Souple Effritable Effritable	Gris Jaune Gris Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445694

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_104 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 324 (B223)	1 2 3	Plâtre Peinture Enduit	Effritable Effritable Effritable	Blanc Multicolore Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445695

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_105 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 324 (B223)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445696

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_106 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 324 (B223)	1 2	Bois Mastic	Dur Fibreux Dur	Marron Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445697

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_107 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 325 (B302)	1 2 3 4 5	Revêtement Peinture Ragréage Matériau Colle	Souple Fibreux Effritable Effritable Effritable Souple	Beige Blanc Gris Rose Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445698

Date de réception : 16/06/2017	Date de préparation : 16/06/2017	Date d'analyse : 24/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_108 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 325 (B302)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445699

Date de réception : 16/06/2017	Date de préparation : 16/06/2017	Date d'analyse : 24/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_109 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 325 (B302)	1 2 3	Plâtre Peinture Toile	Effritable Effritable Fibreux Souple	Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445700

Date de réception : 16/06/2017	Date de préparation : 16/06/2017	Date d'analyse : 24/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_110 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 326 (B408)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445701

Date de réception : 16/06/2017	Date de préparation : 16/06/2017	Date d'analyse : 24/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_111 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 326 (B408)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445702

Date de réception : 16/06/2017	Date de préparation : 24/06/2017	Date d'analyse : 24/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_112 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 327 (B424 bis)	1 2 3	Revêtement Colle Ciment	Souple Souple Effritable	Bleu Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445703

Date de réception : 16/06/2017	Date de préparation : 16/06/2017	Date d'analyse : 24/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_113 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 327 (B424 bis)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445704

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_114 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 327 (B424 bis)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445705

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_115 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 328 (B530)	1 2 3	Revêtement Peinture Ragréage	Souple Effritable Effritable	Rouge Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445706

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_116 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 328 (B530)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445707

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_117 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 328 (B530)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445708

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_118 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 330 (B606)	1 2 3 4	Revêtement Colle Ragréage Peinture	Semi-dur Souple Effritable Effritable	Beige Jaune Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445709

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_119 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 330 (B606)	1 2 3	Plâtre Peinture Enduit	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445710

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_120 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 330 (B606)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Vert Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445711

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_121 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 332 (B644)	1 2 3 4	Revêtement Toile Colle Ragréage	Souple Fibreux Souple Souple Effritable	Rouge Marron Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445712

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_122 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 332 (B644)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445713

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_123 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 332 (B644)	1 2 3	Plâtre Peinture Fibres	Effritable Effritable Souple	Blanc Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445714

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_124 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 333 (C614)	1 2 3 4	Revêtement Toile Colle Ragréage	Souple Fibreux Souple Souple Effritable	Beige Marron Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445715

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_125 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 333 (C614)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445716

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_126 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 333 (C614)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445717

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_127 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 334 (Bureau 4)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445718

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_128 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 334 (Bureau 4)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445719

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_129 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 334 (Bureau 4)	1	Matériau	Effritable	Blanc Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445720

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_130 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits projetés Vol 334 (Bureau 4)	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445721

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_131 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 335 (D511 bis)	1 2 3	Plâtre Fibres Peinture	Effritable Souple Effritable	Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445722

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_132 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 335 (D511 bis)	1 2 3	Plâtre Fibres Peinture	Effritable Souple Effritable	Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445723

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_133 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 335 (D511 bis)	1 2	Plâtre Fibres	Effritable Souple	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445724

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_134 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 335 (D511 bis)	1 2 3 4 5	Revêtement Peinture Toile Colle Ragréage	Souple Effritable Souple Fibreux Souple Effritable	Marron Rouge Beige Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445725

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_135 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 335 (D511 bis)	1 2	Joint Matériau	Souple Effritable	Noir Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445726

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_136 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 336 (D512)	1 2 3 4 5	Revêtement Toile Colle Ragréage Matériau	Souple Souple Fibreux Souple Effritable Effritable	Bleu Marron Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445727

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_137 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 336 (D512)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445728

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_138 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 336 (D512)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445729

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_139 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 336 (D512)	1 2 3 4	Plâtre Enduit Fibres Peinture	Effritable Effritable Souple Effritable	Blanc Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445730

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_140 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 337 (B516)	1 2 3 4	Revêtement Colle Ragréage Ciment	Semi-dur Fibreux Souple Effritable Dur	Gris Vert Jaune Rose Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445731

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_141 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 337 (B516)	1 2	Plâtre Enduit	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445732

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_142 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 337 (B516)	1 2	Plâtre Peinture	Pulvérulent Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445733

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_143 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 337 (B516)	1 2	Plâtre Enduit	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445734

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_144 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 338 (B507)	1 2 3 4	Revêtement Colle Ragréage Revêtement	Souple Souple Effritable Souple Fibreux	Noir Jaune Gris Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445735

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_145 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 338 (B507)	1 2	Plâtre Fibres	Effritable Souple	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445736

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_146 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons Vol 338 (B507)	1 2 3	Plâtre Fibres Enduit	Effritable Souple Effritable	Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445737

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_147 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 338 (B507)	1 2	Plâtre Fibres	Effritable Souple	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445738

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_148 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 338 (B507)	1	Mastic	Dur	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445739

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_149 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 338 (B507)	1 2	Mastic Matériau	Effritable Effritable	Noir Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445740

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_150 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 339 (D409)	1 2 3 4 5 6	Revêtement Toile Colle Ragréage Ciment Matériau	Souple Fibreux Souple Fibreux Souple Effritable Dur Effritable	Gris Beige Jaune Rose Gris Violet	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445741

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_151 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 339 (D409)	1 2	Plâtre Bande peinte	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445742

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_152 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 339 (D409)	1 2 3	Plâtre Peinture Toile	Effritable Effritable Fibreux Souple	Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445743

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_153 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 339 (D409)	1 2	Mastic Matériau	Dur Effritable	Noir Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445744

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_154 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 339 (D409)	1 2	Plâtre Bande peinte	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445745

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_155 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 340 (D414)	1 2 3 4 5	Revêtement Toile Colle Ragréage Peinture	Souple Fibreux Souple Souple Effritable Effritable	Beige Beige Jaune Gris Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445746

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_156 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 340 (D414)	1 2 3 4	Peinture Enduit Ciment Toile	Effritable Effritable Effritable Fibreux Souple	Blanc Blanc Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445747

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_157 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 340 (D414)	1 2	Plâtre Bande peinte	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445748

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_158 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 340 (D414)	1 2 3	Plâtre Peinture Toile	Effritable Effritable Fibreux Souple	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445749

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 16/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_159 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 340 (D414)	1 2 3	Joint Mastic Matériau	Souple Dur Souple	Gris Blanc Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445750

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_160 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 341 (C408)	1 2	Plâtre Bande peinte	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445751

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_161 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 341 (C408)	1 2	Plâtre Bande peinte	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445752

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 26/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_162 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 341 (C408)	1 2	Mastic Matériau	Dur Effritable	Blanc Noir Marron	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445753

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_163 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 342 (P171)	1 2 3	Plâtre Peinture Fibres	Effritable Effritable Souple	Blanc Beige Orange Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445754

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_164 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits ciment Vol 342 (P171)	1 2 3 4	Ciment Peinture Toile Peinture	Effritable Effritable Fibreux Souple Effritable	Gris Orange Beige Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445755

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_165 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 342 (P171)	1 2	Plâtre Bande peinte	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445756

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 26/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_166 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 342 (P171)	1 2 3	Bois Peinture Mastic	Dur Fibreux Effritable Dur	Marron Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445757

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_167 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 343 (D111)	1 2	Plâtre Carton	Effritable Fibreux Souple	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445758

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_168 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 343 (D111)	1 2	Plâtre Carton	Effritable Fibreux Souple	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445759

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_169 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 343 (D111)	1 2 3 4	Plâtre Carton Fibres Peinture	Effritable Souple Fibreux Souple Effritable	Blanc Marron Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445760

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_170 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 343 (D111)	1 2	Mastic Matériau	Effritable Effritable	Marron Beige Noir Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445761

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_171 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 344 (D110)	1 2 3 4	Revêtement Toile Colle Peinture	Semi-dur Fibreux Souple Souple Effritable	Marron Beige Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 8	Revêtement Colle	Souple Souple	Vert Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6 7	Ragréage Matériau	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : PM01445762

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_172 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 344 (D110)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445763

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_173 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 344 (D110)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445764

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_174 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 344 (D110)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445765

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_175 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 345 (Plénum amphi 8)	1	Matériau	Effritable	Beige Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445766

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_176 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage Vol 345 (Plénum amphi 8)	1	Flocage	Fibreux Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445767

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_177 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 261 (Escalier A)	1 2 3 4 5 6 7	Revêtement Toile Colle Ragréage Matériau Matériau Ciment	Semi-dur Fibreux Souple Souple Effritable Dur Effritable Dur	Beige Vert Beige Jaune Rose Noir Beige Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445768

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_178 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 261 (Escalier A)	1 2 3 4 5	Revêtement Toile Ragréage Ciment Matériau	Semi-dur Fibreux Souple Effritable Effritable Effritable	Beige Marron Gris Rose Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445769

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_179 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 261 (Escalier A)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445770

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_180 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) Vol 264	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Gris Rouge	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445771

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_181 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 261 (Escalier A)	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445772

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_182 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Vol 261 (Escalier A)	1 2 3	Plâtre Peinture Bois	Effritable Effritable Dur Fibreux	Blanc Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445773

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_183 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 349 (Palier et escalier)	1	Revêtement	Semi-dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01445774

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_184 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 349 (Palier et escalier)	1 2	Revêtement Colle	Dur Bitumineux	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	3	MET*	Non détecté
	3 4 6	Revêtement Colle Matériau	Souple Souple Effritable	Marron Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : PM01445775

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_185 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 351 (Palier et escalier)	1 2 3	Revêtement Colle Matériau	Souple Souple Effritable	Gris Jaune Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445776

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_186 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 351 (Palier et escalier)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445777

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_187 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Vol 351 (Palier et escalier)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445778

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_188 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 352 (Palier et escalier)	1	Revêtement	Semi-dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Noir Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01445779

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_189 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Vol 353 (Palier et escalier)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445780

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_190 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 156	1 2	Colle Ragréage	Dur Effritable	Gris Rose	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445781

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_191 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 360	1 2 3 4	Revêtement Toile Colle Ragréage	Semi-dur Fibreux Souple Souple Effritable	Beige Beige Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445782

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_192 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 360	1 2 3	Plâtre Peinture Enduit	Effritable Effritable Effritable	Blanc Multicolore Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445783

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_193 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 359	1 2 3	Colle Ciment Joint	Dur Effritable Dur	Gris Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445784

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_194 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 359	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445785

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_195 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 359	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445786

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_196 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 359	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445787

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_197 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 359	1 2 3	Colle Peinture Plâtre	Dur Effritable Effritable	Gris Bleu Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445788

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_198 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 360	1 2	Flocage Matériau	Fibreux Effritable Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445789

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_199 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 360	1 2 3	Laine Tresse Plâtre	Fibreux Souple Fibreux Souple Effritable	Jaune Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445790

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 19/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_200 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 362	1 2 3	Revêtement Colle Ragréage	Souple Souple Effritable	Beige Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445791

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 26/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_201 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 363	1 2 3 4	Revêtement Toile Ragréage Colle	Semi-dur Souple Fibreux Effritable Souple	Beige Beige Gris Rose Jaune	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445792

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_202 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 363	1 2 3 4 5	Revêtement Matériau Ragréage Matériau Colle	Souple Effritable Effritable Effritable Souple	Beige Noir Gris Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445793

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_203 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 364	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445794

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 26/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_204 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 364	1	Flocage	Effritable Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445795

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_205 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 372	1 2 3 4	Revêtement Toile Ragréage Colle	Souple Fibreux Souple Effritable Souple	Jaune Beige Gris Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445796

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_206 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 376	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445797

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_207 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 374	1 2 3 4 5 6	Revêtement Toile Ragréage Colle Ciment Matériau	Semi-dur Fibreux Souple Effritable Souple Effritable Effritable	Jaune Beige Rose Jaune Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445798

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_208 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 375	1 2 3 4	Revêtement Toile Colle Ragréage	Semi-dur Fibreux Souple Souple Effritable	Beige Beige Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445799

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_209 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 376	1	Flocage	Fibreux Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01445800

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_210 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 376	1 2 3	Laine Tresse Matériau	Fibreux Fibreux Souple Effritable	Jaune Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445801

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 24/06/2017** | **Date d'analyse : 26/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_211 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 375	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445802

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_212 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 363	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445803

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_213 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 375	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445804

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_214 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 363	1 2 3	Colle Matériau Ragréage	Souple Souple Effritable	Jaune Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445805

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_215 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 378	1 2 3 4 5	Revêtement Toile Colle Peinture Ragréage	Semi-dur Fibreux Souple Souple Effritable Effritable	Beige Beige Jaune Vert Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445806

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_216 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 382	1 2 3 4	Revêtement Toile Colle Ragréage	Semi-dur Fibreux Souple Souple Effritable	Beige Beige Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445807

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_217 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 385	1 2	Colle Bois	Effritable Dur Fibreux	Gris Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445808

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_218 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 355	1 2 3	Revêtement Colle Ragréage	Semi-dur Souple Effritable	Gris Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445809

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_219 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 387	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5	Joint Peinture	Souple Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : PM01445810

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_220 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 388	1 2 3	Revêtement Colle Ragréage	Fibreux Souple Souple Effritable	Beige Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01445811

Date de réception : 16/06/2017 | **Date de préparation : 17/06/2017** | **Date d'analyse : 24/06/2017**


Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189_221 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 389	1 2	Revêtement Peinture	Souple Effritable	Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : PM01445812 ●								
Date de réception : 16/06/2017			Date de préparation : 17/06/2017				Date d'analyse : 24/06/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002KN000189_222 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 390	1 2 3	Revêtement Colle Ragréage	Souple Souple Effritable	Noir Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance
Sabbah Abdelslame



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012017226188**
Adresse chantier :	Commande : 002KN000189-1 Affaire : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 24/07/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017226188 (39 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01520136

Date de réception : 21/07/2017 — **Date de préparation : 22/07/2017** — **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_223 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 610	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520137

Date de réception : 21/07/2017 — **Date de préparation : 22/07/2017** — **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_224 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 611	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520138

Date de réception : 21/07/2017 — **Date de préparation : 22/07/2017** — **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_225 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) Vol 610	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520139

Date de réception : 21/07/2017 — **Date de préparation : 22/07/2017** — **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_226 Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Calorifugeage Vol 612	1 2 3	Laine Carton Bande peinte	Fibreux Souple Souple Fibreux Effritable Fibreux	Jaune Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520140

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_227 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 612	1 2	Matériau Aluminium	Bitumineux Fibreux Souple	Noir Gris	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520141

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_228 Façades / Murs / Enduit ciment Vol 612	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520142

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_229 Façades / Murs / Enduit ciment Vol 612	1 2 3	Ciment Ciment Matériau	Dur Dur Effritable Fibreux	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520143

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_230 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 613	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520144

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_231 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) Vol 613	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520145

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_232 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bardeaux bitumé (type "Shingle") Vol 612	1	Matériau	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01520146

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_233 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 614	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01520147

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_234 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Flocages Vol 615	1	Flocage	Fibreux Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01520148

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_235 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Flocages Vol 618	1	Flocage	Fibreux Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01520149

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_236 Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments Vol 620	1 2	Joint Peinture	Souple Effritable	Rouge Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520150

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_237 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 611	1 2 3	Plâtre Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Beige Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520151

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_238 Façades / Murs / Enduit ciment Vol 623	1 2	Matériau Peinture	Effritable Fibreux Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520152

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 22/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_239 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bardeaux bitumé (type "Shingle") Vol 623	1 2	Matériau Aluminium	Bitumineux Souple	Noir Gris	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520153

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 24/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_240 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bardeaux bitumé (type "Shingle") Vol 623	1 2 3	Shingle Aluminium Matériau	Bitumineux Fibreux Souple Effritable	Gris Noir Gris Marron	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520154

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_241 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 345 (Plénum amphi 8)	1	Plâtre	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01520155

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_242 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 387	1 2	Enduit Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520156

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_243 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 388	1 2 3 4	Enduit Peinture Plâtre Peinture	Effritable Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc Marron Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520157

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_244 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 624	1 2 3 4	Enduit Peinture Plâtre Peinture	Effritable Effritable Effritable Effritable	Blanc Noir Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520158

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_245 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 390	1 2 3 4	Enduit Peinture Plâtre Peinture	Effritable Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520159

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_246 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 626	1 2 3 4 5	Enduit Peinture Plâtre Peinture Matériau	Effritable Effritable Effritable Effritable Fibreux	Blanc Beige Blanc Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520160

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_247 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 627	1 2 3 4	Enduit Peinture Plâtre Peinture	Effritable Effritable Effritable Effritable	Beige Blanc Blanc Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520161

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_248 Façades / Murs / Enduit ciment Vol 632	1 2 3	Ciment Peinture Enduit	Dur Souple Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520162

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 24/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_249 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bardeaux bitumé (type "Shingle") Vol 632	1 2	Shingle Aluminium	Bitumineux Fibreux Souple	Noir Gris	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520163

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 24/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_250 Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses Vol 632	1 2	Matériau Aluminium	Bitumineux Fibreux Souple	Noir Gris	Attaque chimique : Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520164

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_251 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 628	1 2 3	Revêtement Colle Ragréage	Souple Souple Dur	Beige Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01520165

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_252 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 630	1 2 3	Moquette Colle Ragréage	Souple Fibreux Souple Effritable	Bleu Blanc Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520166

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_253 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 630	1 2 3	Plâtre Peinture Papier	Effritable Effritable Fibreux Souple	Blanc Vert Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520167

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_254 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 631	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Beige Beige Blanc Bleu	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520168

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_255 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 631	1 2 3 4	Revêtement Colle Ragréage Matériau	Souple Fibreux Souple Effritable Effritable	Gris Marron Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520169

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_256 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 631	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520170

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_257 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 631	1 2 3	Colle Enduit Joint	Dur Effritable Souple	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520171 ●

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_258 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 634 (Façade intérieur)	1 2	Mastic Matériau	Dur Effritable	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520172 ●

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_259 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 634 (Façade intérieur)	1 2	Mastic Matériau	Dur Effritable	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01520173 ●

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_260 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 633 (Façade extérieur)	1	Mastic	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01520174 ●

Date de réception : 21/07/2017 | **Date de préparation : 21/07/2017** | **Date d'analyse : 24/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-1_261 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 633 (Façade extérieur)	1	Mastic	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : RAS

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable laboratoire
Sana Bourguiba



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Référence chantier : **C012017236394**
Adresse chantier : Commande : 002KN000189-2
Affaire :
EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 PARIS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 25/09/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017236394 (20 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01626136

Date de réception : 21/09/2017 **Date de préparation : 22/09/2017** **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_262 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduit plâtre Vol 338 (B507)	1 2 3	Peinture Enduit Bois	Effritable Effritable Dur Fibreux	Blanc Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626137

Date de réception : 21/09/2017 **Date de préparation : 22/09/2017** **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_263 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 338 (B507)	1 2	Bande peinte Enduit	Effritable Fibreux Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626138

Date de réception : 21/09/2017 **Date de préparation : 22/09/2017** **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_264 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 338 (B507)	1 2	Bande peinte Enduit	Effritable Fibreux Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626139

Date de réception : 21/09/2017 **Date de préparation : 22/09/2017** **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_265 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 338 (B507)	1	Mastic	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01626140

Date de réception : 21/09/2017 | **Date de préparation : 22/09/2017** | **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_266 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 338 (B507)	1	Mastic	Effritable	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01626141

Date de réception : 21/09/2017 | **Date de préparation : 22/09/2017** | **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_267 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic d'étanchéité Vol 338 (B507)	1	Mastic	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01626142

Date de réception : 21/09/2017 | **Date de préparation : 22/09/2017** | **Date d'analyse : 23/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_268 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduit plâtre Vol 627	1 2 3	Papier peint Peinture Enduit	Souple Fibreux Effritable Effritable	Rose Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626143

Date de réception : 21/09/2017 | **Date de préparation : 22/09/2017** | **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_269 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Poussière Vol 345 (Plénum amphi 8)	1	Poussière sur lingette	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01626144

Date de réception : 21/09/2017 | **Date de préparation : 22/09/2017** | **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_270 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 345 (Plénum amphi 8)	1	Laine	Fibreux	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01626145

Date de réception : 21/09/2017 | **Date de préparation : 22/09/2017** | **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_271 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 635 (Escaliers)	1 2	Revêtement Matériau	Souple Effritable	Orange Noir Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626146

Date de réception : 21/09/2017 | **Date de préparation : 22/09/2017** | **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_272 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 635 (Escaliers)	1 2	Ciment Matériau	Effritable Souple	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626147

Date de réception : 21/09/2017			Date de préparation : 22/09/2017				Date d'analyse : 22/09/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002KN000189-2_273 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 635 (Escaliers)	1 2	Plâtre Peinture	Dur Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626148

Date de réception : 21/09/2017			Date de préparation : 22/09/2017				Date d'analyse : 22/09/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002KN000189-2_274 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 635 (Escaliers)	1 2 3	Peinture Matériau Ciment	Effritable Effritable Dur	Marron Gris Marron Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626149

Date de réception : 21/09/2017			Date de préparation : 22/09/2017				Date d'analyse : 22/09/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002KN000189-2_275 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Vol 635 (Escaliers)	1 2	Plâtre Bois	Dur Dur Fibreux	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626150

Date de réception : 21/09/2017			Date de préparation : 22/09/2017				Date d'analyse : 22/09/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002KN000189-2_276 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Flocages Vol 635 (Escaliers)	1	Flocage	Fibreux Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01626151

Date de réception : 21/09/2017			Date de préparation : 22/09/2017				Date d'analyse : 22/09/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002KN000189-2_277 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 635 (Escaliers)	1 2 3	Matériau Colle Matériau	Effritable Souple Souple	Gris Jaune Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626152

Date de réception : 21/09/2017			Date de préparation : 22/09/2017				Date d'analyse : 22/09/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002KN000189-2_278 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits lissés Vol 636 Salle de reunion	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626153 ●

Date de réception : 21/09/2017 | **Date de préparation : 22/09/2017** | **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_279 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 636 Salle de reunion	1 2	Peinture Enduit	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626154 ●

Date de réception : 21/09/2017 | **Date de préparation : 22/09/2017** | **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_280 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 636 Salle de reunion	1 2	Plâtre Papier	Effritable Souple Fibreux	Blanc Marron Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01626155 ●


Date de réception : 21/09/2017 | **Date de préparation : 22/09/2017** | **Date d'analyse : 22/09/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-2_281 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons Vol 636 Salle de reunion	1	Plâtre	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance
Sabbah Abdelslame



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

AC Environnement

64, rue Clément Ader - 42153 Riorges
Tél : 0 800 600 133 - Fax : 0 825 800 954
labs@ac-environnement.fr
Siret 441 355 914 000298

Référence chantier :	**C022018081544**
Adresse chantier :	Commande : 002KN000189-3 Affaire : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 26/01/2018

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C022018081544 (454 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528618

Date de réception : 24/01/2018 — **Date de préparation : 20/01/2018** — **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_282 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 637	1	Colle	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528619

Date de réception : 24/01/2018 — **Date de préparation : 20/01/2018** — **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_283 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Joint entre éléments Vol 177	1 2 3	Peinture Matériau Ciment	Effritable Souple Effritable	Multicolore Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528620

Date de réception : 24/01/2018 — **Date de préparation : 20/01/2018** — **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_284 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 177	1 2 3	Colle Peinture Enduit	Effritable Effritable Effritable	Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	4 5	Peinture Joint	Effritable Effritable	Orange Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528621

Date de réception : 24/01/2018 — **Date de préparation : 20/01/2018** — **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_285 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 178	1 2	Revêtement Matériau	Semi-dur Souple Fibreux	Orange Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5 6	Colle Ragréage Matériau Peinture	Souple Effritable Effritable Effritable	Jaune Rose Blanc Blanc Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528622

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_286 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 181	1 2 3 4	Peinture Enduit Carton Plâtre	Effritable Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528623

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_287 Revêtement de sol / Faux plancher / Colle Vol 181	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528624

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_288 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 191	1 2	Matériau Ragréage	Effritable Effritable	Marron Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528625

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_289 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 191	1 2	Peinture Béton	Effritable Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528626

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_290 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 179	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	2	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528627

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_291 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 192	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528628

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_292 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 189	1 2 3	Peinture Ciment Enduit	Effritable Effritable Effritable	Blanc Gris Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	4	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528629

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_293 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Conduit en fibres-ciment Vol 165	1 2	Peinture Fibres-ciment	Effritable Dur Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile Crocidolite

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528630

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_294 Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments Vol 167	1 2	Matériau Matériau	Résineux Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528631

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_295 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Tresses Vol 166	1 2	Matériau Matériau	Fibreux Souple Effritable	Blanc Noir	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528632

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_297 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 106	1	Ragréage	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528633

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_298 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Joint entre éléments Vol 86	1 2 3 4	Peinture Matériau Ciment Matériau	Effritable Effritable Dur Effritable	Blanc Blanc Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528634

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_299 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Joint de bride Vol 91	1 2	Joint Matériau	Souple Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528635

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_300 Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein Vol 88	1 2	Matériau Matériau	Effritable Fibreux Effritable	Marron Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528636

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_301 Revêtement de sol / Massif / Ciment Vol 88	1 2	Ciment Matériau	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528637

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_302 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Plaques menuiserie Vol 87	1 2 3 4	Peinture Matériau Enduit Colle	Effritable Fibreux Dur Effritable Souple	Blanc Blanc Beige Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528638

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_303 Plafond et faux-plafonds / Interface entre structures / Joints de dilatation Vol 86	1 2	Peinture Matériau	Effritable Fibreux Souple	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528639

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_304 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 97	1 2 3	Revêtement Toile Colle	Semi-dur Souple Fibreux Souple	Vert Jaune Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5	Ragréage Matériau	Effritable Effritable	Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528640

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_305 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 111	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Matériau Ragréage Matériau	Bitumineux Effritable Effritable	Noir Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528641

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_306 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 111	1	Revêtement	Semi-dur	Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Toile Colle	Souple Fibreux Souple	Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5	Ragréage Peinture	Effritable Effritable	Rose Rose Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528642

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_307 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 113	1 2 3	Enduit Carton Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable Fibreux	Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528643

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_308 Façades / Murs / Enduit ciment Vol 108	1	Ciment	Effritable Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528644

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_309 Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Flocages Vol 86	1	Flocage	Fibreux Souple	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528645

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_310 Conduits, canalisations et équipements / Clapets/volet Coupe feu / Volets Vol 135	1 2 3	Carton Plâtre Carton	Fibreux Souple Effritable Fibreux Souple Fibreux	Marron Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528646

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 24/01/2018** | **Date d'analyse : 24/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_311 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Joint entre éléments Vol 135	1 2	Ciment Matériau	Effritable Effritable	Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528647

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 25/01/2018** | **Date d'analyse : 25/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_312 Conduits, canalisations et équipements / Clapets/volet Coupe feu / Volets Vol 143	1	Matériau	Effritable Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528648

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 24/01/2018** | **Date d'analyse : 24/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_315 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Panneaux Vol 144	1	Matériau	Dur Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528649

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 25/01/2018** | **Date d'analyse : 25/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_316 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 284	1 2 3	Matériau Toile Laine	Bitumineux Souple Fibreux Souple Fibreux	Noir Beige Jaune	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528650

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 24/01/2018** | **Date d'analyse : 24/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_317 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 92	1	Revêtement	Semi-dur	Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Bois	Effritable Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528651

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 24/01/2018** | **Date d'analyse : 24/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_318 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 92	1 2	Matériau Revêtement	Souple Semi-dur	Blanc Jaune Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528652

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_319 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 92	1 2	Peinture Faux plafond	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528653

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_320 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 92	1 2 3 4	Peinture Enduit Carton Plâtre	Effritable Effritable Souple Fibreux Effritable	Beige Gris Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528654

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_321 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 194	1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528655

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_322 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 194	1 2 3	Peinture Ciment Matériau	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528656

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_323 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment Vol 69	1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528657

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_324 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Joint entre éléments Vol 32	1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Multicolore Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528658

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_325 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment Vol 79	1 2	Peinture Béton	Effritable Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528659

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_326 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de dilatation Vol 79	1 2	Matériau Matériau	Souple Fibreux Effritable	Marron Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528660

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_327 Plafond et faux-plafonds / Gaines et coffre horizontaux / Panneaux Vol 79	1 2	Peinture Enduit	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528661

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_328 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Joint entre éléments Vol 37	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528662

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_329 Equipements divers et accessoires / Aérothermes / Isolant Vol 46	1 2	Laine Matériau	Souple Fibreux Effritable	Noir Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528663

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : - | Date d'analyse : -

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_330 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage Vol 47	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarque : Prélèvement non analysé.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528664

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_331 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage Vol 77	1 2	Toile Plâtre	Souple Fibreux Effritable	Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528665

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_332 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Tresses Vol 77	1 2	Laine Matériau	Souple Fibreux Effritable	Noir Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528666

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_333 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Joint entre éléments Vol 76	1 2	Peinture Joint	Effritable Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528667

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_334 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Joint entre éléments Vol 57	1 2	Joint Matériau	Effritable Souple Fibreux	Gris Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528668

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_335 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Conduit en fibres-ciment Vol 57	1	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528669

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_336 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de dilatation Vol 53	1 2	Matériau Matériau	Souple Fibreux Effritable	Marron Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528670

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 25/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_337 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 59	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	3	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528671

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_338 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 59	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528672

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_339 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 41	1 2	Colle Ragréage	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528673

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_340 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 16 (SB 207)	1 2	Peinture Faux plafond	Effritable Souple Fibreux	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528674

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_341 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 17 (SB 209)	1 2	Peinture Faux plafond	Effritable Souple Fibreux	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528675

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_342 Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Entourage de poutres Vol 16 (SB 207)	1 2 3 4	Papier Plâtre Polystyrène Peinture	Souple Fibreux Effritable Souple Effritable	Marron Blanc Blanc Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528676

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_343 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage Vol 17 (SB 209)	1 2 3	Mousse Tresse Matériau	Souple Souple Fibreux Effritable	Beige Beige Marron	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528677

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_344 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Joint entre éléments Vol 17 (SB 209)	1 2 3 4	Peinture Enduit Matériau Matériau	Effritable Effritable Dur Souple	Vert Beige Gris Translucide	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528678

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_345 Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments Vol 17 (SB 209)	1	Matériau	Effritable	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528679

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_346 Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments Vol 25	1	Matériau	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528680

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_348 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment Vol 1 (Parking nord)	1 2	Peinture Ciment	Effritable Dur	Marron Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528681

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_349 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 652 (Bureaux 12)	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Marron Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528682

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_350 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Jonction entre panneaux Vol 654 (Bureaux 14)	1 2 3	Peinture Toile Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable	Beige Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528683

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_351 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 654 (Bureaux 14)	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Marron Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528684

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_352 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 653 (Bureaux 13)	1 2 3 4 5 6	Peinture Toile Papier Carton Plâtre Enduit	Effritable Souple Fibreux Souple Fibreux Souple Fibreux Effritable Effritable	Beige Blanc Beige Marron Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528685

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_353 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 384	1	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528686

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_354 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 384	1 2 3	Peinture Enduit Ciment	Effritable Effritable Effritable	Blanc Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528687

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_355 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 384	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ciment	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528688

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_356 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 384	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5	Colle Ragréage Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable Effritable	Jaune Rose Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528689

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_357 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 661	1	Revêtement	Semi-dur	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Toile	Souple Fibreux	Beige				
	3	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Ragréage	Effritable	Rose				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528690

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_358 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons Vol 661	1	Papier peint	Souple Fibreux	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc				
	3	Peinture	Effritable	Blanc				
	4	Carton	Souple Fibreux	Marron				
	5	Fibres	Souple Fibreux	Blanc				
	6	Plâtre	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528691

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_359 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 320 (B026)	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Ragréage	Effritable	Gris				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528692

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_360 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 382	1	Revêtement	Semi-dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Toile	Souple Fibreux	Marron				
	3	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Ragréage	Effritable	Gris				
	5	Matériau	Effritable	Beige				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528693

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_361 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons Vol 320 (B026)	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Papier	Souple Fibreux	Beige				
	4	Toile	Souple Fibreux	Blanc				
	5	Plâtre	Effritable	Blanc				
	6	Carton	Souple Fibreux	Marron				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528694

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_362 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 659 (Bureaux 15)	1	Peinture	Effritable	Blanc Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur	Rose				
	3	Toile	Souple Fibreux	Marron				
	4	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Ragréage	Effritable	Gris				
	6	Matériau	Souple Fibreux	Multicolore				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528695

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_363 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 659 (Bureaux 15)	1 2	Moquette Colle	Souple Fibreux Souple	Multicolore Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Revêtement Colle Matériau	Souple Souple Effritable	Bleu Marron Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528696

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_364 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 659 (Bureaux 15)	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Orange Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Peinture Ragréage	Souple Effritable Effritable Fibreux	Jaune Gris Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528697

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_365 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 655 (B028)	1 2 3	Revêtement Colle Toile	Semi-dur Souple Souple Fibreux	Orange Jaune Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Marron Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528698

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_366 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 659 (Bureaux 15)	1 2 3	Revêtement Toile Colle	Semi-dur Souple Fibreux Souple	Orange Jaune Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5	Peinture Joint	Effritable Souple	Multicolore Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528699

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_367 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 659 (Bureaux 15)	1 2 3	Revêtement Peinture Colle	Souple Effritable Souple	Beige Gris Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528700

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_368 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre Vol 659 (Bureaux 15)	1 2 3	Peinture Toile Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable	Gris Beige Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528701

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_369 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 659 (Bureaux 15)	1 10	Joint Peinture	Souple Effritable	Gris Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Revêtement Toile Colle	Semi-dur Souple Fibreux Souple	Jaune Beige Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6 7	Peinture Revêtement Colle	Effritable Souple Souple	Blanc Bleu Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	8 9	Ragréage Matériau	Effritable Fibreux Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 9 non dissociable analysée avec la couche 8. Couche 10 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528702

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_370 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 666 (Infirmerie 2)	1 2	Colle Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc Rose	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528703

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_371 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 666 (Infirmerie 2)	1	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528704

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_372 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 666 (Infirmerie 2)	1 2	Faux plafond Peinture	Fibreux Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528705

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_374 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 664	1 2 3 4	Matériau Revêtement Colle Ragréage	Effritable Dur Souple Effritable	Gris Bleu Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528706

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_375 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse Vol 664	1 2 3	Matériau Ragréage Ciment	Effritable Effritable Effritable	Noir Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528707

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_376 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 385	1 2	Colle Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	3	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528708

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_377 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 385	1 2	Peinture Joint	Effritable Effritable	Blanc Vert Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	3	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528709

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_378 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 669	1 3	Revêtement Matériau	Souple Effritable	Blanc Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528710

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_379 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 669	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Matériau Ragréage	Souple Effritable Effritable	Jaune Bleu Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528711

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_380 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 673 (C005)	1 2	Revêtement Colle	Souple Souple	Bleu Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528712

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_381 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre Vol 673 (C005)	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528713

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_382 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 673 (C005)	1 2 3	Peinture Plâtre Ciment	Effritable Effritable Effritable	Multicolore Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528714

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_383 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 675	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Matériau Colle Ragréage	Effritable Souple Effritable	Blanc Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528715

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_384 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 681	1 2 3	Peinture Revêtement Colle	Effritable Souple Souple	Gris Bleu Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528716

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_385 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 682	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528717

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 25/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_386 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 688	1 2 3	Colle Matériau Ragréage	Dur Fibreux Effritable Dur	Gris Beige Rose	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528718

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_387 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 671	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	4	Joint	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528719

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 25/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_388 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 671	1 2	Colle Matériau	Effritable Fibreux Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	3	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528720

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_389 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 671	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Joint	Souple	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Peinture Enduit	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528721

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_390 Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux Vol 671	1 2	Tampon Matériau	Bitumineux Souple	Noir Translucide	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528722

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_391 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 692	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528723

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_392 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 692	1	Peinture	Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Beige Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528724

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_393 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 692	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Beige Beige Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528725

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_395 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 696 (Sureté)	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Bleu Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Ragréage	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528726

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_396 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 696 (Sureté)	1 2 3 4 5	Peinture Toile Enduit Papier Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Blanc Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528727

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_397 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 702	1 2 3	Matériau Revêtement Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux	Beige Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6 7	Joint Colle Ragréage Matériau	Souple Souple Effritable Effritable	Blanc Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528728

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_398 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 705	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528729

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_399 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 708	1 2 3 4	Revêtement Colle Ragréage Ciment	Semi-dur Souple Effritable Effritable	Bleu Jaune Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528730

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_400 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Sous-couches des tissus muraux Vol 708	1 2	Papier peint Plâtre	Souple Fibreux Effritable	Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528731

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_401 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 708	1 2	Flocage Matériau	Souple Fibreux Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528732

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_402 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 649 (Couloir 4)	1 2	Colle Ciment	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528733

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_403 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 649 (Couloir 4)	1 2 3	Papier peint Carton Plâtre	Souple Fibreux Souple Fibreux Effritable	Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528734

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_404 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 644 (Couloir 2)	1 2	Enduit Matériau	Effritable Effritable	Beige Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528735

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_405 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 710	1	Revêtement	Semi-dur	Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5	Colle Ragréage Toile Matériau	Souple Effritable Souple Fibreux Effritable	Jaune Gris Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528736

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_406 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 710	1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528737

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_407 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 710	1 2 3 4	Peinture Enduit Carton Plâtre	Effritable Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528738

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_408 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 710	1	Flocage	Fibreux Souple	Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528739

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_409 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 641	1	Revêtement	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528740

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_410 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 266	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528741

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_411 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 267 (Sanitaires 1)	1 2	Peinture Enduit	Effritable Effritable	Multicolore Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528742

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_412 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 267 (Sanitaires 1)	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Colle	Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528743

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_413 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 267 (Sanitaires 1)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2 3	Peinture Joint	Effritable Dur	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Multicolore Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528744

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_414 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 259	1	Revêtement	Semi-dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5	Colle Ragréage Matériau Ciment	Souple Effritable Effritable Dur	Jaune Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528745

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_415 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe Vol 266	1	Revêtement	Souple	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Matériau Matériau	Résineux Effritable	Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528746

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_416 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 711	1 2	Peinture Revêtement	Effritable Souple	Bleu Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528747

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_417 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 712	1 2	Peinture Revêtement	Effritable Souple	Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528748

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_418 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 712	1 2 3 4 5	Peinture Revêtement Colle Ragréage Matériau	Effritable Souple Souple Effritable Effritable	Bleu Jaune Jaune Gris Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528749

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_419 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 712	1 2 3	Revêtement Colle Ragréage	Souple Souple Effritable	Beige Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528750

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_420 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 712	1 2	Peinture Joint	Effritable Dur	Multicolore Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	4	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528751

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_421 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 714	1 2	Peinture Joint	Effritable Dur	Bleu Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	4	MET*	Non détecté
	3 4 5 6	Colle Matériau Ragréage Matériau	Dur Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Gris Beige Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528752

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_422 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 714	1 2	Peinture Colle	Effritable Dur	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528753

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_423 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 714	1 2	Peinture Colle	Effritable Effritable	Multicolore Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528754

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_424 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 716	1	Joint	Souple	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Revêtement Colle Toile	Semi-dur Souple Souple Fibreux	Beige Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528755

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_425 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 717	1 6	Joint Peinture	Souple Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528756

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_426 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 256	1	Revêtement	Semi-dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5	Colle Ragréage Ciment Matériau	Souple Dur Effritable Effritable	Jaune Gris Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528757

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_427 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 799	1	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Dur Dur	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528758

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_428 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 799	1 2	Peinture Joint	Effritable Dur	Multicolore Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Enduit Plâtre	Dur Effritable Effritable	Beige Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528759

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_429 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 799	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Multicolore Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528760

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_430 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 821	1	Revêtement	Semi-dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Toile	Souple Fibreux	Beige				
	3	Colle	Souple	Jaune				
	4	Ragréage	Dur	Rose	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
	5	Ragréage	Effritable	Gris				
	6	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528761

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_431 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 776	1	Joint	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur	Gris				
	3	Toile	Souple Fibreux	Beige				
	4	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Ragréage	Dur	Rose				
	6	Ragréage	Dur	Gris				
	7	Matériau	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528762

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_432 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 758	1	Ragréage	Dur	Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528763

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_433 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 758	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Matériau	Souple Fibreux	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528764

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_434 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 786	1	Revêtement	Semi-dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Translucide				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528765

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_435 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 760	1	Revêtement	Semi-dur	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Toile	Souple Fibreux	Beige				
	3	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Ragréage	Dur	Rose				
	5	Ragréage	Effritable	Gris				
	6	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528766

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_436 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 784	1	Revêtement	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Dur Effritable	Jaune Rose Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6	Ragréage Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528767

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_437 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 776	1 2	Peinture Joint	Effritable Souple	Multicolore Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6	Colle Ragréage	Souple Dur	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528768

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_438 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 429	1 2	Matériau Revêtement	Effritable Semi-dur	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5 6	Matériau Colle Ragréage Ciment	Effritable Souple Dur Dur	Blanc Jaune Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528769

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_439 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 429	1 2	Revêtement Peinture	Semi-dur Effritable	Beige Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5 6	Matériau Colle Ragréage Ciment	Effritable Souple Dur Effritable	Blanc Jaune Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528770

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_440 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 429	1 2 3 4	Matériau Revêtement Toile Matériau	Effritable Semi-dur Souple Fibreux Effritable	Gris Rouge Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6 7 8	Colle Ragréage Matériau Ragréage	Souple Dur Effritable Effritable	Blanc Rose Noir Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528771

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_441 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 823	1 2 3	Colle Peinture Plâtre	Dur Effritable Effritable	Gris Multicolore Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528772

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_442 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 823	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Blanc Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528773

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_443 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 813	1 2 3 4	Revêtement Toile Colle Sous-couche	Semi-dur Souple Fibreux Souple Souple Fibreux	Beige Beige Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6 7	Colle Ragréage Peinture	Souple Dur Effritable	Beige Rose Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528774

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_444 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 837	1 2 3	Peinture Revêtement Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux	Blanc Rouge Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Ragréage Matériau	Souple Dur Effritable	Jaune Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528775

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_445 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 822	1 2 3	Revêtement Toile Colle	Semi-dur Souple Fibreux Souple	Beige Beige Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5	Ragréage Matériau	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528776

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_446 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 751	1 2 3	Peinture Revêtement Colle	Effritable Souple Souple	Blanc Bleu Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Ragréage Ciment Matériau	Effritable Dur Effritable	Gris Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528777

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_447 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 752	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Peinture Revêtement	Souple Effritable Souple	Jaune Blanc Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6 7	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Beige Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528778

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_448 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 842	1 2 3	Revêtement Colle Toile	Semi-dur Fibreux Souple Souple Fibreux	Gris Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
	4	Ragréage	Effritable	Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528779

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_449 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 843	1 2	Peinture Revêtement	Effritable Souple Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528780

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_450 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 855	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528781

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 25/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_451 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 855	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	3	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528782

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_452 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 855	1 2	Peinture Joint	Effritable Dur	Blanc Bleu Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Enduit	Souple Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528783

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_453 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 855	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Multicolore Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528784

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_454 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 847	1 2	Matériau Revêtement	Effritable Souple Fibreux	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528785

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_455 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 845	1	Revêtement	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5 6	Colle Ragréage Bois Peinture Carton	Souple Effritable Dur Fibreux Effritable Souple Fibreux	Jaune Rose Beige Orange Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528786

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_456 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 845	1 2	Revêtement Matériau	Souple Souple	Noir Translucide	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528787

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_457 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 845	1 2 3 4	Peinture Matériau Enduit Plâtre	Effritable Effritable Fibreux Effritable Effritable	Blanc Rouge Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528788

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_458 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 848	1 2 3	Peinture Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Beige Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528789

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_459 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 848	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528790

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_460 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 848	1 2 3 4	Revêtement Colle Toile Ragréage	Fibreux Semi-dur Souple Souple Fibreux Effritable Fibreux	Gris Jaune Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528791

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_461 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 848	1 2 3 4	Peinture Enduit Peinture Plâtre	Effritable Effritable Effritable Effritable	Blanc Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528792

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_462 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 847	1 2 3	Revêtement Toile Colle	Semi-dur Fibreux Souple Souple	Gris Beige Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528793

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_463 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 847	1 6	Matériau Joint	Effritable Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5	Colle Peinture Enduit Matériau	Dur Effritable Effritable Effritable	Beige Beige Blanc Noir	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528794

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_464 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 847	1 2 3	Colle Matériau Peinture	Dur Fibreux Effritable Effritable	Blanc Blanc Jaune Rouge	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528795

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_465 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 847	1 2	Peinture Joint	Effritable Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	3	Colle	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528796

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_466 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre Vol 625	1 2 3 4	Peinture Toile Enduit Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable Effritable	Blanc Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528797

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_467 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 625	1 2	Peinture Faux plafond	Effritable Fibreux Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528798

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_468 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 859	1	Revêtement	Dur	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528799

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_469 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 859	1	Revêtement	Dur	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Peinture Ragréage	Souple Effritable Effritable	Jaune Bleu Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6	Matériau Ciment	Effritable Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528800

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_470 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse Vol 862	1 2	Colle Revêtement	Souple Souple	Translucide Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528801

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_471 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 863	1 2 3	Colle Ragréage Matériau	Dur Fibreux Effritable Fibreux Effritable	Gris Gris Rose	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528802

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_472 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 864	1 2	Revêtement Colle	Semi-dur Fibreux Souple	Gris Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Peinture Ragréage Revêtement	Effritable Effritable Souple Fibreux	Blanc Gris Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6 7 8 9 10	Colle Revêtement Colle Matériau Matériau	Souple Souple Fibreux Souple Effritable Souple	Marron Beige Orange Blanc Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	11	Matériau	Effritable Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 6. Couche 9 non dissociable analysée avec la couche 6. Couche 10 non dissociable analysée avec la couche 6.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528803

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_473 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 886	1	Moquette	Souple Fibreux	Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5	Colle Ragréage Matériau Matériau	Souple Effritable Effritable Dur	Jaune Gris Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6 7 8 9	Ragréage Matériau Béton Ciment	Effritable Effritable Dur Dur	Beige Marron Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 6. Couche 9 non dissociable analysée avec la couche 6.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528804

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_474 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 886	1 2	Peinture Faux plafond	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528805

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_475 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 881	1	Revêtement	Semi-dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5	Colle Ragréage Colle Ragréage	Souple Effritable Souple Effritable	Jaune Rose Marron Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528806

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_476 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 876	1	Colle	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528807

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_477 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 876	1 2 3	Colle Carton Peinture	Dur Fibreux Souple Fibreux Effritable	Blanc Marron Vert	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528808

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_478 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 876	1	Colle	Dur Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Peinture Carton Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable	Vert Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528809

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_479 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 908	1	Revêtement	Semi-dur Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5 6 7	Colle Ragréage Matériau Matériau Colle Ragréage	Souple Effritable Souple Effritable Souple Effritable	Jaune Gris Beige Gris Marron Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528810

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_480 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons Vol 893	1 2	Peinture Matériau	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528811

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_481 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 893	1	Joint	Souple	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5 6	Colle Ragréage Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable Effritable	Jaune Rose Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528812

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_482 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 891	1 2	Peinture Revêtement	Effritable Semi-dur Fibreux	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5 6	Colle Ragréage Peinture Ragréage	Souple Effritable Effritable Effritable	Jaune Gris Bleu Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	7 8	Ciment Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 7.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528813

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_483 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 915 (B211)	1 2 5	Peinture Revêtement Joint	Effritable Fibreux Semi-dur Souple	Blanc Multicolore Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6 7 8	Peinture Revêtement Colle	Effritable Souple Souple	Beige Marron Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 6.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528814

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_484 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 917	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528815

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_485 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 918	1 2	Peinture Revêtement	Effritable Semi-dur Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Ragréage	Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528816

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_486 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 922	1 2 3	Revêtement Colle Toile	Semi-dur Souple Fibreux Souple	Vert Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5	Ragréage Matériau	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528817

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_489 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 724 (B102)	1 2 3	Revêtement Colle Toile	Semi-dur Souple Fibreux Souple	Vert Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Ragréage	Effritable	Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528818

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_490 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 725	1 2	Peinture Joint	Effritable Souple	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Revêtement Colle Toile	Semi-dur Souple Fibreux Souple	Marron Vert Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528819

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_491 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 728	1 2 3 4	Matériau Revêtement Colle Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux Souple	Gris Bleu Vert Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
	5 6	Ragréage Matériau	Effritable Effritable	Rose Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528820

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_492 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 730	1 2 3 4	Matériau Revêtement Colle Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux Souple	Blanc Marron Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6 7	Ragréage Ciment Matériau	Effritable Effritable Effritable	Gris Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528821

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_493 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 732	1 2	Matériau Revêtement	Souple Semi-dur	Jaune Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5 6	Colle Ragréage Ciment Matériau	Souple Effritable Effritable Effritable	Gris Gris Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528822

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_494 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 735	1	Matériau	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Souple	Bleu				
	3	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Détecté : Chrysotile
	4	Revêtement	Dur	Marron				
	5	Colle	Souple	Marron				
	6	Ragréage	Effritable Fibreux	Gris				
	7	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528823

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_495 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 733	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune				
	3	Ragréage	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528824

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_496 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 781 (B114)	1	Matériau	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur	Gris				
	3	Colle	Souple	Jaune				
	4	Toile	Fibreux Souple	Beige				
	5	Ragréage	Effritable	Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528825

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_497 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 780 (B112)	1	Matériau	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Beige				
	3	Revêtement	Semi-dur	Gris				
	4	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Ragréage	Effritable	Gris				
	6	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528826

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_498 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 736	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur	Vert				
	3	Colle	Souple	Jaune				
	4	Toile	Fibreux Souple	Beige				
	5	Ragréage	Effritable	Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6	Ragréage	Effritable Fibreux	Gris				
	7	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528827

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_499 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 734	1 2 3 4	Peinture Revêtement Colle Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux Souple	Blanc Marron Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528828

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_500 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 783	1 2 3	Revêtement Colle Toile	Semi-dur Souple Fibreux Souple	Gris Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Ragréage Matériau Matériau	Effritable Fibreux Effritable Effritable	Gris Blanc Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528829

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_501 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 788	1 2 3 4	Matériau Revêtement Colle Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux Souple	Gris Vert Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6	Ragréage Matériau	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528830

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_502 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 955	1	Revêtement	Souple Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Matériau Ciment Matériau	Effritable Effritable Effritable	Noir Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528831

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_503 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 953	1 2 3	Revêtement Colle Toile	Semi-dur Souple Souple Fibreux	Bleu Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté
	4	Ragréage	Effritable	Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6	Ciment Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528832

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_504 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 938	1	Revêtement	Semi-dur	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528833

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_505 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 932	1 2	Matériau Revêtement	Effritable Semi-dur	Blanc Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528834

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_506 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 932	1 2 3	Colle Matériau Ciment	Souple Effritable Dur	Marron Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528835

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_507 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 939	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Ciment Matériau	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528836

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_508 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Sous-couches des tissus muraux Vol 927	1 2 3	Colle Enduit Ciment	Souple Effritable Effritable	Jaune Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528837

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_509 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 944	1 2 3	Colle Matériau Ragréage	Souple Effritable Effritable	Marron Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528838

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_510 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 895	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur	Beige				
	3	Toile	Souple Fibreux	Beige				
	4	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Ragréage	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528839

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_511 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 899	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur	Orange				
	3	Toile	Souple Fibreux	Beige				
	4	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Ragréage	Effritable	Gris				
	6	Colle	Souple	Marron				
	7	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528840

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_512 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 912	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur	Gris				
	3	Toile	Souple Fibreux	Beige				
	4	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
	5	Peinture	Effritable	Blanc				
	6	Ragréage	Dur Fibreux	Gris				
	7	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528841

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_513 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 1369	1	Moquette	Souple Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Ragréage	Effritable	Gris				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528842

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_514 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 1371	1	Moquette	Souple Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc				
	3	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	4	Matériau	Effritable	Rose				
	5	Ragréage	Effritable	Gris				
	6	Ciment	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528843

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_515 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1365	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Translucide				
	3	Revêtement	Semi-dur	Bleu				
	4	Toile	Souple Fibreux	Blanc				
	5	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6	Ragréage	Effritable	Rose				
	7	Matériau	Effritable	Marron				
	8	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528844

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_516 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1364	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur	Beige				
	3	Toile	Souple Fibreux	Beige				
	4	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Ragréage	Effritable	Rose				
	6	Matériau	Effritable	Blanc				
	7	Ragréage	Effritable	Gris				
	8	Matériau	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528845

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_517 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 913 (Bureaux 16)	1	Matériau	Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur	Marron				
	3	Colle	Souple	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Matériau	Effritable	Blanc				
	5	Ragréage	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528846

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_518 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 920 (B204)	1	Matériau	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Matériau	Effritable	Marron Noir				
	3	Colle	Souple	Jaune				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				
	5	Ragréage	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528847

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_519 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 923 (B201)	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Matériau	Effritable	Blanc Beige				
	4	Revêtement	Souple	Marron				
	5	Colle	Souple	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6	Ragréage	Effritable	Gris				
	7	Matériau	Effritable	Beige				
	8	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	9	Joint	Souple	Blanc				
	10	Matériau	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 9 non dissociable analysée avec la couche 8. Couche 10 non dissociable analysée avec la couche 8.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528848

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_520 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 849	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528849

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_521 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 849	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Enduit	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528850

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_522 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés Vol 871	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528851

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_523 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons Vol 872	1 2 3	Peinture Carton Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528852

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_524 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Isolant intérieur Vol 872	1 2	Laine Matériau	Souple Fibreux Effritable	Vert Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528853

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_525 Parois verticales intérieures et enduits / Porte coupe-feu / Joint Vol 872	1 2	Joint Matériau	Souple Effritable	Noir Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528854

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_526 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 871	1	Joint	Souple	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Souple	Bleu				
	3	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Ragréage	Effritable	Rose				
	5	Matériau	Effritable	Blanc				
	6	Ragréage	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528855

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_527 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 451	1	Revêtement	Souple	Bleu Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Ragréage	Effritable	Gris				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				
	5	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528856

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_528 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 451	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Matériau	Effritable	Noir				
	4	Ragréage	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528857

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_529 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 868	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528858

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_530 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 949	1	Matériau	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Fibres	Souple Fibreux	Beige				
	3	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Ragréage	Effritable	Rose				
	5	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528859

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_531 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 936	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Souple	Vert				
	3	Colle	Souple	Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté
	4	Ciment	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528860

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_532 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 934	1 2 3	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Blanc Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528861

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_533 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 933	1 2	Peinture Revêtement	Effritable Souple	Beige Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528862

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_534 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 941	1 2	Colle Revêtement	Souple Semi-dur Fibreux	Marron Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Colle	Souple Effritable Souple	Beige Rose Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528863

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_535 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 942	1 2	Colle Ragréage	Souple Dur	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Dur Effritable	Marron Gris Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528864

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_536 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 926	1 2 3	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Dur	Marron Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528865

Date de réception : 24/01/2018 | **Date de préparation : 20/01/2018** | **Date d'analyse : 20/01/2018**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_537 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 946	1 2	Colle Ragréage	Souple Dur	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Dur	Marron Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528866

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_538 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1000	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528867

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_539 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1003	1 2	Revêtement Colle	Souple Souple	Beige Jaune	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
	3	Revêtement	Semi-dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Marron Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528868

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_540 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1011	1 2	Revêtement Toile	Souple Souple Fibreux	Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Dur	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Revêtement	Semi-dur	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6 7	Colle Ragréage	Souple Effritable	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	8	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528869

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_542 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1012 (B420)	1	Matériau	Effritable	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Dur Effritable	Jaune Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6 7	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Dur	Marron Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528870

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_543 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1018	1	Revêtement	Semi-dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Fibreux Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528871

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_544 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1019	1 2	Matériau Revêtement	Effritable Souple	Noir Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Dur	Jaune Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528872

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_545 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1022	1 2	Colle Revêtement	Souple Souple	Translucide Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Dur	Marron Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528873

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_546 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1024	1 2 3 4	Colle Ragréage Ragréage Ciment	Souple Dur Effritable Dur	Jaune Rose Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528874

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_547 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1026	1 2	Colle Ragréage	Souple Dur	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Dur	Marron Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528875

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_548 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1027	1 2	Colle Revêtement	Souple Semi-dur	Jaune Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Dur	Marron Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528876

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_549 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 1034	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528877

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_550 Plafond et faux-plafonds / Ouverture / Joint Vol 1034	1 2 3	Peinture Enduit Ciment	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528878

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_551 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1034	1	Revêtement	Souple	Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Matériau Ragréage	Souple Effritable Effritable	Jaune Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528879

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_552 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1033	1	Revêtement	Semi-dur	Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528880

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_553 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1032	1	Revêtement	Semi-dur	Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528881

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_554 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1373	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528882

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_555 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1070	1	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Matériau	Souple Effritable	Jaune Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Ragréage	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528883

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_556 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 1096	1	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Dur Dur	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528884

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_557 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 1096	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Plâtre	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528885

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_558 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 1096	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Beige Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528886

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_559 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 1096	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Beige Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528887

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_560 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Revêtement durs Vol 1096	1 2 3 4	Enduit Peinture Enduit Matériau	Effritable Effritable Effritable Effritable	Blanc Multicolore Beige Orange	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528888

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_561 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1098	1	Revêtement	Souple	Marron Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528889

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_562 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 1098	1	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : modifier le solvant

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528890

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_563 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1104	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Ragréage	Dur	Rose				
	3	Ragréage	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	4	Matériau	Effritable	Blanc				
	5	Ciment	Dur	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528891

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_564 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1103	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Ragréage	Dur	Gris				
	3	Matériau	Effritable	Marron				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528892

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_565 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1093	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Ragréage	Dur	Rose				
	3	Matériau	Effritable	Beige				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528893

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_566 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons Vol 1093	1	Peinture	Effritable	Violet	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Papier	Souple Fibreux	Rose				
	4	Carton	Souple Fibreux	Marron				
	5	Plâtre	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528894

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_567 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 1093	1	Peinture	Effritable	Violet	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Plâtre	Effritable	Beige				
	4	Ciment	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528895

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_568 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1091	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528896

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_569 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 1091	1 2 3	Matériau Colle Matériau	Semi-dur Souple Effritable	Multicolore Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528897

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_570 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 1091	1 2 3	Peinture Enduit Toile	Effritable Dur Fibreux Souple	Gris Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528898

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_571 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1090	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528899

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_572 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 1089	1	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528900

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 25/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_573 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 1089	1 2	Colle Plâtre	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528901

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_574 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 1055	1	Moquette	Souple Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Toile Matériau	Souple Souple Fibreux Effritable	Jaune Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528902

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_575 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1051	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Matériau Béton	Effritable Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528903

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 24/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_576 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 1050	1	Colle	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528904

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_577 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 1050	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528905

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 25/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_578 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 1050	1 2	Peinture Colle	Effritable Dur	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528906

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_579 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 1050	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528907

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_581 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 1059	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Vert Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528908

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_582 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1059	1 2 3	Matériau Ragréage Ciment	Effritable Effritable Effritable	Marron Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528909

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_583 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 1113	1 2 3	Moquette Toile Toile	Fibreux Souple Fibreux Souple Fibreux Souple	Gris Beige Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Effritable	Jaune Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528910

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_584 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1286	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Fibreux Souple	Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Fibreux Effritable	Jaune Gris Gris Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528911

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_585 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1285	1 2	Revêtement Peinture	Souple Effritable	Gris Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528912

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_586 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1274	1 2 3 4	Colle Ragréage Matériau Matériau	Souple Effritable Effritable Effritable	Jaune Gris Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528913

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_587 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1277	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528914

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_588 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1269	1 2	Revêtement Colle	Souple Souple	Gris Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Matériau Ragréage Ciment	Effritable Effritable Effritable	Marron Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528915

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 24/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_589 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1266	1	Revêtement	Fibreux Semi-dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528916

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 19/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_590 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1265	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Vert Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable Fibreux	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528917

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_591 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1284	1	Revêtement	Semi-dur	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5	Colle Ragréage Matériau Ciment	Souple Effritable Effritable Dur	Jaune Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528918

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_592 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1283	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable Fibreux	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528919

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_593 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1281	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable Fibreux	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528920

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_594 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1252	1 2 3 4	Colle Peinture Matériau Revêtement	Souple Effritable Effritable Semi-dur	Jaune Blanc Bleu Orange Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6	Colle Ragréage	Souple Effritable Fibreux	Marron Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528921

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_595 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1251	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528922

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_596 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1258	1 2	Ragréage Matériau	Effritable Effritable	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528923

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_597 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1259	1 2 3 4 5 6	Colle Ragréage Fibres Colle Matériau Ciment	Souple Effritable Souple Fibreux Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc Marron Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528924

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_598 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1244	1 2 3	Peinture Revêtement Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux	Blanc Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable Fibreux	Jaune Gris Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528925

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_599 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1243	1 2	Revêtement Peinture	Souple Fibreux Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528926

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_600 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1248	1 2 3 4	Revêtement Toile Peinture Matériau	Semi-dur Souple Fibreux Effritable Effritable	Beige Beige Orange Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6 7 8 9	Colle Ragréage Colle Matériau Ciment	Souple Effritable Fibreux Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Marron Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 9 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528927

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_601 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1289	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528928

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_602 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1290	1	Revêtement	Semi-dur	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Matériau Ciment	Souple Effritable Effritable	Marron Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528929

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_603 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1375	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5 6	Colle Ragréage Colle Ciment	Souple Effritable Souple Effritable	Beige Rose Marron Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528930

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_604 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1306	1 2	Colle Ragréage	Souple Fibreux Effritable	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528931

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_605 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1305	1 2 3	Ragréage Béton Colle	Effritable Dur Souple	Gris Gris Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528932

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_606 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1304	1 2	Colle Revêtement	Souple Semi-dur	Jaune Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Matériau Ragréage	Souple Effritable Effritable	Marron Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528933

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_607 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1303	1 2 3	Colle Ragréage Peinture	Souple Effritable Fibreux Effritable	Jaune Gris Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6 7	Colle Matériau Ciment	Souple Effritable Dur	Marron Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528934

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_608 Façades / Appui de fenêtre / Peinture Vol 1376 (Cour intérieure 1)	1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528935

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_609 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 1376 (Cour intérieure 1)	1	Mastic	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Joint	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528936

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_610 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 1376 (Cour intérieure 1)	1 2	Mastic Matériau	Effritable Effritable	Beige Noir	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528937

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 19/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_611 Façades / Murs / Enduit ciment Vol 1376 (Cour intérieure 1)	1 2	Enduit Papier	Effritable Souple Fibreux	Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528938

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 19/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_612 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 1375	1 2	Peinture Enduit	Effritable Effritable	Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528939

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 19/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_613 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1291	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528940

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 19/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_614 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1293	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Bleu Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528941

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 19/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_615 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1294	1 2 3	Revêtement Peinture Toile	Semi-dur Effritable Souple Fibreux	Noir Rose Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528942

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_616 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1295	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Bleu Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528943

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_617 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1296	1 2 6	Peinture Revêtement Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux	Gris Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528944

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_618 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1297	1 2 3	Peinture Revêtement Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux	Bleu Vert Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528945

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_619 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1377	1 2 3 4	Colle Ragréage Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable Effritable	Jaune Rose Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528946

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_620 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 1377	1 2 3 4 5	Peinture Papier Enduit Carton Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable Souple Fibreux Effritable	Beige Gris Blanc Beige Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528947

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_621 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 1378	1 2 3 4	Peinture Enduit Plâtre Bois	Effritable Effritable Effritable Effritable Fibreux	Gris Beige Beige Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528948

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_622 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 1302	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528949

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_623 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1300	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528950

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_624 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1325	1	Revêtement	Souple Fibreux	Beige Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Ragréage	Effritable	Rose				
	4	Ragréage	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528951

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_625 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1337	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Ragréage	Effritable	Rose				
	3	Ragréage	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528952

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_626 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1321	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Ragréage	Effritable Fibreux	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528953

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_627 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1323	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Ragréage	Effritable	Gris				
	3	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528954

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_628 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1320	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Ragréage	Effritable	Rose				
	3	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528955

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_629 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits plâtre Vol 1318	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Carton	Souple Fibreux	Marron				
	4	Plâtre	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528956

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_630 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 1309	1	Moquette	Souple Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Ragréage	Effritable	Rose				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528957

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_631 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 1172	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528958

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_632 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 1171	1	Colle	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté
	2 3	Ragréage Matériau	Effritable Effritable	Rose Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528959

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_633 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 1170	1	Colle	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté
	2 3	Ragréage Matériau	Effritable Effritable	Rose Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528960

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_634 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 1170	1 2 3 4	Colle Matériau Peinture Enduit	Dur Effritable Fibreux Effritable Effritable	Blanc Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528961

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_635 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1169	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable Fibreux	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528962

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_636 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1164 (C516)	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528963

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_637 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1166	1 2 3	Peinture Ragréage Ciment	Effritable Effritable Dur	Blanc Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528964

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_638 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 1379	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528965

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_639 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1168	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable Fibreux	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528966

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_640 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 1202	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Enduit	Dur Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528967

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_641 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1202	1 2	Ragréage Ragréage	Effritable Effritable Fibreux	Rose Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
	3	Matériau	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528968

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_642 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1212	1 2 3	Revêtement Colle Ragréage	Souple Souple Effritable	Gris Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528969

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_643 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 1212	1 2 3 4	Papier Peinture Enduit Plâtre	Souple Fibreux Effritable Effritable Effritable	Beige Beige Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528970

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_645 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1231	1 2 3	Peinture Revêtement Toile	Effritable Souple Souple Fibreux	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528971

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_646 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 1232	1 2	Colle Ciment	Dur Dur	Gris Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528972

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_647 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 1231	1 2 3	Peinture Enduit Ciment	Effritable Effritable Dur	Blanc Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528973

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_648 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 1231	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528974

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_649 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1225	1 2 3	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Fibreux Effritable	Jaune Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528975

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_650 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1224	1 2 3 4	Colle Ragréage Matériau Matériau	Souple Effritable Effritable Effritable	Jaune Rose Blanc Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528976

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 23/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_651 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1382	1 2 3 4	Colle Ragréage Colle Matériau	Souple Dur Souple Effritable	Jaune Gris Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528977

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_652 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1383	1 2	Peinture Revêtement	Effritable Semi-dur Fibreux	Blanc Gris Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528978

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_653 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1215	1 2 3	Peinture Fibres Revêtement	Effritable Souple Fibreux Souple	Blanc Translucide Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528979

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_654 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1381	1 2	Colle Revêtement	Souple Souple	Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528980

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_655 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1213	1 2 3	Peinture Colle Revêtement	Effritable Souple Semi-dur	Beige Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5	Colle Ragréage	Souple Effritable	Beige Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	6 7 8 9	Colle Ragréage Matériau Ciment	Souple Effritable Effritable Dur	Marron Gris Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 6. Couche 9 non dissociable analysée avec la couche 6.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528981

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_656 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1146 (B520b)	1	Revêtement	Semi-dur Fibreux	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528982

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_657 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1140	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur Fibreux	Beige				
	3	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Ragréage	Effritable	Gris				
	5	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528983

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_658 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1138	1	Matériau	Effritable	Translucide	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur Fibreux	Bleu				
	3	Toile	Souple Fibreux	Translucide				
	4	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Matériau	Semi-dur	Gris				
	6	Colle	Souple	Beige				
	7	Ragréage	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528984

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_660 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1137	1	Revêtement	Semi-dur Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Toile	Souple Fibreux	Translucide				
	3	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Ragréage	Effritable	Rose				
	5	Colle	Souple	Beige				
	6	Ragréage	Effritable	Gris				
	7	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528985

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_661 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1127	1	Revêtement	Semi-dur Fibreux	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Ragréage	Effritable	Rose				
	4	Colle	Souple	Beige				
	5	Ragréage	Effritable	Gris				
	6	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528986

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_662 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1128 (B513)	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Matériau	Effritable	Marron				
	4	Ragréage	Effritable	Gris				
	5	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528987

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_663 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés Vol 1128 (B513)	1	Enduit	Effritable	Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528988

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_664 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés Vol 1128 (B513)	1 2 3	Peinture Toile Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable	Beige Translucide Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528989

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_665 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1123 (B505)	1 2 3 4	Peinture Colle Ragréage Matériau	Effritable Souple Effritable Effritable	Blanc Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528990

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_666 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Sous-couches des tissus muraux Vol 1123 (B505)	1 2 3 4	Peinture Toile Papier Enduit	Effritable Souple Fibreux Souple Fibreux Effritable	Blanc Translucide Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528991

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_667 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1156	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Peinture Colle Ragréage	Effritable Souple Effritable	Multicolore Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528992

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_668 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1184	1	Revêtement	Souple Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528993

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_669 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1183	1	Revêtement	Semi-dur Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Ragréage	Effritable	Rose				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528994

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 23/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_670 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits projetés Vol 1183	1	Matériau	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Blanc				
	3	Enduit	Effritable	Beige				
	4	Plâtre	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528995

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_671 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1194	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Semi-dur	Beige				
	3	Colle	Souple	Jaune				
	4	Ragréage	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528996

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_672 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés Vol 1350	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Plâtre	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528997

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_673 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage Vol 1350	1	Matériau	Effritable	Noir	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
	2	Laine	Souple Fibreux	Jaune				
	3	Tresse	Souple Fibreux	Beige				
	4	Tresse	Souple Fibreux	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528998

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_674 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits projetés Vol 1350	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Beige				
	3	Plâtre	Dur	Blanc				
	4	Matériau	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00528999

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_675 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés Vol 1350	1 2 3 4	Peinture Enduit Enduit Ciment	Effritable Effritable Effritable Effritable	Beige Blanc Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529000

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_676 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 1350	1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529001

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_677 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint Vol 1350	1 2	Peinture Joint	Effritable Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529002

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_678 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre Vol 1069	1 2 3	Peinture Plâtre Matériau	Effritable Effritable Effritable	Multicolore Blanc Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529003

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_679 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre Vol 1344	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Multicolore Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529004

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_680 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés Vol 1344	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Multicolore Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529005

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_681 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés Vol 1344	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Multicolore Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529006

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_682 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 1344	1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529007

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_684 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre Vol 1085	1 2 3	Peinture Plâtre Matériau	Effritable Effritable Effritable	Multicolore Blanc Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529008

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_685 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Joint entre éléments Vol 1385	1 2	Peinture Joint	Effritable Dur	Multicolore Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529009

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_686 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1308	1 2 3	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Marron Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529010

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_687 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1308	1 2 3	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529011

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_688 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre Vol 1308	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529012

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_689 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 1308	1 2 3 4	Peinture Enduit Plâtre Fibres	Effritable Effritable Effritable Souple Fibreux	Multicolore Beige Blanc Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529013

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_690 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 1308	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Beige Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529014

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_691 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre Vol 1037	1 2 3 4	Peinture Enduit Plâtre Bois	Effritable Effritable Effritable Effritable Fibreux	Blanc Beige Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529015

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_692 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 1037	1 2 3	Peinture Enduit Bois	Effritable Effritable Dur Fibreux	Beige Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529016

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_693 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 580	1 2	Peinture Enduit	Effritable Effritable Fibreux	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529017

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_694 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 580	1 2 3	Peinture Enduit Ciment	Effritable Effritable Dur	Beige Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529018

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_695 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 580	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529019

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_696 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 580	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable Fibreux	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529020

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_697 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 580	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Beige Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529021

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_699 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre Vol 353 (Palier et escalier)	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529022

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_700 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 353 (Palier et escalier)	1 2 3	Peinture Enduit Plâtre	Effritable Effritable Effritable	Beige Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529023

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_701 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 353 (Palier et escalier)	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529024

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_702 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 353 (Palier et escalier)	1 2 3	Peinture Plâtre Matériau	Effritable Effritable Souple	Beige Blanc Blanc Translucide	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529025

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_703 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint Vol 353 (Palier et escalier)	1 2 3	Peinture Enduit Ciment	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529026

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_704 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 353 (Palier et escalier)	1 2 3	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529027

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_705 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment Vol 116	1 2 3 4	Peinture Enduit Ciment Matériau	Effritable Effritable Effritable Effritable	Blanc Blanc Gris Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529028

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_706 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 116	1 2 3	Peinture Enduit Ciment	Effritable Effritable Effritable	Blanc Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529029

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_707 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 116	1 2	Peinture Ciment	Effritable Dur	Rouge Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529030

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_708 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 116	1 2	Ciment Matériau	Dur Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529031

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_709 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment Vol 129	1 2	Enduit Ciment	Effritable Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529032

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_710 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 129	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529033

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_711 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 129	1 2	Matériau Ciment	Effritable Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529034

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_712 Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment Vol 129	1 2	Matériau Ciment	Effritable Dur	Gris Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529035

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_713 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 1391 (Cour intérieure 2)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529036

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_714 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre Vol 242	1 2	Peinture Ciment	Effritable Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529037

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_715 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 242	1 2	Peinture Ciment	Effritable Dur	Blanc Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529038

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_716 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 242	1 2	Ciment Fibres	Dur Souple Fibreux	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529039

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_717 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1162	1 2 3	Peinture Revêtement Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux	Beige Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6 7	Colle Ragréage Colle Ragréage	Souple Dur Souple Effritable	Jaune Rose Marron Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529040

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_718 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1158	1 2 3	Peinture Revêtement Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux	Bleu Noir Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5	Colle Ragréage	Souple Dur	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529041

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_719 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1196	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Bleu Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Dur	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529042

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_720 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1197	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Bleu Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Dur	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529043

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_721 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1198	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Ragréage	Souple Dur Dur	Jaune Rose Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529044

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_722 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1199	1	Revêtement	Semi-dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3	Colle Ragréage	Souple Dur Fibreux	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529045

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_723 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1188	1 2	Colle Ragréage	Souple Dur	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529046

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_724 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 981	1 2	Colle Ragréage	Souple Dur	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Ragréage Ciment	Effritable Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529047

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_725 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 981	1 2 3 4 5 6	Peinture Plâtre Papier Enduit Peinture Carton	Effritable Effritable Souple Fibreux Effritable Effritable Souple Fibreux	Marron Blanc Beige Blanc Rose Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529048

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_726 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 1123 (B505)	1 2	Colle Revêtement	Souple Souple	Marron Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529049

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_727 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 1050	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Beige Noir	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529050

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_728 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 938	1 2 3	Colle Revêtement Ragréage	Souple Semi-dur Effritable	Jaune Gris Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5	Colle Ciment	Souple Dur	Marron Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529051

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_729 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 941	1 2	Colle Ragréage	Souple Effritable	Marron Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Revêtement	Souple Semi-dur	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6	Colle Ragréage	Souple Dur	Beige Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529052

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_730 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 1369	1 2 3	Peinture Revêtement Colle	Effritable Semi-dur Souple	Blanc Gris Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6 7	Ragréage Colle Ragréage Ciment	Effritable Souple Effritable Dur	Gris Marron Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529053

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_731 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 1371	1 2	Colle Revêtement	Souple Semi-dur	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529054

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_732 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 920 (B204)	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5 6	Colle Revêtement Colle Matériau	Souple Souple Souple Effritable	Jaune Marron Marron Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529055

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_733 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1199	1 2	Revêtement Fibres	Semi-dur Souple Fibreux	Bleu Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Revêtement	Souple Semi-dur	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6 7	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Marron Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529056

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_734 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1392	1 2 3 9	Peinture Revêtement Toile Tresse	Effritable Semi-dur Fibreux Souple Fibreux Souple Fibreux	Blanc Jaune Blanc Bleu Rouge	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
	4 5	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
	6 7 8	Matériau Matériau Ragréage	Effritable Effritable Effritable	Marron Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 6. Couche 9 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529057

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_735 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1292	1 2 3 4	Matériau Matériau Fibres Ciment	Effritable Effritable Souple Fibreux Dur	Beige Blanc Multicolore Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529058

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_736 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 1292	1 2 3	Colle Revêtement Toile	Souple Semi-dur Souple Fibreux	Translucide Orange Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6 7 8	Colle Revêtement Colle Ragréage Matériau	Souple Semi-dur Souple Effritable Effritable	Jaune Bleu Marron Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 8 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529059

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_737 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 790	1 2	Revêtement Toile	Semi-dur Souple Fibreux	Gris Rouge Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4	Colle Ragréage	Souple Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529060

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_738 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 786	1 2 3 4	Peinture Revêtement Colle Matériau	Effritable Semi-dur Souple Effritable	Blanc Bleu Bleu Rouge Translucide Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529061

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_739 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 712	1 2 3	Peinture Revêtement Toile	Effritable Semi-dur Souple Fibreux	Bleu Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4 5 6	Colle Matériau Ragréage	Souple Effritable Dur	Jaune Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529062

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_740 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 1123 (B505)	1 2 3	Revêtement Colle Matériau	Souple Souple Effritable	Gris Beige Jaune Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	4	Revêtement	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	5 6 7	Colle Matériau Ragréage	Souple Effritable Effritable	Marron Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529063

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_741 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 1098	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Matériau Ragréage	Souple Effritable Effritable	Jaune Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529064

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_742 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1140	1 2	Colle Revêtement	Souple Semi-dur	Marron Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Matériau Ragréage	Souple Effritable Effritable	Jaune Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529065

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_743 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 1382	1 2	Colle Revêtement	Souple Souple	Jaune Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3 4 5	Colle Matériau Ragréage	Souple Effritable Effritable	Marron Blanc Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529066

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_744 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 1212	1 2	Moquette Colle	Souple Fibreux Souple	Gris Vert Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529067

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_745 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 1070	1 2	Colle Enduit	Effritable Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529068

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_746 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 1070	1 2	Matériau Joint	Effritable Dur	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	3	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529069

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 22/01/2018 | Date d'analyse : 22/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_747 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1286	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5	Colle Matériau Ragréage Colle	Souple Effritable Effritable Souple Fibreux	Marron Orange Gris Jaune	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529070

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 25/01/2018 | Date d'analyse : 25/01/2018

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_748 Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Colle d'isolant Vol 77	1 2	Matériau Ciment	Souple Effritable	Marron Noir Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : 42PM00529071

Date de réception : 24/01/2018 | Date de préparation : 20/01/2018 | Date d'analyse : 20/01/2018


Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002KN000189-3_749 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 1034	1 2 3	Peinture Matériau Mastic	Effritable Effritable Effritable	Blanc Gris Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste

Emilie Fournie Doré



cofrac ESSAIS

Accréditation N°1-6001 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-24864 EN DATE DU 22/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT0718-24864
		Réf. Commande Client :	002KN000189-4

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)


ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14499		
Réf échantillon client : 002KN000189-4750 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 1394 (Rampe entrée)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène avec poussières		
Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14500		
Réf échantillon client : 002KN000189-4751 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint / Vol 1394 (Rampe entrée)		Description ITGA : Matériau plâtreux gris en vrac avec poussières		
Matériau plâtreux gris en vrac avec poussières	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Amélie LAURAGUAIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-24864 EN DATE DU 22/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14501		
Réf échantillon client : 002KN000189-4752 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint / Vol 1394 (Rampe entrée)		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène avec poussières		
▸ Matériau compact gris en vrac hétérogène avec poussières	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14502		
Réf échantillon client : 002KN000189-4753 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 1394 (Rampe entrée)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
▸ Matériau compact gris hétérogène	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14503		
Réf échantillon client : 002KN000189-4754 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles / Vol 1394 (Rampe entrée)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
▸ Matériau compact gris hétérogène	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14504		
Réf échantillon client : 002KN000189-4755 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles / Vol 1395 (Rampe Sortie)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène avec poussières		
▸ Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14505		
Réf échantillon client : 002KN000189-4756 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 1395 (Rampe Sortie)		Description ITGA : Matériau compact en vrac hétérogène avec poussières		
▸ Matériau compact en vrac hétérogène avec poussières	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-24864 EN DATE DU 22/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14506		
Réf échantillon client : 002KN000189-4757 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche et sous-couche / Vol 1395 (Rampe Sortie)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac hétérogène avec poussières		
▸ Matériau bitumineux noir en vrac hétérogène avec poussières	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14507		
Réf échantillon client : 002KN000189-4758 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche et sous-couche / Vol 1395 (Rampe Sortie)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières		
▸ Matériau bitumineux noir avec poussières	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14508		
Réf échantillon client : 002KN000189-4759 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 338 (B507)		Description ITGA : Matériau souple noir		
▸ Matériau souple noir	META	2	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14509		
Réf échantillon client : 002KN000189-4760 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 338 (B507)		Description ITGA : Matériau compact gris avec poussières / Peinture		
▸ Matériau compact gris avec poussières + peinture non séparable	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-24864 EN DATE DU 22/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14510		
Réf échantillon client : 002KN000189-4761 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 338 (B507)		Description ITGA : Matériau beige et gris en vrac hétérogène avec poussières / Peinture		
▸ Matériau beige et gris en vrac hétérogène avec poussières + peinture non séparable	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14511		
Réf échantillon client : 002KN000189-4762 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 936 (B 307)		Description ITGA : Matériau compact beige avec poussières / Peinture		
▸ Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14512		
Réf échantillon client : 002KN000189-4763 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 728 (B507)		Description ITGA : Matériau compact beige avec poussières / Peinture		
▸ Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14513		
Réf échantillon client : 002KN000189-4764 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 654 (Bureaux 14)		Description ITGA : Matériau compact beige avec poussières / Peinture		
▸ Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-24864 EN DATE DU 22/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14514		
Réf échantillon client : 002KN000189-4765 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage / Vol 251 (Sous-station)		Description ITGA : Matériau fibreux beige avec poussières		
▸ Matériau fibreux beige avec poussières	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14515		
Réf échantillon client : 002KN000189-4766 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 251 (Sous-station)		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières / Peinture		
▸ Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières + peinture non séparable	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT021803-14516		
Réf échantillon client : 002KN000189-4767 / Equipements divers et accessoires / Etuves / Joints / Vol 251 (Sous-station)		Description ITGA : Matériau beige en vrac hétérogène avec fibres / Peinture avec poussières		
▸ Matériau beige en vrac hétérogène avec fibres + peinture avec poussières non séparable	META	1	22/03/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0719-117734 Réf. Commande Client : 002KN000189-5

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/12/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
(2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57534		
Réf échantillon client : 002KN000189-5818 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 1410		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57535		
Réf échantillon client : 002KN000189-5819 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 1412		Description ITGA : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture en faible quantité / Ragréage gris / Matériau mousse beige		
Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Matériau mousse beige	META (2)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57536	
Réf échantillon client : 002KN000189-5820 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 1413 (P142)		Description ITGA :	Revêtement cassant orange avec couche en toile / Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité	
Revêtement cassant orange avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement cassant gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57537	
Réf échantillon client : 002KN000189-5821 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 1415		Description ITGA :	Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en vrac hétérogène	
Revêtement cassant gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57538	
Réf échantillon client : 002KN000189-5822 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1418 (Ext Sud)		Description ITGA :	Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57539	
Réf échantillon client : 002KN000189-5823 / Façades / Poteaux / Enduits Ciment / Vol 1418 (Ext Sud)		Description ITGA :	Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57540		
Réf échantillon client : 002KN000189-5824 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1418 (Ext Sud)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris		
Matériau compact gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57541		
Réf échantillon client : 002KN000189-5825 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 1391 (Cour intérieure 2)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières		
Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières	META (2)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57542		
Réf échantillon client : 002KN000189-5826 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1419		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57543		
Réf échantillon client : 002KN000189-5827 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 1420		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose en vrac / Peinture en faible quantité		
Revêtement souple gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57544		
Réf échantillon client : 002KN000189-5828 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1421 (THA8)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57545
Réf échantillon client : 002KN000189-5829 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1421 (THA8)		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57546
Réf échantillon client : 002KN000189-5830 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 96		Description ITGA :		Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune
Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune	META (2)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57547
Réf échantillon client : 002KN000189-5831 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 96		Description ITGA :		Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Ragréage rose en vrac
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57548
Réf échantillon client : 002KN000189-5832 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 96		Description ITGA :		Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57549
Réf échantillon client : 002KN000189-5833 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plancher / Vol 82		Description ITGA :		Matériau compact rouge / Ragréage gris hétérogène
Matériau compact rouge non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57550		
Réf échantillon client : 002KN000189-5834 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche / Vol 82		Description ITGA : Matériau souple noir avec couche en papier / Colle polymère jaune		
Matériau souple noir avec couche en papier + colle polymère jaune non séparable	META (2)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57551		
Réf échantillon client : 002KN000189-5835 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 83		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57552		
Réf échantillon client : 002KN000189-5836 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 1425 (C201)		Description ITGA : Revêtement cassant gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement cassant gris avec couche en toile	META (1)	2	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57553		
Réf échantillon client : 002KN000189-5837 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 909 (P202)		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en vrac / Matériau blanc en faible quantité		
Revêtement cassant gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57554		
Réf échantillon client : 002KN000189-5838 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 1427		Description ITGA : Moquette bleue / Colle polymère jaune / Revêtement cassant gris et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac		
Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable	META (2)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement cassant gris et rouge	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57555		
Réf échantillon client : 002KN000189-5839 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 1427		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Revêtement cassant rouge / Ragréage gris en faible quantité		
Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement cassant rouge + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57556		
Réf échantillon client : 002KN000189-5840 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 1427		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57557		
Réf échantillon client : 002KN000189-5841 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 792 (102)		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement cassant orange avec couche en toile / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Matériau blanc en faible quantité		
Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant orange avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57558
Réf échantillon client : 002KN000189-5842 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 739		Description ITGA :		Colle grise / Ragréage gris hétérogène
Colle grise non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57559
Réf échantillon client : 002KN000189-5843 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 739		Description ITGA :		Colle blanche / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Matériau gris en faible quantité
Colle blanche + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57560
Réf échantillon client : 002KN000189-5844 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 662 (Infirmerie 3)		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en vrac
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57561
Réf échantillon client : 002KN000189-5845 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 662 (Infirmerie 3)		Description ITGA :		Peinture / Carrelage / Colle beige
Peinture non séparable + colle beige	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57562
Réf échantillon client : 002KN000189-5846 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage / Vol 47		Description ITGA :		Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau fibreux jaune avec poussières
Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57563		
Réf échantillon client : 002KN000189-5847 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage / Vol 47		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières / Matériau en liège marron en vrac		
Matériau bitumineux noir avec poussières non séparable + matériau en liège marron en vrac non séparable	META (2)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57564		
Réf échantillon client : 002KN000189-5848 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 667 (C013)		Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc en faible quantité		
Revêtement cassant beige	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières	META (2)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57565		
Réf échantillon client : 002KN000189-5849 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 925 (THB201)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage rose en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57566		
Réf échantillon client : 002KN000189-5850 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 720 (B100)		Description ITGA : Revêtement cassant vert avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peintures multiples		
Revêtement cassant vert avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peintures multiples non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57567
Réf échantillon client : 002KN000189-5851 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 910		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57568
Réf échantillon client : 002KN000189-5852 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 910		Description ITGA :		Carrelage / Colle blanche / Peintures multiples
Carrelage	---			Non analysé
Colle blanche + peintures multiples non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57569
Réf échantillon client : 002KN000189-5853 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 704		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57570
Réf échantillon client : 002KN000189-5854 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 704		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige / Carton en faible quantité
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + carton en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57571
Réf échantillon client : 002KN000189-5855 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 700		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac / Peinture en faible quantité
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57572	
Réf échantillon client : 002KN000189-5856 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 700		Description ITGA :	Colle beige avec poussières / Ragréage gris	
Colle beige avec poussières	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Ragréage gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57573	
Réf échantillon client : 002KN000189-5857 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 948		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage gris en vrac	
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57574	
Réf échantillon client : 002KN000189-5858 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 948		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57575	
Réf échantillon client : 002KN000189-5859 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1434		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche	
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57576	
Réf échantillon client : 002KN000189-5860 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1434		Description ITGA :	Colle grise / Ragréage gris	
Colle grise	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Ragréage gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57577
Réf échantillon client : 002KN000189-5861 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1436		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage gris en vrac
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57578
Réf échantillon client : 002KN000189-5862 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1436		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en faible quantité en vrac
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en faible quantité en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57579
Réf échantillon client : 002KN000189-5863 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1438		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage gris en vrac hétérogène
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57580
Réf échantillon client : 002KN000189-5864 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 960		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage gris en vrac
Carrelage	---			Non analysé
Ragréage gris en vrac non séparable + colle grise en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57581
Réf échantillon client : 002KN000189-5865 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 987		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage rose en faible quantité
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac + ragréage rose en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117734 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57582		
Réf échantillon client : 002KN000189-5866 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 987		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57583		
Réf échantillon client : 002KN000189-5867 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 988		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0719-117735 Réf. Commande Client : 002KN000189-5

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/12/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
(2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57584		
Réf échantillon client : 002KN000189-5868 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 988		Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Carrelage	---			Non analysé
Joint cassant gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57585		
Réf échantillon client : 002KN000189-5869 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1446		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Revêtement cassant beige en faible quantité avec couche en toile		
Peinture en faible quantité	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement souple beige	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement cassant beige en faible quantité avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57586		
Réf échantillon client : 002KN000189-5870 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1446		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières / Ragréage gris / Matériau souple blanc / Peinture / Revêtement cassant beige avec couche en toile		
Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Matériau souple blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57587		
Réf échantillon client : 002KN000189-5871 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1446		Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en vrac		
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57588		
Réf échantillon client : 002KN000189-5872 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1450		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Joint cassant blanc en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Joint cassant blanc en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57589
Réf échantillon client : 002KN000189-5873 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1450		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57590
Réf échantillon client : 002KN000189-5874 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1451		Description ITGA :		Carrelage / Joint cassant blanc / Colle grise / Ragréage rose
Carrelage	---			Non analysé
Joint cassant blanc	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle grise non séparable + ragréage rose non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57591
Réf échantillon client : 002KN000189-5875 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1451		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57592
Réf échantillon client : 002KN000189-5876 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1453		Description ITGA :		Carrelage blanc / Carrelage gris / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant blanc
Carrelage blanc + carrelage gris	---			Non analysé
Colle grise en vrac hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Joint cassant blanc	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57593		
Réf échantillon client : 002KN000189-5877 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1453		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche		
Peintures multiples	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57594		
Réf échantillon client : 002KN000189-5878 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1452		Description ITGA : Carrelage blanc / Peinture / Carrelage gris / Joint cassant blanc / Colle grise en vrac		
Carrelage blanc + carrelage gris	---			Non analysé
Peinture	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Joint cassant blanc	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle grise en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57595		
Réf échantillon client : 002KN000189-5879 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1452		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche		
Peinture	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57596		
Réf échantillon client : 002KN000189-5880 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1060		Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en vrac		
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57597		
Réf échantillon client : 002KN000189-5881 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1060		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple bleu	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57598		
Réf échantillon client : 002KN000189-5882 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1087		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres		
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec fibres	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57599		
Réf échantillon client : 002KN000189-5883 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1087		Description ITGA : Revêtement cassant gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement cassant gris avec couche en toile	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57600		
Réf échantillon client : 002KN000189-5884 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1088		Description ITGA : Carrelage / Peinture / Joint cassant gris / Colle beige en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Peinture non séparable + joint cassant gris non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle beige en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57601		
Réf échantillon client : 002KN000189-5885 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1088		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige en vrac	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57602
Réf échantillon client : 002KN000189-5886 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1454		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige en vrac / Papier gris
Carrelage	---			Non analysé
• Colle beige en vrac non séparable + papier gris non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57603
Réf échantillon client : 002KN000189-5887 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1454		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac / Couche plâtreuse blanche
Carrelage	---			Non analysé
• Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57604
Réf échantillon client : 002KN000189-5888 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1455		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage gris en faible quantité en vrac
Carrelage	---			Non analysé
• Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57605
Réf échantillon client : 002KN000189-5889 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1455		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche
Carrelage	---			Non analysé
• Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57606
Réf échantillon client : 002KN000189-5890 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1165		Description ITGA :		Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragréage gris en vrac
• Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57607		
Réf échantillon client : 002KN000189-5891 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1165		Description ITGA : Peinture / Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune avec poussières		
Peinture	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement souple bleu	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières	META (2)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57608		
Réf échantillon client : 002KN000189-5892 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 1133		Description ITGA : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57609		
Réf échantillon client : 002KN000189-5893 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1133		Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose / Ragréage gris en vrac		
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57610		
Réf échantillon client : 002KN000189-5894 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1119		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage gris en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57611	
Réf échantillon client : 002KN000189-5895 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1119		Description ITGA :	Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---			Non analysé
Joint cassant gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57612	
Réf échantillon client : 002KN000189-5896 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1238		Description ITGA :	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragréage gris en vrac	
Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57613	
Réf échantillon client : 002KN000189-5897 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1238		Description ITGA :	Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57614	
Réf échantillon client : 002KN000189-5898 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1238		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Revêtement souple bleu	
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement souple bleu	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57615
Réf échantillon client : 002KN000189-5899 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1456		Description ITGA :		Carrelage en vrac / Colle grise en vrac / Ragréage gris en vrac
Carrelage en vrac	---			Non analysé
Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57616
Réf échantillon client : 002KN000189-5900 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1456		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige en vrac / Peinture en faible quantité
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57617
Réf échantillon client : 002KN000189-5901 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1457		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Ragréage gris en vrac
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac hétérogène non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57618
Réf échantillon client : 002KN000189-5902 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1457		Description ITGA :		Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche
Peinture	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57619		
Réf échantillon client : 002KN000189-5903 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1458		Description ITGA : Peinture / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose		
Peinture	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement souple beige	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57620		
Réf échantillon client : 002KN000189-5904 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1458		Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose / Matériau blanc en faible quantité		
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57621		
Réf échantillon client : 002KN000189-5905 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1459		Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris avec poussières / Colle grise hétérogène		
Carrelage	---			Non analysé
Joint cassant gris avec poussières	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle grise hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57622		
Réf échantillon client : 002KN000189-5906 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1459		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Peintures multiples	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57623	
Réf échantillon client : 002KN000189-5907 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1226		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage gris en faible quantité en vrac	
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57624	
Réf échantillon client : 002KN000189-5908 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1226		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57625	
Réf échantillon client : 002KN000189-5909 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1216		Description ITGA :	Peintures multiples / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en faible quantité en vrac	
Peintures multiples	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement souple beige	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57626	
Réf échantillon client : 002KN000189-5910 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1216		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en vrac	
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57627	
Réf échantillon client : 002KN000189-5911 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1461		Description ITGA :	Carrelage en vrac / Colle grise en vrac	
Carrelage en vrac	---			Non analysé
Colle grise en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57628	
Réf échantillon client : 002KN000189-5912 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1462		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57629	
Réf échantillon client : 002KN000189-5913 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 1463 (Local fioul)		Description ITGA :	Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57630	
Réf échantillon client : 002KN000189-5914 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1241		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Ragréage gris en vrac	
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac hétérogène non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57631	
Réf échantillon client : 002KN000189-5915 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1241		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117735 EN DATE DU 27/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57632		
Réf échantillon client : 002KN000189-5916 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1358		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac hétérogène / Ragréage beige en faible quantité en vrac		
Carrelage en vrac	---			Non analysé
Colle grise en vrac hétérogène non séparable + ragréage beige en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57633		
Réf échantillon client : 002KN000189-5917 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1358		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche		
Peinture	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0719-117733 Réf. Commande Client : 002KN000189-5

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/12/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
(2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation Réf échantillon client : 002KN000189-5768 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1406		Réf échantillon ITGA : IT071912-57484 Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau blanc en vrac		
Colle grise en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation Réf échantillon client : 002KN000189-5769 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 1407 (Esc P8)		Réf échantillon ITGA : IT071912-57485 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène avec couche en toile		
Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène avec couche en toile non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57486		
Réf échantillon client : 002KN000189-5770 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plancher / Vol 1408 (Livraison)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57487		
Réf échantillon client : 002KN000189-5771 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 1408 (Livraison)		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57488		
Réf échantillon client : 002KN000189-5772 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits plâtre / Vol 1408 (Livraison)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières		
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57489		
Réf échantillon client : 002KN000189-5773 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 1408 (Livraison)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57490		
Réf échantillon client : 002KN000189-5774 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 1408 (Livraison)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57491		
Réf échantillon client : 002KN000189-5775 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 674		Description ITGA : Colle polymère incolore avec poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
Colle polymère incolore avec poussières	META (2)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement souple beige	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57492		
Réf échantillon client : 002KN000189-5776 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 674		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57493		
Réf échantillon client : 002KN000189-5777 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)		Description ITGA : Peinture / Matériau cartonné / Couche plâtreuse blanche		
Peinture non séparable + matériau cartonné non séparable	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Couche plâtreuse blanche	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57494		
Réf échantillon client : 002KN000189-5778 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57495
Réf échantillon client : 002KN000189-5779 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)		Description ITGA :		Peinture / Matériau plâtreux blanc
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57496
Réf échantillon client : 002KN000189-5780 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)		Description ITGA :		Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57497
Réf échantillon client : 002KN000189-5781 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)		Description ITGA :		Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57498
Réf échantillon client : 002KN000189-5782 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 668 (Logement de fonction dir CROUS)		Description ITGA :		Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :		IT071912-57499
Réf échantillon client : 002KN000189-5783 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 691 (PMR009)		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en vrac
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57500		
Réf échantillon client : 002KN000189-5784 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 265 (B000)		Description ITGA : Revêtement cassant rouge avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement cassant rouge avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57501		
Réf échantillon client : 002KN000189-5785 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 265 (B000)		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57502		
Réf échantillon client : 002KN000189-5786 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 262 (B004)		Description ITGA : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57503		
Réf échantillon client : 002KN000189-5787 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 262 (B004)		Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige avec poussières		
Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57504	
Réf échantillon client : 002KN000189-5788 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 159 (S/B106)		Description ITGA :	Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige en vrac hétérogène	
Carrelage	---			Non analysé
Joint cassant gris	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle beige en vrac hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57505	
Réf échantillon client : 002KN000189-5789 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 159 (S/B106)		Description ITGA :	Peintures multiples / Carrelage / Colle grise	
Peintures multiples	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57506	
Réf échantillon client : 002KN000189-5790 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 159 (S/B106)		Description ITGA :	Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57507	
Réf échantillon client : 002KN000189-5791 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 89		Description ITGA :	Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	26/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57508	
Réf échantillon client : 002KN000189-5792 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 89		Description ITGA :	Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57509	
Réf échantillon client : 002KN000189-5793 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 128		Description ITGA :	Revêtement cassant vert avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en faible quantité	
Revêtement cassant vert avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57510	
Réf échantillon client : 002KN000189-5794 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 128		Description ITGA :	Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57511	
Réf échantillon client : 002KN000189-5795 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 128		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux bleu en vrac	
Peinture non séparable + matériau plâtreux bleu en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57512	
Réf échantillon client : 002KN000189-5796 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 128		Description ITGA :	Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57513	
Réf échantillon client : 002KN000189-5797 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plancher / Vol 100		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris	
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57514		
Réf échantillon client : 002KN000189-5798 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1409 (Parvis)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57515		
Réf échantillon client : 002KN000189-5799 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 1409 (Parvis)		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène		
Matériau gris en vrac hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57516		
Réf échantillon client : 002KN000189-5800 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 197		Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Dalle dure cassante rouge	META (2)	3	30/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57517		
Réf échantillon client : 002KN000189-5801 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 197		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57518		
Réf échantillon client : 002KN000189-5802 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 197		Description ITGA : Peintures multiples / Papier peint / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57519		
Réf échantillon client : 002KN000189-5803 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 197		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières		
Matériau cotonneux blanc avec poussières	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57520		
Réf échantillon client : 002KN000189-5804 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 198		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène		
Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57521		
Réf échantillon client : 002KN000189-5805 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 198		Description ITGA : Matériau blanc en faible quantité en vrac / Matériau compact gris hétérogène avec couche en toile		
Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57522		
Réf échantillon client : 002KN000189-5806 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 187		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac		
Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57523		
Réf échantillon client : 002KN000189-5807 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 187		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac		
Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57524	
Réf échantillon client : 002KN000189-5808 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 184		Description ITGA :	Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peintures multiples	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57525	
Réf échantillon client : 002KN000189-5809 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 185		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57526	
Réf échantillon client : 002KN000189-5810 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 187		Description ITGA :	Peinture / Matériau fibreux beige avec poussières	
Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57527	
Réf échantillon client : 002KN000189-5811 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 187		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA :	IT071912-57528	
Réf échantillon client : 002KN000189-5812 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 187		Description ITGA :	Revêtement cassant bleu avec couche en toile / Matériau souple beige avec poussières	
Revêtement cassant bleu avec couche en toile	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Matériau souple beige avec poussières	META (2)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57529		
Réf échantillon client : 002KN000189-5813 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 1411		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57530		
Réf échantillon client : 002KN000189-5814 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 1411		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris en vrac hétérogène avec poussières		
Peintures multiples	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Enduit compact gris en vrac hétérogène avec poussières	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57531		
Réf échantillon client : 002KN000189-5815 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 1411		Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige avec poussières		
Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57532		
Réf échantillon client : 002KN000189-5816 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle / Vol 1410		Description ITGA : Colle marron en vrac / Matériau fibreux beige		
Colle marron en vrac	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Matériau fibreux beige	META (1)	1	27/12/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : EPAURIF_Université_Paris-Dauphine_Réhabilitation Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Université Paris-Dauphine - Réhabilitation		Réf échantillon ITGA : IT071912-57533		
Réf échantillon client : 002KN000189-5817 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Fibralith (colle) / Vol 1410		Description ITGA : Matériau beige avec poussières / Matériau gris / Bois en faible quantité en vrac		
Matériau beige avec poussières non séparable + matériau gris non séparable + bois en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	27/12/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-117733 EN DATE DU 30/12/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ANNEXE: DOCUMENTS

QBE

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties
Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

NTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages corporels*	6,000,000 € par *Sinistre*
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par *Année d'assurance*
2. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	750,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15 000 € par *Sinistre*
4. *Dommages immatériels non consécutifs*	150,000 € par *Sinistre*
5. *Atteintes à l'environnement*	400,000 € par *Année d'assurance*
RC PROFESSIONNELLE/ RC PRODUITS LIVRES	
Tous dommages confondus Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs confondus Dont	1 500,000 € par *Année d'assurance*
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs confondus trouvant sur origine dans une erreur de diagnostic	350 000 € par sinistre

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 21 Décembre 2018

QBE Insurance (Europe) Limited
Direction Régionale Grand Sud-Est
1 boulevard Vivier Merle
69443 LYON CEDEX 03
Gestion des polices : 04 26 83 82 76

Page 3 / 3

Assurance 3/3

QBE

- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat
- Diagnostiques d'assainissement collectif et individuel .
- Diagnostic d'accessibilité Handicapés

Ainsi que toute activité accessoire non aggravante directement liée à l'activité principale

Et à l'exclusion de tout diagnostic :

- Relatif à une étude concernant la pollution des sol
- Relatif à la détection de légionnelle effectuée dans des établissements de soins, des maisons de retraite, des établissements scolaires et parascolaires.

Page 2 / 3

Assurance 2/3

GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier ».

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT siret 441 355 914 00298 né à Savigny-Sur-Orges le 02/03/1977, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2° et 3° de l'article L.271-4, à savoir :

AMIANTE - PLOMB - TERMITES - DPE - GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT en la personne de Denis MORA est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : les personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle QBE N°AM895928 renouvelable avec tacite reconduction de la SAS AC ENVIRONNEMENT répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2019

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Attestation sur l'honneur

QBE

QBE Insurance (Europe) Limited
Cœur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex
Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90
www.QBEIurope.com

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Cœur Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
SIREN N° 441 355 914
64 rue Clément Ader – 42153 RIORGES
Unités techniques : Amiante – Riorges
Accréditation N° 1-6001 rév 1 valable jusqu'au 31/08/2019

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° **031 0004725**
- à effet du **01/12/2014**
- période de validité de la présente attestation : **du 01/01/2019 au 31/12/2019**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers réglementés ou non réglementés:
  - Plomb y compris avant travaux ou démolition
  - Amiante y compris avant travaux ou démolition
  - Parasitaires
  - Installation de gaz
  - Installation intérieur électricité
  - Risques naturels et technologiques (ERNT)
  - Performances énergétiques DPE
  - Contrôle des installations d'assainissement non collectif
  - Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
  - Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
  - Mesurage loi « Carrez »
  - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan métré
  - Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
  - Mesure du radon dans les bâtiments
  - Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
  - Loi SRU, certificat de logement décent
  - Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
  - Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments
  - Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée

QBE Insurance (Europe) Limited est une entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou encaissés en France, inscrite sur le RCS de Nanterre sous le numéro B 414 108 001. Son siège social est situé Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni.
QBE Insurance (Europe) Limited est une société de droit anglais au capital de GBP 160 000 000.
QBE Insurance (Europe) Limited est membre du QBE European Operations, division du QBE Insurance Group.
QBE Insurance (Europe) Limited est autorisée par la Prudential Regulation Authority et est régie par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni.
Elle est immatriculée en Angleterre sous le n° 1741561.

Page 1 / 3

Assurance 1/3

ANNEXE: DOCUMENTS



SOCOTEC
CERTIFICATION INTERNATIONAL

CERTIFICAT

N° DTI / 1812-003

Certifie par la présente que :

Naïm CHAMLAL

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	20/12/2018	19/12/2023
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	14/12/2018	13/12/2023

Directeur Opérationnel : Guillaume Rey

cofrac

SOCOTEC – 1 Rue René Anjolvy – 94250 GENTILLY - DTI 1812-003
