APAVE
AGENCE DE ROUEN

2 rue des Mouettes CS 90098
76132 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
N° SIRET : 90386907101236

DONNEUR D'ORDRE
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
CONTACT : M BAUDEL

Pré Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents
Le présent document constitue un pré-rapport correspondant à une 1ère étape de repérage



Numéro d'offre **:**
Numéro de contrat :
Numéro de rapport (n° de tâche) **: T251302716**
Date : **10/09/2025**

Lieu d'intervention :

BATIMENT 412 Ancien Lacan
4 rue PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

Destinataire rapport :
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

Date d'intervention :
Du **24/07/2025** au **25/07/2025**

Intervenant : **Monsieur Baptiste BEAUFILS**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 280 pages

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	**BATIMENT 412 Ancien Lacan** **4 rue PAUL ELUARD** **76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN**	Référence Cadastrale : Date du Permis de Construire :	**Non communiqué** **Antérieur au 1er juillet 1997**
Nature du bâtiment :	**ERP**		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	**CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY**
Adresse :	**4 RUE PAUL ELUARD** **76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN**
Qualité :	Donneur d'ordre

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom:	**CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY**
Adresse :	**4 RUE PAUL ELUARD** **76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	**BEAUFILS Baptiste**	Laboratoire d'Analyses :	**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**
N° certificat de qualification :	**19-1453**	Adresse laboratoire :	**ZI de Petite Synthe Bâtiment B1 1294 rue Achille Peres , Z.I. de Petite Synthe 59640 Dunkerque**
Date d'obtention :	**05/03/2020**	Numéro d'accréditation :	**1-1935**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	**ABCIDIA CERTIFICATION**	Organisme d'assurance professionnelle :	**AXA FRANCE IARD**
		Adresse assurance :	**313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX**
Date de la commande :	**20/08/2025**	N° de contrat d'assurance :	**10800807204**
Accompagnateur :	**M BAUDEL**	Date de validité :	**31/12/2025**

1.4 SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Nom du diagnostiqueur : **BEAUFILS Baptiste**
AGENCE DE ROUEN 2 rue des Mouettes CS 90098 76132 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
Signature de l'opérateur



DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Lieu et date d'établissement du rapport

Fait à **MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX** le **10/09/2025**

2 CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré à ce stade de la mission des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission objet du présent rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES **2**
DESIGNATION DU BATIMENT 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 2
EXÉCUTION DE LA MISSION 2
SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 2

CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT **2**

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **4**
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 19

INVESTIGATIONS NON REALISEES **38**
LOCAUX NON VISITES / MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE 38
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE 38

PRECONISATIONS **38**

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION **39**
OBJECTIF 39
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 39
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 39

PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION **40**
PROGRAMME DE DEMOLITION 40
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE 40

RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) **44**

ANNEXE CROQUIS **45**

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION **56**

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES **109**

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES **134**

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE **142**

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE **165**

ANNEXE AUTRES DOCUMENTS **167**

3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

3.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Entrée	Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S343	Z017
RDC	Degagement 1	Revêtements de plafond	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P042)	S042	Z019
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S195	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S342	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
RDC	Bureau n°1	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S194	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S341	Z017
RDC	Bureau n°2	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S196	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S340	Z017
RDC	Bureau n°3	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040)	S040	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S339	Z017
RDC	Chambre n°1	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P019)	S019	Z010
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S197	Z034

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S338	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P020)	S020	Z010
RDC	Salle de sejour n°1	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S198	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S337	Z017
RDC	Chambre n°2	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S199	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S336	Z017
RDC	Salle a manger n°1	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S200	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S335	Z017
RDC	Infirmerie n°1	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S102	Z013
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S201	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S334	Z017
RDC	Office n°1	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S103	Z013
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S115	Z015
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S202	Z034

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S333	Z017
RDC	Sanitaire n°1	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S203	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S332	Z017
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027)	S027	Z013
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P028)	S028	Z013
RDC	Sanitaire n°2	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S098	Z013
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S204	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S331	Z017
RDC	Chambre n°3	Revêtement de sol	Linoeum + colle	Résultat d'analyse (P007)	S007	Z004
		Revêtement de sol	Linoeum + colle	Résultat d'analyse (P008)	S008	Z004
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S205	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S330	Z017
RDC	Chambre n°4	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S206	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S329	Z017
RDC	lingerie	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S207	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S328	Z017

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Cage d'escalier n°1	Sous face d'escalier	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P047)	S047	Z020
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S303	Z017
RDC	Bureau n°4	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S208	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S327	Z017
RDC	Vestiaires	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S209	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S326	Z017
RDC	Degagement n°1	Revêtements de plafond	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P044)	S044	Z019
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S210	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
RDC	Bureau n°5	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S211	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S325	Z017
RDC	Bureau n°6	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S212	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S324	Z017
RDC	Bureau n°7	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S213	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S323	Z017
RDC	Bureau n°8	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S214	Z034

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S322	Z017
RDC	Bureau n°9	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S215	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S321	Z017
RDC	Bureau n°10	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S216	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S320	Z017
RDC	Sanitaire n°3	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S099	Z013
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S114	Z015
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S217	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S319	Z017
RDC	Cage d'escalier entree	Sous face d'escalier	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P046)	S046	Z020
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S302	Z017
RDC	Ascenseur n°1	Revêtement de sol	Linoeum + colle	Résultat d'analyse (P023)	S023	Z012
RDC	Degagement n°2	Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035)	S035	Z017
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P036)	S036	Z017
		Revêtements de plafond	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P041)	S041	Z019
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Bureau n°11	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S218	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S318	Z017
RDC	Bureau n°12	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S219	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S317	Z017
RDC	Atelier n°1	Revêtements de plafond	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P043)	S043	Z019
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S220	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S316	Z017
RDC	Atelier n°2	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S221	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S315	Z017
RDC	Atelier n°3	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S222	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S314	Z017
RDC	Sanitaire n°4	Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S113	Z015

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S125	Z013
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S223	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S313	Z017
RDC	Sanitaire n°5	Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S112	Z015
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S124	Z013
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S224	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S312	Z017
RDC	Office n°2	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S100	Z013
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S111	Z015
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S225	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S311	Z017
RDC	Atelier n°4	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S226	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S310	Z017
RDC	Atelier n°5	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S227	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S309	Z017

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Atelier n°6	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S228	Z034
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S306	Z017
RDC	Lingerie n°1	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S229	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S305	Z017
RDC	Cage d'escalier n°2	Sous face d'escalier	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P045)	S045	Z020
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S304	Z017
1er Etage	Bureau n°13	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S262	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S374	Z017
1er Etage	Office n°3	Revêtement de sol	Linoeum+colle	Résultat d'analyse (P051)	S051	Z035
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S123	Z015
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S261	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S373	Z017
1er Etage	Chambre n°5	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S260	Z034
		Revêtement de sol	Linoeum+colle	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S300	Z021
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S372	Z017

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
1er Etage	Chambre n°6	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S259	Z034
		Revêtement de sol	Linoeum+colle	Résultat d'analyse (P048 - idem)	S301	Z021
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S371	Z017
1er Etage	Salle de sejour n°2	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S258	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S370	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Chambre n°7	Revêtement de sol	Linoeum+colle	Résultat d'analyse (P048)	S048	Z021
		Revêtement de sol	Linoeum+colle	Résultat d'analyse (P049)	S049	Z021
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S257	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S369	Z017
1er Etage	Chambre n°8	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S256	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S368	Z017
1er Etage	Infirmerie n°2	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S255	Z034
1er Etage	SDB	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S110	Z013
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S122	Z015
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S254	Z034

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S367	Z017
1er Etage	Sanitaire n°6	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S109	Z013
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S121	Z015
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S253	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S366	Z017
1er Etage	Sanitaire n°7	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S108	Z013
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S120	Z015
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S252	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S365	Z017
1er Etage	Chambre	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S251	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S364	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Chambre n°9	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S250	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S363	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Lingerie n°2	Conduit de ventilation	Fibro ciment	Résultat d'analyse (P069)	S069	Z023
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S249	Z034

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S362	Z017
1er Etage	Degagement n°3	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S248	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S361	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Lingerie n°3	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S247	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S360	Z017
1er Etage	Vestiaire	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S246	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S359	Z017
1er Etage	Lingerie n°4	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S245	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S358	Z017
1er Etage	Salle a manger n°2	Revêtements de plafond	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P066)	S066	Z019
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S244	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S357	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Office n°4	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S105	Z013
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S119	Z015
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S243	Z034

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S356	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Bureau n°14	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S242	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S355	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Salle de sejour n°3	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S241	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S354	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Chambre n°10	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S240	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S353	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Bureau n°15	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S239	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S352	Z017
1er Etage	Sanitaire n°8	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S104	Z013
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S118	Z015
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S238	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S351	Z017

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
1er Etage	Chambre n°11	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S237	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S350	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Sanitaire n°9	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S107	Z013
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S117	Z015
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S236	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S349	Z017
1er Etage	Sanitaire n°10	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S106	Z013
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S116	Z015
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S235	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S348	Z017
1er Etage	Chambre n°12	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S234	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S347	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Chambre n°13	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S233	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S346	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
1er Etage	Chambre n°14	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S232	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S345	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	Document consulté		
1er Etage	Lingerie n°5	Conduit de ventilation	Fibro ciment	Résultat d'analyse (P068)	S068	Z023
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S231	Z034
		Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S344	Z017
Sous-sol	Local technique n°1	Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S390	Z017
Sous-sol	Degagement n°4	Conduit de ventilation	Fibro ciment	Résultat d'analyse (P068 - idem)	S389	Z023
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S393	Z034
Sous-sol	Sous station	Conduit de fluide	Joint de bride	Document consulté		
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S394	Z034
Sous-sol	Local technique n°2	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S395	Z034
Sous-sol	Local technique n°3	Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S396	Z034
Extérieur	Toiture 1	Etanchéité de toiture terrasse	Bandes bitumineuses	Résultat d'analyse (P091)	S091	Z037
Extérieur	Façades	Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P092)	S092	Z031
RDC	WC	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S101	Z013
		Cloisons	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S230	Z034

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P031)	S031	Z015
		Revêtement de murs	Colle de faience	Résultat d'analyse (P032)	S032	Z015
Sous-sol	Escalier	Murs de refend	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S391	Z017
		Sous face d'escalier	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P045 - idem)	S392	Z020
Extérieur	Machinerie	Materiel en machinerie	Garniture de friction	Document consulté		

3.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Entrée	Plancher	Chappe ciment	**Résultat d'analyse (P021)**	S021	Z011
		Plancher	Chappe ciment	**Résultat d'analyse (P022)**	S022	Z011
RDC	Degagement 1	Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S192	Z018
RDC	Bureau n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S156	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S193	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Bureau n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S157	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S263	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Bureau n°3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S158	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S264	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Chambre n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S159	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S265	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Salle de sejour n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S160	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S266	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Chambre n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S161	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S267	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Salle a manger n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S162	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S268	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Infirmerie n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S163	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S269	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Office n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S164	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S270	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Sanitaire n°1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001)**	S001	Z001
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S165	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S271	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P002)**	S002	Z001
		Revêtement de sol douche	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P003)**	S003	Z002
		Revêtement de sol douche	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P004)**	S004	Z002
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	**Résultat d'analyse (P029)**	S029	Z014
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	**Résultat d'analyse (P030)**	S030	Z014
		Revêtement de murs	Colle de faïence	**Résultat d'analyse (P033)**	S033	Z016
		Revêtement de murs	Colle de faïence	**Résultat d'analyse (P034)**	S034	Z016
RDC	Sanitaire n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S166	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S272	Z018
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S375	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Chambre n°3	Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P038)**	S038	Z018
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S167	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S273	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Chambre n°4	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S168	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S274	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	lingerie	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S169	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S275	Z018
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S376	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Bureau n°4	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S170	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S276	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Vestiaires	Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S277	Z018

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Bureau n°5	Revêtement de sol	Linoeum + colle	**Résultat d'analyse (P009)**	S009	Z005
		Revêtement de sol	Linoeum + colle	**Résultat d'analyse (P010)**	S010	Z005
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S171	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S278	Z018
RDC	Bureau n°6	Revêtement de sol	Moquette + colle	**Résultat d'analyse (P011)**	S011	Z006
		Revêtement de sol	Moquette + colle	**Résultat d'analyse (P012)**	S012	Z006
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S172	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S279	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Bureau n°7	Revêtement de sol	Moquette + colle	**Résultat d'analyse (P013)**	S013	Z007
		Revêtement de sol	Moquette + colle	**Résultat d'analyse (P014)**	S014	Z007
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S173	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S280	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Bureau n°8	Revêtement de sol	Moquette + colle	**Résultat d'analyse (P015)**	S015	Z008
		Revêtement de sol	Moquette + colle	**Résultat d'analyse (P016)**	S016	Z008

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S174	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S281	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Bureau n°9	Revêtement de sol	Moquette + colle	**Résultat d'analyse (P017)**	S017	Z009
		Revêtement de sol	Moquette + colle	**Résultat d'analyse (P018)**	S018	Z009
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S175	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S282	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Bureau n°10	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S176	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S283	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
		Revêtement de sol	Linoeum + colle	**Résultat d'analyse (P009 - idem)**	S397	Z005
RDC	Sanitaire n°3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S177	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S284	Z018
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S377	Z001

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Cage d'escalier entree	Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S285	Z018
RDC	Ascenseur n°1	Revêtement de sol	Linoeum + colle	**Résultat d'analyse (P024)**	S024	Z038
RDC	Degagement n°2	Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037)**	S037	Z018
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S178	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S286	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Bureau n°11	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S179	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S287	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Bureau n°12	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S180	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S288	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Atelier n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S181	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S289	Z018

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Atelier n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S182	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S290	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Atelier n°3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S183	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S291	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Sanitaire n°4	Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P026)**	S026	Z002
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S184	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S292	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Sanitaire n°5	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S185	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S293	Z018
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S378	Z001

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Office n°2	Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P025)**	S025	Z002
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S186	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S294	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Atelier n°4	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S187	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S295	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Atelier n°5	Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P039)**	S039	Z018
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S188	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S296	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Atelier n°6	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S189	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S297	Z018

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
RDC	Lingerie n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S190	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S298	Z018
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S379	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Bureau n°13	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S126	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Office n°3	Revêtement de sol	Linoeum+colle	**Résultat d'analyse (P050)**	S050	Z022
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S127	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Chambre n°5	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S128	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Chambre n°6	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S129	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
1er Etage	Salle de sejour n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S130	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Chambre n°7	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S131	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Chambre n°8	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S132	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Infirmerie n°2	Revêtement de murs	Colle de faïence	**Résultat d'analyse (P058)**	S058	Z042
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S133	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	SDB	Revêtement de murs	Colle de faïence	**Résultat d'analyse (P059)**	S059	Z042
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S134	
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S380	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Sanitaire n°6	Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P052)**	S052	Z003
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S135	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P053)**	S053	Z003
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	**Résultat d'analyse (P054)**	S054	Z043
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	**Résultat d'analyse (P055)**	S055	Z043
		Revêtement de murs	Colle de faïence	**Résultat d'analyse (P060)**	S060	Z016
1er Etage	Sanitaire n°7	Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P056)**	S056	Z001
		Revêtement de murs	Colle de faïence	**Résultat d'analyse (P061)**	S061	Z016
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S136	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P057)**	S057	Z001
1er Etage	Chambre	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S137	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Chambre n°9	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S138	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Lingerie n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S139	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S388	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Degagement n°3	Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P062)**	S062	Z018
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Lingerie n°3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S140	
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S387	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Vestiaire	Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Lingerie n°4	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S141	
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S386	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Salle a manger n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S142	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Office n°4	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S143	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Bureau n°14	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S144	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Salle de sejour n°3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S145	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Chambre n°10	Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P063)**	S063	Z018
		Murs de refend	Enduit ciment	**Résultat d'analyse (P065)**	S065	Z039
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S146	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Bureau n°15	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S147	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Sanitaire n°8	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S148	
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S381	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
1er Etage	Chambre n°11	Murs de refend	Enduit ciment	**Résultat d'analyse (P064)**	S064	Z040
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S149	
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S382	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Sanitaire n°9	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S150	
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S383	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Sanitaire n°10	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S151	
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S384	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Chambre n°12	Revêtements de plafond	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P067)**	S067	Z041
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S152	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Chambre n°13	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S153	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
1er Etage	Chambre n°14	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S154	
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
1er Etage	Lingerie n°5	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S155	
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001 - idem)**	S385	Z001
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
Sous-sol	Local technique n°1	Cloisons	Enduit Platre	**Résultat d'analyse (P070)**	S070	Z024
		Cloisons	Enduit Platre	**Résultat d'analyse (P071)**	S071	Z024
		Conduit de fluide	Calorifugeage	**Document consulté**		
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	**Document consulté**		
Sous-sol	Degagement n°4	Plancher	Chappe ciment	**Résultat d'analyse (P072)**	S072	Z011
		Plancher	Chappe ciment	**Résultat d'analyse (P073)**	S073	Z011
		Conduit de fluide	Calorifugeage	**Document consulté**		
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	**Document consulté**		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
Sous-sol	Sous station	Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
		Conduit de fluide	Calorifugeage	**Document consulté**		
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	**Document consulté**		
Sous-sol	Local technique n°2	Conduit de fluide	Calorifugeage	**Document consulté**		
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	**Document consulté**		
Sous-sol	Local technique n°3	Conduit de fluide	Calorifugeage	**Document consulté**		
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	**Document consulté**		
Extérieur	Toiture 1	Releve d'etancheité	Bandes bitumineuses	**Résultat d'analyse (P088)**	S088	Z029
		Releve d'etancheité	Bandes bitumineuses	**Résultat d'analyse (P089)**	S089	Z029
		Etanchéité de toiture terrasse	Bandes bitumineuses	**Résultat d'analyse (P090)**	S090	Z030
Extérieur	Façades	Revêtement de murs	Colle de faïence	**Résultat d'analyse (P076)**	S076	Z026
		Revêtement de murs	Enduit de façades	**Résultat d'analyse (P080)**	S080	Z027
		Revêtement de murs	Enduit de façades	**Résultat d'analyse (P081)**	S081	Z027
		Revêtement de murs	Enduit de façades	**Résultat d'analyse (P082)**	S082	Z027

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtement de murs	Enduit de façades	**Résultat d'analyse (P083)**	S083	Z027
		Soubassement	Enduit ciment	**Résultat d'analyse (P084)**	S084	Z028
		Soubassement	Enduit ciment	**Résultat d'analyse (P085)**	S085	Z028
		Soubassement	Enduit ciment	**Résultat d'analyse (P086)**	S086	Z028
		Soubassement	Enduit ciment	**Résultat d'analyse (P087)**	S087	Z028
		Revêtement de murs	Colle de faïence	**Résultat d'analyse (P077)**	S077	Z026
		Revêtement de murs	Colle de faïence	**Résultat d'analyse (P078)**	S078	Z026
		Revêtement de murs	Colle de faïence	**Résultat d'analyse (P079)**	S079	Z026
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	**Résultat d'analyse (P093)**	S093	Z036
		Etancheité de casquette	Bandes bitumineuses	**Résultat d'analyse (P094)**	S094	Z032
		Etancheité de casquette	Bandes bitumineuses	**Résultat d'analyse (P095)**	S095	Z032
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Résultat d'analyse (P096)**	S096	Z033
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Résultat d'analyse (P097)**	S097	Z033
RDC	WC	Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P005)**	S005	Z003
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Document consulté**	S191	
		Cloisons	Enduit Ciment	**Résultat d'analyse (P037 - idem)**	S299	Z018

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtements de plafond	Béton Brut	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P006)**	S006	Z003
Sous-sol	Escalier	Marches	Enduit ciment	**Résultat d'analyse (P074)**	S074	Z025
		Marches	Enduit ciment	**Résultat d'analyse (P075)**	S075	Z025

4 INVESTIGATIONS NON REALISEES

4.1 Locaux non visités / Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Etage	Local / partie d'immeuble	Justification	Moyen d'accès à prévoir
Extérieur	Toiture 2	non accessible	
Extérieur	Machinerie	Non accessible	
Sous-sol	Vide sanitaire	L'accès au local ou à la zone n'est pas sécurisé et ne permet pas une intervention dans les conditions normales de sécurité.	

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément à l'article R1334-19, « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

4.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété,

- **à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités**
- **une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.**

5 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de

modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

6 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

6.1 OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

6.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,
Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

6.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date de réalisation du repérage : 24/07/2025
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques

communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.
Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant
Documents remis : Néant

Commentaire : **Néant**
Pour des raisons d'accessibilité, les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.
Il ne peut être finalisé qu'après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

7 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

7.1 PROGRAMME DE DEMOLITION

DEMOLITION DU BATIMENT 412 ANCIEN LACAN

7.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d'immeuble concernés par la démolition telle que définie par le donneur d'ordre.
Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste

C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

Liste des locaux (visités / non visités) :

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	Entrée	OUI	
RDC	Degagement 1	OUI	
RDC	Bureau n°1	OUI	
RDC	Bureau n°2	OUI	
RDC	Bureau n°3	OUI	
RDC	Chambre n°1	OUI	
RDC	Salle de sejour n°1	OUI	
RDC	Chambre n°2	OUI	
RDC	Salle a manger n°1	OUI	
RDC	Infirmerie n°1	OUI	
RDC	Office n°1	OUI	
RDC	Sanitaire n°1	OUI	
RDC	Sanitaire n°2	OUI	
RDC	Chambre n°3	OUI	
RDC	Chambre n°4	OUI	
RDC	lingerie	OUI	
RDC	Cage d'escalier n°1	OUI	
RDC	Bureau n°4	OUI	
RDC	Vestiaires	OUI	
RDC	Degagement n°1	OUI	
RDC	Bureau n°5	OUI	
RDC	Bureau n°6	OUI	
RDC	Bureau n°7	OUI	
RDC	Bureau n°8	OUI	
RDC	Bureau n°9	OUI	
RDC	Bureau n°10	OUI	
RDC	Sanitaire n°3	OUI	
RDC	Cage d'escalier entree	OUI	
RDC	Ascenseur n°1	OUI	
RDC	Degagement n°2	OUI	
RDC	Bureau n°11	OUI	
RDC	Bureau n°12	OUI	
RDC	Atelier n°1	OUI	
RDC	Atelier n°2	OUI	
RDC	Atelier n°3	OUI	
RDC	Sanitaire n°4	OUI	
RDC	Sanitaire n°5	OUI	
RDC	Office n°2	OUI	
RDC	Atelier n°4	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	Atelier n°5	OUI	
RDC	Atelier n°6	OUI	
RDC	Lingerie n°1	OUI	
RDC	Cage d'escalier n°2	OUI	
1er Etage	Bureau n°13	OUI	
1er Etage	Office n°3	OUI	
1er Etage	Chambre n°5	OUI	
1er Etage	Chambre n°6	OUI	
1er Etage	Salle de sejour n°2	OUI	
1er Etage	Chambre n°7	OUI	
1er Etage	Chambre n°8	OUI	
1er Etage	Infirmerie n°2	OUI	
1er Etage	SDB	OUI	
1er Etage	Sanitaire n°6	OUI	
1er Etage	Sanitaire n°7	OUI	
1er Etage	Chambre	OUI	
1er Etage	Chambre n°9	OUI	
1er Etage	Lingerie n°2	OUI	
1er Etage	Degagement n°3	OUI	
1er Etage	Lingerie n°3	OUI	
1er Etage	Vestiaire	OUI	
1er Etage	Lingerie n°4	OUI	
1er Etage	Salle a manger n°2	OUI	
1er Etage	Office n°4	OUI	
1er Etage	Bureau n°14	OUI	
1er Etage	Salle de sejour n°3	OUI	
1er Etage	Chambre n°10	OUI	
1er Etage	Bureau n°15	OUI	
1er Etage	Sanitaire n°8	OUI	
1er Etage	Chambre n°11	OUI	
1er Etage	Sanitaire n°9	OUI	
1er Etage	Sanitaire n°10	OUI	
1er Etage	Chambre n°12	OUI	
1er Etage	Chambre n°13	OUI	
1er Etage	Chambre n°14	OUI	
1er Etage	Lingerie n°5	OUI	
Sous-sol	Local technique n°1	OUI	
Sous-sol	Degagement n°4	OUI	
Sous-sol	Sous station	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
Sous-sol	Local technique n°2	OUI	
Sous-sol	Local technique n°3	OUI	
Extérieur	Toiture 1	OUI	
Extérieur	Façades	OUI	
RDC	WC	OUI	
Sous-sol	Escalier	OUI	
1er Etage	Ascenseur n°2	OUI	
Sous-sol	Ascenseur n°3	OUI	
Extérieur	Toiture 2	NON	non accessible
Extérieur	Machinerie	NON	Non accessible
Sous-sol	Vide sanitaire	NON	L'accès au local ou à la zone n'est pas sécurisé et ne permet pas une intervention dans les conditions normales de sécurité.

8 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
06/06/2025	T250783005	APAVE	Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
03/03/2011	11/028/FP	BUREAU VERITAS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

ANNEXE CROQUIS

Client :	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY	Titre :	RDC
N° rapport :			BATIMENT 412 Ancien Lacan
N° planche :	1/10 Version : 0	Lieu d'intervention :	4 rue PAUL ELUARD
Type :	Croquis		76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Date :	10/09/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	BEAUFILS Baptiste	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

Planche de repérage

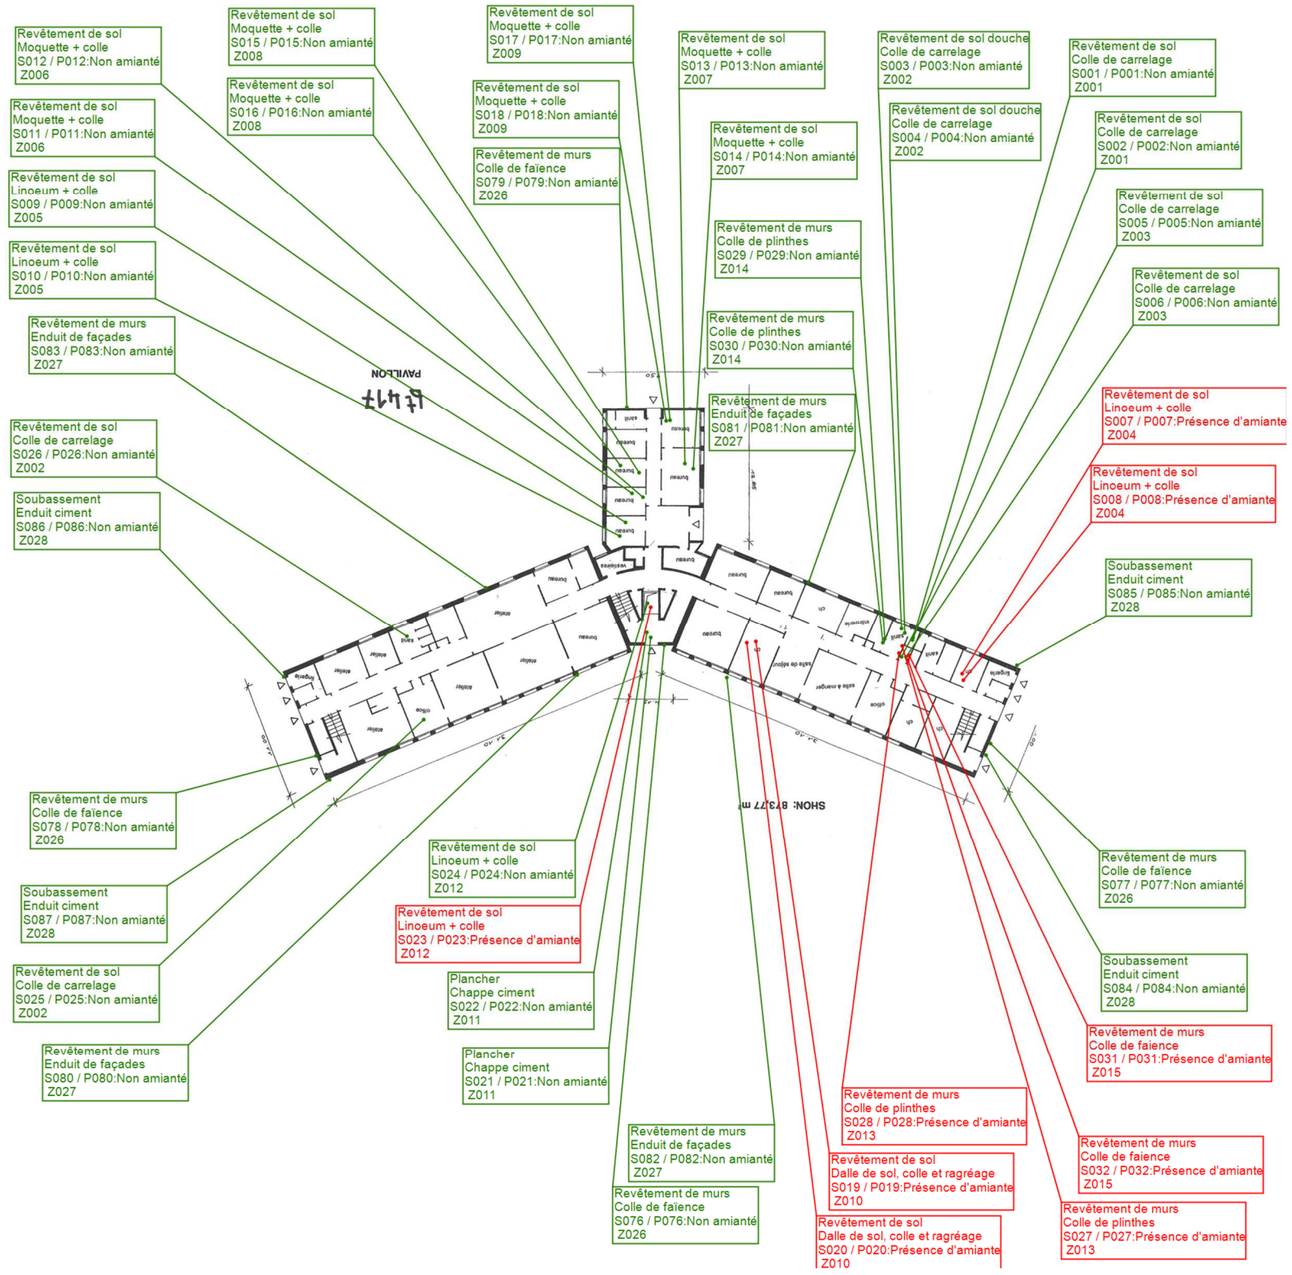


Planche de repérage

Client :	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY	Titre :	1er Etage
N° rapport :			BATIMENT 412 Ancien Lacan
N° planche :	2/10 Version : 0	Lieu d'intervention :	4 rue PAUL ELUARD
Type :	Croquis		76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Date :	10/09/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	BEAUFILS Baptiste	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

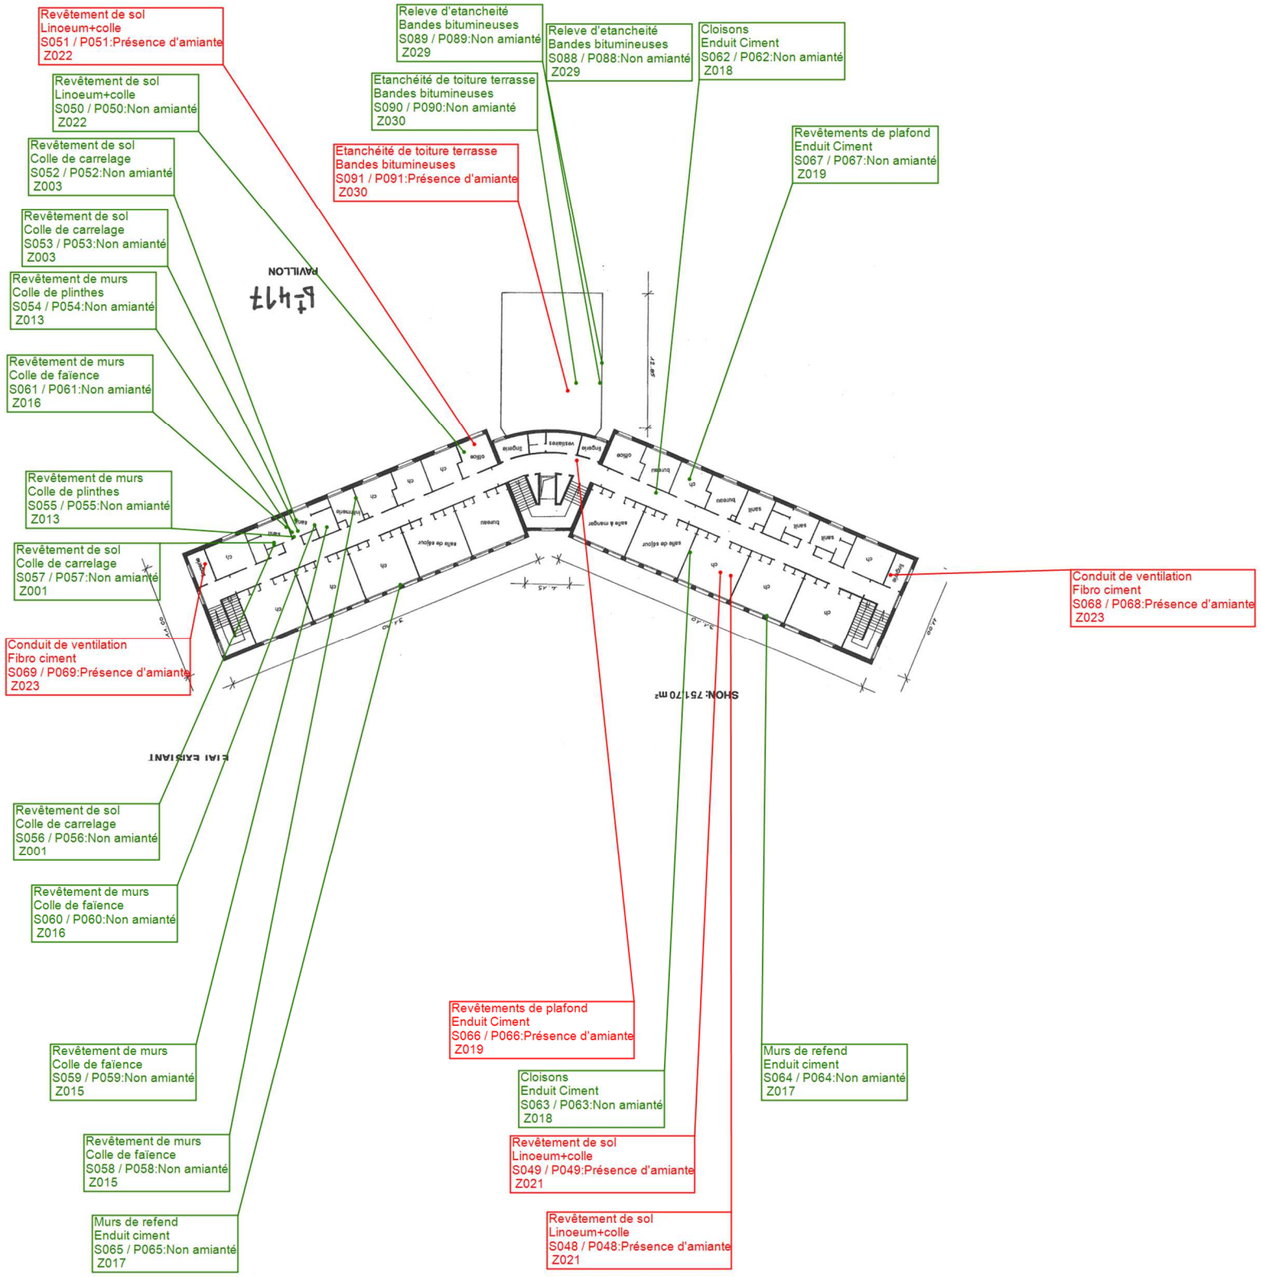


Planche de repérage

Client :	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY	Titre :	Sous-sol
N° rapport :			BATIMENT 412 Ancien Lacan
N° planche :	3/10 Version : 0	Lieu d'intervention :	4 rue PAUL ELUARD
Type :	Croquis		76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Date :	10/09/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	BEAUFILS Baptiste	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	


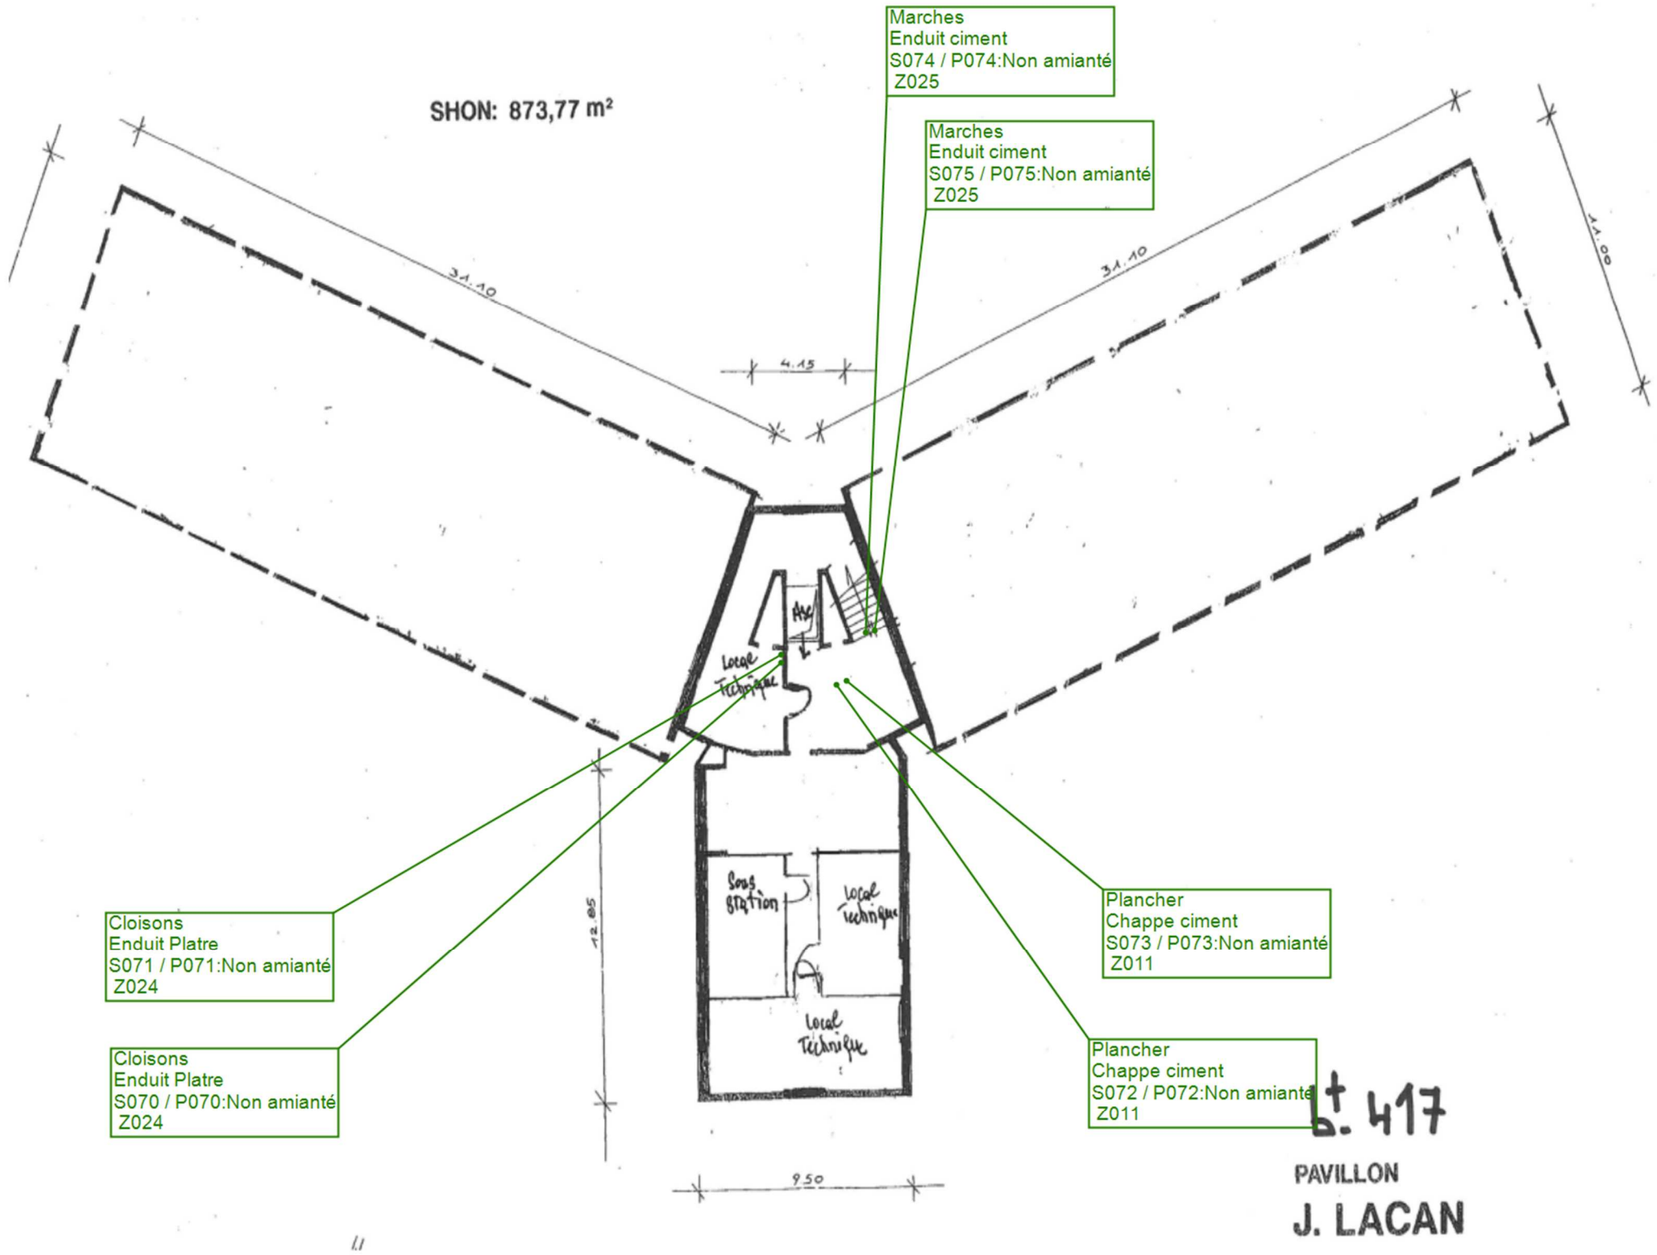


Planche de repérage

Client :	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY	Titre :	RDC SUITE
N° rapport :			BATIMENT 412 Ancien Lacan
N° planche :	4/10 Version : 0	Lieu d'intervention :	4 rue PAUL ELUARD
Type :	Croquis		76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Date :	10/09/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	BEAUFILS Baptiste	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

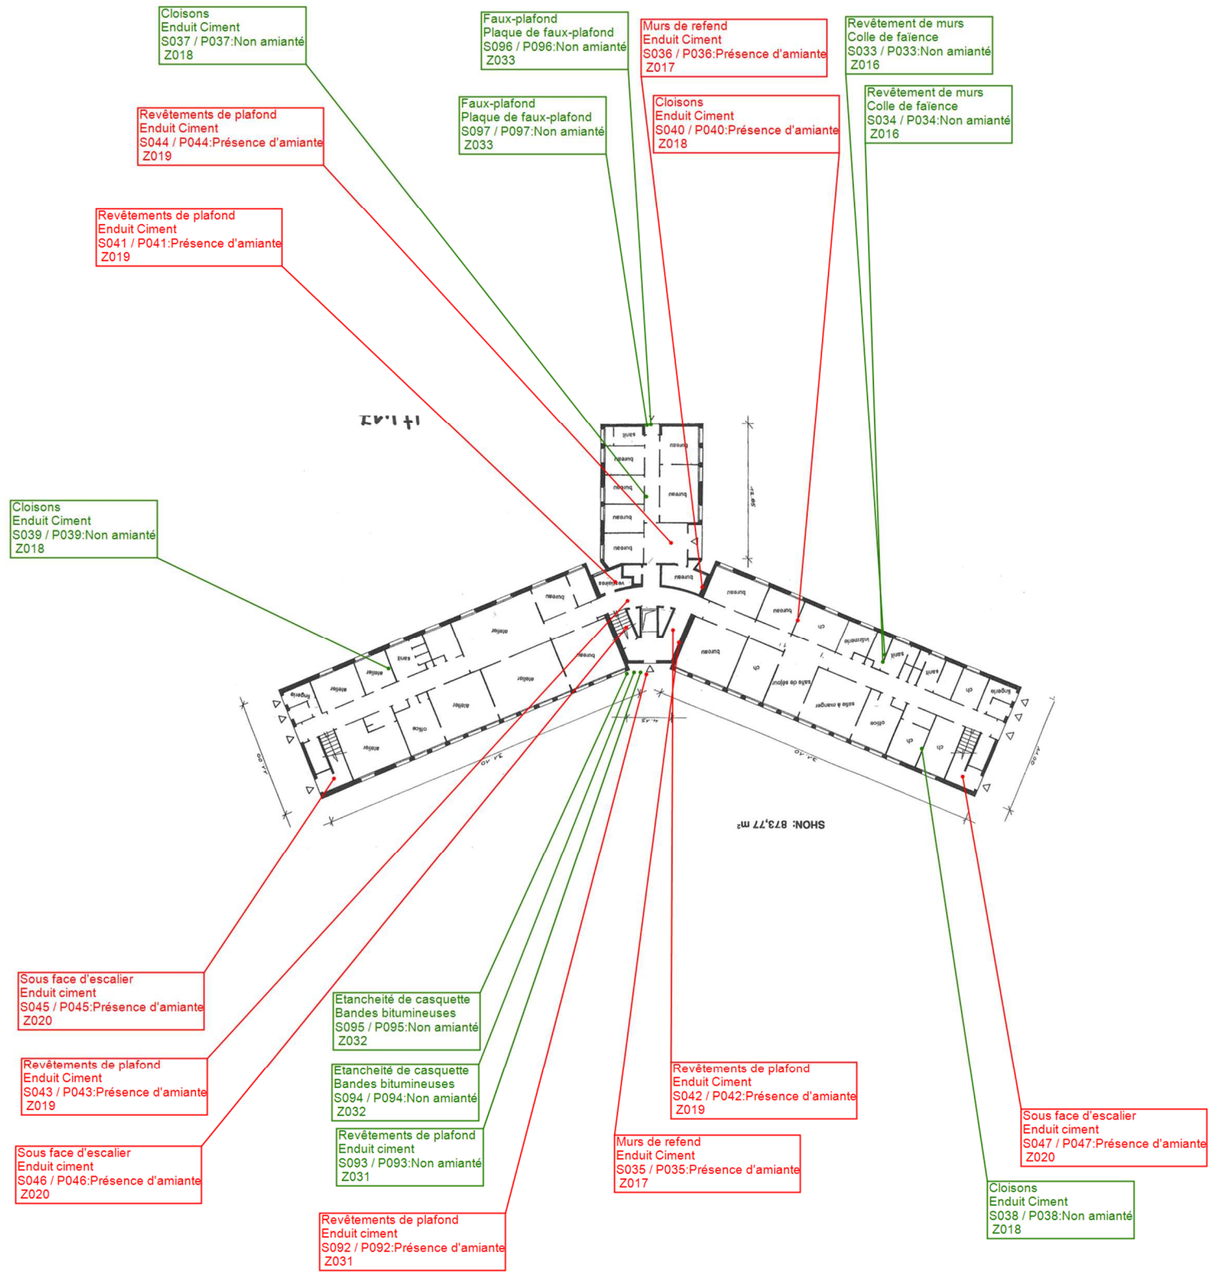

Client :	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY	Titre :	Schéma emprise des matériaux amiantés RDC
N° rapport :			BATIMENT 412 Ancien Lacan
N° planche :	5/10 Version : 0	Lieu d'intervention :	4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Type :	Croquis		
Date :	10/09/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	BEAUFILS Baptiste	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	


Planche de repérage

Legende :

Dalles de sols + Colle contenant de l'amiante

Sol souple + colle et ragréage contenant de l'amiante

Enduit Murs de Refend + cloisons contenant de l'amiante

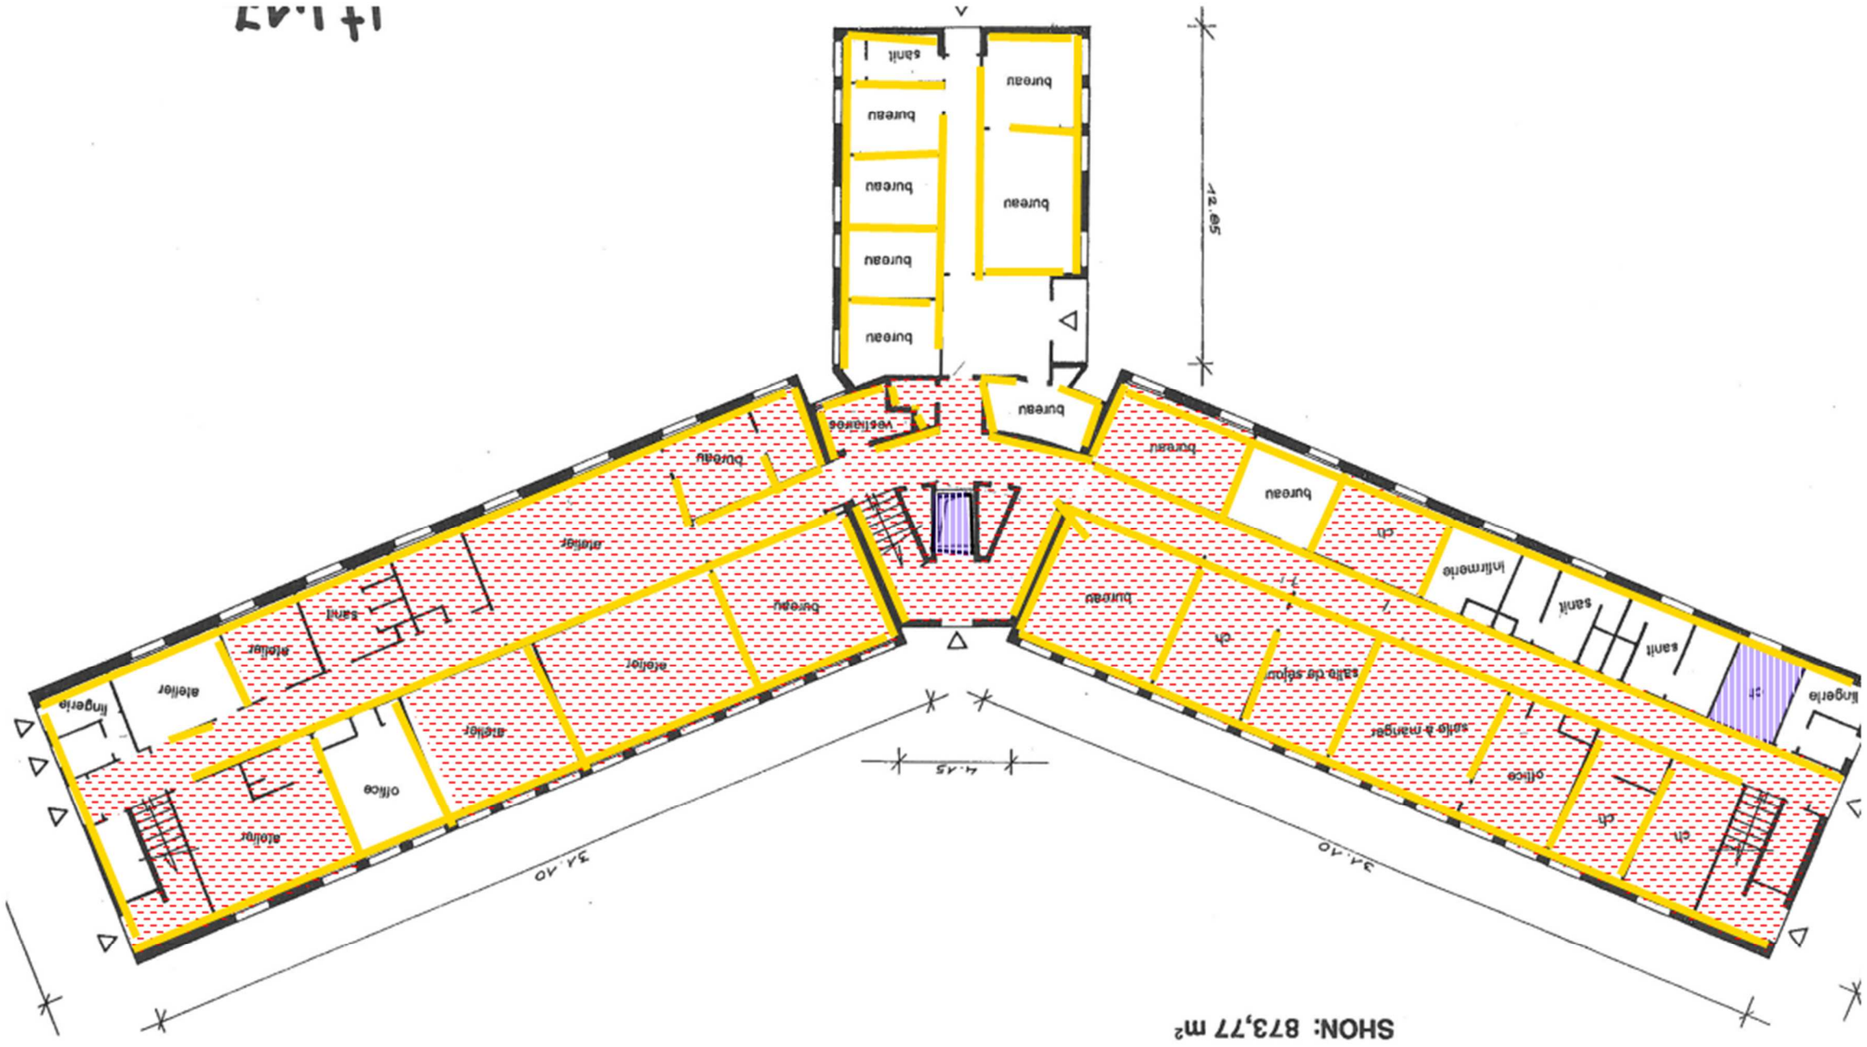


Client :	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY	Titre :	Schéma emprise des matériaux amiantés 1er
N° rapport :			BATIMENT 412 Ancien Lacan
N° planche :	6/10 Version : 0	Lieu d'intervention :	4 rue PAUL ELUARD
Type :	Croquis		76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Date :	10/09/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	BEAUFILS Baptiste	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

Planche de repérage

Legende :

- *Dalles de sols + colle contenant de l'amiante*
- *Sol souple + Colle + reagreage contenant de l'amiante*
- *Etanchéité de toiture terrasse conteant de l'amiante*
- *Plafond conduit de ventilation contenant de l'amiante*
- *Murs colle de faience et colle de plinthes*

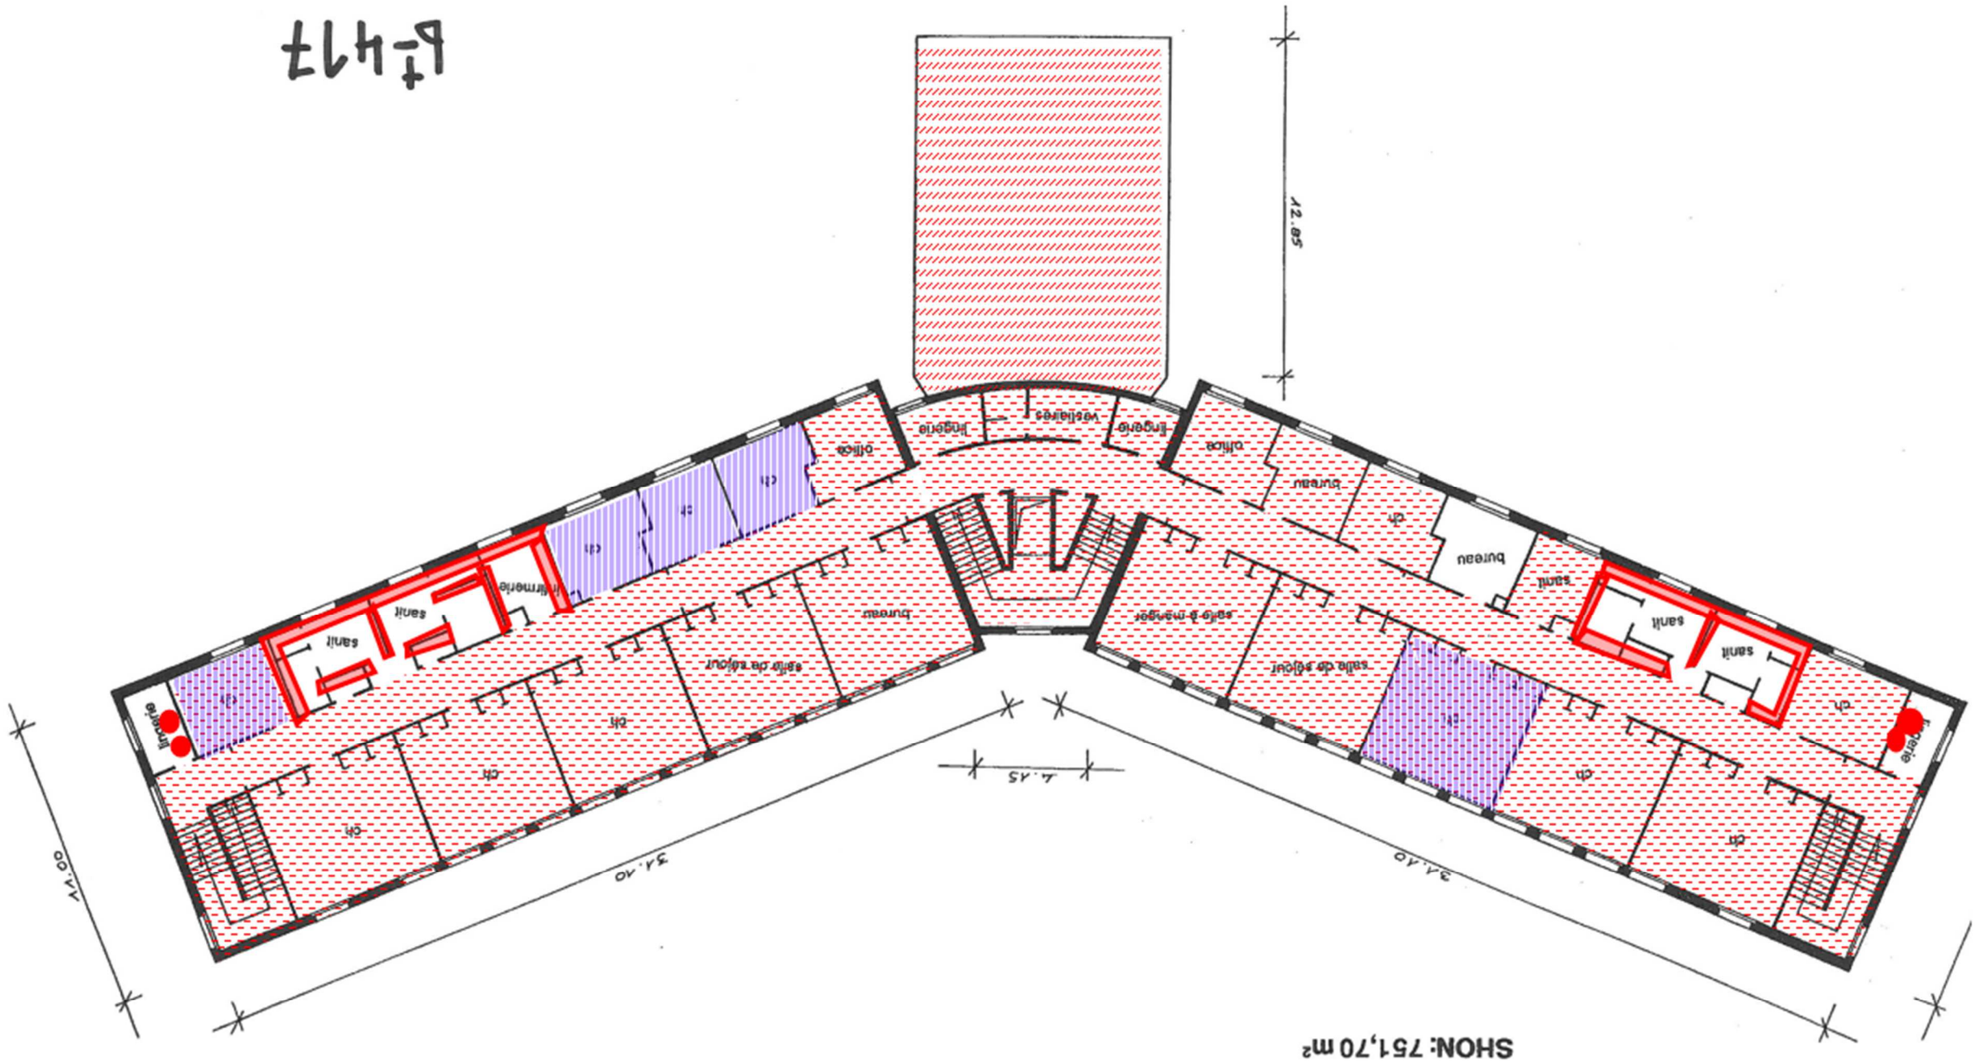

Client :	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY	Titre :	Schéma emprise des matériaux amiantés
N° rapport :			BATIMENT 412 Ancien Lacan
N° planche :	7/10 Version : 0	Lieu d'intervention :	4 rue PAUL ELUARD
Type :	Croquis		76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Date :	10/09/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	BEAUFILS Baptiste	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

Planche de repérage

Legende :

- *Conduit de ventilation Et Fourreau de gaines contenant de l'amiante*
- *Tuyauterie joint de bride contenant de l'amiante*
- *Murs de refend + cloisons contenant de l'amiante*


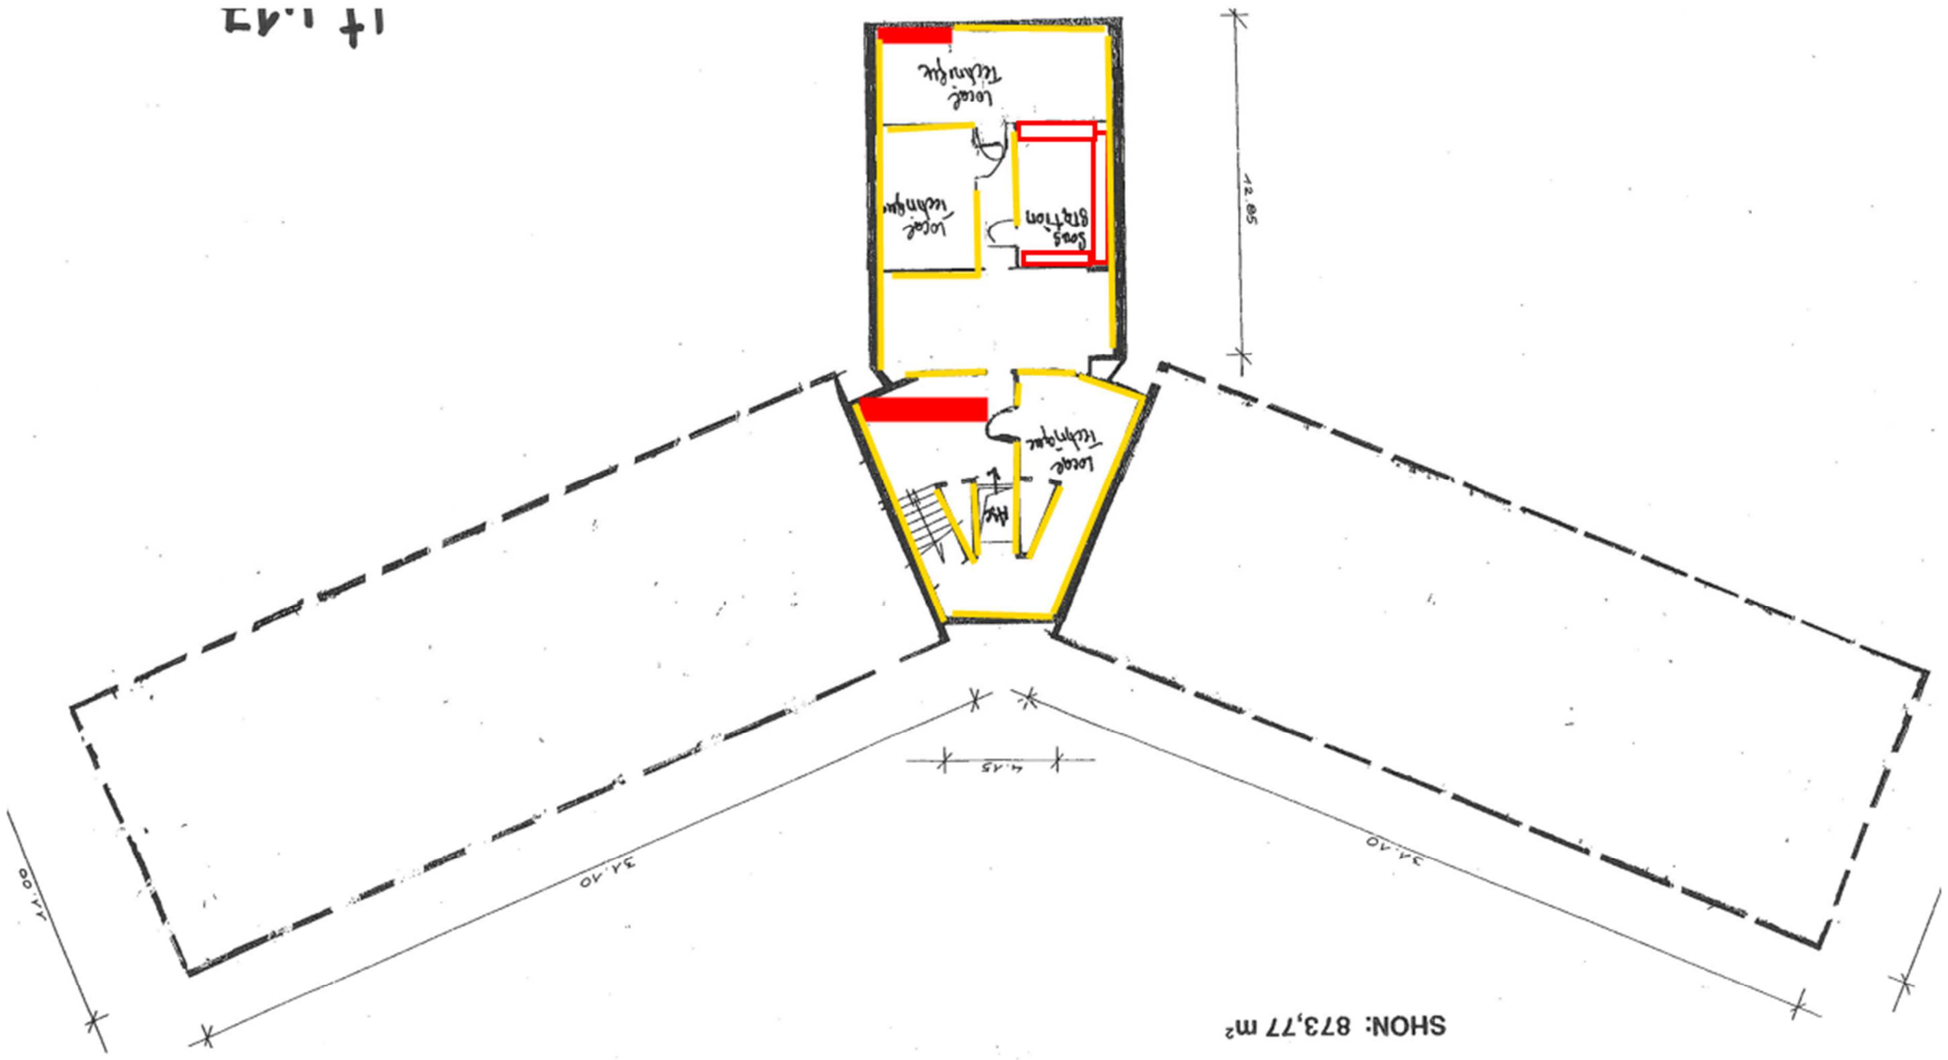


Planche de repérage

Client :	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY	Titre :	Schéma emprise des matériaux amiantés
N° rapport :			BATIMENT 412 Ancien Lacan
N° planche :	8/10 Version : 0	Lieu d'intervention :	4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Type :	Croquis		
Date :	10/09/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	BEAUFILS Baptiste	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

Legende :

Garniture de frein contenant de l'amiante

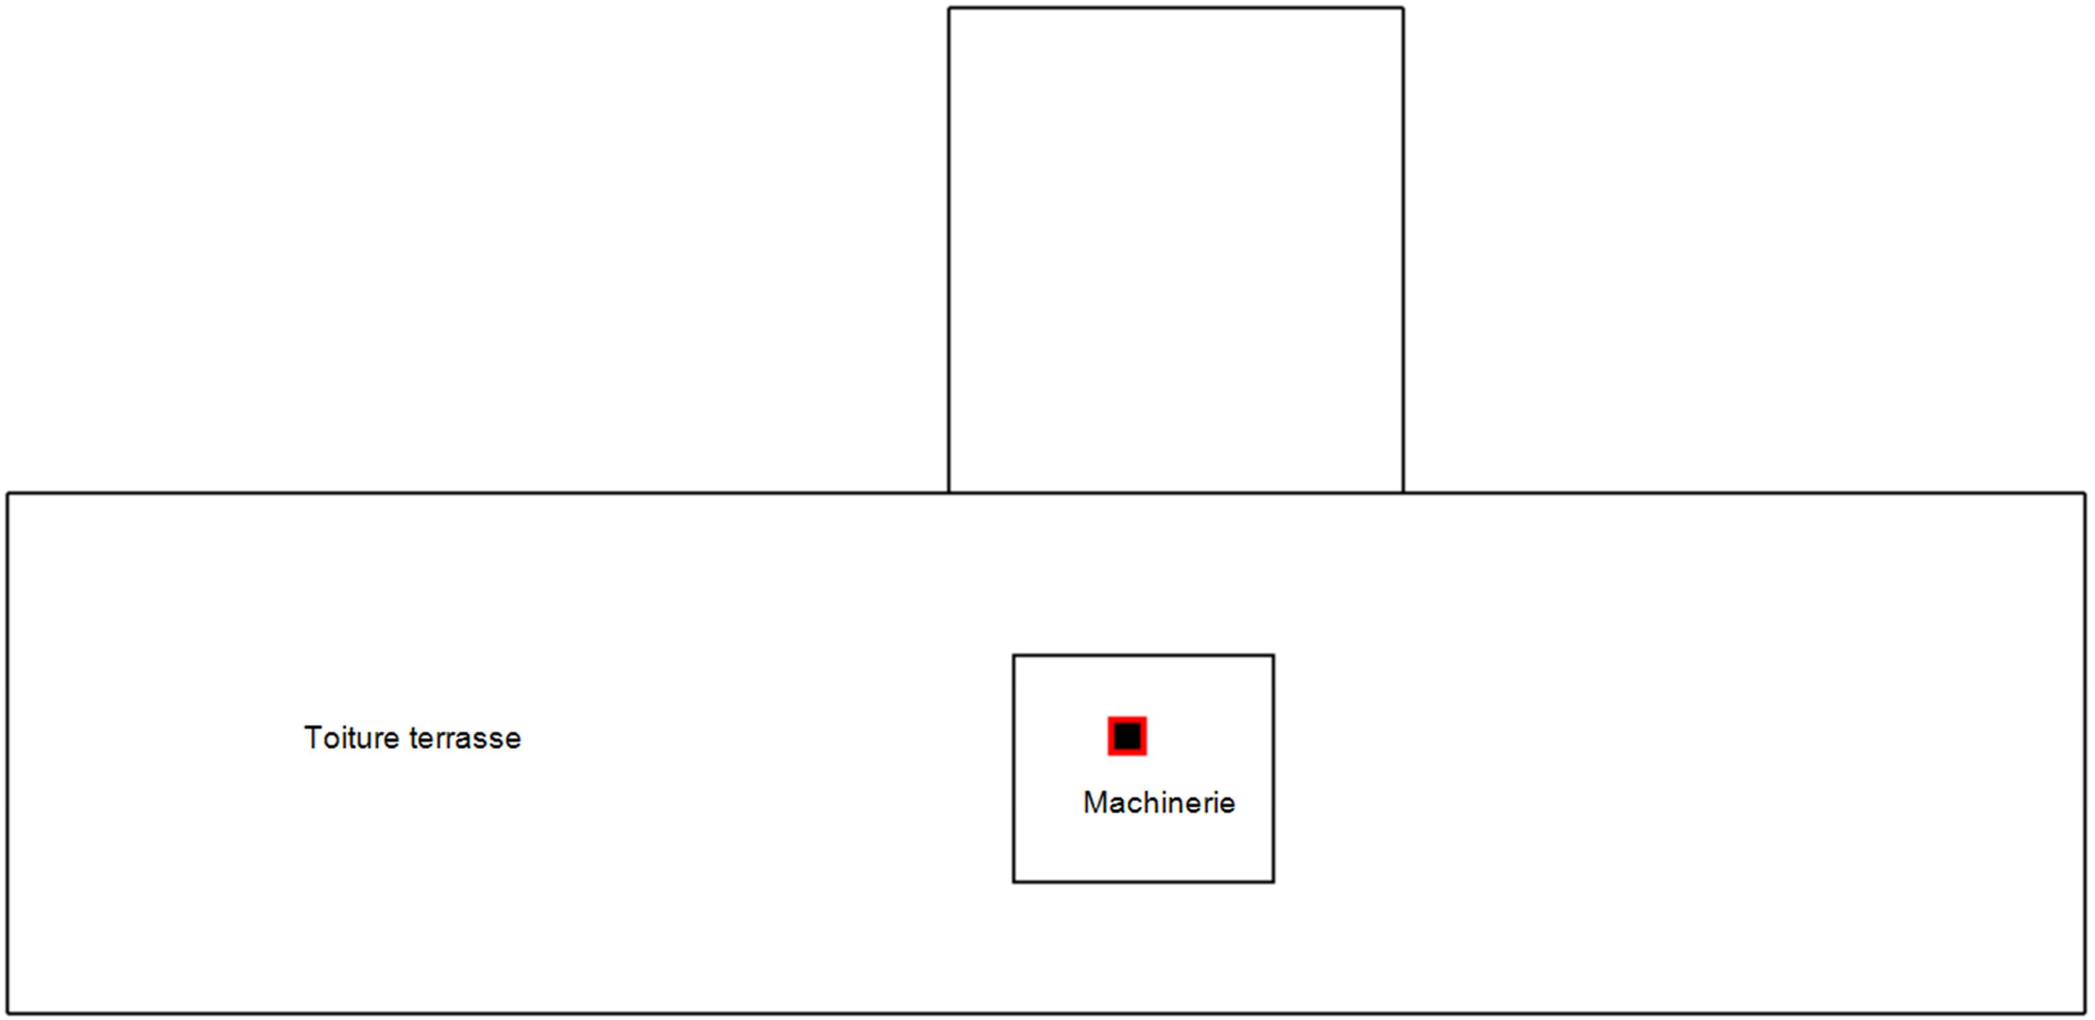


apave	**Planche de repérage**		
Client :	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY	Titre :	SUITE RDC
N° rapport :			BATIMENT 412 Ancien Lacan
N° planche :	9/10 Version : 0	Lieu d'intervention :	4 rue PAUL ELUARD
Type :	Croquis		76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Date :	10/09/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	BEAUFILS Baptiste	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

Legende :

Enduit plafond et sous face d'escalier contenant de l'amiante

Murs colle de faience et colle de plinthes

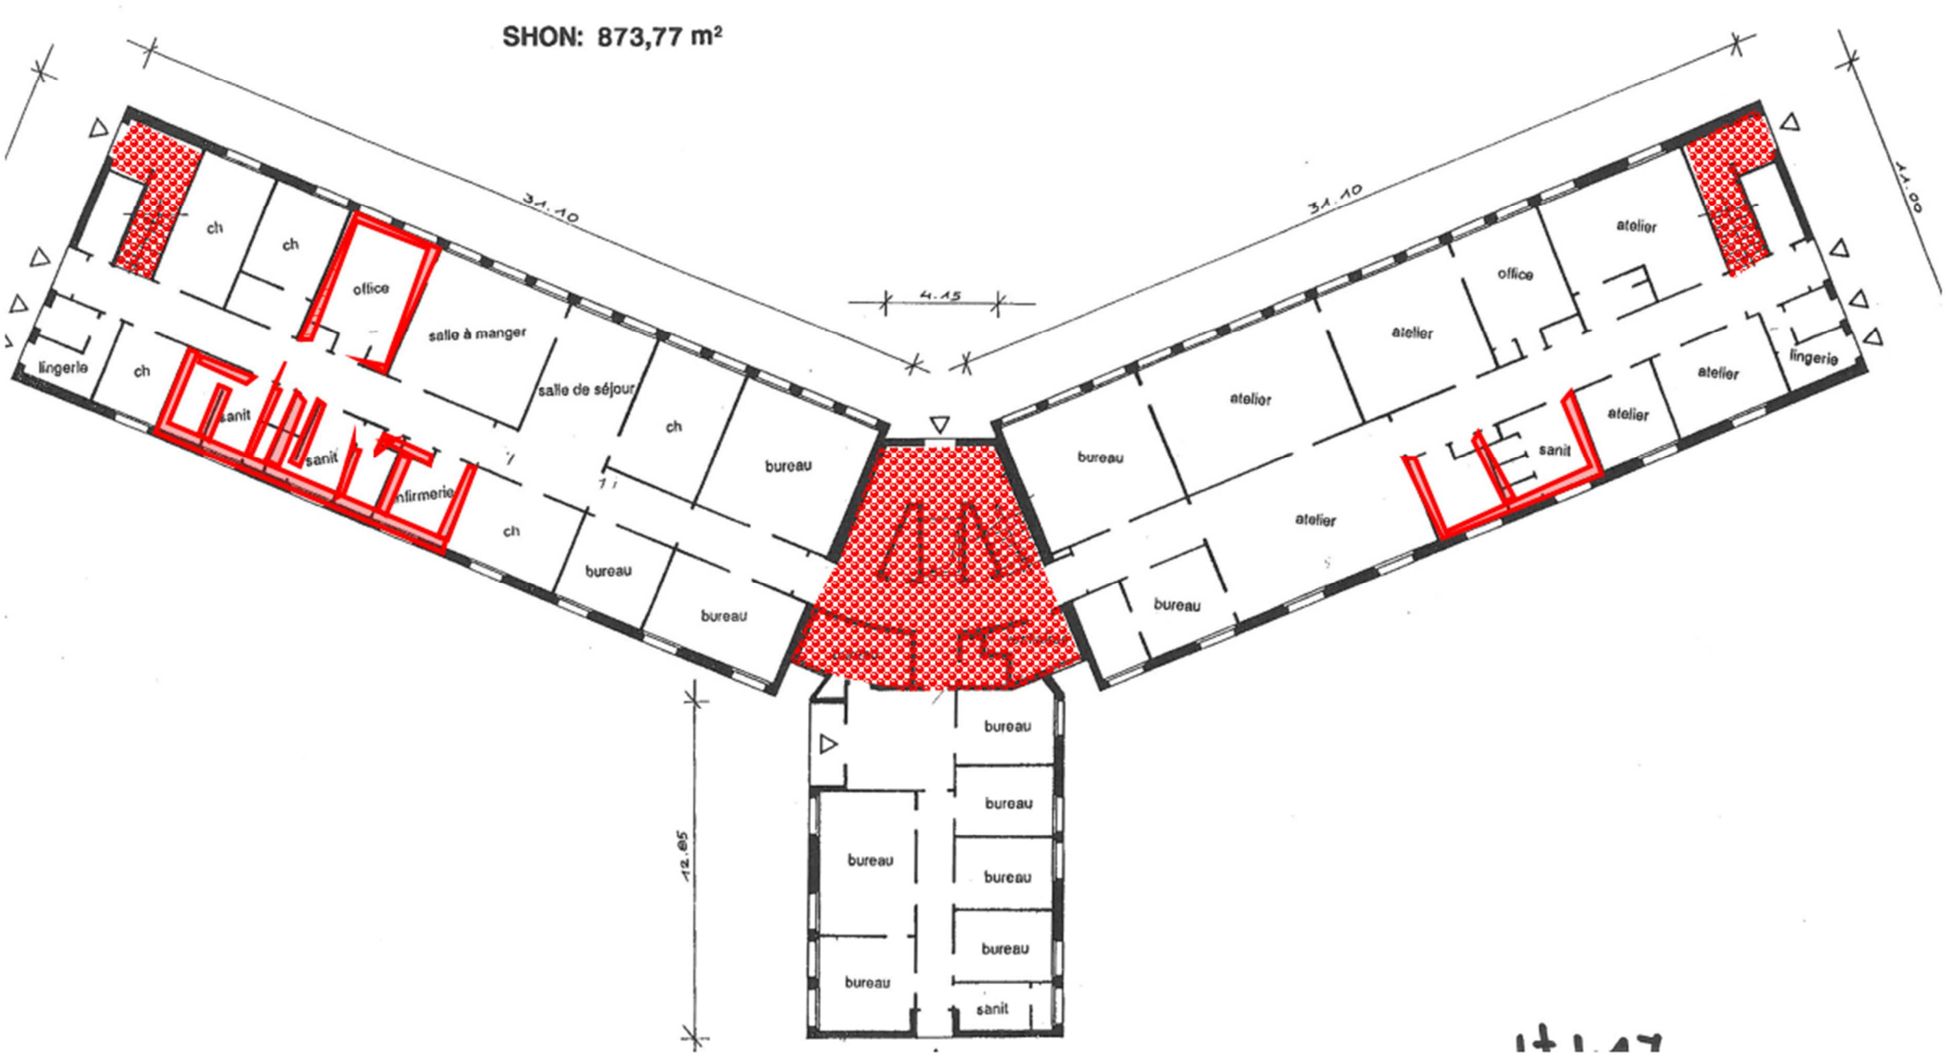


Client :	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY	Titre :	Suite 1er Etage
N° rapport :			BATIMENT 412 Ancien Lacan
N° planche :	10/10 Version : 0	Lieu d'intervention :	4 rue PAUL ELUARD
Type :	Croquis		76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Date :	10/09/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	BEAUFILS Baptiste	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

Planche de repérage

Legende :

Enduit plafond et sous face d'escalier contenant de l'amiante

Enduit Murs de refend + cloisons contenant de l'amiante

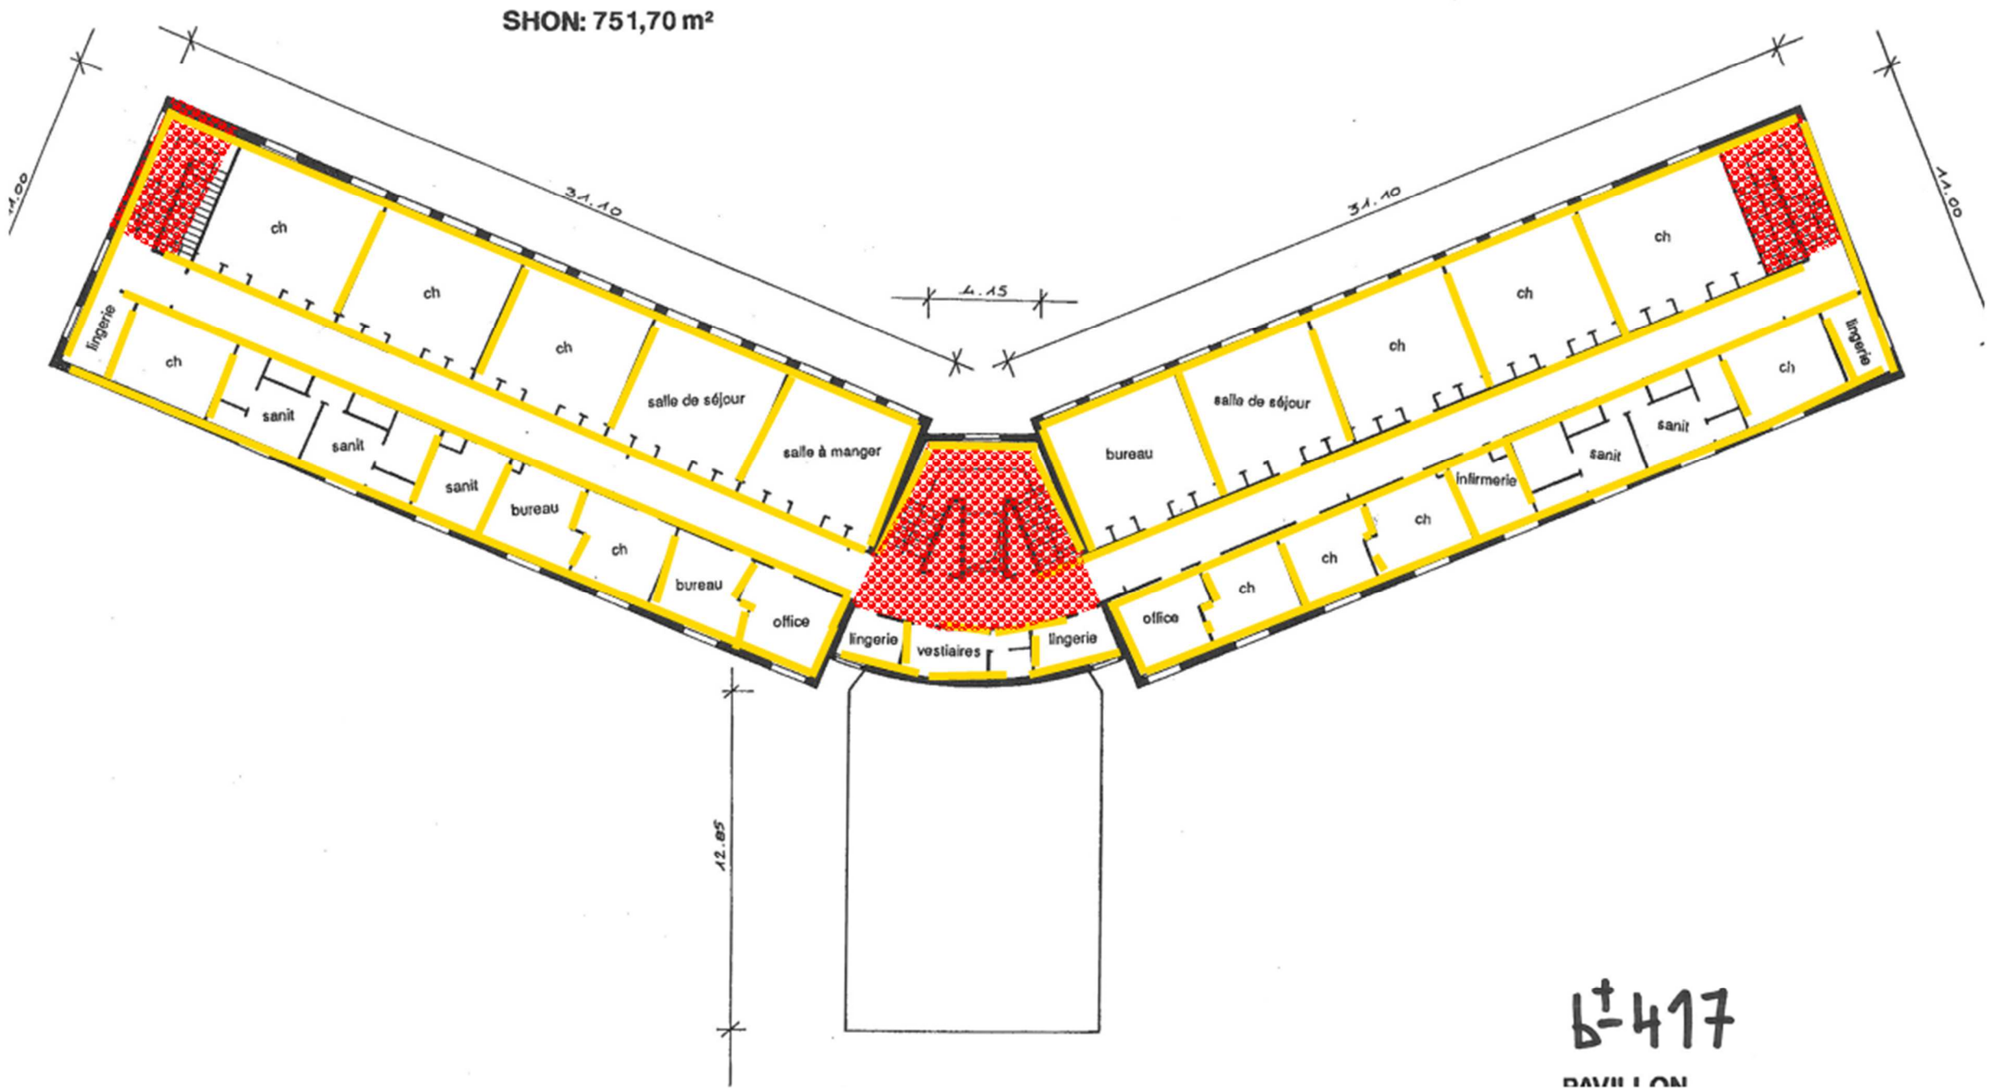

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Sanitaire n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Sanitaire n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Sanitaire n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol douche - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Sanitaire n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol douche - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - WC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - WC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de carrelage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Chambre n°3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Linoeum + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Linoeum + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture en traces (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P008

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Chambre n°3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Linoeum + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Linoeum + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P009

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°5
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Linoeum + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Linoeum + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°5
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Linoeum + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Linoeum + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Moquette + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau en traces (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) en traces (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Moquette + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau en traces (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) en traces (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Moquette + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage en traces (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Moquette + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage en traces (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°8
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Moquette + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°8
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Moquette + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau en traces (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°9
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Moquette + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage en traces (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°9
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Moquette + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Chambre n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalle de sol, colle et ragréage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P020

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Chambre n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalle de sol, colle et ragréage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P021

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Entrée
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chappe ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Chappe ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Entrée
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chappe ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Chappe ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Ascenseur n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Linoeum + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Linoeum + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P024

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Ascenseur n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Linoeum + colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Linoeum + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Office n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Sanitaire n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Sanitaire n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de plinthes



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau (blanc) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P028

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Sanitaire n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de plinthes



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P029

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Sanitaire n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Sanitaire n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - WC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faience	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de plinthes



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P032

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - WC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faience	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de plinthes



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) en traces (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P033

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Sanitaire n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Sanitaire n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement

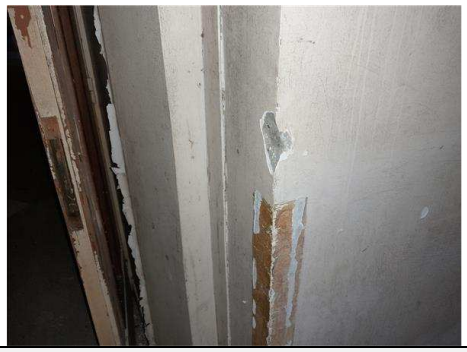

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Degagement n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Murs de refend - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P036

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Degagement n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Murs de refend - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Degagement n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Chambre n°3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Atelier n°5
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit Ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P041

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Degagement n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P042

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Degagement 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P043

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Atelier n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P044

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Degagement n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P045

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Cage d'escalier n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Sous face d'escalier - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P046

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Cage d'escalier entree
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Sous face d'escalier - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P047

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Cage d'escalier n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Sous face d'escalier - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P048

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Chambre n°7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Linoeum+colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Linoeum+colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P049

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Chambre n°7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Linoeum+colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Linoeum+colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P050

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Office n°3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Linoeum+colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Linoeum+colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Office n°3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Linoeum+colle	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Linoeum+colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (fibreux)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P052

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Sanitaire n°6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Sanitaire n°6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Sanitaire n°6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Sanitaire n°6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Sanitaire n°7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Sanitaire n°7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Infirmerie n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - SDB
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Sanitaire n°6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Sanitaire n°7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Degagement n°3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Chambre n°10
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Chambre n°11
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Murs de refend - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Chambre n°10
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Murs de refend - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Salle a manger n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P067

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Chambre n°12
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Lingerie n°5
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibro ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Conduit de ventilation - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Fibro ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P069

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Lingerie n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibro ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Conduit de ventilation - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Fibro ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P070

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Sous-sol - Local technique n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Platre	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Platre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Sous-sol - Local technique n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Platre	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit Platre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Sous-sol - Degagement n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chappe ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Chappe ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Sous-sol - Degagement n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chappe ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Chappe ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Sous-sol - Escalier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Marches - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Sous-sol - Escalier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Marches - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de façades	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de façades

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de façades	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de façades

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de façades	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de façades

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de façades	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de façades

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Toiture 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Releve d'etancheité - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P089

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Toiture 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Releve d'etancheité - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (collant) ; matériau (beige) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Toiture 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Etanchéité de toiture terrasse - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (collant)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Toiture 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Etanchéité de toiture terrasse - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Bandes bitumineuses



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (collant)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P092

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Bandes bitumineuses



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (collant)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P093

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P094

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Etancheité de casquette - Casquette

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (cémenteux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Etancheité de casquette - Casquette

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type aluminium (gris) (brillant) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (collant)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P096

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaque de faux-plafond	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P097

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Extérieur - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaque de faux-plafond	24/07/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (blanc) (plâtreux)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-057351-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720250801636685

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Baptiste BEAUFILS
2 Route des Mouettes
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 — Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 — Page1/25
Dossier N° : 25NM031524 — Date de réception : 25/08/2025 — Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Sanitaire n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Sanitaire n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC - Sanitaire n°1 - Sol - Revêtement de sol douche - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page2/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P004-RDC - Sanitaire n°1 - Sol - Revêtement de sol douche - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-RDC - WC - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - WC - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-RDC - Chambre n°3 - Sol - Revêtement de sol - Linoeum + colle	Matériau de type peinture en traces (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	P008-RDC - Chambre n°3 - Sol - Revêtement de sol - Linoeum + colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page3/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
009	P009-RDC - Bureau n°5 - Sol - Revêtement de sol - Linoeum + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-RDC - Bureau n°5 - Sol - Revêtement de sol - Linoeum + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (beige)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page4/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P011-RDC - Bureau n°6 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau en traces (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) en traces (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-RDC - Bureau n°6 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau en traces (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) en traces (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-RDC - Bureau n°7 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage en traces (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-RDC - Bureau n°7 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage en traces (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page5/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P015-RDC - Bureau n°8 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-RDC - Bureau n°8 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau en traces (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-RDC - Bureau n°9 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage en traces (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-RDC - Bureau n°9 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page6/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	P019-RDC - Chambre n°1 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)(i)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
020	P020-RDC - Chambre n°1 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)(ii)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021	P021-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Chappe ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page7/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022 (1)	P022-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Chappe ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-RDC - Ascenseur - Sol - Revêtement de sol - Linoeum + colle	Matériau souple de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (marron)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
024	P024-RDC - Ascenseur - Sol - Revêtement de sol - Linoeum + colle	Matériau souple de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (marron)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-RDC - Office n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) (beige)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-RDC - Sanitaire n°4 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) (beige)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page8/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	P027-RDC - Sanitaire n°1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau (blanc) en traces	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028	P028-RDC - Sanitaire n°1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
029	P029-RDC - Sanitaire n°1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(iii)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030-RDC - Sanitaire n°1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-RDC - WC - Murs - Revêtement de murs - Colle de faience	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page9/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	P032-RDC - WC - Murs - Revêtement de murs - Colle de faience	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) en traces (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	P033-RDC - Sanitaire n°1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	P034-RDC - Sanitaire n°1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035-RDC - Degagement n°2 - Murs - Murs de refend - Enduit Ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
036	P036-RDC - Degagement n°2 - Murs - Murs de refend - Enduit Ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page10/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037 (1)	P037-RDC - Degagement n°2 - Murs - Cloisons - Enduit Ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
038 (1)	P038-RDC - Chambre n°3 - Murs - Cloisons - Enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039-RDC - Atelier n°5 - Murs - Cloisons - Enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page11/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	P040-RDC - Bureau n°3 - Murs - Cloisons - Enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
041 (1)	P041-RDC - Degagement n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)(iv)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
042	P042-RDC - Degagement 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
043	P043-RDC - Atelier n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
044	P044-RDC - Degagement n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page12/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	P045-RDC - Cage d'escalier n°2 - Plafond - Sous face d'escalier - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
046	P046-RDC - Cage d'escalier entree - Plafond - Sous face d'escalier - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
047	P047-RDC - Cage d'escalier n°1 - Plafond - Sous face d'escalier - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
048	P048-1er Etage - Chambre n°7 - Sol - Revêtement de sol - Linoeum+colle	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page13/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049 (2)	P049-1er Etage - Chambre n°7 - Sol - Revêtement de sol - Linoeum+colle	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
050	P050-1er Etage - Office n°3 - Sol - Revêtement de sol - Linoeum+colle	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051 (2)	P051-1er Etage - Office n°3 - Sol - Revêtement de sol - Linoeum+colle	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (fibreux)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
052	P052-1er Etage - Sanitaire n°6 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page14/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	P053-1er Etage - Sanitaire n°6 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
054	P054-1er Etage - Sanitaire n°6 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
055	P055-1er Etage - Sanitaire n°6 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
056	P056-1er Etage - Sanitaire n°7 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (beige)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
057	P057-1er Etage - Sanitaire n°7 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (beige)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page15/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	P058-1er Etage - Infirmerie n°2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
059	P059-1er Etage - SDB - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
060	P060-1er Etage - Sanitaire n°6 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
061	P061-1er Etage - Sanitaire n°7 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page16/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	P062-1er Etage - Degagement n°3 - Murs - Cloisons - Enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
063	P063-1er Etage - Chambre n°10 - Murs - Cloisons - Enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
064	P064-1er Etage - Chambre n°11 - Murs - Murs de refend - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
065	P065-1er Etage - Chambre n°10 - Murs - Murs de refend - Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page17/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	P066-1er Etage - Salle a manger n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
067	P067-1er Etage - Chambre n°12 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
068	P068-1er Etage - Lingerie n°5 - Plafond - Conduit de ventilation - Fibro ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
069	P069-1er Etage - Lingerie n°2 - Plafond - Conduit de ventilation - Fibro ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page18/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	P070-Sous-sol - Local technique n°1 - Murs - Cloisons - Enduit Platre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
071	P071-Sous-sol - Local technique n°1 - Murs - Cloisons - Enduit Platre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
072	P072-Sous-sol - Degagement n°4 - Sol - Plancher - Chappe ciment	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
073	P073-Sous-sol - Degagement n°4 - Sol - Plancher - Chappe ciment	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page19/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
074	P074-Sous-sol - Escalier - Sol - Marches - Enduit ciment	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
075	P075-Sous-sol - Escalier - Sol - Marches - Enduit ciment	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page20/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076	P076-Extérieur - Façades - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
077	P077-Extérieur - Façades - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
078	P078-Extérieur - Façades - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
079	P079-Extérieur - Façades - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
080	P080-Extérieur - Façades - Murs - Revêtement de murs - Enduit de façades	Matériau (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (beige)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page21/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	P081-Extérieur - Façades - Murs - Revêtement de murs - Enduit de façades	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (beige)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
082	P082-Extérieur - Façades - Murs - Revêtement de murs - Enduit de façades	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (beige)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
083	P083-Extérieur - Façades - Murs - Revêtement de murs - Enduit de façades	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (beige)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
084	P084-Extérieur - Façades - Murs - Soubassement - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
085	P085-Extérieur - Façades - Murs - Soubassement - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page22/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	P086-Extérieur - Façades - Murs - Soubassement - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
087	P087-Extérieur - Façades - Murs - Soubassement - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
088	P088-Extérieur - Toiture - Murs - Releve d'etancheité - Bandes bitumineuses	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
089	P089-Extérieur - Toiture - Murs - Releve d'etancheité - Bandes bitumineuses	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (collant) ; matériau (beige) en traces	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
090	P090-Extérieur - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse - Bandes bitumineuses	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (collant)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page23/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	P091-Extérieur - Toiture - Sol - Etanchéité de toiture terrasse - Bandes bitumineuses	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (collant)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
092	P092-Extérieur - Façades - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (collant)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
093	P093-Extérieur - Façades - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
094	P094-Extérieur - Façades - Casquette - Etancheité de casquette - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (cémenteux) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
095	P095-Extérieur - Façades - Casquette - Etancheité de casquette - Bandes bitumineuses	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type aluminium (gris) (brillant) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (collant)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 Page24/25
Dossier N° : 25NM031524 Date de réception : 25/08/2025 Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
096	P096-Extérieur - Façades - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond - bitumineux	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
097	P097-Extérieur - Façades - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (blanc) (plâtreux)	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau COLLE NOIRE ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(iii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(iv) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-057351-01 | Date d'émission de rapport : 28/08/2025 10:57 | Page25/25
Dossier N° : 25NM031524 | Date de réception : 25/08/2025 | Date d'analyse : 26/08/2025
Référence dossier Client:
112621 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Jordan Masquelier
Responsable Département
Laboratoire EABNO CEBAT

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
RDC	Entrée	Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	15 m²	
RDC	Degagement 1	Revêtements de plafond	Enduit Ciment	30 m²	
		Cloisons	Enduit Ciment	30 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	30 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	30 m²	
RDC	Bureau n°1	Cloisons	Enduit Ciment	15 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Bureau n°2	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Bureau n°3	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Chambre n°1	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	15 m²	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	15 m²	
RDC	Salle de sejour n°1	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Chambre n°2	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Salle a manger n°1	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Infirmerie n°1	Revêtement de murs	Colle de plinthes	10 ml	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
RDC	Office n°1	Revêtement de murs	Colle de plinthes	10 ml	
		Revêtement de murs	Colle de faience	25 m²	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Sanitaire n°1	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	10 ml	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	10 m²	
RDC	Sanitaire n°2	Revêtement de murs	Colle de plinthes	10 ml	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Chambre n°3	Revêtement de sol	Linoeum + colle	15 m²	
		Revêtement de sol	Linoeum + colle	15 m²	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Chambre n°4	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	lingerie	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Cage d'escalier n°1	Sous face d'escalier	Enduit ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	20 m²	
RDC	Bureau n°4	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Vestiaires	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Degagement n°1	Revêtements de plafond	Enduit Ciment	10 m²	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	70 m²	
RDC	Bureau n°5	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Bureau n°6	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
RDC	Bureau n°7	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Bureau n°8**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Bureau n°9**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Bureau n°10**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Sanitaire n°3**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes	**10 ml**	
		Revêtement de murs	Colle de faience	**30 m²**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Cage d'escalier entree**	**Sous face d'escalier**	Enduit ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Ascenseur n°1**	**Revêtement de sol**	Linoeum + colle	**1 m²**	
RDC	**Degagement n°2**	**Murs de refend**	Enduit Ciment	**15 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**15 m²**	
		Revêtements de plafond	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
RDC	**Bureau n°11**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Bureau n°12**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Atelier n°1**	**Revêtements de plafond**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Atelier n°2**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Atelier n°3**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Sanitaire n°4**	**Revêtement de murs**	Colle de faience	**25 m²**	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	**10 ml**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Sanitaire n°5**	**Revêtement de murs**	Colle de faience	**20 m²**	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	**10 ml**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Office n°2**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes	**10 ml**	
		Revêtement de murs	Colle de faience	**20 m²**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Atelier n°4**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Atelier n°5**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Atelier n°6**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Lingerie n°1**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
RDC	**Cage d'escalier n°2**	**Sous face d'escalier**	Enduit ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**20 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
1er Etage	**Bureau n°13**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
1er Etage	**Office n°3**	**Revêtement de sol**	Linoeum+colle	**15 m²**	
		Revêtement de murs	Colle de faience	**20 m²**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
1er Etage	Chambre n°5	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Linoeum+colle	15 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Chambre n°6	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Linoeum+colle	15 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Salle de sejour n°2	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
1er Etage	Chambre n°7	Revêtement de sol	Linoeum+colle	15 m²	
		Revêtement de sol	Linoeum+colle	15 m²	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Chambre n°8	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Infirmerie n°2	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	SDB	Revêtement de murs	Colle de plinthes	10 ml	
		Revêtement de murs	Colle de faience	25 m²	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Sanitaire n°6	Revêtement de murs	Colle de plinthes	10 ml	
		Revêtement de murs	Colle de faience	25 m²	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Sanitaire n°7	Revêtement de murs	Colle de plinthes	10 ml	
		Revêtement de murs	Colle de faience	20 m²	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Chambre	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
1er Etage	Chambre n°9	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
1er Etage	Lingerie n°2	Conduit de ventilation	Fibro ciment	6 ml	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Degagement n°3	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	80 m²	
1er Etage	Lingerie n°3	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Vestiaire	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Lingerie n°4	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Salle a manger n°2	Revêtements de plafond	Enduit Ciment	10 m²	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
1er Etage	Office n°4	Revêtement de murs	Colle de plinthes	10 ml	
		Revêtement de murs	Colle de faience	20 m²	
		Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
1er Etage	Bureau n°14	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
1er Etage	Salle de sejour n°3	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
1er Etage	Chambre n°10	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	15 m²	
1er Etage	Bureau n°15	Cloisons	Enduit Ciment	10 m²	
		Murs de refend	Enduit Ciment	10 m²	
1er Etage	Sanitaire n°8	Revêtement de murs	Colle de plinthes	10 ml	
		Revêtement de murs	Colle de faience	25 m²	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
		Cloisons	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
1er Etage	**Chambre n°11**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
1er Etage	**Sanitaire n°9**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes	**10 ml**	
		Revêtement de murs	Colle de faience	**20 m²**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
1er Etage	**Sanitaire n°10**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes	**10 ml**	
		Revêtement de murs	Colle de faience	**20 m²**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
1er Etage	**Chambre n°12**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
1er Etage	**Chambre n°13**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
1er Etage	**Chambre n°14**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Revêtement de sol	Dalle de sol+ Colle	**15 m²**	
1er Etage	**Lingerie n°5**	**Conduit de ventilation**	Fibro ciment	**6 ml**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**5 m²**	
		Murs de refend	Enduit Ciment	**5 m²**	
Sous-sol	**Local technique n°1**	**Murs de refend**	Enduit Ciment	**20 m²**	
Sous-sol	**Degagement n°4**	**Conduit de ventilation**	Fibro ciment	**6 ml**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**10 m²**	
Sous-sol	**Sous station**	**Conduit de fluide**	Joint de bride	**1 ml**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**10 m²**	
Sous-sol	**Local technique n°2**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
Sous-sol	**Local technique n°3**	**Cloisons**	Enduit Ciment	**10 m²**	
Extérieur	**Toiture 1**	**Etanchéité de toiture terrasse**	Bandes bitumineuses	**100 m²**	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
Extérieur	**Façades**	**Revêtements de plafond**	Enduit ciment	**1 m²**	
RDC	**WC**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes	**4 ml**	
		Cloisons	Enduit Ciment	**5 m²**	
		Revêtement de murs	Colle de faience	**10 m²**	
		Revêtement de murs	Colle de faience	**10 m²**	
Sous-sol	**Escalier**	**Murs de refend**	Enduit Ciment	**10 m²**	
		Sous face d'escalier	Enduit ciment	**3 m²**	
Extérieur	**Machinerie**	**Materiel en machinerie**	Garniture de friction		

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :

- **Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux**
- **Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.**
- **La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective …)**

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Revêtement de sol Colle de carrelage — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Sanitaire n°1	Revêtement de sol	X	Colle de carrelage	S001	P001	Non
		Revêtement de sol		Colle de carrelage	S002	P002	Non
RDC	Sanitaire n°2	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S375	P001 - idem	Non
RDC	lingerie	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S376	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire n°3	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S377	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire n°5	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S378	P001 - idem	Non
RDC	Lingerie n°1	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S379	P001 - idem	Non
1er Etage	SDB	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S380	P001 - idem	Non
1er Etage	Sanitaire n°7	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S056	P056	Non
		Revêtement de sol		Colle de carrelage	S057	P057	Non
1er Etage	Lingerie n°2	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S388	P001 - idem	Non
1er Etage	Lingerie n°3	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S387	P001 - idem	Non
1er Etage	Lingerie n°4	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S386	P001 - idem	Non
1er Etage	Sanitaire n°8	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S381	P001 - idem	Non
1er Etage	Chambre n°11	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S382	P001 - idem	Non
1er Etage	Sanitaire n°9	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S383	P001 - idem	Non
1er Etage	Sanitaire n°10	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S384	P001 - idem	Non
1er Etage	Lingerie n°5	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S385	P001 - idem	Non

Z002 - Revêtement de sol douche Colle de carrelage — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Sanitaire n°1	Revêtement de sol douche	X	Colle de carrelage	S003	P003	Non
		Revêtement de sol douche		Colle de carrelage	S004	P004	Non
RDC	Sanitaire n°4	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S026	P026	Non
RDC	Office n°2	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S025	P025	Non

Z003 - Revêtement de sol Colle de carrelage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er Etage	Sanitaire n°6	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S052	P052	Non
		Revêtement de sol		Colle de carrelage	S053	P053	Non
RDC	WC	Revêtement de sol	X	Colle de carrelage	S005	P005	Non
		Revêtement de sol		Colle de carrelage	S006	P006	Non

Z004 - Revêtement de sol Linoeum + colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Chambre n°3	Revêtement de sol	X	Linoeum + colle	S007	P007	Oui
		Revêtement de sol		Linoeum + colle	S008	P008	Oui

Z005 - Revêtement de sol Linoeum + colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau n°5	Revêtement de sol	X	Linoeum + colle	S009	P009	Non
		Revêtement de sol		Linoeum + colle	S010	P010	Non
RDC	Bureau n°10	Revêtement de sol		Linoeum + colle	S397	P009 - idem	Non

Z006 - Revêtement de sol Moquette + colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau n°6	Revêtement de sol	X	Moquette + colle	S011	P011	Non
		Revêtement de sol		Moquette + colle	S012	P012	Non

Z007 - Revêtement de sol Moquette + colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau n°7	Revêtement de sol	X	Moquette + colle	S013	P013	Non
		Revêtement de sol		Moquette + colle	S014	P014	Non

Z008 - Revêtement de sol Moquette + colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau n°8	Revêtement de sol	X	Moquette + colle	S015	P015	Non
		Revêtement de sol		Moquette + colle	S016	P016	Non

Z009 - Revêtement de sol Moquette + colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau n°9	Revêtement de sol	X	Moquette + colle	S017	P017	Non
		Revêtement de sol		Moquette + colle	S018	P018	Non

Z010 - Revêtement de sol Dalle de sol, colle et ragréage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Chambre n°1	Revêtement de sol	X	Dalle de sol, colle et ragréage	S019	P019	Oui
		Revêtement de sol		Dalle de sol, colle et ragréage	S020	P020	Oui

Z011 - Plancher Chappe ciment							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Entrée	Plancher	X	Chappe ciment	S021	P021	Non
		Plancher		Chappe ciment	S022	P022	Non
Sous-sol	Degagement n°4	Plancher		Chappe ciment	S072	P072	Non
		Plancher		Chappe ciment	S073	P073	Non

Z012 - Revêtement de sol Linoeum + colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Ascenseur n°1	Revêtement de sol	X	Linoeum + colle	S023	P023	Oui

Z013 - Revêtement de murs Colle de plinthes							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Infirmerie n°1**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S102	**P027 - idem**	**Oui**
RDC	**Office n°1**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S103	**P027 - idem**	**Oui**
RDC	**Sanitaire n°1**	Revêtement de murs	X	**Colle de plinthes**	S027	**P027**	**Oui**
		Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S028	**P028**	**Oui**
RDC	**Sanitaire n°2**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S098	**P027 - idem**	**Oui**
RDC	**Sanitaire n°3**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S099	**P027 - idem**	**Oui**
RDC	**Sanitaire n°4**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S125	**P027 - idem**	**Oui**
RDC	**Sanitaire n°5**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S124	**P027 - idem**	**Oui**
RDC	**Office n°2**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S100	**P027 - idem**	**Oui**
1er Etage	**SDB**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S110	**P027 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°6**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S109	**P027 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°7**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S108	**P027 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Office n°4**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S105	**P027 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°8**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S104	**P027 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°9**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S107	**P027 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°10**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S106	**P027 - idem**	**Oui**
RDC	**WC**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S101	**P027 - idem**	**Oui**

Z014 - Revêtement de murs Colle de plinthes							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Sanitaire n°1**	Revêtement de murs	X	**Colle de plinthes**	S029	**P029**	**Non**
		Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S030	**P030**	**Non**

Z015 - Revêtement de murs Colle de faience							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Office n°1**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S115	**P031 - idem**	**Oui**
RDC	**Sanitaire n°3**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S114	**P031 - idem**	**Oui**
RDC	**Sanitaire n°4**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S113	**P031 - idem**	**Oui**
RDC	**Sanitaire n°5**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S112	**P031 - idem**	**Oui**
RDC	**Office n°2**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S111	**P031 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Office n°3**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S123	**P031 - idem**	**Oui**
1er Etage	**SDB**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S122	**P031 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°6**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S121	**P031 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°7**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S120	**P031 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Office n°4**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S119	**P031 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°8**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S118	**P031 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°9**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S117	**P031 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°10**	Revêtement de murs		**Colle de faience**	S116	**P031 - idem**	**Oui**
RDC	**WC**	Revêtement de murs	X	**Colle de faience**	S031	**P031**	**Oui**
		Revêtement de murs		**Colle de faience**	S032	**P032**	**Oui**

Z016 - Revêtement de murs Colle de faïence							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Sanitaire n°1**	Revêtement de murs	X	**Colle de faïence**	S033	**P033**	**Non**
		Revêtement de murs		**Colle de faïence**	S034	**P034**	**Non**
1er Etage	**Sanitaire n°6**	Revêtement de murs		**Colle de faïence**	S060	**P060**	**Non**
1er Etage	**Sanitaire n°7**	Revêtement de murs		**Colle de faïence**	S061	**P061**	**Non**

Z017 - Murs de refend Enduit Ciment	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Entrée	Murs de refend		Enduit Ciment	S343	P035 - idem	Oui
RDC	Degagement 1	Murs de refend		Enduit Ciment	S342	P035 - idem	Oui
RDC	Bureau n°1	Murs de refend		Enduit Ciment	S341	P035 - idem	Oui
RDC	Bureau n°2	Murs de refend		Enduit Ciment	S340	P035 - idem	Oui
RDC	Bureau n°3	Murs de refend		Enduit Ciment	S339	P035 - idem	Oui
RDC	Chambre n°1	Murs de refend		Enduit Ciment	S338	P035 - idem	Oui
RDC	Salle de sejour n°1	Murs de refend		Enduit Ciment	S337	P035 - idem	Oui
RDC	Chambre n°2	Murs de refend		Enduit Ciment	S336	P035 - idem	Oui
RDC	Salle a manger n°1	Murs de refend		Enduit Ciment	S335	P035 - idem	Oui
RDC	Infirmerie n°1	Murs de refend		Enduit Ciment	S334	P035 - idem	Oui
RDC	Office n°1	Murs de refend		Enduit Ciment	S333	P035 - idem	Oui
RDC	Sanitaire n°1	Murs de refend		Enduit Ciment	S332	P035 - idem	Oui
RDC	Sanitaire n°2	Murs de refend		Enduit Ciment	S331	P035 - idem	Oui
RDC	Chambre n°3	Murs de refend		Enduit Ciment	S330	P035 - idem	Oui
RDC	Chambre n°4	Murs de refend		Enduit Ciment	S329	P035 - idem	Oui
RDC	lingerie	Murs de refend		Enduit Ciment	S328	P035 - idem	Oui
RDC	Cage d'escalier n°1	Murs de refend		Enduit Ciment	S303	P035 - idem	Oui
RDC	Bureau n°4	Murs de refend		Enduit Ciment	S327	P035 - idem	Oui
RDC	Vestiaires	Murs de refend		Enduit Ciment	S326	P035 - idem	Oui
RDC	Bureau n°5	Murs de refend		Enduit Ciment	S325	P035 - idem	Oui
RDC	Bureau n°6	Murs de refend		Enduit Ciment	S324	P035 - idem	Oui
RDC	Bureau n°7	Murs de refend		Enduit Ciment	S323	P035 - idem	Oui
RDC	Bureau n°8	Murs de refend		Enduit Ciment	S322	P035 - idem	Oui
RDC	Bureau n°9	Murs de refend		Enduit Ciment	S321	P035 - idem	Oui
RDC	Bureau n°10	Murs de refend		Enduit Ciment	S320	P035 - idem	Oui
RDC	Sanitaire n°3	Murs de refend		Enduit Ciment	S319	P035 - idem	Oui
RDC	Cage d'escalier entree	Murs de refend		Enduit Ciment	S302	P035 - idem	Oui
RDC	Degagement n°2	Murs de refend	X	Enduit Ciment	S035	P035	Oui
		Murs de refend		Enduit Ciment	S036	P036	Oui

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau n°11	Murs de refend		Enduit Ciment	S318	P035 - idem	Oui
RDC	Bureau n°12	Murs de refend		Enduit Ciment	S317	P035 - idem	Oui
RDC	Atelier n°1	Murs de refend		Enduit Ciment	S316	P035 - idem	Oui
RDC	Atelier n°2	Murs de refend		Enduit Ciment	S315	P035 - idem	Oui
RDC	Atelier n°3	Murs de refend		Enduit Ciment	S314	P035 - idem	Oui
RDC	Sanitaire n°4	Murs de refend		Enduit Ciment	S313	P035 - idem	Oui
RDC	Sanitaire n°5	Murs de refend		Enduit Ciment	S312	P035 - idem	Oui
RDC	Office n°2	Murs de refend		Enduit Ciment	S311	P035 - idem	Oui
RDC	Atelier n°4	Murs de refend		Enduit Ciment	S310	P035 - idem	Oui
RDC	Atelier n°5	Murs de refend		Enduit Ciment	S309	P035 - idem	Oui
RDC	Atelier n°6	Murs de refend		Enduit Ciment	S306	P035 - idem	Oui
RDC	Lingerie n°1	Murs de refend		Enduit Ciment	S305	P035 - idem	Oui
RDC	Cage d'escalier n°2	Murs de refend		Enduit Ciment	S304	P035 - idem	Oui
1er Etage	Bureau n°13	Murs de refend		Enduit Ciment	S374	P035 - idem	Oui
1er Etage	Office n°3	Murs de refend		Enduit Ciment	S373	P035 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°5	Murs de refend		Enduit Ciment	S372	P035 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°6	Murs de refend		Enduit Ciment	S371	P035 - idem	Oui
1er Etage	Salle de sejour n°2	Murs de refend		Enduit Ciment	S370	P035 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°7	Murs de refend		Enduit Ciment	S369	P035 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°8	Murs de refend		Enduit Ciment	S368	P035 - idem	Oui
1er Etage	SDB	Murs de refend		Enduit Ciment	S367	P035 - idem	Oui
1er Etage	Sanitaire n°6	Murs de refend		Enduit Ciment	S366	P035 - idem	Oui
1er Etage	Sanitaire n°7	Murs de refend		Enduit Ciment	S365	P035 - idem	Oui
1er Etage	Chambre	Murs de refend		Enduit Ciment	S364	P035 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°9	Murs de refend		Enduit Ciment	S363	P035 - idem	Oui
1er Etage	Lingerie n°2	Murs de refend		Enduit Ciment	S362	P035 - idem	Oui
1er Etage	Degagement n°3	Murs de refend		Enduit Ciment	S361	P035 - idem	Oui
1er Etage	Lingerie n°3	Murs de refend		Enduit Ciment	S360	P035 - idem	Oui
1er Etage	Vestiaire	Murs de refend		Enduit Ciment	S359	P035 - idem	Oui

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er Etage	**Lingerie n°4**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S358	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Salle a manger n°2**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S357	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Office n°4**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S356	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Bureau n°14**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S355	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Salle de sejour n°3**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S354	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Chambre n°10**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S353	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Bureau n°15**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S352	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°8**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S351	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Chambre n°11**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S350	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°9**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S349	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Sanitaire n°10**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S348	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Chambre n°12**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S347	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Chambre n°13**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S346	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Chambre n°14**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S345	**P035 - idem**	**Oui**
1er Etage	**Lingerie n°5**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S344	**P035 - idem**	**Oui**
Sous-sol	**Local technique n°1**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S390	**P035 - idem**	**Oui**
Sous-sol	**Escalier**	Murs de refend		**Enduit Ciment**	S391	**P035 - idem**	**Oui**

Z018 - Cloisons Enduit Ciment	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Degagement 1	Cloisons		Enduit Ciment	S192	P037 - idem	Non
RDC	Bureau n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S193	P037 - idem	Non
RDC	Bureau n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S263	P037 - idem	Non
RDC	Bureau n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S264	P037 - idem	Non
RDC	Chambre n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S265	P037 - idem	Non
RDC	Salle de sejour n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S266	P037 - idem	Non
RDC	Chambre n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S267	P037 - idem	Non
RDC	Salle a manger n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S268	P037 - idem	Non
RDC	Infirmerie n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S269	P037 - idem	Non
RDC	Office n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S270	P037 - idem	Non
RDC	Sanitaire n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S271	P037 - idem	Non
RDC	Sanitaire n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S272	P037 - idem	Non
RDC	Chambre n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S038	P038	Non
		Cloisons		Enduit Ciment	S273	P037 - idem	Non
RDC	Chambre n°4	Cloisons		Enduit Ciment	S274	P037 - idem	Non
RDC	lingerie	Cloisons		Enduit Ciment	S275	P037 - idem	Non
RDC	Bureau n°4	Cloisons		Enduit Ciment	S276	P037 - idem	Non
RDC	Vestiaires	Cloisons		Enduit Ciment	S277	P037 - idem	Non
RDC	Bureau n°5	Cloisons		Enduit Ciment	S278	P037 - idem	Non
RDC	Bureau n°6	Cloisons		Enduit Ciment	S279	P037 - idem	Non
RDC	Bureau n°7	Cloisons		Enduit Ciment	S280	P037 - idem	Non
RDC	Bureau n°8	Cloisons		Enduit Ciment	S281	P037 - idem	Non
RDC	Bureau n°9	Cloisons		Enduit Ciment	S282	P037 - idem	Non
RDC	Bureau n°10	Cloisons		Enduit Ciment	S283	P037 - idem	Non
RDC	Sanitaire n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S284	P037 - idem	Non
RDC	Cage d'escalier entree	Cloisons		Enduit Ciment	S285	P037 - idem	Non
RDC	Degagement n°2	Cloisons	X	Enduit Ciment	S037	P037	Non
		Cloisons		Enduit Ciment	S286	P037 - idem	Non
RDC	Bureau n°11	Cloisons		Enduit Ciment	S287	P037 - idem	Non

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau n°12	Cloisons		Enduit Ciment	S288	P037 - idem	Non
RDC	Atelier n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S289	P037 - idem	Non
RDC	Atelier n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S290	P037 - idem	Non
RDC	Atelier n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S291	P037 - idem	Non
RDC	Sanitaire n°4	Cloisons		Enduit Ciment	S292	P037 - idem	Non
RDC	Sanitaire n°5	Cloisons		Enduit Ciment	S293	P037 - idem	Non
RDC	Office n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S294	P037 - idem	Non
RDC	Atelier n°4	Cloisons		Enduit Ciment	S295	P037 - idem	Non
RDC	Atelier n°5	Cloisons		Enduit Ciment	S039	P039	Non
		Cloisons		Enduit Ciment	S296	P037 - idem	Non
RDC	Atelier n°6	Cloisons		Enduit Ciment	S297	P037 - idem	Non
RDC	Lingerie n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S298	P037 - idem	Non
1er Etage	Degagement n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S062	P062	Non
1er Etage	Chambre n°10	Cloisons		Enduit Ciment	S063	P063	Non
RDC	WC	Cloisons		Enduit Ciment	S299	P037 - idem	Non

Z019 - Revêtements de plafond Enduit Ciment — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Degagement 1	Revêtements de plafond		Enduit Ciment	S042	P042	Oui
RDC	Degagement n°1	Revêtements de plafond		Enduit Ciment	S044	P044	Oui
RDC	Degagement n°2	Revêtements de plafond	X	Enduit Ciment	S041	P041	Oui
RDC	Atelier n°1	Revêtements de plafond		Enduit Ciment	S043	P043	Oui
1er Etage	Salle a manger n°2	Revêtements de plafond		Enduit Ciment	S066	P066	Oui

Z020 - Sous face d'escalier Enduit ciment							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Cage d'escalier n°1	Sous face d'escalier		Enduit ciment	S047	P047	Oui
RDC	Cage d'escalier entree	Sous face d'escalier		Enduit ciment	S046	P046	Oui
RDC	Cage d'escalier n°2	Sous face d'escalier	X	Enduit ciment	S045	P045	Oui
Sous-sol	Escalier	Sous face d'escalier		Enduit ciment	S392	P045 - idem	Oui

Z021 - Revêtement de sol Linoeum+colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er Etage	Chambre n°5	Revêtement de sol		Linoeum+colle	S300	P048 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°6	Revêtement de sol		Linoeum+colle	S301	P048 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°7	Revêtement de sol	X	Linoeum+colle	S048	P048	Oui
		Revêtement de sol		Linoeum+colle	S049	P049	Oui

Z022 - Revêtement de sol Linoeum+colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er Etage	Office n°3	Revêtement de sol	X	Linoeum+colle	S050	P050	Non

Z023 - Conduit de ventilation Fibro ciment							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er Etage	Lingerie n°2	Conduit de ventilation		Fibro ciment	S069	P069	Oui
1er Etage	Lingerie n°5	Conduit de ventilation	X	Fibro ciment	S068	P068	Oui
Sous-sol	Degagement n°4	Conduit de ventilation		Fibro ciment	S389	P068 - idem	Oui

Z024 - Cloisons Enduit Platre							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Sous-sol	Local technique n°1	Cloisons	X	**Enduit Platre**	S070	**P070**	**Non**
		Cloisons		**Enduit Platre**	S071	**P071**	**Non**

Z025 - Marches Enduit ciment							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Sous-sol	Escalier	Marches	X	**Enduit ciment**	S074	**P074**	**Non**
		Marches		**Enduit ciment**	S075	**P075**	**Non**

Z026 - Revêtement de murs Colle de faïence							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	Façades	Revêtement de murs	X	**Colle de faïence**	S076	**P076**	**Non**
		Revêtement de murs		**Colle de faïence**	S077	**P077**	**Non**
		Revêtement de murs		**Colle de faïence**	S078	**P078**	**Non**
		Revêtement de murs		**Colle de faïence**	S079	**P079**	**Non**

Z027 - Revêtement de murs Enduit de façades							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	Façades	Revêtement de murs	X	**Enduit de façades**	S080	**P080**	**Non**
		Revêtement de murs		**Enduit de façades**	S081	**P081**	**Non**
		Revêtement de murs		**Enduit de façades**	S082	**P082**	**Non**
		Revêtement de murs		**Enduit de façades**	S083	**P083**	**Non**

Z028 - Soubassement Enduit ciment							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
Extérieur	**Façades**	Soubassement	X	**Enduit ciment**	S084	**P084**	**Non**
		Soubassement		**Enduit ciment**	S085	**P085**	**Non**
		Soubassement		**Enduit ciment**	S086	**P086**	**Non**
		Soubassement		**Enduit ciment**	S087	**P087**	**Non**

Z029 - Releve d'etancheité Bandes bitumineuses							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
Extérieur	**Toiture 1**	Releve d'etancheité	X	**Bandes bitumineuses**	S088	**P088**	**Non**
		Releve d'etancheité		**Bandes bitumineuses**	S089	**P089**	**Non**

Z030 - Etanchéité de toiture terrasse Bandes bitumineuses							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
Extérieur	**Toiture 1**	Etanchéité de toiture terrasse	X	**Bandes bitumineuses**	S090	**P090**	**Non**

Z031 - Revêtements de plafond Enduit ciment							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
Extérieur	**Façades**	Revêtements de plafond	X	**Enduit ciment**	S092	**P092**	**Oui**

Z032 - Etancheité de casquette Bandes bitumineuses							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
Extérieur	**Façades**	Etancheité de casquette	X	**Bandes bitumineuses**	S094	**P094**	**Non**
		Etancheité de casquette		**Bandes bitumineuses**	S095	**P095**	**Non**

Z033 - Faux-plafond Plaque de faux-plafond							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
Extérieur	**Façades**	Faux-plafond	X	**Plaque de faux-plafond**	S096	**P096**	**Non**
		Faux-plafond		**Plaque de faux-plafond**	S097	**P097**	**Non**

Z034 - Cloisons Enduit Ciment	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Degagement 1	Cloisons		Enduit Ciment	S195	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S194	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S196	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°3	Cloisons	X	Enduit Ciment	S040	P040	Oui
RDC	Chambre n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S197	P040 - idem	Oui
RDC	Salle de sejour n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S198	P040 - idem	Oui
RDC	Chambre n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S199	P040 - idem	Oui
RDC	Salle a manger n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S200	P040 - idem	Oui
RDC	Infirmerie n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S201	P040 - idem	Oui
RDC	Office n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S202	P040 - idem	Oui
RDC	Sanitaire n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S203	P040 - idem	Oui
RDC	Sanitaire n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S204	P040 - idem	Oui
RDC	Chambre n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S205	P040 - idem	Oui
RDC	Chambre n°4	Cloisons		Enduit Ciment	S206	P040 - idem	Oui
RDC	lingerie	Cloisons		Enduit Ciment	S207	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°4	Cloisons		Enduit Ciment	S208	P040 - idem	Oui
RDC	Vestiaires	Cloisons		Enduit Ciment	S209	P040 - idem	Oui
RDC	Degagement n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S210	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°5	Cloisons		Enduit Ciment	S211	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°6	Cloisons		Enduit Ciment	S212	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°7	Cloisons		Enduit Ciment	S213	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°8	Cloisons		Enduit Ciment	S214	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°9	Cloisons		Enduit Ciment	S215	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°10	Cloisons		Enduit Ciment	S216	P040 - idem	Oui
RDC	Sanitaire n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S217	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°11	Cloisons		Enduit Ciment	S218	P040 - idem	Oui
RDC	Bureau n°12	Cloisons		Enduit Ciment	S219	P040 - idem	Oui
RDC	Atelier n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S220	P040 - idem	Oui
RDC	Atelier n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S221	P040 - idem	Oui

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Atelier n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S222	P040 - idem	Oui
RDC	Sanitaire n°4	Cloisons		Enduit Ciment	S223	P040 - idem	Oui
RDC	Sanitaire n°5	Cloisons		Enduit Ciment	S224	P040 - idem	Oui
RDC	Office n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S225	P040 - idem	Oui
RDC	Atelier n°4	Cloisons		Enduit Ciment	S226	P040 - idem	Oui
RDC	Atelier n°5	Cloisons		Enduit Ciment	S227	P040 - idem	Oui
RDC	Atelier n°6	Cloisons		Enduit Ciment	S228	P040 - idem	Oui
RDC	Lingerie n°1	Cloisons		Enduit Ciment	S229	P040 - idem	Oui
1er Etage	Bureau n°13	Cloisons		Enduit Ciment	S262	P040 - idem	Oui
1er Etage	Office n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S261	P040 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°5	Cloisons		Enduit Ciment	S260	P040 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°6	Cloisons		Enduit Ciment	S259	P040 - idem	Oui
1er Etage	Salle de sejour n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S258	P040 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°7	Cloisons		Enduit Ciment	S257	P040 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°8	Cloisons		Enduit Ciment	S256	P040 - idem	Oui
1er Etage	Infirmerie n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S255	P040 - idem	Oui
1er Etage	SDB	Cloisons		Enduit Ciment	S254	P040 - idem	Oui
1er Etage	Sanitaire n°6	Cloisons		Enduit Ciment	S253	P040 - idem	Oui
1er Etage	Sanitaire n°7	Cloisons		Enduit Ciment	S252	P040 - idem	Oui
1er Etage	Chambre	Cloisons		Enduit Ciment	S251	P040 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°9	Cloisons		Enduit Ciment	S250	P040 - idem	Oui
1er Etage	Lingerie n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S249	P040 - idem	Oui
1er Etage	Degagement n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S248	P040 - idem	Oui
1er Etage	Lingerie n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S247	P040 - idem	Oui
1er Etage	Vestiaire	Cloisons		Enduit Ciment	S246	P040 - idem	Oui
1er Etage	Lingerie n°4	Cloisons		Enduit Ciment	S245	P040 - idem	Oui
1er Etage	Salle a manger n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S244	P040 - idem	Oui
1er Etage	Office n°4	Cloisons		Enduit Ciment	S243	P040 - idem	Oui
1er Etage	Bureau n°14	Cloisons		Enduit Ciment	S242	P040 - idem	Oui

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er Etage	Salle de sejour n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S241	P040 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°10	Cloisons		Enduit Ciment	S240	P040 - idem	Oui
1er Etage	Bureau n°15	Cloisons		Enduit Ciment	S239	P040 - idem	Oui
1er Etage	Sanitaire n°8	Cloisons		Enduit Ciment	S238	P040 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°11	Cloisons		Enduit Ciment	S237	P040 - idem	Oui
1er Etage	Sanitaire n°9	Cloisons		Enduit Ciment	S236	P040 - idem	Oui
1er Etage	Sanitaire n°10	Cloisons		Enduit Ciment	S235	P040 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°12	Cloisons		Enduit Ciment	S234	P040 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°13	Cloisons		Enduit Ciment	S233	P040 - idem	Oui
1er Etage	Chambre n°14	Cloisons		Enduit Ciment	S232	P040 - idem	Oui
1er Etage	Lingerie n°5	Cloisons		Enduit Ciment	S231	P040 - idem	Oui
Sous-sol	Degagement n°4	Cloisons		Enduit Ciment	S393	P040 - idem	Oui
Sous-sol	Sous station	Cloisons		Enduit Ciment	S394	P040 - idem	Oui
Sous-sol	Local technique n°2	Cloisons		Enduit Ciment	S395	P040 - idem	Oui
Sous-sol	Local technique n°3	Cloisons		Enduit Ciment	S396	P040 - idem	Oui
RDC	WC	Cloisons		Enduit Ciment	S230	P040 - idem	Oui

Z035 - Revêtement de sol Linoeum+colle — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er Etage	Office n°3	Revêtement de sol	X	Linoeum+colle	S051	P051	Oui

Z036 - Revêtements de plafond Enduit ciment — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	Façades	Revêtements de plafond	X	Enduit ciment	S093	P093	Non

Z037 - Etanchéité de toiture terrasse Bandes bitumineuses							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	**Toiture 1**	Etanchéité de toiture terrasse	X	**Bandes bitumineuses**	S091	**P091**	**Oui**

Z038 - Revêtement de sol Linoeum + colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	**Ascenseur n°1**	Revêtement de sol	X	**Linoeum + colle**	S024	**P024**	**Non**

Z039 - Murs de refend Enduit ciment							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er Etage	**Chambre n°10**	Murs de refend	X	**Enduit ciment**	S065	**P065**	**Non**

Z040 - Murs de refend Enduit ciment							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er Etage	**Chambre n°11**	Murs de refend	X	**Enduit ciment**	S064	**P064**	**Non**

Z041 - Revêtements de plafond Enduit Ciment							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er Etage	**Chambre n°12**	Revêtements de plafond	X	**Enduit Ciment**	S067	**P067**	**Non**

Z042 - Revêtement de murs Colle de faïence							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er Etage	**Infirmerie n°2**	Revêtement de murs	X	**Colle de faïence**	S058	**P058**	**Non**
1er Etage	**SDB**	Revêtement de murs		**Colle de faïence**	S059	**P059**	**Non**

Z043 - Revêtement de murs Colle de plinthes							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
1er Etage	**Sanitaire n°6**	Revêtement de murs	X	**Colle de plinthes**	S054	**P054**	**Non**
		Revêtement de murs		**Colle de plinthes**	S055	**P055**	**Non**

ANNEXE CERTIFICAT DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

CERTIFIÉ abcidia CERTIFICATION opérateur de diagnostics immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

BEAUFILS Baptiste
sous le numéro 19-1453

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☑ **Amiante** sans mention — Prise d'effet : 05/03/2020 — Validité : 04/03/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Amiante** avec mention — Prise d'effet : 05/03/2020 — Validité : 04/03/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **DPE** individuel — Prise d'effet : 14/06/2019 — Validité : 13/06/2024
Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011

☑ **Gaz** — Prise d'effet : 14/06/2019 — Validité : 13/06/2024
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES Accréditation n°4.0040 portée disponible sur www.cofrac.fr

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat. A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE

Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités : c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**
Pour la société :
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

Document :	Document 1

BUREAU VERITAS
Technoparc des Bocquets
110 Allée Robert Lemasson
76230 BOIS GUILLAUME

Téléphone : 02.35.59.46.00
Télécopie : 02.35.59.46.46
florent.pierrain@fr.bureauveritas.com

Réf. client : 2277746
Rapport N°: REN 7.11/028/FP
Rapport établi le *03/03/2011* par Florent PIERRAIN

CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY
4 RUE PAUL ELUARD
BP 45
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

A l'attention de Mr NELLY

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION (Article R1334-27 du Code de la Santé Publique)

ATTENTION CONTIENT DE L'AMIANTE (1)
Cf. conclusions au § 1



Lieu d'intervention	**Bâtiment Jacques Lacan 412**
Adresse	Centre Hospitalier du Rouvray 4 Rue Paul Eluard – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Intervention du	21/02/2011 et du 28/02/2011

En présence de : Mr NELLY

Opérateur de repérage : **Florent PIERRAIN**
Laboratoire accrédité COFRAC pour les analyses (sous le n° 1-1751) :
EUROFINS LEM – 67701 SAVERNE

Ce rapport comporte 41 pages dont 5 annexes

Le chargé d'affaire Diagnostiqueur : Florent PIERRAIN

(1) dans le cadre de la mission qui nous a été confié

Bureau Veritas Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
67/71 Boulevard du Château 92200 Neuilly-sur-Seine RCS Nanterre B775 690 621
RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1
Copyright Bureau Veritas 12/2010

SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS 3
1.1. Conclusion Générale 3
1.2. Matériaux Déclarés Amiantés après Analyse (TAB « MDAA ») 3
1.3. Matériaux Déclarés Amiantés sur décision de l'Opérateur (TAB « MDAO ») 3
1.4. Matériaux Déclarés ne contenant pas d'Amiante après Analyse (TAB « MDSAA ») 4
1.5. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires (TAB « ZLNV ») 5
1.6. Composants de la construction Nécessitant des Investigations Approfondies (TAB « CNIA ») 5
1.7. Autres Composants Particuliers susceptibles de Nécessiter des Investigations Approfondies (TAB « CPNIA ») 5
2. PREAMBULE 6
3. OBJET DE LA MISSION 6
4. TEXTES DE REFERENCE 7
5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC 7
6. VISITE DES LOCAUX 3
6.1. Récolement des données 3
6.1.1. Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite. *8*
6.1.2. Conclusion de ces documents. *8*
6.2. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés 9
6.3. Remarques complémentaires 9
ANNEXE 1 : LISTE DES LOCAUX VISITES 10
ANNEXE 2 : REPERAGE DES MATERIAUX, PRELEVEMENTS & INVESTIGATIONS 12
ANNEXE 3 : ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S) 19
ANNEXE 4 : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE 22
ANNEXE 5 : COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 41

1. CONCLUSIONS

1.1. CONCLUSION GENERALE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante : (Se reporter aux tableaux TAB « MDAA » et « MDAO »)

1.2. MATERIAUX DECLARES AMIANTES APRES ANALYSE (TAB « MDAA »)

Matériau	N° prélèvement	Localisation du prélèvement ou du matériau	Nature - description	Présence amiante	Observations éventuelles	Etat de conservation ou de dégradation	Réf. photo
Dalle de sol et colle	P5	RDC Couloirs placard technique, cage escalier R+1 Couloirs cage escalier	Grise et colle noire	Oui	/	Bon état	5
Dalle de sol et colle	P6	RDC Couloirs cage escalier chambres salle de séjour ateliers entrée R+1 Lingeries vestiaires chambres bureau office cage escalier	Beige et colle noire	Oui	/	Bon état	6
Dalle de sol et colle	P7	RDC Bureaux R+1 Chambres salle de séjour salle à manger	Bleue et colle noire	Oui	/	Bon état	7
Dalle de sol et colle	P8	R+1 Sanitaires	Noire et colle noire	Oui	/	Dégradé	8
Ragréage des revêtements souples	P12	RDC Chambres, Bureau R+1 Chambres, Bureau	Ciment	Oui	Seul le ragréage contient des fibres d'amiante	Bon état	12
Joints de brides	P16	Local sous station Sous-sol	Granuleux	Oui	/	Bon état	16
Plaquette de freins	P18	Machinerie ascenseur - édicule	Granuleux fibreux	Oui	/	Bon état	18

RAPPEL :

En cas de présence avérée d'amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent être engagées.

1.3. MATERIAUX DECLARES AMIANTES SUR DECISION DE L'OPERATEUR (TAB « MDAO »)

Matériau	Localisation du matériau	Nature - description	Présence amiante	Observations éventuelles	Etat de conservation ou de dégradation	Réf. Photo
Gaines de ventilation	R+1 Lingeries	fibrociment	Oui	X 4 Gaines	Bon état	19 et 20
Gaines de ventilation	R-1 dégagement	fibrociment	Oui		Bon état	21
Fourreau	R-1 Caves	fibrociment	Oui	X 4 Gaines	Bon état	22

RAPPEL :

En cas de présence avérée d'amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent être engagées.

Copyright Bureau Veritas 12/2010

1.4. MATERIAUX DECLARES NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE (TAB « MDSAA »)

Matériau	N° prélèvement	Localisation du prélèvement ou du matériau	Nature - description	Présence amiante	Observations éventuelles	Réf. photo
Colle faïence	P1	Façades extérieures	Colle ciment	Non	/	1
Panneaux de faux plafond	P2	Locaux RDC et R+1	Matériaux granuleux	Non	/	2
Colle ragréage carrelage	P3	RDC Sanitaires, Lingeries, Infirmerie, office atelier R+1 Sanitaires, Lingeries, Infirmerie, office	Colle ciment	Non	/	3
Colle faïence	P4	RDC Sanitaires, atelier, office. R+1 Sanitaires, infirmerie, office	Colle ciment	Non	/	4
Plaque produit noir	P9	Sous évier métallique – RDC atelier – R+1 office	Matériaux bitumineux	Non	/	9
Colle ragréage carrelage	P10	RDC Sanitaires R+1 Sanitaires	Colle ciment	Non	/	10
Colle ragréage carrelage	P11	RDC Sanitaires	Colle ciment	Non	/	11
Colle et revêtement souple	P12	RDC Chambre, Bureau R+1 Chambres, Bureau	Colle jaune – plaque souple	Non	Seul le ragréage contient des fibres d'amiante	12
Colle ragréage revêtement moquette	P13	RDC Bureaux	Colle jaune	Non	/	13
Plaques et colle	P14	Murs Locaux RDC et R+1	Colle jaune – plaque dure	Non	/	14
Calorifuge	P15	Locaux sous-sol - Caves	Matériaux bitumineux – laine de verre	Non	/	15
Etanchéité	P17	Terrasse	Matériaux bitumineux	Non	/	17

Copyright Bureau Veritas 12/2010

1.5. ZONES ET LOCAUX NON VISITES NECESSITANT DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES (TAB « ZLNV »)

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas toute omission éventuelle à ce titre et de confier à Bureau Veritas, le cas échéant , une mission complémentaire relative au diagnostic des locaux et zones omis.

Pas de local non visité identifié.

1.6. COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION NECESSITANT DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES (TAB « CNIA »)

Sans Objet

1.7. AUTRES COMPOSANTS PARTICULIERS SUSCEPTIBLES DE NECESSITER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES (TAB « CPNIA »)

Le tableau ci-dessous répertorie des composants susceptibles de contenir de l'amiante mais dont il est matériellement impossible d' évaluer la présence pour les raisons invoquées dans ce tableau. Ces éléments sont fournis pour information mais nécessitent l'attention du donneur d'ordre et des entreprises intervenantes.
En cas de travaux les concernant, le donneur d'ordre devra faire procéder régulièrement au diagnostic de ces éléments.

Matériau suspect	Localisation du matériau	Aspect	Observations/remarques/motifs
Conduits enterrés	Descentes d'eaux pluviales au-delà des regards de collecte	Non visibles	Non évaluables sans travaux lourd de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait si ces éléments sont concernés par les travaux.

Copyright Bureau Veritas 12/2010

2. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante **des principaux éléments de la construction dans le cadre de démolition de l'immeuble sis :**

Bâtiment Jacques Lacan 412 - Centre Hospitalier du Rouvray - 4 Rue Paul Eluard – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

3. OBJET DE LA MISSION

Etablir le repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux en regard de la liste figurant en annexe 1 de l'arrêté du 2 janvier 2002, et **notamment** les composants suivants :

- Toiture et étanchéité.
- Façades.
- Parois verticales intérieures et enduits.
- Plafonds et faux plafonds.
- Revêtements de sols et de murs.
- Conduits, canalisations et équipements.
- Ascenseurs et monte-charge.
- Equipements divers.
- Installations industrielles.
- Voies et réseaux divers.

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants de la construction affectés par les travaux font l'objet du présent repérage (voir paragraphe 6).

4. TEXTES DE REFERENCE

- Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29 et annexe 13-9.
- Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 – articles R1336-2 à R1336-5
- Code du travail - Section 3 Risques d'exposition à l'amiante - articles R4412-94 à R4412-148
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique
- Arrêté du 7 février 1996, relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.
- Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article R. 1334-27 du Code de la Santé Publique
- Norme NFX 46-020 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

La mission de diagnostic est réalisée par un ou des opérateurs de repérage de Bureau VERITAS titulaire(s) de la certification de personne dans le domaine de l'amiante.

M. Florent PIERRAIN est certifié dans le domaine de l'amiante depuis le 21/08/2007 par *Afnor CERTIFICATION*, organisme certificateur dans le domaine de l'amiante, accrédité par le COFRAC.

Certificat N° ODI/AM/07022299
Date limite de validité de la certification : 22/08/2012

Phase de repérage :

La recherche est effectuée sur la base d'une inspection visuelle dont l'objectif est de repérer les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Phase d'analyse d'échantillons :

Les prélèvements éventuels font l'objet d'une analyse par le laboratoire « EUROFINS LEM », accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1751.

Copyright Bureau Veritas 12/2010

6. VISITE DES LOCAUX

La visite a été effectuée le 21/02/2011 et 28/02/2011 accompagné de : M. .NELLY

Présence d'une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages : **NON**

Présence de la société de maintenance des ascenseurs : **NON**

Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : **NON**

Présence d'une personne habilitée à ouvrir les locaux TGBT : **SANS OBJET**

On se reportera à l'annexe 1 qui précise les locaux visités et au paragraphe qui liste les zones et locaux non visités (TAB « ZLNV ».

6.1. RECOLEMENT DES DONNEES

6.1.1. Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite.

- Plans fournis : **oui**

- Anciens rapports de repérage : **non**

6.1.2. Conclusion de ces documents.

Sans objet

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante, communiqués à BUREAU VERITAS dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics et constats.

6.2. DEMARCHES REGLEMENTAIRES EN PRESENCE DE MATERIAUX AMIANTES

Préalablement aux travaux de démolition, même partiels, des travaux de retrait des matériaux amiantés sont obligatoires (sauf lorsqu'ils apportent un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place).

- L'entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant notamment son mode opératoire, l'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l'amiante. etc. Les travaux ne pourront débuter qu'un mois après la date de réception du plan de retrait par l'Inspection du Travail, la CRAM, l'OPPBTP et la médecine du travail.
- Les travailleurs intervenants doivent être titulaires d'une attestation de compétence délivrée par un organisme de formation certifié.
- Pour réaliser le retrait de matériaux dits friables ou de matériaux non friables représentant un risque particulier (présents à l'intérieur du bâti) l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification auprès d'un organisme certificateur accrédité.

Tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l'amiante, mais dont l'intervention est susceptible de libérer des fibres d'amiante et par voie de conséquence de l'y exposer, entre dans le champ d'application de la sous-section 4 défini à l'article R. 4412-139 du Code du travail et doit bénéficier des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-113 et R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail.

Les travailleurs concernés bénéficient, préalablement à toute activité ou intervention en présence d'amiante, d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante suivant les dispositions de l'Arrêté du 22 décembre 2009.

6.3. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

Sans objet

Copyright Bureau Veritas 12/2010

ANNEXE 1. : LISTE DES LOCAUX VISITES

ANNEXE 1

LISTE DES LOCAUX VISITES

[cette annexe comporte 1 + 1 page(s)]

La présente liste présente les locaux et /ou zones ayant été inspectés par l'opérateur dans le cadre de la mission confiée à Bureau Veritas.
Le tableau « ZLNV figurant au paragraphe 1.5 du présent rapport, précise les locaux et zones qui, à la connaissance de l'opérateur n'ont pu être visités.

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux et zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

BATIMENT	NIVEAU	ZONES OU LOCAUX VISITES	CIRCONSTANCES DE LA VISITE
Jacques Lacan 412	R-1	Ensembles des locaux	Présence de meubles et de matériel
Jacques Lacan 412	RDC	Ensembles des locaux	Présence de meubles et de matériel / absence de lumière
Jacques Lacan 412	R+1	Ensembles des locaux	Présence de meubles et de matériel
Jacques Lacan 412	Terrasse	Ensembles des locaux	/

ANNEXE 2. : REPERAGE DES MATERIAUX, PRELEVEMENTS & INVESTIGATIONS


Les documents, fournis dans cette annexe sont la traduction visuelle des constats effectués en tête de rapport.

ANNEXE 2

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE
LOCALISATION DES PRELEVEMENTS & DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

(DOSSIERS PLANS ET PHOTOS)

[cette annexe comporte 1 + 8 page(s)]

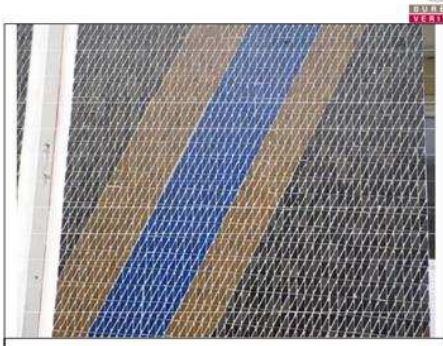	
Réf : 1 Faïence façades extérieures	Réf : 2 Panneaux de faux plafond RDC et R+1
	
Réf : 3 Carrelage RDC et R+1 Sanitaires offices lingeries infirmeries, atelier.	Réf : 4 Faïence RDC et R+1 Sanitaires offices atelier, infirmeries
	
Réf : 5	Réf : 6

Copyright Bureau Veritas 12/2010



Réf : 7



Réf : 8



Réf : 9



Réf : 10



Réf : 11



Réf : 12



Réf : 13

Réf : 14



Réf : 15

Réf : 16



Réf : 17


Réf : 18



Réf : 19 Gaines ventilations R+1 lingerie	Réf : 20 Gaines ventilations R+1 lingerie



Réf : 21 Gaines ventilations R-1 dégagement	Réf : 22 Fourreau

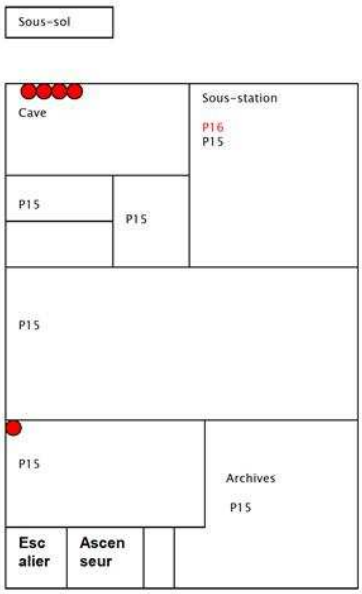

BUREAU VERITAS

Technoparc des Bocquets
110 Allée R. Lemasson

76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX

Tél. 02.35.59.46.00
Fax. 02.35.59.46.46

Rapport de mission de repérage des matériaux et produit contenant de l'amiante avant démolition

LEGENDE


- Gaines et fourreau type fibrociment
- P16 Joints de brides types Chrysotile
- P15 Calorifuge sans amiante

Client : Centre Hospitalier du Rouvray

N° Affaire : 2277746

Adresse du site : Bâtiment Jacques Lacan (412) - 4 Rue Paul Eluard – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

Réalisé le : 03/03/2011

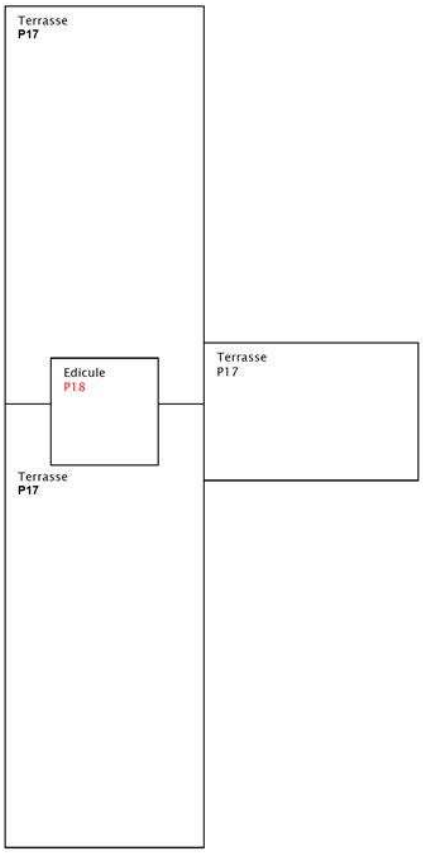

BUREAU VERITAS

Technoparc des Bocquets
110 Allée R. Lemasson

76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX

Tél. 02.35.59.46.00
Fax. 02.35.59.46.46

Rapport de mission de repérage des matériaux et produit contenant de l'amiante avant démolition

LEGENDE

P17	Etanchéité sans amiante
P18	Frein machine ascenseur type chrysotile

Client : Centre Hospitalier du Rouvray

N° Affaire : 2277746

Adresse du site : Bâtiment Jacques Lacan (412) - 4 Rue Paul Eluard – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

Réalisé le : 03/03/2011

ANNEXE 3. : ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S)

ANNEXE 3

ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S)

[cette annexe comporte 1 + 2 page(s)]

Attestation d'assurance :

HISCOX

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0084283

LE PRENEUR D'ASSURANCE

Souscripteur : BUREAU VERITAS
67/71 BOULEVARD DU CHATEAU
92200 NEUILLY SUR SEINE

Assuré : BUREAU VERITAS

LES CONDITIONS DE GARANTIE

Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox : Diagnostiqueurs immobilier

ACTIVITES DE L'ASSURE

Activités de diagnostics Immobiliers dont notamment :

Contrôle périodique amiante
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
Diagnostic amiante après travaux ou démolition
Dossier technique amiante

Ainsi que toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil aux clients, découlant directement des missions de Diagnostics ci-dessus, et ce y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

PERIODE DE VALIDITE

La présente attestation est valable pour la période du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011.
La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des termes et limites du contrat auquel elle se réfère.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE et/ou RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON
(Les garanties s'appliquent par sinistre et par année d'assurance.)

- Montant des garanties	1 000 000,00 Euros
Dont :	
- Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non	1 000 000,00 Euros

Fait à Paris, le 11/01/2011
Pour les Assureurs

11/01/2011 10:53
RCP0084283

Adresse postale : 12, quai des Queyries 33100 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10 – Fax : 0810 00 71 02
Siège social :19, rue Louis le Grand - 75002 Paris - N°ORIAS 07 006 739
S.A.R.L. au capital de 3 512 715 Euros - R.C.S Paris B401 121 090 00039 - N° TVA Intracommunautaire FR03401121090
Page 1 / 1

Certificat(s) :


CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
Opérateur Technique de Diagnostic Immobilier
AMIANTE
Repérage et diagnostic amiante

Nom : PIERRAIN
Prénom : FLORENT
N° : ODI/AM/07022299
Délivré le : 21/08/2007
Expire le : 22/08/2012

Ce certificat demeure la propriété exclusive d'AFNOR Certification. Il est remis à titre rigoureusement personnel au porteur pour lui permettre de faire part de sa certification dans le respect d'une information claire et sincère.

AFNOR Certification

Signature du Titulaire

ANNEXE 4. : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE

ANNEXE 4

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE

[cette annexe comporte 1 + 18 page(s)]

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-002**
Version du : 02/03/2011 13:46 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 2 - Panneaux faux-plafond - RDC et R+1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Plaque semi dure**	
Description microscopique en MOLP	matériaux granuleux, fibres de papier, fibres de verre	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Pas de fibre d'amiante**	HSG 248(MDHS 77)

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Eurofins LEM - Site de Saverne
ACCREDITATION N° 1-1751
cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-003**
Version du : 02/03/2011 13:46
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 3 - Carrelage + colle - RDC et R+1

Page 1 sur 1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**colle ragréage carrelage**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 91 91 91 - fax 03 88 91 05 31 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 500 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION N° 1-5751 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-004**
Version du : 02/03/2011 13:48 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 4 - Faience + colle - RDC et R+1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**colle ragréage carrelage**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
ACCREDITATION N° 1-1751 Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-005**
Version du : 02/03/2011 13:48 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 5 - Dalle de Sol + colle - RDC et R+1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Colle noire**	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	**Plaque dure**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soum à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 91 91 91 - fax 03 88 91 05 31 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013
ACCREDITATION N° 1-5751 Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-006**
Version du : 02/03/2011 13:48 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 6 - Dalle de Sol + colle - RDC et R+1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Colle noire**	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	**Plaque dure**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 91 11 91 - fax 03 88 91 05 31 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

Copyright Bureau Veritas 12/2010

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-007**
Version du : 02/03/2011 13:46 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 7 - Dalle de Sol + colle - RDC et R+1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Colle noire**	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	**Plaque dure**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soum à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 910 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013
ACCREDITATION N° 1-1751 Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-008**
Version du : 02/03/2011 13:46 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 8 - Dalle de Sol + colle - RDC et R+1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Colle noire**	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	**Plaque dure**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soum à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Eurofins LEM - Site de Saverne
ACCREDITATION N° 1-1751
cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-009**
Version du : 02/03/2011 13:46 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 9 - Plaque produit noir + colle - Sous evier RDC et R+1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Matériau bitumineux**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 910 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION N° 1-1751 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-010**
Version du : 02/03/2011 13:48 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 10 - Carrelage + colle - RDC et R+1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**colle ragréage carrelage**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 910 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION N° 1-1751 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-011**
Version du : 02/03/2011 13:46 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 11 - Carrelage + colle - RDC

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**colle ragréage carrelage**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 910 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 500 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION N° 1-1751 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-012**
Version du : 02/03/2011 13:46 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 12 - Revêtement plastique+colle+ragréage - RDC et R+1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Colle jaune**	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Pas de fibre d'amiante**	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	**Colle noire et ragréage**	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Matériau granuleux	
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 3		
Description visuelle	**Plaque souple**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soum à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 910 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

cofrac ESSAIS
ACCREDITATION N° 1-5751 Portée disponible sur www.cofrac.fr

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-013**
Version du : 02/03/2011 13:48 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 13 - Revêtement moquette+colle+ragréage - RDC

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Colle jaune Mousse Moquette**	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Fibres synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Pas de fibre d'amiante**	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	**Ragréage**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soum à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 91 91 91 - fax 03 88 91 05 31 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 500 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013
ACCREDITATION N° 1-5751 Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-014**
Version du : 02/03/2011 13:48 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 14 - Plaques+colle - Murs RDC et R+1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Colle jaune**	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Fibres synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Pas de fibre d'amiante**	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	**Plaque dure**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 3		
Description visuelle	**Peinture**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soum à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél: 03 88 911 911 - fax 03 88 910 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013
ACCREDITATION N° 1-1751 Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-015**
Version du : 02/03/2011 13:48
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 15 - Calorifuge - Sous sol

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Laine de verre hétérogène**	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Fibres synthétique Fibres de verre	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Pas de fibre d'amiante**	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	**Matériau bitumineux**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 910 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION N° 1-1751 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S007888-001**
Version du : 02/03/2011 13:48 Page 1 sur 1
Date de réception : 25/02/2011
Référence dossier : 1510003868/023
227 77 46
BATIMENT JACQUES LACAN 412
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Référence échantillon : 1 - Faience + colle - Façades extérieures bat Lacan

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**colle ragréage carrelage**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 910 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION N° 1-1751 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S008273-001**
Version du : 02/03/2011 17:06 Page 1 sur 1
Date de réception : 01/03/2011
Référence dossier : Cde : 1510003868/028
Dossier : 2277746
Site : Centre Hospitalier du Rouvray - 4 Rue Paul eluard - 76300 Sotteville Les Rouen
Référence échantillon : N°16 - Joints brides - Local ss station - ss sol bât Jacques Lacan - 412

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Joint	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	HSG 248(MDHS 77)

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 91 91 91 - fax 03 88 91 05 31 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 500 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION N° 1-1751 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008273-002
Version du : 02/03/2011 17:06 — Page 1 sur 1
Date de réception : 01/03/2011
Référence dossier : Cde : 1510003868/028
Dossier : 2277746
Site : Centre Hospitalier du Rouvray - 4 Rue Paul eluard - 76300 Sotteville Les Rouen
Référence échantillon : N°17 - Etanchéité terrasse - bât Jacques Lacan 412

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Plaque semi dure**	
Description microscopique en MOLP	matériaux granuleux, fibres de papier, fibres de verre	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Pas de fibre d'amiante**	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	**Matériau bitumineux**	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	1	
* **Résultat de l'analyse par MET**	**Pas de fibre d'amiante**	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
23 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél: 00 65 911 911 - fax 03 88 910 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 533 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION n° 1-5754 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | LEM

BUREAU VERITAS
Mme MERCIER
Technoparc des Bocquets
110 allée Robert Le Masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008273-003
Version du : 02/03/2011 17:06 Page 1 sur 1
Date de réception : 01/03/2011
Référence dossier : Cde : 1510003868/028
Dossier : 2277746
Site : Centre Hospitalier du Rouvray - 4 Rue Paul eluard - 76300 Sotteville Les Rouen
Référence échantillon : N°18 - Plaquette de frein - Machinerie ascenseur édicule - bât Jacques Lacan 412

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Matériau hétérogène**	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux Fibres synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	HSG 248(MDHS 77)

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soum à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.
Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél: 03 88 91 91 91 - fax 03 88 91 85 31 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 820 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013
ACCREDITATION n° 1-5701 Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

ANNEXE 5. : COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

ANNEXE 5

COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]

ABSENCE DE RAPPORT ANTERIEUR FOURNI PAR LE CLIENT
ANNEXE SANS OBJET

Commentaire :	

Document :	Document 2

APAVE
AGENCE DE ROUEN

2 rue des Mouettes CS 90098
76132 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
N° SIRET : 90386907101236

DONNEUR D'ORDRE
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
4 RUE PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
CONTACT : M BAUDEL

Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents

Numéro d'offre :
Numéro de contrat :
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T250783005**
Date : **06/06/2025**

Lieu d'intervention :

BATIMENT 412 Ancien Lacan
4 rue PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

Destinataire rapport :
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

Date d'intervention :
Du **22/05/2025** au **22/05/2025**

Intervenant : **Monsieur Baptiste BEAUFILS**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 70 pages

APAVE Infrastructures et Construction France
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE CEDEX

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES ... 3
DESIGNATION DU BATIMENT ... 3
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE ... 3
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE ... 3
EXÉCUTION DE LA MISSION ... 3
SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE ... 3
CONCLUSION(S) DU RAPPORT ... 3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES : ... 4
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES : ... 4
RESULTATS DU REPERAGE ... 4
MATERIAUX DE LA LISTE A CONTENANT DE L'AMIANTE ... 4
MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B CONTENANT DE L'AMIANTE ... 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE ... 6
PRECONISATIONS ... 15
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION ... 16
OBJECTIF ... 16
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES ... 16
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE ... 16
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION ... 17
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) ... 19
ANNEXE CROQUIS ... 20
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION ... 26
ANNEXE ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS ... 33
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES ... 64
ANNEXE ATTESTATION DE COMPETENCE ... 68
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE ... 69
ANNEXE AUTRES DOCUMENTS ... 70

Repérage amiante listes A et B
Numéro d'offre : T250783005
Numéro de contrat :105095 A

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN	Numéro de Lot :	
		Date du Permis de Construire :	Antérieur au 1er juillet 1997
Étage :	1	Nature du bâtiment :	ERP
Bâtiment :	412 Ancien Lacan	Cat. du bâtiment :	Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
Adresse :	4 RUE PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Qualité :	

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom:	CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
Adresse :	4 RUE PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	BEAUFILS Baptiste	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
N° certificat de qualification :	19-1453	Adresse laboratoire :	ZI de Petite Synthe Bâtiment B1 1294 rue Achille Peres , Z.I. de Petite Synthe 59640 Dunkerque
Date d'obtention :	05/03/2020	Numéro d'accréditation :	1-1935
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	ABCIDIA CERTIFICATION	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA FRANCE IARD
		Adresse assurance :	313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
Date de la commande :	27/05/2025	N° de contrat d'assurance :	10800807204
Accompagnateur :	M BAUDEL	Date de validité :	31/12/2025

1.4 SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Nom du diagnostiqueur : BEAUFILS Baptiste
AGENCE DE ROUEN 2 rue des Mouettes CS 90098 76132 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX

Signature



DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Lieu et date d'établissement du rapport

Fait à MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
Le 06/06/2025

2 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré à ce stade de la mission des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1 Liste des locaux non visités :

Etage	Local / partie d'immeuble	Justification	Moyen d'accès à prévoir
RDC	Lingerie n°1	Porte Fermée à clé.	

Certains locaux restant non visités et/ou certaines parties de l'immeuble restant inaccessibles, les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012.

2.2 Liste des éléments non inspectés :

Aucun

3 RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

3.1 Matériaux de la liste A contenant de l'amiante

Absence

3.2 Matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante

3.2.1 Matériaux et produits nécessitant une évaluation périodique (EP)

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage
RDC	Hall	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse (P001)	
RDC	Bureau n°1	Revêtement de sol	Dalle de sol Bleu	Résultat d'analyse (P002)	
1er Etage	Sanitaire	Revêtement de sol	Dalle de sol Noir	Résultat d'analyse (P004)	
RDC	Bureau n°3	Revêtement de sol	Dalle de sol Bleu	Résultat d'analyse	
RDC	Chambre 1 à 5	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
RDC	Salle de sejour n°1	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
RDC	Salle a manger n°1	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
RDC	Office n°1	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
RDC	Atelier n°1	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
RDC	Atelier n°2	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
RDC	Atelier n°3	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
RDC	Atelier n°5	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
RDC	Atelier n°6	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
RDC	Cage d'escalier n°1	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
RDC	Cage d'escalier n°2	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
RDC	Cage d'escalier n°3	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
1er Etage	Chambre 1 à 12	Revêtement de sol	Dalle de sol Bleu	Résultat d'analyse	
1er Etage	Couloir n°1	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
1er Etage	Bureau n°13	Revêtement de sol	Dalle de sol Bleu	Résultat d'analyse	
1er Etage	Salle de sejour n°2	Revêtement de sol	Dalle de sol Bleu	Résultat d'analyse	
1er Etage	Office n°3	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
1er Etage	Lingerie n°4	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage
1er Etage	Vestiaire	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
1er Etage	Lingerie n°5	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
1er Etage	Salle a manger n°2	Revêtement de sol	Dalle de sol Bleu	Résultat d'analyse	
1er Etage	Salle de sejour n°3	Revêtement de sol	Dalle de sol Bleu	Résultat d'analyse	
1er Etage	Office n°4	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
1er Etage	Bureau n°14	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
Sous sol	Degagement	Conduit de fluide	Fibre-ciment	Jugement personnel	
RDC	Couloir n°2	Revêtement de sol	Dalle de sol Grise	Résultat d'analyse	
		Revêtement de sol	Dalle de sol Bleu	Résultat d'analyse	

EP / Recommandation de gestion : Le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate. Il convient de :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

3.2.2 Matériaux et produits nécessitant une action corrective de premier niveau (AC1)

Absence

3.2.3 Matériaux et produits nécessitant une action corrective de second niveau (AC2)

Absence

3.3 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Liste (A/B)	Hors Champ d'Investigation	Critère ayant permis de conclure	Réf sondage
RDC	Bureau n°1	Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Bureau n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse (P003)	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Revêtement de sol	Dalle de sol Souple	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
Sous-sol	Sous station	Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	B		Résultat d'analyse (P005)	
		Conduit de fluide	Calorifugeage	A		Résultat d'analyse (P006)	
Sous-sol	Local technique n°1	Conduit de fluide	Calorifugeage	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	B		Résultat d'analyse	
Sous-sol	Local technique n°2	Conduit de fluide	Calorifugeage	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	B		Résultat d'analyse	
Sous-sol	Local technique n°3	Conduit de fluide	Calorifugeage	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	B		Résultat d'analyse	
RDC	Bureau n°3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Bureau n°4	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Liste (A/B)	Hors Champ d'Investigation	Critère ayant permis de conclure	Réf sondage
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Bureau n°5	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Bureau n°6	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Bureau n°7	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Bureau n°8	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Bureau n°9	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Bureau n°10	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Bureau n°11	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Liste (A/B)	Hors Champ d'Investigation	Critère ayant permis de conclure	Réf sondage
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Bureau n°12	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Chambre 1 à 5	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Salle de sejour n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Infirmerie n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Marquage du matériau	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Salle a manger n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Office n°1	Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Sanitaires H	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A			

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Liste (A/B)	Hors Champ d'Investigation	Critère ayant permis de conclure	Réf sondage
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Sanitaire F n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A			
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Atelier n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Atelier n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Office n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A			
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Atelier n°3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Liste (A/B)	Hors Champ d'Investigation	Critère ayant permis de conclure	Réf sondage
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Lingerie n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A			
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Atelier n°4	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A			
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Atelier n°5	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Marquage du matériau	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Sanitaires n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
RDC	Atelier n°6	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Liste (A/B)	Hors Champ d'Investigation	Critère ayant permis de conclure	Réf sondage
RDC	Cage d'escalier n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
RDC	Cage d'escalier n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
RDC	Cage d'escalier n°3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
1er Etage	Chambre 1 à 12	Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
1er Etage	Couloir n°1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Bureau n°13	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Salle de sejour n°2	Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
1er Etage	Office n°3	Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Infirmerie n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Liste (A/B)	Hors Champ d'Investigation	Critère ayant permis de conclure	Réf sondage
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Sanitaire H	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Marquage de materiaux	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Sanitaire F n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Marquage de materiaux	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Lingerie n°3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Marquage de materiaux	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Lingerie n°4	Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Vestiaire	Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Repérage amiante listes A et B

Numéro d'offre : T250783005
Numéro de contrat :105095 A

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Liste (A/B)	Hors Champ d'Investigation	Critère ayant permis de conclure	Réf sondage
1er Etage	Lingerie n°5	Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Salle a manger n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Salle de sejour n°3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Office n°4	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Bureau n°14	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Résultat d'analyse	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Bureau n°15	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Marquage du matériau	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Sanitaires n°2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Marquage de materiaux	

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Liste (A/B)	Hors Champ d'Investigation	Critère ayant permis de conclure	Réf sondage
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
1er Etage	Lingerie n°6	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	A		Marquage de materiaux	
		Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
		Conduit de fluide	PVC	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
Extérieur	Façades	Conduit de fluide	Métal	B		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

4 PRECONISATIONS

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et tenu à la disposition :
- des occupants de l'immeuble, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail si l'immeuble comporte des locaux de travail

et communiqué :
- aux opérateurs de repérage amiante pour les diagnostics avant démolition totale ou partielle.
- toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti
- aux personnes mentionnées à l'article 1334-29-5, paragraphe 2, 2ème alinéa.

Toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant, doit être avertie de la présence d'amiante.

L'opération de repérage devra être étendue aux locaux fermés ou non visités et aux éléments non inspectés s'ils existent

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. Elles comprennent notamment l'obligation d'élaborer une analyse de risque et un mode opératoire pour éviter toute action pouvant libérer des fibres dans l'air (ponçage, frottement, perçage, découpage…).

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

5 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

5.1 OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits des listes A et B contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer lors de la mise en vente de son immeuble ou de la constitution du dossier technique amiante.

5.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Décret n° 2010 – 1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique)
Norme NF X46-020 août 2017

5.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) de l'intervention : 22/05/2025
Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant
Documents remis : Néant
Commentaire : Néant

Conditions du repérage : Le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant-vente porte sur les matériaux ou produits visibles et directement accessibles, figurant aux listes A et B mentionnées aux articles R1334-20 et R1334-21 du code de la santé publique. Il n'exclut pas la présence d'amiante dans d'autres parties d'ouvrage pour lesquelles un repérage complémentaire doit être réalisé en cas de travaux ou de démolition.
Ce repérage se doit d'être non destructif.
Dès lors, les revêtements ou autres composants présents sur le bien objet du repérage ne peuvent être démontés ou endommagés par le diagnostiqueur.
Tous les murs, plancher haut, plancher bas, se trouvant être doublés de panneaux de plâtre, de lambris, de plafond tendu, ou recouverts de linoléum, de moquette, de parquet, de plinthes, d'isolant, etc., n'ont pas pu être examinés en sous face (non accessible sans destruction), y compris tout matériau ou produit se trouvant à plus de 3,8 mètres de hauteur ne pourra pas être repéré/investigué et se voit donc exclu d'office de la présente mission.
Nous restons cependant à la disposition du donneur d'ordre pour réaliser des compléments d'investigation si nécessaire.

La responsabilité du diagnostiqueur ne pourra pas être recherchée en cas de présence d'amiante constatée sur une zone :
- inaccessible lors du repérage ou accessible qu'après démontage ou destruction, ou encore
- non indiquée dans les documents préalablement remis au diagnostiqueur.

Par conséquent, le rapport ne peut être considéré comme attestant de l'absence d'amiante dans les autres matériaux ou produits présents dans le bâtiment objet du repérage, ni se substituer à un repérage avant travaux ou avant démolition.

6 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

Notre inventaire porte spécifiquement sur les matériaux et produits définis dans le PROGRAMME DE REPERAGE DE L'AMIANTE dans les matériaux ou produits mentionnés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Liste des locaux (visités / non visités) :

Repérage amiante listes A et B

Numéro d'offre : T250783005
Numéro de contrat :105095 A

Etage	Local / partie d'immeuble	Visité	Justification
RDC	Hall	OUI	
RDC	Bureau n°1	OUI	
RDC	Bureau n°2	OUI	
1er Etage	Sanitaire	OUI	
Sous-sol	Sous station	OUI	
Sous-sol	Local technique n°1	OUI	
Sous-sol	Local technique n°2	OUI	
Sous-sol	Local technique n°3	OUI	
RDC	Bureau n°3	OUI	
RDC	Bureau n°4	OUI	
RDC	Bureau n°5	OUI	
RDC	Bureau n°6	OUI	
RDC	Bureau n°7	OUI	
RDC	Bureau n°8	OUI	
RDC	Bureau n°9	OUI	
RDC	Bureau n°10	OUI	
RDC	Bureau n°11	OUI	
RDC	Bureau n°12	OUI	
RDC	Chambre 1 à 5	OUI	
RDC	Salle de sejour n°1	OUI	
RDC	Infirmerie n°1	OUI	
RDC	Salle a manger n°1	OUI	
RDC	Office n°1	OUI	
RDC	Lingerie n°1	NON	Porte Fermée à clé.
RDC	Sanitaires H	OUI	
RDC	Sanitaire F n°1	OUI	
RDC	Atelier n°1	OUI	
RDC	Atelier n°2	OUI	
RDC	Office n°2	OUI	
RDC	Atelier n°3	OUI	
RDC	Lingerie n°2	OUI	
RDC	Atelier n°4	OUI	
RDC	Atelier n°5	OUI	
RDC	Sanitaires n°1	OUI	
RDC	Atelier n°6	OUI	
RDC	Cage d'escalier n°1	OUI	
RDC	Cage d'escalier n°2	OUI	
RDC	Cage d'escalier n°3	OUI	
1er Etage	Chambre 1 à 12	OUI	


Etage	Local / partie d'immeuble	Visité	Justification
1er Etage	Couloir n°1	OUI	
1er Etage	Bureau n°13	OUI	
1er Etage	Salle de sejour n°2	OUI	
1er Etage	Office n°3	OUI	
1er Etage	Infirmerie n°2	OUI	
1er Etage	Sanitaire H	OUI	
1er Etage	Sanitaire F n°2	OUI	
1er Etage	Lingerie n°3	OUI	
1er Etage	Lingerie n°4	OUI	
1er Etage	Vestiaire	OUI	
1er Etage	Lingerie n°5	OUI	
1er Etage	Salle a manger n°2	OUI	
1er Etage	Salle de sejour n°3	OUI	
1er Etage	Office n°4	OUI	
1er Etage	Bureau n°14	OUI	
1er Etage	Bureau n°15	OUI	
1er Etage	Sanitaires n°2	OUI	
1er Etage	Lingerie n°6	OUI	
Extérieur	Façades	OUI	
Extérieur	Toiture	OUI	
Sous sol	Degagement	OUI	
RDC	Couloir n°2	OUI	


7 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)


Rapports précédents :
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués


Repérage amiante listes A et B
Numéro d'offre : T250783005
Numéro de contrat :105095 A


ANNEXE CROQUIS

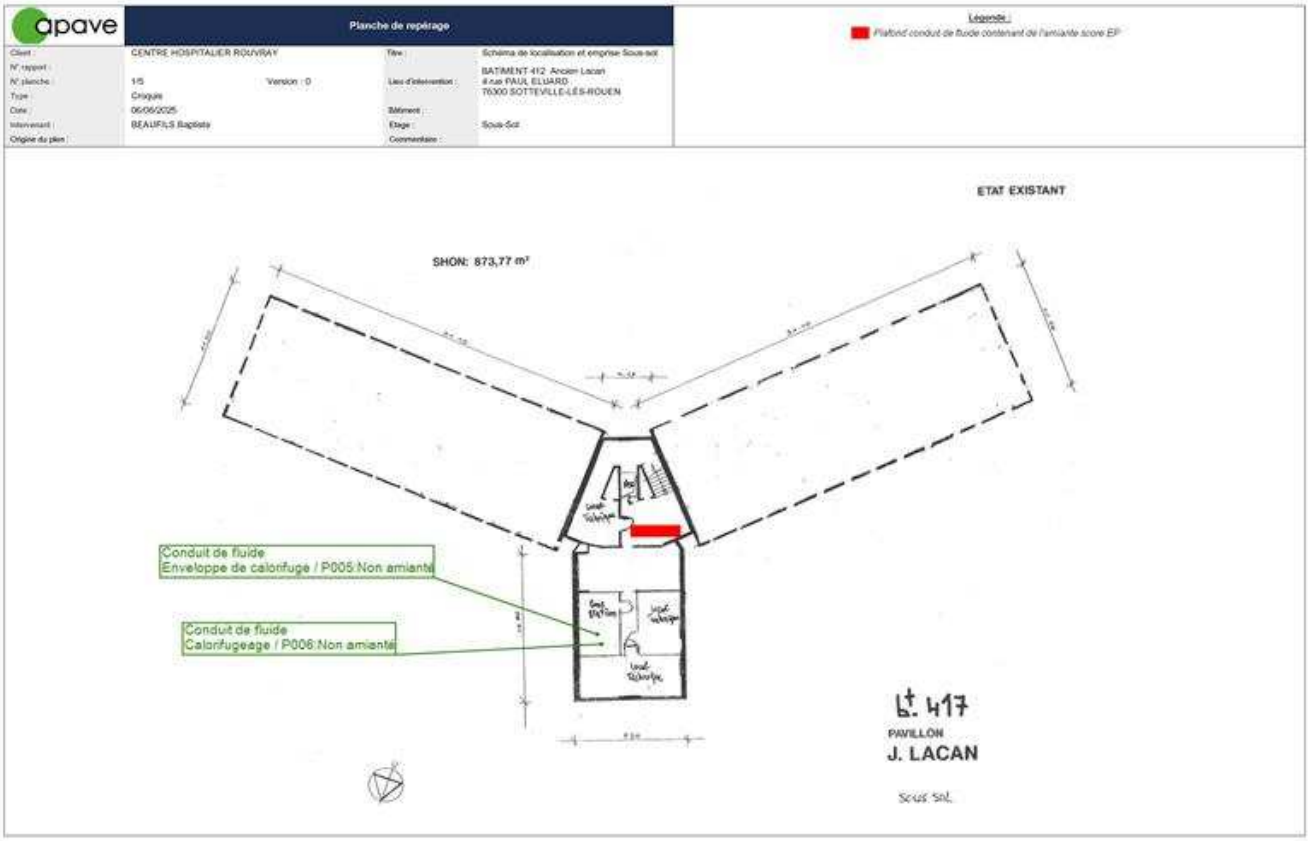
apave
Planche de repérage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
15
Version : 0
Croquis
06/06/2025
BEAUFILS Baptiste
Schéma de localisation et emprise Sous-sol
BATIMENT 412 Ancien Lacan
4 rue PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Sous-Sol
Légende :
Plafond conduit de fluide contenant de l'amiante score EP
ETAT EXISTANT
SHON: 873,77 m²
Conduit de fluide
Enveloppe de calorifuge / P005:Non amianté
Conduit de fluide
Calorifugeage / P006:Non amianté
PAVILLON
J. LACAN
Sous Sol

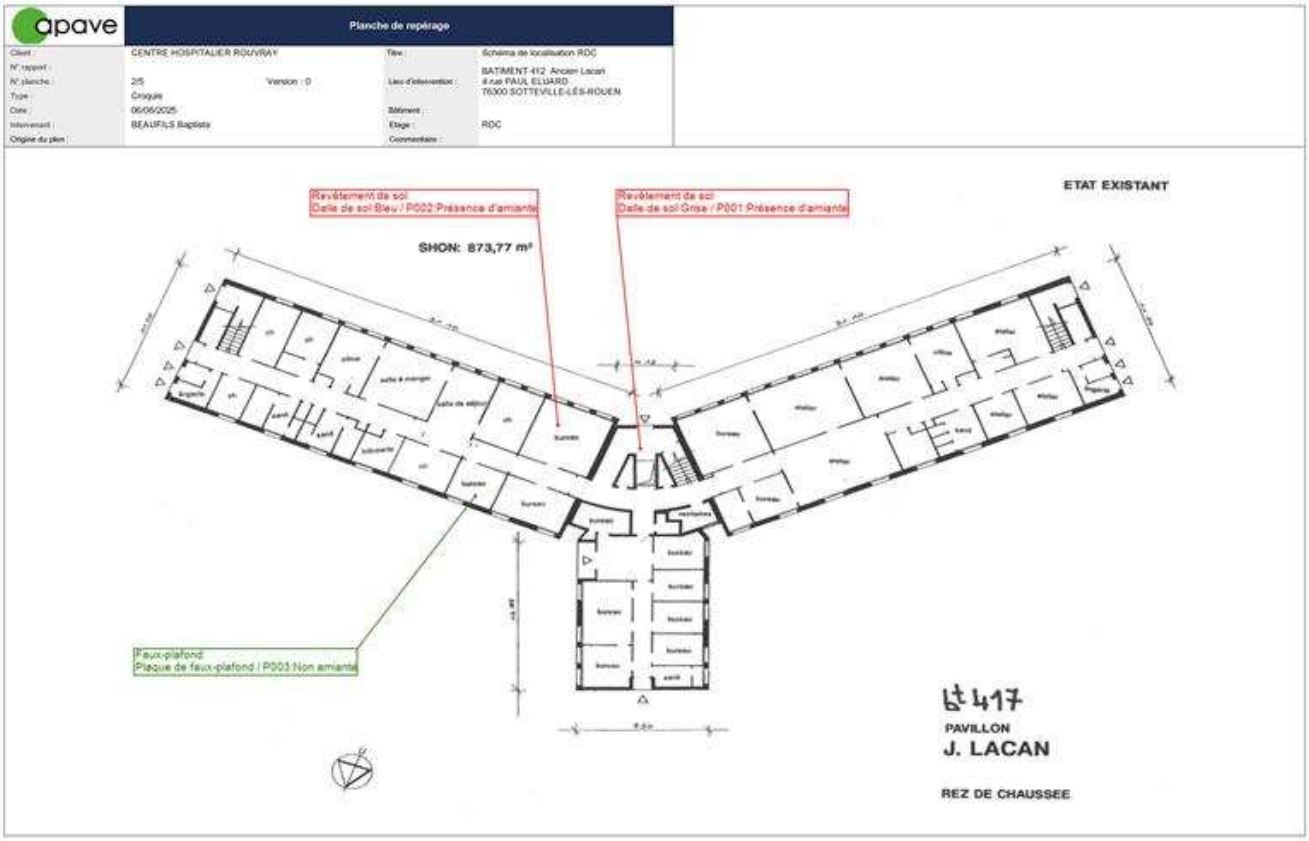
apave
Planche de repérage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
Schéma de localisation RDC
2/5
Version : 0
Croquis
06/06/2025
BEAUFILS Baptiste
BATIMENT 412 Ancien Lacan
4 rue PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
RDC
ETAT EXISTANT
Revêtement de sol
Dalle de sol Bleu / P002 Présence d'amiante
Revêtement de sol
Dalle de sol Grise / P001 Présence d'amiante
SHON: 873,77 m²
Faux-plafond
Plaque de faux-plafond / P003 Non amiante
417
PAVILLON
J. LACAN
REZ DE CHAUSSEE

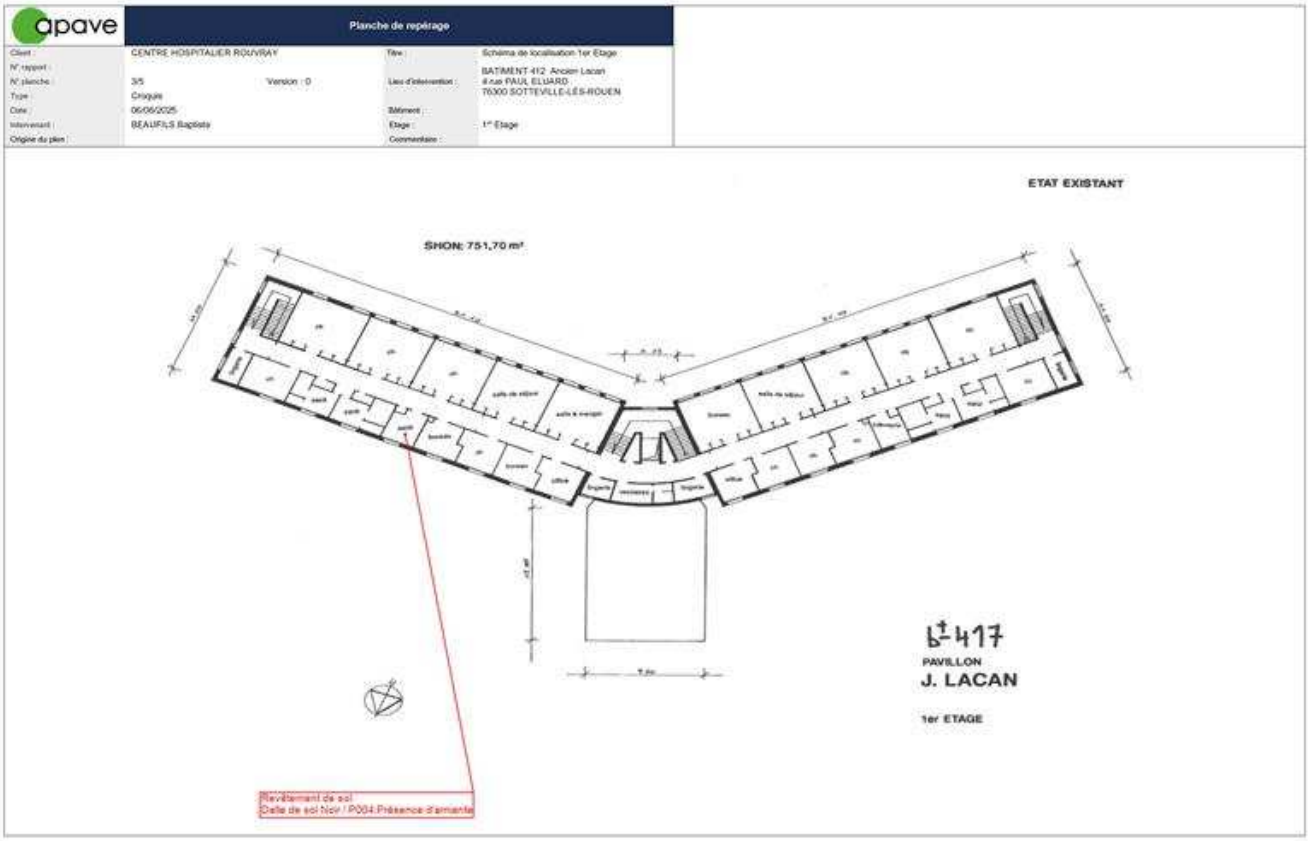
apave
Planche de repérage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
3/5
Version : 0
Croquis
06/06/2025
BEAUFILS Baptiste
Schéma de localisation 1er Etage
BATIMENT 412 Ancien Lacan
4 rue PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
1er Etage
ETAT EXISTANT
SHON: 751,70 m²
412
PAVILLON
J. LACAN
1er ETAGE
Revêtement de sol
Dalle de sol Noir / P004 Présence d'amiante

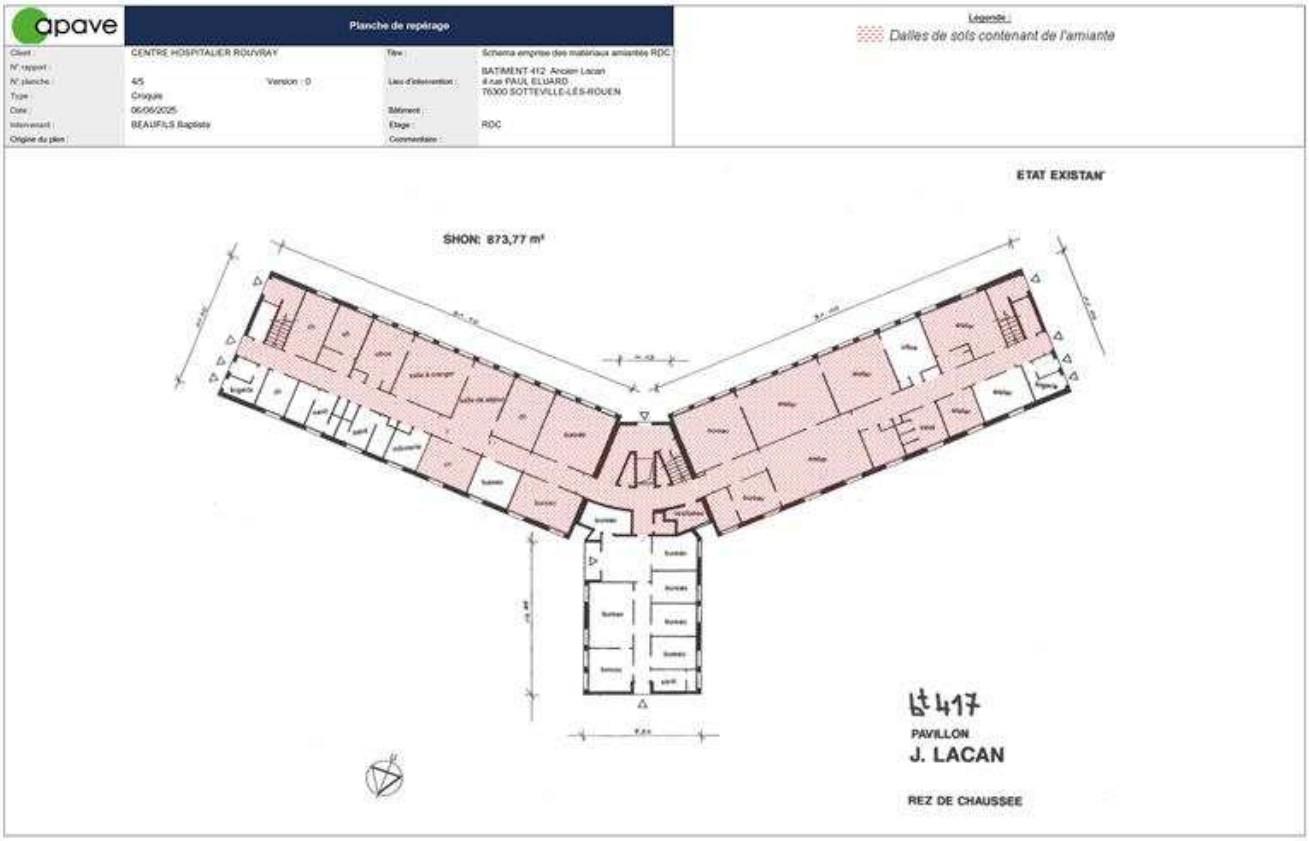
apave
Planche de repérage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
4/5
Version : 0
Croquis
06/06/2025
BEAUFILS Baptiste
BATIMENT 412 Ancien Lacan
RDC
Légende :
Dalles de sols contenant de l'amiante
ETAT EXISTANT
SHON: 873,77 m²
PAVILLON
J. LACAN
REZ DE CHAUSSEE

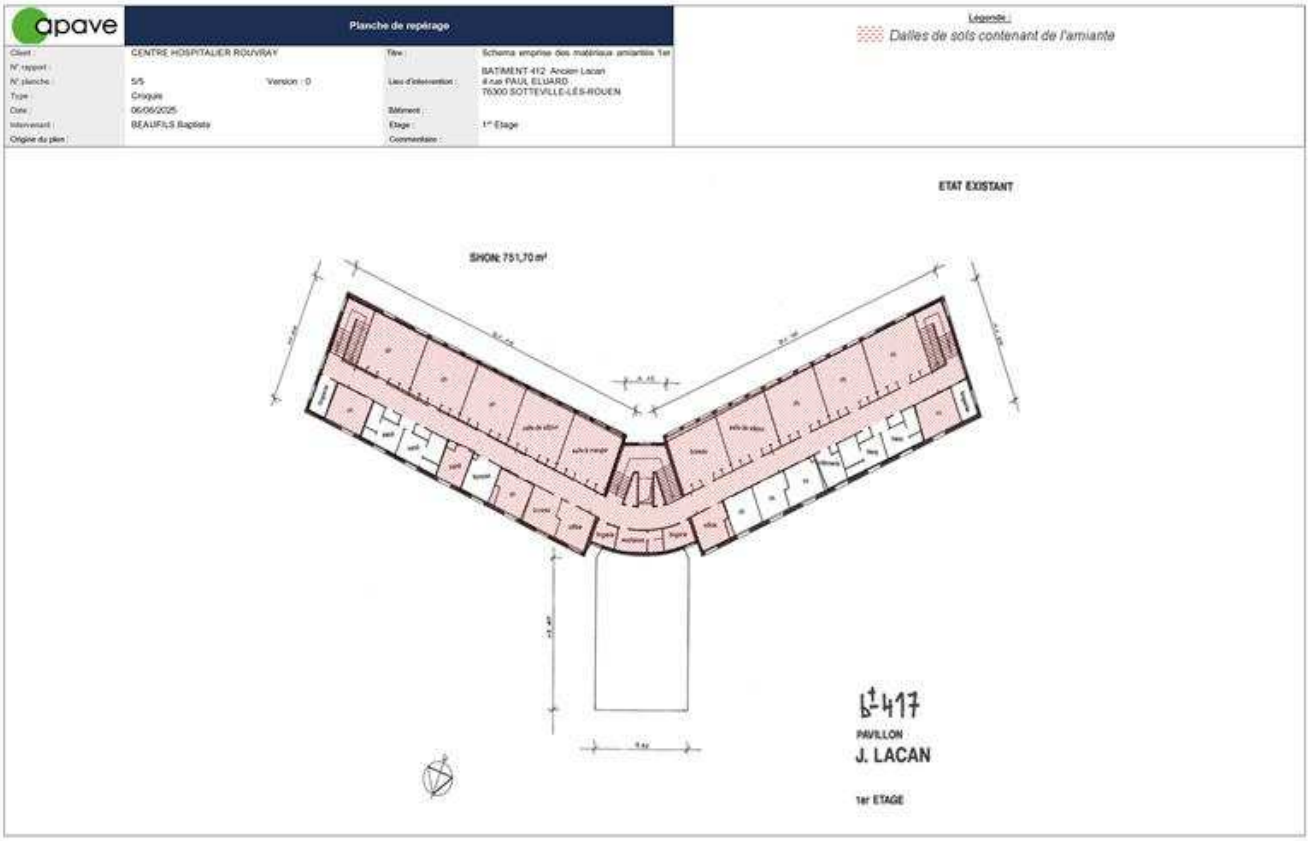
apave
Planche de repérage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY
5/5
Version : 0
Croquis
06/06/2025
BEAUFILS Baptiste
BATIMENT 412 Ancien Lacan
4 rue PAUL ELUARD
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
1er Etage
Légende :
Dalles de sols contenant de l'amiante
ETAT EXISTANT
SHON: 751,70 m²
b-417
PAVILLON
J. LACAN
1er ETAGE

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Partie d'ouvrage**
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Sous sol - Degagement
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibre-ciment		BEAUFILS Baptiste
Localisation		
Conduit de fluide - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		
Résultat de la grille d'évaluation		
Evaluation périodique		

Repérage amiante listes A et B

Numéro d'offre : T250783005
Numéro de contrat :105095 A

PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Hall
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalle de sol Grise	22/05/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Résultat de la grille d'évaluation

Evaluation périodique

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol Grise



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (clair) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-041213-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

Repérage amiante listes A et B
Numéro d'offre : T250783005
Numéro de contrat :105095 A

PRELEVEMENT : P002		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Partie d'ouvrage**
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalle de sol Bleu	22/05/2025	BEAUFILS Baptiste
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
Résultat de la grille d'évaluation		
Evaluation périodique		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol Bleu



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-041213-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

Page : 28/70

Repérage amiante listes A et B

apave

Repérage amiante listes A et B

Numéro d'offre : T250783005
Numéro de contrat :105095 A

PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		RDC - Bureau n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaque de faux-plafond	22/05/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plaque de faux-plafond



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-041213-01	Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante listes A et B
Numéro d'offre : T250783005
Numéro de contrat :105095 A

PRELEVEMENT : P004		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		1er Etage - Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol Noir	22/05/2025	BEAUFILS Baptiste
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
Résultat de la grille d'évaluation		
Evaluation périodique		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalle de sol Noir



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert) (foncé) ; matériau (noir) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-041213-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

Repérage amiante listes A et B

Numéro d'offre : T250783005
Numéro de contrat :105095 A

PRELEVEMENT : P005

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Sous-sol - Sous station
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enveloppe de calorifuge	22/05/2025	BEAUFILS Baptiste

Localisation

Conduit de fluide - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enveloppe de calorifuge



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (plâtreux) (gris) (clair)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-041213-01	Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante listes A et B
Numéro d'offre : T250783005
Numéro de contrat :105095 A

PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY		Sous-sol - Sous station
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	22/05/2025	BEAUFILS Baptiste
Localisation		
Conduit de fluide - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calorifugeage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-041213-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-041213-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 1

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti


Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Hall
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Hall
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 2

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti


Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Bureau n°1
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Bleu
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Bureau n°1
Recommandation	Evaluation périodique

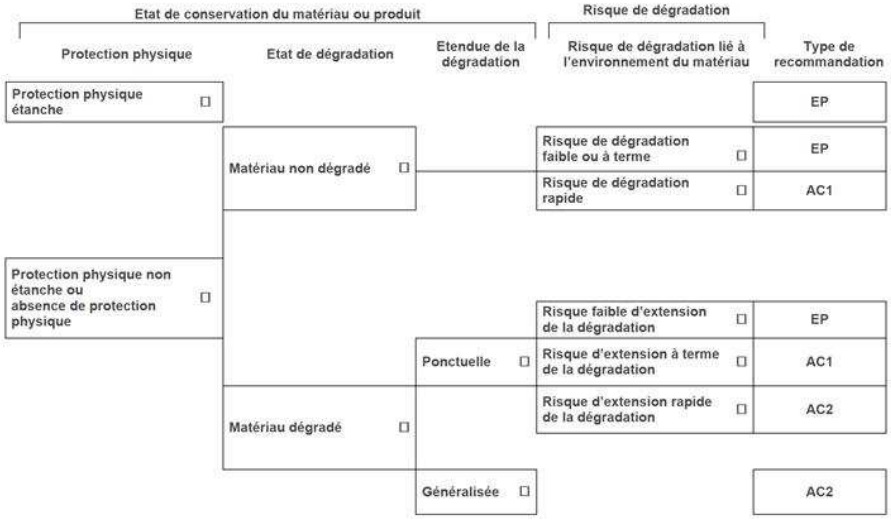

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 3

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti


Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Sanitaire
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Noir
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Sanitaire
Recommandation	Evaluation périodique

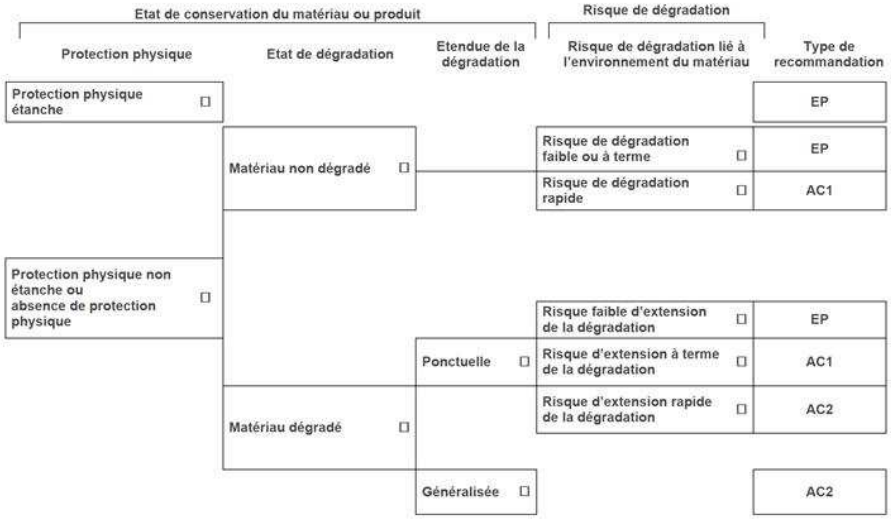

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 4

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti


Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Bureau n°3
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Bleu
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Bureau n°3
Recommandation	Evaluation périodique

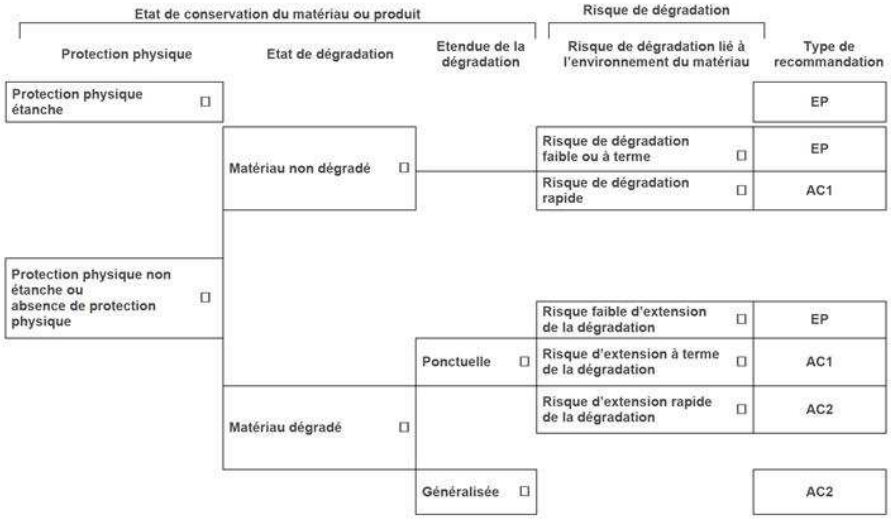

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 5

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Chambre 1 à 5
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Chambre 1 à 5
Recommandation	Evaluation périodique

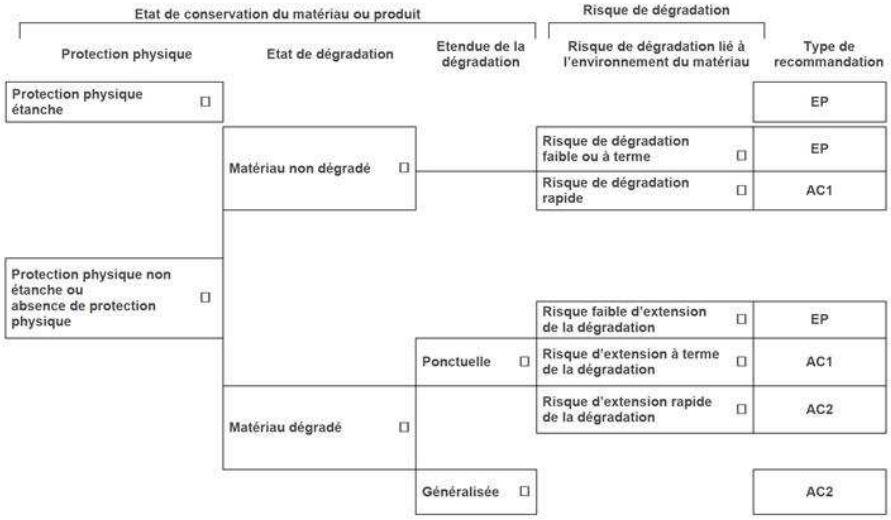

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 6

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti


Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Salle de sejour n°1
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Salle de sejour n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 7

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Salle a manger n°1
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Salle a manger n°1
Recommandation	Evaluation périodique

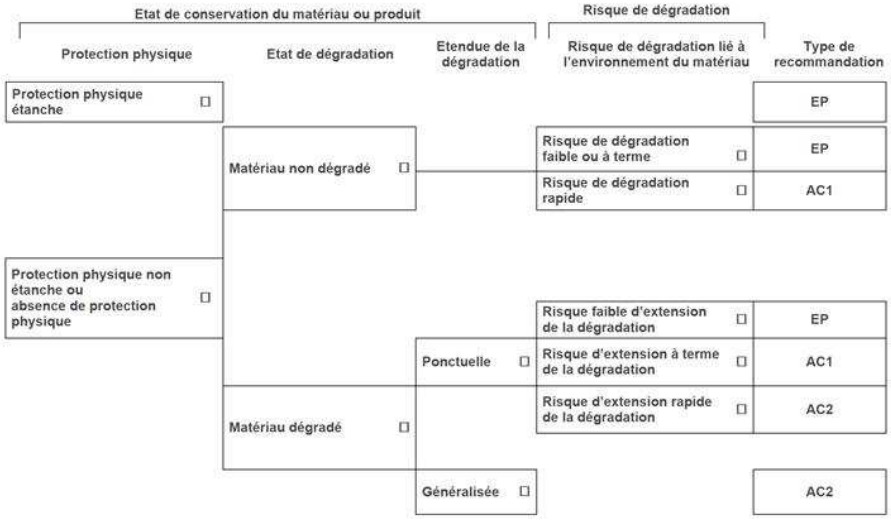

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 8

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti


Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Office n°1
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Office n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 9

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Atelier n°1
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Atelier n°1
Recommandation	Evaluation périodique

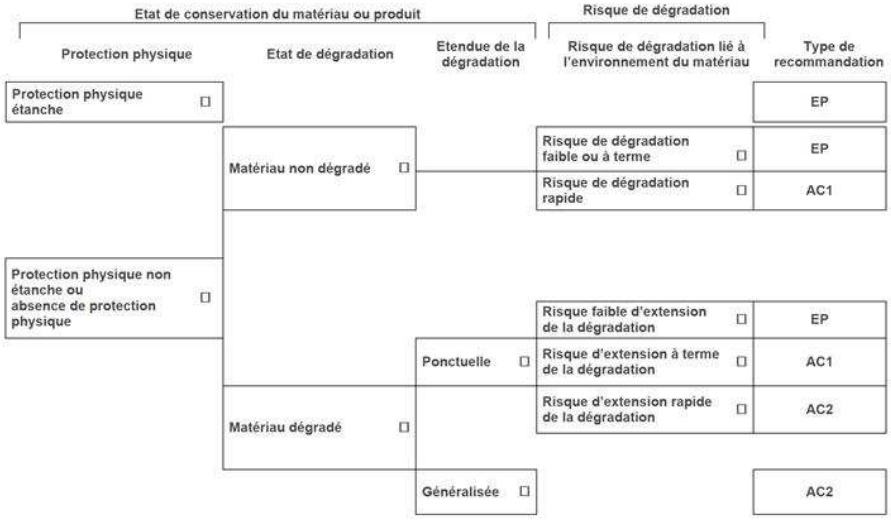

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 10

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Atelier n°2
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Atelier n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 11

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Atelier n°3
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Atelier n°3
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 12

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti


Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Atelier n°5
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Atelier n°5
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 13

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Atelier n°6
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Atelier n°6
Recommandation	Evaluation périodique

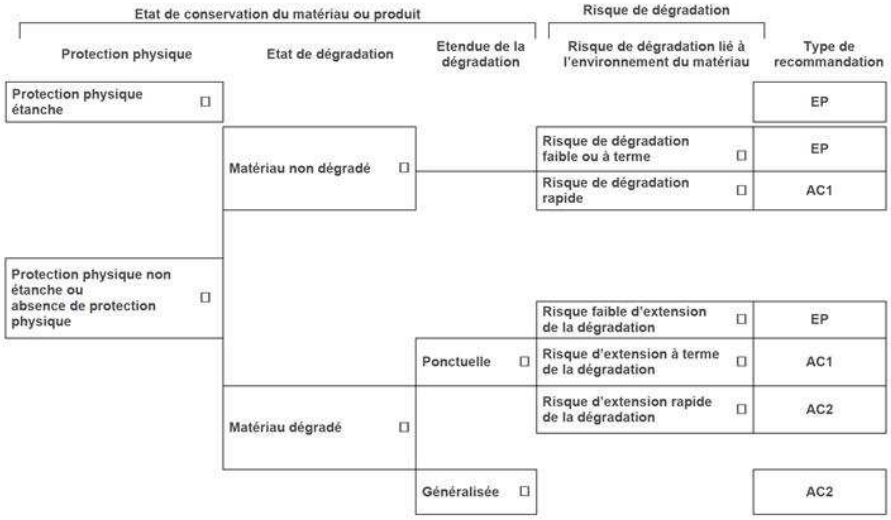

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 14

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Cage d'escalier n°1
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Cage d'escalier n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 15

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Cage d'escalier n°2
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Cage d'escalier n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 16

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Cage d'escalier n°3
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Cage d'escalier n°3
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 17

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Chambre 1 à 12
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Bleu
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Chambre 1 à 12
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 18

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Couloir n°1
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Couloir n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 19

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Bureau n°13
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Bleu
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Bureau n°13
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 20

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Salle de sejour n°2
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Bleu
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Salle de sejour n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 21

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Office n°3
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Office n°3
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 22

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Lingerie n°4
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Lingerie n°4
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 23

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Vestiaire
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Vestiaire
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 24

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Lingerie n°5
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Lingerie n°5
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 25

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Salle a manger n°2
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Bleu
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Salle a manger n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 26

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Salle de sejour n°3
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Bleu
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Salle de sejour n°3
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 27

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Office n°4
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Office n°4
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 28

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti


Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	1er Etage
Pièce ou zone homogène	Bureau n°14
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Bureau n°14
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 29

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	Sous sol
Pièce ou zone homogène	Degagement
Elément	Conduit de fluide
Matériau / Produit	Fibre-ciment
Repérage	Murs
Destination déclarée du local	Degagement
Recommandation	Evaluation périodique

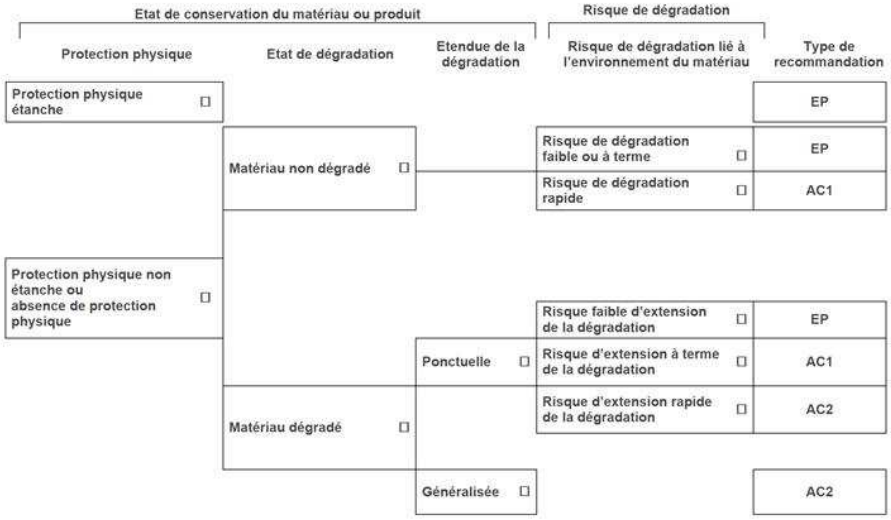

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 30

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Couloir n°2
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Grise
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Couloir n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B N° 31

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	
Date de l'évaluation	22/05/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Couloir n°2
Elément	Revêtement de sol
Matériau / Produit	Dalle de sol Bleu
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Couloir n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
	Matériau non dégradé ☐		Risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			Risque de dégradation rapide ☐	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☐				
			Risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
		Ponctuelle ☐	Risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
	Matériau dégradé ☐		Risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		Généralisée ☐		AC2

Repérage amiante listes A et B
Numéro d'offre : T250783005
Numéro de contrat :105095 A

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720250501577735

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Baptiste BEAUFILS
2 Route des Mouettes
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-041213-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2025 7:41 Page1/3
Dossier N° : 25NM020350 Date de réception : 28/05/2025 Date d'analyse : 30/05/2025
Référence dossier Client:
105095 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Hall - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol Grise	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (clair) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	P002-RDC - Bureau n°1 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol Bleu	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	P003-RDC - Bureau n°2 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-1er Etage - Sanitaire - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol Noir	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert) (foncé) ; matériau (noir) en traces	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
005	P005-Sous-sol - Sous station - Murs - Conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-041213-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2025 7:41 Page2/3
Dossier N° : 25NM020350 Date de réception : 28/05/2025 Date d'analyse : 30/05/2025
Référence dossier Client:
105095 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (plâtreux) (gris) (clair)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-Sous-sol - Sous station - Murs - Conduit de fluide - Calorifugeage	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-041213-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2025 7:41 Page3/3
Dossier N° : 25NM020350 Date de réception : 28/05/2025 Date d'analyse : 30/05/2025
Référence dossier Client:
105095 A - BATIMENT 412 Ancien Lacan 4 rue PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Julien Garcia
Technicien Analyste Microscopie


Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tel: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

ANNEXE ATTESTATION DE COMPETENCE

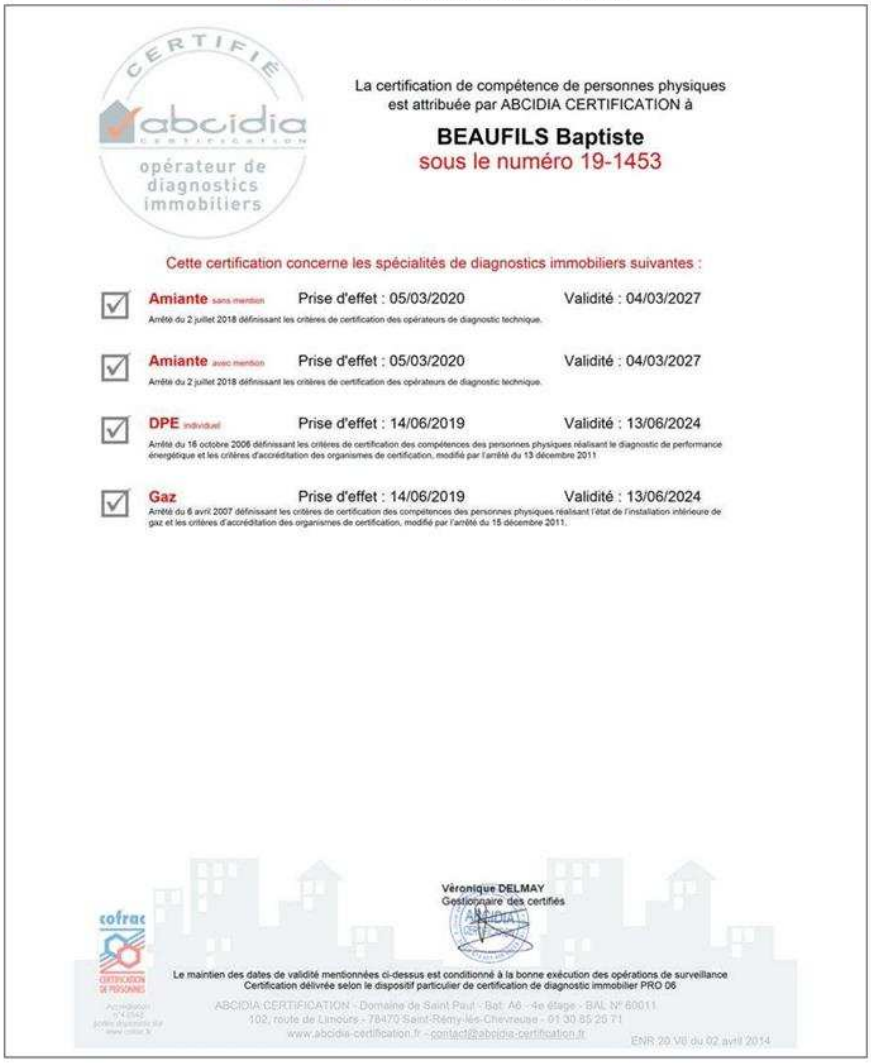

CERTIFIÉ abcidia CERTIFICATION opérateur de diagnostics immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

BEAUFILS Baptiste
sous le numéro 19-1453

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☑ **Amiante** sans mention	Prise d'effet : 05/03/2020	Validité : 04/03/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☑ **Amiante** avec mention	Prise d'effet : 05/03/2020	Validité : 04/03/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☑ **DPE** individuel	Prise d'effet : 14/06/2019	Validité : 13/06/2024
Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011		
☑ **Gaz**	Prise d'effet : 14/06/2019	Validité : 13/06/2024
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.		

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat. A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 20 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 VII du 02 avril 2014

ANNEXE ATTESTATION d'ASSURANCE

Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**
Pour la société :
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

Commentaire :	

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.


Les familles de déchets



Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	**Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)**
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

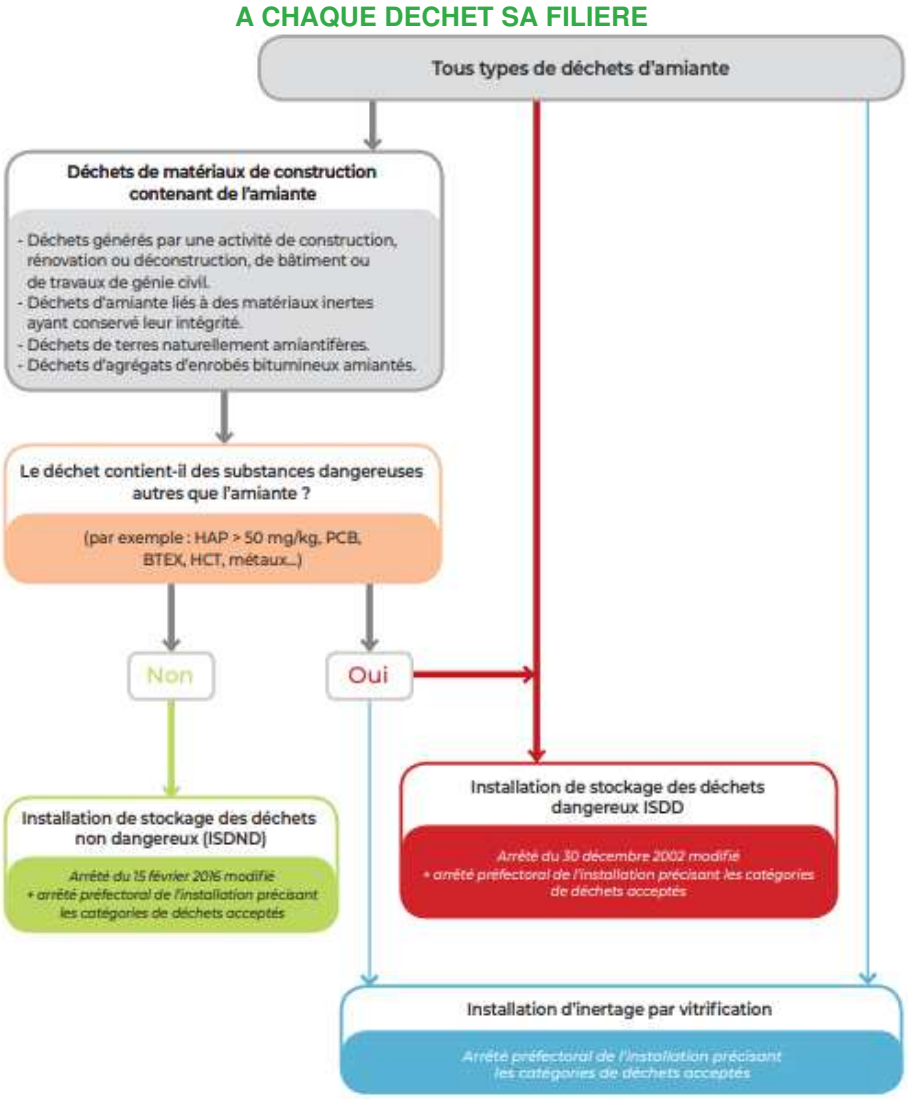

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.
Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :
https://www.sinoe.org/
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
