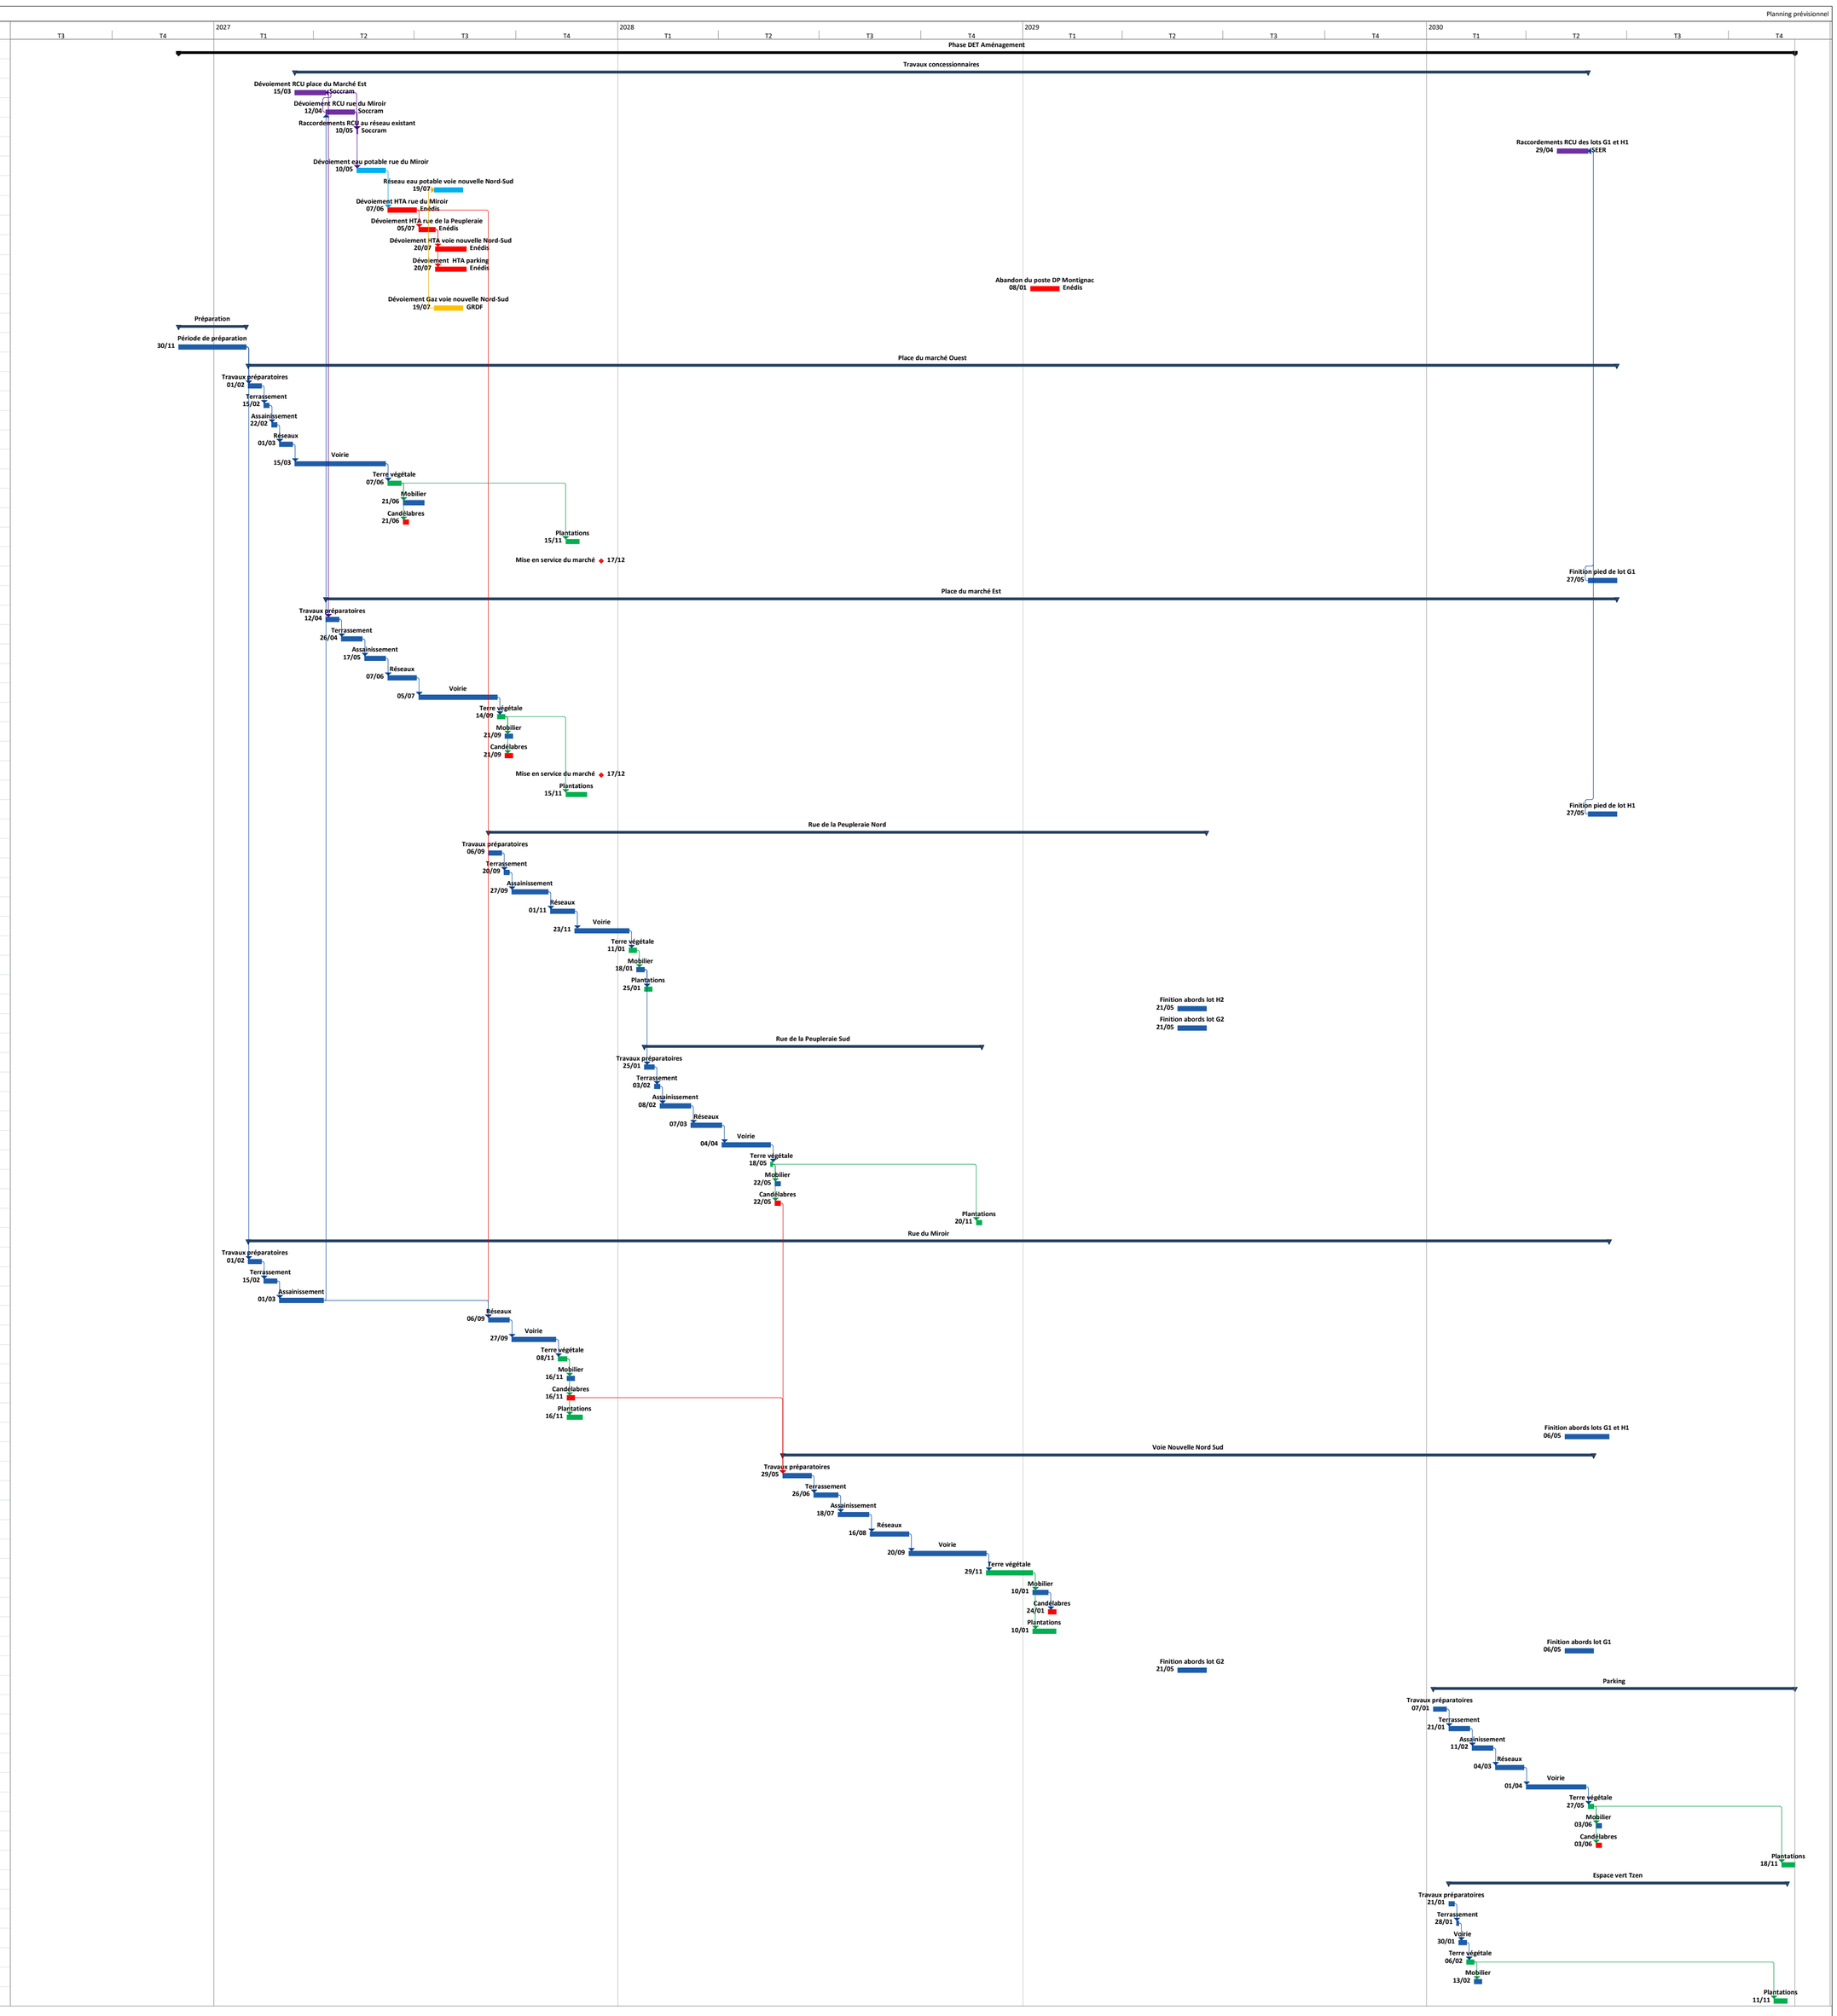N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Phase DET Aménagement**	**976 jrs**	**Lun 30/11/26**	**Ven 29/11/30**
2	**Travaux concessionnaires**	**781 jrs**	**Lun 15/03/27**	**Lun 27/05/30**
3	Dévoiement RCU place du Marché Est	1 m	Lun 15/03/27	Lun 12/04/27
4	Dévoiement RCU rue du Miroir	1 m	Lun 12/04/27	Ven 07/05/27
5	Raccordements RCU au réseau existant	1 jr	Lun 10/05/27	Lun 10/05/27
6	Raccordements RCU des lots G1 et H1	1 m	Lun 29/04/30	Lun 27/05/30
7	Dévoiement eau potable rue du Miroir	1 m	Lun 10/05/27	Ven 04/06/27
8	Réseau eau potable voie nouvelle Nord-Sud	1 m	Lun 19/07/27	Ven 13/08/27
9	Dévoiement HTA rue du Miroir	1 m	Lun 07/06/27	Ven 02/07/27
10	Dévoiement HTA rue de la Peupleraie	2 sem.	Lun 05/07/27	Lun 19/07/27
11	Dévoiement HTA voie nouvelle Nord-Sud	1 m	Mar 20/07/27	Lun 16/08/27
12	Dévoiement HTA parking	1 m	Mar 20/07/27	Lun 16/08/27
13	Abandon du poste DP Montignac	1 m	Ven 08/01/29	Ven 02/02/29
14	Dévoiement Gaz voie nouvelle Nord-Sud	1 m	Lun 19/07/27	Ven 13/08/27
15	**Préparation**	**30 jrs**	**Lun 30/11/26**	**Ven 29/01/27**
16	Période de préparation	30 jrs	Lun 30/11/26	Ven 29/01/27
17	**Place du marché Ouest**	**831 jrs**	**Lun 01/02/27**	**Ven 21/06/30**
18	Travaux préparatoires	10 jrs	Lun 01/02/27	Ven 12/02/27
19	Terrassement	5 jrs	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27
20	Assainissement	5 jrs	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27
21	Réseaux	10 jrs	Lun 01/03/27	Ven 12/03/27
22	Voirie	60 jrs	Lun 15/03/27	Ven 04/06/27
23	Terre végétale	10 jrs	Lun 07/06/27	Ven 18/06/27
24	Mobilier	15 jrs	Lun 21/06/27	Ven 09/07/27
25	Candélabres	5 jrs	Lun 21/06/27	Ven 25/06/27
26	Plantations	10 jrs	Lun 15/11/27	Ven 26/11/27
27	Mise en service du marché	0 jr	Ven 17/12/27	Ven 17/12/27
28	Finition pied de lot G1	20 jrs	Lun 27/05/30	Ven 21/06/30
29	**Place du marché Est**	**781 jrs**	**Lun 12/04/27**	**Ven 21/06/30**
30	Travaux préparatoires	10 jrs	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27
31	Terrassement	15 jrs	Lun 26/04/27	Ven 14/05/27
32	Assainissement	15 jrs	Lun 17/05/27	Ven 04/06/27
33	Réseaux	20 jrs	Lun 07/06/27	Ven 02/07/27
34	Voirie	50 jrs	Lun 05/07/27	Lun 13/09/27
35	Terre végétale	5 jrs	Mar 14/09/27	Lun 20/09/27
36	Mobilier	5 jrs	Mar 21/09/27	Lun 27/09/27
37	Candélabres	5 jrs	Mar 21/09/27	Lun 27/09/27
38	Mise en service du marché	0 jr	Ven 17/12/27	Ven 17/12/27
39	Plantations	15 jrs	Lun 15/11/27	Ven 03/12/27
40	Finition pied de lot H1	20 jrs	Lun 27/05/30	Ven 21/06/30
41	**Rue de la Peupleraie Nord**	**428 jrs**	**Lun 06/09/27**	**Ven 15/06/29**
42	Travaux préparatoires	10 jrs	Lun 06/09/27	Ven 17/09/27
43	Terrassement	5 jrs	Lun 20/09/27	Ven 24/09/27
44	Assainissement	25 jrs	Lun 27/09/27	Ven 29/10/27
45	Réseaux	15 jrs	Lun 01/11/27	Lun 22/11/27
46	Voirie	20 jrs	Mar 23/11/27	Lun 10/01/28
47	Terre végétale	5 jrs	Mar 11/01/28	Lun 17/01/28
48	Mobilier	5 jrs	Mar 18/01/28	Lun 24/01/28
49	Plantations	5 jrs	Mar 25/01/28	Lun 31/01/28
50	Finition abords lot H2	20 jrs	Lun 21/05/29	Ven 15/06/29
51	Finition abords lot G2	20 jrs	Lun 21/05/29	Ven 15/06/29
52	**Rue de la Peupleraie Sud**	**215 jrs**	**Mar 25/01/28**	**Ven 24/11/28**
53	Travaux préparatoires	7 jrs	Mar 25/01/28	Mer 02/02/28
54	Terrassement	3 jrs	Jeu 03/02/28	Lun 07/02/28
55	Assainissement	20 jrs	Mar 08/02/28	Lun 06/03/28
56	Réseaux	20 jrs	Mar 07/03/28	Lun 03/04/28
57	Voirie	30 jrs	Mar 04/04/28	Mer 17/05/28
58	Terre végétale	2 jrs	Jeu 18/05/28	Ven 19/05/28
59	Mobilier	5 jrs	Lun 22/05/28	Ven 26/05/28
60	Candélabres	5 jrs	Lun 22/05/28	Ven 26/05/28
61	Plantations	5 jrs	Lun 20/11/28	Ven 24/11/28
62	**Rue du Miroir**	**826 jrs**	**Lun 01/02/27**	**Ven 14/06/30**
63	Travaux préparatoires	10 jrs	Lun 01/02/27	Ven 12/02/27
64	Terrassement	10 jrs	Lun 15/02/27	Ven 26/02/27
65	Assainissement	30 jrs	Lun 01/03/27	Ven 09/04/27
66	Réseaux	15 jrs	Lun 06/09/27	Ven 24/09/27
67	Voirie	30 jrs	Lun 27/09/27	Ven 05/11/27
68	Terre végétale	5 jrs	Lun 08/11/27	Lun 15/11/27
69	Mobilier	5 jrs	Mar 16/11/27	Lun 22/11/27
70	Candélabres	5 jrs	Mar 16/11/27	Lun 22/11/27
71	Plantations	10 jrs	Mar 16/11/27	Lun 29/11/27
72	Finition abords lots G1 et H1	30 jrs	Lun 06/05/30	Ven 14/06/30
73	**Voie Nouvelle Nord Sud**	**490 jrs**	**Lun 29/05/28**	**Ven 31/05/30**
74	Travaux préparatoires	20 jrs	Lun 29/05/28	Ven 23/06/28
75	Terrassement	15 jrs	Lun 26/06/28	Lun 17/07/28
76	Assainissement	20 jrs	Mar 18/07/28	Lun 14/08/28
77	Réseaux	25 jrs	Mer 16/08/28	Mar 19/09/28
78	Voirie	50 jrs	Mer 20/09/28	Mar 28/11/28
79	Terre végétale	15 jrs	Mer 29/11/28	Mar 09/01/29
80	Mobilier	10 jrs	Mer 10/01/29	Mar 23/01/29
81	Candélabres	5 jrs	Mer 24/01/29	Mar 30/01/29
82	Plantations	15 jrs	Mer 10/01/29	Mar 30/01/29
83	Finition abords lot G1	20 jrs	Lun 06/05/30	Ven 31/05/30
84	Finition abords lot G2	20 jrs	Lun 21/05/29	Ven 15/06/29
85	**Parking**	**235 jrs**	**Lun 07/01/30**	**Ven 29/11/30**
86	Travaux préparatoires	10 jrs	Lun 07/01/30	Ven 18/01/30
87	Terrassement	15 jrs	Lun 21/01/30	Ven 08/02/30
88	Assainissement	15 jrs	Lun 11/02/30	Ven 01/03/30
89	Réseaux	20 jrs	Lun 04/03/30	Ven 29/03/30
90	Voirie	40 jrs	Lun 01/04/30	Ven 24/05/30
91	Terre végétale	5 jrs	Lun 27/05/30	Ven 31/05/30
92	Mobilier	5 jrs	Lun 03/06/30	Ven 07/06/30
93	Candélabres	5 jrs	Lun 03/06/30	Ven 07/06/30
94	Plantations	10 jrs	Lun 18/11/30	Ven 29/11/30
95	**Espace vert Tzen**	**220 jrs**	**Lun 21/01/30**	**Ven 22/11/30**
96	Travaux préparatoires	5 jrs	Lun 21/01/30	Ven 25/01/30
97	Terrassement	2 jrs	Lun 28/01/30	Mar 29/01/30
98	Voirie	5 jrs	Mer 30/01/30	Mar 05/02/30
99	Terre végétale	5 jrs	Mer 06/02/30	Mar 12/02/30
100	Mobilier	5 jrs	Mer 13/02/30	Mar 19/02/30
101	Plantations	10 jrs	Lun 11/11/30	Ven 22/11/30
