BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Lorraine Bourgogne (Nancy)
ZAC De frocourt
29 rue Antoine de St Exupery
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

A l'attention du donneur d'ordre : BENJAMIN DERLANGE

Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

Référence du rapport : 17811530/S3/1/AM-RTV/1-901EC-240

Identification de l'immeuble bâti :
TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE
7 RUE DU CHATEAU
54300 LUNEVILLE

Bâtiment : TRIBUNAL DE PROXIMITE



Latitude : 48.593695

Longitude : 6.491896

Rédigé le : 14/03/2023

Date d'émission du rapport : 14/03/2023

Date(s) de(s) visite(s) :
Le 23/02/2023

Référence du programme de travaux :
N°LUN-TI-PL01 P-100° réalisé le 30/01/2023 par Bureau Veritas Solutions

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage:

Nom	Prénom	Fonction	Compétence
Bernard	Beranger	Operateur de repérage	Certificat de compétence n°B2C - 0921 obtenu le 18/03/2021 établi par B2C - 24 Rue des Près - 67380 LINGOLSHEIM valable jusqu'au 17/03/2028

Signataire(s) du rapport:

Nom	Prénom	Fonction	Compétence	Signature
Bernard	Beranger	Operateur de repérage	Certificat de compétence n°B2C - 0921 obtenu le 18/03/2021 établi par B2C - 24 Rue des Près - 67380 LINGOLSHEIM valable jusqu'au 17/03/2028	

Ce document comporte 18 page(s) d'annexe.

Sommaire

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION 3

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 6

2. CONCLUSIONS 7

2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre 8

2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre 7

2.3. Obligations réglementaires 9

3. INFORMATIONS GENERALES 10

3.1. Immeuble bâti objet de la mission 10

3.2. Parties prenantes 10

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE 10

4.1. Références réglementaires 10

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 11

5.1. Date(s) de visite(s) 11

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 11

5.3. Conditions spécifiques 11

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 11

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 12

6.1. Matériaux et produits repérés 12

7. ANNEXES 13

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 13

7.2. Croquis de repérage 14

7.3. Photos 21

7.4. Attestation d'assurance 31

7.5. Certificat de compétence 33

7.6. Rapports d'analyses du laboratoire 34

Copyright BUREAU VERITAS

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Mise en accessibilité et mise à niveau des infrastructures VDI du tribunal.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures - Toitures - Terrasses et étanchéités	
Ardoises	, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	, Bardeaux bitumineux ('shingles')
Conduits en toiture	, Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	, Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits d'eaux pluviales, Conduits de cheminée, Conduits de fumée, Conduits de ventilation, Costières, Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	, Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	, Complexes asphaltés , Ecrans de semi indépendance , Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanternaux	, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées	, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Plaques planes	, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	, Accessoires de couverture composite, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Bardages	, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peintures des bardages métalliques, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Conduits en façade	, Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	, Chéneaux, Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de cheminée, Conduits de fumée, Conduits de ventilation, Corniches
Façades légères	, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes	, Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Crépis, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés - lissés ou talochés, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Peintures sur béton, Primaires d'accrochage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	, Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs rideaux	, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses

Panneaux sandwich	, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Isolant sous panneau sandwich, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Panneaux, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Poteaux de façade	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Crépis, Enduits extérieurs projetés - lissés ou talochés, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Peintures sur béton, Primaires d'accrochage, Revêtements plastiques épais (RPE),
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons 'en dur'	Coffrages perdus, Enduits projetés, Revêtements durs
Cloisons (légères et préfabriquées)	, Enduits projetés, Panneaux de cloisons
Cloisons maçonnées	, Coffrages perdus, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation
Cloisons sêches (assemblées - préfabriquées)	, Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions entre panneaux préfabriqués , Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds de cloisons, Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons , Panneaux, Panneaux de cloisons lisses, Panneaux de cloisons moulurées, Plots de colle fixant les cloisons au mur, Sous couches des tissus muraux
Coffres	, Enduits projetés
Coffres verticaux	, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Gaines	, Enduits projetés
Gaines verticales	, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Murs	, Coffrages perdus, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Revêtements durs
Pied de cloison	, Carton, Fibres-ciment, Joints, Tresses
Plinthes	, Peintures
Portes	, Peintures
Portes coupe-feu	, Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	, Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	, Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	, Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	, Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	, Coffrages perdus, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	, Entourages de poteaux, Revêtements durs
Revêtements de cloisons	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de coffres	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de gaines	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de murs	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de poteaux	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Tête de cloison	, Carton, Fibres-ciment, Joints, Tresses,
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Calfeutrements, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Joints coupe-feu, Joints de dilatation, Joints de structure, Jonctions avec la façade, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Coffres	, Enduits projetés, Panneaux collés, Panneaux vissés
Coffres horizontaux	, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Contrevents	, Flocages, Peintures intumescentes, Projections en plâtre
Ecran de contonnement	, Plaques
Faux plafonds	, Ecrans de contonnement , Isolants, Joints d'écrans de contonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines	, Enduits projetés, Panneaux collés, Panneaux vissés
Gaines horizontales	, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Interface entre structures	, Calfeutrements, Rebouchages de trémie
Interface entre strucutures	, Jonctions avec la façade
Interfaces entre structures	, Joints de dilatation

Plafonds	, Bandes calicot, Bourre, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux cloués, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	, Calfeutrements, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits talochés, Entourages de poutres, Flocages, Joints coupe-feu, Joints de dilatation, Joints de structure, Jonctions avec la façade, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Poutres	, Enduits projetés, Panneaux collés, Panneaux vissés
Suspentes	, Flocages, Peintures intumescentes, Projections en plâtre,
05 - Planchers et planchers techniques	
Planchers	Dalles de sol
Revêtements de sol	, Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints d'assemblage, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Moquettes, Nez de marche, Panneaux, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples,
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits d'air	, Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits d'eau	, Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits d'échapement	, Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits de fluides	, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits de fluides (air - eau - autres fluides)	, Conduits, Enveloppes de calorifuges
Conduits de fumée	, Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits de vapeur	, Colles de calorifugeage, Conduits, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits électriques	, Tresses dans câble électrique d'alimentation
Portes coupe-feu	, Joints (bandes), Joints (tresses)
Vide-ordures	, Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	, Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets,
07 - Ascenseurs - monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	, Panneaux
Convecteurs électriques	, Calorifugeages
Equipements	, Calorifugeages
Matériel en machinerie ascenseur	, Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	, Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	, Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	, Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des escaliers mécaniques	, Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	, Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	, Panneaux
Portes palière monte-charges	, Panneaux
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	, Eléments en fibres-ciment
Baignoires	, Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Canalisations électriques préfabriquées	, Isolants
Chaudières (mixtes - collectives)	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	, Parois, Portes
Convecteurs électriques	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Dispositifs anti condensation, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses, Tresses des diffuseurs
Equipements	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	, Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Fours	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	, Carton, Tresses
Groupes électrogènes	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	, Eléments en fibres-ciment
Poêles	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	, Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	, Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	, Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
09 - Fondations et soubassements	
Conduits	, Conduits dans maçonnerie
Etanchéité des murs enterrés	, Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Fourreaux	, Fourreaux dans maçonnerie
Parois horizontales enterrées	, Joints, Joints de dilatation, Joints de fractionnement, Joints de rupture
Parois verticales enterrées	, Joints, Joints de dilatation, Joints de fractionnement, Joints de rupture
10 - Aménagements - voiries et réseaux divers	
Aménagements extérieurs	, Bordures en fibres-ciment, Eléments extérieurs en fibres-ciment, Jardinières en fibres-ciment, Plaques de caniveau en fibres-ciment, Pots de fleur en fibres-ciment
Conduits	, Eléments de canalisations enterrés
Espaces sportifs	, Revêtements de sol
Syphons	, Eléments de canalisations enterrés
Voiries	, Asphaltes, Enrobés bitumineux des couches de voirie

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :

RDC : Accueil, Salle de pause, Bureau 1, Local informatique, WC 1, Couloir 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, bureau 5, Escalier rdc, Sous-escalier, pièce.
1 ER ETAGE : Escalier R+1, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Dégagement 1, Salle d'audience 1, Cage d'escalier, Palier, Dégagement 2, WC1, WC 2.
2 EME ETAGE : Escalier r+2, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Salle d'audience 2.
PARTIES EXTERIEURES : Façade 1, Façade 2.

2. CONCLUSIONS

L’opérateur de repérage n’ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante.

2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE	/	/	Toiture terrasse et remontée d'étanchéité sur l'acrotère	Destruction de l'imperméabilité de la structure	Prévoir la reprise de l'étanchéité à l

2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> LOCAL INFORMATIQUE	/	/	/	Absence de trappe de visite présence d'un faux-plafond non démontable	Créer une trappe de visite de dimension suffisante pour accéder aux combles par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> WC 1	/	/	/	Absence de trappe de visite présence d'un faux-plafond non démontable	Créer une trappe de visite de dimension suffisante pour accéder aux combles par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 1	/	/	/	Absence de trappe de visite présence d'un faux-plafond non démontable	Créer une trappe de visite de dimension suffisante pour accéder aux combles par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 2	/	/	/	Absence de trappe de visite présence d'un faux-plafond non démontable	Créer une trappe de visite de dimension suffisante pour accéder aux combles par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE
7 RUE DU CHATEAU
54300 LUNEVILLE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE	Administrations, bureaux	Immeuble de travail <= 300 personnes	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Intervenant	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
BENJAMIN DERLANGE	Donneur d'ordre	/	/	+336 28 01 89 20

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 23/02/2023

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Pas d'accompagnateur lors du repérage
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Référence	Nom du document	Auteur	Date	Objet du repérage	Conclusions (si rapport de repérage)
LUN-TI-PL01 P-100°	Plans Tribunal Lunéville	Bureau Veritas Solutions	30/01/2023	Plans	/
LUN-TI-PL01 P-100°	Avant projet Tribunal de Lunéville	Bureau Veritas Solutions	30/01/2023	Avant projet détaillé	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

Nota : Tout prélèvement est précédé d'un sondage
ZPSO = zone présentant des similitudes d'ouvrage
X* = élément témoin de la ZPSO n°x

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 1	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	3*	3	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 1	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Gris	2	idem 2	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 1	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	Gris	1	idem 1	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 2	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	3*	idem 3	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 2	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Gris	2	idem 2	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 3	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	3*	idem 3	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 3	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Gris	2	idem 2	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 3	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Gris	2	idem 2	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 4	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	papier	Beige	7*	12	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 5	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	3	13	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ACCUEIL	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	4*	4	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ACCUEIL	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	5	5	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	11	11	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	3*	idem 3	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ACCUEIL	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	Gris	1	idem 1	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SALLE DE PAUSE	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	Gris	1	1	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SALLE DE PAUSE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Gris	2	2	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SALLE DE PAUSE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	3*	idem 3	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> LOCAL INFORMATIQUE	04 - Plafonds et faux plafonds	Coffres horizontaux	Bandes calicot	papier	Beige	6*	6	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> LOCAL INFORMATIQUE	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	papier	Beige	7*	7	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> LOCAL INFORMATIQUE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Jaune	8	8	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> LOCAL INFORMATIQUE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	8	8	/		/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> LOCAL INFORMATIQUE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	3	9	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> WC 1	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	10*	10	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> COULOIR 1	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	3*	idem 3	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER RDC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	23*	34	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER RDC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	23*	35	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER RDC	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	24	36	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER RDC	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Gris	24	36	/		/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER RDC	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	25	37	/	Analyse	Paillasse sous escalier	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER RDC	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Gris	25	37	/		Paillasse sous escalier	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	35	55	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	35	56	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Gris	36*	57	/	Analyse	Sous-bassement	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Gris	36	58	/	Analyse	Sous-bassement	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de coffres	Ragréages	ciment	Gris	36*	59	/	Analyse	Bac de lavoir	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de coffres	Ragréages	ciment	Gris	36	60	/	Analyse	Bac de lavoir	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Gris	37*	61	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Gris	37	62	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SOUS ESCALIER -> SOUS ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	26*	38	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SOUS ESCALIER -> SOUS ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	26	39	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SOUS ESCALIER -> SOUS ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Gris	27*	40	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SOUS ESCALIER -> SOUS ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Gris	27	41	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 6	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	18*	26	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 6	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	19*	27	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 7	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	18	28	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 7	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	19*	29	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 8	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	18	idem 28	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 8	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	19*	idem 27	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 1	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	18	30	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 1	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	21*	31	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	22*	32	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	22	33	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	12	15	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	13*	16	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	papier	Beige	14*	19	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	38*	63	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Jaune	15*	20	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	15*	20	/		/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 1	04 - Plafonds et faux plafonds	Coffres horizontaux	Bandes calicot	papier	Beige	16*	22	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Jaune	15	21	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	15	21	/		/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Coffres horizontaux	Bandes calicot	papier	Beige	16	23	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> PALIER	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	12*	14	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> PALIER	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	13	17	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> PALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	papier	Beige	14	18	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> PALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	38	64	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> CAGE D'ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	17*	24	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> SALLE D'AUDIENCE 1	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	17	25	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> SALLE D'AUDIENCE 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Panneaux	bois	Marron	39	/	/	Par nature ne contient pas d'amiante	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER R+2	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	28*	42	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER R+2	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	28*	43	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER R+2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	30	48	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 9	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	28*	idem 42	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 9	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	31*	idem 46	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 10	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	28*	idem 42	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 10	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	31*	idem 46	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 11	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	28*	idem 42	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 11	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	31*	idem 46	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 12	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	28*	44	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 12	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	30*	45	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 12	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	31*	46	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> SALLE D'AUDIENCE 2	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	31	47	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> SALLE D'AUDIENCE 2	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	plâtre	Blanc	28*	idem 42	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 1	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	ciment	Gris	32*	49	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 1	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	ciment	Gris	33*	51	/	Analyse	Sous-bassement	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 2	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	ciment	Gris	32	50	/	Analyse	/	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 2	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	ciment	Gris	33	52	/	Analyse	Sous-bassement	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 2	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Colle	ciment	Gris	34*	53	/	Analyse	Joint des briques	Non
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 2	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Colle	ciment	Gris	34*	54	/	Analyse	Joint des briques	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 6	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 7	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 8	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> CAGE D'ESCALIER	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 1	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> ESCALIER R+1	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> PALIER	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> SALLE D'AUDIENCE 1	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 10	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 11	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 12	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 13	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 9	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER R+2	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> SALLE D'AUDIENCE 2	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 1	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 2	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ACCUEIL	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 1	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 2	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 3	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 4	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 5	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> COULOIR 1	/

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER RDC	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE	/
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SALLE DE PAUSE	/

7.2. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 23/02/2023
	Auteur	**Beranger Bernard**
	N° dossier	**17811530/S3/1/AM-RTV/1-901EC-240**
Plans	Planche	**1 / 7**
	Indice	**1**

LEGENDE

- Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**
- Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**
- S — **Sondage**
- **Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire**

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

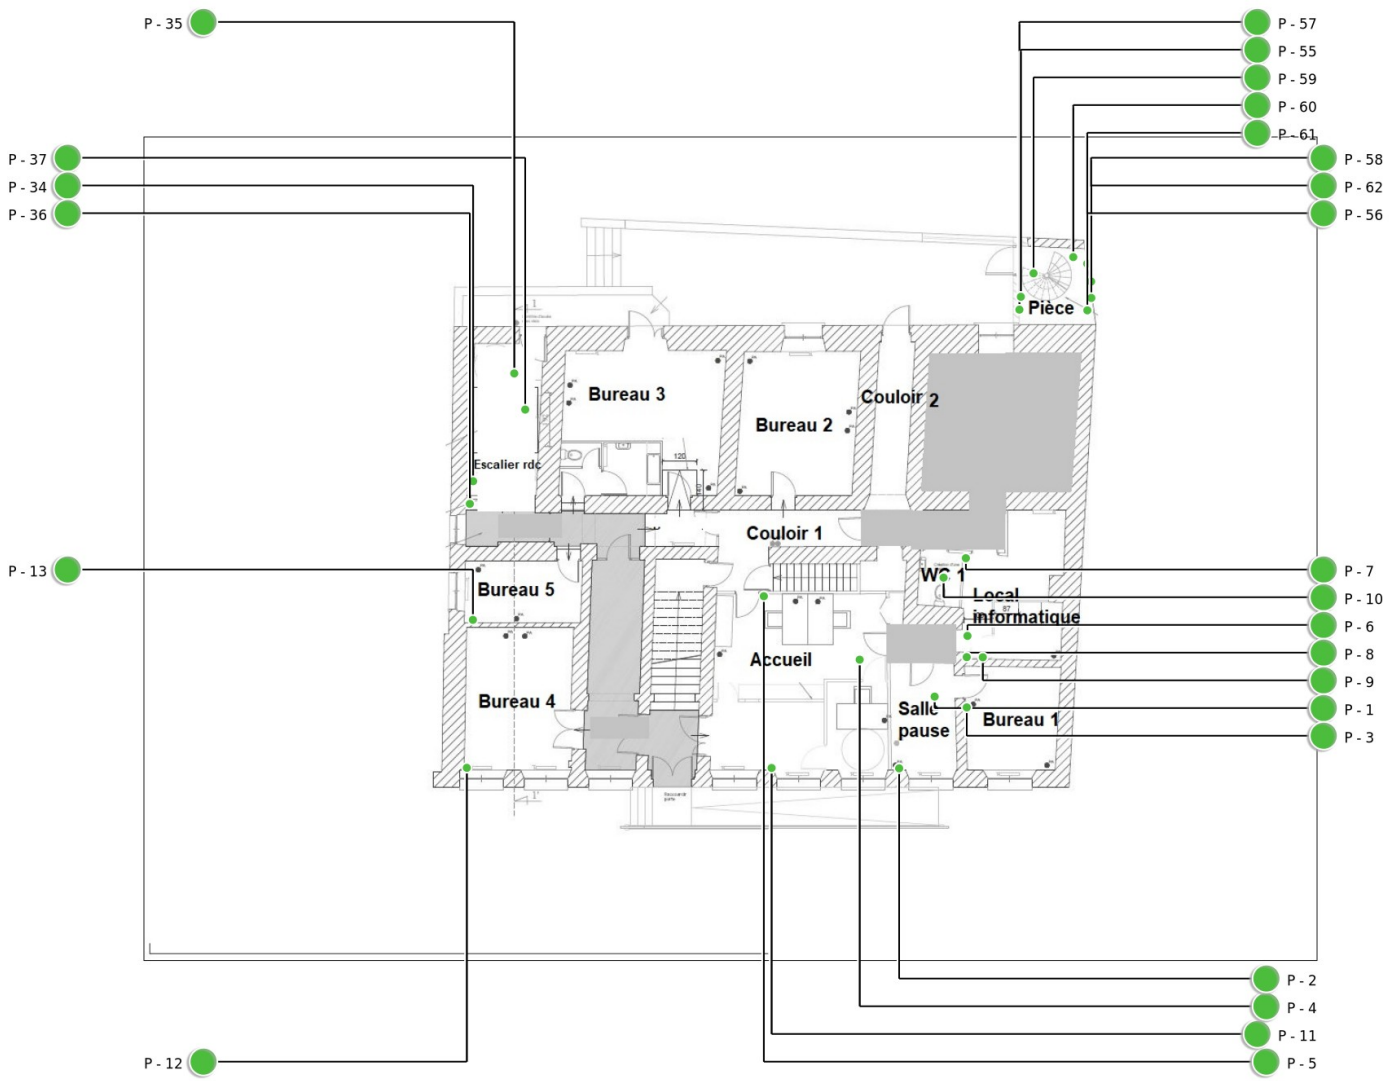


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SOUS ESCALIER	Date visite	Le 23/02/2023
	Auteur	**Beranger Bernard**
	N° dossier	**17811530/S3/1/AM-RTV/1-901EC-240**
	Planche	**2 / 7**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

- Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**
- Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**
- S — **Sondage**
- **Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire**

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

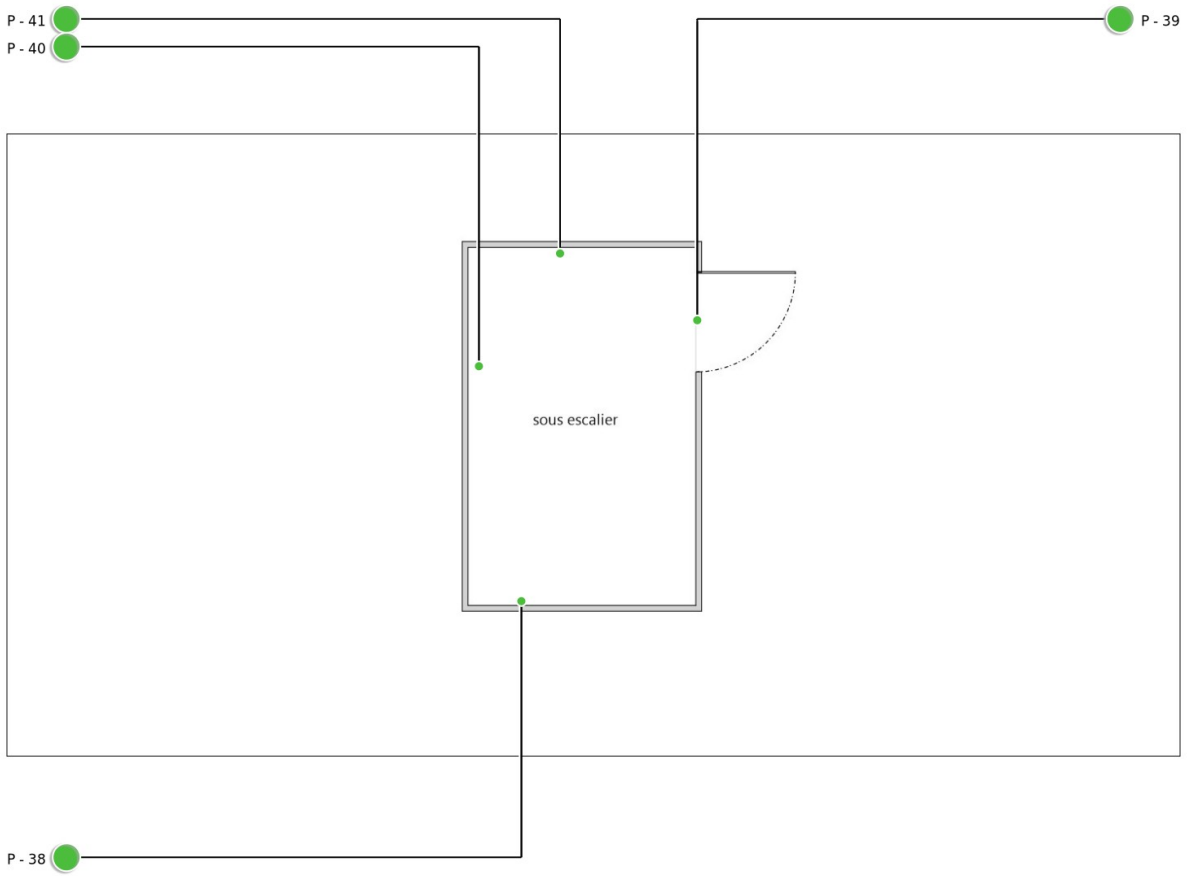


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE	Date visite	Le 23/02/2023
	Auteur	**Beranger Bernard**
	N° dossier	**17811530/S3/1/AM-RTV/1-901EC-240**
	Planche	**3 / 7**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

- Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**
- Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**
- S — **Sondage**
- **Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire**

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

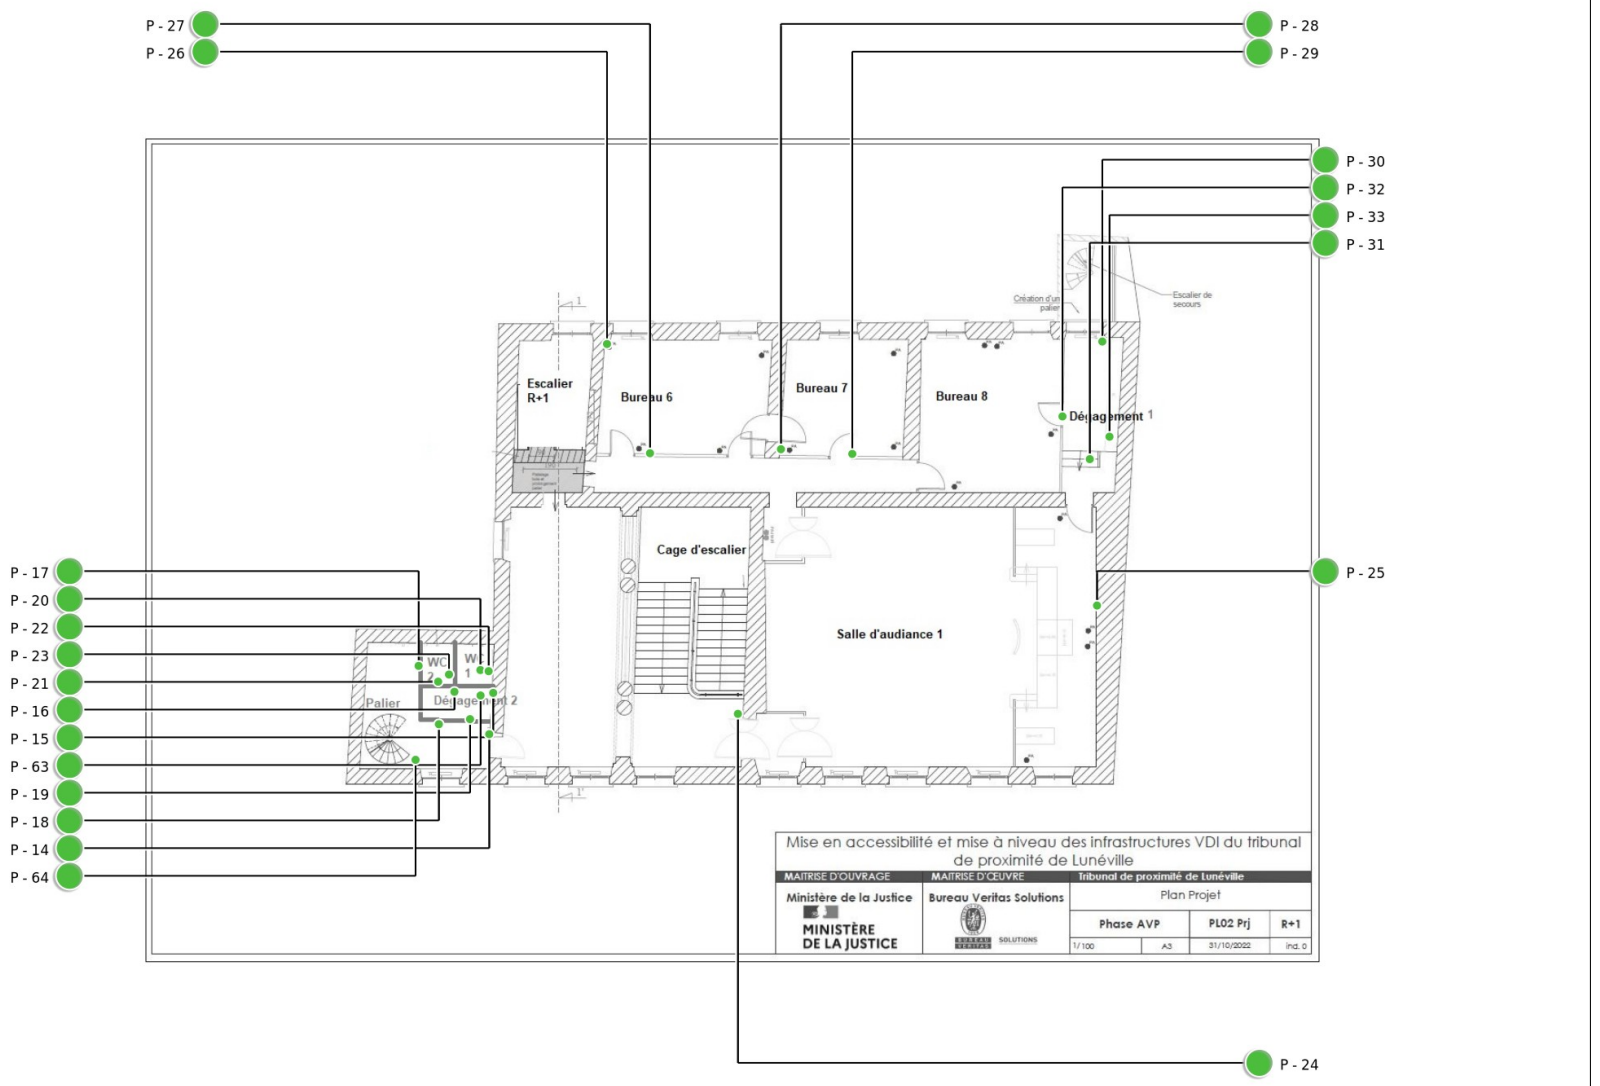


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE	Date visite	Le 23/02/2023
	Auteur	**Beranger Bernard**
	N° dossier	**17811530/S3/1/AM-RTV/1-901EC-240**
	Planche	**4 / 7**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**

Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**

S — **Sondage**

Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

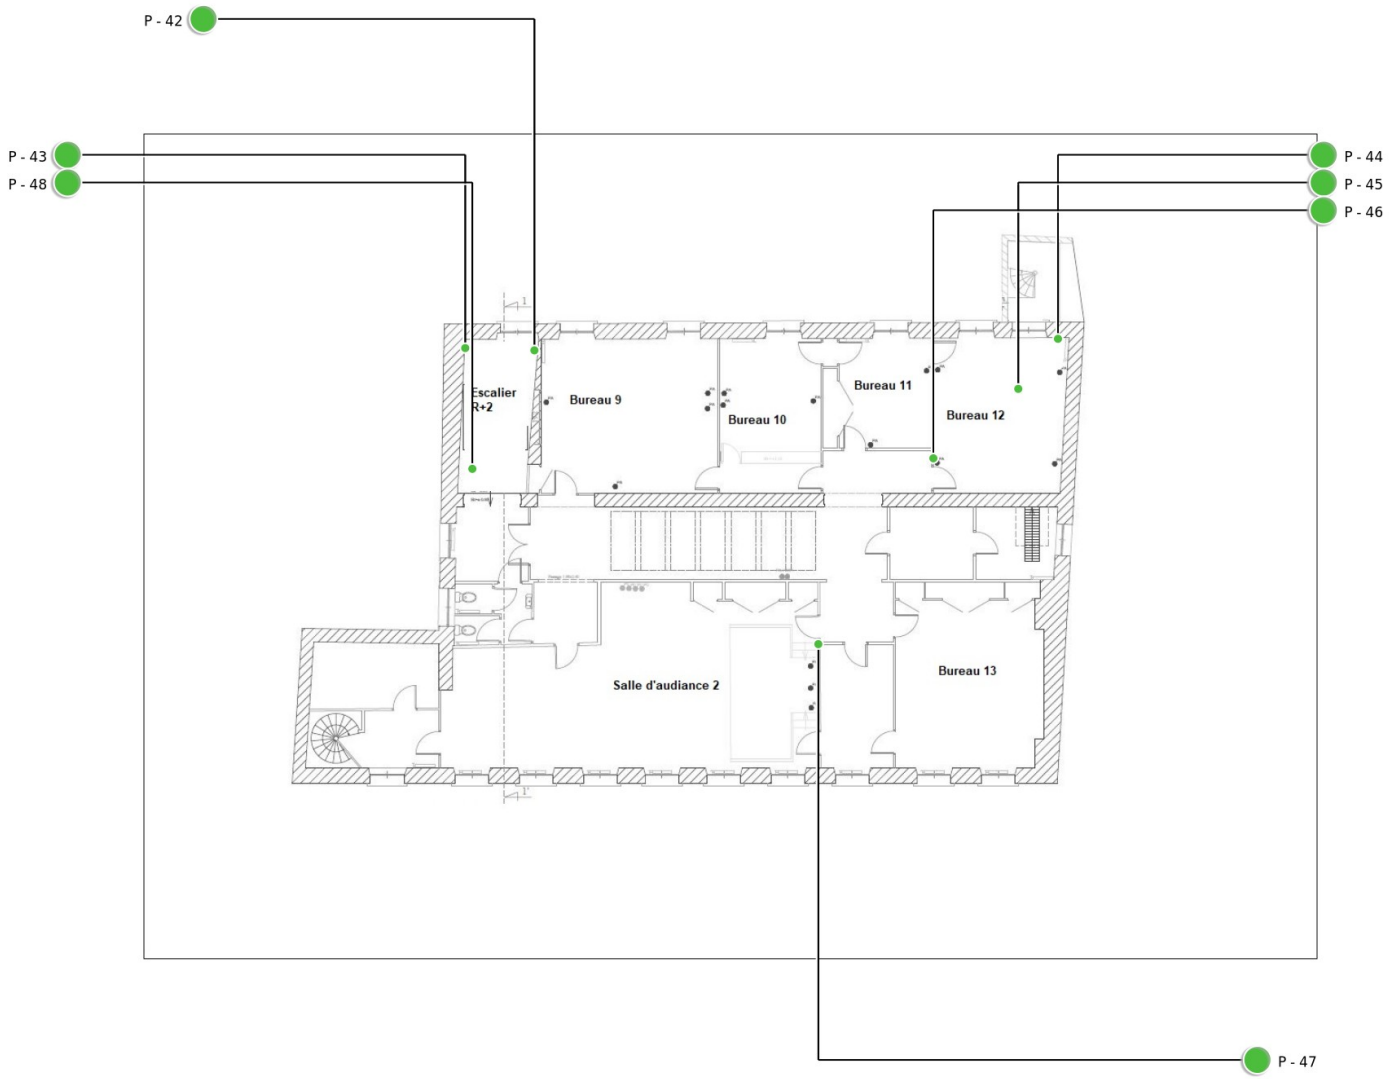



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES	Date visite	Le 23/02/2023
	Auteur	**Beranger Bernard**
	N° dossier	**17811530/S3/1/AM-RTV/1-901EC-240**
	Planche	**5 / 7**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

- Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**
- Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**
- S — **Sondage**
- **Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire**

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

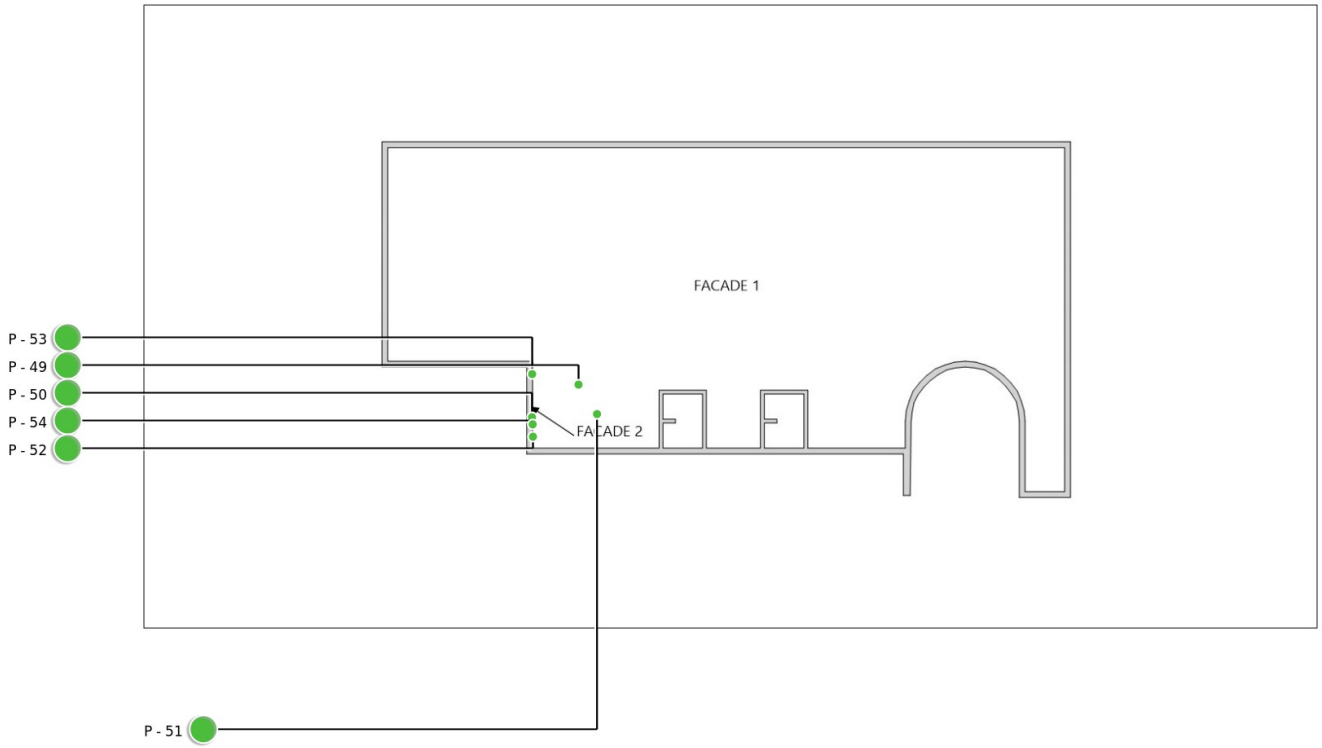

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 23/02/2023
	Auteur	**Beranger Bernard**
	N° dossier	**17811530/S3/1/AM-RTV/1-901EC-240**
	Planche	**6 / 7**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

Px **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**

Px **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**

S **Sondage**

Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Moyen d'acces

Investigation approfondie

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

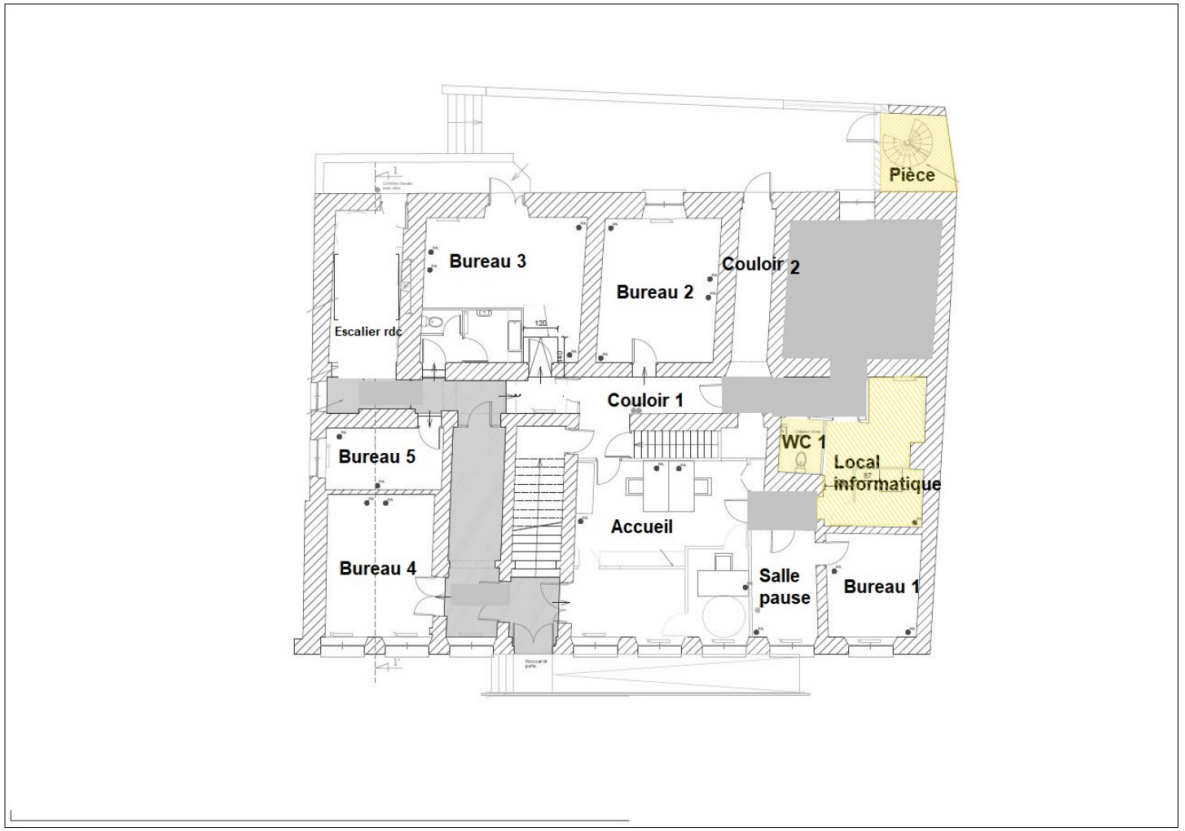


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE	Date visite	Le 23/02/2023
	Auteur	**Beranger Bernard**
	N° dossier	**17811530/S3/1/AM-RTV/1-901EC-240**
	Planche	**7 / 7**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**

Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**


S — **Sondage**

Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Moyen d'acces

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

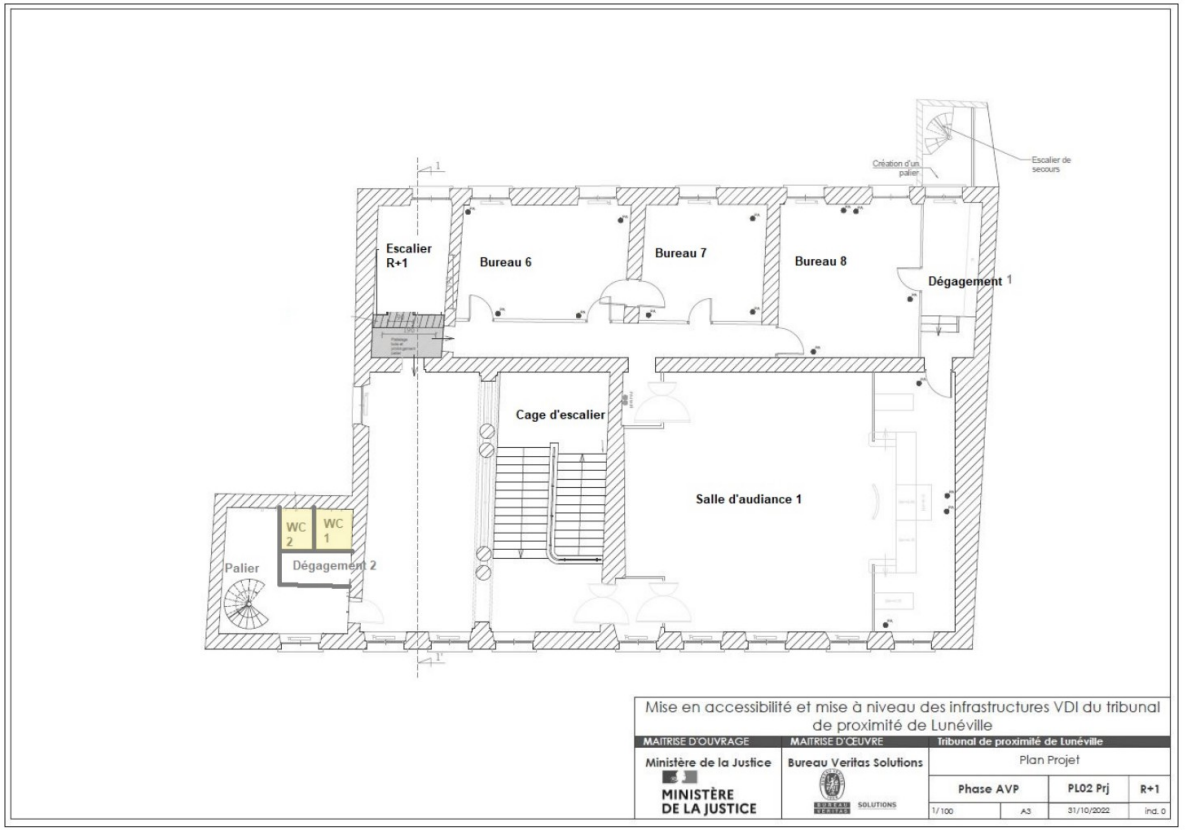


Copyright BUREAU VERITAS

7.3 Reportage Photos

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3 Prélèvement 3 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 1



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 7 Prélèvement 12 Bandes calicot

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 4



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3 Prélèvement 13 Enduits lissés


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> BUREAU 5



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 5 Prélèvement 5 Ragréages


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ACCUEIL

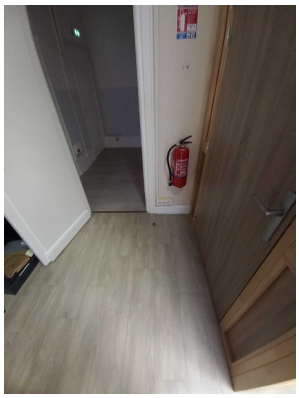

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 1 Prélèvement 1 Plaques


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SALLE DE PAUSE

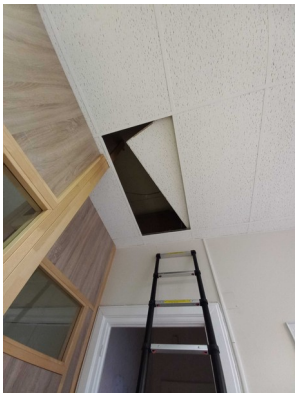

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 2 Prélèvement 2 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SALLE DE PAUSE

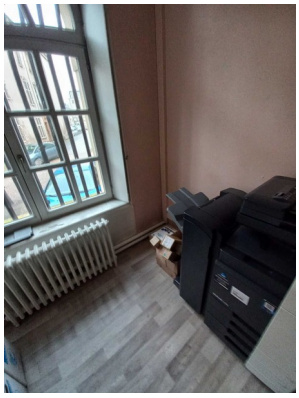

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6 Prélèvement 6 Bandes calicot


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> LOCAL INFORMATIQUE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 7 Prélèvement 7 Bandes calicot

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> LOCAL INFORMATIQUE

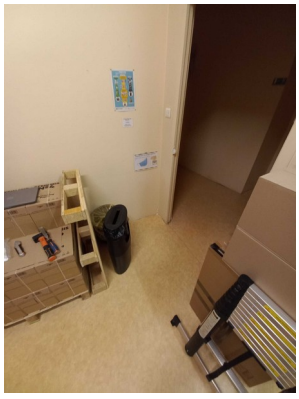

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3 Prélèvement 9 Enduits lissés


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> LOCAL INFORMATIQUE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 10 Prélèvement 10 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> WC 1

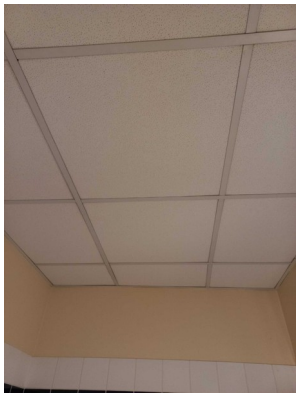

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 23 Prélèvement 34 Colles de carrelage

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER RDC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 23 Prélèvement 35 Colles de carrelage

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER RDC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 24 Prélèvement 36 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER RDC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 25 Prélèvement 37 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER RDC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 35 Prélèvement 55 Ragréages

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 35 Prélèvement 56 Ragréages


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 36 Prélèvement 57 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE

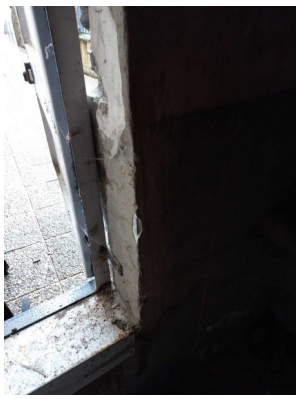

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 36 Prélèvement 58 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 36 Prélèvement 59 Ragréages

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 36 Prélèvement 60 Ragréages

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 37 Prélèvement 61 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 37 Prélèvement 62 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> PIECE



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 26 Prélèvement 38 Ragréages

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SOUS ESCALIER -> SOUS ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 26 Prélèvement 39 Ragréages

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SOUS ESCALIER -> SOUS ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 27 Prélèvement 40 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SOUS ESCALIER -> SOUS ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 27 Prélèvement 41 Enduits lissés


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> REZ DE CHAUSSEE -> SOUS ESCALIER -> SOUS ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 18 Prélèvement 26 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 6

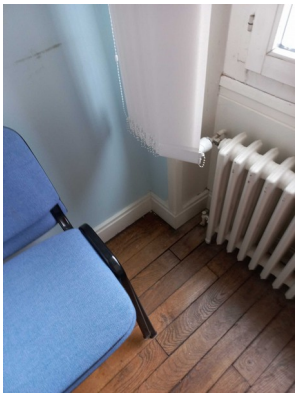

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 19 Prélèvement 27 Enduits lissés


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 6



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 18 Prélèvement 28 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 7



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 19 Prélèvement 29 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> BUREAU 7



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 18 Prélèvement 30 Enduits lissés


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 1



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 21 Prélèvement 31 Enduits lissés


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 1

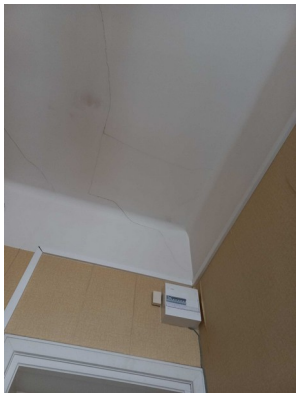

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélèvement 32 Colles de carrelage


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 1

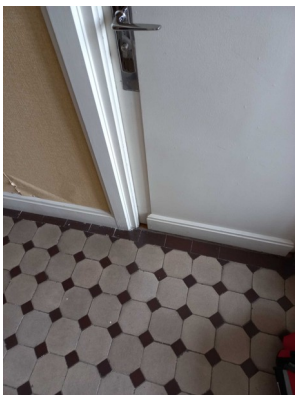

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélèvement 33 Colles de carrelage


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 1

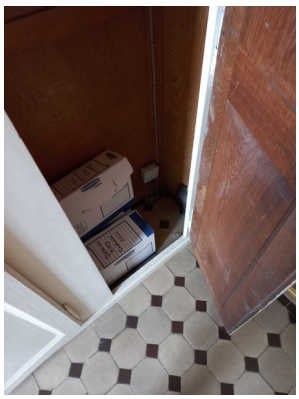

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 12 Prélèvement 15 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2

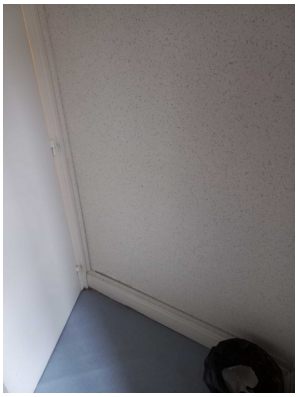

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 13 Prélèvement 16 Enduits lissés


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 15 Prélèvement 20 Colles non bitumineuses


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 1

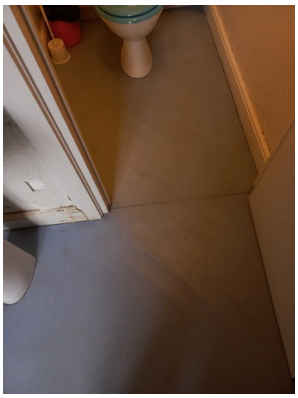

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 16 Prélèvement 22 Bandes calicot


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 1

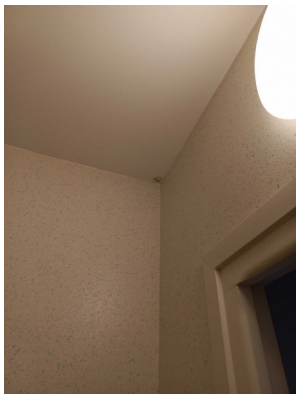

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 15 Prélèvement 21 Colles non bitumineuses


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 2

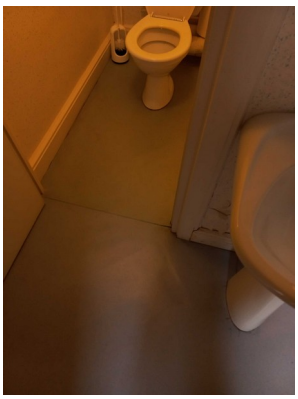

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 16 Prélèvement 23 Bandes calicot

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> WC 2

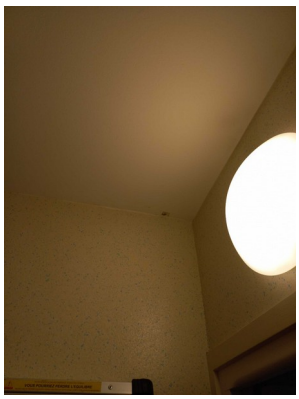


Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 12 Prélèvement 14 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> PALIER

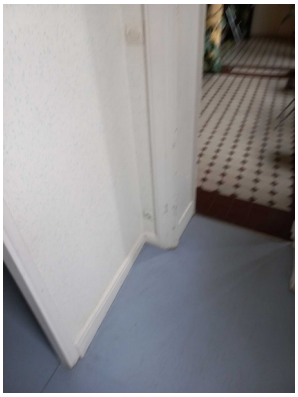

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 13 Prélèvement 17 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> PALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 14 Prélèvement 18 Bandes calicot

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> PALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 17 Prélèvement 24 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> CAGE D'ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 17 Prélèvement 25 Enduits lissés


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 1ER ETAGE -> SALLE D'AUDIENCE 1



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 28 Prélèvement 42 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER R+2

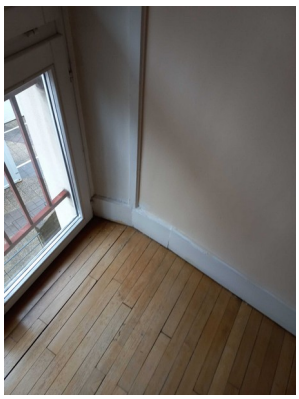


Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 28 Prélèvement 43 Enduits lissés


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER R+2

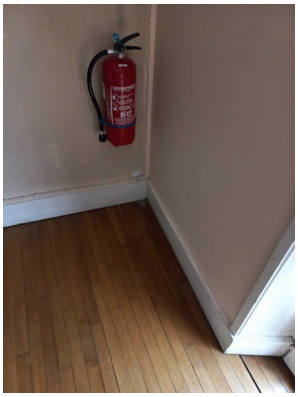

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 30 Prélèvement 48 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER R+2

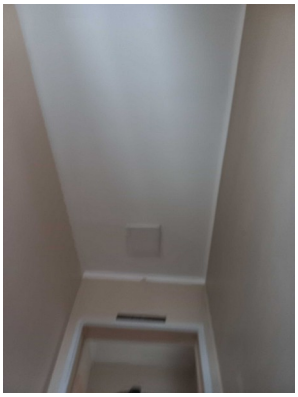

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 28 Prélèvement 44 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 12



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 31 Prélèvement 46 Enduits lissés


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> BUREAU 12



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 31 Prélèvement 47 Enduits lissés

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> 2 EME ETAGE -> SALLE D'AUDIENCE 2

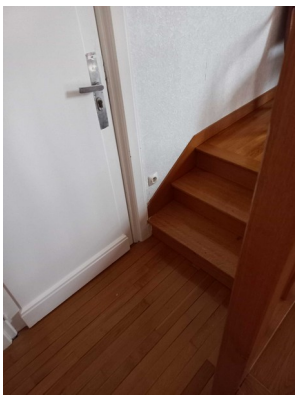

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 32 Prélèvement 49 Crépis

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 1



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 33 Prélèvement 51 Crépis


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 1



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 32 Prélèvement 50 Crépis

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 2

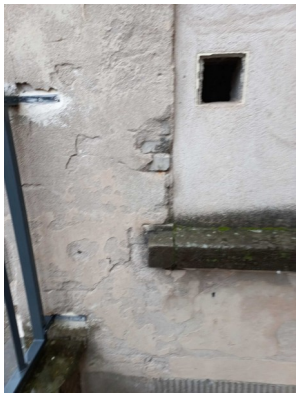

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 33 Prélèvement 52 Crépis

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 2



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 34 Prélèvement 53 Colle


Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 2



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 34 Prélèvement 54 Colle

Localisation : TRIBUNAL DE LUNEVILLE -> PARTIES EXTERIEURES -> FACADE 2

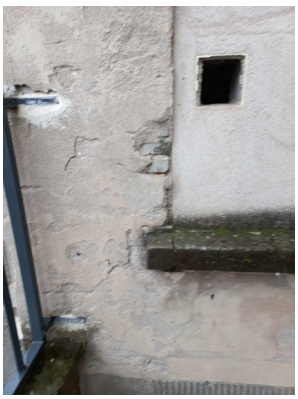

Copyright BUREAU VERITAS

7.4. Attestation d'assurance

MSIG
Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic amiante tels que :

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

Mais également analyses et/ou prélèvements d'échantillons, missions de recherche d'amiante, conseil en performance énergétique et/ou toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil découlant des missions de diagnostics ci-dessus et y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par sinistre** ..... **1 000 000 EUR**

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne

75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

Allemagne

MSIG

Europe

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), par année d'assurance ..... 1 000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
66, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143982 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.5. Certificat de compétence



cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n°4-0657 PORTÉE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

B2C
Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C - 0921

CERTIFICATION
attribuée à :

Béranger BERNARD
Dans les domaines suivants :

Domaine Amiante sans mention
Obtenue le : 18/03/2021 — Valable jusqu'au : 17/03/2028*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Domaine Amiante avec mention
Obtenue le : 18/03/2021 — Valable jusqu'au : 17/03/2028*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Domaine Plomb sans mention
Obtenue le : 18/12/2020 — Valable jusqu'au : 17/12/2027*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Domaine Energie sans mention (DPE)
Obtenue le : 18/03/2021 — Valable jusqu'au : 17/03/2028*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Domaine Energie avec mention (DPE)
Obtenue le : 18/03/2021 — Valable jusqu'au : 17/03/2028*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Domaine Électricité
Obtenue le : 18/12/2020 — Valable jusqu'au : 17/12/2027*
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Domaine Gaz
Obtenue le : 18/12/2020 — Valable jusqu'au : 17/12/2027*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Fait à STRASBOURG, le 18 mars 2021

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site :
www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Beranger BERNARD
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 | Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 |
Dossier N° : 23A010630 | Date de réception : 03/03/2023 | Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3GW0653 Réf. Prel : P - 1 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - SALLE DE PAUSE/Faux plafonds - (fibreux/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige) en traces	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3GW0654 Réf. Prel : P - 2 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - SALLE DE PAUSE/Murs - (ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3GW0655 Réf. Prel : P - 3 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - BUREAU 1/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	BV3GW0656 Réf. Prel : P - 4 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - ACCUEIL/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	BV3GW0657 Réf. Prel : P - 5 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - ACCUEIL/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	BV3GW0658 Réf. Prel : P - 6 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - LOCAL INFORMATIQUE/Coffres horizontaux - (papier/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)(i)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
007	BV3GW0659 Réf. Prel : P - 7 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - LOCAL INFORMATIQUE/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées) - (papier/Beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces(i)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	BV3GW0660 Réf. Prel : P - 8 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - LOCAL INFORMATIQUE/Revêements de sol - (colle/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	BV3GW0661 Réf. Prel : P - 9 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - LOCAL INFORMATIQUE/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	BV3GW0662 Réf. Prel : P - 10 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - WC 1/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	BV3GW0663 Réf. Prel : P - 11 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - ACCUEIL/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 Page4/18
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	BV3GW0664 Réf. Prel : P - 12 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - BUREAU 4/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées) - (papier/Beige)	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	BV3GW0665 Réf. Prel : P - 13 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - BUREAU 5/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	BV3GW0666 Réf. Prel : P - 14 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - PALIER/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	BV3GW0667 Réf. Prel : P - 15 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 2/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 | Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 | Page5/18
Dossier N° : 23A010630 | Date de réception : 03/03/2023 | Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	BV3GW0668 Réf. Prel : P - 16 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 2/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	BV3GW0669 Réf. Prel : P - 17 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - PALIER/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	BV3GW0670 Réf. Prel : P - 18 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - PALIER/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées) - (papier/Beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	BV3GW0671 Réf. Prel : P - 19 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 2/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées) - (papier/Beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	**MET** * / FCGD	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 Page6/18
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	BV3GW0672 Réf. Prel : P - 20 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - WC 1/Revêtements de sol - (colle/Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	BV3GW0673 Réf. Prel : P - 21 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - WC 2/Revêtements de sol - (colle/Jaune)	Matériau souple (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	BV3GW0674 Réf. Prel : P - 22 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - WC 1/Coffres horizontaux - (papier/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces(i)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 Page7/18
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
023 (1)	BV3GW0675 Réf. Prel : P - 23 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - WC 2/Coffres horizontaux - (papier/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
024	BV3GW0676 Réf. Prel : P - 24 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - CAGE D'ESCALIER/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** * / FCGD	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / FCGD	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 Page8/18
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	BV3GW0677 Réf. Prel : P - 25 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - SALLE D'AUDIENCE 1/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	BV3GW0678 Réf. Prel : P - 26 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - BUREAU 6/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	BV3GW0679 Réf. Prel : P - 27 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - BUREAU 6/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 Page9/18
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	BV3GW0680 Réf. Prel : P - 28 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - BUREAU 7/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	BV3GW0681 Réf. Prel : P - 29 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - BUREAU 7/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc)	**MET** * / FCGD	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	BV3GW0682 Réf. Prel : P - 30 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 1/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 Page10/18
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc)	**MET** * / FCGD	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	BV3GW0683 Réf. Prel : P - 31 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 1/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur (granulaire) (fibreux) (gris)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	BV3GW0684 Réf. Prel : P - 32 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 1/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur (gris)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	BV3GW0685 Réf. Prel : P - 33 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 1/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau dur (gris)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	BV3GW0686 Réf. Prel : P - 34 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - ESCALIER RDC/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur (gris)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 Page11/18
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	BV3GW0687 Réf. Prel : P - 35 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - ESCALIER RDC/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036	BV3GW0688 Réf. Prel : P - 36 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - ESCALIER RDC/Murs (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	BV3GW0689 Réf. Prel : P - 37 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - ESCALIER RDC/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 Page12/18
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	BV3GW0690 Réf. Prel : P - 38 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - SOUS ESCALIER - SOUS ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (marron)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	BV3GW0691 Réf. Prel : P - 39 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - SOUS ESCALIER - SOUS ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
040	BV3GW0692 Réf. Prel : P - 40 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - SOUS ESCALIER - SOUS ESCALIER/Murs - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
041	BV3GW0693 Réf. Prel : P - 41 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - SOUS ESCALIER - SOUS ESCALIER/Murs - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
042	BV3GW0694 Réf. Prel : P - 42 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 2 EME ETAGE - ESCALIER R+2/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / FCGD	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 Page13/18
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	BV3GW0695 Réf. Prel : P - 43 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 2 EME ETAGE - ESCALIER R+2/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau (gris) (bleu)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
044	BV3GW0696 Réf. Prel : P - 44 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 2 EME ETAGE - BUREAU 12/Murs - (plâtre/Blanc	Matériau (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
045	BV3GW0697 Réf. Prel : P - 45 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 2 EME ETAGE - BUREAU 12/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	BV3GW0698 Réf. Prel : P - 46 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 2 EME ETAGE - BUREAU 12/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047	BV3GW0699 Réf. Prel : P - 47 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 2 EME ETAGE - SALLE D'AUDIENCE 2/Murs - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / FCGD	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048	BV3GW0700 Réf. Prel : P - 48 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 2 EME ETAGE - ESCALIER R+2/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
049	BV3GW0701 Réf. Prel : P - 49 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - PARTIES EXTERIEURES - FACADE 1/Façades lourdes - (ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / M44U	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 Page15/18
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	BV3GW0702 Réf. Prel : P - 50 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - PARTIES EXTERIEURES - FACADE 2/Façades lourdes - (ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051	BV3GW0703 Réf. Prel : P - 51 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - PARTIES EXTERIEURES - FACADE 1/Façades lourdes - (ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
052	BV3GW0704 Réf. Prel : P - 52 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - PARTIES EXTERIEURES - FACADE 2/Façades lourdes - (ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
053	BV3GW0705 Réf. Prel : P - 53 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - PARTIES EXTERIEURES - FACADE 2/Façades lourdes - (ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
054	BV3GW0706 Réf. Prel : P - 54 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - PARTIES EXTERIEURES - FACADE 2/Façades lourdes - (ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
055	BV3GW0707 Réf. Prel : P - 55 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - PIECE/Revêtements de sol - (ciment/Gris)					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 Page16/18
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
056	BV3GW0708 Réf. Prel : P - 56 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - PIECE/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
057	BV3GW0709 Réf. Prel : P - 57 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - PIECE/Murs - (ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
058	BV3GW0710 Réf. Prel : P - 58 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - PIECE/Murs - (ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
059	BV3GW0711 Réf. Prel : P - 59 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - PIECE/Revêtements de coffres - (ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
060	BV3GW0712 Réf. Prel : P - 60 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - PIECE/Revêtements de coffres - (ciment/Gris)					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56
Dossier N° : 23A010630 Date de réception : 03/03/2023 Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
061	BV3GW0713 Réf. Prel : P - 61 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - PIECE/Murs - (ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
062	BV3GW0714 Réf. Prel : P - 62 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - REZ DE CHAUSSEE - PIECE/Murs - (ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
063	BV3GW0715 Réf. Prel : P - 63 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 2/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
064	BV3GW0716 Réf. Prel : P - 64 TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 1ER ETAGE - PALIER/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / SLP2	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau de type plâtre est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX


N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-017356-01 | Date d'émission de rapport : 09/03/2023 9:56 | Page18/18
Dossier N° : 23A010630 | Date de réception : 03/03/2023 | Date d'analyse : 06/03/2023
Référence dossier Client:15100797887/17811530/S3/1/1_17811530/4/4

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Cindy Gompper-Denni
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS
