BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Lorraine Bourgogne (Nancy)
ZAC De frocourt
29 rue Antoine de St Exupery
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 32061146/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 10/07/2026

Référence au programme de travaux :
_ RAAT diag amiante avant travaux + diag plomb tribunal de Lunéville (54300) _ RAAT diag amiante avant travaux + diag plomb tribunal de Lunéville (54300) réalisé le 02/04/2026 par CECILE BOUR

DONNEUR D'ORDRE

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
CECILE BOUR
7 RUE DU CHATEAU
54300 LUNEVILLE

SITE D'INTERVENTION

TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE

7 RUE DU CHATEAU
54300 LUNEVILLE

TRIBUNAL DE PROXIMITE

Latitude : 48.593700 / Longitude : 6.491900

Date(s) d'intervention(s) :
Le 23/06/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Beranger Bernard	Operateur de repérage	Certification N° B2C - 0921	Beranger Bernard

Le présent rapport comporte 79 pages, dont 47 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION 3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 6

2. CONCLUSIONS 7
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 7
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre 8
2.3. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux 8
2.4. Obligations réglementaires 9

3. INFORMATIONS GENERALES 10
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 10
3.2. Parties prenantes 10


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE 10
4.1. Références réglementaires 10

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 11
5.1. Date(s) de visite(s) 11
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 11
5.3. Conditions spécifiques 11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 11

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 12
6.1. Matériaux et produits repérés 12
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 32

7. ANNEXES 33
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 33
7.2. Photos prélèvements 36
7.3. Photos sondages 44
7.4. Photos inaccessibilités 46
7.5. Attestation d'assurance 48
7.6. Certificat de compétence 50
7.7. Croquis de repérage 51
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire 61

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

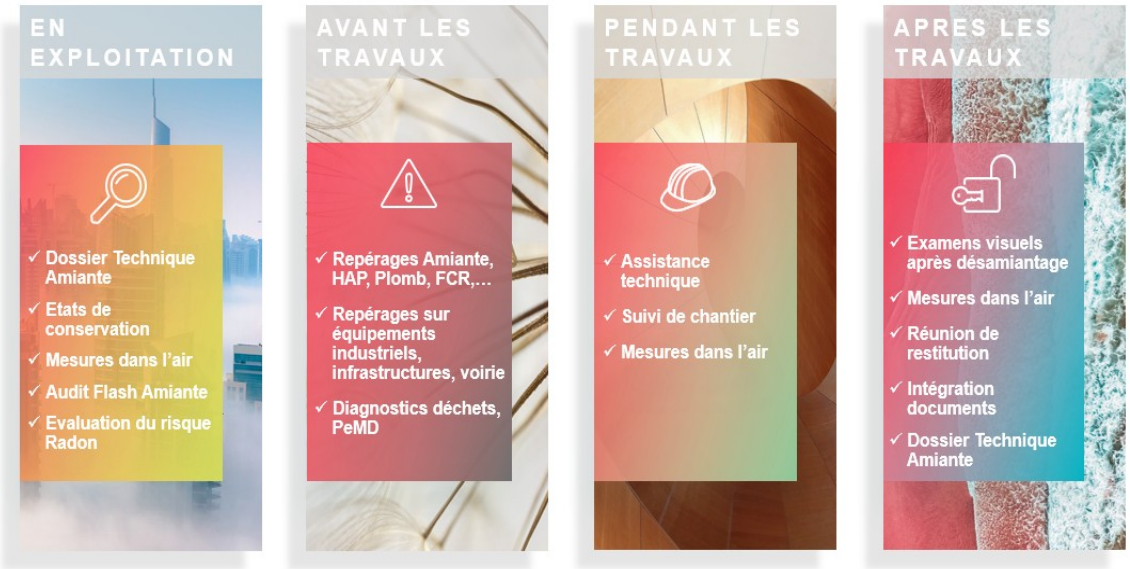

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Mise en accessibilité et mise à niveau des infrastructures VDI. Pose de radiateurs , création d'une rampe d'accés PMR, remplacement de fenêtres et portes, démolition de cloisons, pose de faux plafonds

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits de fumée, Conduits eaux pluviales, Conduits eaux usées
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels (façade)
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bacs fibrociment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis fenêtres fibrociment, Coffrages perdus, Colle, Colles carrelage, Colles faïence, Colles pâte de verre, Couvre-joints, Enduits pelliculaires façades, Enduits projetés/crépis façades, Garnissage joints dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints carrelage, Joints dilatation, Joints faïence, Joints pâte de verre, Maçonnerie silico-calcaire, Peintures façades, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés sous bardage, Flocages sous bardage
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Plinthes	Peintures plinthes
Portes	Peintures
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs portes, Joints bandes portes, Joints portes, Joints tresses portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits projetés charpente, Enduits projetés/talochés charpente, Flocages charpente, Joints charpentes, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures charpente, Peintures intumescentes charpente, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres
Suspentes et contrevents	Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements clapets CF, Clapets CF, Joints clapets CF, Lames clapets CF, Rebouchages clapets CF, Tunnels clapets CF
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité trappes, Vidoirs en fibrociment
Volets coupe-feu	Calfeutrements volets CF, Ossature volets CF, Rebouchages volets CF, Volets CF
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments anti arcs électriques, Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments anti arcs électriques, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments anti arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement mur/plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement mur/plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement mur/plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux
Portes palière monte-charges	
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments fibrociment
Baignoires	Plaques antivibratiles baignoires
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints brides, Joints d'étanchéité, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques antivibratiles éviers
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments fibrociment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques antivibratiles placards
Pots de fleur	Eléments fibrociment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Aménagements extérieurs	Bordures fibrociment, Eléments extérieurs fibrociment, Jardinières fibrociment, Plaques de caniveau fibrociment, Pots de fleur fibrociment
Conduits	Eléments de canalisations enterrés
Espaces sportifs	Revêtements de sol
Grilles	Peintures
Murs	Enduits lissage/ragréage murs
Portails	Peintures
Portes	
Revêtements de murs	Peintures décoratives
Syphons	Eléments de canalisations enterrés
Voiries	Asphaltes, Enrobé bitumineux

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.
Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
De plus, des investigations complémentaires doivent être réalisées en cours de travaux.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
36	R+1 -> 101 SALLE DES PAS PERDUS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Beige, Blanc
47	RDC -> 009 SANITAIRES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc
45	RDC -> 009 SANITAIRES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
RDC -> 009 SANITAIRES (IA 1)	Coffre sous baignoire	Trappe d accès collée	Démonter la trappes d accès
EXTERIEURS -> TOITURES (IA 2)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	Investigations destructives sur étanchéité requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire intervenir un étancheur qualifié pour rebouchage des investigations destructives

2.3. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
R+1 -> 101 SALLE DES PAS PERDUS (IC 3)	6- Conduits et accessoires intérieurs - Conduit derrière un plaquage empêchant l'accès	Investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les conditions d'occupation le permettront

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE
7 RUE DU CHATEAU
54300 LUNEVILLE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
CECILE BOUR	Donneur d'ordre	UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS	7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 23/06/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Repérage amiante avant travaux / 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE	BUREAU VERITAS BERNARD Béranger	14/03/2023	17811530/S3/1/AM-RTV/1-901EC-240	Absence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE	BUREAU VERITAS BERNARD Béranger	09/11/2023	18558850/S1/6/AM-RTV/1-95623-83	Présence d'amiante
Programme de travaux / _ RAAT diag amiante avant travaux + diag plomb tribunal de Lunéville (54300)	CECILE BOUR	02/04/2026	_ RAAT diag amiante avant travaux + diag plomb tribunal de Lunéville (54300)	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 001 ENTRÉE	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	20	/	S2	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non
RDC -> 002 CIRCULATION	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	/	S7	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Fibreux	Gris	44	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> 003 ANTENNE DE JUSTICE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	/	S8	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 003 ANTENNE DE JUSTICE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	7	BV3GW0664_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0664	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Fibreux	Gris	44	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> 005 CIRCULATION	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Jaune	49	P13* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	49	P13* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Jaune	49	P14 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	49	P14 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment	Gris	2	P4* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Fibreux	Gris	44	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> 006 ANTENNE DE JUSTICE	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Fibreux	Gris	44	P3* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	3	P18* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	3	BV3GW0665_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0665	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 007 CIRCULATION	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	23	BV3GW0689_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0689	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Gris	23	BV3GW0689_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0689	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	21	BV3GW0686_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0686	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	21	BV3GW0687_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0687	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	22	BV3GW0688_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0688	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Gris	22	BV3GW0688_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0688	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 008 LOCAL	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	BV3GW0690_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0690	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	BV3GW0691_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0691	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment	Gris	25	BV3GW0692_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0692	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment	Gris	25	BV3GW0693_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0693	Non
RDC -> 009 SANITAIRES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris	45	P5*P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	47	P7*P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	47	P8P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	46	P6*N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	46	P11N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 009 SANITAIRES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	48	P9* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	48	P10 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris	45 (i)	P12 N	/	AN	/	***Oui***
RDC -> 010 ANTENNE DE JUSTICE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	3	/	S6	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	/	S5	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Fibreux	Gris	44	/	S4	AN	/	Non
RDC -> 012 SERVICES PROTECTION DES PM	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	27	/	S11	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	3	Idem P 18	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non
RDC -> 013 CIRCULATION	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	46	/	S9	AN	/	Non
RDC -> 015 ARCHIVES	Revêtements de sol	Peintures sol	Décoratif	Gris	50	P15* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	50	P15* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures sol	Décoratif	Gris	50	P16 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 015 ARCHIVES	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	50	P16 N	/	AN	/	Non
RDC -> 016 INFORMATIQUE BUREAU	Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines	Papier	Beige	6	BV3GW0658_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0658	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	8	BV3GW0660_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0660	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	8	BV3GW0660_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0660	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	7	BV3GW0659_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0659	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	3	BV3GW0661_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0661	Non
RDC -> 017 SANITAIRES	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	9	BV3GW0662_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0662	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 019 REPROGRAPHIE	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Gris	1	BV3GW0653_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0653	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment	Gris	2	BV3GW0654_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0654	Non
RDC -> 020 GREFFE CIVIL	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	3	BV3GW0655_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0655	Non
RDC -> 021 ACCUEIL BUREAU DU GREFFE	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	4	BV3GW0656_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0656	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	5	BV3GW0657_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0657	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	10	BV3GW0663_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0663	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 023 LOCAL	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	3	/	S10	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	5	P17* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non
RDC -> PIECE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	32	BV3GW0708_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0708	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	32	BV3GW0707_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0707	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment	Gris	33	BV3GW0709_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0709	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Ragréages	Ciment	Gris	33	BV3GW0709_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0709	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment	Gris	33	BV3GW0710_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0710	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Ragréages	Ciment	Gris	33	BV3GW0710_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0710	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment	Gris	33	BV3GW0711_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0711	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Ragréages	Ciment	Gris	33	BV3GW0711_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0711	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment	Gris	33	BV3GW0712_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0712	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Ragréages	Ciment	Gris	33	BV3GW0712_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0712	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment	Gris	34	BV3GW0713_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0713	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment	Gris	34	BV3GW0714_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0714	Non
R+1 -> 101 SALLE DES PAS PERDUS	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	42	BV3LQ3784_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 Prélèvement antérieur : BV3LQ3784	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	42	BV3LQ3785_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 Prélèvement antérieur : BV3LQ3785	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Beige, Blanc	36	BV3GW5276_antP	/	DC	Reprise sur mur Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW5276	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	16	BV3GW0676_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0676	Non
	Poteaux	Enduits lissage/ragréage poteaux	Plâtre	Beige, Blanc	37	BV3GW5278_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW5278	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 101 SALLE DES PAS PERDUS	Poteaux	Enduits lissage/ragréage poteaux	Plâtre	Beige, Blanc	37	BV3GW5279_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW5279	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	Décoratif	Beige	38	BV3GW5280_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW5280	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	Décoratif	Beige	38	BV3GW5281_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW5281	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Beige	41	BV3GW5277_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW5277	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige	39	BV3GW5282_antN	/	DC	Radiateur Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW5282	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 101 SALLE DES PAS PERDUS	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige	39	BV3GW5283_antN	/	DC	Radiateur Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW5283	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Beige	40	BV3GW5284_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW5284	Non
	Poteaux	Enduits lissage/ragréage poteaux	Plâtre	Beige, Blanc	37	/	S3	DC	Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige	39	/	S1	DC	Radiateur Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023 radiateur	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Beige, Blanc	36 (i)	P43*N	/	DC	Reprise sur mur Repérage amiante avant travaux - 20183423-AM RTV-Salle des pas perdus - Tribunal de LUNEVILLE - 09/11/2023	***Oui***
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige	43	P1*N	/	AN	Plâtre	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 102 CIRCULATION	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	35	BV3GW0716_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0716	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	11	BV3GW066_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW066	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	12	BV3GW0669_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0669	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	13	BV3GW0670_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0670	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	13	BV3GW0671_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0671	Non
R+1 -> 103 SANITAIRES	Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines	Papier	Beige	15	BV3GW0674_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0674	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 103 SANITAIRES	Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines	Papier	Beige	15	BV3GW0675_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0675	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	35	BV3GW0715_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0715	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	14	BV3GW0672_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0672	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	14	BV3GW0672_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0672	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	14	BV3GW0673_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0673	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	14	BV3GW0673_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0673	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 103 SANITAIRES	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	11	BV3GW0667_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0667	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	12	BV3GW0668_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0668	Non
R+1 -> 105 SALLE STANISLAS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	17	BV3GW0678_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0678	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	18	BV3GW0679_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0679	Non
R+1 -> 106 EMILIE DU CHÂTELET	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	17	BV3GW0680_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0680	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	18	BV3GW0681_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0681	Non
R+1 -> 107 BUREAU JUGE D'INSTRUCTION	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	3	Idem P 18	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 108 VESTIAIRES	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	19	BV3GW0683_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0683	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	20	BV3GW0684_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0684	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	20	BV3GW0685_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0685	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	17	BV3GW0682_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0682	Non
R+1 -> 109 SALLE D'AUDIENCE	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	27	/	S12	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	16	BV3GW0677_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0677	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 201 CIRCULATION	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	27	BV3GW0700_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0700	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	26	BV3GW0694_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0694	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	26	BV3GW0695_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0695	Non
R+2 -> 207 BUREAU C.P	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	27	BV3GW0697_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0697	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	26	BV3GW0696_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0696	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	28	BV3GW0698_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0698	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 212 SALLE DES PRUD'HOMMES	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	Blanc	28	BV3GW0699_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0699	Non
R+2 -> 215 SANITAIRES	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	51	P20*N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	51	P21N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris	52	P22*N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris	52	P23N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	53	P24*N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	53	P25N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige	43	P19N	/	AN	Plâtre	Non
EXTERIEURS -> FAÇADES	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Enduit	Beige	54	/	S13	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Enduit	Gris	54	/	S13	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	56	P30*N	/	AN	Dalles extérieur béton désactivé	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	56	P31N	/	AN	Dalles extérieur béton désactivé	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	57	P32*N	/	AN	marches entrée	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
EXTERIEURS -> FAÇADES	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	57	P33 N	/	AN	marches entrée	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	63	P39* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	63	P40 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Ciment	Gris	55	P28* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Ciment	Gris	55	P29 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Enduit	Beige	54	P26* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Enduit	Gris	54	P26* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Enduit	Beige	54	P27 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Enduit	Gris	54	P27 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Gris, Marron, Noir	58	P34* N	/	AN	grilles fenêtres	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris, Jaune, Orange	59	P35* N	/	AN	volets fenêtres	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Jaune, Noir, Orange	60	P36* N	/	AN	grilles fenêtres	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	61	P37* N	/	AN	muret	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Blanc, Marron, Noir	62	P38* N	/	AN	Barrière	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Noir, Vert	64	P41* N	/	AN	grilles	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
EXTERIEURS -> FAÇADES	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Orange	65	P42* N	/	AN	volets	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Ciment	Gris	29	BV3GW0701_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0701	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Ciment	Gris	29	BV3GW0702_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0702	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Ciment	Gris	30	BV3GW0703_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0703	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Ciment	Gris	30	BV3GW0704_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0704	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Ciment	Gris	31	BV3GW0705_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0705	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Ciment	Gris	31	BV3GW0706_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 17811530_AM RTV-TRIBUNAL DE LUNEVILLE - 14/03/2023 Prélèvement antérieur : BV3GW0706	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
36	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	70 m²
45	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	20 ml
47	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	20 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC	/
RDC -> 001 ENTRÉE	/
RDC -> 002 CIRCULATION	/
RDC -> 003 ANTENNE DE JUSTICE	/
RDC -> 004 ANTENNE DE JUSTICE	/
RDC -> 005 CIRCULATION	/
RDC -> 006 ANTENNE DE JUSTICE	/
RDC -> 007 CIRCULATION	/
RDC -> 008 LOCAL	/
RDC -> 009 SANITAIRES	/
RDC -> 010 ANTENNE DE JUSTICE	/
RDC -> 011 CIRCULATION	/
RDC -> 012 SERVICES PROTECTION DES PM	/
RDC -> 013 CIRCULATION	/
RDC -> 014 CIRCULATION	/
RDC -> 015 ARCHIVES	/
RDC -> 016 INFORMATIQUE BUREAU	/
RDC -> 017 SANITAIRES	/
RDC -> 018 CIRCULATION	/
RDC -> 019 REPROGRAPHIE	/
RDC -> 020 GREFFE CIVIL	/
RDC -> 021 ACCUEIL BUREAU DU GREFFE	/
RDC -> 022 LT	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC -> 023 LOCAL	/
RDC -> PIECE	/
R+1	/
R+1 -> 101 SALLE DES PAS PERDUS	/
R+1 -> 102 CIRCULATION	/
R+1 -> 103 SANITAIRES	/
R+1 -> 104 CIRCULATION	/
R+1 -> 105 SALLE STANISLAS	/
R+1 -> 106 EMILIE DU CHÂTELET	/
R+1 -> 107 BUREAU JUGE D'INSTRUCTION	/
R+1 -> 108 VESTIAIRES	/
R+1 -> 109 SALLE D'AUDIENCE	/
R+1 -> 110 SAS	/
R+1 -> 111 SAS	/
R+2	/
R+2 -> 201 CIRCULATION	/
R+2 -> 202 CIRCULATION	/
R+2 -> 203 DIRECTION DU GREFFE	/
R+2 -> 204 VPJCP	/
R+2 -> 205 DGT	/
R+2 -> 206 JCP	/
R+2 -> 207 BUREAU C.P	/
R+2 -> 208 LOCAL	/
R+2 -> 209 LOCAL	/
R+2 -> 210 SALLE DE CONCILIATION	/
R+2 -> 211 BUREAU	/
R+2 -> 212 SALLE DES PRUD'HOMMES	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 -> 213 CIRCULATION	/
R+2 -> 214 ARCHIVES	/
R+2 -> 215 SANITAIRES	/
EXTERIEURS	/
EXTERIEURS -> FAÇADES	/
EXTERIEURS -> TOITURES	/

7.2. Photos prélèvements

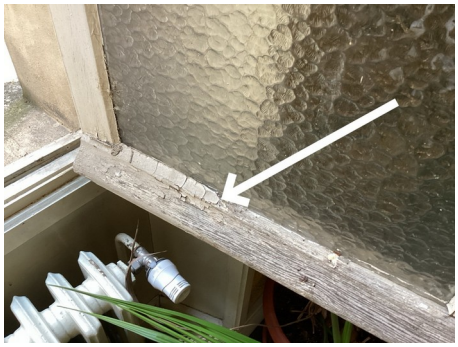P1	ZPSO 43
R+1 -> 101 SALLE DES PAS PERDUS	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P3	ZPSO 44
RDC -> 006 ANTENNE DE JUSTICE	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P3	ZPSO 44
RDC -> 006 ANTENNE DE JUSTICE	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P4	ZPSO 2
RDC -> 005 CIRCULATION	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs	

P5	ZPSO 45
RDC -> 009 SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P6	ZPSO 46
RDC -> 009 SANITAIRES	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P7	ZPSO 47

RDC -> 009 SANITAIRES



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

P8	ZPSO 47

RDC -> 009 SANITAIRES



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

P9	ZPSO 48

RDC -> 009 SANITAIRES



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

P10	ZPSO 48

RDC -> 009 SANITAIRES



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

P11	ZPSO 46

RDC -> 009 SANITAIRES



Revêtements de sol -> Colles carrelage


P12	ZPSO 45

RDC -> 009 SANITAIRES




Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P13	ZPSO 49
RDC -> 005 CIRCULATION	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses | Ragréages	

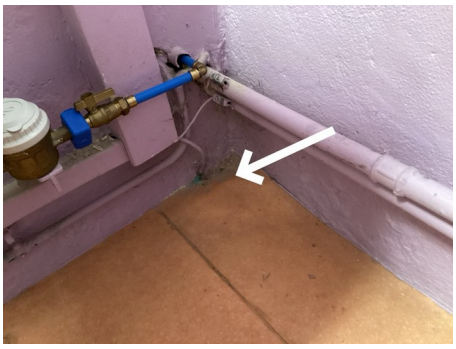P14	ZPSO 49
RDC -> 005 CIRCULATION	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses | Ragréages	

P15	ZPSO 50
RDC -> 015 ARCHIVES	
	
Revêtements de sol -> Peintures sol | Ragréages	

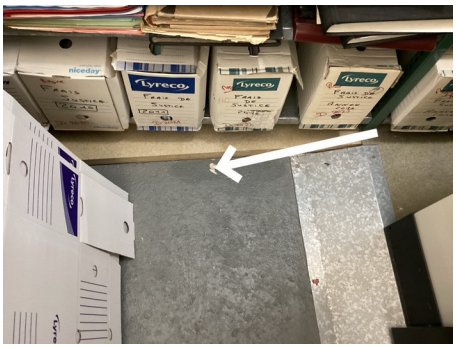P16	ZPSO 50
RDC -> 015 ARCHIVES	
	
Revêtements de sol -> Peintures sol | Ragréages	

P17	ZPSO 5
RDC -> 023 LOCAL	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P18	ZPSO 3
RDC -> 006 ANTENNE DE JUSTICE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs	

P19	ZPSO 43
R+2 -> 215 SANITAIRES	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P20	ZPSO 51
R+2 -> 215 SANITAIRES	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P21	ZPSO 51
R+2 -> 215 SANITAIRES	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P22	ZPSO 52
R+2 -> 215 SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P23	ZPSO 52
R+2 -> 215 SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P24	ZPSO 53
R+2 -> 215 SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P24	ZPSO 53
R+2 -> 215 SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P25	ZPSO 53
R+2 -> 215 SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P26	ZPSO 54
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité | Joints d'étanchéité	


P27	ZPSO 54
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité | Joints d'étanchéité	

P28	ZPSO 55
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P29	ZPSO 55
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P30	ZPSO 56
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P31	ZPSO 56
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

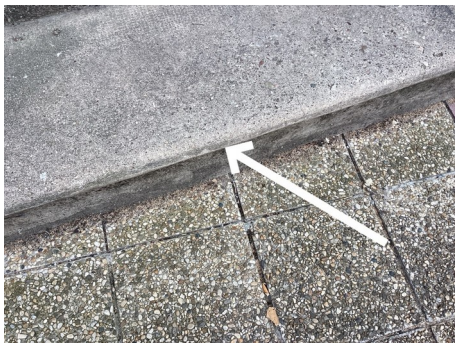P32	ZPSO 57
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P33	ZPSO 57
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P34	ZPSO 58
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Equipements -> Peintures	

P35	ZPSO 59
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Equipements -> Peintures	

P36	ZPSO 60
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Equipements -> Peintures	

P37	ZPSO 61
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	

P38	ZPSO 62
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Equipements -> Peintures	

P39	ZPSO 63
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P40	ZPSO 63
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P41	ZPSO 64
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Equipements -> Peintures	

P42	ZPSO 65
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Equipements -> Peintures	

P43	ZPSO 36
R+1 -> 101 SALLE DES PAS PERDUS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs	

7.3. Photos sondages


S2	ZPSO 20
RDC -> 001 ENTRÉE	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

S3	ZPSO 37
R+1 -> 101 SALLE DES PAS PERDUS	
	
Poteaux -> Enduits lissage/ragréage poteaux	

S4	ZPSO 44
RDC -> 010 ANTENNE DE JUSTICE	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

S5	ZPSO 24
RDC -> 010 ANTENNE DE JUSTICE	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

S6	ZPSO 3
RDC -> 010 ANTENNE DE JUSTICE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs	

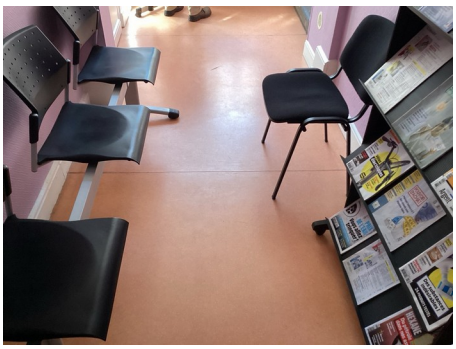S7	ZPSO 24
RDC -> 002 CIRCULATION	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

S8	ZPSO 24
RDC -> 003 ANTENNE DE JUSTICE	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

S9	ZPSO 46
RDC -> 013 CIRCULATION	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

S10	ZPSO 3
RDC -> 023 LOCAL	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs	

S11	ZPSO 27
RDC -> 012 SERVICES PROTECTION DES PM	
	
Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds	

S12	ZPSO 27
R+1 -> 109 SALLE D'AUDIENCE	
	
Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds	

S13	ZPSO 54
EXTERIEURS -> FAÇADES	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité | Joints d'étanchéité	

7.4. Photos inaccessibilités

Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux

RDC -> 009 SANITAIRES	IA 1
Coffre sous baignoire	
Trappe d accès collée	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la trappes d accès

EXTERIEURS -> TOITURES	IA 2
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Investigations destructives sur étanchéité requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux : Faire intervenir un étancheur qualifié pour rebouchage des investigations destructives

Investigation(s) complémentaire(s) à réaliser juste avant les travaux ou entre les différentes étapes de travaux

R+1 -> 101 SALLE DES PAS PERDUS	IC 3
6- Conduits et accessoires intérieurs	
Investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :** Conduit derrière un plaquage empêchant l'accès Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les conditions d'occupation le permettront

7.5. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n°4-0557 PORTÉE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

B2C
Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 0921

CERTIFICATION DE PERSONNES
attribuée à :

Béranger BERNARD
Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B - certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 18/03/2021 | **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 18/03/2021 | **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Certification DPE sans mention : Secteur D - certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique

Obtenue le : 18/03/2021 | **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Certification DPE avec mention : Secteur Dbis - certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'immeubles ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation

Obtenue le : 18/03/2021 | **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Fait à STRASBOURG, le 24 mars 2026

Gérant
STEGER Alexandre

B2C
Bureau Contrôle Certification
24 rue des Prés
67380 LINGOLSHEIM

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : B.2.C@outlook.com • www.b2c-france.com

7.7. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
Localisation RDC	Date visite	Le 23/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	32061146/S1/1
	Planche	1 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

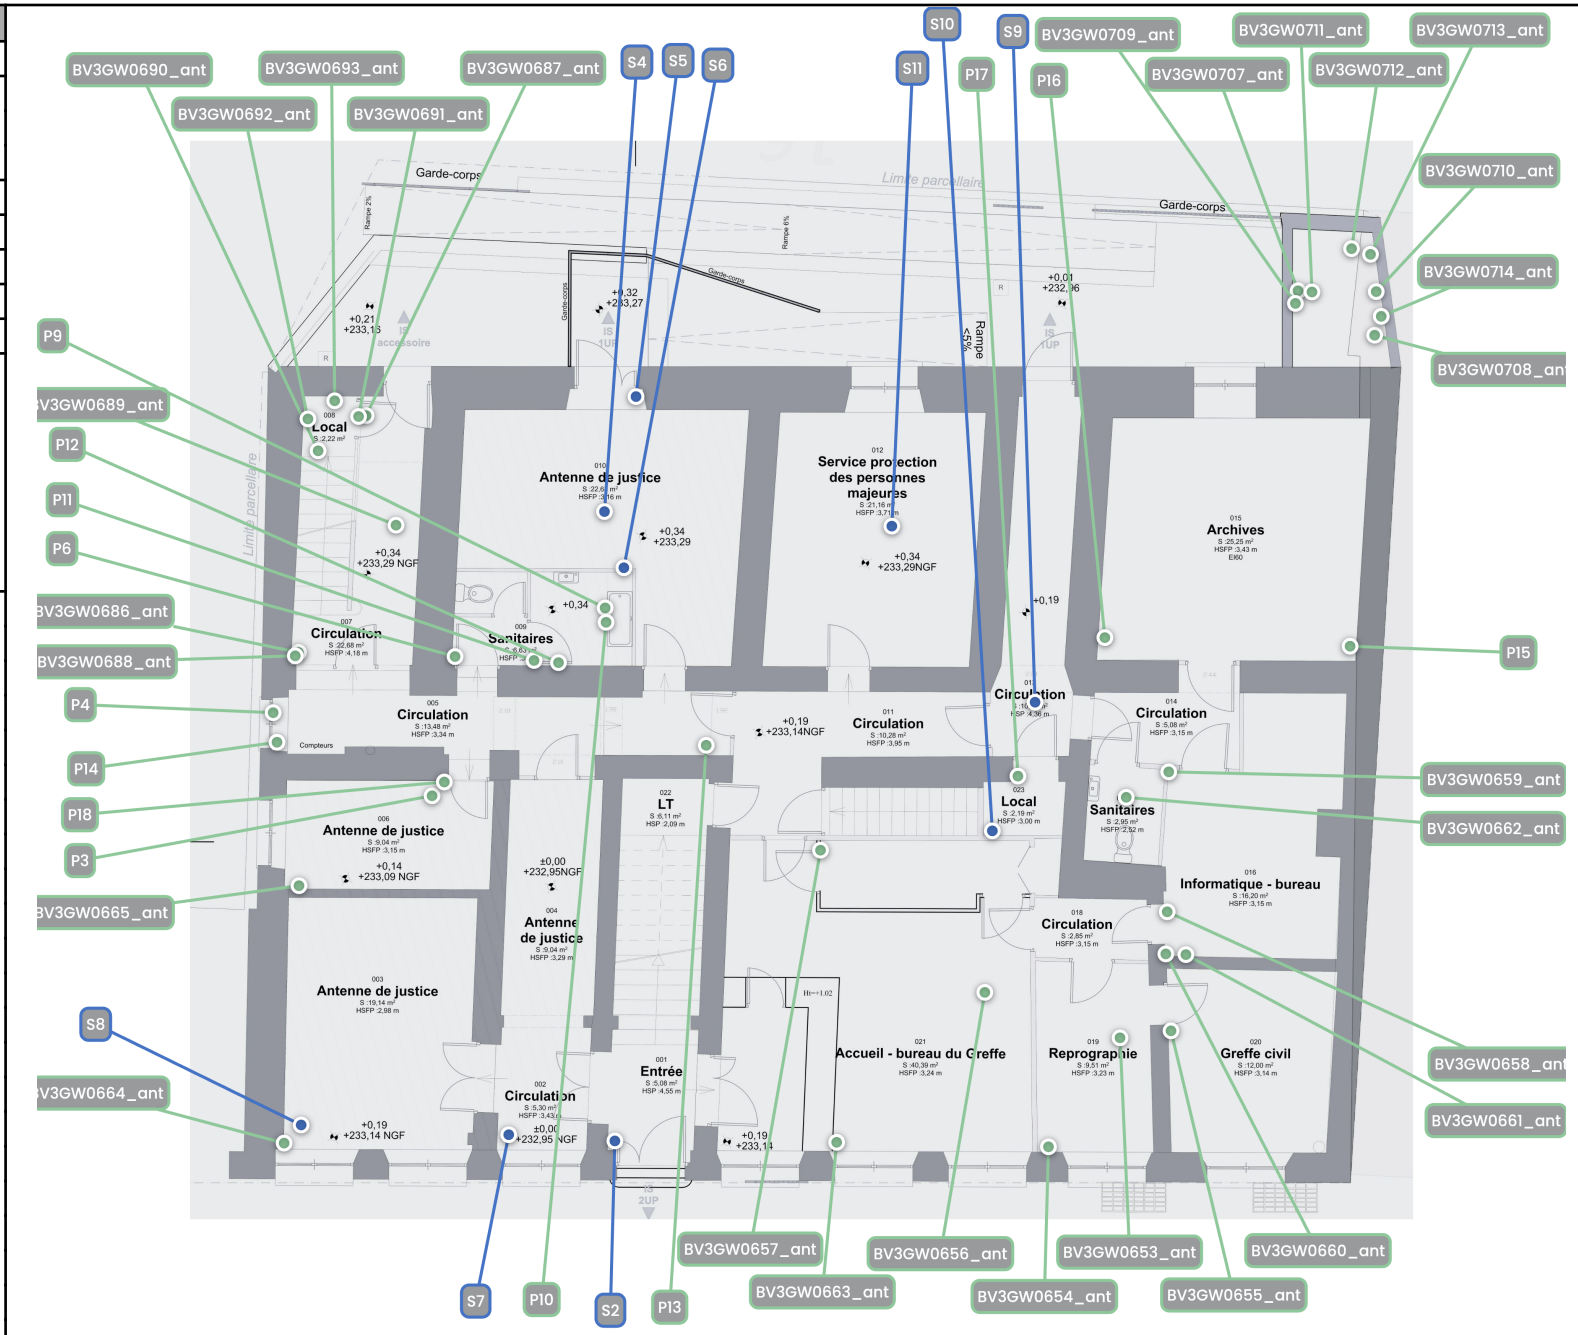

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
Localisation RDC	Date visite	Le 23/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	32061146/S1/1
	Planche	2 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Colles plinthe
- Colles faïence

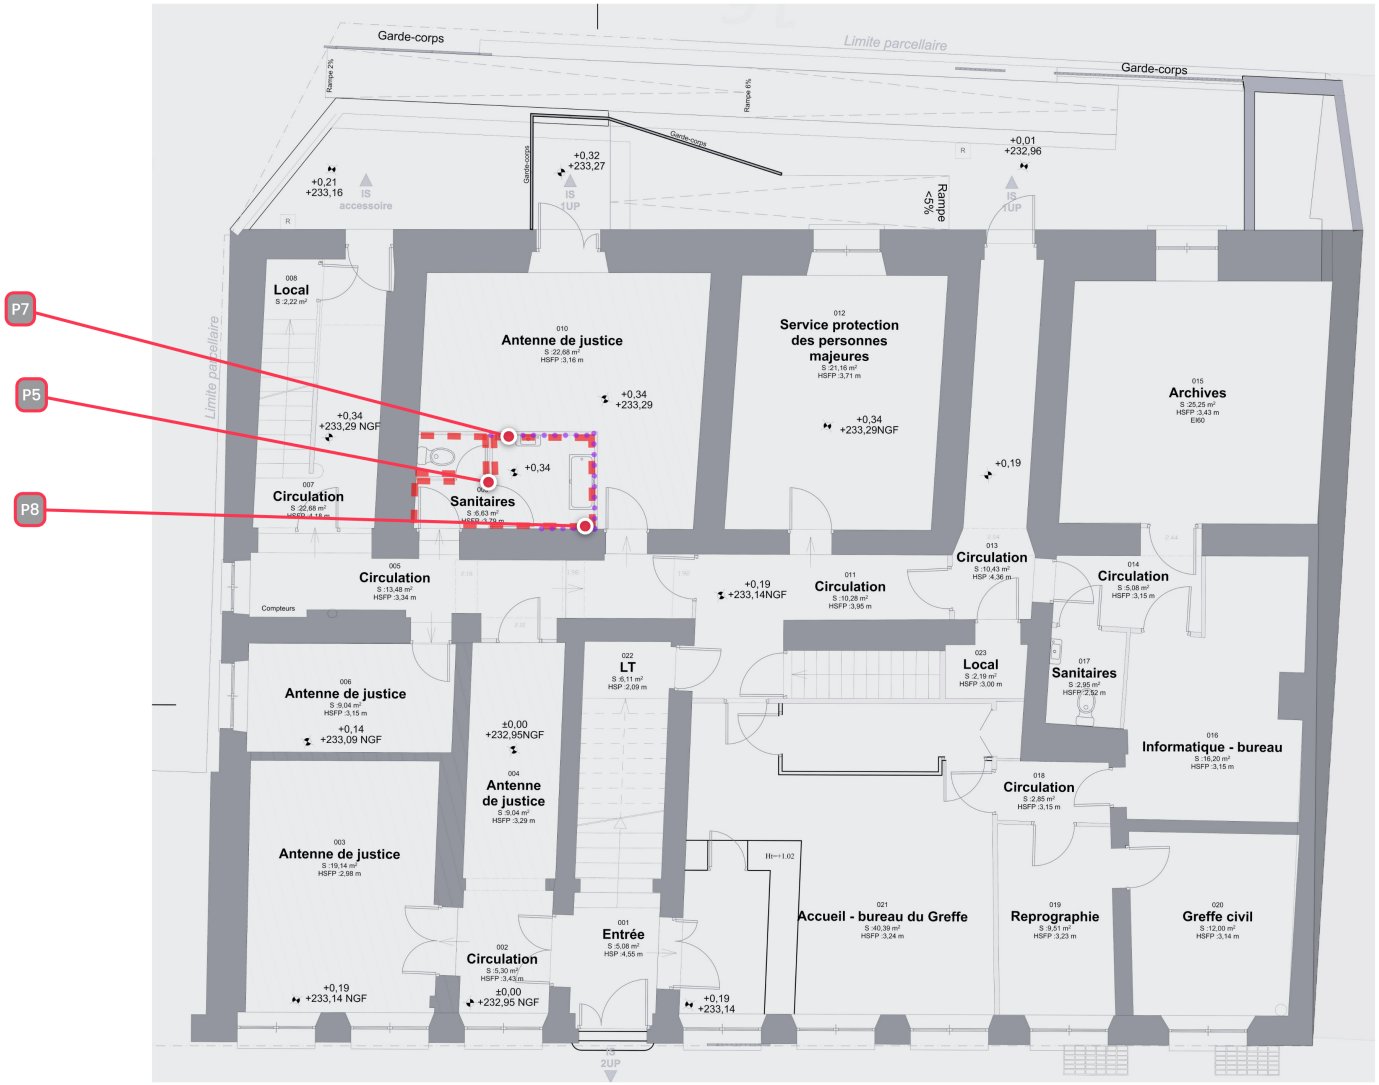

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
Localisation RDC	Date visite	Le 23/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	32061146/S1/1
	Planche	3 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Inaccessibilité

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

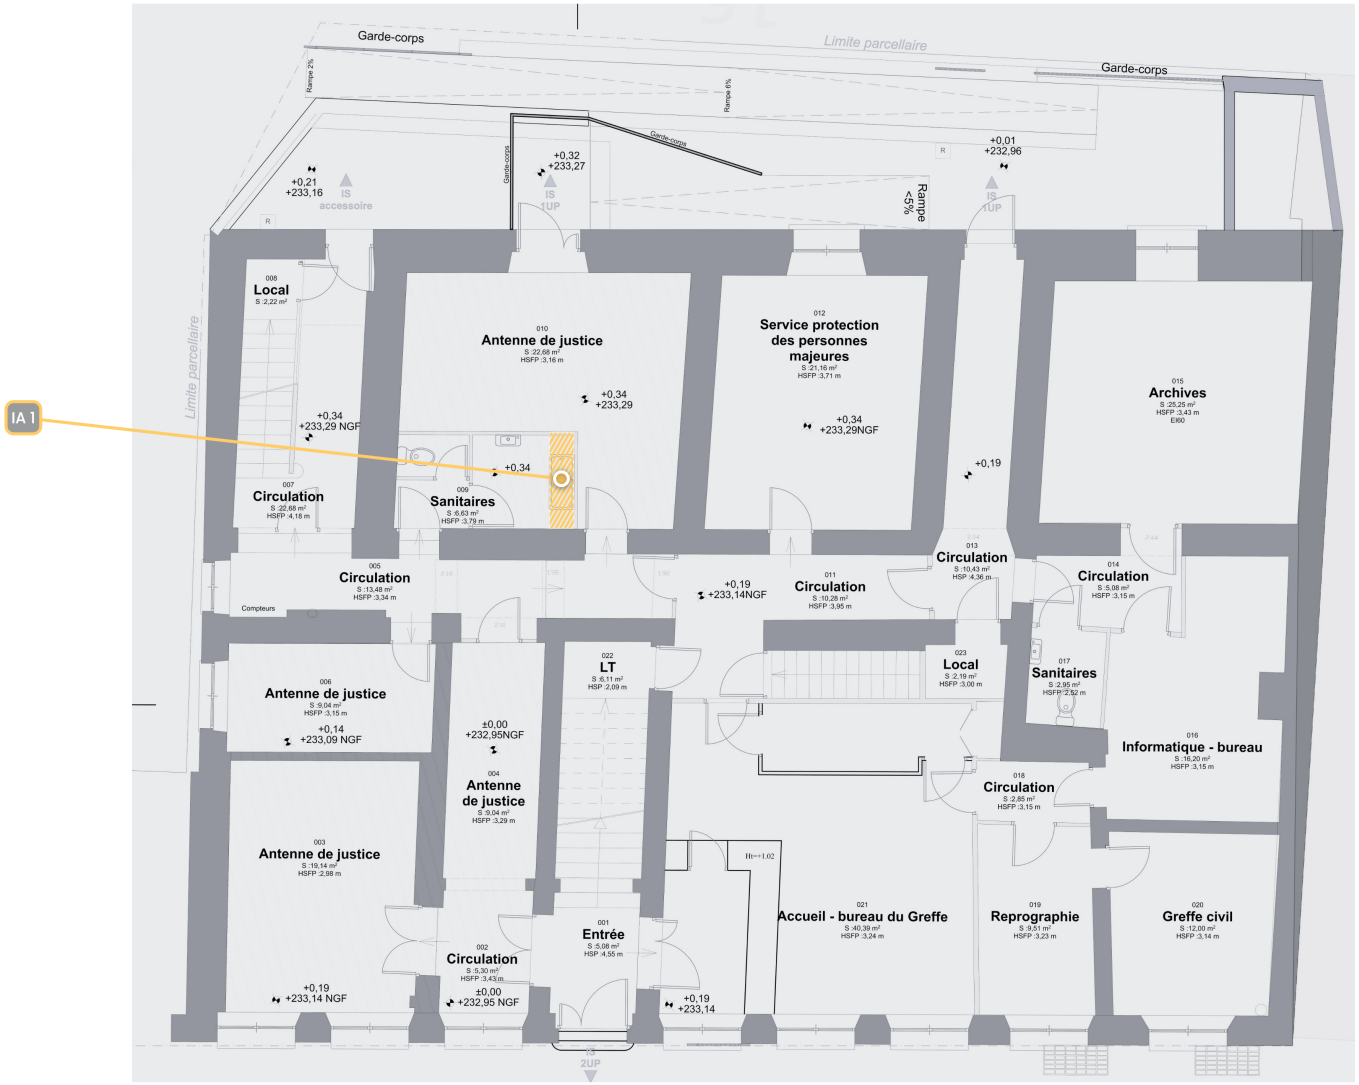

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
Localisation R+1	Date visite	Le 23/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	3206146/S1/1
	Planche	4 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

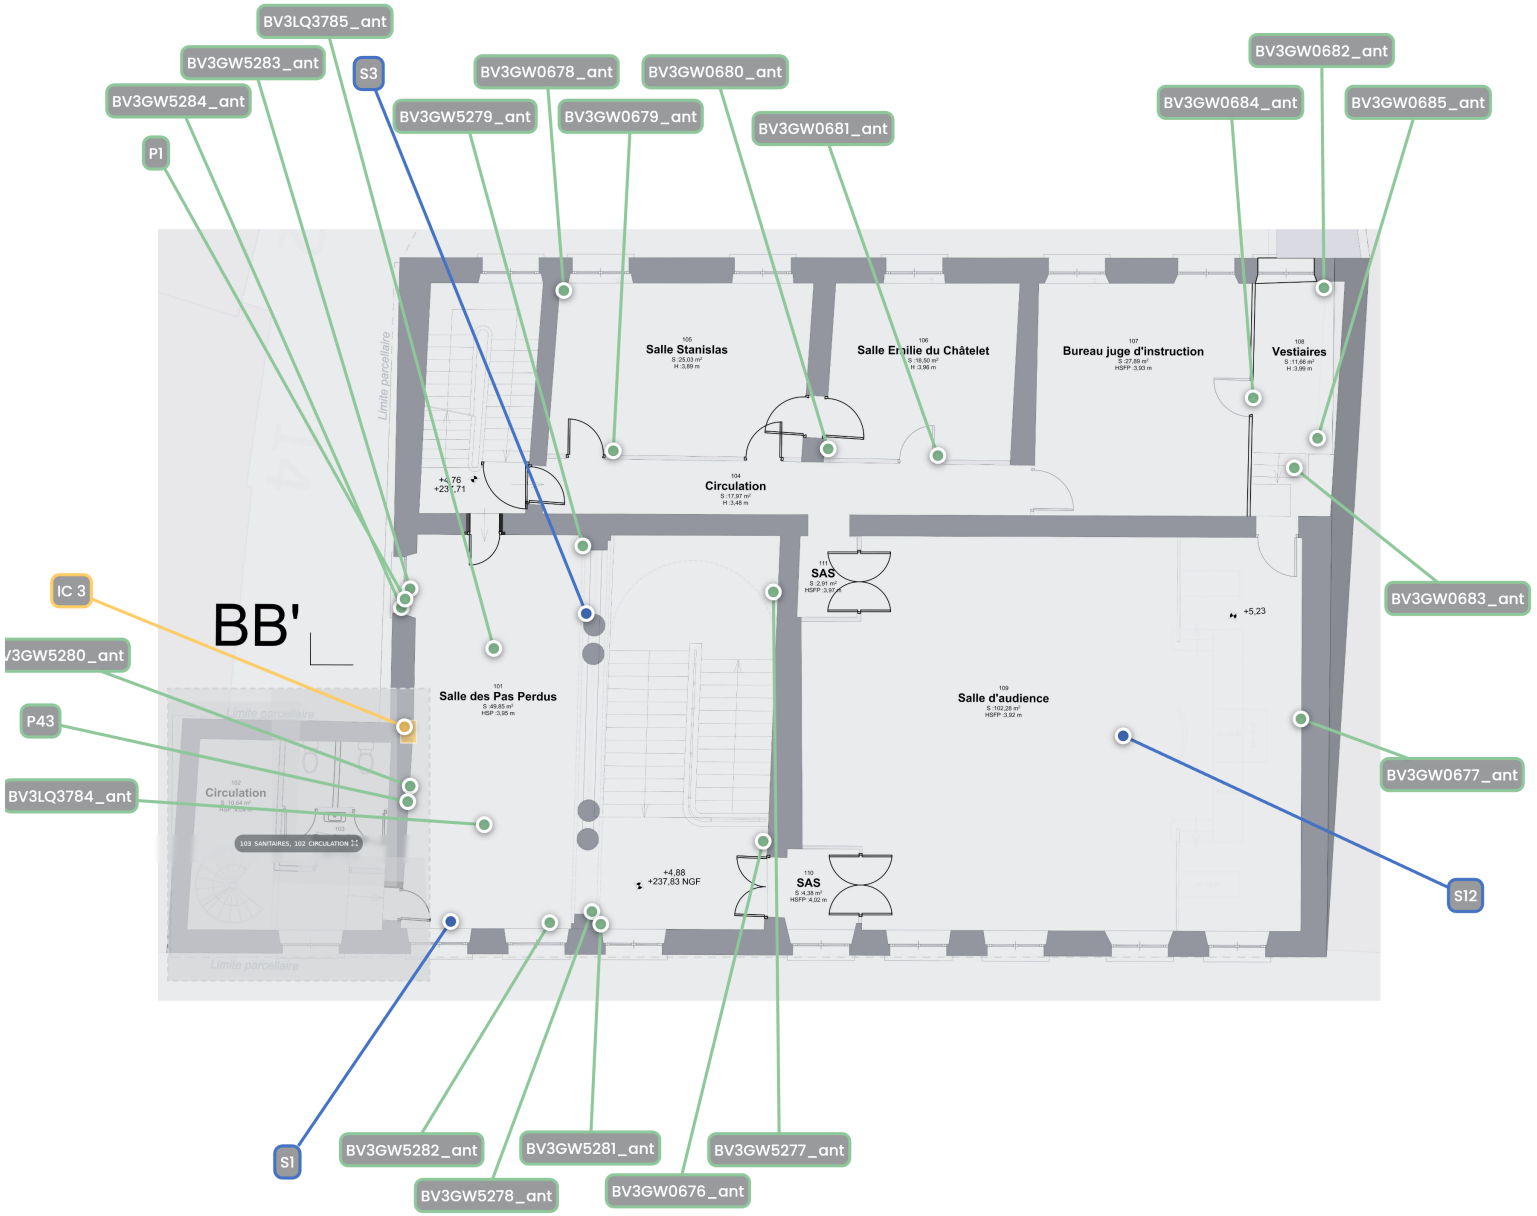


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
Localisation R+1	Date visite	Le 23/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	3206146/S1/1
	Planche	5 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits lissage/ragréage murs

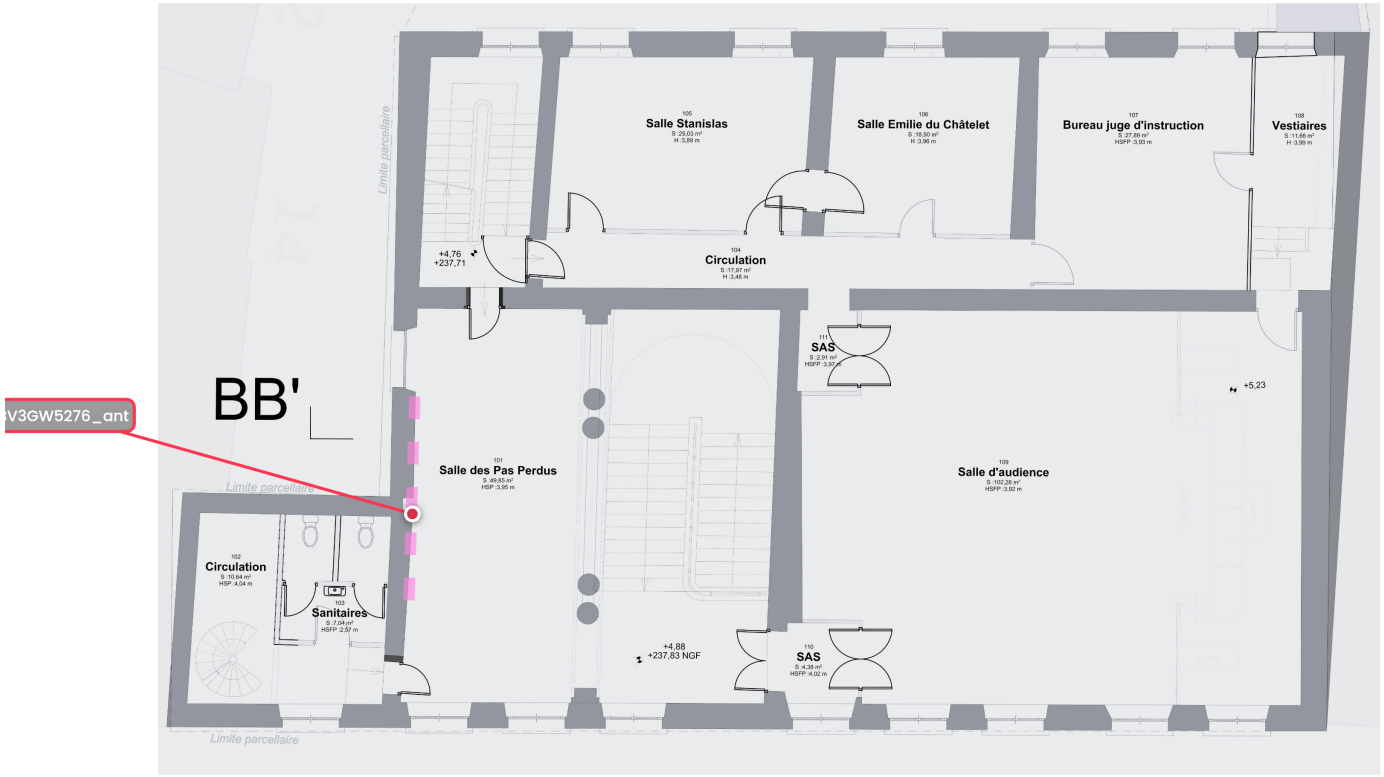

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
Localisation R+1	Date visite	Le 23/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	3206146/S1/1
	Planche	6 / 9
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Enduits lissage/ragréage murs

Localisation de la zone isolée



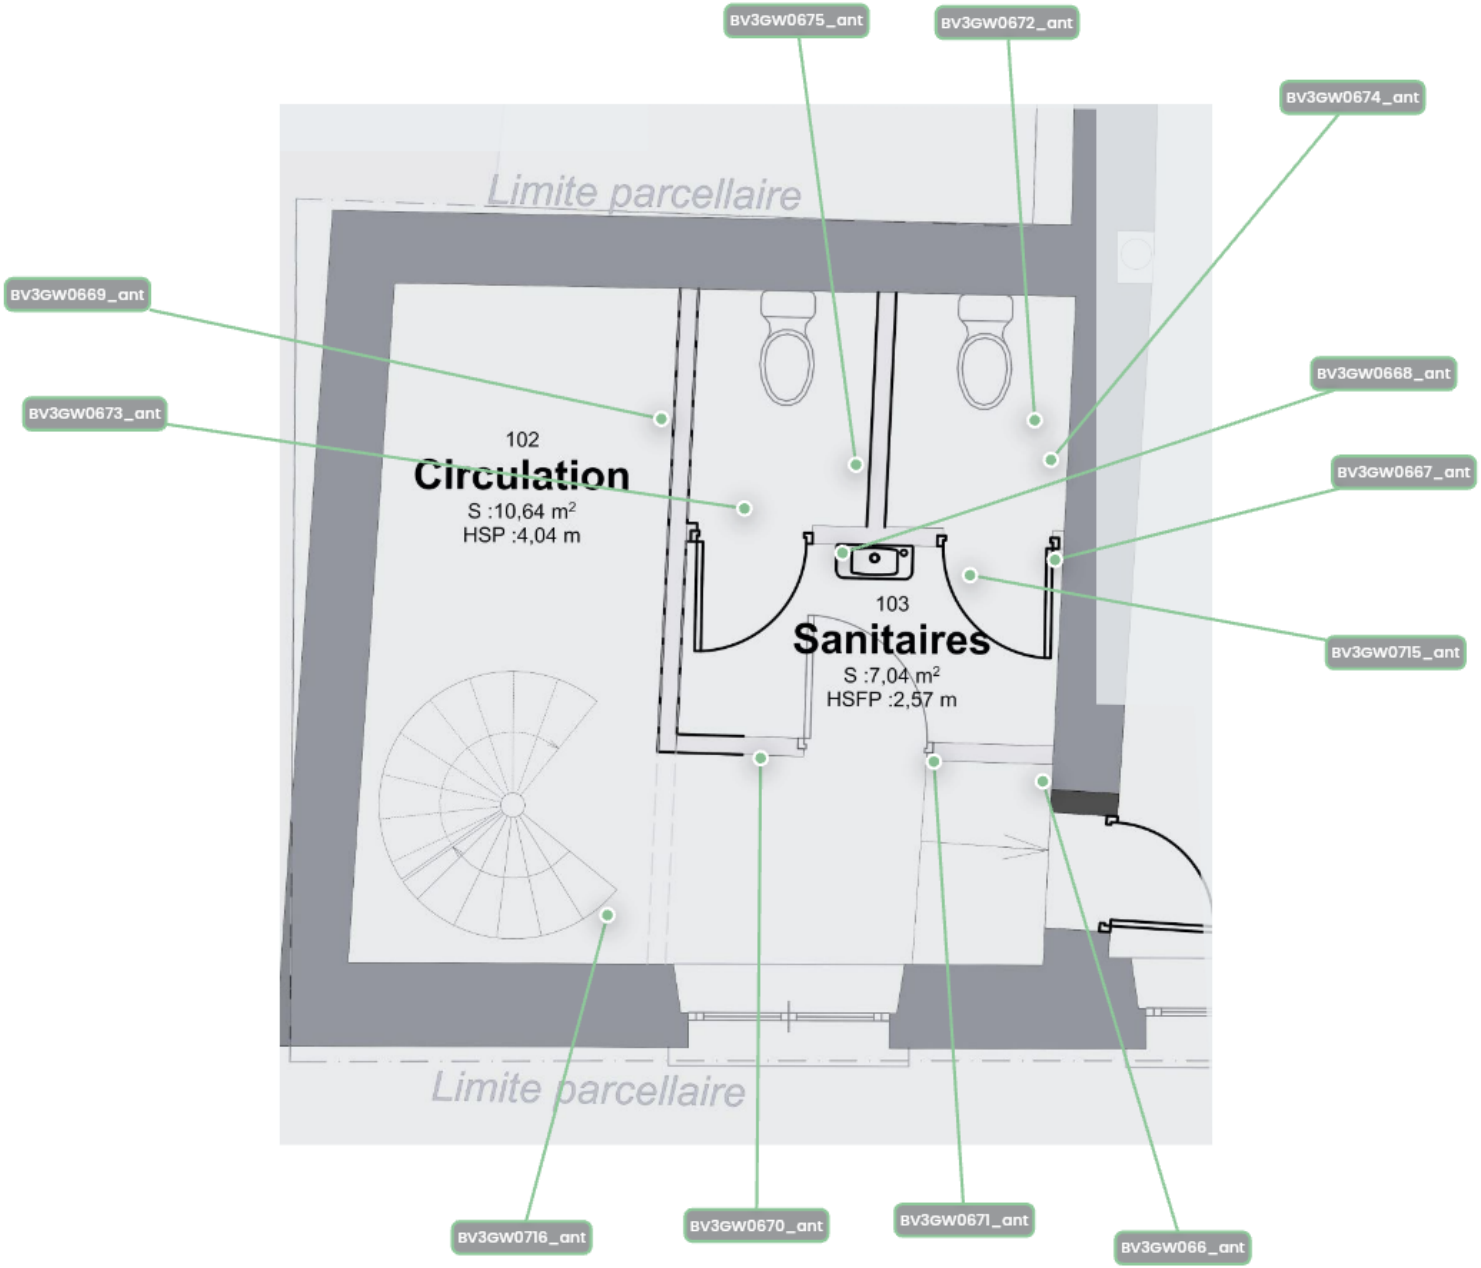

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
Localisation R+2	Date visite	Le 23/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	3206146/S1/1
	Planche	7 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

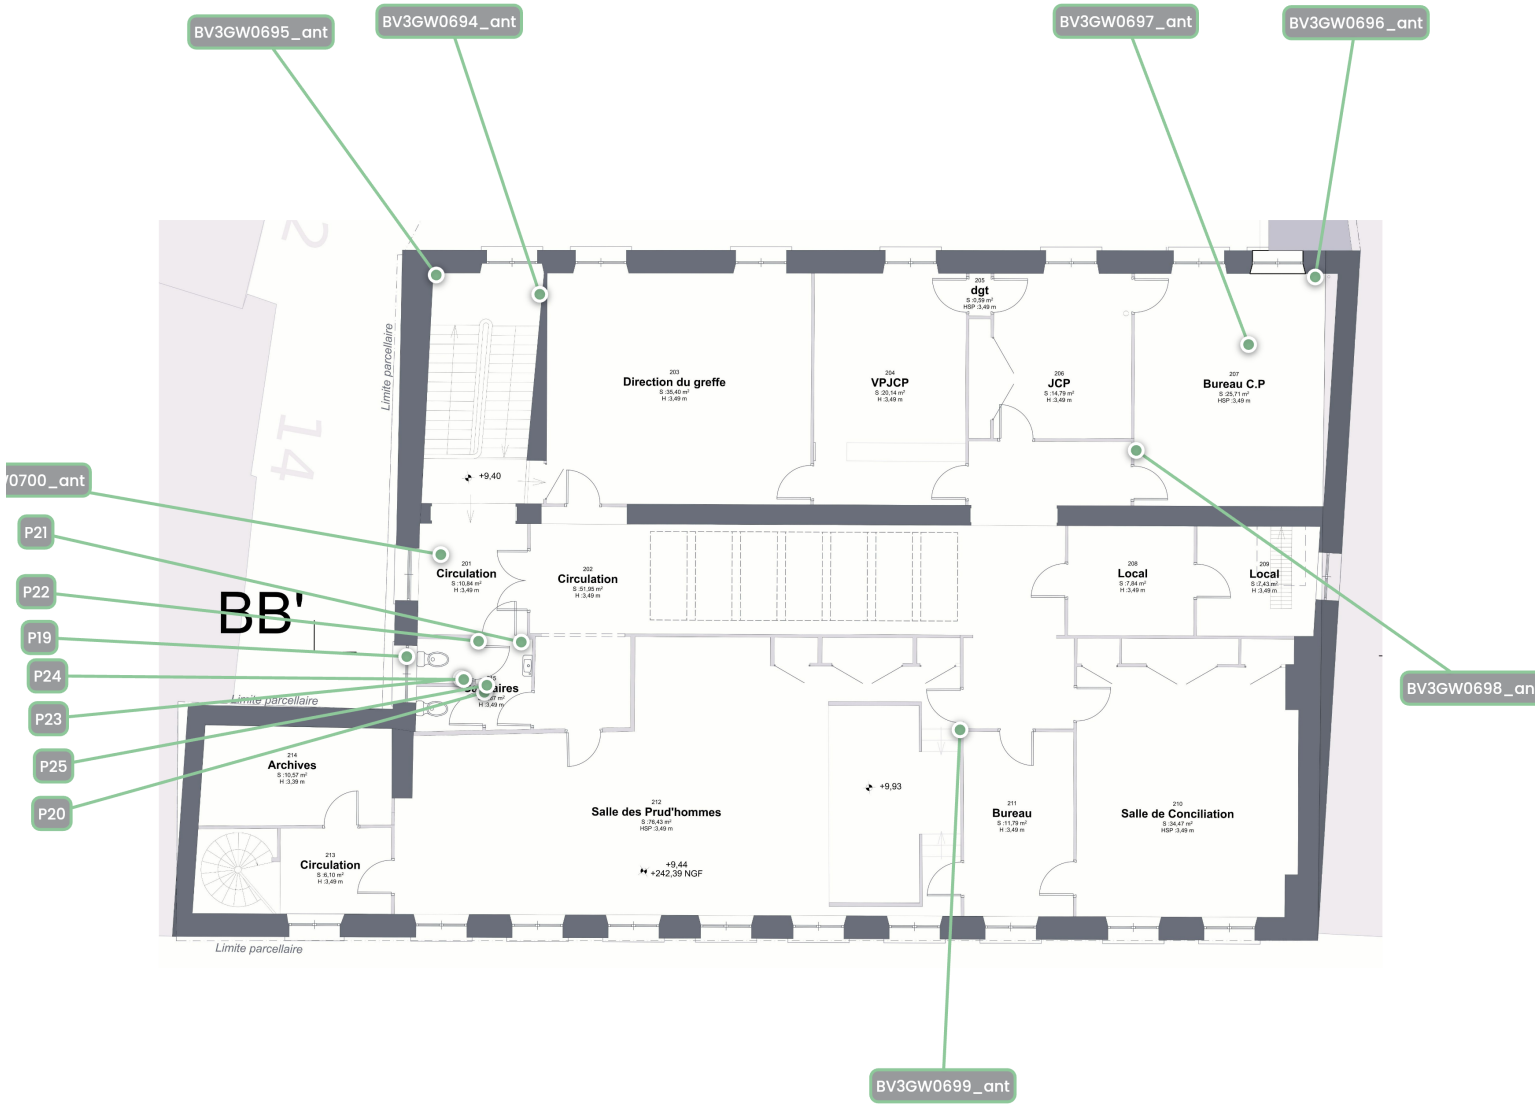

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
Localisation EXTERIEURS	Date visite	Le 23/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	3206146/S1/1
	Planche	8 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

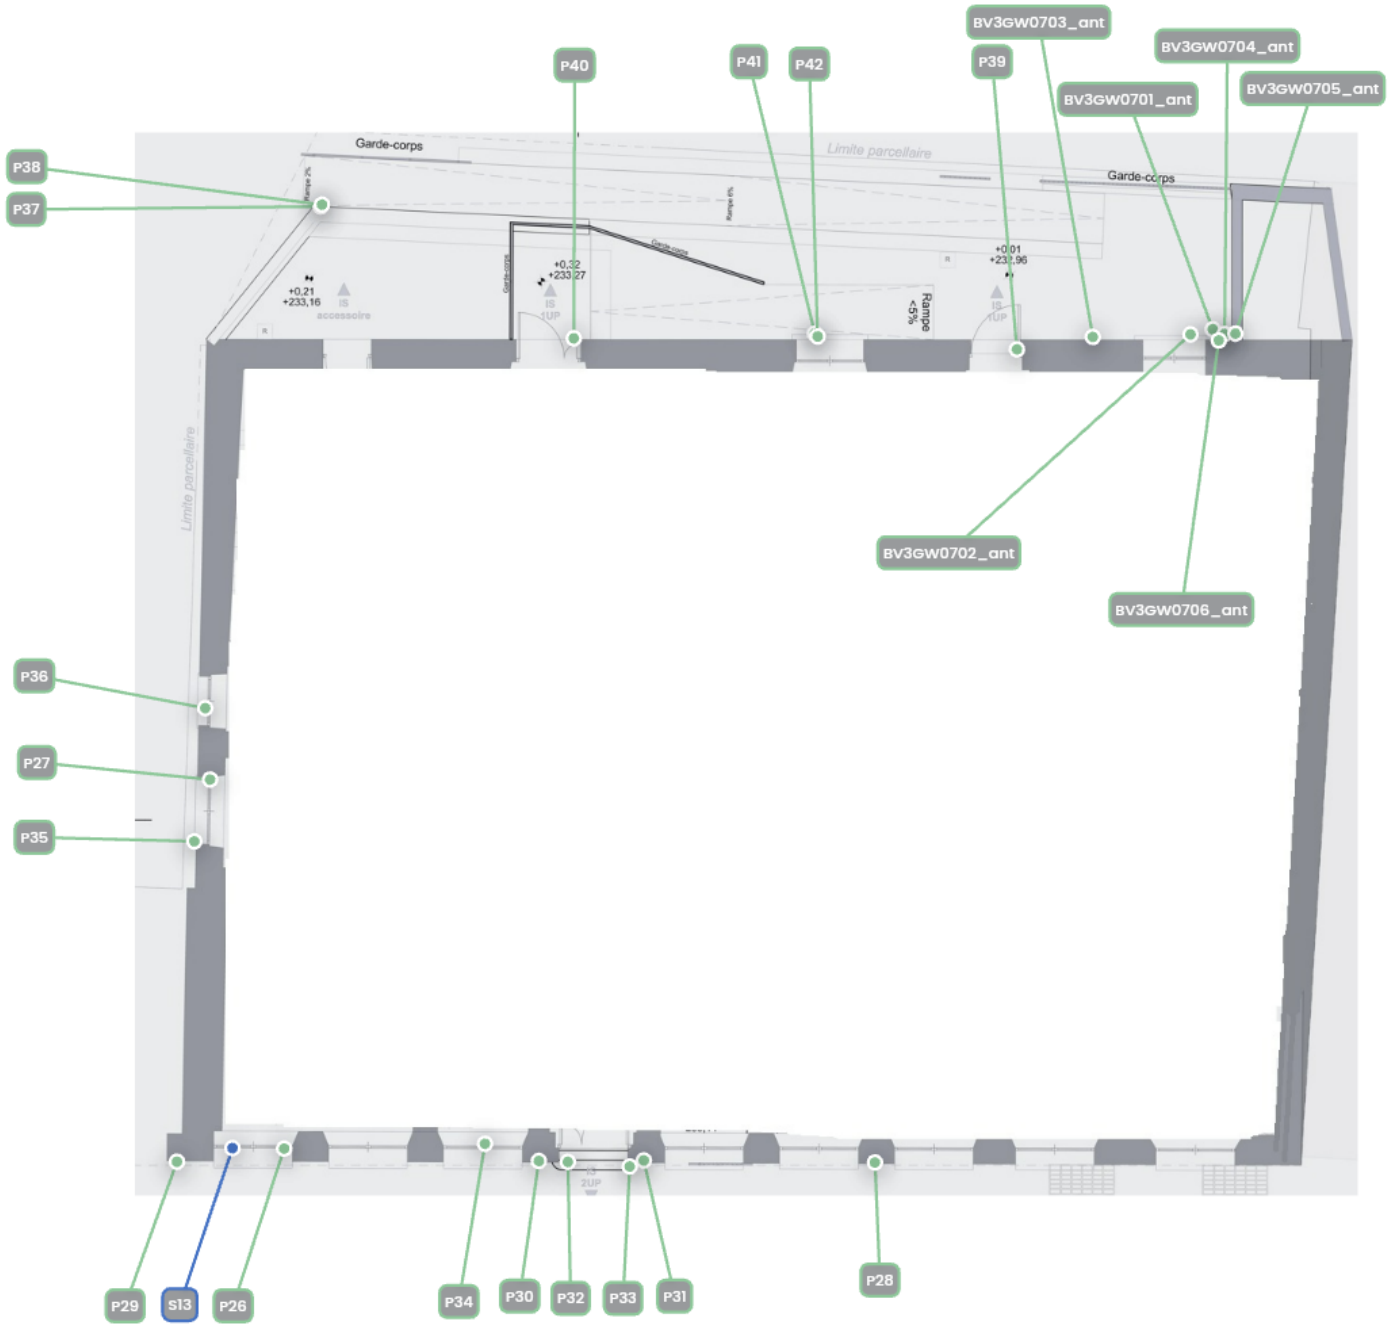

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - LUNEVILLE 7 RUE DU CHATEAU 54300 LUNEVILLE	
Localisation EXTERIEURS	Date visite	Le 23/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	3206146/S1/1
	Planche	9 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Inaccessibilité

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

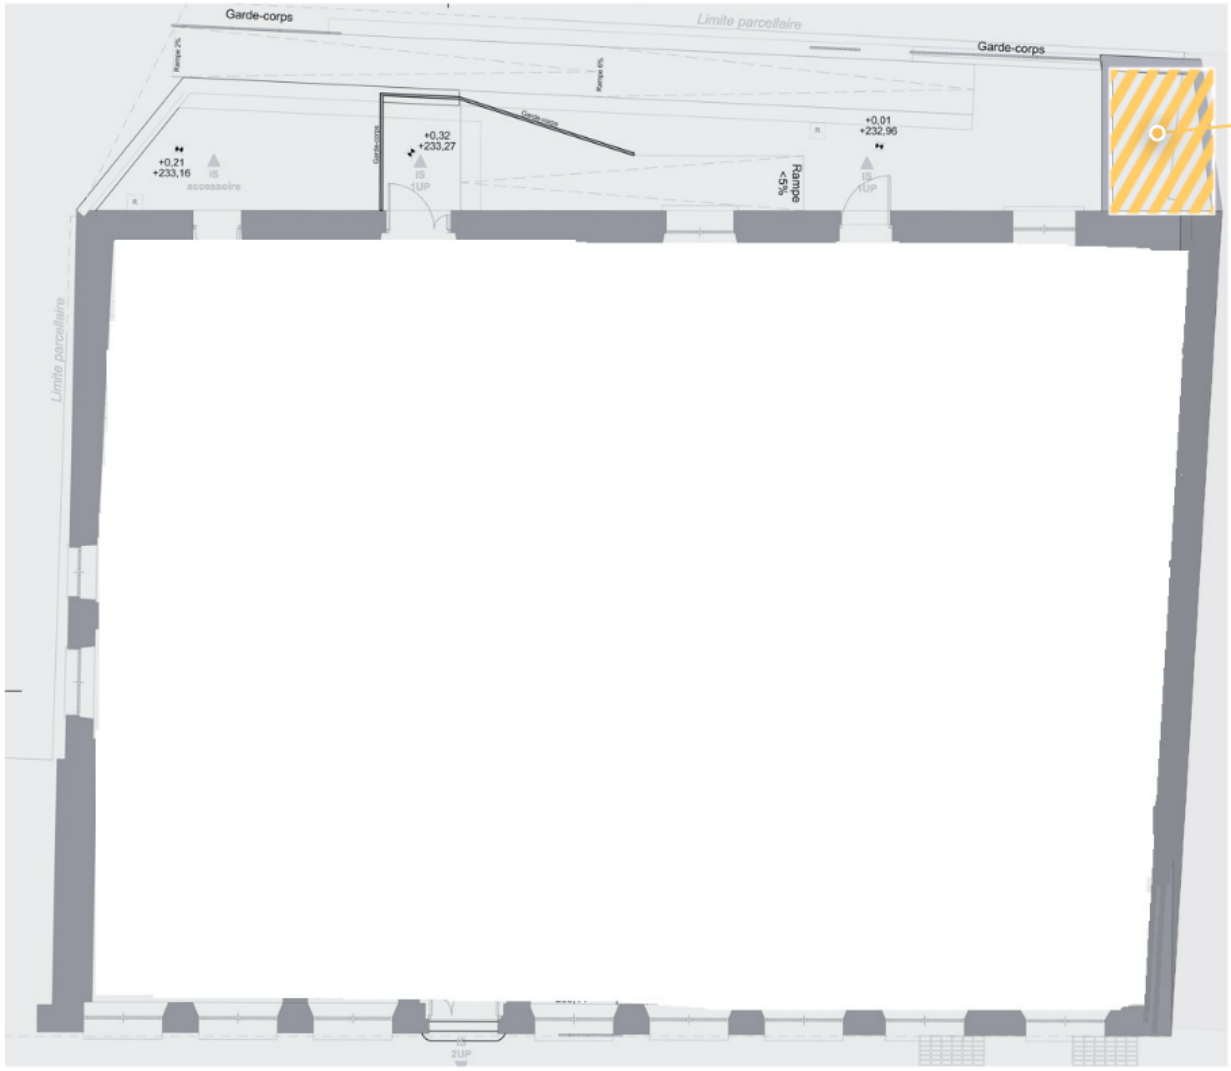

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Beranger BERNARD
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-26-LE-140911-01

Numéro de dossier : 26A023449
Référence de dossier : 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26A023449-001 - Référence *BV3MW5804 Réf. Prel : P1 R+1 - 101 SALLE DES PAS PERDUS/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-002 - Référence *BV3MW5806 Réf. Prel : P3 RDC - 006 ANTENNE DE JUSTICE/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Fibreux, Carton/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-003 - Référence *BV3MW5807 Réf. Prel : P4 RDC - 005 CIRCULATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissage/ragréage murs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-004 - Référence *BV3MW5808 Réf. Prel : P5 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-005 - Référence *BV3MW5809 Réf. Prel : P6 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-006 - Référence *BV3MW5810 Réf. Prel : P7 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-007 - Référence *BV3MW5811 Réf. Prel : P8 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-008 - Référence *BV3MW5812 Réf. Prel : P9 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-009 - Référence *BV3MW5813 Réf. Prel : P10 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-010 - Référence *BV3MW5814 Réf. Prel : P11 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-011 - Référence *BV3MW5815 Réf. Prel : P12 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-012 - Référence *BV3MW5816 Réf. Prel : P13 RDC - 005 CIRCULATION/Revêtements de sol : Colles bitumineuses / Ragréages - (Bitumineux/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-013 - Référence *BV3MW5817 Réf. Prel : P14 RDC - 005 CIRCULATION/Revêtements de sol : Colles bitumineuses / Ragréages - (Bitumineux/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-014 - Référence *BV3MW5818 Réf. Prel : P15 RDC - 015 ARCHIVES/Revêtements de sol : Peintures sol / Ragréages - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-015 - Référence *BV3MW5819 Réf. Prel : P16 RDC - 015 ARCHIVES/Revêtements de sol : Peintures sol / Ragréages - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-016 - Référence *BV3MW5820 Réf. Prel : P17 RDC - 023 LOCAL/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-017 - Référence *BV3MW5805 Réf. Prel : P18 RDC - 006 ANTENNE DE JUSTICE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissage/ragréage murs - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-018 - Référence *BV3MW5821 Réf. Prel : P19 R+2 - 215 SANITAIRES/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-019 - Référence *BV3MW5822 Réf. Prel : P20 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-020 - Référence *BV3MW5823 Réf. Prel : P21 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-021 - Référence *BV3MW5824 Réf. Prel : P22 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-022 - Référence *BV3MW5825 Réf. Prel : P23 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-023 - Référence *BV3MW5826 Réf. Prel : P24 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-024 - Référence *BV3MW5827 Réf. Prel : P25 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-025 - Référence *BV3MW5828 Réf. Prel : P26 EXTERIEURS - FAÇADES/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité / Joints d'étanchéité - (Enduit/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-026 - Référence *BV3MW5829 Réf. Prel : P27 EXTERIEURS - FAÇADES/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité / Joints d'étanchéité - (Enduit/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-027 - Référence *BV3MW5830 Réf. Prel : P28 EXTERIEURS - FAÇADES/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-028 - Référence *BV3MW5831 Réf. Prel : P29 EXTERIEURS - FAÇADES/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-029 - Référence *BV3MW5832 Réf. Prel : P30 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-030 - Référence *BV3MW5833 Réf. Prel : P31 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-031 - Référence *BV3MW5834 Réf. Prel : P32 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-032 - Référence *BV3MW5835 Réf. Prel : P33 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-033 - Référence *BV3MW5836 Réf. Prel : P34 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Noir, Marron, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-034 - Référence *BV3MW5837 Réf. Prel : P35 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Beige, Gris, Jaune, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-035 - Référence *BV3MW5838 Réf. Prel : P36 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Jaune, Orange, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-036 - Référence *BV3MW5839 Réf. Prel : P37 EXTERIEURS - FAÇADES/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d'assemblage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-037 - Référence *BV3MW5840 Réf. Prel : P38 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Noir, Blanc, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-038 - Référence *BV3MW5841 Réf. Prel : P39 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-039 - Référence *BV3MW5842 Réf. Prel : P40 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-040 - Référence *BV3MW5843 Réf. Prel : P41 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Noir, Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-041 - Référence *BV3MW5844 Réf. Prel : P42 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Beige, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A023449-042 - Référence *BV3MW5846 Réf. Prel : P43 R+1 - 101 SALLE DES PAS PERDUS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissage/ragréage murs - (Plâtre/Blanc, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
SH-Analyses-EABE
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01
Référence laboratoire N° : 26EK040639
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26
Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Date de réception :26/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26A023449-001 - BV3MW5804 Réf. Prel : P1 R+1 - 101 SALLE DES PAS PERDUS/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Dur/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26A023449-002 - BV3MW5806 Réf. Prel : P3 RDC - 006 ANTENNE DE JUSTICE/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Fibreux, Carton/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26A023449-003 - BV3MW5807 Réf. Prel : P4 RDC - 005 CIRCULATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissage/ragréage murs - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01
Référence laboratoire N° : 26EK040639
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26
Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Date de réception :26/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26A023449-004 - BV3MW5808 Réf. Prel : P5 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	**MET** / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
005	26A023449-005 - BV3MW5809 Réf. Prel : P6 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1) (2)	26A023449-006 - BV3MW5810 Réf. Prel : P7 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
007	26A023449-007 - BV3MW5811 Réf. Prel : P8 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)(i)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01
Référence laboratoire N° : 26EK040639
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26
Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Date de réception :26/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	26A023449-008 - BV3MW5812 Réf. Prel : P9 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	26A023449-009 - BV3MW5813 Réf. Prel : P10 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26A023449-010 - BV3MW5814 Réf. Prel : P11 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau souple (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (marron)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	26A023449-011 - BV3MW5815 Réf. Prel : P12 RDC - 009 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(ii)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01
Référence laboratoire N° : 26EK040639
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26
Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Date de réception :26/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	26A023449-012 - BV3MW5816 Réf. Prel : P13 RDC - 005 CIRCULATION/Revêtements de sol : Colles bitumineuses / Ragréages - (Bitumineux/Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26A023449-013 - BV3MW5817 Réf. Prel : P14 RDC - 005 CIRCULATION/Revêtements de sol : Colles bitumineuses / Ragréages - (Bitumineux/Jaune)	Matériau souple (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26A023449-014 - BV3MW5818 Réf. Prel : P15 RDC - 015 ARCHIVES/Revêtements de sol : Peintures sol / Ragréages - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	26A023449-015 - BV3MW5819 Réf. Prel : P16 RDC - 015 ARCHIVES/Revêtements de sol : Peintures sol / Ragréages - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	26A023449-016 - BV3MW5820 Réf. Prel : P17 RDC - 023 LOCAL/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01
Référence laboratoire N° : 26EK040639
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26
Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Date de réception :26/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	26A023449-017 - BV3MW5805 Réf. Prel : P18 RDC - 006 ANTENNE DE JUSTICE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissage/ragréage murs - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	26A023449-018 - BV3MW5821 Réf. Prel : P19 R+2 - 215 SANITAIRES/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Dur/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	26A023449-019 - BV3MW5822 Réf. Prel : P20 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	26A023449-020 - BV3MW5823 Réf. Prel : P21 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01
Référence laboratoire N° : 26EK040639
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26
Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Date de réception :26/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	26A023449-021 - BV3MW5824 Réf. Prel : P22 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	26A023449-022 - BV3MW5825 Réf. Prel : P23 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	26A023449-023 - BV3MW5826 Réf. Prel : P24 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	26A023449-024 - BV3MW5827 Réf. Prel : P25 R+2 - 215 SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01
Référence laboratoire N° : 26EK040639
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26
Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Date de réception :26/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	26A023449-025 - BV3MW5828 Réf. Prel : P26 EXTERIEURS - FAÇADES/Menuiseries extérieures : Joints d''étanchéité / Joints d''étanchéité - (Enduit/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	26A023449-026 - BV3MW5829 Réf. Prel : P27 EXTERIEURS - FAÇADES/Menuiseries extérieures : Joints d''étanchéité / Joints d''étanchéité - (Enduit/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	26A023449-027 - BV3MW5830 Réf. Prel : P28 EXTERIEURS - FAÇADES/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	26A023449-028 - BV3MW5831 Réf. Prel : P29 EXTERIEURS - FAÇADES/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01
Référence laboratoire N° : 26EK040639
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26
Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Date de réception :26/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	26A023449-029 - BV3MW5832 Réf. Prel : P30 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	26A023449-030 - BV3MW5833 Réf. Prel : P31 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	26A023449-031 - BV3MW5834 Réf. Prel : P32 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	26A023449-032 - BV3MW5835 Réf. Prel : P33 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033 (3)	26A023449-033 - BV3MW5836 Réf. Prel : P34 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Noir, Marron, Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01
Référence laboratoire N° : 26EK040639
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26
Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Date de réception :26/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034 (3)	26A023449-034 - BV3MW5837 Réf. Prel : P35 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Beige, Gris, Jaune, Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	**MET** / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 (3)	26A023449-035 - BV3MW5838 Réf. Prel : P36 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Jaune, Orange, Noir)	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	**MET** / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	26A023449-036 - BV3MW5839 Réf. Prel : P37 EXTERIEURS - FAÇADES/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d''assemblage - (Ciment/Gris)	Matériau (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (3)	26A023449-037 - BV3MW5840 Réf. Prel : P38 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Noir, Blanc, Marron)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	**MET** / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	26A023449-038 - BV3MW5841 Réf. Prel : P39 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01
Référence laboratoire N° : 26EK040639
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26
Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Date de réception :26/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	26A023449-039 - BV3MW5842 Réf. Prel : P40 EXTERIEURS - FAÇADES/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040 (3)	26A023449-040 - BV3MW5843 Réf. Prel : P41 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Noir, Vert)	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	**MET** / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	26A023449-041 - BV3MW5844 Réf. Prel : P42 EXTERIEURS - FAÇADES/Equipements : Peintures - (Multicouches/Beige, Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	**MET** / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	26A023449-042 - BV3MW5846 Réf. Prel : P43 R+1 - 101 SALLE DES PAS PERDUS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissage/ragréage murs (Plâtre/Blanc, Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple (fibreux) (beige)	**MET** / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (fibreux) (beige)	**MOLP** / HXJ5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01
Référence laboratoire N° : 26EK040639
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26
Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Date de réception :26/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(3) Echantillon mouillé.

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-048978-01 | Date d'émission de rapport : 04/07/2026 7:26 | Page12/12
Référence laboratoire N° : 26EK040639 | Référence de suivi du dossier N° : 26A023449
Reçu au laboratoire le : 29/06/2026 | Date de réception :26/06/2026
Date d'analyse : 02/07/2026
Référence dossier Client:26A023449 - 1510797887/32061146/S1/1/1_32061146/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Cláudio Teixeira
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios
