

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
N° 2502054-IT

Commune :	**LUNEVILLE**
Adresse :	**7 Rue du Château**
Quartier ou complément :	
Date de début d'inspection :	**10 novembre 2025**
Date de fin d'inspection :	**10 novembre 2025**

Client :	**MINISTERE DE LA JUSTICE** **20 BD DE LA MOTHE** **CS 70005** **54002 NANCY CEDEX**
Autorité responsable :	**MINISTERE DE LA JUSTICE - DPT IMM**

Numéro de dossier :	**2502054-IT**
Objectif de l'inspection :	**Inspection de routine de l'état**
Nom du réseau :	**Réseaux autour et sous un bâtiment**
Type de réseau :	**Réseau unitaire, eaux pluviales et eaux usées**

Nombre d'inspections :	**12**	Long. inspectée : **71.30 m**	Long. mesurée : **69.90 m**
dont collecteurs :	**8**	Long. inspectée : **61.70 m**	Long. mesurée : **61.70 m**
branchements :	**4**	Long. inspectée : **9.60 m**	Long. mesurée : **8.20 m**
regards/noeuds :	**0**		

Observations particulières :
En annexe : schéma de principe.
Certains tronçons n'ont pas pu être inspectés complètement – Les causes techniques sont mentionnées sur le ou les tronçons concernés. Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.


Vérifié par :Anthony LEGRAND Le : 25/11/2025	Approuvé par :Michel PHILIPPE Le : 25/11/2025
Anthony LEGRAND Certifié par yousign	Michel PHILIPPE Certifié par yousign

Les résultats de l'inspection se rapportent exclusivement au travail commandé ou à/aux objet(s) ou lot(s) inspecté(s).
Le rapport d'inspection ne doit pas être reproduit excepté dans sa totalité, sans l'accord de l'organisme d'inspection et du client.

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **LUNEVILLE** Adresse : **7 Rue du Château** Emplacement : **Dans une zone piétonnière** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **MINISTERE DE LA JUSTICE - DPT IMM** Client : **MINISTERE DE LA JUSTICE** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : **10/11/2025**	Référence du tronçon : **R2 - R3** Référence du noeud de départ : **R2** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **R3** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **R3 vers R2** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Unitaire** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **21.90 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **2502054-IT** Réf. support photo : **2502054-IT**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **200** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **R2** Dimensions du regard : **Ø1000** Hauteur totale de l'ouvrage : **2.20 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **R3** Dimensions du regard : **500 x 500** Hauteur totale de l'ouvrage : **0.70 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **IBAK** Modèle de l'enrouleur : **Minilite Basic** - Numéro de série : **428919**	Modèle du chariot : - Numéro de série : Modèle de la caméra : **ORION** - Numéro de série : **430578**
Observations particulières	
Remarques générales :	

LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R2 - R3** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **R3 vers R2**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R2 vers R3**	Longueur inspectée : **21.90 m** Longueur mesurée : **21.90 m**

SYNTHESE DU TRONÇON R2 VERS R3



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / R2	1/2	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	4
0.50m / R2	3/4	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R2 - Arrivée de la canalisation en chute BACA - Rupture de 2h à 3h - A l'assemblage regard / tuyau	4
4.30m / R2	5/6	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Distance de 50mm	5
5.70m / R2	7/8	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 10h - Hauteur 160mm - Arrivée de R1	5
9.40m / R2	9/10	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm	6
9.90m / R2	11/12	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 160mm	6
13.90m / R2	13/14	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h - Hauteur 160mm	7
14.10m / R2	15/16	BAJC - Déviation angulaire - angle de 30° - Vers la gauche	7
18.90m / R2	17/18	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h - Hauteur 125mm BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 50% - A l'intérieur du branchement	8
19.60m / R2	19/20	AEDAE - Modification du matériau de la canalisation : grès AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 300mm	8
20.50m / R2	21	AEDAX - Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	9
20.80m / R2	22/23	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 10h - Hauteur 160mm BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 60% - A l'intérieur du branchement	9
21.50m / R2	24	BCEB - Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud R3	9
21.90m / R2	25	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	10

Observations générales :

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **1/2**	VIDEO : **00:00:02**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection





DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **3/4**	VIDEO : **00:00:14**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R2 - Arrivée de la canalisation en chute
BACA - Rupture de 2h à 3h - A l'assemblage regard / tuyau





	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R2 - R3** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **R3 vers R2**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R2 vers R3**	Longueur inspectée : **21.90 m** Longueur mesurée : **21.90 m**


DISTANCE : **4.30 m**	PHOTO : **5/6**	VIDEO : **00:01:07**

OBSERVATIONS :
BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Distance de 50mm



DISTANCE : **5.70 m**	PHOTO : **7/8**	VIDEO : **00:01:19**

OBSERVATIONS :
BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 10h - Hauteur 160mm - Arriv de R1

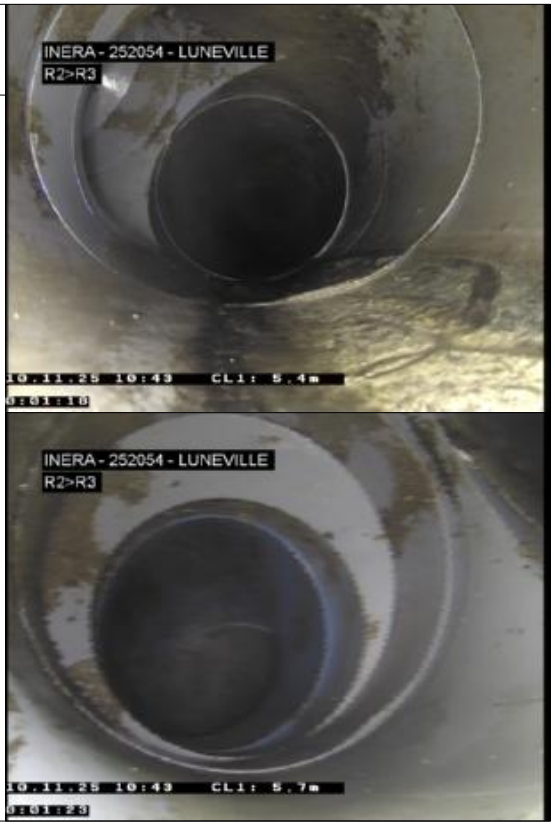

	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R2 - R3** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **R3 vers R2**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R2 vers R3**	Longueur inspectée : **21.90 m** Longueur mesurée : **21.90 m**

DISTANCE : **9.40 m**	PHOTO : **9/10**	VIDEO : **00:01:49**

OBSERVATIONS :
BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm



DISTANCE : **9.90 m**	PHOTO : **11/12**	VIDEO : **00:02:00**


OBSERVATIONS :
BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 160mm



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R2 - R3** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **R3 vers R2**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R2 vers R3**	Longueur inspectée : **21.90 m** Longueur mesurée : **21.90 m**

DISTANCE : **13.90 m**	PHOTO : **13/14**	VIDEO : **00:02:22**

OBSERVATIONS :
BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h - Hauteur 160mm

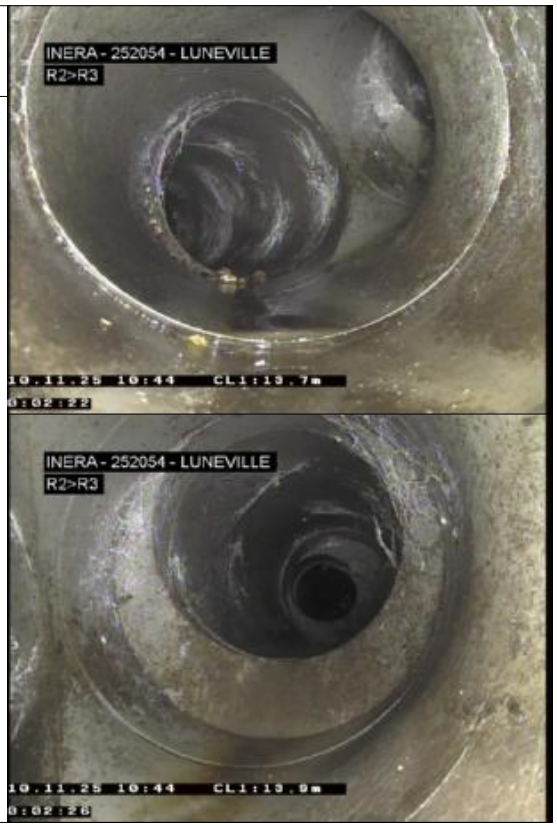

DISTANCE : **14.10 m**	PHOTO : **15/16**	VIDEO : **00:01:48**

OBSERVATIONS :
BAJC - Déviation angulaire - angle de 30° - Vers la gauche



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R2 - R3** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **R3 vers R2**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R2 vers R3**	Longueur inspectée : **21.90 m** Longueur mesurée : **21.90 m**

DISTANCE : **18.90 m**	PHOTO : **17/18**	VIDEO : **00:02:31**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h - Hauteur 125mm
BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 50% - A l'intérie du branchement



DISTANCE : **19.60 m**	PHOTO : **19/20**	VIDEO : **00:03:06**

OBSERVATIONS :

AEDAE - Modification du matériau de la canalisation : grès
AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 300mm



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R2 - R3** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **R3 vers R2**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R2 vers R3**	Longueur inspectée : **21.90 m** Longueur mesurée : **21.90 m**

DISTANCE : **20.50 m**	PHOTO : **21**	VIDEO : **00:03:23**

OBSERVATIONS :
AEDAX - Modification du matériau de la canalisation : PVC-U



DISTANCE : **20.80 m**	PHOTO : **22/23**	VIDEO : **00:04:12**

OBSERVATIONS :
BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 10h - Hauteur 160mm
BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 60% - A l'intérie du branchement





DISTANCE : **21.50 m**	PHOTO : **24**	VIDEO : **00:03:33**

OBSERVATIONS :
BCEB - Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud R3



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R2 - R3** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **R3 vers R2**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R2 vers R3**	Longueur inspectée : **21.90 m** Longueur mesurée : **21.90 m**


DISTANCE : **21.90 m**	PHOTO : **25**	VIDEO : **00:03:44**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Branchement : **R1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**		Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.50 m** Longueur mesurée : **6.50 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R1 VERS Collecteur

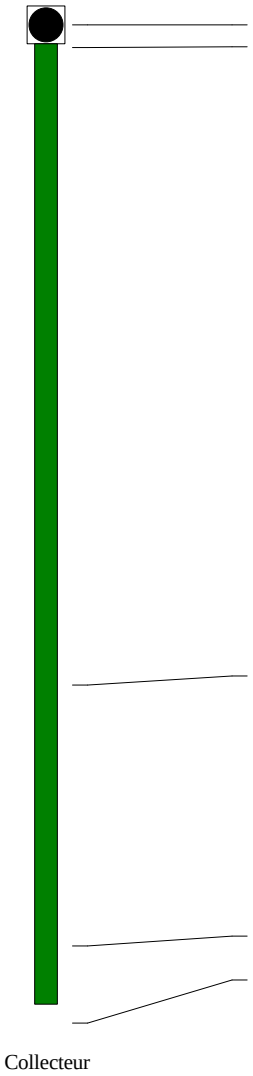

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R1	26/27	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	12
0.15 m/R1	28	BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R1 - Boite de branchement	12
4.30 m/R1	29	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Angle 45° - Coude	12
6.00 m/R1	30	BCC-B - Courbure du collecteur vers le bas - Angle 45° - Coude	13
6.50 m/R1	31/32	BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	13

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **R2 - R3**

Position : **à 5.70 m et à 10h en partant de R2**

	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Branchement : **R1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**		Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.50 m** Longueur mesurée : **6.50 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **26/27**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Début de l'inspection





DISTANCE : **0.15 m**	PHOTO : **28**	VIDEO : **00:00:07**

OBSERVATIONS :
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R1 - Boite de branchement



DISTANCE : **4.30 m**	PHOTO : **29**	VIDEO : **00:00:31**

OBSERVATIONS :
BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Angle 45° - Coude



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Branchement : **R1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**		Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.50 m** Longueur mesurée : **6.50 m**

DISTANCE : **6.00 m**	PHOTO : **30**	VIDEO : **00:00:45**

OBSERVATIONS :
BCC-B - Courbure du collecteur vers le bas - Angle 45° - Coude



DISTANCE : **6.50 m**	PHOTO : **31/32**	VIDEO : **00:00:47**


OBSERVATIONS :
BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection





	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Branchement : **R1 - R1.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **110 mm**		Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers R1.1**	Longueur inspectée : **0.90 m** Longueur mesurée : **0.90 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R1 VERS R1.1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R1	33/34	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	15
0.15 m/R1	35	BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R1 - Boite de branchement	15
0.50 m/R1	36	AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 100mm	15
0.90 m/R1	37/38/39	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 90° - Coude BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud R1.1 BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	16

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement :

Position : **dans**

	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Branchement : **R1 - R1.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **110 mm**		Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers R1.1**	Longueur inspectée : **0.90 m** Longueur mesurée : **0.90 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **33/34**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Début de l'inspection





DISTANCE : **0.15 m**	PHOTO : **35**	VIDEO : **00:00:21**

OBSERVATIONS :
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R1 - Boite de branchement



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **36**	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :
AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 100mm



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Branchement : **R1 - R1.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **110 mm**		Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers R1.1**	Longueur inspectée : **0.90 m** Longueur mesurée : **0.90 m**

DISTANCE : **0.90 m**	PHOTO : **37/38/39**	VIDEO : **00:00:45**

OBSERVATIONS :

BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 90° - Coude
BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud R1.1
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection








LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Branchement : **R1 - R1.2** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**		Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers R1.2**	Longueur inspectée : **1.40 m** Longueur mesurée : **N mesurable**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R1 VERS R1.2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R1	40/41	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	18
0.15 m/R1	42	BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R1 - Boite de branchement	18
1.30 m/R1	43	BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Angle 45° - Coude	18
1.40 m/R1	44/45	AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 100mm AEDAE - Modification du matériau de la canalisation : grès BAJB - Décentrage (radial) - Distance de 20mm BDB - Remarque générale - Arrivée des toilettes, test d'écoulement réalisé. BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Progression impossible, reprise en contresens impossible R1. non visible BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	19

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : **R1**		
Position : **dans R1**		

LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Branchement : **R1 - R1.2** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**		Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers R1.2**	Longueur inspectée : **1.40 m** Longueur mesurée : **N mesurable**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **40/41**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Début de l'inspection





DISTANCE : **0.15 m**	PHOTO : **42**	VIDEO : **00:00:05**

OBSERVATIONS :
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R1 - Boite de branchement



DISTANCE : **1.30 m**	PHOTO : **43**	VIDEO : **00:00:14**

OBSERVATIONS :
BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Angle 45° - Coude



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Branchement : **R1 - R1.2** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**		Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers R1.2**	Longueur inspectée : **1.40 m** Longueur mesurée : **N mesurable**

DISTANCE : **1.40 m**	PHOTO : **44/45**	VIDEO : **00:00:46**

OBSERVATIONS :

AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 100mm
AEDAE - Modification du matériau de la canalisation : grès
BAJB - Décentrage (radial) - Distance de 20mm
BDB - Remarque générale - Arrivée des toilettes, test d'écoulement réalisé.
BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Progression impossible, reprise en contresens impossible R1.2 non visible
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **LUNEVILLE** Adresse : **7 Rue du Château** Emplacement : **Dans une zone piétonnière** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **MINISTERE DE LA JUSTICE - DPT IMM** Client : **MINISTERE DE LA JUSTICE** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : **10/11/2025**	Référence du tronçon : **R3 - R3.1** Référence du noeud de départ : **R3** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **R3.1** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **R3.1 vers R3** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **2.20 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **2502054-IT** Réf. support photo : **2502054-IT**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Grès** Longueur unitaire : **1.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **R3** Dimensions du regard : **500 x 500** Hauteur totale de l'ouvrage : **0.70 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **R3.1** Dimensions du regard : **400 x 400** Hauteur totale de l'ouvrage : **0.50 m** Nombre de branchements : **1** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **IBAK** Modèle de l'enrouleur : **Minilite Basic** - Numéro de série : **428919**	Modèle du chariot : - Numéro de série : Modèle de la caméra : **ORION** - Numéro de série : **430578**
Observations particulières	
Remarques générales :	

LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R3 - R3.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **R3.1 vers R3**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R3 vers R3.1**	Longueur inspectée : **2.20 m** Longueur mesurée : **2.20 m**

SYNTHESE DU TRONÇON R3 VERS R3.1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / R3	46/47	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection DBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 30mm - Béton	22
0.20m / R3	48	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R3 Niveau d'eau trouble de 15%	22
0.50m / R3	49/50	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte de 12h à 12h - Largeur de 2mm Niveau d'eau trouble de 10%	23
1.50m / R3	51/52	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte de 6h à 10h - Largeur de 2mm Niveau d'eau trouble de 10%	23
2.00m / R3	53/54	BCEB - Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud R3.1 - Regard siphoné Niveau d'eau trouble de 10%	24
2.20m / R3	55	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 10%	24

Observations générales :

	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R3 - R3.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **R3.1 vers R3**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R3 vers R3.1**	Longueur inspectée : **2.20 m** Longueur mesurée : **2.20 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **46/47**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
DBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 30mm - Béton





DISTANCE : **0.20 m**	PHOTO : **48**	VIDEO : **00:00:10**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R3
Niveau d'eau trouble de 15%




	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R3 - R3.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **R3.1 vers R3**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R3 vers R3.1**	Longueur inspectée : **2.20 m** Longueur mesurée : **2.20 m**

DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **49/50**	VIDEO : **00:00:14**

OBSERVATIONS :

BABCB - Fissure circonférentielle ouverte de 12h à 12h - Largeur de 2mm
Niveau d'eau trouble de 10%

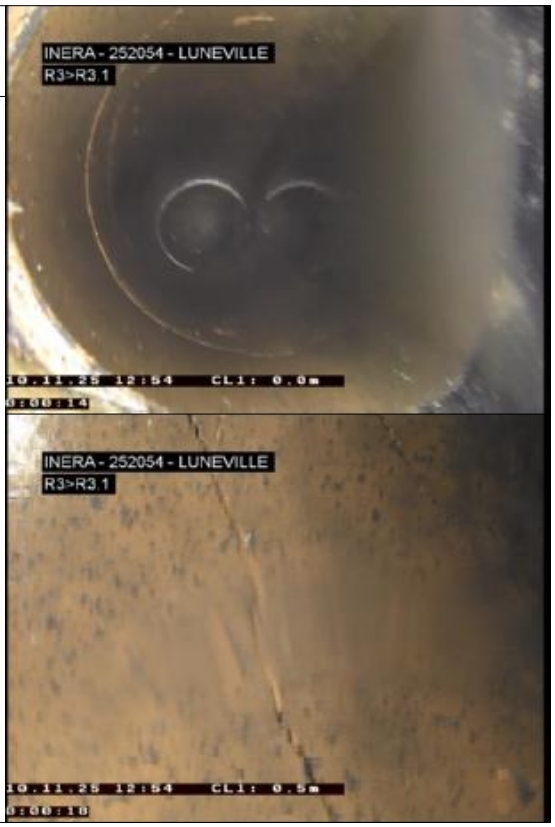

DISTANCE : **1.50 m**	PHOTO : **51/52**	VIDEO : **00:00:30**

OBSERVATIONS :

BABCB - Fissure circonférentielle ouverte de 6h à 10h - Largeur de 2mm
Niveau d'eau trouble de 10%



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R3 - R3.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **R3.1 vers R3**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R3 vers R3.1**	Longueur inspectée : **2.20 m** Longueur mesurée : **2.20 m**

DISTANCE : **2.00 m**	PHOTO : **53/54**	VIDEO : **00:01:19**

OBSERVATIONS :

BCEB - Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud R3.1 - Regard siphoné
Niveau d'eau trouble de 10%



DISTANCE : **2.20 m**	PHOTO : **55**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 10%



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **LUNEVILLE** Adresse : **7 Rue du Château** Emplacement : **Dans une zone piétonnière** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **MINISTERE DE LA JUSTICE - DPT IMM** Client : **MINISTERE DE LA JUSTICE** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : **10/11/2025**	Référence du tronçon : **R3.1 - R3.2** Référence du noeud de départ : **R3.1** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **R3.2** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **R3.2 vers R3.1** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **10.90 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **2502054-IT** Réf. support photo : **2502054-IT**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Fonte** Longueur unitaire : **1.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **R3.1** Dimensions du regard : **400 x 400** Hauteur totale de l'ouvrage : **0.50 m** Nombre de branchements : **1** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **R3.2** Dimensions du regard : **NC** Hauteur totale de l'ouvrage : **NC m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **IBAK** Modèle de l'enrouleur : **Minilite Basic** - Numéro de série : **428919**	Modèle du chariot : - Numéro de série : Modèle de la caméra : **ORION** - Numéro de série : **430578**
Observations particulières	
Remarques générales :	

LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R3.1 - R3.2** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **R3.2 vers R3.1**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R3.1 vers R3.2**	Longueur inspectée : **10.90 m** Longueur mesurée : **10.90 m**

SYNTHESE DU TRONÇON R3.1 VERS R3.2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / R3.1	56/57	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	27
0.20m / R3.1	58	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R3.1 - Regard SIphonné	27
2.00m / R3.1	59/60	BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Angle 45° - Coude	28
5.60m / R3.1	61	AEDAX - Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	28
		BDGC - Perte de visibilité due à la vapeur	
6.20m / R3.1	62	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h - Hauteur 100mm	28
		BDGC - Perte de visibilité due à la vapeur	
10.70m / R3.1	63	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Angle 45° - Coude	29
		BDGC - Perte de visibilité due à la vapeur	
10.90m / R3.1	64	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 45° - Coude	29
		BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Progression impossible, succession de coudes	
		BDB - Remarque générale - Arrivée de toilette de l'étage	
		BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	

Observations générales :

	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R3.1 - R3.2** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **R3.2 vers R3.1**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R3.1 vers R3.2**	Longueur inspectée : **10.90 m** Longueur mesurée : **10.90 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **56/57**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Début de l'inspection





DISTANCE : **0.20 m**	PHOTO : **58**	VIDEO : **00:00:09**


OBSERVATIONS :
BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R3.1 - Regard SIphonné



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R3.1 - R3.2** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **R3.2 vers R3.1**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R3.1 vers R3.2**	Longueur inspectée : **10.90 m** Longueur mesurée : **10.90 m**

DISTANCE : **2.00 m**	PHOTO : **59/60**	VIDEO : **00:04:10**

OBSERVATIONS :
BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Angle 45° - Coude

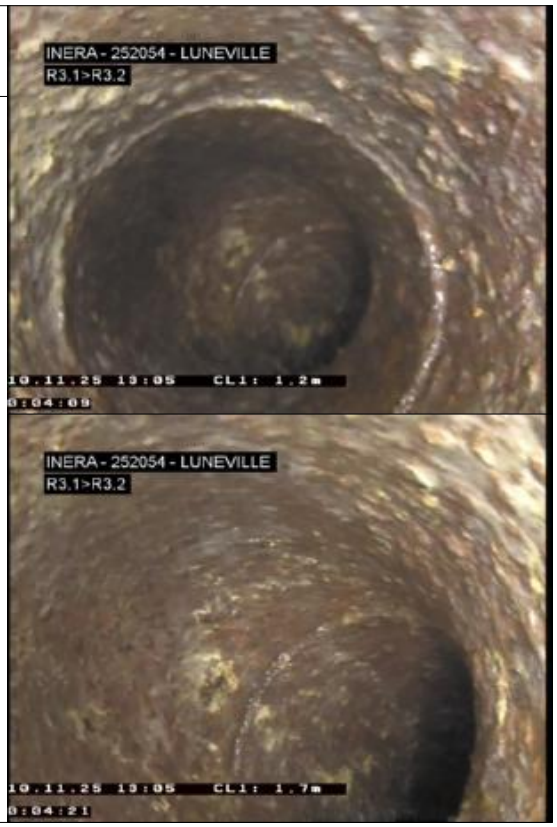

DISTANCE : **5.60 m**	PHOTO : **61**	VIDEO : **00:05:29**

OBSERVATIONS :
AEDAX - Modification du matériau de la canalisation : PVC-U
BDGC - Perte de visibilité due à la vapeur



DISTANCE : **6.20 m**	PHOTO : **62**	VIDEO : **00:05:31**

OBSERVATIONS :
BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h - Hauteur 100mm
BDGC - Perte de visibilité due à la vapeur



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R3.1 - R3.2** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **R3.2 vers R3.1**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R3.1 vers R3.2**	Longueur inspectée : **10.90 m** Longueur mesurée : **10.90 m**

DISTANCE : **10.70 m**	PHOTO : **63**	VIDEO : **00:06:21**

OBSERVATIONS :

BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Angle 45° - Coude
BDGC - Perte de visibilité due à la vapeur



DISTANCE : **10.90 m**	PHOTO : **64**	VIDEO : **00:06:32**

OBSERVATIONS :

BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 45° - Coude
BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Progression impossible, succession coudes
BDB - Remarque générale - Arrivée de toilette de l'étage
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection


ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **LUNEVILLE** Adresse : **7 Rue du Château** Emplacement : **Sous un bâtiment permanent** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **MINISTERE DE LA JUSTICE - DPT IMM** Client : **MINISTERE DE LA JUSTICE** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : **10/11/2025**	Référence du tronçon : **R4 - R4.1** Référence du noeud de départ : **R4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **R4.1** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **R4.1 vers R4** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **12.20 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **2502054-IT** Réf. support photo : **2502054-IT**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **R4** Dimensions du regard : **400 x 400** Hauteur totale de l'ouvrage : **0.80 m** Nombre de branchements : **1** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **R4.1** Dimensions du regard : **NC** Hauteur totale de l'ouvrage : **NC m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **IBAK** Modèle de l'enrouleur : **Minilite Basic** - Numéro de série : **428919**	Modèle du chariot : - Numéro de série : Modèle de la caméra : **ORION** - Numéro de série : **430578**
Observations particulières	
Remarques générales : **Problème de lecture de vidéo sur le tronçon, repèrage avec la sonde afin de repèrer l'arrivée des toilettes**	

LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - R4.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **R4.1 vers R4**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers R4.1**	Longueur inspectée : **12.20 m** Longueur mesurée : **12.20 m**

SYNTHESE DU TRONÇON R4 VERS R4.1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / R4	65/66	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	32
0.25m / R4	67	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R4 - Arrivée en chute de la canalisation	32
1.60m / R4	68/69	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 11h - Hauteur 50mm	33
1.90m / R4	70/71/72	BAFKE - Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) de 12h à 5h BAFKE - Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 9h	33
2.10m / R4	73	BAJC - Déviation angulaire - angle de 15° - Vers la droite	34
6.00m / R4	74/75/76	BDB - Remarque générale - Repérage de la canalisation en surface avec la sonde	34
11.00m / R4	77/78	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 40mm - Arrivée du Lavabo	35
12.20m / R4	79/80/81	BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud R4.1 - Problème de lecture de vidéo, arrivée des toilettes BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	35

Observations générales :
Problème de lecture de vidéo sur le tronçon, repèrage avec la sonde afin de repèrer l'arrivée des toilettes

	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - R4.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **R4.1 vers R4**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers R4.1**	Longueur inspectée : **12.20 m** Longueur mesurée : **12.20 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **65/66**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Début de l'inspection





DISTANCE : **0.25 m**	PHOTO : **67**	VIDEO : **00:00:28**

OBSERVATIONS :
BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R4 - Arrivée e chute de la canalisation



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - R4.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **R4.1 vers R4**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers R4.1**	Longueur inspectée : **12.20 m** Longueur mesurée : **12.20 m**

DISTANCE : **1.60 m**	PHOTO : **68/69**	VIDEO : **00:00:57**

OBSERVATIONS :
BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 11h - Hauteur 50mm





DISTANCE : **1.90 m**	PHOTO : **70/71/72**	VIDEO : **00:01:11**

OBSERVATIONS :
BAFKE - Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) de 12h à 5h
BAFKE - Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 9h







	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - R4.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **R4.1 vers R4**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers R4.1**	Longueur inspectée : **12.20 m** Longueur mesurée : **12.20 m**

DISTANCE : **2.10 m**	PHOTO : **73**	VIDEO : **00:01:21**

OBSERVATIONS :
BAJC - Déviation angulaire - angle de 15° - Vers la droite




DISTANCE : **6.00 m**	PHOTO : **74/75/76**	VIDEO : **00:02:25**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Repérage de la canalisation en surface avec la sonde





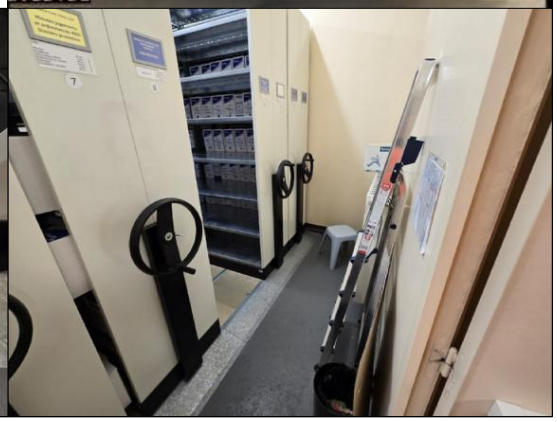

LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - R4.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **R4.1 vers R4**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers R4.1**	Longueur inspectée : **12.20 m** Longueur mesurée : **12.20 m**

DISTANCE : **11.00 m**	PHOTO : **77/78**	VIDEO : **00:02:41**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 40mm - Arrivée du Lavabo





DISTANCE : **12.20 m**	PHOTO : **79/80/81**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud R4.1 - Problème de lecture de vidéo, arrivé des toilettes
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection








Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **LUNEVILLE** Adresse : **7 Rue du Château** Emplacement : **Sous un bâtiment permanent** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **MINISTERE DE LA JUSTICE - DPT IMM** Client : **MINISTERE DE LA JUSTICE** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : **10/11/2025**	Référence du tronçon : **R4 - S2** Référence du noeud de départ : **R4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **S2** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **S2 vers R4** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **0.70 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **2502054-IT** Réf. support photo : **2502054-IT**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **125** Largeur : Matériau constitutif : **Grès** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **R4** Dimensions du regard : **400 x 400** Hauteur totale de l'ouvrage : **0.80 m** Nombre de branchements : **1** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **S2** Dimensions du regard : **Ø80** Hauteur totale de l'ouvrage : **0.20 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **IBAK** Modèle de l'enrouleur : **Minilite Basic** - Numéro de série : **428919**	Modèle du chariot : - Numéro de série : Modèle de la caméra : **ORION** - Numéro de série : **430578**
Observations particulières	
Remarques générales :	

LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - S2** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **S2 vers R4**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers S2**	Longueur inspectée : **0.70 m** Longueur mesurée : **0.70 m**

SYNTHESE DU TRONÇON R4 VERS S2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / R4	82/83	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	38
0.25m / R4	84	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R4	38
0.70m / R4	85/86/87	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud S2 - Siphon BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	39

Observations générales :

	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - S2** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **S2 vers R4**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers S2**	Longueur inspectée : **0.70 m** Longueur mesurée : **0.70 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **82/83**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Début de l'inspection



DISTANCE : **0.25 m**	PHOTO : **84**	VIDEO : **00:00:04**

OBSERVATIONS :
BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R4



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - S2** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **S2 vers R4**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers S2**	Longueur inspectée : **0.70 m** Longueur mesurée : **0.70 m**

DISTANCE : **0.70 m**	PHOTO : **85/86/87**	VIDEO : **00:00:25**

OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud S2 - Siphon
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection








Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **LUNEVILLE** Adresse : **7 Rue du Château** Emplacement : **Sous un bâtiment permanent** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **MINISTERE DE LA JUSTICE - DPT IMM** Client : **MINISTERE DE LA JUSTICE** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : **10/11/2025**	Référence du tronçon : **S2 - R6** Référence du noeud de départ : **S2** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **R6** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **R6 vers S2** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **1.60 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **2502054-IT** Réf. support photo : **2502054-IT**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **125** Largeur : Matériau constitutif : **Grès** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **S2** Dimensions du regard : **Ø80** Hauteur totale de l'ouvrage : **0.20 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **R6** Dimensions du regard : **NC** Hauteur totale de l'ouvrage : **NC m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **IBAK** Modèle de l'enrouleur : **Minilite Basic** - Numéro de série : **428919**	Modèle du chariot : - Numéro de série : Modèle de la caméra : **ORION** - Numéro de série : **430578**
Observations particulières	
Remarques générales :	

LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **S2 - R6** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **R6 vers S2**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **S2 vers R6**	Longueur inspectée : **1.60 m** Longueur mesurée : **1.60 m**

SYNTHESE DU TRONÇON S2 VERS R6



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / S2	88/89	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	42
0.30m / S2	90	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte de 7h à 11h - Largeur de 2mm	42
1.60m / S2	91/92/93	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6 - Regard borgne, situé sous le bac BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	43

Observations générales :

	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **S2 - R6** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **R6 vers S2**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **S2 vers R6**	Longueur inspectée : **1.60 m** Longueur mesurée : **1.60 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **88/89**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Début de l'inspection





DISTANCE : **0.30 m**	PHOTO : **90**	VIDEO : **00:00:10**

OBSERVATIONS :
BABCB - Fissure circonférentielle ouverte de 7h à 11h - Largeur de 2mm



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **S2 - R6** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **R6 vers S2**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **S2 vers R6**	Longueur inspectée : **1.60 m** Longueur mesurée : **1.60 m**

DISTANCE : **1.60 m**	PHOTO : **91/92/93**	VIDEO : **00:00:27**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6 - Regard borgne, situé sous le bac
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection








Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **LUNEVILLE** Adresse : **7 Rue du Château** Emplacement : **Dans une zone piétonnière** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **MINISTERE DE LA JUSTICE - DPT IMM** Client : **MINISTERE DE LA JUSTICE** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : **10/11/2025**	Référence du tronçon : **S1 - R6** Référence du noeud de départ : **S1** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **R6** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **S1 vers R6** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **7.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **2502054-IT** Réf. support photo : **2502054-IT**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **125** Largeur : Matériau constitutif : **Grès** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement : -
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **S1** Dimensions du regard : **Ø80** Hauteur totale de l'ouvrage : **0.40 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **R6** Dimensions du regard : **NC** Hauteur totale de l'ouvrage : **NC m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **IBAK** Modèle de l'enrouleur : **Minilite Basic** - Numéro de série : **428919**	Modèle du chariot : - Numéro de série : Modèle de la caméra : **ORION** - Numéro de série : **430578**
Observations particulières	
Remarques générales :	

LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **S1 - R6** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **S1 vers R6**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **S1 vers R6**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON S1 VERS R6



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / S1	94/95/96	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud S1 - Siphon	46
1.20m / S1	97/98	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Distance de 40mm	46
5.30m / S1	99/100	BCC-B - Courbure du collecteur vers le bas - Angle 45° - Coude	47
5.60m / S1	101	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut - Angle 45° - Coude	47
7.00m / S1	102/103/104	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6 - Regard borgne, situé sous le bac BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	48

Observations générales :

LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **S1 - R6** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **S1 vers R6**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **S1 vers R6**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **94/95/96** | VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud S1 - Siphon







DISTANCE : **1.20 m** | PHOTO : **97/98** | VIDEO : **00:00:24**

OBSERVATIONS :

BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Distance de 40mm






	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **S1 - R6** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **S1 vers R6**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **S1 vers R6**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

DISTANCE : **5.30 m**	PHOTO : **99/100**	VIDEO : **00:00:48**

OBSERVATIONS :
BCC-B - Courbure du collecteur vers le bas - Angle 45° - Coude

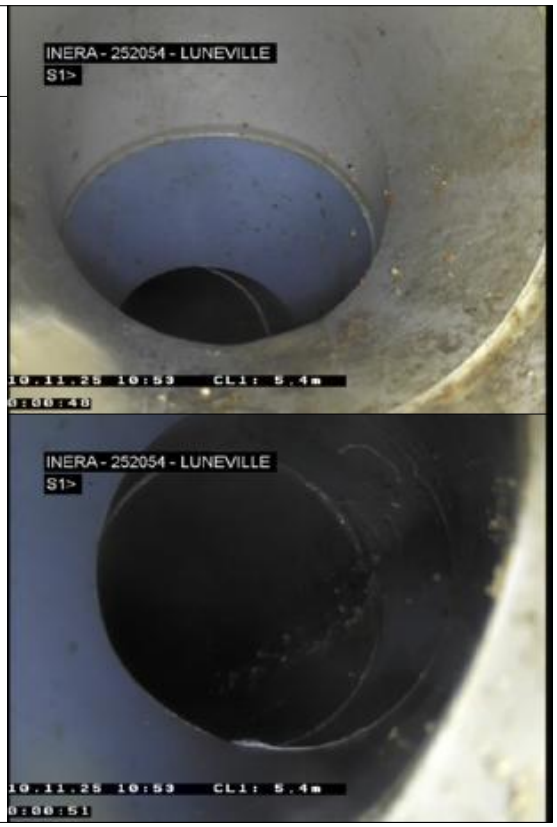

DISTANCE : **5.60 m**	PHOTO : **101**	VIDEO : **00:00:52**

OBSERVATIONS :
BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut - Angle 45° - Coude



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **S1 - R6** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **S1 vers R6**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **S1 vers R6**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

DISTANCE : **7.00 m**	PHOTO : **102/103/104**	VIDEO : **00:01:01**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6 - Regard borgne, situé sous le bac
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection








Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **LUNEVILLE** Adresse : **7 Rue du Château** Emplacement : **Sous un bâtiment permanent** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **MINISTERE DE LA JUSTICE - DPT IMM** Client : **MINISTERE DE LA JUSTICE** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : **10/11/2025**	Référence du tronçon : **R4 - R5** Référence du noeud de départ : **R4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **R5** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **R4 vers R5** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.20 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **2502054-IT** Réf. support photo : **2502054-IT**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **125** Largeur : Matériau constitutif : **Grès** Longueur unitaire : **1.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **R4** Dimensions du regard : **400 x 400** Hauteur totale de l'ouvrage : **0.80 m** Nombre de branchements : **1** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **R5** Dimensions du regard : **400 x 400** Hauteur totale de l'ouvrage : **1.15 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Non** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **IBAK** Modèle de l'enrouleur : **Minilite Basic** - Numéro de série : **428919**	Modèle du chariot : - Numéro de série : Modèle de la caméra : **ORION** - Numéro de série : **430578**
Observations particulières	
Remarques générales :	

LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - R5** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **R4 vers R5**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers R5**	Longueur inspectée : **5.20 m** Longueur mesurée : **5.20 m**

SYNTHESE DU TRONÇON R4 VERS R5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / R4	105/106	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	51
0.25m / R4	107	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R4	51
0.90m / R4	108	BAJB - Décentrage (radial) de 6h à 12h - Distance de 10mm	51
1.30m / R4	109	BAJB - Décentrage (radial) de 6h à 10h - Distance de 5mm	52
1.80m / R4	110/111	BABCD - Fissure hélicoïdale ouverte de 9h à 3h - Largeur de 1mm	52
2.80m / R4	112/113	AEDAX - Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	53
3.80m / R4	114	BCC-- - Courbure du collecteur - Angle 90° - Coude	53
5.00m / R4	115/116	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5 - Arrivée en chute de la canalisation	54
5.20m / R4	117/118	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	54

Observations générales :

	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - R5** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **R4 vers R5**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers R5**	Longueur inspectée : **5.20 m** Longueur mesurée : **5.20 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **105/106**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Début de l'inspection





DISTANCE : **0.25 m**	PHOTO : **107**	VIDEO : **00:00:16**

OBSERVATIONS :
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R4



DISTANCE : **0.90 m**	PHOTO : **108**	VIDEO : **00:00:29**

OBSERVATIONS :
BAJB - Décentrage (radial) de 6h à 12h - Distance de 10mm



	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - R5** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **R4 vers R5**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers R5**	Longueur inspectée : **5.20 m** Longueur mesurée : **5.20 m**


DISTANCE : **1.30 m**	PHOTO : **109**	VIDEO : **00:00:41**

OBSERVATIONS :
BAJB - Décentrage (radial) de 6h à 10h - Distance de 5mm



DISTANCE : **1.80 m**	PHOTO : **110/111**	VIDEO : **00:01:00**

OBSERVATIONS :
BABCD - Fissure hélicoïdale ouverte de 9h à 3h - Largeur de 1mm

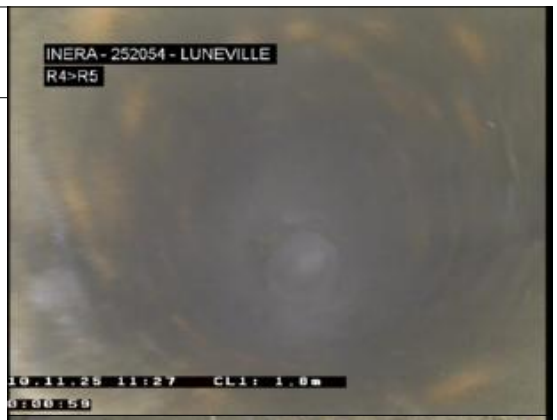




	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - R5** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **R4 vers R5**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers R5**	Longueur inspectée : **5.20 m** Longueur mesurée : **5.20 m**

DISTANCE : **2.80 m**	PHOTO : **112/113**	VIDEO : **00:01:08**

OBSERVATIONS :
AEDAX - Modification du matériau de la canalisation : PVC-U

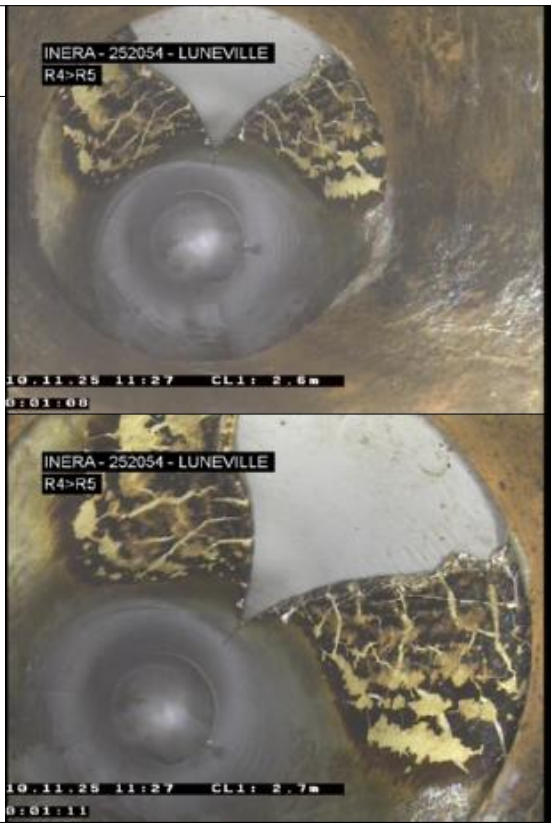

DISTANCE : **3.80 m**	PHOTO : **114**	VIDEO : **00:01:29**

OBSERVATIONS :
BCC-- - Courbure du collecteur - Angle 90° - Coude



LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**			Dossier : **2502054-IT** Tronçon : **R4 - R5** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**	Sens de l'écoulement **R4 vers R5**	Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **1.00 m**	Sens de l'inspection **R4 vers R5**	Longueur inspectée : **5.20 m** Longueur mesurée : **5.20 m**

DISTANCE : **5.00 m**	PHOTO : **115/116**	VIDEO : **00:01:51**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5 - Arrivée en chut de la canalisation





DISTANCE : **5.20 m**	PHOTO : **117/118**	VIDEO : **00:01:56**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection





	LUNEVILLE **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Branchement : **R7.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R7 vers R7.1**	Longueur inspectée : **0.80 m** Longueur mesurée : **0.80 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R7 VERS R7.1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R7	119/120/121	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R7 - Boite de branchement	56
0.30 m/R7	122	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 45° - Coude	56
0.80 m/R7	123	BAJB - Décentrage (radial) - Distance de 25mm BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Progression impossible, reprise en contresens impossible R7. non visible BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	56

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **R7**

Position : **dans R7**

INERA GRAND EST	**LUNEVILLE** **7 Rue du Château** **Client : MINISTERE DE LA JUSTICE**		Dossier : **2502054-IT** Branchement : **R7.1** Opérateur : **Anthony LEGRAND**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **10 novembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R7 vers R7.1**	Longueur inspectée : **0.80 m** Longueur mesurée : **0.80 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **119/120/121**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R7 - Boite de branchement







DISTANCE : **0.30 m**	PHOTO : **122**	VIDEO : **00:00:19**

OBSERVATIONS :

BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 45° - Coude



DISTANCE : **0.80 m**	PHOTO : **123**	VIDEO : **00:00:29**

OBSERVATIONS :

BAJB - Décentrage (radial) - Distance de 25mm
BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Progression impossible, reprise en contresens impossible R7.1 non visible
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection

ABANDON INSPECTION



SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LUNEVILLE
7 Rue du Château

Dossier : 2502054-IT

Date : 10/11/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
R2 vers R3	200	21.90 m	Unitaire	PVC-U			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	4
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R2 - Arrivée de la canalisation en chute	4
						BACA - Rupture de 2h à 3h - A l'assemblage regard / tuyau	
					4.30	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Distance de 50mm	5
					5.70	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 10h - Hauteur 160mm - Arri de R1	5
					9.40	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm	6
					9.90	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 160mm	6
					13.90	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h - Hauteur 160mm	7
					14.10	BAJC - Déviation angulaire - angle de 30° - Vers la gauche	7
					18.90	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h - Hauteur 125mm	8
						BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 50% - A l'intéri du branchement	
					19.60	AEDAE - Modification du matériau de la canalisation : grès	8
						AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 300mm	
					20.50	AEDAX - Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	9
					20.80	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 10h - Hauteur 160mm	9
						BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 60% - A l'intéri du branchement	
					21.50	BCEB - Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud R3	9
					21.90	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	10
R1 vers Collecteur	125	6.50 m	Unitaire	PVC-U			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	12
					0.15	BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R1 - Boite de branchement	12
					4.30	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Angle 45° - Coude	12
					6.00	BCC-B - Courbure du collecteur vers le bas - Angle 45° - Coude	13
					6.50	BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Collecteur	13
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	
R1 vers R1.1	110	0.90 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	15
					0.15	BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R1 - Boite de branchement	15
					0.50	AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 100mm	15
					0.90	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 90° - Coude	16
						BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud R1.1	
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	
R1 vers R1.2	125	1.40 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	18
					0.15	BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R1 - Boite de branchement	18
					1.30	BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Angle 45° - Coude	18
					1.40	AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 100mm	19
						AEDAE - Modification du matériau de la canalisation : grès	
						BAJB - Décentrage (radial) - Distance de 20mm	
						BDB - Remarque générale - Arrivée des toilettes, test d'écoulement réalisé.	
						BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Progression impossible, reprise en contresens impossible R1.2 non visible	
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	
R3 vers R3.1	150	2.20 m	Eaux usées	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	22
						DBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 30mm Béton	
					0.20	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R3	22
						Niveau d'eau trouble de 15%	

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LUNEVILLE
7 Rue du Château

Dossier : 2502054-IT

Date : 10/11/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					0.50	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte de 12h à 12h - Largeur de 2mm	23
					1.50	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte de 6h à 10h - Largeur de 2mm Niveau d'eau trouble de 10%	23
					2.00	BCEB - Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud R3.1 - Regard siphoné Niveau d'eau trouble de 10%	24
					2.20	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 10%	24
R3.1 vers R3.2	100	10.90 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	27
					0.20	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R3.1 - Regarc SIphonné	27
					2.00	BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Angle 45° - Coude	28
					5.60	AEDAX - Modification du matériau de la canalisation : PVC-U BDGC - Perte de visibilité due à la vapeur	28
					6.20	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h - Hauteur 100mm BDGC - Perte de visibilité due à la vapeur	28
					10.70	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Angle 45° - Coude BDGC - Perte de visibilité due à la vapeur	29
					10.90	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 45° - Coude BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Progression impossible, successic de coudes BDB - Remarque générale - Arrivée de toilette de l'étage BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	29
R4 vers R4.1	100	12.20 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	32
					0.25	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R4 - Arrivée chute de la canalisation	32
					1.60	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 11h - Hauteur 50mm	33
					1.90	BAFKE - Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) de 12h à 5h BAFKE - Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 9h	33
					2.10	BAJC - Déviation angulaire - angle de 15° - Vers la droite	34
					6.00	BDB - Remarque générale - Repérage de la canalisation en surface avec la sonde	34
					11.00	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 40mm - Arrivé du Lavabo	35
					12.20	BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud R4.1 - Problème de lecture de vidéo, arriv des toilettes BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	35
R4 vers S2	125	0.70 m	Eaux usées	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	38
					0.25	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R4	38
					0.70	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud S2 - Siphon BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	39
S2 vers R6	125	1.60 m	Eaux usées	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	42
					0.30	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte de 7h à 11h - Largeur de 2mm	42
					1.60	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6 - Regard borgne situé sous le bac BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	43
S1 vers R6	125	7.00 m	Eaux usées	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud S1 - Siphon	46
					1.20	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Distance de 40mm	46
					5.30	BCC-B - Courbure du collecteur vers le bas - Angle 45° - Coude	47
					5.60	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut - Angle 45° - Coude	47
					7.00	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6 - Regard borgne situé sous le bac	48

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LUNEVILLE
7 Rue du Château

Dossier : 2502054-IT

Date : 10/11/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					7.00	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6 - Regard borgne situé sous le bac	48
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	
R4 vers R5	125	5.20 m	Eaux usées	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	51
					0.25	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R4	51
					0.90	BAJB - Décentrage (radial) de 6h à 12h - Distance de 10mm	51
					1.30	BAJB - Décentrage (radial) de 6h à 10h - Distance de 5mm	52
					1.80	BABCD - Fissure hélicoïdale ouverte de 9h à 3h - Largeur de 1mm	52
					2.80	AEDAX - Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	53
					3.80	BCC-- - Courbure du collecteur - Angle 90° - Coude	53
					5.00	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5 - Arrivée en chu de la canalisation	54
					5.20	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	54
R7 vers R7.1	100	0.80 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	56
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud R7 - Boite de branchement	
					0.30	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 45° - Coude	56
					0.80	BAJB - Décentrage (radial) - Distance de 25mm	56
						BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Progression impossible, reprise en contresens impossible R7.1 non visible	
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	

SYNTHESE DES RESEAUX PAR RUE

LUNEVILLE
7 Rue du Château

Dossier : 2502054-IT

Date : 10/11/2025

Référence	Section	Matériau	Longueur	Inspectée
R2 - R3	Ø 200 mm	PVC-U	21.90 m	21.90 m
R3 - R3.1	Ø 150 mm	Grès	2.20 m	2.20 m
R3.1 - R3.2	Ø 100 mm	Fonte	10.90 m	10.90 m
R4 - R4.1	Ø 100 mm	PVC-U	12.20 m	12.20 m
R4 - S2	Ø 125 mm	Grès	0.70 m	0.70 m
S2 - R6	Ø 125 mm	Grès	1.60 m	1.60 m
S1 - R6	Ø 125 mm	Grès	7.00 m	7.00 m
R4 - R5	Ø 125 mm	Grès	5.20 m	5.20 m

Longueur totale pour 8 conduites sur 7 Rue du Château = 61.70 m / inspectée = 61.70 m

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LUNEVILLE
7 Rue du Château

Dossier : 2502054-IT

Date : 10/11/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	R2 > R3	R1 > Collecteur	R1 > R1.1	R1 > R1.2	R3 > R3.1	R3.1 > R3.2	R4 > R4.1	R4 > S2
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø125	Ø110	Ø125	Ø150	Ø100	Ø100	Ø125
Longueur mesurée :	21.90 m	6.50 m	0.90 m	non mes.	2.20 m	10.90 m	12.20 m	0.70 m
Longueur inspectée :	21.90 m	6.50 m	0.90 m	1.40 m	2.20 m	10.90 m	12.20 m	0.70 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	6 / 0 / 0	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / 0 / 1	1 / 1 / 0	2 / 1 / 0	0 / 1 / 0
• Tronçon visité incomplètement				X				
• AECA Modification de la section transversale, form	1		1	1				
• AEDA Modification du matériau de la canalisation	2			1		1		
• BABC Fissure ouverte					2			
• BACA Rupture	1							
• BAFK Dégradation de surface, poinçonnement							2	
• BAJA Deboîtement (longitudinal)	1							
• BAJB Décentrage (radial)				1				
• BAJC Déviation angulaire	1						1	
• BBCB Dépôt de matériau grossier	2							
• BCC Courbure du collecteur		1	1			1		
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche		1				1		
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite				1		1		
• DBCC Dépôt de matériau dur ou compacté					1			

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LUNEVILLE
7 Rue du Château

Dossier : 2502054-IT

Date : 10/11/2025

Caractéristiques tronçon								**Total**
Tronçon / Branchement / Noeud	S2 > R6	S1 > R6	R4 > R5	R7 > R7.1				
Dimensions des tuyaux :	Ø125	Ø125	Ø125	Ø100				
Longueur mesurée :	1.60 m	7.00 m	5.20 m	0.80 m				69.90 m
Longueur inspectée :	1.60 m	7.00 m	5.20 m	0.80 m				71.30 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 1 / 0	0 / - / -				9 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form								3
• AEDA Modification du matériau de la canalisation			1					5
• BABC Fissure ouverte	1		1					4
• BACA Rupture								1
• BAFK Dégradation de surface, poinçonnement								2
• BAJA Deboîtement (longitudinal)		1						2
• BAJB Décentrage (radial)			2	1				4
• BAJC Déviation angulaire								2
• BBCB Dépôt de matériau grossier								2
• BCC Courbure du collecteur		1	1	1				6
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche		1						3
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								2
• DBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								1



ANNEXE 1: Schéma des réseaux contrôlés

Légende:

ETAT DES CONTROLES

ITV (inspection télévisée):

- Réseau d'eaux usées inspecté
- Réseau d'eaux pluviales inspecté
- Réseau unitaire inspecté
- Réseau d'adduction en eau potable inspecté
- Drainage inspecté
- Réseau d'eaux usées non inspecté
- Réseau d'eaux pluviales non inspecté
- Réseau unitaire non inspecté
- Réseau d'adduction en eau potable non inspecté
- Drainage non inspecté

TC (test de compactage): Conforme (P) NON Conforme (P) REFUS (P)

EP(essai à la plaque): EP Positionnement essai à la plaque

EE (essai d'étanchéité): Conforme NON Conforme

ELEMENTS D'INVENTAIRE

- Regard de visite
- Avaloir
- Boîte d'inspection
- Siphon de sol
- Poste de refoulement
- Déversoir d'orage
- Séparateur d'hydrocarbures
- Sens d'écoulement des effluents

Glossaire des abréviations:

AEP	Adduction en eau potable	DT	Descente de toiture	PR	Poste de refoulement	Rft	Refoulement
AV	Avaloir	EI	Eaux industrielles	R	Regard	SH	Séparateurs d'hydrocarbures
B	Branchement	EP	Eaux pluviales	RB	Regard borgne	U	Unitaire
BB	Boîtes de branchement(s)	EU	Eaux usées	REnt	Regard enterré	NV	Non visible
DO	Déversoir d'orage	P	Point essai de compactage	RExt	Regard existant		

INERA GRAND EST
Z.A. PATIS DES SAULES
88450 VINCEY
Tél: +33 (0) 3 29 38 11 05
E-mail: inera-lorrainesud@inera-ge.com

SCHEMA DE PRINCIPE (sans échelle)

LA POSITION DES REGARDS ET LE CHEMINEMENT DES RESEAUX SONT DONNES A TITRE PUREMENT INDICATIF

Client : MINISTERE DE LA JUSTICE
20 BD DE LA MOTHE
54000 NANCY

Date de réalisation : 25/11/2025

Dessiné par : BG

N° AFFAIRE: 2502054

Inspection télévisée 2502054-IT	Planche de convenance
Essai d'étanchéité	Test à la fumée
Test de compactage	
Essai à la plaque	

Chantier : 7 Rue du Château

Ville : LUNEVILLE
