
Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035

Numéro de rapport	**34-28777017-MONTPELLIER-0005082538-RECTORAT-PB BAT D P**
Propriétaire	**RECTORAT ACADEMIE MONTPELLIER**
Donneur d'ordre	**RECTORAT ACADEMIE MONTPELLIER**
Adresse de l'immeuble	**RECTORAT BATIMENT D rue DE L'ABBE DE L'EPEE 34000 MONTPELLIER**
Bâtiment ou installation	**Bâtiment**
Date de la commande	**24/11/2025**
La ou le(s) date(s) de la visite	**24/11/2025**
Date d'édition du rapport de repérage	**19/12/2025**
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	**74**

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise



Opérateur de repérage :

Monsieur MURILLO Tanguy
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 451, rue Denis Papin
34000 MONTPELLIER
Le **19/12/2025**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 36 315 050 € - RCS Nanterre B 790 184 675
Siège social: Le Triangle de l'Arche – 4 Place des Saisons – 92400 COURBEVOIE - © Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
DESCRIPTION DE LA MISSION 3
OBJET DE LA MISSION : 3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : 3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS : 3
PROGRAMME DE TRAVAUX 3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE 4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X 7
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS) 7
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE 7
METHODOLOGIE EMPLOYEE 7
INTERPRETATION DES RESULTATS 10
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 10
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES 10
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 68
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 72
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE 74

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.
Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission :

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**RECTORAT ACADEMIE MONTPELLIER**
Demeurant :	**RECTORAT 31 Rue de l'Université 34000 MONTPELLIER**
Représenté par :	**Monsieur LOF ALEXANDRA** **/ /**
Donneur d'ordre du repérage :	**RECTORAT ACADEMIE MONTPELLIER**
Demeurant :	**RECTORAT 31 Rue de l'Université 34000 MONTPELLIER**
Représenté par :	**Monsieur LOF ALEXANDRA** **/ /**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur MURILLO Tanguy**
Nom et adresse de l'entreprise :	**BUREAU VERITAS EXPLOITATION ZAC Blaise Pascal - Immeuble l'Optimum 451, rue Denis Papin 34000 MONTPELLIER**
N° de Siret :	**79018467500300**
RCP-compagnie-n° de police :	**ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - FRL001575**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**RECTORAT BATIMENT D**
Adresse complète :	**rue DE L'ABBE DE L'EPEE 34000 MONTPELLIER**
Référence Cadastrale :	**BS - 532**

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**	Construction :
Fonction principale du bâtiment :	**Bâtiment**	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

<[Absence de document remis]>

Type de document

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Curage complet du bâtiment D : Murs , sol , plafond, menuiseries

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local	Étage	Visité	Justification de non-visite
PIECE 1		OUI	
PIECE 2		OUI	
PIECE 3		OUI	
PIECE 4		OUI	
PIECE 5		OUI	
PIECE 6		OUI	
PIECE 7		OUI	
PIECE 8		OUI	
PIECE 9		OUI	
PIECE 10		OUI	
PIECE 11		OUI	
PIECE 12		OUI	
PIECE 13		OUI	
PIECE 14		OUI	
PIECE 15		OUI	
PIECE 16		OUI	
PIECE 17		OUI	
PIECE 18		OUI	
Chaufferie		OUI	
PIECE 19		OUI	
PIECE 20		OUI	
PIECE 21		OUI	
PIECE 22		OUI	
PIECE 23		OUI	
PIECE 24		OUI	
PIECE 25		OUI	
PIECE 26		OUI	
PIECE 27		OUI	
PIECE 28		OUI	
PIECE 29		OUI	
PIECE 30		OUI	
PIECE 31		OUI	
PIECE 32		OUI	
PIECE 33		OUI	
PIECE 34		OUI	
PIECE 35		OUI	
PIECE 36		OUI	
PIECE 90		OUI	
PIECE 37		OUI	
PIECE 38		OUI	
PIECE 39		OUI	
PIECE 40		OUI	
PIECE 41		OUI	
PIECE 42		OUI	
PIECE 43		OUI	
PIECE 44		OUI	
PIECE 45		OUI	
PIECE 46		OUI	
PIECE 47		OUI	
PIECE 48		OUI	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PIECE 49		OUI	
PIECE 50		OUI	
PIECE 51		OUI	
PIECE 52		OUI	
PIECE 53		OUI	
PIECE 54		OUI	
PIECE 55		OUI	
PIECE 56		OUI	
PIECE 57		OUI	
PIECE 58		OUI	
PIECE 59		OUI	
PIECE 60		OUI	
PIECE 61		OUI	
PIECE 62		OUI	
PIECE 63		OUI	
PIECE 64		OUI	
PIECE 65		OUI	
PIECE 66		OUI	
PIECE 67		OUI	
PIECE 68		OUI	
PIECE 69		OUI	
PIECE 70		OUI	
PIECE 71		OUI	
PIECE 72		OUI	
PIECE 73		OUI	
PIECE 74		OUI	
PIECE 75		OUI	
PIECE 76		OUI	
PIECE 77		OUI	
PIECE 78		OUI	
PIECE 79		OUI	
PIECE 80		OUI	
PIECE 81		OUI	
PIECE 82		OUI	
PIECE 83		OUI	
PIECE 84		OUI	
PIECE 85		OUI	
PIECE 86		OUI	
PIECE 87		OUI	
PIECE 88		OUI	
PIECE 89		OUI	
COMBLES		OUI	
NORD		OUI	
SUD		OUI	
EST		OUI	
OUEST		OUI	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

3.2	L'appareil portable à fluorescence X	
Marque :	**Fondis Electronic**	
Modèle :	**FEnX2**	
Numéro de série :	**24-1120**	
Date de changement de source :	**19/06/2024**	
Nature du radionucléide :	**Cd109**	
Activité de la source :	**850 Mbq**	
Limite de quantification de l'appareil	**0,31 mg/cm²**	
Étalon 1		**Étalon 2**
Fabricant de l'étalon : NIST		Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm²		Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm²		Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm²
N° NIST de l'étalon : SRM2575		N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)

N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm²)	Date	Observation
1	0,36	0,1	24/11/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
2	0,77	0,1	24/11/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
571	0,36	0,1	24/11/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic
572	0,72	0,1	24/11/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique

Nom :	**Eurofins Analyse pour le Bâtiment Sud**
Adresse :	**75C Avenue de Pascalet 30310 VERGÈZE**
Numéro d'accréditation :	**1-5922**

4 Méthodologie Employée

Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X
Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission
L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
– chaque palier ;
– chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;

Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X…) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.
Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :
– les différents murs d'une même pièce ;
– des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
– les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
– une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :
– l'ensemble des plinthes d'un même local ;
– l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :
- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faÏences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Relevé des mesures :
Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.
Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.
Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

COMBLES (Combles)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Plafond	Plafond	Charpente Bois/Métal	Tuiles				
	Sol	Plancher	Béton					

Commentaire sur le local	Néant

NORD (FACADES)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
567	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,08	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

SUD (FACADES)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
568	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,07	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

EST (FACADES)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
569	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,61	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

OUEST (FACADES)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
570	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,51	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

Chaufferie (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Béton					
566	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	9,66	0,1	
565	A	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	7,83	0,1	
	B	Murs	Béton					
	C	Murs	Béton					
	D	Murs	Béton					
563	D	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
564	D	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					
	Sol	Plancher	Béton					

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PIECE 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
7	A	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
8					C	0,22	0,1	
3	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,88	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
5	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	4,82	0,1	
6	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	8,53	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
4	C	Murs	Enduit + peinture		HD	0,06	0,1	
	C	Plinthes		Carrelage				
10	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,69	0,1	
9	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	2,51	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
11	D	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
12	D	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
13	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,07	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Crémaillère		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches		Carrelage				
14	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	2,74	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	A	Plinthes		Carrelage				
16	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
17	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
18	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
19					C	0,06	0,1	
15	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence	HD	0,09	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
20	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,07	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
21	A	Murs	Enduit + peinture	Faïence	HD	0,07	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
22	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	B	Plinthes		Carrelage				
23	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
25	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
24	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
26	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,07	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 4 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	A	Plinthes		Carrelage				
28	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
29	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
27	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence	HD	0,07	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				
30	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
31	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,08	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 5 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
32	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,06	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
33	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,69	0,1	
34	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	2,51	0,1	
37	B	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
38					C	0,08	0,1	
	B	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM F1
	B	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM F1
	B	Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM F1
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
35	B	Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	11,01	0,1	
36					C	1	0,1	
	B	Porte-fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture				IDEM PF1
	B	Porte-fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
40	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
39	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
41	D	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
42					C	0,05	0,1	
	D	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°6 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM F1
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
43	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafonds	HD	0,12	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
45	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
46	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	B	Plinthes		Carrelage				
44	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence	HD	0,19	0,1	
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
	E	Murs	Enduit + peinture					
47	E	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
	F	Murs	Enduit + peinture					
	F	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	G	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
48	H	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	IDEM F1
49					C	0	0,1	
	H	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	H	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	H	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	H	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	I	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
50	I	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
51	I	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	J	Murs	Enduit + peinture					
	K	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	L	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	M	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	N	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
52	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafonds	HD	0,05	0,1	
53					C	0,07	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 7 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture					
	A	Plinthes		Carrelage				
55	A	Porte Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
56		intérieur			C	0	0,1	
57	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
58					C	0	0,1	
54	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence	HD	0,19	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
59	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,07	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 8 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
60	A	Murs	Enduit + peinture	Faïence	HD	0,27	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
62	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	8,74	0,1	
61	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	5,39	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	B	Plinthes		Carrelage				
64	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
63	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
66	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
65	B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
	D	Radiateur Dormant intérieur	Métal	Peinture				
	E	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	E	Plinthes		Carrelage				
	F	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	F	Plinthes		Carrelage				
68	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,55	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 9 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture					
	A	Plinthes		Carrelage				
70	A	Porte Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
71					C	0,03	0,1	
69	B	Murs	Enduit + peinture		HD	0,07	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
72	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,55	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 10 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture					
	A	Plinthes		Carrelage				
74	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
75					C	0,03	0,1	
73	B	Murs	Enduit + peinture		HD	0,94	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
77	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Plinthes		Carrelage				
76	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,55	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 11 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture					
	A	Plinthes		Carrelage				
78	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	5,1	0,1	
79	B	Murs	Enduit + peinture		HD	0,47	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				
	B	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
80	D	Porte Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	6,79	0,1	6,79 OUVRANT
81					C	2,67	0,1	2,67 DORMANT
	E	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	E	Plinthes		Carrelage				
	E	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture				
	E	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture				
	F	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	F	Plinthes		Carrelage				
	F	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	F	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	F	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture				PORTE METAL ROUGE
84	F	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	6,1	0,1	PORTE METAL ROUGE
85	F	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	PORTE METAL BEIGE
	F	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture				
	F	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	F	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
82	F	Radiateur Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
86	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,55	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 12 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
87	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,87	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
88	A	Porte Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
89					C	0,06	0,1	
90	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
91					C	0,02	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
92	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,55	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 13 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
93	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,12	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
94	A	Porte Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
95					C	0,13	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
96	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,55	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 14 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
97	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,22	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
98	A	Porte Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
99					C	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
100	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,55	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 15 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
101	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,09	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
102	A	Porte Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
103					C	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
104	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,55	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PIECE 16 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
105	A	Murs	Enduit + peinture	Faïence	HD	0,02	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	B	Plinthes		Carrelage				
106	B	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				
107	C	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
108	C	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture					
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 17 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
109	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,63	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
110	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
111	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
112	D	Conduit n°1	Métal	Peinture	HD	0,92	0,1	
113	D	Conduit n°2	Métal	Peinture	HD	0,42	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
114	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,55	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 18 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
115	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,15	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
116	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	0,45	0,1	
117	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	3,28	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	B	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture				
118	B	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
120	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	11,07	0,1	
119	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,83	0,1	
122	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
121	C	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	4,52	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
	D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	D	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
124	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,23	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Crémaillère		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches		Carrelage				
123	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	2,74	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 19 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
125	A	Murs Enduit+peinture		Papier peint	HD	0,16	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Murs		Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
126	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
127	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture				Idem P2
	B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P2
	C	Murs		Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
129	C	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
130	C	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
	C	Porte n°5 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P4
	C	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P4
128	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,18	0,1	
	D	Murs		Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	D	Porte n°6 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°7 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°7 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°8 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°8 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
131	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,85	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 20 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
132	A	Murs Enduit+peinture		Papier peint	HD	0,07	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Murs		Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
135	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
137	C	Fenêtre n°1 Volets	Métal	Peinture	HD	2,97	0,1	
136	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
138	C	Fenêtre n°2 Volets	Métal	Peinture	HD	6,71	0,1	
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1 ET 2
	C	Fenêtre n°3 Volets	Métal	Peinture				
	C	Murs		Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
133	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,39	0,1	
134	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0,34	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Murs		Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
142	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,85	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 21 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
139	A	Murs		Papier peint/Faïence	HD	0,16	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P2
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Murs		Papier peint/Faïence				
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs		Papier peint/Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				
140	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
141	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
	D	Murs		Papier peint/Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
	D	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
143	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,85	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 22 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
150	A	Murs		Papier peint	HD	0,16	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
144	A	Radiateur Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
145	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
146					C	0,02	0,1	
	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	B	Murs		Papier peint/Faïence				
	B	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Murs		Papier peint/Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs		Papier peint/Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
147	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
148	D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
149	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,85	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 23 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
151	A	Murs		Papier peint	HD	0,16	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Murs		Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
152	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
153					C	0,02	0,1	
	C	Murs		Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs		Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
154	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,85	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 24 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
159	A	Murs		Papier peint	HD	0,16	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
155	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
156	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				
	B	Murs		Papier peint/Faïence				
	B	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Radiateur Ouvrant intérieur	Métal	Peinture				
	C	Murs		Papier peint/Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs		Papier peint/Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
157	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
158	D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
160	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,85	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 25 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
162	A	Murs		Papier peint	HD	0,16	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
167	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
168	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
165	B	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	7,37	0,1	
163	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
164					C	0,38	0,1	
	B	Murs		Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
161	B	Radiateur Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Murs		Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs		Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
166	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,85	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 26 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
169	A	Murs		Papier peint	HD	0,16	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
170	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
171	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
	B	Murs		Papier peint				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs		Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
172	D	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	7,36	0,1	
173	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
174					C	0,38	0,1	
	D	Murs		Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
175	D	Radiateur Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
176	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,85	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 27 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
177	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,46	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
179	B	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
178	B	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
181	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
180	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
182	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
183	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
184	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
185					C	0,09	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
187	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Crémaillère		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches		Carrelage				
186	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	5,72	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PIECE 28 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
188	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,38	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
190	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,1	
193	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
194	D	Plinthes	Bois	Carrelage/Peinture	HD	0,05	0,1	
191	D	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
192	D	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
195	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 29 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
196	A	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre	HD	0,27	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
197	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
198	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
201	B	Plinthes	Bois	Carrelage/Peinture	HD	0,05	0,1	
	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	C	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
	C	Plinthes		Carrelage				
	C	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	C	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
199	D	Fenêtre n°1 Garde corps	Métal	Peinture	HD	0,92	0,1	
	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
200	D	Fenêtre n°2 Garde corps	Métal	Peinture	HD	0,58	0,1	
	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°3 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°4 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°5 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°6 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
	D	Plinthes		Carrelage				
206	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 30 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
203	A	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre	HD	0,32	0,1	
202	A	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
	B	Plinthes	Bois	Peinture				
	C	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
	C	Plinthes	Bois	Peinture				
205	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
204	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
	D	Plinthes	Bois	Peinture				
207	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 31 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
208	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	A	Plinthes	Bois	Peinture				
209	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
210	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
211	B	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes	Bois	Peinture				
	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes	Bois	Peinture				
	D	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	D	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	E	Murs	Enduit + peinture					
	F	Murs	Enduit + peinture					
212	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 32 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
213	A	Murs	Enduit + peinture	Faïence	HD	0,32	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
214	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
215	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
216	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 33 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
217	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
218	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
219	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Murs	Enduit + peinture					
	D	Murs	Enduit + peinture					
220	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 34 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Faïence/Toile de verre				
	A	Plinthes		Carrelage				
223	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
222	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence/Toile de verre				
	B	Plinthes		Carrelage				
224	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence/Toile de verre				
	C	Plinthes		Carrelage				
221	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence/Toile de verre	HD	0,54	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				
226	D	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
225	D	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	E	Murs	Enduit + peinture	Faïence/Toile de verre				
228	E	Porte n°4 Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	0,12	0,1	
227	E	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	F	Murs	Enduit + peinture	Faïence/Toile de verre				
	F	Porte n°5 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	F	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
229	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 35 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
232	A	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre	HD	0,59	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
231	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
230	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
	A	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	A	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	B	Fenêtre n°14 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°15 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°16 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°17 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°18 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°19 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°20 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°21 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°22 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°23 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°24 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
	C	Plinthes		Carrelage				
233	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
235	C	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
234	C	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
246	D	Fenêtre n°1 Garde corps	Métal	Peinture	HD	0,15	0,1	
	D	Fenêtre n°10 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°10 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Fenêtre n°11 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°11 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°12 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°12 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°13 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°13 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°2 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°3 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°4 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°5 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°6 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°7 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°8 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°8 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°9 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°9 Garde corps	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
	D	Plinthes		Carrelage				
236	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 36 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
237	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,66	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM PIECE 35
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM PIECE 35
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
239	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	8,99	0,1	
238	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	9,08	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°5 Garde corps	Métal	Peinture				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
240	D	Radiateur	Métal	Peinture	HD	12,51	0,1	
242	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,61	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Crémaillère		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches		Carrelage				
241	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	2,27	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 90 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
243	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1 PIECE 34
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1 PIECE 34
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
244	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,32	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Crémaillère	Béton	Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Béton	Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Béton	Carrelage				
245	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	2,27	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 37 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
247	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,54	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	B	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
250	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
249	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
251	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,23	0,1	
252	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
253					C	0,11	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
254	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,89	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Crémaillère		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches		Carrelage				
248	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Carrelage	HD	3,69	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 38 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
255	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,49	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
256	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,33	0,1	IDEM F1
257					C	0	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
275	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,89	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 39 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
264	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,11	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	C	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
	D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	D	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	E	Murs	Enduit + peinture					
	E	Plinthes		Carrelage				
	E	Porte n°5 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	E	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
279	F	Murs	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
	F	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	G	Murs	Enduit + peinture					
	G	Plinthes		Carrelage				
	G	Porte n°6 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
269	G	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
265	H	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
267	H	Fenêtre n°1 Volets	Métal	Peinture	HD	6,43	0,1	
266	H	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
268	H	Fenêtre n°2 Volets	Métal	Peinture	HD	5,42	0,1	
	H	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	H	Fenêtre n°3 Volets	Métal	Peinture				IDEM F1
	H	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	H	Fenêtre n°4 Volets	Métal	Peinture				IDEM F1
	H	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	H	Fenêtre n°5 Volets	Métal	Peinture				IDEM F1
	H	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	H	Fenêtre n°6 Volets	Métal	Peinture				IDEM F1
	H	Murs	Enduit + peinture					
	H	Plinthes		Carrelage				
	I	Murs	Enduit + peinture					
	I	Plinthes		Carrelage				
	J	Murs	Enduit + peinture					
	J	Plinthes		Carrelage				
276	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,89	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 40 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
258	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,06	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
263	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
262	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	B	Plinthes		Carrelage				
259	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
260					C	0,01	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
261	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,65	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
277	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,89	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 41 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
270	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
271	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
272	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
274	C	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	3,25	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
273	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
278	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,89	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 42 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
280	C	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
281	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
282	D	Fenêtre n°1 Volets	Métal	Peinture	HD	6,43	0,1	
	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Fenêtre n°2 Volets	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°3 Volets	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	D	Fenêtre n°4 Volets	Métal	Peinture				IDEM F1
	D	Murs	Enduit + peinture	Dalles/Moquettes				
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	F	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
283	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,89	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 43 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
284	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
285	B	Fenêtre n°1 Volets	Métal	Peinture	HD	6,43	0,1	
	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	B	Fenêtre n°2 Volets	Métal	Peinture				IDEM F1
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
286	D	Murs	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
287	E	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
288	E	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	F	Murs	Enduit + peinture					
	F	Plinthes		Carrelage				
289	F	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
290	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,89	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PIECE 44 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
291	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,19	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
295	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
292	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
293					C	0,12	0,1	
294	C	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	7,42	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafond				
	Sol	Plancher		Moquette				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 45 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
296	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,12	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
297	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
298	C	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	7,42	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafond				
	Sol	Plancher		Moquette				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 46 (R+2)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
299	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,12	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
300	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
301	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
302	C	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	7,42	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafond				
	Sol	Plancher		Moquette				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 47 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
303	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,12	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
304	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
305	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
306	C	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	7,42	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafond				
	Sol	Plancher		Moquette				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 48 (R+2)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
307	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,12	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
308	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
309	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
310	C	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	7,42	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafond				
	Sol	Plancher		Moquette				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 49 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
311	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,12	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
312	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
313	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
314	C	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	7,42	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafond				
	Sol	Plancher		Moquette				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 50 (R+2)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
315	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,12	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
316	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
317	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
318	C	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	7,42	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafond				
	Sol	Plancher		Moquette				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 51 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
319	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,12	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
320	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
322	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
321	C	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	7,42	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafond				
	Sol	Plancher		Moquette				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 52 (R+2)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Cloison plâtre	Papier peint				
	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
323	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Cloison plâtre	Papier peint				
	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
324	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
325	B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Porte n°4 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
326	B	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Porte n°5 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
	B	Porte n°5 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
327	B	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Murs	Cloison plâtre	Papier peint				
	C	Porte n°6 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
328	C	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Murs	Cloison plâtre	Papier peint				
	D	Porte n°10 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
329	D	Porte n°10 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Porte n°7 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
330	D	Porte n°7 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Porte n°8 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
331	D	Porte n°8 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Porte n°9 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
332	D	Porte n°9 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafond				
	Sol	Plancher		Dalles de sol				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 53 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Moquette				
336	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
335	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
333	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
334	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	B	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	B	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	B	Fenêtre n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	B	Fenêtre n°8 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	B	Murs	Enduit + peinture	Moquette				
	C	Murs	Enduit + peinture	Moquette				
	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Murs	Enduit + peinture	Moquette				
	D	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Dalles de faux-plafond				
	Sol	Plancher		Dalles de sol				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 54 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	A	Plinthes		Carrelage				
341	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
342	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	B	Plinthes		Carrelage				
339	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
340	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°8 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				
337	C	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
338	C	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture				IDEM P1
	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
343	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,53	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 55 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
344	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,44	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
346	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
345	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
348	B	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	7,42	0,1	
347	B	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	6,57	0,1	
350	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
351	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
353	D	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
352	D	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,38	0,1	
354	D	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,13	0,1	
355	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,53	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Crémaillère		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
349	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	4,18	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 56 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
356	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,53	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
357	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
358					C	0,09	0,1	
359	B	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	0,26	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
360	B	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture					
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 57 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
361	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,93	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	B	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
364	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
363	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
365	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,42	0,1	
366	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
367					C	0,07	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
368	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
362	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	3,27	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 58 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
371	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,13	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
369	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
370	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
372	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
373					C	0	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
374	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 59 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
375	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,77	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Non peint				Non peint
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
396	B	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
397	B	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°5 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°6 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°7 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte n°7 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
376	B	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	D	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°5 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°6 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°7 Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	D	Porte n°7 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
384	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 60 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
377	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Plinthes		Carrelage				
379	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
378	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
381	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
382	C	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	5,17	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
380	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,01	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
383	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 61 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
404	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,21	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
386	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
385	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	B	Plinthes		Carrelage				
388	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
389					C	0	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	C	Plinthes		Carrelage				
387	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
405	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 62 (R+3)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
391	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
390	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
398	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
399					C	0	0,1	
406	C	Fenêtre n°1 Volets	Métal	Peinture	HD	6,35	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°2 Volets	Métal	Peinture				IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
392	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
393	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
400	E	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
403	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local		**Néant**						

PIECE 63 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
401	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,07	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
394	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
395					C	0,06	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
402	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 64 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
412	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
407	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
408					C	0,22	0,1	
409	E	Fenêtre n°1 Volets	Métal		HD	6,35	0,1	
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	E	Fenêtre n°2 Volets	Métal					IDEM F1
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
410	E	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
	E	Radiateur n°2	Métal	Peinture				
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
411	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 65 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
413	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,08	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
414	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
415	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 66 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
416	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
417	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
421	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
418	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
419	E	Fenêtre n°1 Volets	Métal		HD	6,35	0,1	
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	E	Fenêtre n°2 Volets	Métal					IDEM F1
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
420	E	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
	E	Radiateur n°2	Métal	Peinture				
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
422	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 67 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
423	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,08	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
424	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
425	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 68 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
426	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
427	C	Fenêtre n°1 Volets	Métal		HD	6,45	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°2 Volets	Métal					IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
428	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture				
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
429	E	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
430	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 69 (R+3)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
431	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
432	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
433	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local		**Néant**						

PIECE 70 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
435	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
434	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
436	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
437	C	Fenêtre n°1 Volets	Métal		HD	6,45	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				
	C	Fenêtre n°2 Volets	Métal					
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
438	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture				
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
439	E	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
440	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PIECE 71 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
441	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
442	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
443	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 72 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
444	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
445	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
446	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
447	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
448	E	Fenêtre n°1 Volets	Métal		HD	6,45	0,1	
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	E	Fenêtre n°2 Volets	Métal					IDEM F1
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
449	E	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	E	Radiateur n°2	Métal	Peinture				
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
450	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 73 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
451	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
452	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
453	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 74 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
454	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
455	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
456	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
457	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
458	E	Fenêtre n°1 Volets	Métal		HD	6,45	0,1	
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	E	Fenêtre n°2 Volets	Métal					IDEM F1
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
459	E	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	E	Radiateur n°2	Métal	Peinture				
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
460	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 75 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
461	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
462	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
463	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 76 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
464	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
465	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
466	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
467	C	Fenêtre n°1 Volets	Métal		HD	6,45	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°2 Volets	Métal					IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
468	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
469	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	E	Plinthes		Carrelage				
470	E	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
471	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local		**Néant**						

PIECE 77 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
472	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
473	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
474	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local		**Néant**						

PIECE 78 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
475	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
476	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
477	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
478	C	Fenêtre n°1 Volets	Métal		HD	6,45	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°2 Volets	Métal					IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
479	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
480	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
481	E	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
482	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 79 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
483	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
484	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
485	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 80 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
486	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
487	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
488	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
489	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
490	E	Fenêtre n°1 Volets	Métal		HD	6,45	0,1	
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	E	Fenêtre n°2 Volets	Métal					IDEM F1
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
491	E	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
492	E	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
493	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 81 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
494	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
495	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
496	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 82 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
497	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
498	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
499	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
500	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
501	E	Fenêtre n°1 Volets	Métal		HD	6,45	0,1	
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	E	Fenêtre n°2 Volets	Métal					IDEM F1
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
502	E	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
503	E	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
504	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 83 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
505	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
506	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
507	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

PIECE 84 (R+3)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	A	Plinthes		Carrelage				
508	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
509	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	B	Plinthes		Carrelage				
510	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
511	C	Fenêtre n°1 Volets	Métal		HD	6,45	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°2 Volets	Métal					IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	C	Plinthes		Carrelage				
512	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
513	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	D	Plinthes		Carrelage				
	E	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	E	Plinthes		Carrelage				
514	E	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	F	Murs	Enduit + peinture	Papier peint				
	F	Plinthes		Carrelage				
515	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 85 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
516	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
517	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
518	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PIECE 86 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
523	A	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre	HD	0,46	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
527	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
519	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
520	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	1,49	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
	B	Plinthes		Carrelage				
521	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°8 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture	Toile de verre				
	D	Plinthes		Carrelage				
522	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 87 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
524	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,2	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
526	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
525	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
	B	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	B	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
528	B	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,67	0,1	
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				
529	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,75	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	D	Plinthes		Carrelage				
530	D	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,32	0,1	
532	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,32	0,1	
531	D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
	E	Murs	Enduit + peinture					
	E	Plinthes		Carrelage				
534	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	F	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	F	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	F	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	F	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	F	Fenêtre n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	F	Fenêtre n°8 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	F	Murs	Enduit + peinture	Faïence				
	F	Plinthes		Carrelage				
533	F	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
535	F	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
536	F	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
537	F	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
538	F	Porte n°5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
539	F	Porte n°6 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
540	F	Porte n°7 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
541	F	Porte n°7 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
542	F	Porte n°8 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
543	F	Porte n°8 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
544	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,43	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 88 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
545	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0,75	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Plinthes		Carrelage				
547	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
546	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					
	B	Plinthes		Carrelage				
549	B	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	10,8	0,1	
548	B	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	HD	6,52	0,1	
551	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture				IDEM F1
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
553	D	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
552	D	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
554	D	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,26	0,1	
555	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,53	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Crémaillère		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage				
	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches		Carrelage				
550	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	3,39	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

PIECE 89 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
556	A	Murs	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	A	Plinthes		Carrelage				
560	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
561	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
559	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
557	B	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	HD	0,2	0,1	
	B	Murs	Enduit + peinture					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Plinthes		Carrelage				
	C	Murs	Enduit + peinture					
	C	Plinthes		Carrelage				
558	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,23	0,1	
	D	Murs	Enduit + peinture					
	D	Plinthes		Carrelage				
	E	Murs	Enduit + peinture					
	E	Plinthes		Carrelage				
	F	Murs	Enduit + peinture					
	F	Plinthes		Carrelage				
562	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,53	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				


Commentaire sur le local	Néant

LEGENDE			
Localisation de la mesure	**HG :** en Haut à Gauche	**HC :** en Haut au Centre	**HD :** en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	**C :** au Centre	**MD :** au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	**BC :** en Bas au Centre	**BD :** en Bas à Droite

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite


ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	RECTORAT BATIMENT D rue DE L'ABBE DE L'EPEE 34000 MONTPELLIER
N° dossier :	34-28777017-MONTPELLIER-0005082538-RECTORAT-PB BAT D				
N° planche :	1/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	PLAN RDC

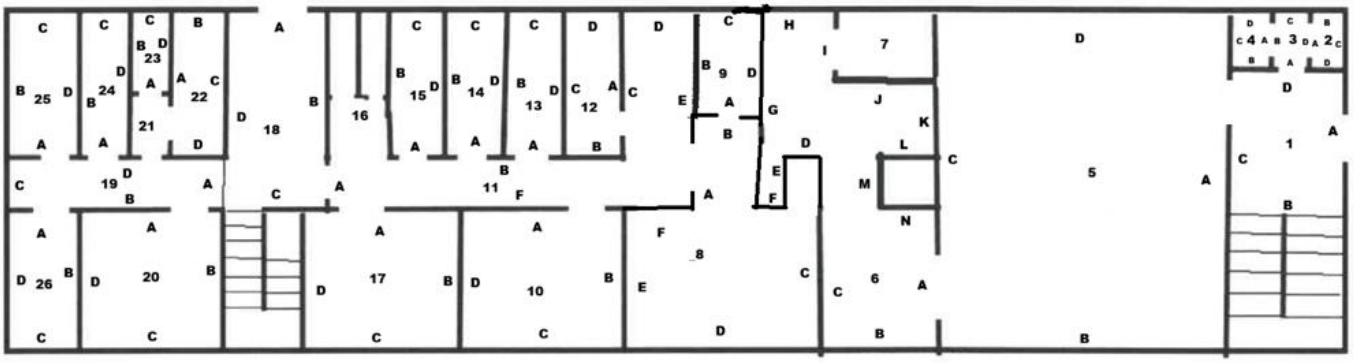


© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	34-28777017-MONTPELLIER-0005082538-RECTORAT-PB BAT D			Adresse de l'immeuble :	RECTORAT BATIMENT D rue DE L'ABBE DE L'EPEE 34000 MONTPELLIER
N° planche :	2/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	PLAN R+1

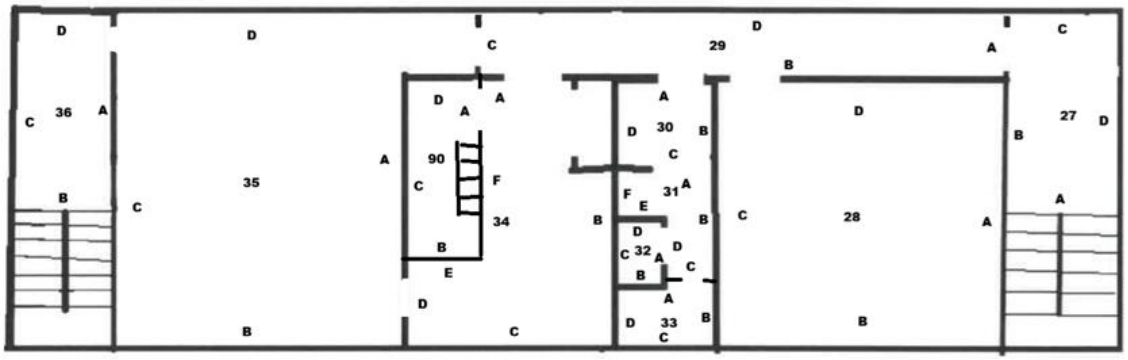


© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	34-28777017-MONTPELLIER-0005082538-RECTORAT-PB BAT D			Adresse de l'immeuble :	RECTORAT BATIMENT D rue DE L'ABBE DE L'EPEE 34000 MONTPELLIER
N° planche :	3/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	PLAN R+2

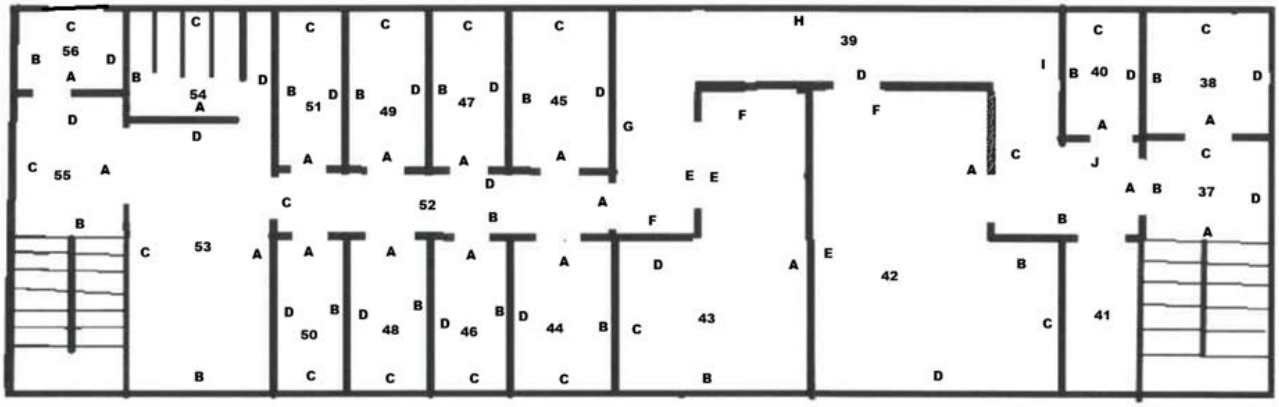

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	34-28777017-MONTPELLIER-0005082538-RECTORAT-PB BAT D			Adresse de l'immeuble :	RECTORAT BATIMENT D rue DE L'ABBE DE L'EPEE 34000 MONTPELLIER
N° planche :	4/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	PLAN R+3

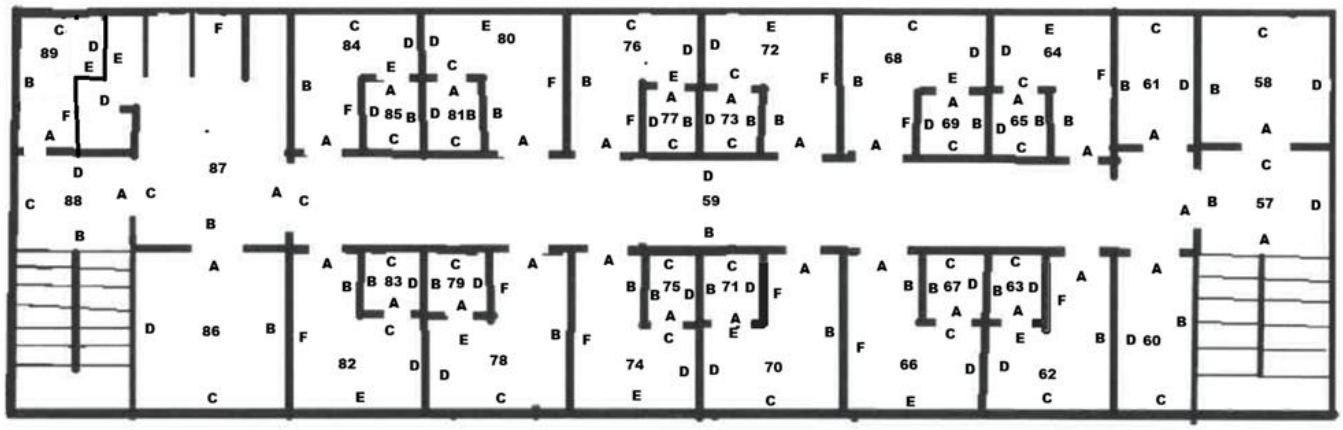

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Allianz

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE

Fondis Electronic

Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : BUREAU VERITAS	
Modèle de l'analyseur :	FEnX2
Numéro de série analyseur :	24-1120
Numéro de série de la source :	RTV-2449-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	19/06/2024
Date de fin de validité de la source :	19/06/2029

FONDIS ELECTRONIC SAS
26 av. Duguay-Trouin
F-78961 VOISINS LE BRETONNEUX CEDEX
Tél. : (0)1 34 521 030 - Fax : (0)1 30 573 325
SIREN 428 583 637 - RCS Versailles
TVA FR 15 428 583 637 - APE 4652Z

Groupe Physitek
Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex
Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite
