BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
DBE LRO
Immeuble l'Optimum
Zac Blaise Pascal
34000 MONTPELLIER

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28777017/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 16/07/2026

Référence au programme de travaux :
Mail du 20/10/2025 : "IMPORTANT POUR PROGRAMME DE TRAVAUX: BUREAU VERITAS _x0001_ mail du 24/10/2025
Mail le 24/10/2025 : "IMPORTANT POUR PROGRAMME DE TRAVAUX: BUREAU VERITAS"

DONNEUR D'ORDRE

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE

Alexandra LOF
17 Rue abbe de L Epee
34000 MONTPELLIER

SITE D'INTERVENTION

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee

17 Rue abbe de L Epee
34000 MONTPELLIER

BATIMENT 3

Latitude : 43.621500 / Longitude : 3.874100

Date(s) d'intervention(s) :
Du 12/11/2025 au 14/11/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Benjamin LACOME	Diagnostiqueur immobilier	Certification N° 9643074	Benjamin LACOME

Le présent rapport comporte 395 pages, dont 330 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 6
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre 13
2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre 13
2.4. Obligations réglementaires 14

3. INFORMATIONS GENERALES **15**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 15
3.2. Parties prenantes 15


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **15**
4.1. Références réglementaires 15

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **16**
5.1. Date(s) de visite(s) 16
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 16
5.3. Conditions spécifiques 16
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 16

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **17**
6.1. Matériaux et produits repérés 17
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 64

7. ANNEXES **66**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 66
7.2. Photos prélèvements 76
7.3. Photos sondages 123
7.4. Photos inaccessibilités 132
7.5. Photos observations 134
7.6. Attestation d'assurance 136
7.7. Certificat de compétence 138
7.8. Croquis de repérage 139
7.9. Rapport d'analyse du laboratoire 203

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

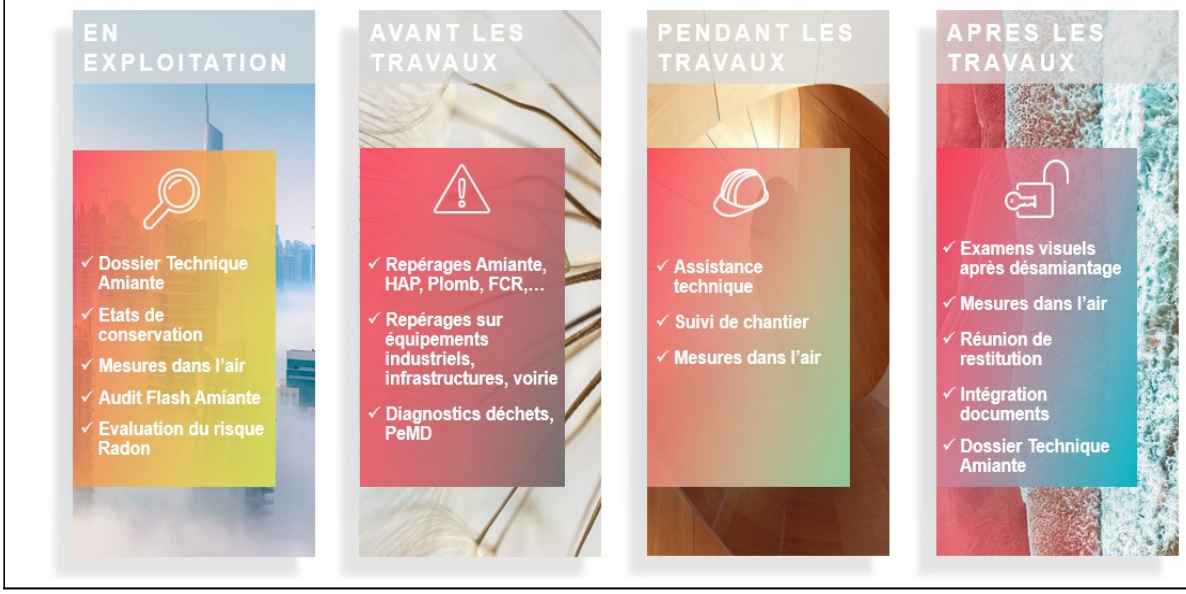

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
"Votre programme initial prévoit : oui (voir également document transmis) Interventions sur sols, murs, plafonds Rénovation installations électriques, sanitaires Travaux CVC Remplacement menuiseries Conservation de la façade (ITE sur batiment D) Éléments potentiels à confirmer : oui Réfection de la toiture (état général non précisé) Reprise des façades (fissures et état du bois à évaluer) Traitement des infiltrations possibles toiture"

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Conduits en toiture	Conduits de fumée, Conduits EP, Conduits EU
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles solins fibrociment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments de toiture, Faitages, Garnissages joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés sous toiture, Flocages sous toiture, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Plaques ondulées et planes	Plaques fibrociment, Plaques matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires couverture fibrociment, Accessoires couverture hors fibrociment, Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bardeaux bitumineux, Plaques fibrociment, Plaques matériaux bitumineux
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits de fumée, Conduits eaux pluviales, Conduits eaux usées
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels (façade)

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bacs fibrociment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis fenêtres fibrociment, Coffrages perdus, Colle, Colles carrelage, Colles faïence, Colles pâte de verre, Couvre-joints, Enduits pelliculaires façades, Enduits projetés/crépis façades, Garnissage joints dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints carrelage, Joints dilatation, Joints faïence, Joints pâte de verre, Maçonnerie silico-calcaire, Peintures façades, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits projetés charpente, Enduits projetés/talochés charpente, Flocages charpente, Joints charpentes, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures charpente, Peintures intumescentes charpente, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres
Suspentes et contrevents	Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.
Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'inaccessibilité concerne les locaux techniques au niveau du RDC de la Zone 2.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
141	BATIMENT A B C -> TOITURE ET COMBLES	Conduits en toiture	Conduits de fumée	Fibres-ciment	Gris
140	BATIMENT A B C -> TOITURE ET COMBLES	Toitures	Plaques fibrociment	Semi-dur	Gris
31	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR	Façades lourdes y compris poteaux	Coffrages perdus	Fibres-ciment	Gris
11	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 118	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/
11	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES				
144	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 028				
11	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 232				
11	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 224				
11	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 226				
11	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 229				
11	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 237				
31	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	Pailleté	Gris
145	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 1	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Blanc
145	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> CIRCULATION 1				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
33	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 107	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Beige, Bleu
11	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 118	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc
11	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES				
82	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 015	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc
137	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Semi-dur	Blanc
144	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 028	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc
11	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 232				
11	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 224				
11	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 226				
11	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 229				
96	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> SDB	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Jaune
11	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 237	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc
124	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 260	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc
51	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 118	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
51	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 119	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir
51	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 121				
51	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 122				
48	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige
56	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3				
2	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir
2	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 133				
5	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris
5	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 1				
2	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir
13	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 141				
13	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 144				
2	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135				
2	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 138				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
10	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Blanc
10	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES				
2	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 019	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir
2	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 08				
132	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 07	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	/
138	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Semi-dur	Noir
132	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 01	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	/
2	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL DEGAGEMENT 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir
94	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 209	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Rouge
2	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 220	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir
2	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 227				
2	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 238				
2	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1				
88	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
2	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir
33	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 107	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/
82	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 015				
96	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> SDB				
56	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/
2	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris
2	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 133				
5	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/
5	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 1				
2	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris
13	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 141				
13	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 144				
2	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135				
2	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 138				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
10	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/
10	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES				
2	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 019	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris
2	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 08				
2	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL DEGAGEMENT 3				
2	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 220				
2	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 227				
2	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 238				
2	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1				
88	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/
2	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris
57	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Beige
57	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> ESCALIER 3				
57	BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	Gris
57	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> ESCALIER 3				
112	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 022	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/
112	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL DEGAGEMENT 3				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
105	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 267	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Beige, Gris
105	BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 338				
112	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 022	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	/
112	BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL DEGAGEMENT 3				
91	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 227	Portes de placard	Plaques antivibratiles placards	Souple	Noir
91	BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 233				

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
BATIMENT A B C (IA 10)	2- Parois verticales extérieures et façades - Joints compribandes inaccessibles	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 2 - RDC -> LOCAL 025 (MA 14)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee
17 Rue abbe de L Epee
34000 MONTPELLIER

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee	Enseignement supérieur / Recherche	IGH et ERP de la 1ère et la 2ème catégorie	01/01/1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Alexandra LOF	Donneur d'ordre	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE	17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	0467914881
Alexandra LOF	Gestionnaire	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE	31, rue de l'université 34000 MONTPELLIER	alexandra.lof@region-academique-occitanie.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 12/11/2025 au 14/11/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Mail du 20/10/2025 : "IMPORTANT POUR PROGRAMME DE TRAVAUX: BUREAU VERITAS mail du 24/10/2025	Alexandra LOF	24/10/2025	Mail le 24/10/2025 : "IMPORTANT POUR PROGRAMME DE TRAVAUX: BUREAU VERITAS"	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 102	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	/	34	P69* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 104	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	/	34	P68 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Blanc	4	P67* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 105	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Fibreux	Blanc	35	P70* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 107	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Beige, Bleu	33	P65* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	33	P65* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Beige, Bleu	33	P66 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	33	P66 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Bleu	32	P63* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	32	P63* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	32	P63* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Bleu	32	P64 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	32	P64 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	32	P64 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 109	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Fibreux	Blanc	35	P71 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 110	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	/	34	P72 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Granuleux	Bleu	36	P73* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Granuleux	Bleu	36	P74 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 111	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	37	P75* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	37	P75* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	37	P75* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	37	P76 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	37	P76 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	37	P76 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 111	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Jaune	38	P77* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	/	Gris	38	P77* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Beige	39	P78* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	39	P78* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Beige	39	P79 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	39	P79 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 1	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Granuleux	Beige	67	P138* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Bleu	65	P133* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	65	P133* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	65	P133* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 1	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Bleu	65	P134 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	65	P134 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	65	P134 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Lissé	Beige	68	P139* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Lissé	Beige	68	P140 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 113	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	Beige	66	P135* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 115	Revêtements de sol	Moquettes	Fibreux	Gris	44	P89* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Mortier	/	44	P89* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	45	P90* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	/	45	P90* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 116	Revêtements de sol	Moquettes	Fibreux	Gris	44	P91 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Mortier	/	44	P91 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	45	P92 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	/	45	P92 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin	Blanc	47	P95* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 117	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Lissé, Plâtre	Blanc	50	P101* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 118	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	1	/	S2	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	/	Gris	1	/	S2	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	11	P103* P	/	AN	/	***Oui***
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/	11	P103* P	/	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 118	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	51	P104* P	/	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 119	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	51	P105 P	/	AN	/	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Lissé, Plâtre	Blanc	50	P102 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 120	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	53	/	S3	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	53	/	S3	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Rouge	53	/	S3	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Bleu	52	P106* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	52	P106* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Rose	52	P106* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Bleu	52	P107 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 120	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	52	P107 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Rose	52	P107 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	55	P110* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	55	P111 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 121	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	51	/	S4	AN	/	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin	Blanc	47	/	S5	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Blanc	4	/	S6	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	53	P108* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	53	P108* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Rouge	53	P108* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 121	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	53	P109 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	53	P109 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Rouge	53	P109 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 122	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	51	/	S7	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2	Faux plafonds	Plaques	Compact	Blanc	139	P302* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige	48	P97* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige	48	P98 P	/	AN	/	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	49	P99* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	49	P100 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 3	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Jaune	38	P85 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 3	Revêtements de sol	Joints carrelage	/	Gris	38	P85 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3	Revêtements de sol	Ragréages	Fin	Bleu	46	P93* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Fin	Bleu	46	P94 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige	56	P112* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	56	P112* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige	56	P113 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	56	P113 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Beige	57	P114* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	Gris	57	P114* P	/	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> DÉGAGEMENT 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin	Blanc	47	P96 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	P116* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	P116* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	/	58	P117* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	/	58	P118 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Blanc	59	P119* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Blanc	59	P120 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur	Blanc	60	P121* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Lissé, Plâtre	Blanc	50	P122 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Jaune	42	P84* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	/	Gris	42	P84* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Jaune	42	P88 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	/	Gris	42	P88 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Bleu	41	P82* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	/	41	P82* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Bleu	41	P83 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	/	41	P83 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	43	P86* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	43	P86* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	43	P87 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	43	P87 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Beige	40	P80* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Beige	40	P81 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	119	/	S22	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Rose	121	P270* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Bleu	121	P270* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Rose	121	P271 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Bleu	121	P271 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	120	P268* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 134	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	119	/	S20	AN	/	Non
	Plafonds	Plots de colle plafonds	Compact	Blanc	118	/	S21	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 134	Faux plafonds	Plaques	Polystyrène	/	118	/	S21	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	9	P16* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	9	P16* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Rose	9	P16* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	Fibreux	/	62	P126* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin	Blanc	62	P126* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 133	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	P12 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	P12 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	9	P13 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	9	P13 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 133	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Rose	9	P13 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	Fibreux	/	62	P127 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin	Blanc	62	P127 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Dur	Beige	114	P253* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Blanc	4	P14 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 132	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	9	/	S19	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	9	/	S19	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Rose	9	/	S19	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 131	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	9	/	S18	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	9	/	S18	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 131	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Rose	9	/	S18	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	119	/	S17	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	120	P269 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 130	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	119	P267* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	Plafonds	Plots de colle plafonds	Compact	Blanc	118	P266* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Polystyrène	/	118	P266* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris	5	P6* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	5	P6* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	1	P7* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	/	Gris	1	P7* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	7	P10* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	Gris	7	P10* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	7	P11 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	Gris	7	P11 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Blanc	6	P8* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	6	P8* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Blanc	6	P9 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	6	P9 N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits projetés/talochés poteaux	Plâtre	Beige	61	P123* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur	/	64	P131* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Blanc	4	P5 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 128	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Blanc	63	P128* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Blanc	63	P129 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur	/	64	P130 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 1	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	1	/	S1	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	/	Gris	1	/	S1	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris	5	P17 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	5	P17 P	/	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 2	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	117	P264* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	8	P15* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 2	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	Gris	8	P15* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	8	P18 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	Gris	8	P18 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur	Blanc	60	P125 N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits projetés/talochés poteaux	Plâtre	Beige	61	P132 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES	Faux plafonds	Plaques	Fibres-ciment	Blanc	129	P285* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	3	P3* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/	3	P3* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	3	P4 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/	3	P4 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	P2 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	P2 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	1	P1 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	/	Gris	1	P1 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur	Blanc	60	P124 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 146	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	24	P48* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	24	P49 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Bleu	23	P46* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	23	P46* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Bleu	23	P47 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 146	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	23	P47 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	117	/	S36	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	119	/	S37	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Rouge	16	P31* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Rouge	16	P32 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Semi-dur	Blanc	17	P33* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Semi-dur	Blanc	17	P34 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	19	P37* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	19	P38 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Rouge	18	P35* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Rouge	18	P36 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Jaune	20	P40* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Jaune	20	P41 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Jaune	21	P42* N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Jaune	21	P43 N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits projetés/talochés poteaux	Dur	Rouge	22	P44* N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits projetés/talochés poteaux	Dur	Rouge	22	P45 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Compact	Jaune	28	P55* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Compact	Jaune	28	P56 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Dur	Beige	114	P250 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Blanc	4	P39 N	/	AN	/	Non
	Eviers métalliques	Plaques antivibratiles éviers	Souple	Noir	25	P50* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PORCHE 2	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Compact	Beige	115	P251* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Compact	Beige	115	P252 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 140	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Marron	15	P29* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 141	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	13	P25* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	13	P25* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	14	P27* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	Beige	14	P27* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	14	P28 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 141	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	Beige	14	P28 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Marron	15	P30 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 142	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Blanc	12	P24* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	12	P24* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 144	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Blanc	12	P23 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	12	P23 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	13 (i)	P26 N	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	13 (i)	P26 N	/	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	123	P274* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	122	P272* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	122	P273 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	/	S26	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	/	S26	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 138	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	/	S24	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	/	S24	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	120	/	S25	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Fibreux	Rouge	73	/	S23	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Orange	73	/	S23	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Blanc	10	P20* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	10	P20* P	/	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Blanc	10	P19 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	10	P19 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	11	P21 P	/	AN	/	*Oui*
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/	11	P21 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	11	P22 P	/	AN	/	*Oui*
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/	11	P22 P	/	AN	/	*Oui*
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 1	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	117	P265 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Compact	Blanc	30	P61* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Compact	Blanc	30	P62 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	Pailleté	Gris	31	P59* P	/	AN	/	*Oui*

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR	Façades lourdes y compris poteaux	Coffrages perdus	Fibres-ciment	Gris	31	P59* P	/	AN	/	***Oui***
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	Pailleté	Gris	31	P259 P	/	AN	/	***Oui***
	Façades lourdes y compris poteaux	Coffrages perdus	Fibres-ciment	Gris	31	P259 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Rouge	26	P51* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Rouge	26	P52 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Semi-dur	Blanc	27	P53* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Semi-dur	Blanc	27	P54 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Compact	Gris	29	P57* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Compact	Gris	29	P58 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	Pailleté	Gris	31 (i)	P60 N	/	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR	Façades lourdes y compris poteaux	Coffrages perdus	Fibres-ciment	Gris	31 (i)	P60 N	/	AN	/	*Oui*
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	Pailleté	Gris	31	/	S54	AN	/	*Oui*
	Façades lourdes y compris poteaux	Coffrages perdus	Fibres-ciment	Gris	31	/	S54	AN	/	*Oui*
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> ESCALIER 1	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Granuleux	Beige	67	P137 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	Beige	66	P136 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 016	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Beige	80	P176* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Rouge	80	P176* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 019	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	/	S9	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	/	S9	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Beige	80	P175 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Rouge	80	P175 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 014	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Clair, Gris	78	P168* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 014	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	Blanc	78	P168* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 015	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	82	P171* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	82	P171* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	82	P172 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	82	P172 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Beige	81	P173* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	Foncé, Gris	81	P173* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Beige	81	P174 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	Foncé, Gris	81	P174 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 012	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Clair, Gris	78	P167 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	Blanc	78	P167 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Bleu, Clair	79	P169* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	Blanc	79	P169* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 012	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Bleu, Clair	79	P170 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	Blanc	79	P170 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 010	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Marron	74	P162* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	74	P162* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Gris	75	P161* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	75	P161* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés cloisons	Plâtre	Blanc	76	P163* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Blanc	77	P164* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 08	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	/	S52	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	/	S52	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	Fibreux	/	62	P158 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin	Blanc	62	P158 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 07	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	/	132	P288* P	/	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 07	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	131	P286* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	131	P287 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 03	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés cloisons	Plâtre	Blanc	76	/	S44	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	117	/	S45	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Rouge	134	P292* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Rouge	134	P293 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	135	P294* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	/	135	P294* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	135	P295 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	/	135	P295 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Bleu	133	P290* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Bleu	133	P291 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Semi-dur	Blanc	137	P298* P	/	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Semi-dur	Blanc	137	P299 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Semi-dur	Noir	138	P300* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Semi-dur	Noir	138	P301 P	/	AN	/	*Oui*
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 01	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	/	132 (i)	P289 N	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	136	P296* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	136	P297 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL O21	Revêtements de sol	Moquettes	Fibreux	Rouge	73	P151* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Orange	73	P151* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Fibreux	Rouge	73	P152 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Orange	73	P152 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur	/	64	P154 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Rouge	113	P248* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Rouge	113	P249 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 022	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	/	112	P247* P	/	AN	/	*Oui*
	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	112	P247* P	/	AN	/	*Oui*
	Poteaux	Enduits projetés/talochés poteaux	Plâtre	Beige	61	P150 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 024	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Lissé, Plâtre	Blanc	50	P155 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> ESCALIER 3	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	69	P143* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	69	P143* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 028	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	144	P156* P	/	AN	ZPSO IDEM Z11	*Oui*
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/	144	P156* P	/	AN	ZPSO IDEM Z11	*Oui*
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> COURS 1	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Dur	Beige	114	P255 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> CIRCULATION 1	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Marron	74	P159 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	74	P159 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Gris	75	P160 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	75	P160 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> CIRCULATION 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Blanc	77	P165 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés cloisons	Plâtre	Blanc	76	P166 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL DEGAGEMENT 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	P157 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	P157 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	69	P142 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	69	P142 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	1	P153 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	/	Gris	1	P153 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	/	112 (i)	P246 N	/	AN	/	***Oui***
	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	112 (i)	P246 N	/	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 2 - RDC -> LOCAL 033	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	/	70	P145* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	72	P148* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	72	P149 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 2 - RDC -> LOCAL 033	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Dur	Beige	114	P263 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Blanc	4	P144 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 2 - RDC -> COURS 6	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Dur	Beige	114	P254 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 209	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Rouge	94	P202* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Rouge	94	P203 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Rouge	93	P204* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	93	P204* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Rouge	93	P205 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	93	P205 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	95	P206* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	95	P206* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	95	P207 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	95	P207 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Compact	Blanc	97	P257* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Compact	Blanc	97	P256 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 211	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	100	P218* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 212	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	100	P217 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	95	P262 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	95	P262 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 215	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	99	P215* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	99	P216 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 220	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	P214 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	P214 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	98	P212* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	98	P213 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> ESCALIER 3	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Beige	57 (i)	P115 N	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	Gris	57 (i)	P115 N	/	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 232	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	11	/	S55	AN	/	*Oui*
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/	11	/	S55	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	90	P197* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	90	P197* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	90	P197* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 224	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	11	/	S56	AN	/	*Oui*
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/	11	/	S56	AN	/	*Oui*
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 226	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	11	/	S57	AN	/	*Oui*
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/	11	/	S57	AN	/	*Oui*
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 227	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	/	S49	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	/	S49	AN	/	*Oui*
	Portes de placard	Plaques antivibratiles placards	Souple	Noir	91	/	S14	AN	/	*Oui*
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 229	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	11	/	S58	AN	/	*Oui*
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/	11	/	S58	AN	/	*Oui*
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 230	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Mou	Marron	92	P199* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 230	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Mou	Marron	92	P200 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Plâtre	Blanc	101	P220* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Plâtre	Blanc	101	P221 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Lissé, Plâtre	Blanc	50	P198 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> SDB	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Jaune	96	P209* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	96	P209* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Jaune	96	P258 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	96	P258 P	/	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 233	Portes de placard	Plaques antivibratiles placards	Souple	Noir	91	P201* P	/	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 234	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	125	P278* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	90	P195 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	90	P195 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	90	P195 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	90	P196 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	90	P196 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 234	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	90	P196 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 236	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	126	P279* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 237	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	11	/	S12	AN	/	***Oui***
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	/	11	/	S12	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 238	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	/	S42	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	/	S42	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 242	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	55	/	S38	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	123	/	S29	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 245	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	55	/	S39	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	/	S40	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	/	S40	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	1	/	S10	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	/	Gris	1	/	S10	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	1	/	S11	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	/	Gris	1	/	S11	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	119	/	S30	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige	88	P187* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	88	P187* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige	88	P188 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	88	P188 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	55	P191 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2 (i)	P192 N	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2 (i)	P192 N	/	AN	/	*Oui*
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 252	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Beige	80	P194 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Rouge	80	P194 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 253	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	Fibreux	/	62	P193 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin	Blanc	62	P193 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	/	S41	AN	/	*Oui*

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	2	/	S41	AN	/	*Oui*
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 254	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Gris	89	P189* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	89	P189* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Gris	89	P190 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	89	P190 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Semi-dur	Gris	87	P185* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	87	P185* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Semi-dur	Gris	87	P186 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	87	P186 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 256	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	117	P277 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Rose	121	/	S28	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Bleu	121	/	S28	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 260	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	124	P275* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	124	P276 P	/	AN	/	*Oui*

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 262	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Mou	Rouge	104	P230* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Mou	Rouge	104	P231 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 263	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	102	P229* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	102	P229* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 267	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Beige, Gris	105	P228* P	/	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 277	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Lissé, Plâtre	Blanc	50	P226 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 284	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	102	P222 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	102	P222 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 1	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Blanc	145 (i)	P282* N	/	AN	/	***Oui***
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> CIRCULATION 1	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Blanc	145	P223 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Rouge	85	P224* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	85	P224* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	103	P225* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	103	P225* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	103	P225* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> CIRCULATION 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Marron	84	P227* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	84	P227* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	128	P283* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Rouge	85	P181 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	85	P181 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Rouge	85	P182 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	85	P182 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	83	P177* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	83	P177* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	83	P178 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	83	P178 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Marron	84	P179 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	84	P179 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Marron	84	P180 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	84	P180 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Gris	86	P183* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	86	P183* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Gris	86	P184 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	86	P184 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 330	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Rose	109	P240* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	109	P240* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Rose	109	P241 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	109	P241 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 333	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige	111	P243* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 334	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Rouge	110	P245* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 336	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	117	/	S32	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	123	/	S33	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 336	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	108	P237* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	108	P237* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	108	P238 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	108	P238 N	/	AN	/	Non
	Eviers métalliques	Plaques antivibratiles éviers	Semi-dur	Noir	107	P236* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> ESCALIER 1	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	128	P284 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Rouge	85	/	S16	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	85	/	S16	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	119	/	S31	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 337	Faux plafonds	Plaques	Compact	/	127	P281* N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 338	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Beige, Gris	105	/	S15	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	102	P235 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	102	P235 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 318	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Bleu	106	P232* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 318	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	106	P232* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Bleu	106	P233 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	106	P233 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 320	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	102	/	S35	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	102	/	S35	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> ESCALIER 2	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	117	P280 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Rouge	110	P244 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige	111	P242 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> CIRCULATION 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Marron	84	P234 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	84	P234 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Compact	/	116	P260* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Compact	/	116	P261 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> CIRCULATION 2	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	117	/	S34	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	103	P239 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> CIRCULATION 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	103	P239 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	103	P239 N	/	AN	/	Non
BATIMENT A B C -> TOITURE ET COMBLES	Toitures	Plaques fibrociment	Semi-dur	Gris	140	P303* P	/	AN	/	***Oui***
	Conduits en toiture	Conduits de fumée	Fibres-ciment	Gris	141	P304* P	/	AN	/	***Oui***
	Conduits en toiture	Conduits de fumée	Fibres-ciment	Gris	141	/	S51	AN	/	***Oui***
	Conduits en toiture	Conduits de fumée	Fibres-ciment	Gris	141	/	S53	AN	/	***Oui***
	Toitures	Plaques fibrociment	Semi-dur	Gris	140	/	S50	AN	/	***Oui***

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
140	Toitures	Plaques fibrociment	620 m²
2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	500 ml
2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	500 ml
5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	110 ml
5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	110 ml
10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	30 ml
10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	30 ml
11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	50 m²
11	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	50 m²
13	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	50 ml
13	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	50 ml
31	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	4 U
31	Façades lourdes y compris poteaux	Coffrages perdus	4 U
33	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	10 m²
33	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	10 m²
48	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	10 ml
51	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	40 ml
56	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	30 ml
56	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	30 ml

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
82	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	4 m²
82	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	4 m²
88	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	10 ml
88	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	10 ml
94	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	10 ml
96	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	6 m²
96	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	6 m²
124	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	15 m²
132	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	60 ml
137	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	4 m²
138	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	20 ml
144	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	5 m²
144	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	5 m²
91	Portes de placard	Plaques antivibratiles placards	2 U
105	Conduits	Conduits	1 U
112	Conduits	Enveloppes de calorifuges	10 ml
112	Conduits	Calorifugeages	10 ml
141	Conduits en toiture	Conduits de fumée	3 U
145	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	2 U
57	Revêtements de sol	Colles carrelage	50 m²
57	Revêtements de sol	Joints carrelage	50 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT A B C	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 100	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 101	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 102	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 103	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 104	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 105	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 107	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 109	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 110	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 111	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 1	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 1	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 113	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 114	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 115	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 116	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 117	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 118	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 119	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 120	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 121	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 122	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 2	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 3	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> DÉGAGEMENT 1	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 123	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 124	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 125	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 126	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 4	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> DÉGAGEMENT 2	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 134	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 133	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 132	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 131	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 130	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 128	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 1	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 2	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 3	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 146	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 1	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PORCHE 2	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 140	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 141	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 142	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 143	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 144	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 138	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 1	/
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR	/
BATIMENT A B C -> RDC	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL DEGAGEMENTT	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> ESCALIER 1	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 017	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 016	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 018	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 019	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 014	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 015	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 013	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 012	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 09	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 011	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 010	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 08	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 07	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 03	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 02	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> ESCALIER 2	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 020	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 005	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 006	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 01	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> ESCALIER 2	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL O21	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 022	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 023	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL DEGAGEMENT 2	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 024	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> ESCALIER 3	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 028	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 025	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> COURS 1	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> COURS 5	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> CIRCULATION 1	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL DEGAGEMENT 3	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 004	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 003	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 2 - RDC	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 2 - RDC -> LOCAL 028	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 2 - RDC -> LOCAL 033	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 2 - RDC -> COURS 6	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 2 - RDC -> PORCHE 1	/
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 2 - RDC -> ESCALIER 1	/
BATIMENT A B C -> R+1	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 204	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 203	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 202	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 201	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 200	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 207	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 205	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 206	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 209	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> ESCALIER 1	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 1	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 2	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> ESCALIER 2	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 210	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 211	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 212	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 213	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 214	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 215	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 216	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 217	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 218	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 219	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 220	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 221	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> ESCALIER 3	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 232	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 222	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 223	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 224	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 225	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 226	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 227	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 228	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 229	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 231	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 230	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 232	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> ESCALIER 3	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 3	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 4	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> SDB	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 233	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 234	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 235	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 236	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 237	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 238	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 239	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 240	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 241	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 242	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 243	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 244	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 245	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 247	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 248	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 249	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 250	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 251	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 252	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 253	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 245 (1)	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 2	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 3	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 254	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 255	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 256	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 257	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 258	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 259	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 260	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 261	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 262	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 263	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 264	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 265	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 266	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 267	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 268	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 269	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 270	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 271	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 272	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 273	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 274	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 275	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 276	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 277	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 278	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 279	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 280	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 281	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 282	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 283	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 284	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 1	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> CIRCULATION 1	/
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	/
BATIMENT A B C -> R+2	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 330	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 331	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 332	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 333	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 334	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 335	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 336	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> ESCALIER 1	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 337	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 338	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 310	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 311	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 309	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 313	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 312	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 314	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 315	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 316	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 317	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 318	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 319	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 320	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> ESCALIER 2	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> ESCALIER 3	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> CIRCULATION 1	/
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> CIRCULATION 2	/
BATIMENT A B C -> TOITURE ET COMBLES	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 3	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

P2	ZPSO 2
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P3	ZPSO 3
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P4	ZPSO 3
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P5	ZPSO 4
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P6	ZPSO 5
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P7	ZPSO 1
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P8	ZPSO 6
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P9	ZPSO 6
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	




Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P10	ZPSO 7
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P11	ZPSO 7
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	

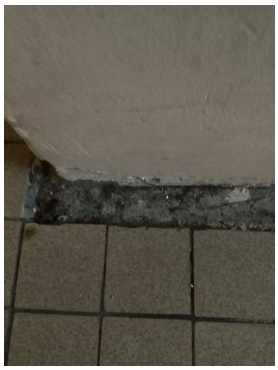

Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P12	ZPSO 2
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 133	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P13	ZPSO 9

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 133



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P14	ZPSO 4

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 133



Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage

P15	ZPSO 8

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 2



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P16	ZPSO 9

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 134



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P17	ZPSO 5

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 1



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P18	ZPSO 8

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 2



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P19	ZPSO 10


BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P20	ZPSO 10


BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2

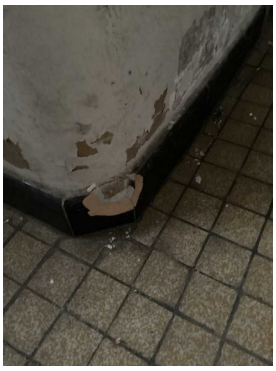

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P21	ZPSO 11

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES

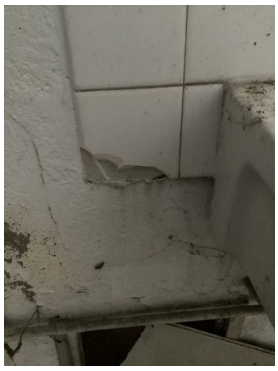

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P22	ZPSO 11

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P23	ZPSO 12

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 144



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P24	ZPSO 12

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 142



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

Copyright BUREAU VERITAS

P25	ZPSO 13

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 141



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P26	ZPSO 13

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 144



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P27	ZPSO 14

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 141



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P28	ZPSO 14

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 141



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P29	ZPSO 15

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 140



Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage

P30	ZPSO 15

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 141




Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage

P31	ZPSO 16
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P32	ZPSO 16
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P33	ZPSO 17
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P34	ZPSO 17
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

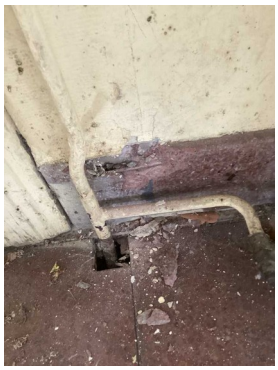P35	ZPSO 18
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P36	ZPSO 18
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P37	ZPSO 19
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P38	ZPSO 19
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P39	ZPSO 4
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P40	ZPSO 20
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P41	ZPSO 20
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P42	ZPSO 21
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés/talochés gaines	

P43	ZPSO 21
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés/talochés gaines	

P44	ZPSO 22
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Poteaux -> Enduits projetés/talochés poteaux	

P45	ZPSO 22
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Poteaux -> Enduits projetés/talochés poteaux	

P46	ZPSO 23
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 146	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses	

P47	ZPSO 23
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 146	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses	

P48	ZPSO 24
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 146	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	

P49	ZPSO 24
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 146	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	

P50	ZPSO 25
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Eviers métalliques -> Plaques antivibratiles éviers	

P51	ZPSO 26
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	


P52	ZPSO 26
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P53	ZPSO 27
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P54	ZPSO 27
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P55	ZPSO 28

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145

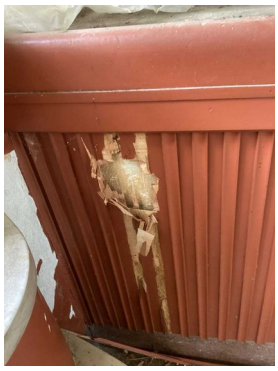

Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P56	ZPSO 28

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P57	ZPSO 29

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P58	ZPSO 29

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P59	ZPSO 31

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR



Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures façades | Coffrages perdus

P60	ZPSO 31

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR



Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures façades | Coffrages perdus

P61	ZPSO 30

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR



Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds

P62	ZPSO 30

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR



Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds

P63	ZPSO 32

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 107



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P64	ZPSO 32

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 107



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P65	ZPSO 33

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 107



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence


P66	ZPSO 33

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 107



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P67	ZPSO 4
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 104	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

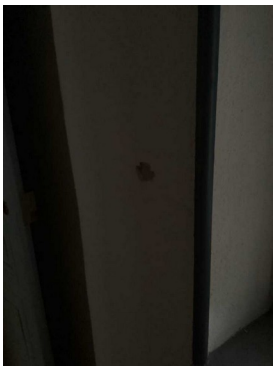
P68	ZPSO 34
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 104	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	


P69	ZPSO 34
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 102	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P70	ZPSO 35
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 105	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P71	ZPSO 35
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 109	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P72	ZPSO 34
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 110	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

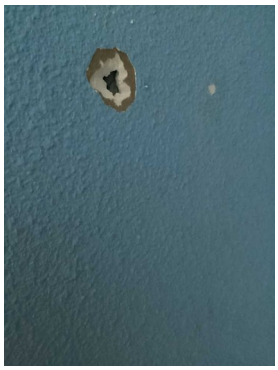P73	ZPSO 36
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 110	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

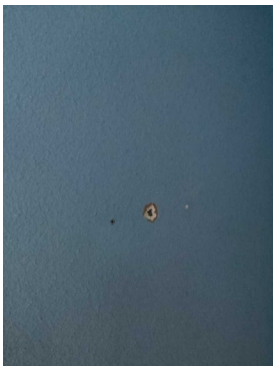P74	ZPSO 36
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 110	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

P75	ZPSO 37
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 111	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages	

P76	ZPSO 37
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 111	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages	

P78	ZPSO 39
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 111	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P79	ZPSO 39
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 111	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P80	ZPSO 40
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	



Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

P81	ZPSO 40
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	



Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

P82	ZPSO 41
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	




Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P83	ZPSO 41
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P84	ZPSO 42
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	

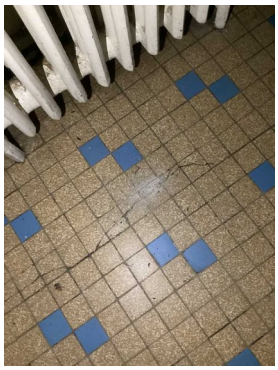

Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P85	ZPSO 38
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 3	




Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

Copyright BUREAU VERITAS

P86	ZPSO 43
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P87	ZPSO 43
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

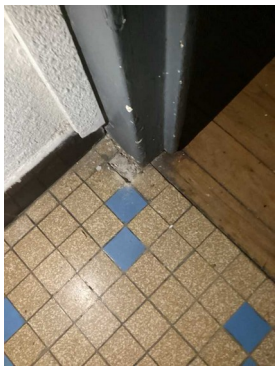P88	ZPSO 42
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CUISINE	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

P89	ZPSO 44
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 115	
	
Revêtements de sol -> Moquettes | Colles non bitumineuses	

P90	ZPSO 45
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 115	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles bitumineuses	


P91	ZPSO 44
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 116	
	
Revêtements de sol -> Moquettes | Colles non bitumineuses	

P92	ZPSO 45
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 116	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles bitumineuses	

P93	ZPSO 46
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P94	ZPSO 46
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P95	ZPSO 47
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 116	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

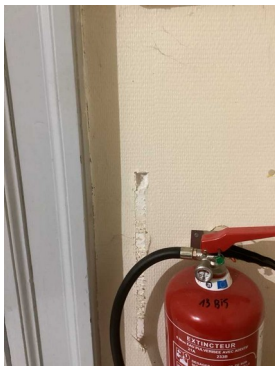P96	ZPSO 47
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> DÉGAGEMENT 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P97	ZPSO 48
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P98	ZPSO 48

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P99	ZPSO 49

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P100	ZPSO 49


BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P101	ZPSO 50

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 117



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P102	ZPSO 50


BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 119



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P103	ZPSO 11

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 118

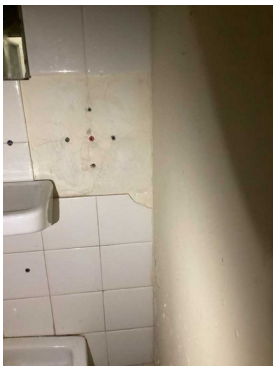

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P104	ZPSO 51


BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 118



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P105	ZPSO 51

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 119

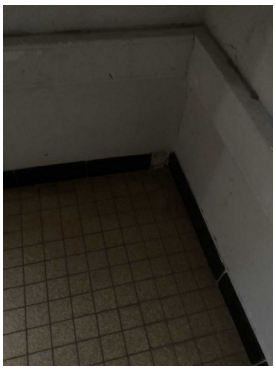

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P106	ZPSO 52

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 120



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P107	ZPSO 52

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 120



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P108	ZPSO 53


BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 121



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages


P109	ZPSO 53

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 121

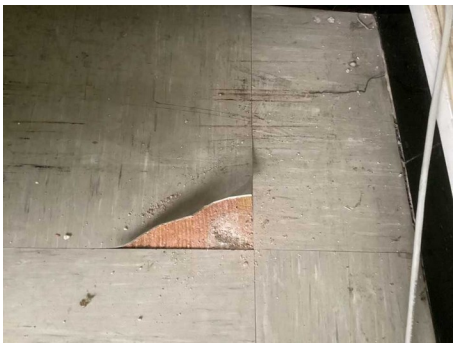

Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P110	ZPSO 55
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 120	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

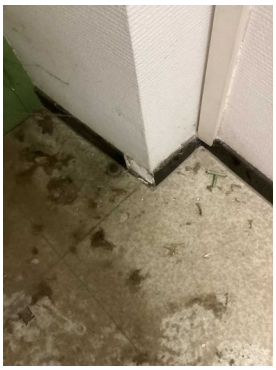P111	ZPSO 55
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 120	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P112	ZPSO 56
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	


P113	ZPSO 56
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P114	ZPSO 57
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 3	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

P115	ZPSO 57
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> ESCALIER 3	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

P116	ZPSO 2

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 4

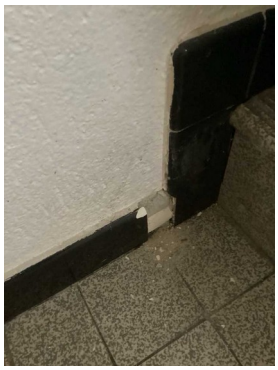

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P117	ZPSO 58

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 4



Revêtements de sol -> Colles carrelage

P118	ZPSO 58


BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 4



Revêtements de sol -> Colles carrelage

P119	ZPSO 59

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 4

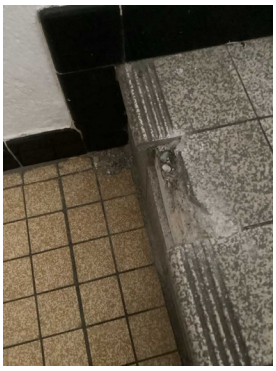

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P120	ZPSO 59

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 4



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P121	ZPSO 60

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 4



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P122	ZPSO 50
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P123	ZPSO 61
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	
	
Poteaux -> Enduits projetés/talochés poteaux	

P124	ZPSO 60
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	


P125	ZPSO 60
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P126	ZPSO 62
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 134	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales | Enduits projetés/talochés murs	

P127	ZPSO 62
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 133	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales | Enduits projetés/talochés murs	

P128	ZPSO 63
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 128	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales	


P129	ZPSO 63
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 128	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales	

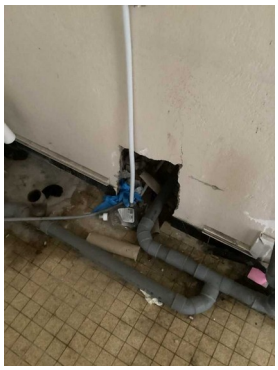P130	ZPSO 64
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 128	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	


P131	ZPSO 64
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	


P132	ZPSO 61
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 2	
	
Poteaux -> Enduits projetés/talochés poteaux	

P133	ZPSO 65
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 1	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Ragréages	

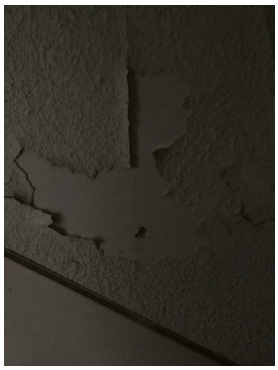P135	ZPSO 66
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 113	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P136	ZPSO 66
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> ESCALIER 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

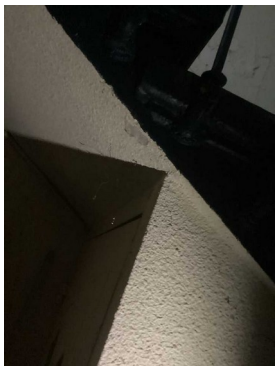P137	ZPSO 67
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> ESCALIER 1	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	

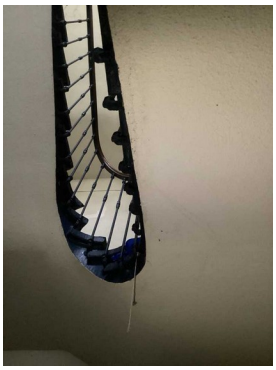P138	ZPSO 67
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 1	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	

P139	ZPSO 68
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P140	ZPSO 68
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P157	ZPSO 2

BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL DEGAGEMENT 3



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P158	ZPSO 62

BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 08



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales | Enduits projetés/talochés murs

P159	ZPSO 74

BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> CIRCULATION 1



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P160	ZPSO 75

BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> CIRCULATION 1



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P161	ZPSO 75

BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 010




Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P162	ZPSO 74

BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 010




Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

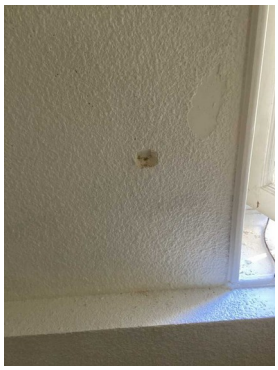P163	ZPSO 76
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 010	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés cloisons (Liste B)	

P164	ZPSO 77
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 010	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales	

P165	ZPSO 77
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> CIRCULATION 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales	

P166	ZPSO 76
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> CIRCULATION 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés cloisons (Liste B)	

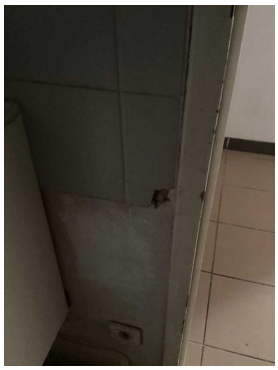P167	ZPSO 78
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 012	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P168	ZPSO 78
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 014	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

Copyright BUREAU VERITAS

P169	ZPSO 79
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 012	




Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P170	ZPSO 79
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 012	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P171	ZPSO 82
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 015	

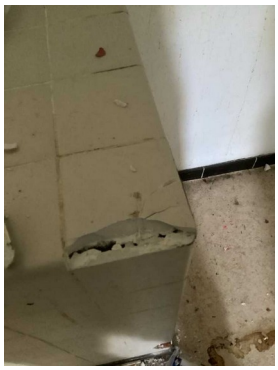


Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P172	ZPSO 82
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 015	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P173	ZPSO 81
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 015	

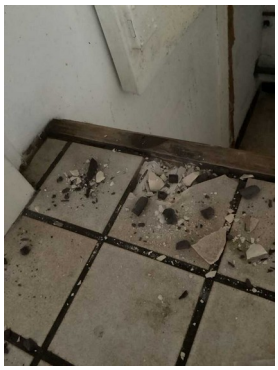

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P174	ZPSO 81
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 015	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

Copyright BUREAU VERITAS

P175	ZPSO 80
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 019	



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses

P176	ZPSO 80
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 016	



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses

P177	ZPSO 83
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P178	ZPSO 83
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P179	ZPSO 84
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P180	ZPSO 84
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P181	ZPSO 85
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P182	ZPSO 85
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P183	ZPSO 86
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P184	ZPSO 86
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	




Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P185	ZPSO 87
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 254	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence


P186	ZPSO 87
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 254	

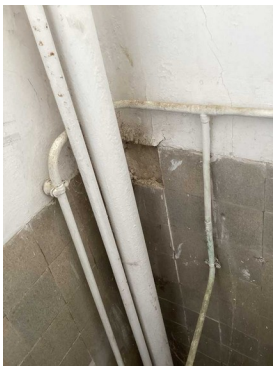


Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P187	ZPSO 88
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P188	ZPSO 88
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

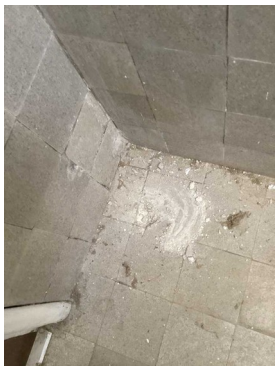P189	ZPSO 89
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 254	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

P190	ZPSO 89
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 254	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

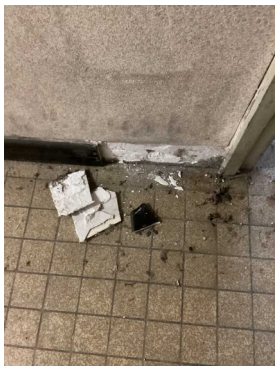P191	ZPSO 55
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P192	ZPSO 2
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P193	ZPSO 62

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 253



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales | Enduits projetés/talochés murs

P194	ZPSO 80

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 252



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses

P195	ZPSO 90


BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 234



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P196	ZPSO 90

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 234

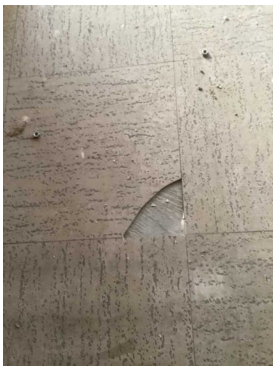

Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P197	ZPSO 90

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 232



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P198	ZPSO 50

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 4



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs


P199	ZPSO 92
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 230	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P200	ZPSO 92
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 230	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	


P201	ZPSO 91
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 233	
	
Portes de placard -> Plaques antivibratiles placards	

P202	ZPSO 94
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 209	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P203	ZPSO 94
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 209	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

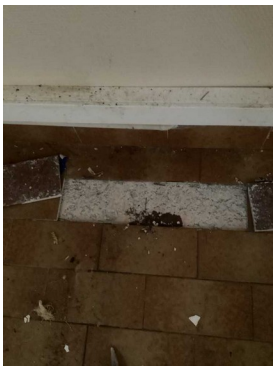P204	ZPSO 93
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 209	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

P205	ZPSO 93
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 209	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

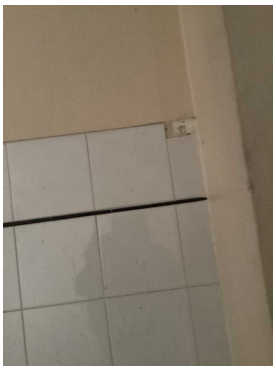P206	ZPSO 95
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 209	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P207	ZPSO 95
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 209	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P209	ZPSO 96
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> SDB	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P212	ZPSO 98
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 220	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P213	ZPSO 98
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 220	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P214	ZPSO 2
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 220	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P215	ZPSO 99
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 215	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P216	ZPSO 99
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 215	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P217	ZPSO 100
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 212	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	

P218	ZPSO 100
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 211	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	

P220	ZPSO 101
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés murs (Liste B)	

Copyright BUREAU VERITAS

P221	ZPSO 101

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 3



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés murs (Liste B)

P222	ZPSO 102

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 284



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P223	ZPSO 145


BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> CIRCULATION 1



Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage

P224	ZPSO 85

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> CIRCULATION 1

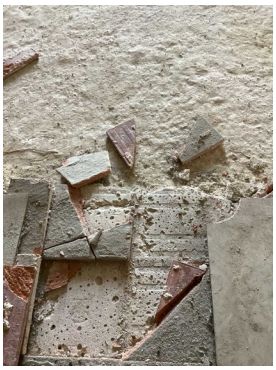

Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P225	ZPSO 103

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> CIRCULATION 1



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P226	ZPSO 50

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 277



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P227	ZPSO 84
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> CIRCULATION 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P228	ZPSO 105
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 267	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P229	ZPSO 102
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 263	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P230	ZPSO 104
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 262	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P231	ZPSO 104
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 262	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P232	ZPSO 106
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 318	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses	

P233	ZPSO 106

BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 318



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses

P234	ZPSO 84

BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> CIRCULATION 1



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P235	ZPSO 102

BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 338



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P236	ZPSO 107

BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 336



Eviers métalliques -> Plaques antivibratiles éviers

P237	ZPSO 108

BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 336



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P237	ZPSO 108

BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 336



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P238	ZPSO 108


BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 336



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P239	ZPSO 103

BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> CIRCULATION 2

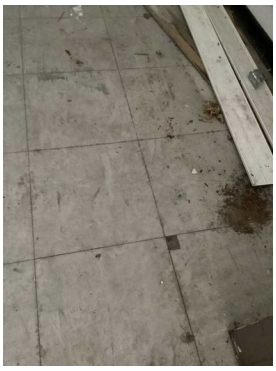

Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P240	ZPSO 109


BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 330



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P241	ZPSO 109

BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 330

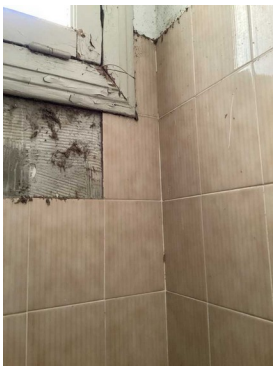

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P242	ZPSO 111

BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> ESCALIER 2



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P243	ZPSO 111

BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 333



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

Copyright BUREAU VERITAS

P244	ZPSO 110
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> ESCALIER 2	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P245	ZPSO 110
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 334	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P246	ZPSO 112
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL DEGAGEMENT 3	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages	

P247	ZPSO 112
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 022	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages	

P248	ZPSO 113
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL O21	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P249	ZPSO 113
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL O21	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	


P250	ZPSO 114
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P251	ZPSO 115
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PORCHE 2	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P252	ZPSO 115
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PORCHE 2	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	


P253	ZPSO 114
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 133	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P256	ZPSO 97
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

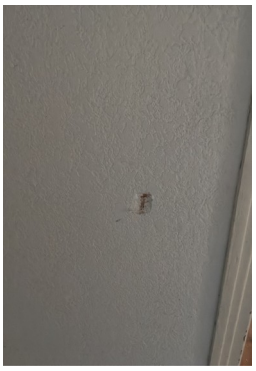P257	ZPSO 97
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> CIRCULATION 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P258	ZPSO 96

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> SDB

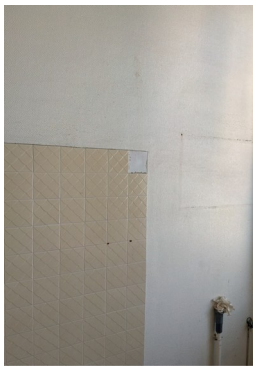

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P259	ZPSO 31

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> PASSAGE EXTERIEUR



Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures façades | Coffrages perdus

P264	ZPSO 117

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 2



Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds

P265	ZPSO 117

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 1



Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds

P266	ZPSO 118

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 129



Plafonds -> Plots de colle plafonds | Plaques

P267	ZPSO 119

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 130



Faux plafonds -> Plaques (Liste A)


Copyright BUREAU VERITAS

P268	ZPSO 120
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P269	ZPSO 120
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 131	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P270	ZPSO 121
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Sous-couches revêtements souples	


P271	ZPSO 121
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Sous-couches revêtements souples	

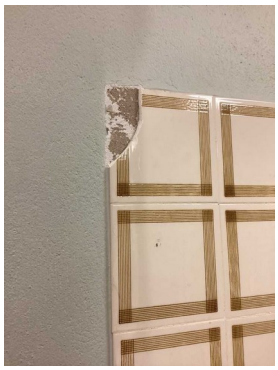
P272	ZPSO 122
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P273	ZPSO 122
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P274	ZPSO 123
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P275	ZPSO 124
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 260	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

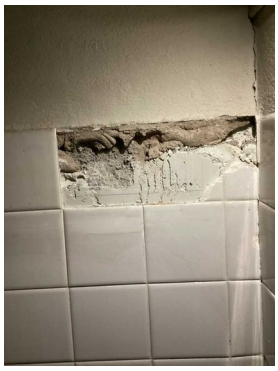
P276	ZPSO 124
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 260	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P277	ZPSO 117
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 256	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	

P278	ZPSO 125
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 234	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P279	ZPSO 126
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 236	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P280	ZPSO 117
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> ESCALIER 2	

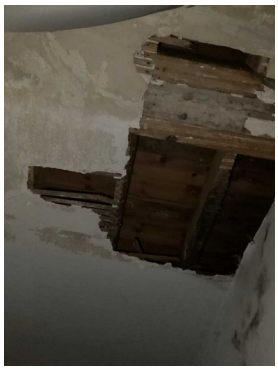

Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds

P281	ZPSO 127
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 337	




Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

P282	ZPSO 145
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 1	




Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage

P283	ZPSO 128
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> ESCALIER 2	



Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds

P284	ZPSO 128
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> ESCALIER 1	

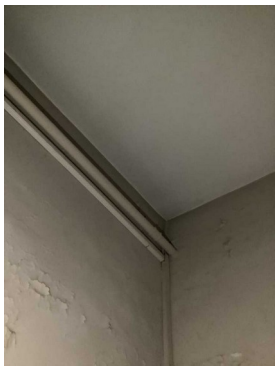

Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds


P285	ZPSO 129
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL SANITAIRES	



Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

P286	ZPSO 131


BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 07

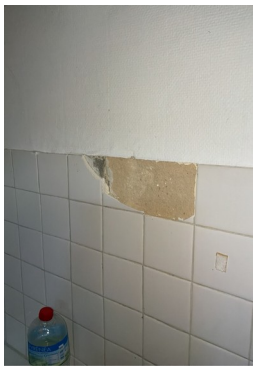

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

P287	ZPSO 131


BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 07

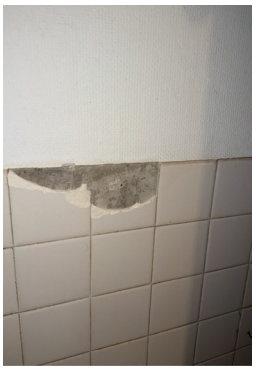

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

P288	ZPSO 132

BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 07

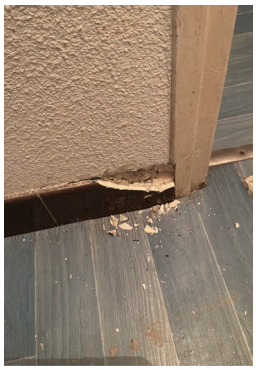

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P289	ZPSO 132


BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 01



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P290	ZPSO 133

BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 03

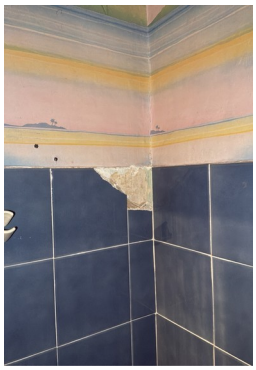

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

P291	ZPSO 133

BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 03





Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

Copyright BUREAU VERITAS


P292	ZPSO 134
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 03	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P293	ZPSO 134
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 03	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

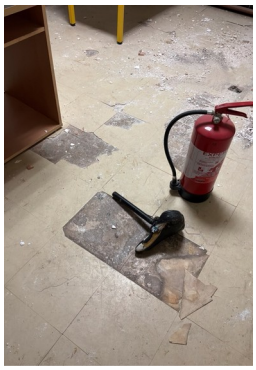
P294	ZPSO 135
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 03	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	

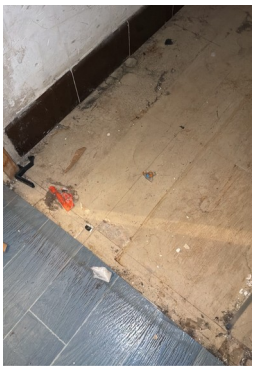
P295	ZPSO 135
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 03	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	


P296	ZPSO 136
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 01	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

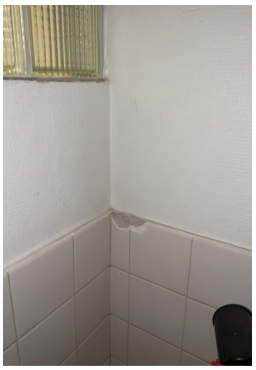P297	ZPSO 136
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 01	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	


P298	ZPSO 137
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 020	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

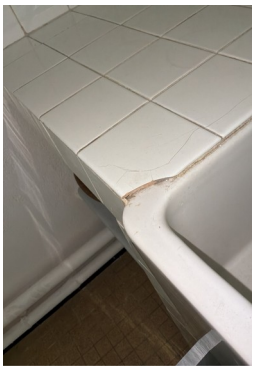P299	ZPSO 137
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 020	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

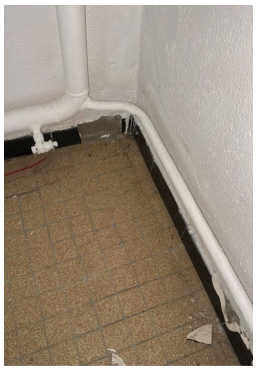P300	ZPSO 138
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 020	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

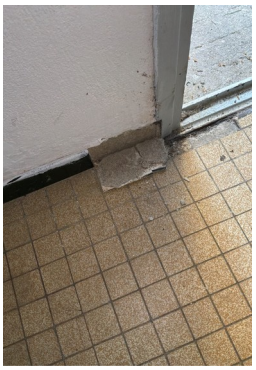P301	ZPSO 138
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 020	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P302	ZPSO 139
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> ESCALIER 2	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

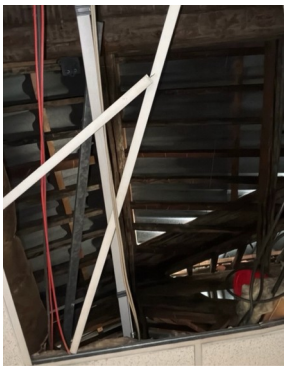P303	ZPSO 140
BATIMENT A B C -> TOITURE ET COMBLES	
	
Toitures -> Plaques fibrociment (Liste B)	

P304	ZPSO 141
BATIMENT A B C -> TOITURE ET COMBLES	
	
Conduits en toiture -> Conduits de fumée (Liste B)	


7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 1
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> CIRCULATION 1	




Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

S2	ZPSO 1
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 118	

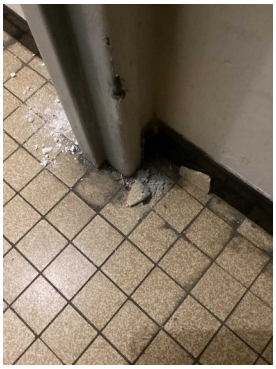

Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

S3	ZPSO 53
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 120	

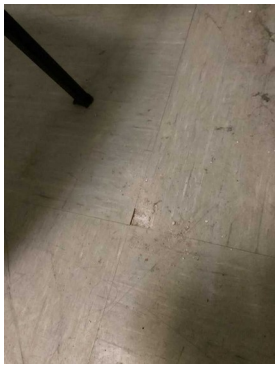

Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

S4	ZPSO 51
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 121	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

S5	ZPSO 47
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 121	



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs


S6	ZPSO 4
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 121	




Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage


S7	ZPSO 51
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 122	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

S9	ZPSO 2
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 019	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

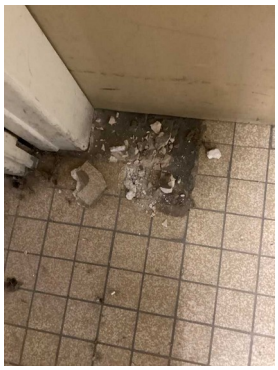S10	ZPSO 1
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

S11	ZPSO 1
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

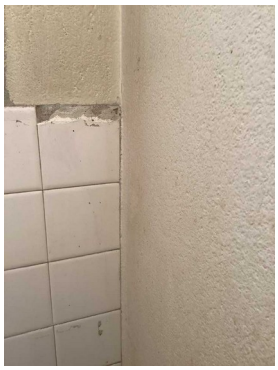S12	ZPSO 11
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 237	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

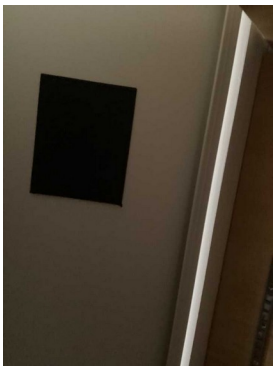S14	ZPSO 91
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 227	
	
Portes de placard -> Plaques antivibratiles placards	


S15	ZPSO 105
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 338	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S16	ZPSO 85
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> ESCALIER 1	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

S17	ZPSO 119
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 131	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


S18	ZPSO 9
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 131	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages	

S19	ZPSO 9
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 132	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages	

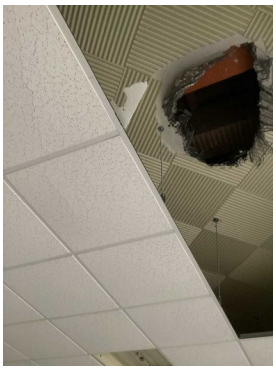S20	ZPSO 119
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 134	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S21	ZPSO 118

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 134

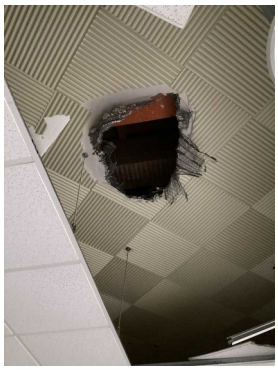

Plafonds -> Plots de colle plafonds | Plaques

S22	ZPSO 119

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135



Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

S23	ZPSO 73

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 138



Revêtements de sol -> Moquettes | Colles non bitumineuses

S24	ZPSO 2

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 138



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

S25	ZPSO 120

BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 138



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

S26	ZPSO 2


BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 135



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

S28	ZPSO 121
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 256	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Sous-couches revêtements souples	


S29	ZPSO 123
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 242	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

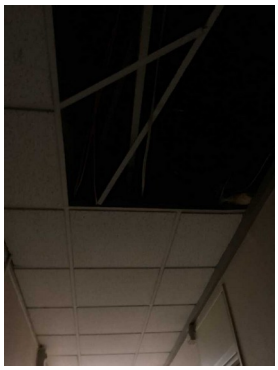S30	ZPSO 119
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S31	ZPSO 119
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> ESCALIER 1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S32	ZPSO 117
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 336	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	

S33	ZPSO 123
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 336	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

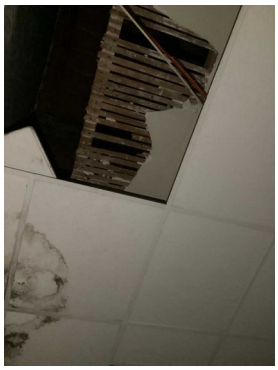S34	ZPSO 117
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> CIRCULATION 2	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	

S35	ZPSO 102
BATIMENT A B C -> R+2 -> BATIMENT ZONE 3 - R+2 -> LOCAL 320	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

S36	ZPSO 117
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	


S37	ZPSO 119
BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S38	ZPSO 55
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 242	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	


S39	ZPSO 55
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 245	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

Copyright BUREAU VERITAS

S40	ZPSO 2
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

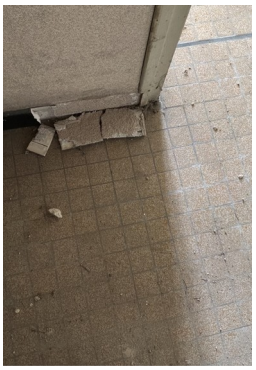S41	ZPSO 2
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> CIRCULATION 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

S42	ZPSO 2
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 2 - R+1 -> LOCAL 238	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

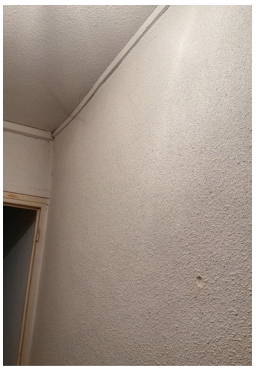S44	ZPSO 76
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 03	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés cloisons (Liste B)	

S45	ZPSO 117
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 03	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	

S49	ZPSO 2
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 227	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	


S50	ZPSO 140
BATIMENT A B C -> TOITURE ET COMBLES	
	
Toitures -> Plaques fibrociment (Liste B)	


S51	ZPSO 141
BATIMENT A B C -> TOITURE ET COMBLES	
	
Conduits en toiture -> Conduits de fumée (Liste B)	

S52	ZPSO 2
BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 1 - RDC -> LOCAL 08	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

S53	ZPSO 141
BATIMENT A B C -> TOITURE ET COMBLES	
	
Conduits en toiture -> Conduits de fumée (Liste B)	

S55	ZPSO 11
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 232	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

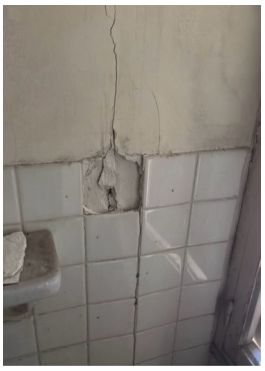S56	ZPSO 11
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 224	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

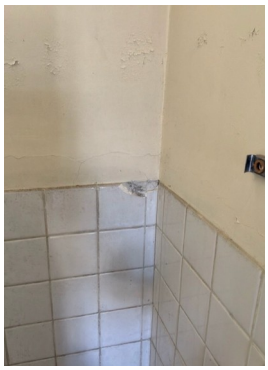S57	ZPSO 11
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 226	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

S58	ZPSO 11
BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 1 - R+1 -> LOCAL 229	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

7.4. Photos inaccessibilités


Moyen(s) d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre avant les travaux

BATIMENT A B C -> RDC -> BATIMENT ZONE 2 - RDC -> LOCAL 025	MA 14
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte


Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux

BATIMENT A B C	IA 10
2- Parois verticales extérieures et façades	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Joints compribandes inaccessibles Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4

7.5. Photos observations

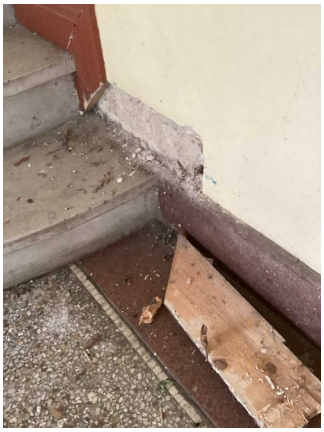BATIMENT A B C -> REZ DE JARDIN -> BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN -> LOCAL 145	OBS 1
03 - Parois verticales intérieures	
Plinthes	
	**Observation :** plinthes en bois sans colle

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> CIRCULATION 1	OBS 4
03 - Parois verticales intérieures	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	**Observation :** plinthes plastiques

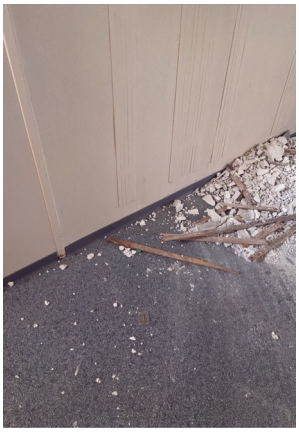BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 256	OBS 5
03 - Parois verticales intérieures	
Plinthes	
	**Observation :** plinthes plastiques

BATIMENT A B C -> R+1 -> BATIMENT ZONE 3 - R+1 -> LOCAL 260	OBS 6
03 - Parois verticales intérieures	
Plinthes	
	**Observation :** plinthes en bois

7.6. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.7. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Benjamin LACOME

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029

Date :28/03/2022

Numéro de certificat : 9643074

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0067
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

7.8. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	1 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

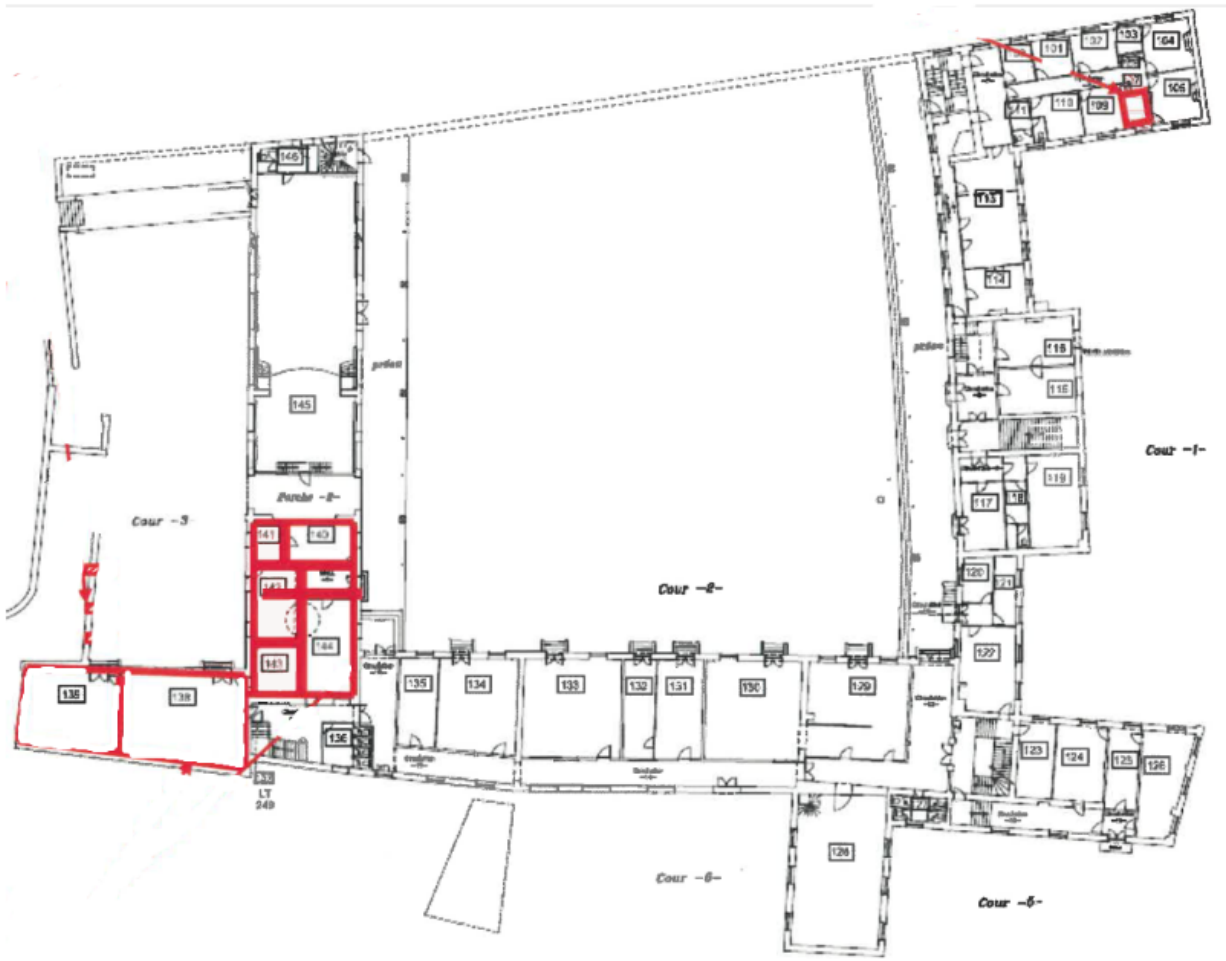

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	2 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	3 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Colles plinthe,Joints plinthe
- Colles faïence,Joints faïence
- Colles plinthe
- Colles carrelage,Joints carrelage

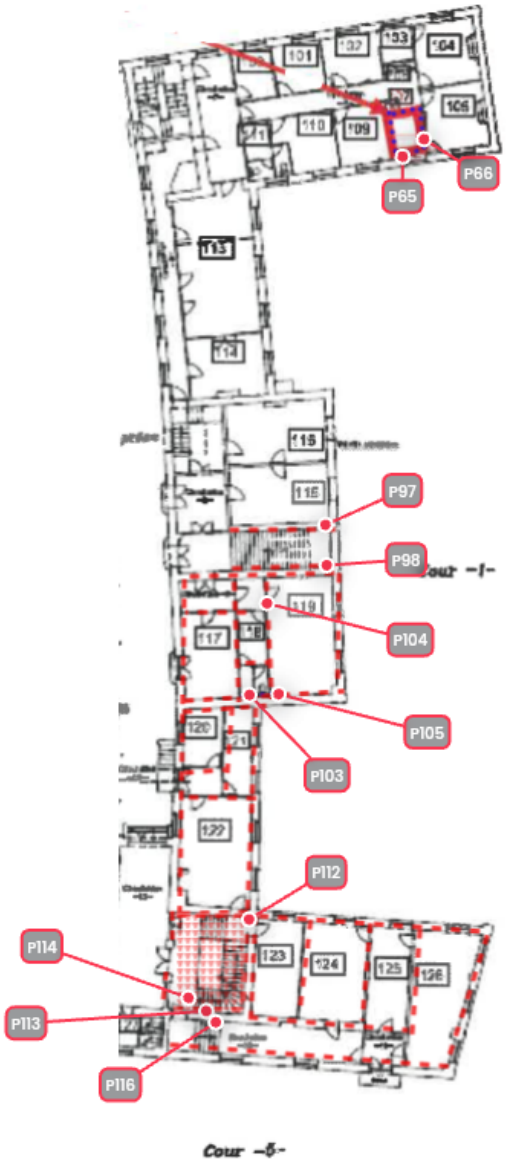

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	4 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Sol

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

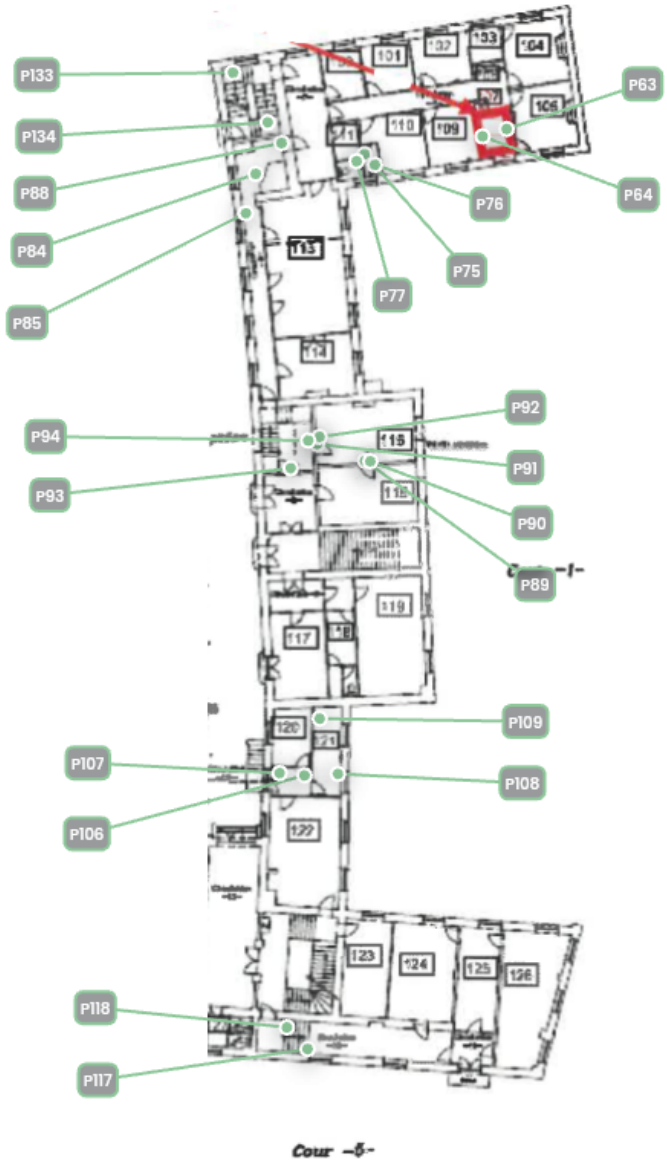

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	5 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

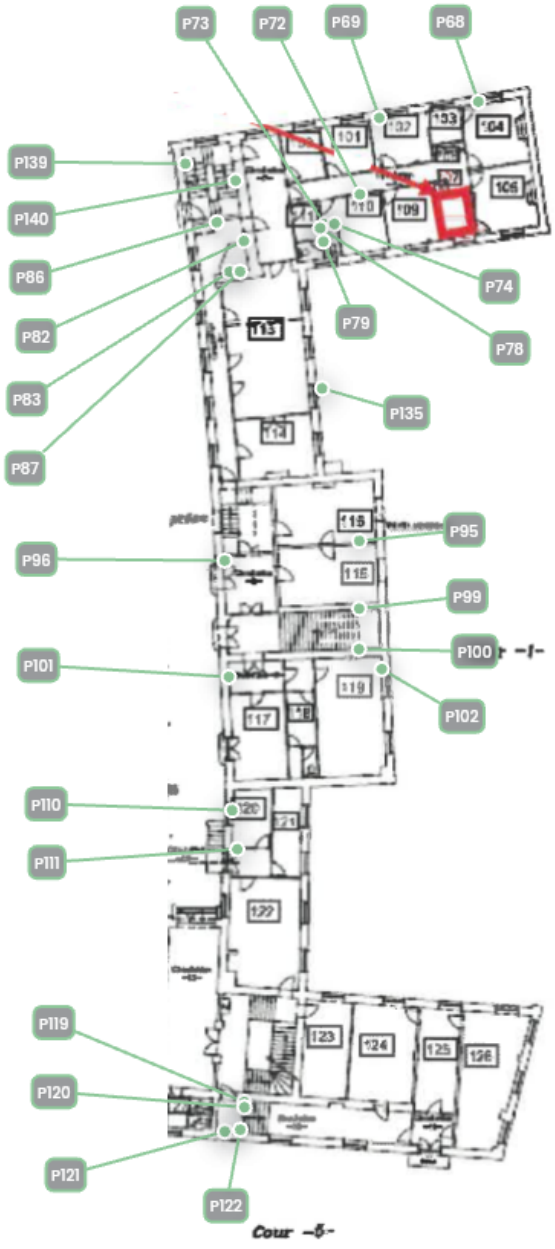

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	6 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	7 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Autre

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

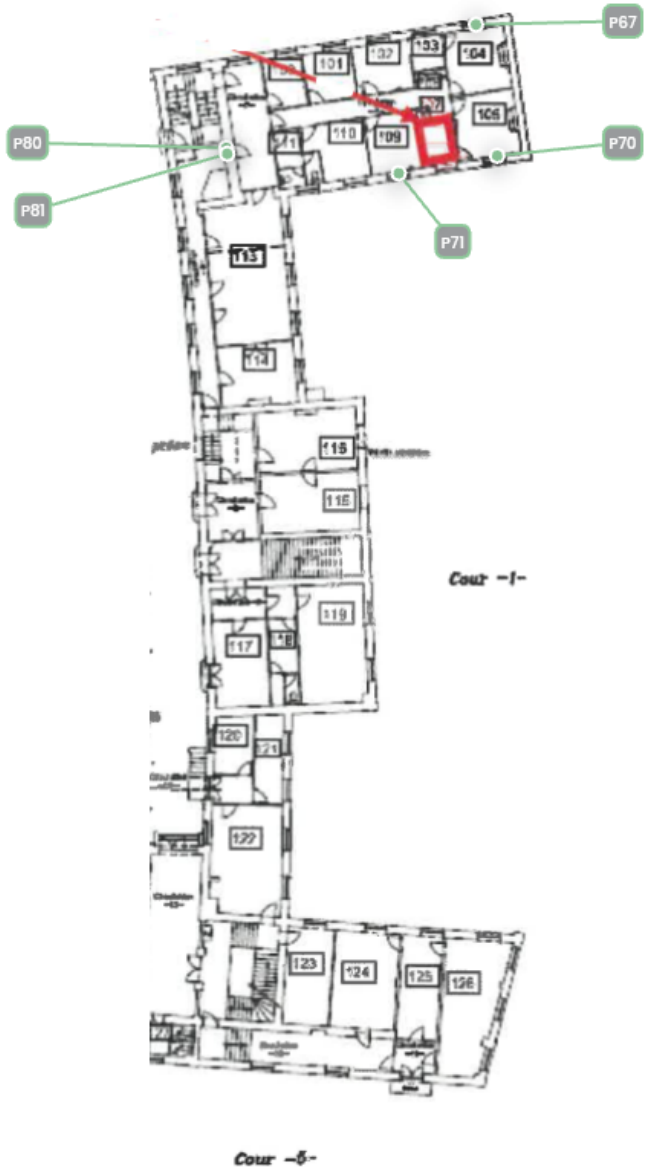

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	8 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Sondage
Observation

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

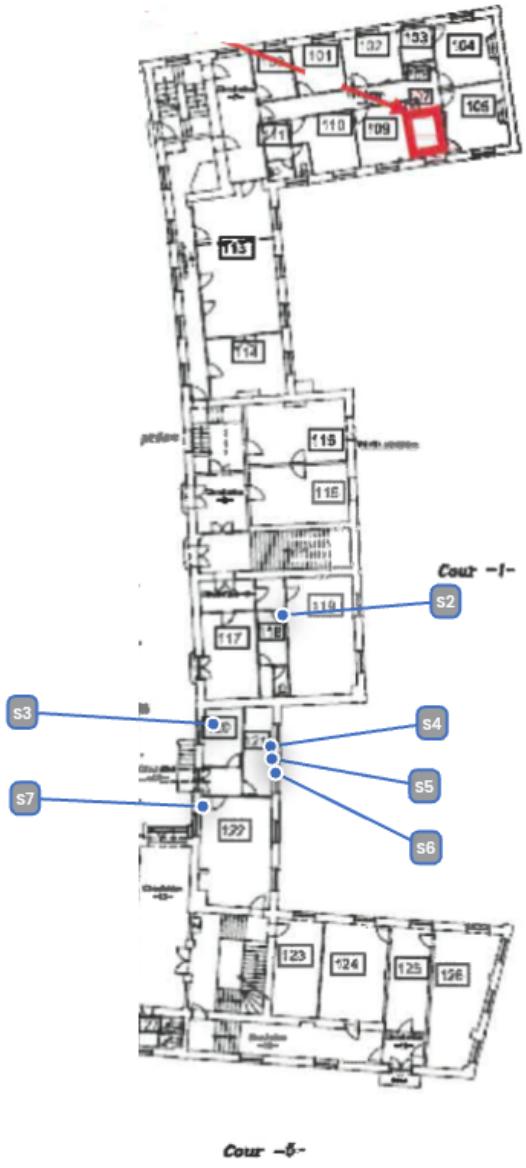

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN > ESCALIER 1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	9 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	10 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

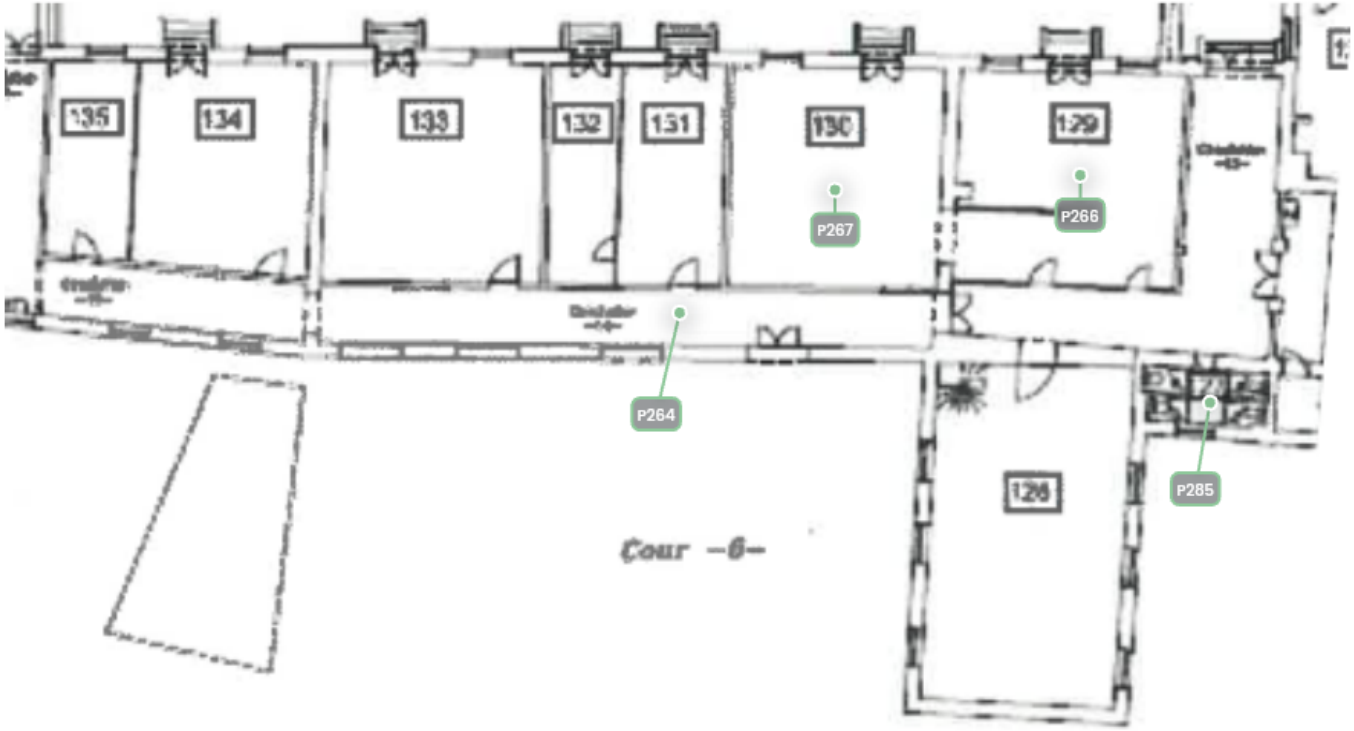

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	11 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

--- Colles plinthe,Joints plinthe

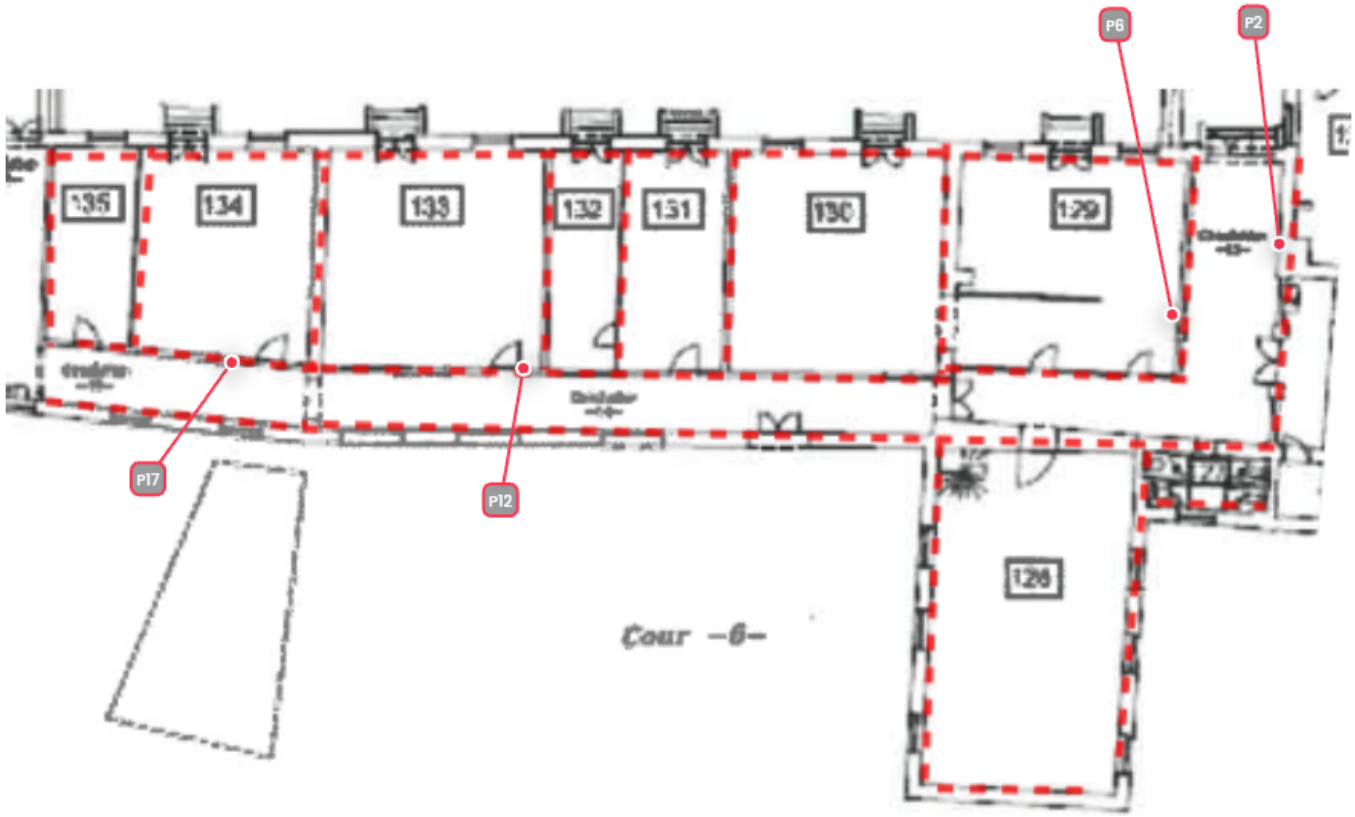

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	12 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Sol

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

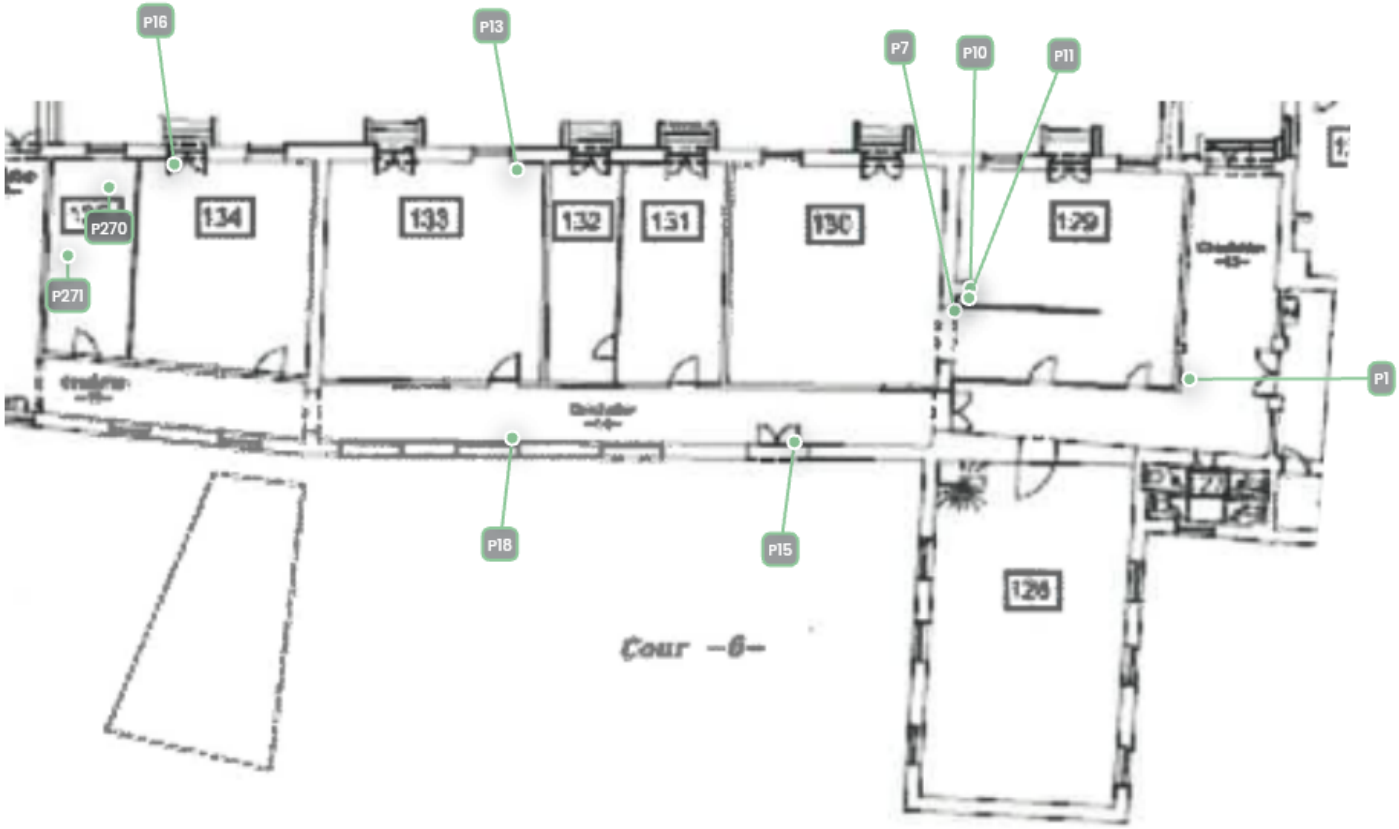

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	13 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

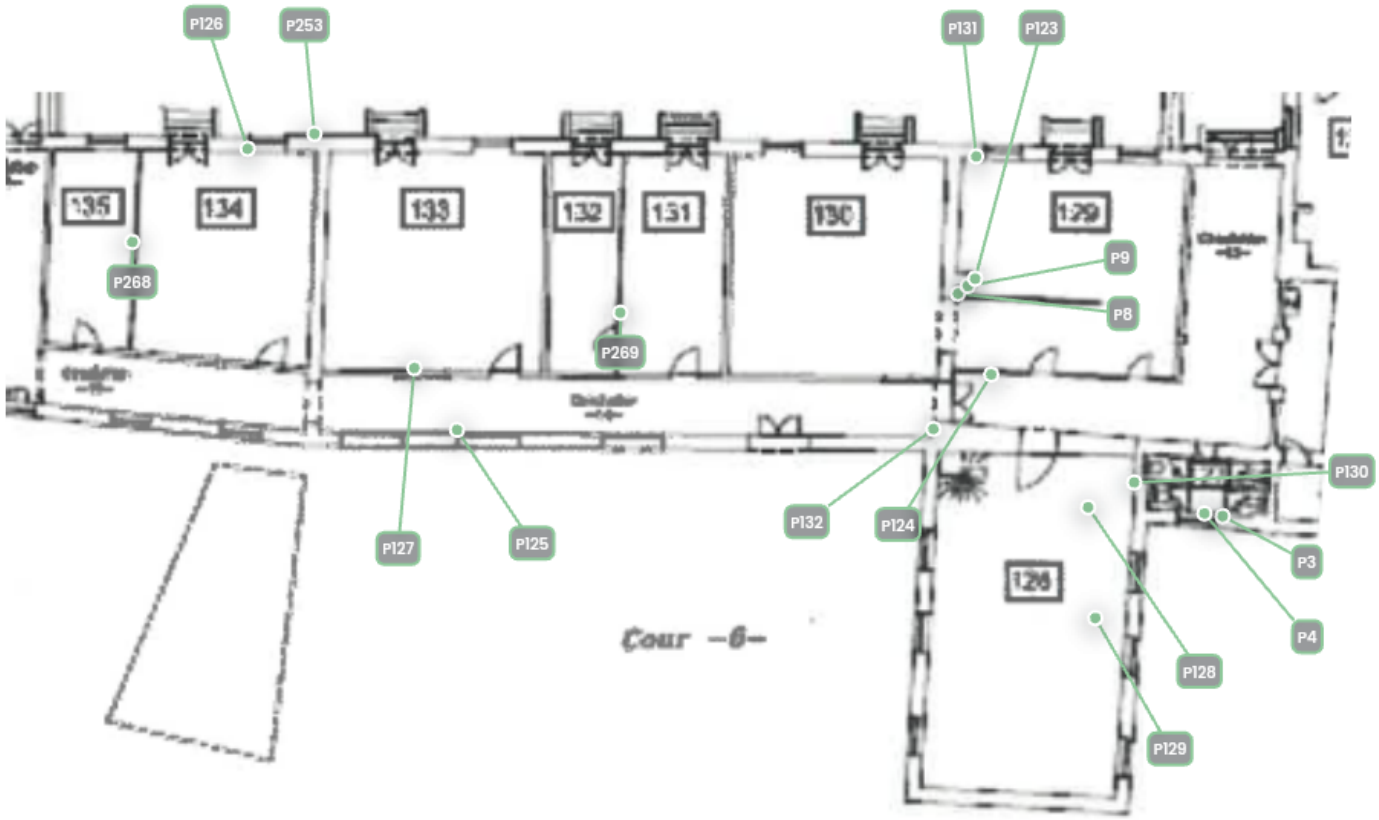

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	14 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Autre

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

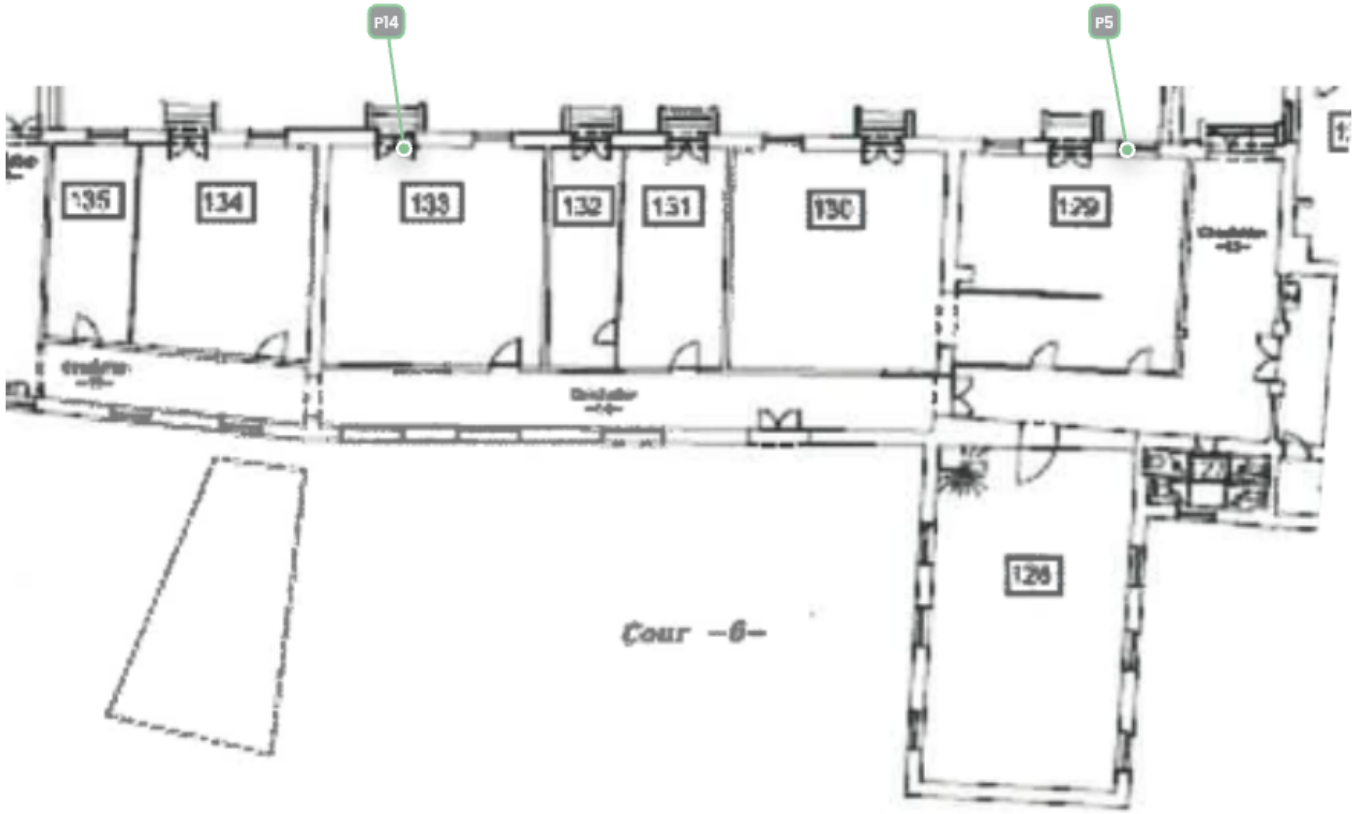

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	15 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Sondage

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

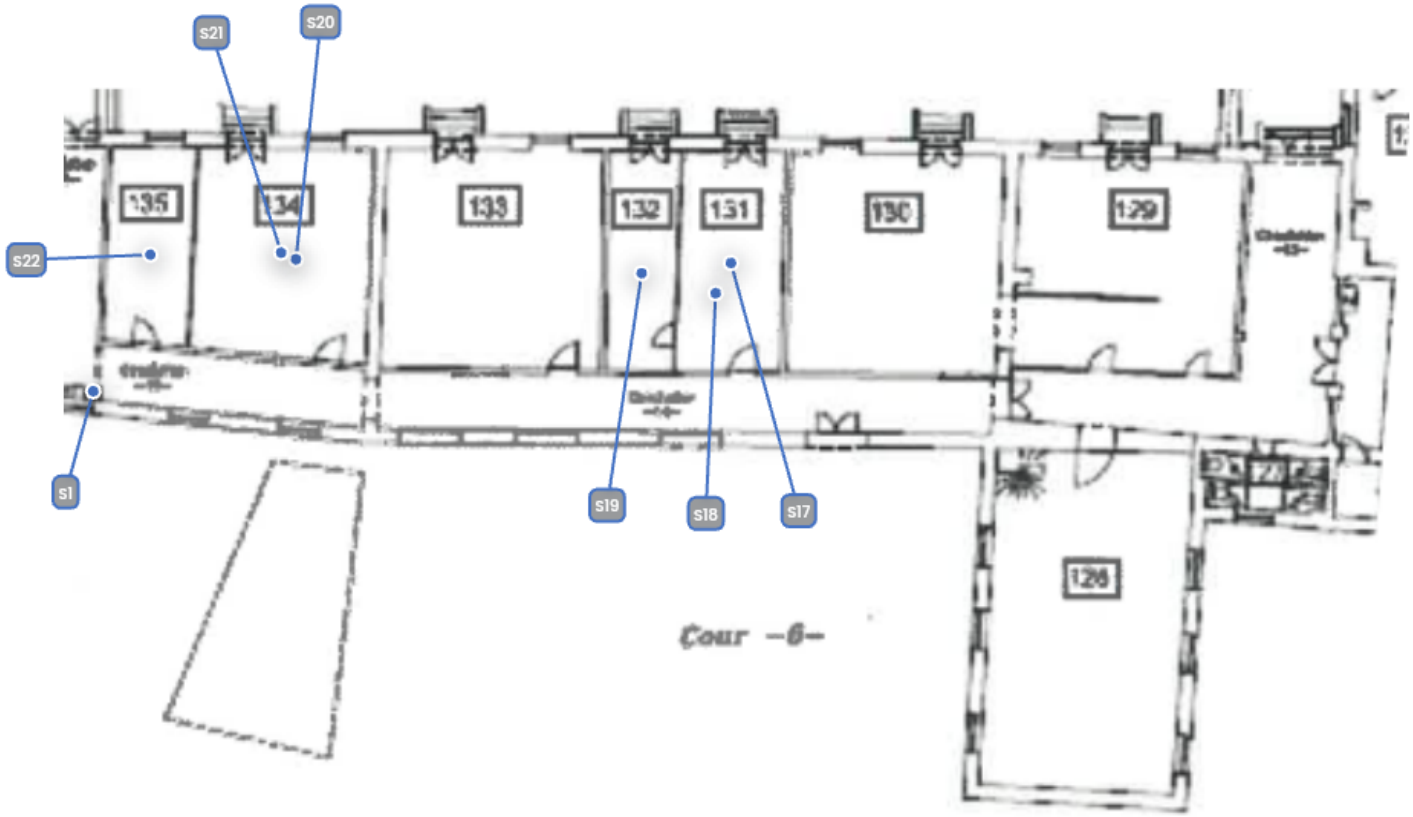

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	16 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	17 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Colles plinthe,Joints plinthe
- Colles faïence,Joints faïence
- Peintures façades,Coffrages perdus

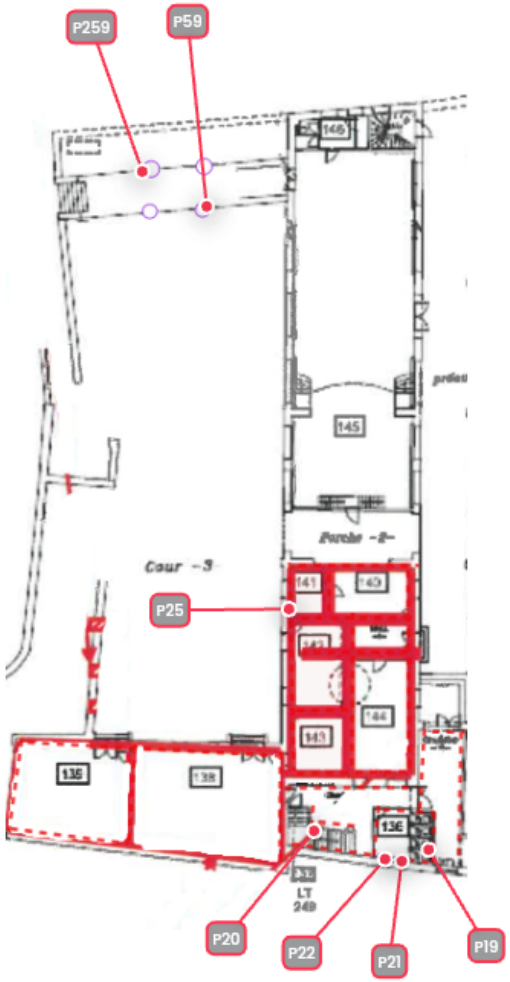

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	18 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Sol

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

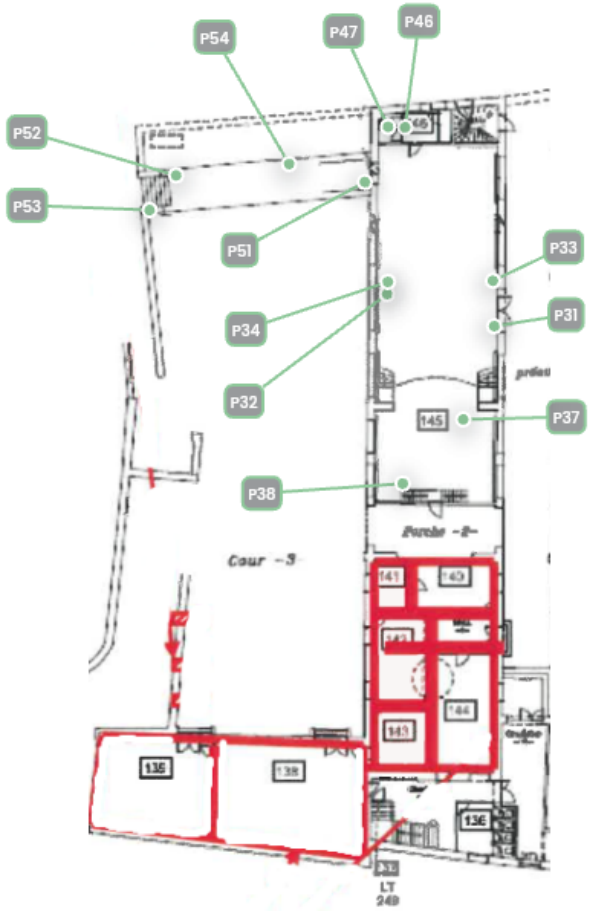

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	19 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

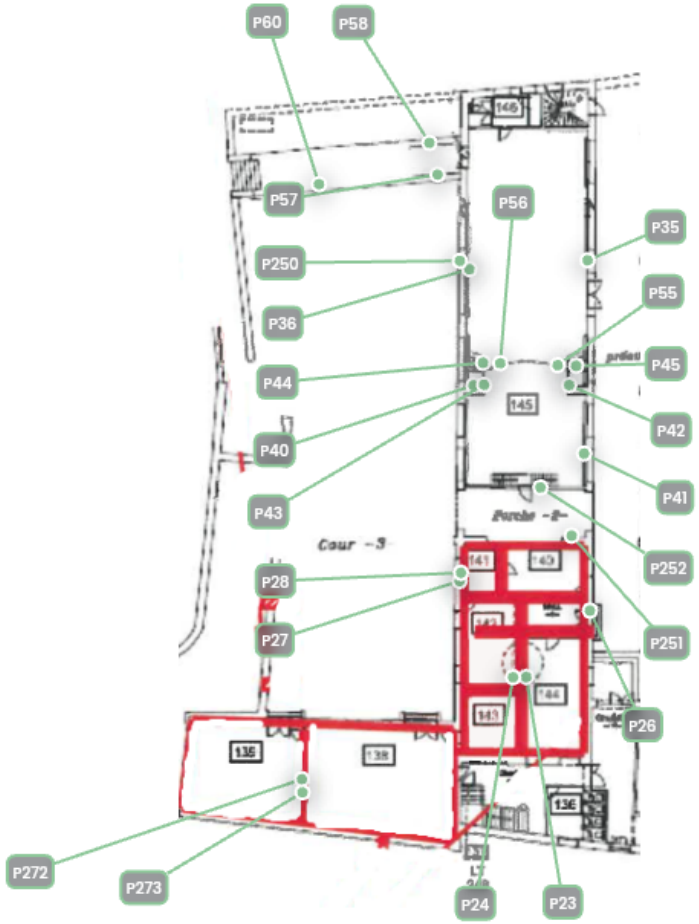

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	20 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	21 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Autre

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > REZ DE JARDIN > BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	22 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Inaccessibilité
Observation

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	23 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

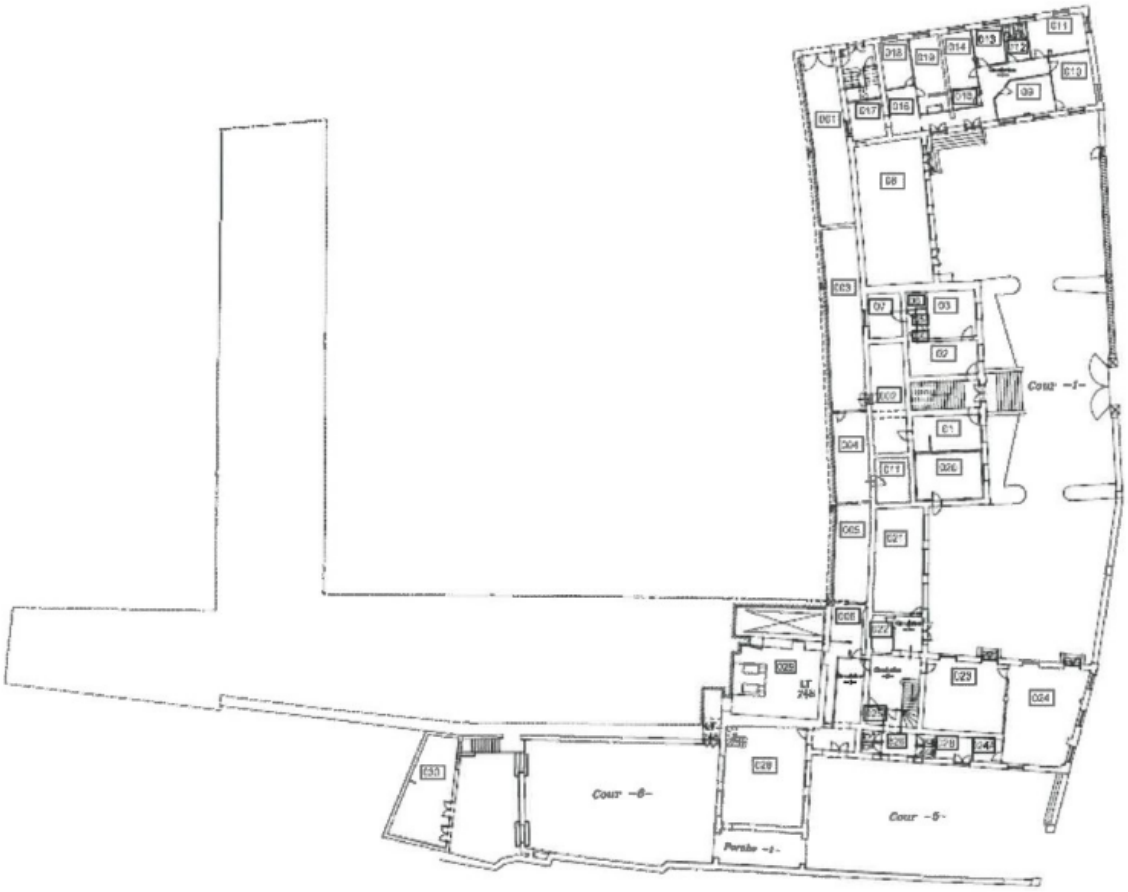

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	24 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

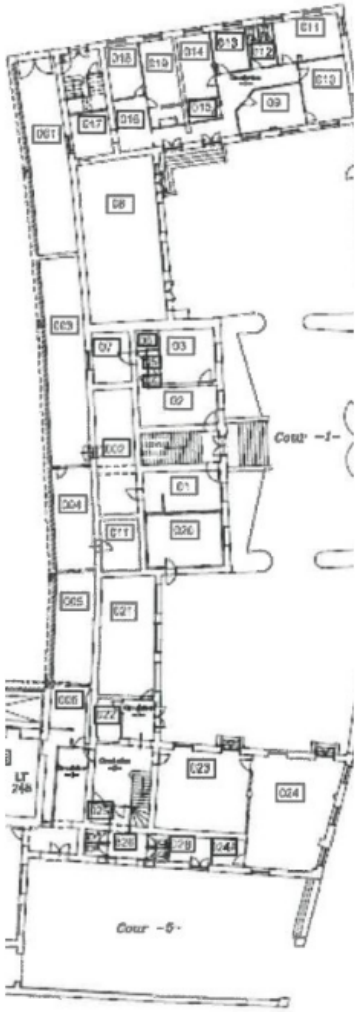

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	25 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Colles plinthe,Joints plinthe
- Colles faïence,Joints faïence
- Colles plinthe
- Colles faïence
- Enveloppes de calorifuges (Liste B),Calorifugeages (Liste A)



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	26 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Sol

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	27 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

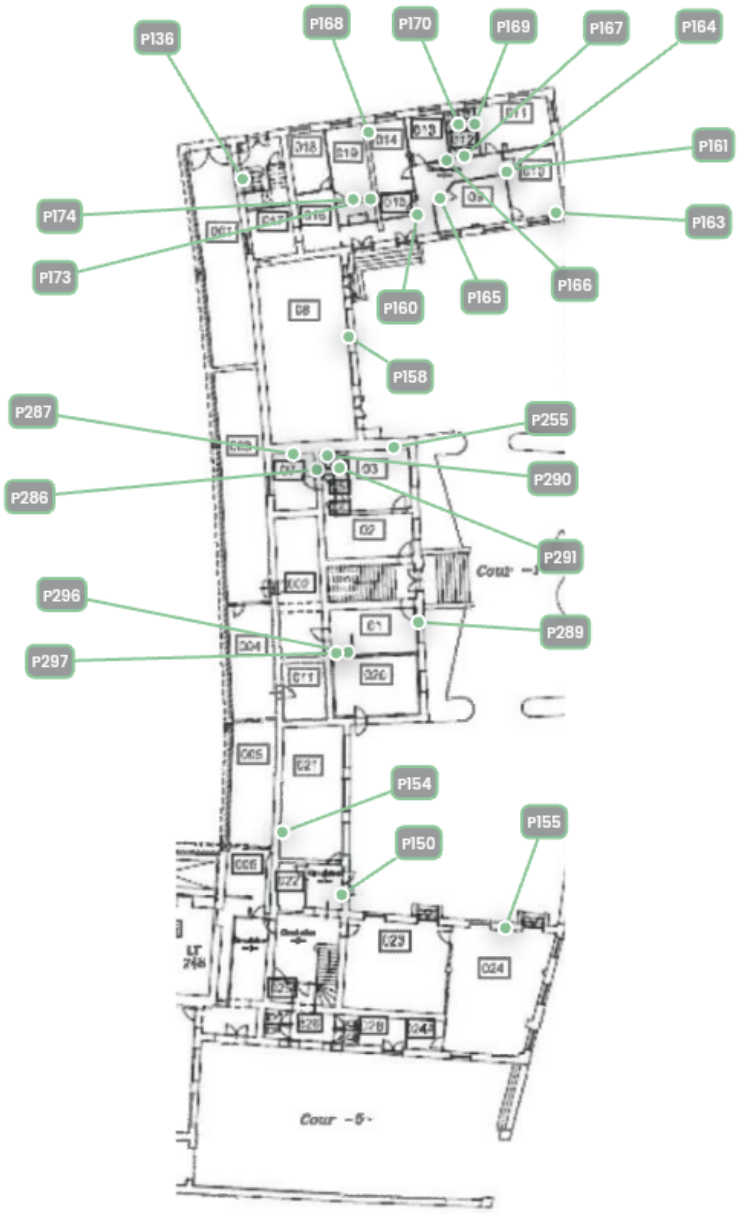

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	28 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

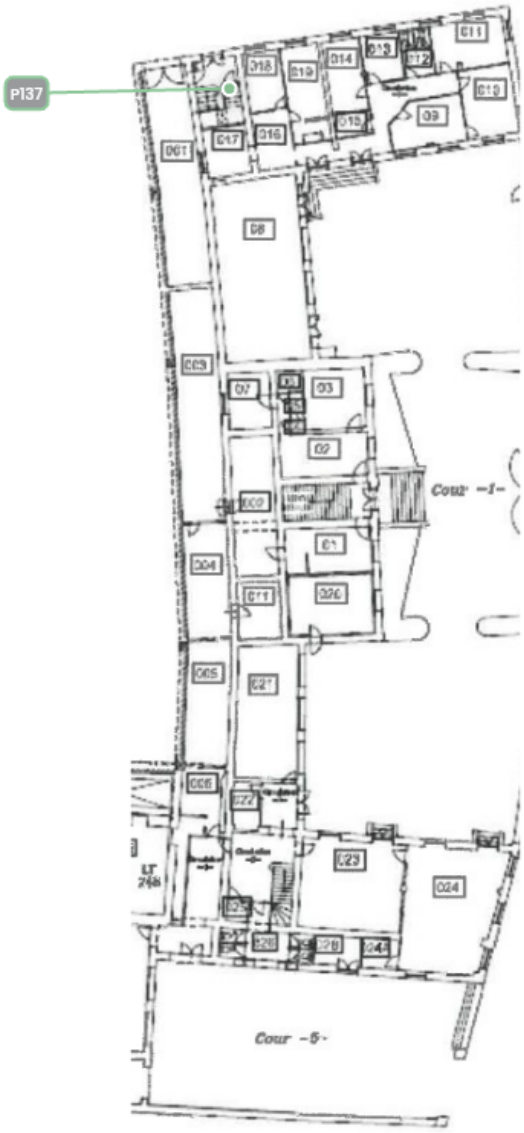

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	29 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Autre

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	30 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Sondage

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	31 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Observation
Inaccessibilité

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

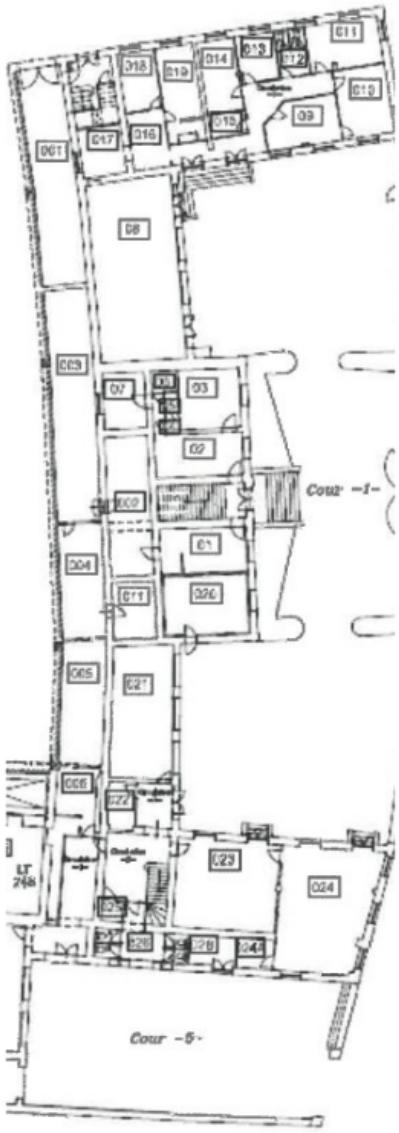

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC > LOCAL DEGAGEMENTT	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	32 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC > LOCAL 010	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	33 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

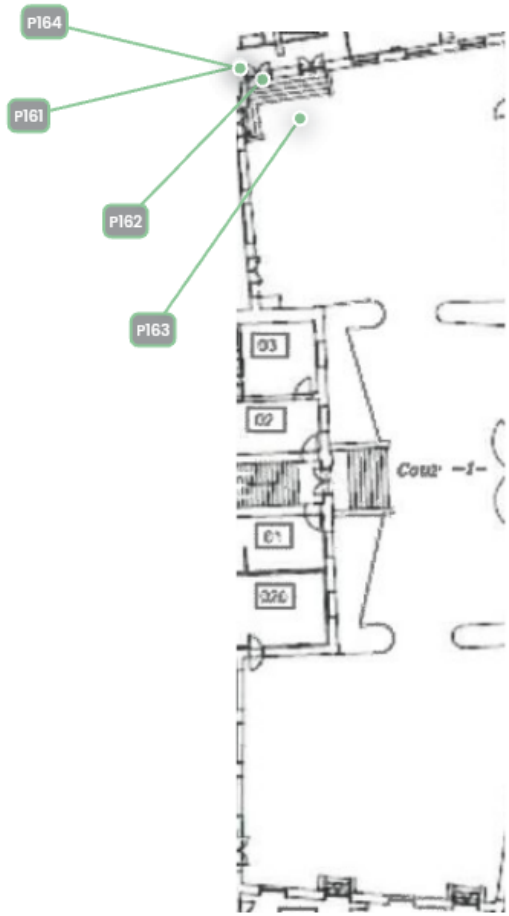

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC > COURS 1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	34 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

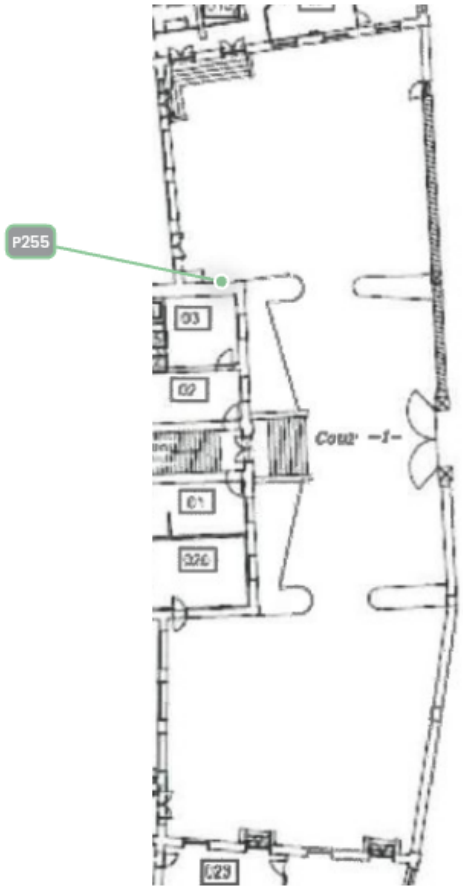

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 1 - RDC > COURS 5	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	35 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

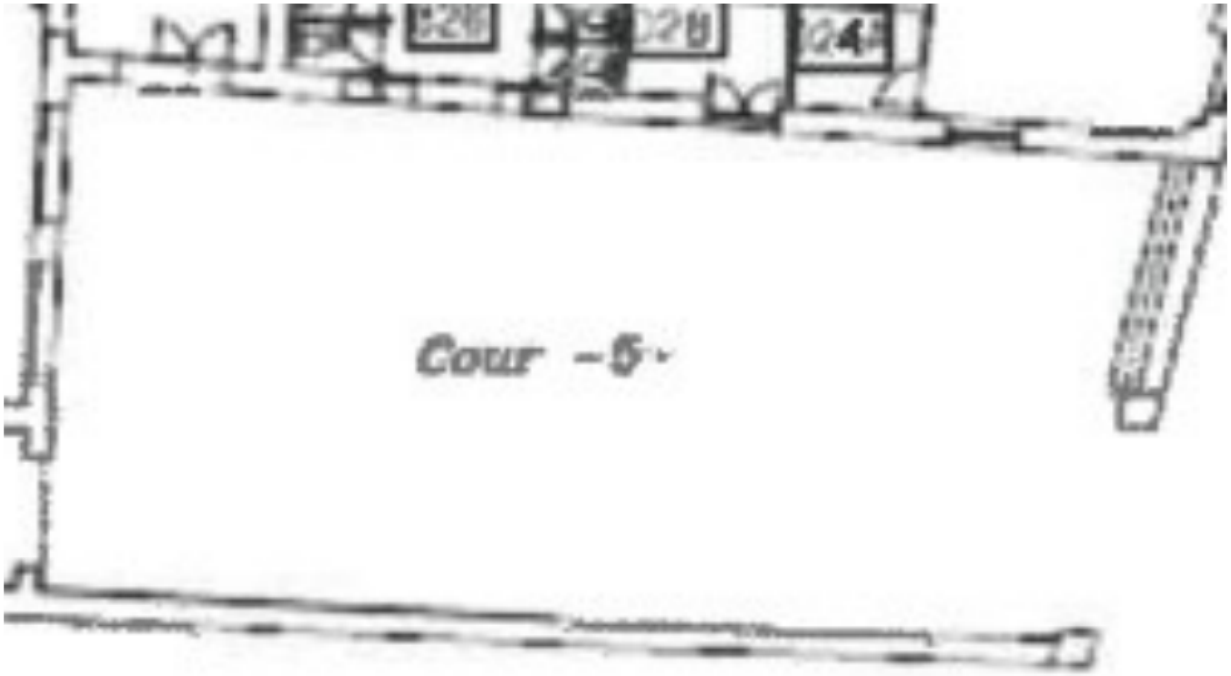

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 2 - RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	36 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

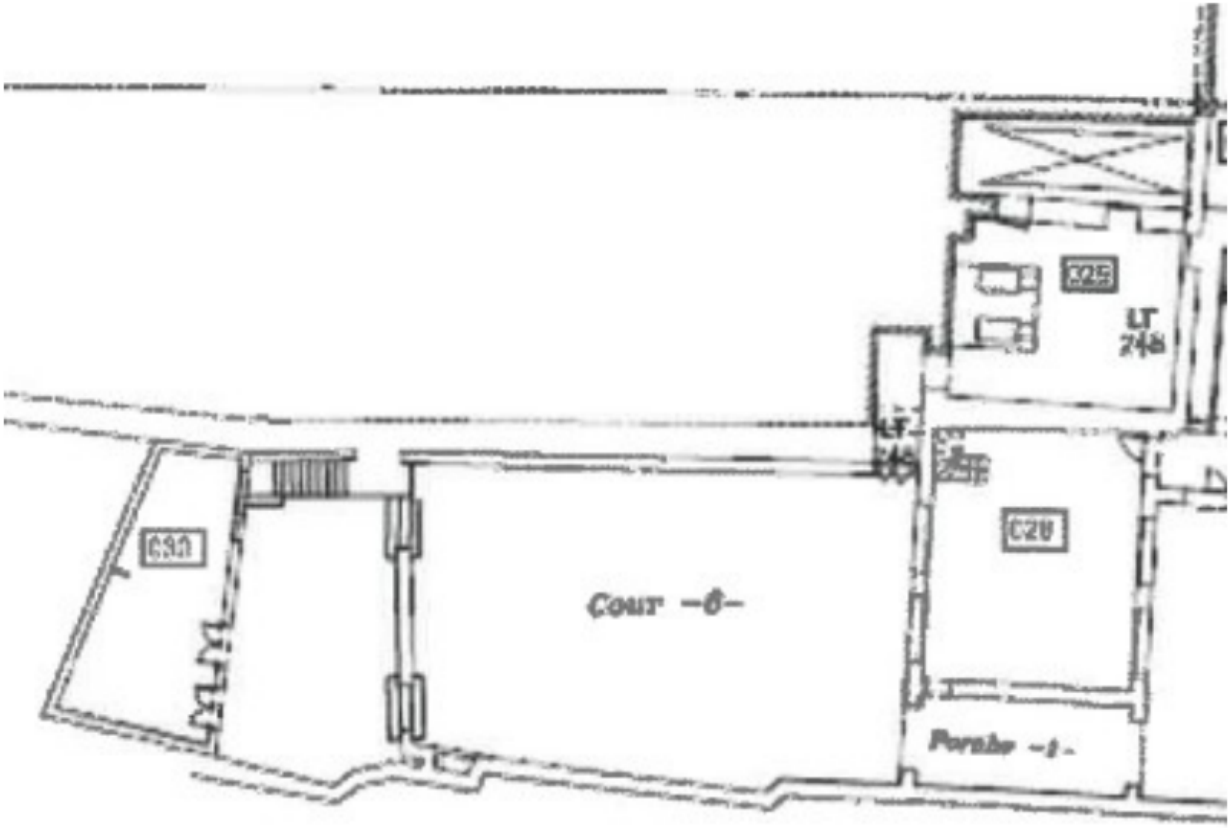

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 2 - RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	37 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

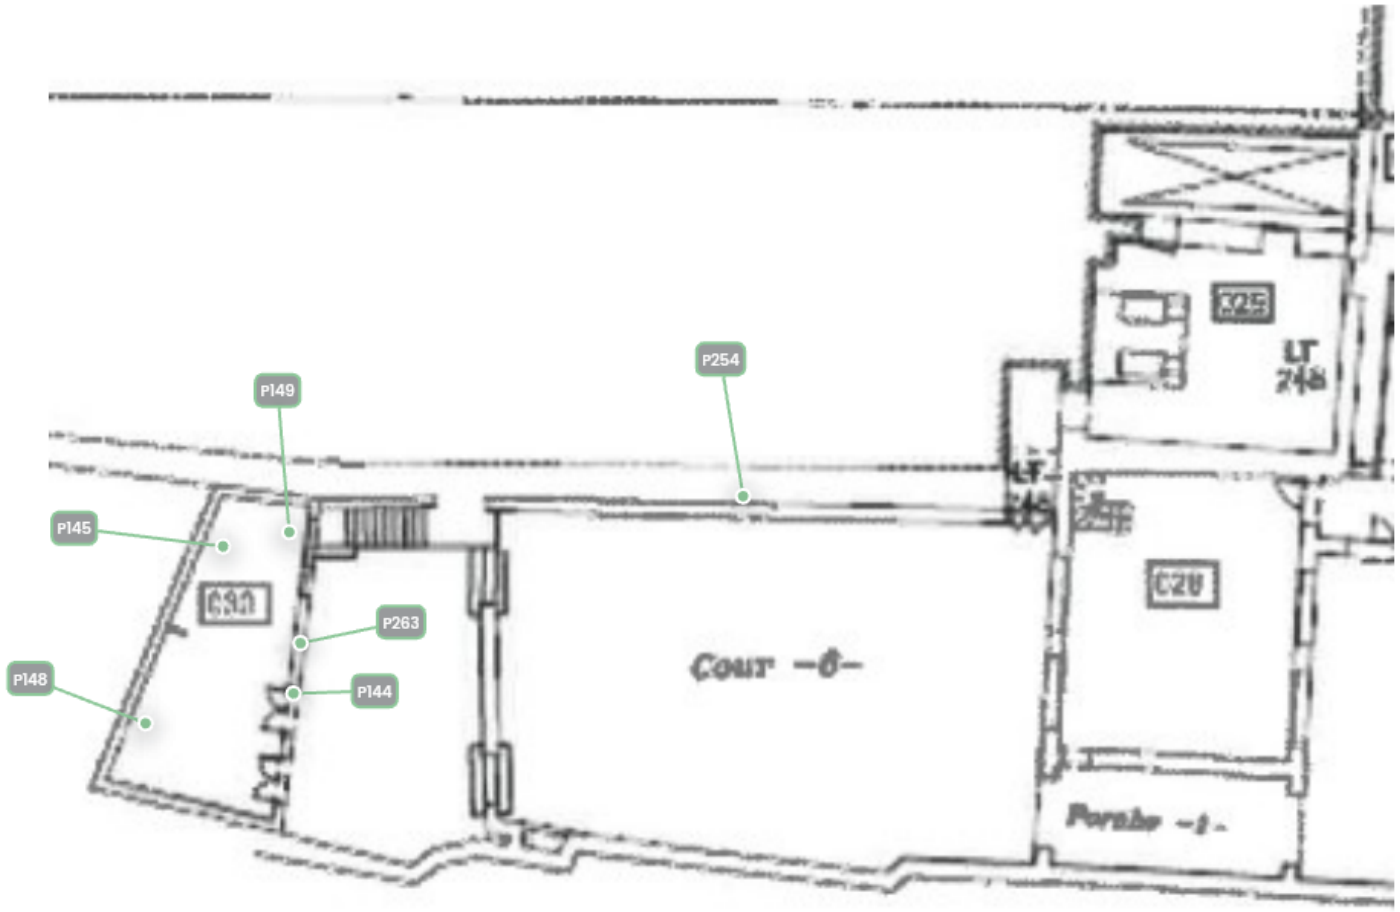

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > RDC > BATIMENT ZONE 2 - RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	38 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Inaccessibilité

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

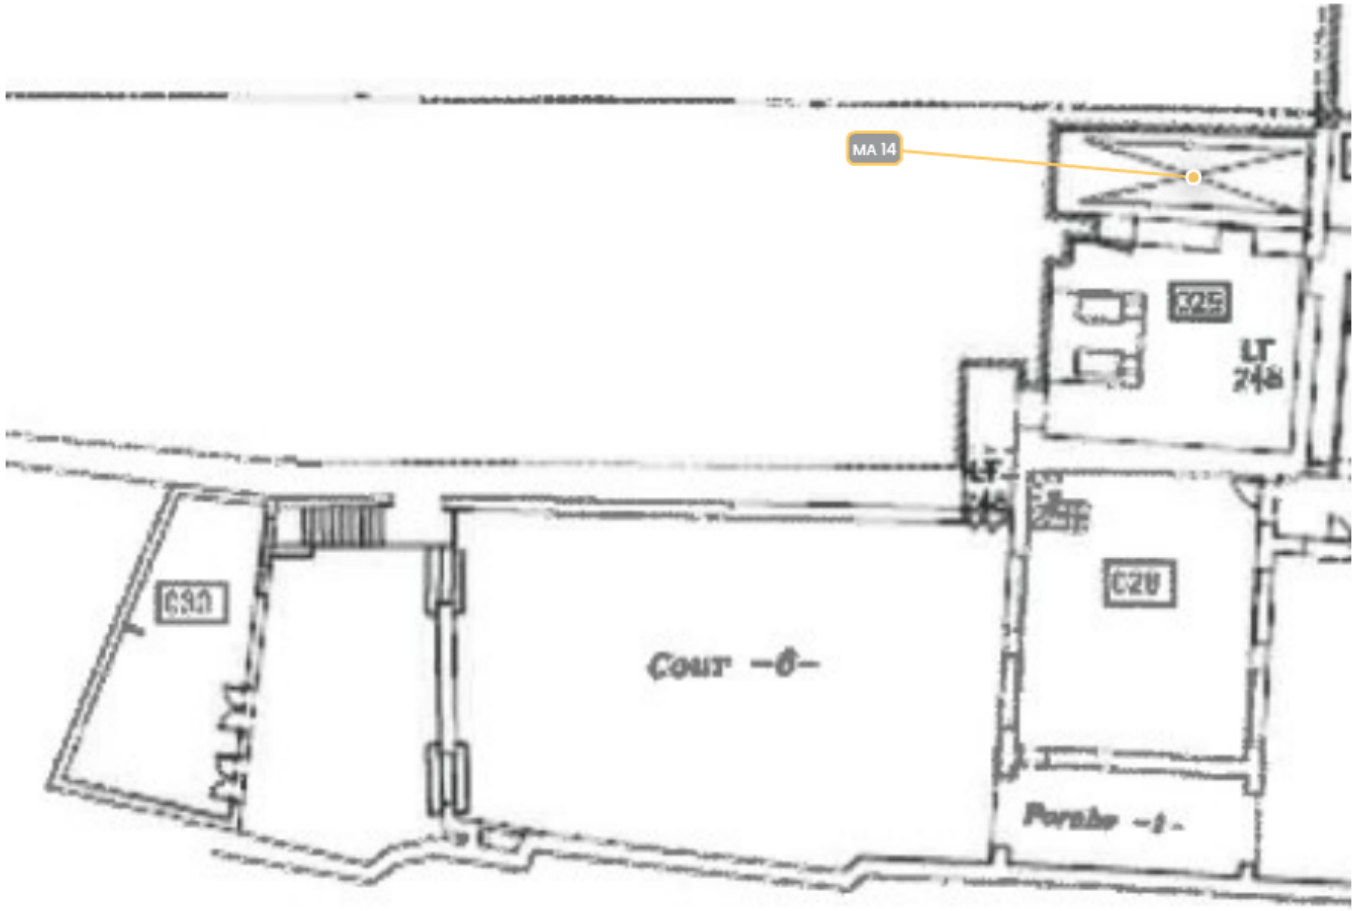

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	39 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

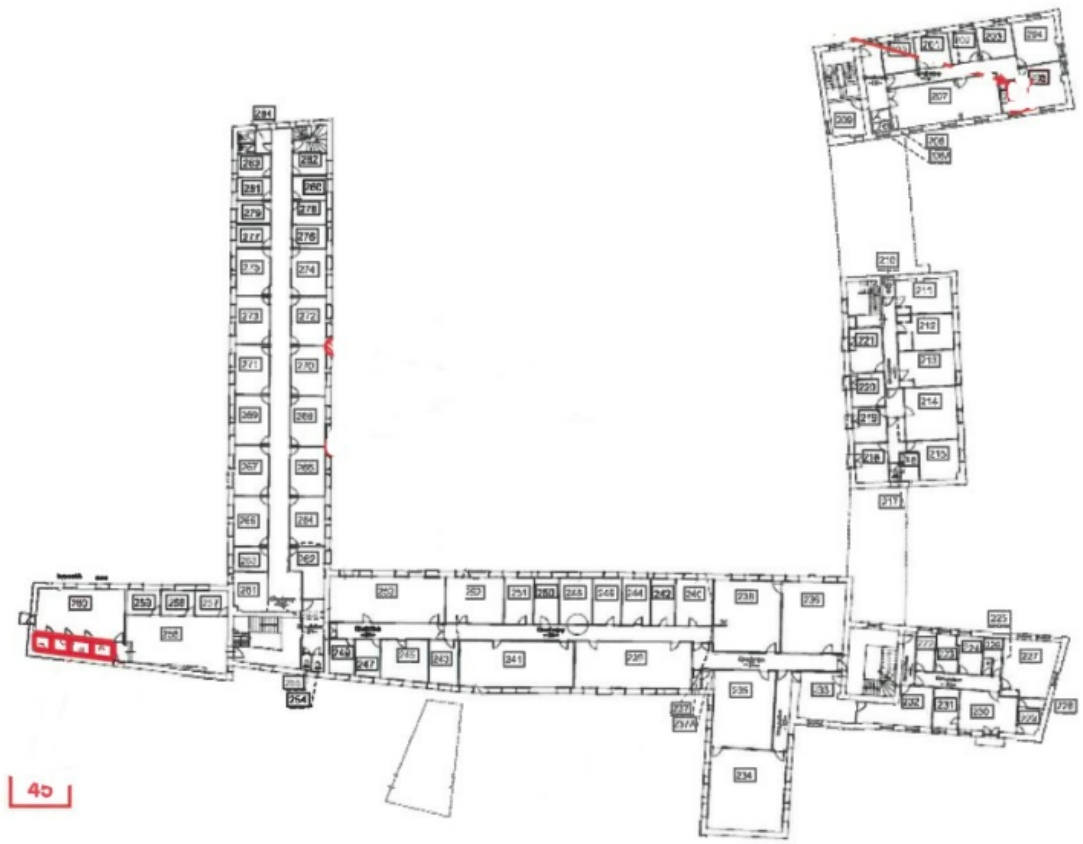

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 1 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	40 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

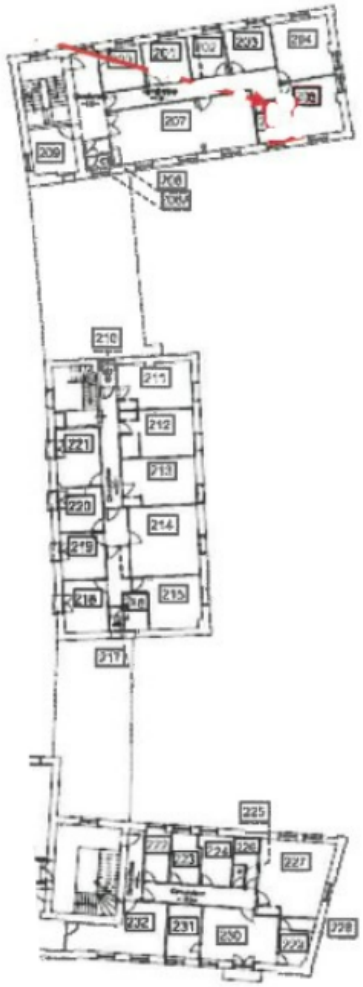

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 1 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	41 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Colles plinthe,Joints plinthe
- Colles faïence,Joints faïence
- Colles plinthe
- Plaques antivibratiles placards
- Colles carrelage,Joints carrelage

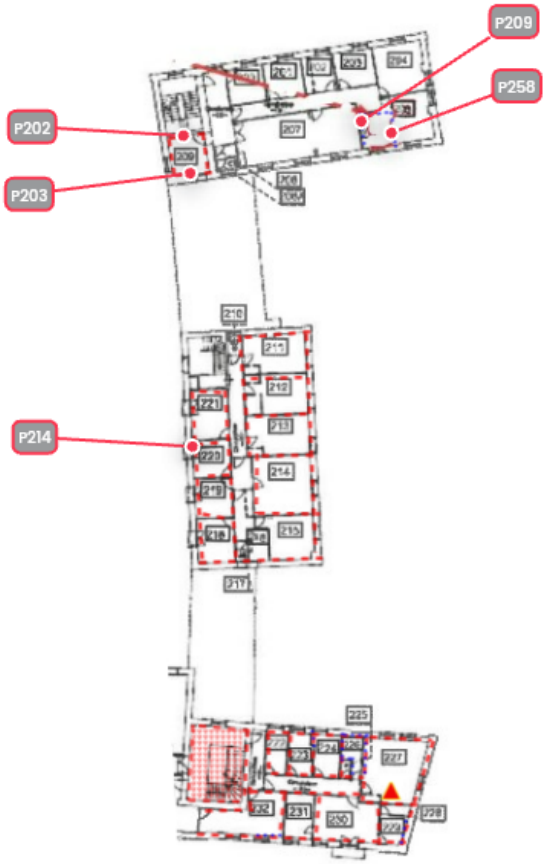

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

Date du rapport : 16/07/2026
Rapport N°:28777017/S1/1

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 1 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	42 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Sol

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

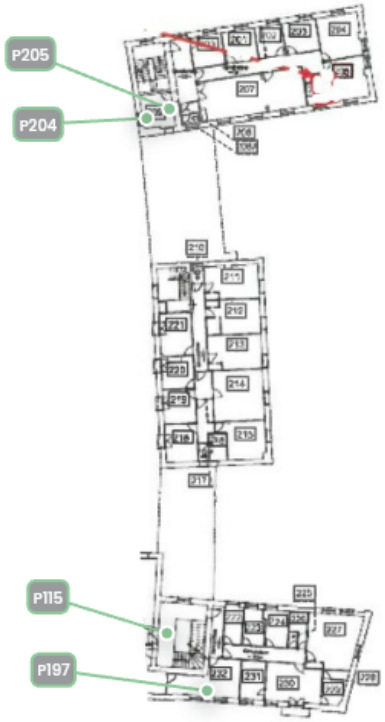

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 1 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	43 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 1 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	44 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

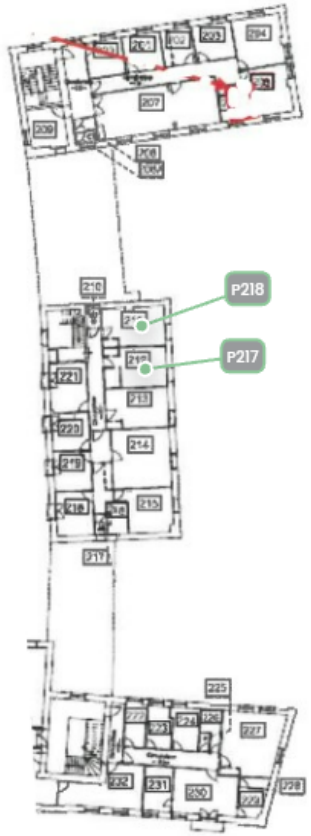

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 1 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	45 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Autre

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

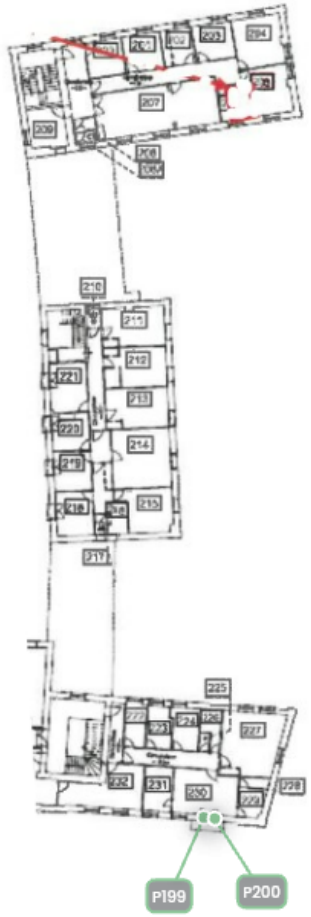

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 1 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	46 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Sondage

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 2 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	47 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

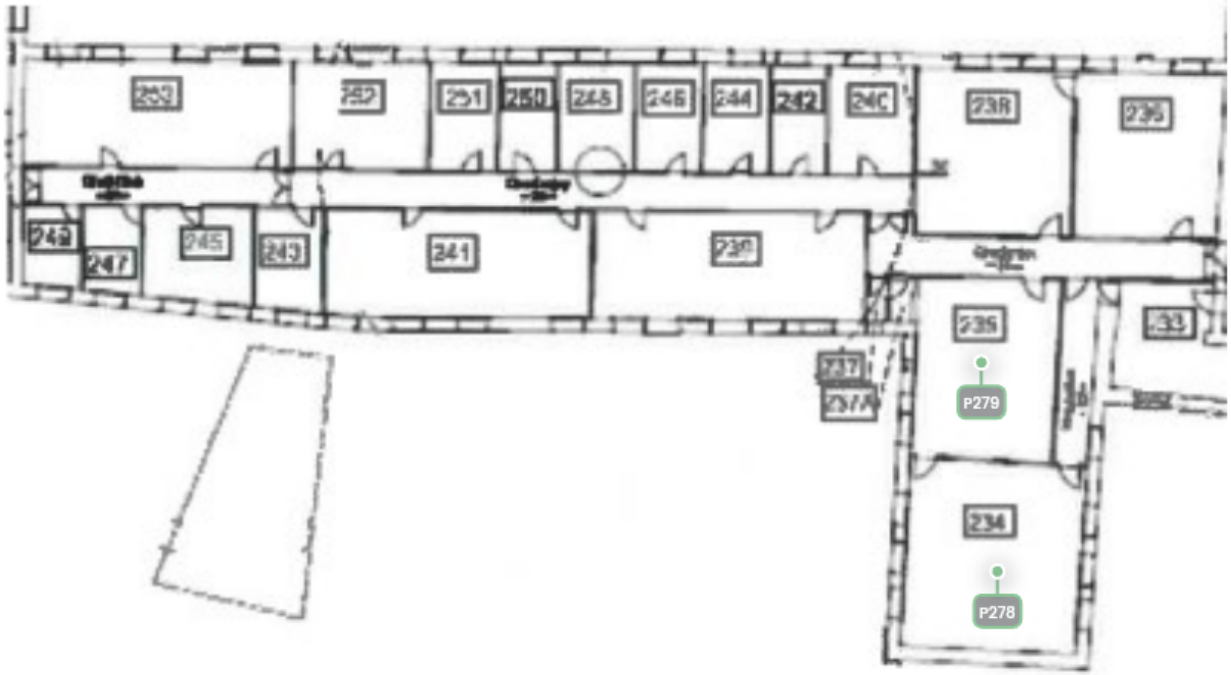

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 2 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	48 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Colles plinthe,Joints plinthe
- Colles faïence,Joints faïence
- Plaques antivibratiles placards



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 2 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	49 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Sol

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

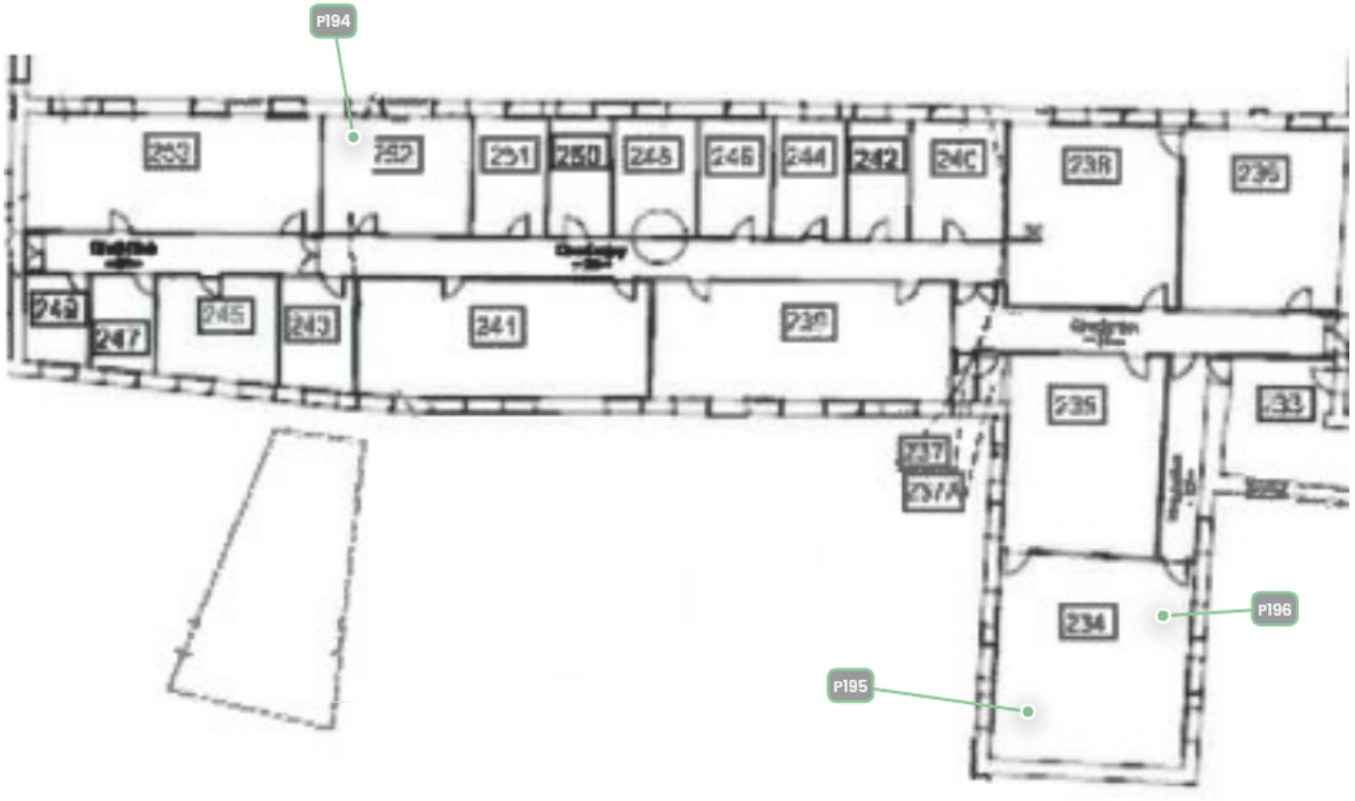

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 2 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	50 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

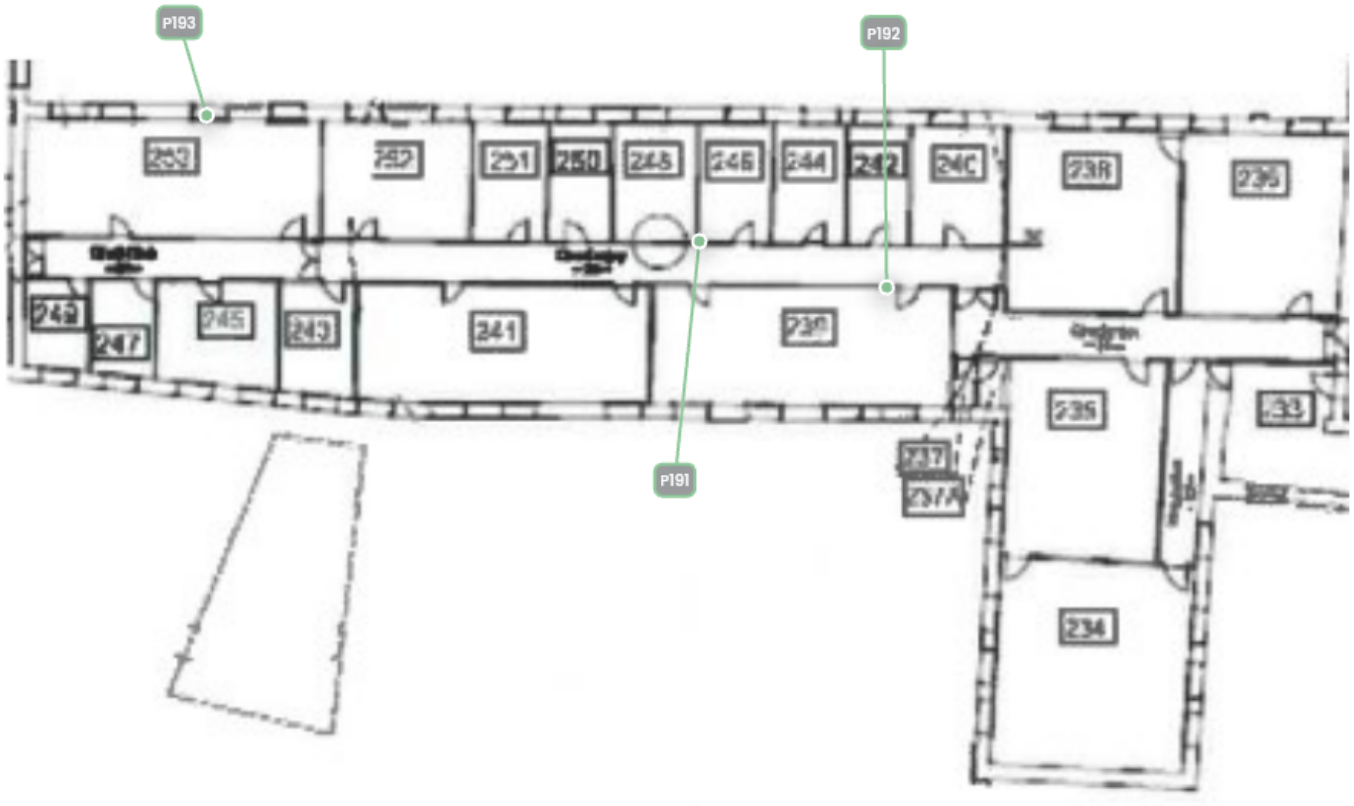

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 2 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	51 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Sondage

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

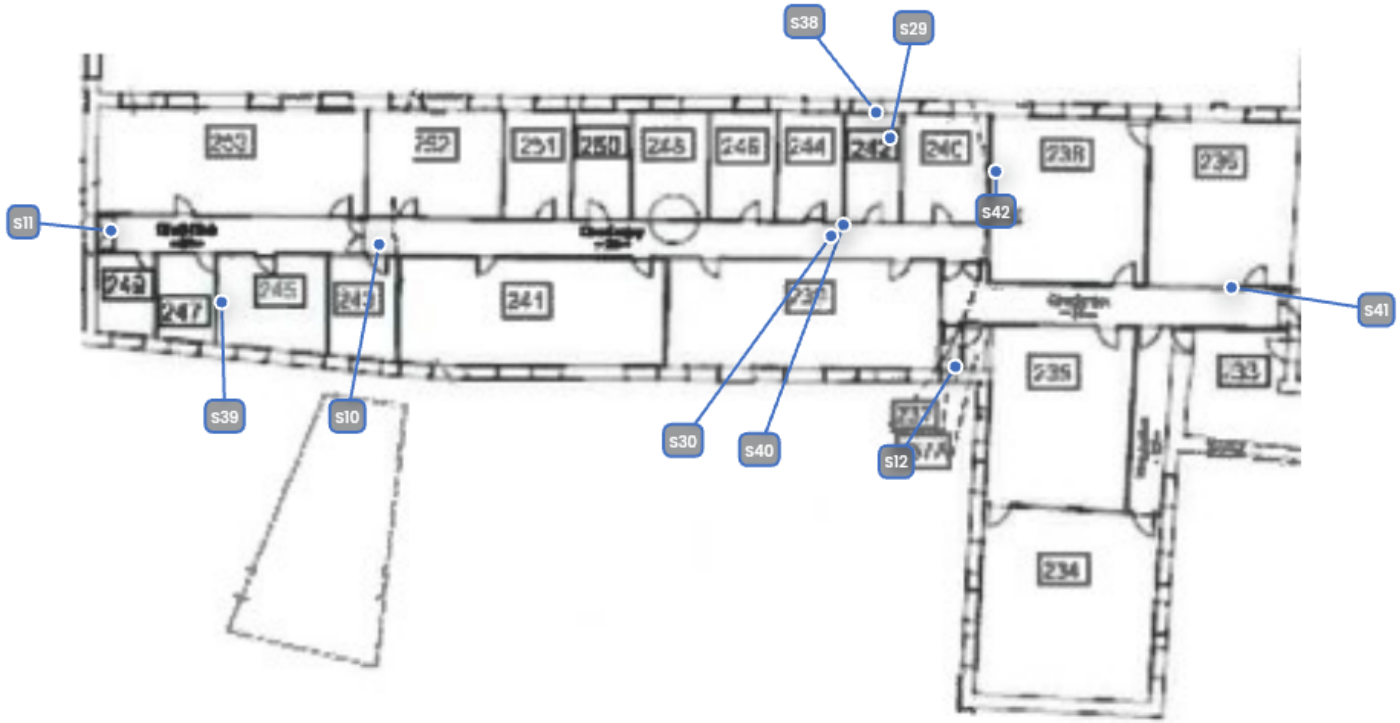

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 3 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	52 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

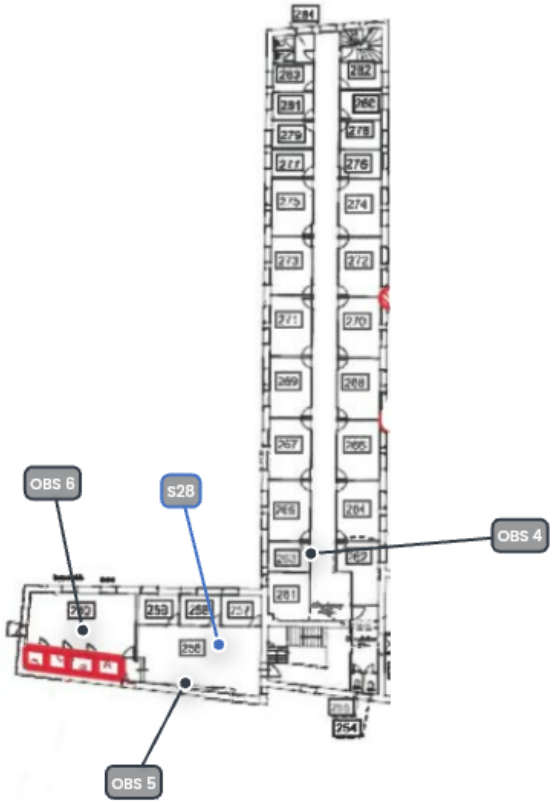

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 3 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	53 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Colles plinthe,Joints plinthe
- Colles faïence
- Conduits (Liste B)
- Mastic de vitrage

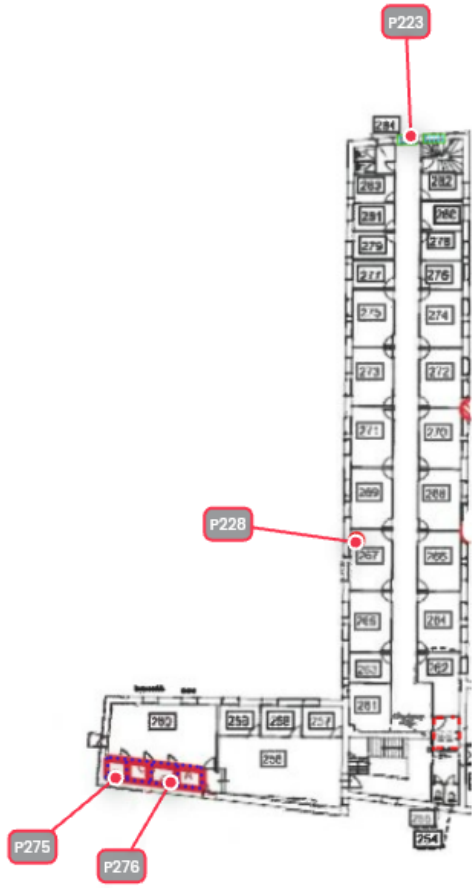

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

Date du rapport : 16/07/2026
Rapport N°:28777017/S1/1

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 3 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	54 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Sol

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

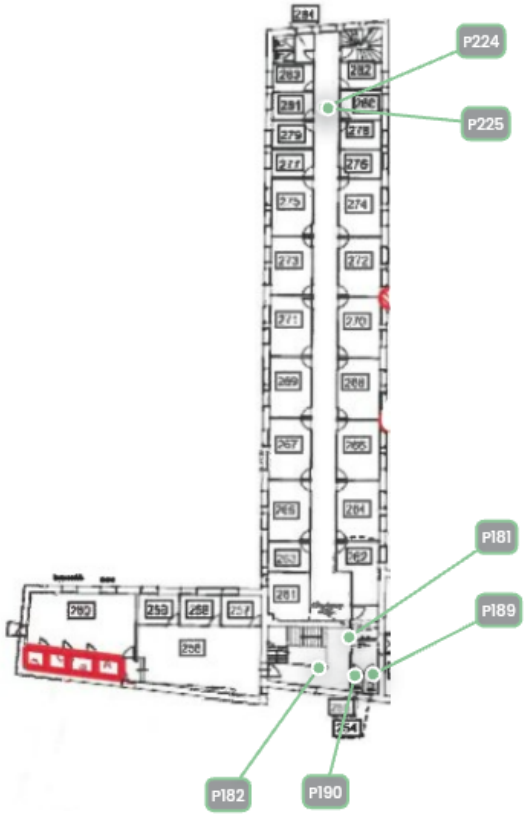

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 3 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	55 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

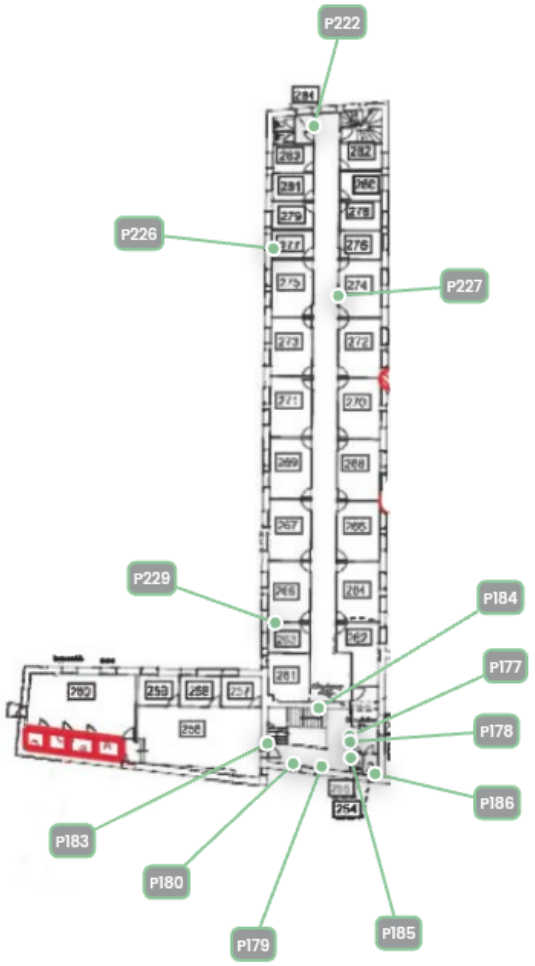

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+1 > BATIMENT ZONE 3 - R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	56 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Autre,Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

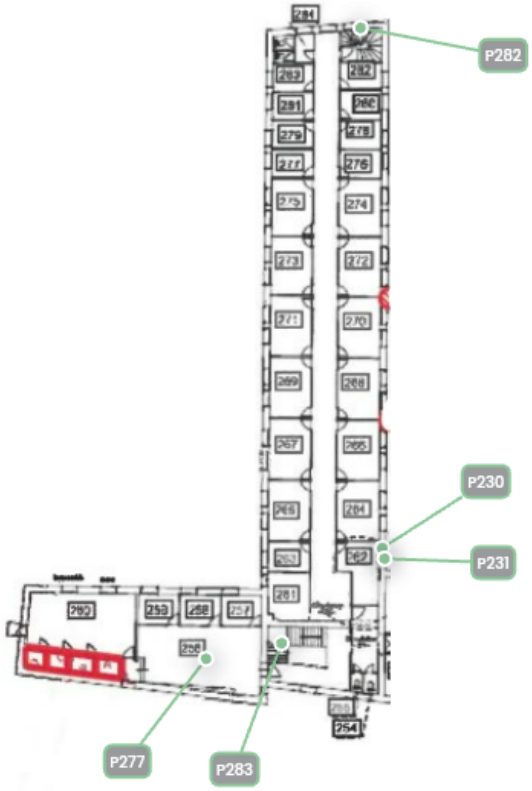

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+2	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	57 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+2 > BATIMENT ZONE 3 - R+2	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	58 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Conduits (Liste B)

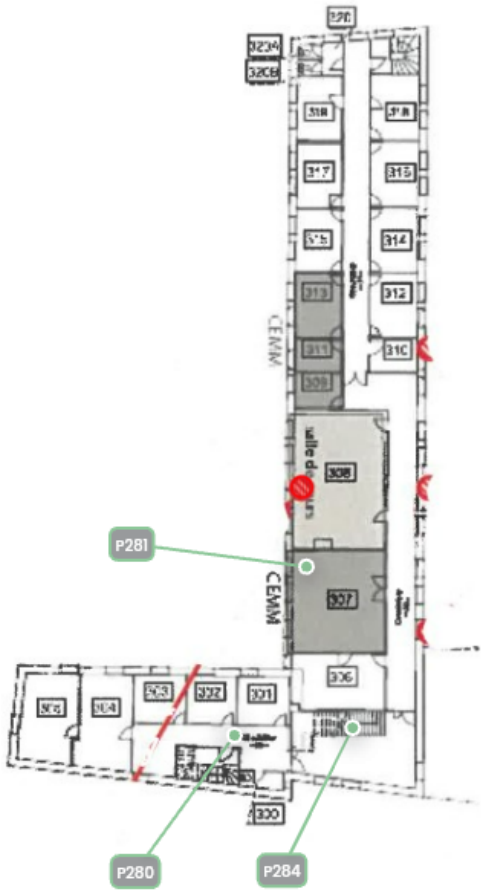

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+2 > BATIMENT ZONE 3 - R+2	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	59 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Sol

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

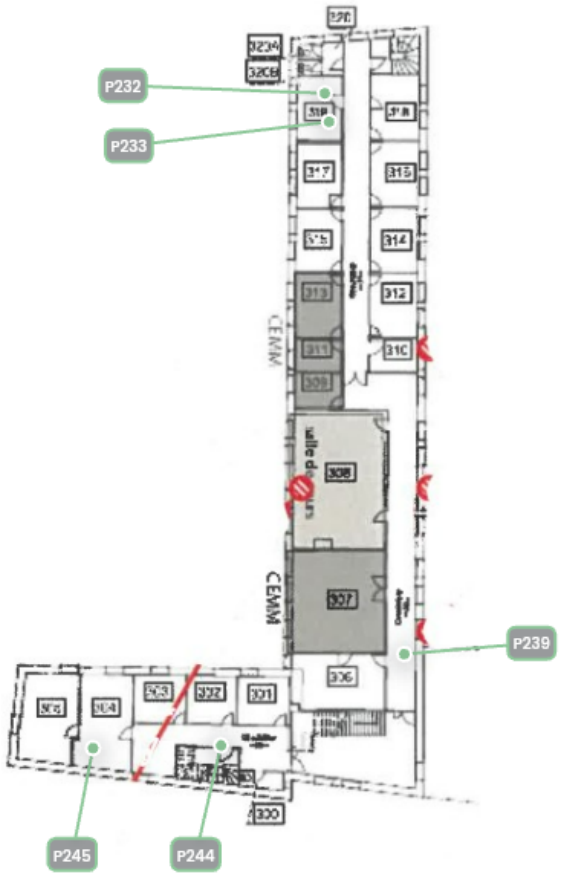

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+2 > BATIMENT ZONE 3 - R+2	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	60 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

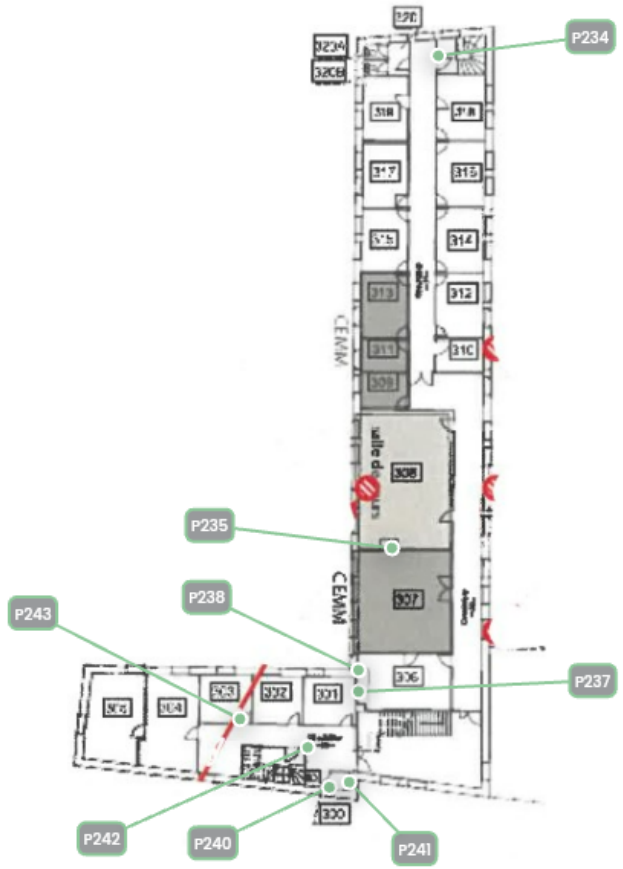

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+2 > BATIMENT ZONE 3 - R+2	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	61 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Autre

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

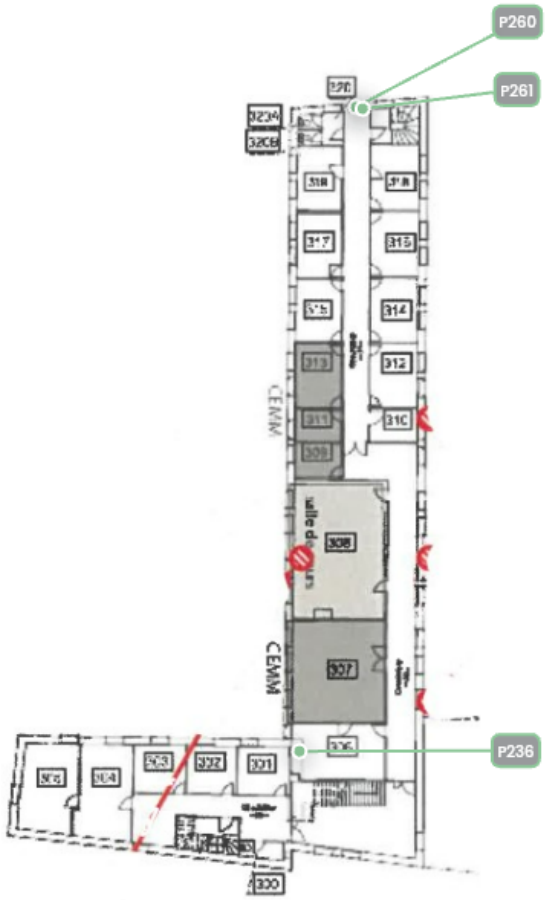

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > R+2 > BATIMENT ZONE 3 - R+2	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	62 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Sondage

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

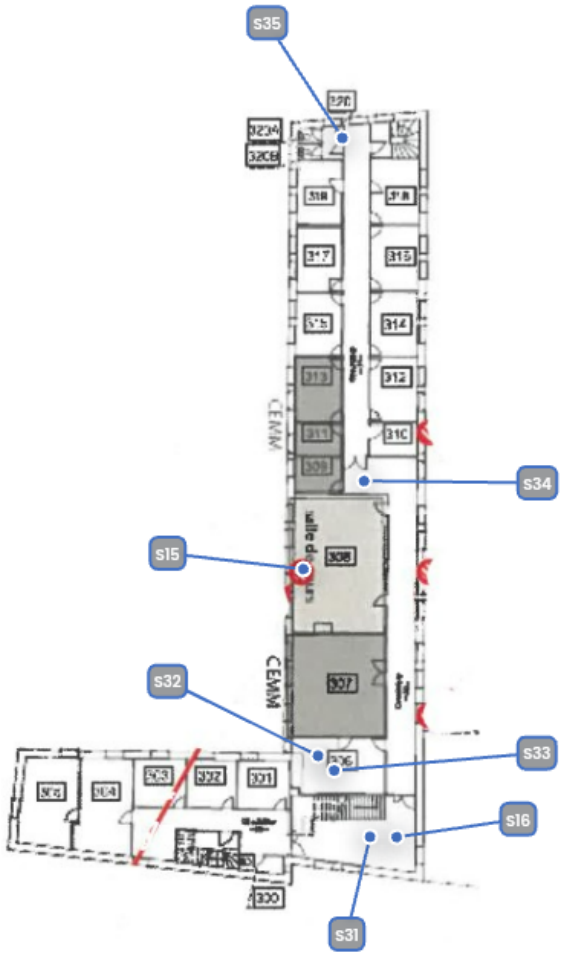

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation BATIMENT A B C > TOITURE ET COMBLES	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S1/1
	Planche	63 / 63
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Plaques fibrociment (Liste B)
- Conduits de fumée (Liste B)

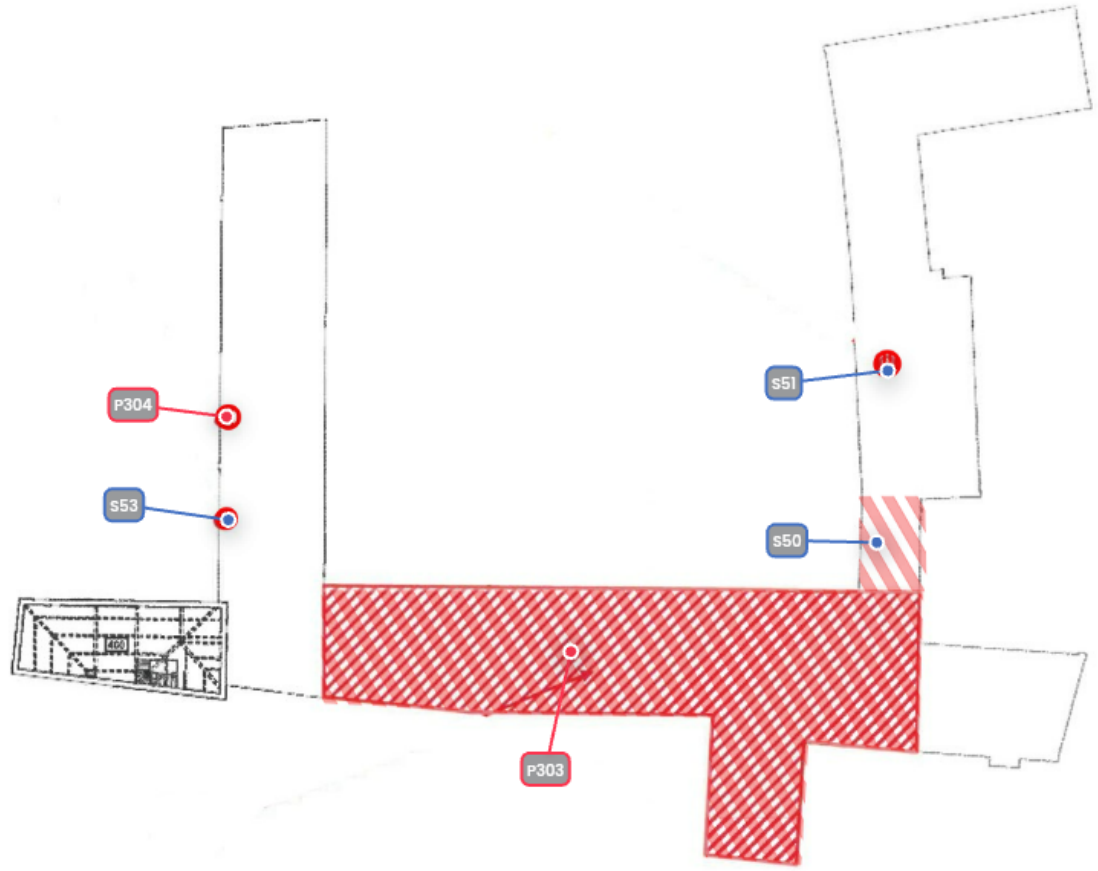

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

Date du rapport : 16/07/2026
Rapport N°:28777017/S1/1

7.9. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Madame Sabine HUET
450 Rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER

Notre référence : AR-25-KE-059778-01

Numéro de dossier : 25KE032440
Référence de dossier : 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25KE032440-001 - Référence *EUROFINS250000008496 Réf. Prel : P1 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-002 - Référence *EUROFINS250000008495 Réf. Prel : P2 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-003 - Référence *EUROFINS250000008493 Réf. Prel : P3 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-004 - Référence *EUROFINS250000008476 Réf. Prel : P4 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-005 - Référence *EUROFINS250000008491 Réf. Prel : P5 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-006 - Référence *EUROFINS250000008492 Réf. Prel : P6 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-007 - Référence *EUROFINS250000008490 Réf. Prel : P7 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-008 - Référence *EUROFINS250000008489 Réf. Prel : P8 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-009 - Référence *EUROFINS250000008488 Réf. Prel : P9 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-010 - Référence *EUROFINS250000008470 Réf. Prel : P10 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-011 - Référence *EUROFINS250000008471 Réf. Prel : P11 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-012 - Référence *EUROFINS250000008485 Réf. Prel : P12 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 133/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-013 - Référence *EUROFINS250000008484 Réf. Prel : P13 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 133/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-014 - Référence *EUROFINS250000008483 Réf. Prel : P14 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 133/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-015 - Référence *EUROFINS250000008487 Réf. Prel : P15 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-016 - Référence *EUROFINS250000008482 Réf. Prel : P16 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 134/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-017 - Référence *EUROFINS250000008478 Réf. Prel : P17 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-018 - Référence *EUROFINS250000008469 Réf. Prel : P18 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-019 - Référence *EUROFINS250000008473 Réf. Prel : P19 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-020 - Référence *EUROFINS250000008472 Réf. Prel : P20 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-021 - Référence *EUROFINS250000008474 Réf. Prel : P21 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-022 - Référence *EUROFINS250000008475 Réf. Prel : P22 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-023 - Référence *EUROFINS250000008468 Réf. Prel : P23 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 144/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-024 - Référence *EUROFINS250000008467 Réf. Prel : P24 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 142/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-025 - Référence *EUROFINS250000008466 Réf. Prel : P25 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 141/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-026 - Référence *EUROFINS250000008465 Réf. Prel : P26 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 144/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-027 - Référence *EUROFINS250000008463 Réf. Prel : P27 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 141/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-028 - Référence *EUROFINS250000008464 Réf. Prel : P28 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 141/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-029 - Référence *EUROFINS250000008461 Réf. Prel : P29 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 140/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-030 - Référence *EUROFINS250000008462 Réf. Prel : P30 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 141/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-031 - Référence *EUROFINS250000008459 Réf. Prel : P31 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-032 - Référence *EUROFINS250000008458 Réf. Prel : P32 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-033 - Référence *EUROFINS250000008457 Réf. Prel : P33 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Semi-dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-034 - Référence *EUROFINS250000008456 Réf. Prel : P34 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Semi-dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-035 - Référence *EUROFINS250000008454 Réf. Prel : P35 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-036 - Référence *EUROFINS250000008453 Réf. Prel : P36 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-037 - Référence *EUROFINS250000008455 Réf. Prel : P37 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Ragréages - (Ragréage/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-038 - Référence *EUROFINS250000008460 Réf. Prel : P38 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Ragréages - (Ragréage/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-039 - Référence *EUROFINS250000008452 Réf. Prel : P39 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-040 - Référence *EUROFINS250000008451 Réf. Prel : P40 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-041 - Référence *EUROFINS250000008450 Réf. Prel : P41 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-042 - Référence *EUROFINS250000008449 Réf. Prel : P42 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Gaines et coffres verticaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-043 - Référence *EUROFINS250000008448 Réf. Prel : P43 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Gaines et coffres verticaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-044 - Référence *EUROFINS250000008446 Réf. Prel : P44 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-045 - Référence *EUROFINS250000008447 Réf. Prel : P45 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-046 - Référence *EUROFINS250000008445 Réf. Prel : P46 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 146/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-047 - Référence *EUROFINS250000008443 Réf. Prel : P47 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 146/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-048 - Référence *EUROFINS250000008441 Réf. Prel : P48 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 146/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-049 - Référence *EUROFINS250000008442 Réf. Prel : P49 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 146/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-050 - Référence *EUROFINS250000008439 Réf. Prel : P50 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Eviers métalliques : Plaques souples bitumineuses antivibratiles - (Souple/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-051 - Référence *EUROFINS250000008435 Réf. Prel : P51 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-052 - Référence *EUROFINS250000008436 Réf. Prel : P52 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-053 - Référence *EUROFINS250000008437 Réf. Prel : P53 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Semi-dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-054 - Référence *EUROFINS250000008438 Réf. Prel : P54 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Semi-dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-055 - Référence *EUROFINS250000008434 Réf. Prel : P55 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-056 - Référence *EUROFINS250000008440 Réf. Prel : P56 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-057 - Référence *EUROFINS250000008433 Réf. Prel : P57 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-058 - Référence *EUROFINS250000008432 Réf. Prel : P58 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-059 - Référence *EUROFINS250000008431 Réf. Prel : P59 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Façades lourdes y compris poteaux : Peintures - (Pailleté/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-060 - Référence *EUROFINS250000008430 Réf. Prel : P60 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Façades lourdes y compris poteaux : Peintures - (Pailleté/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-061 - Référence *EUROFINS250000008429 Réf. Prel : P61 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-062 - Référence *EUROFINS250000008428 Réf. Prel : P62 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-063 - Référence *EUROFINS250000008349 Réf. Prel : P63 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 107/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-064 - Référence *EUROFINS250000008350 Réf. Prel : P64 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 107/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-065 - Référence *EUROFINS250000008351 Réf. Prel : P65 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 107/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-066 - Référence *EUROFINS250000008352 Réf. Prel : P66 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 107/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-067 - Référence *EUROFINS250000008357 Réf. Prel : P67 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 104/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-068 - Référence *EUROFINS250000008421 Réf. Prel : P68 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 104/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-069 - Référence *EUROFINS250000008420 Réf. Prel : P69 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 102/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-070 - Référence *EUROFINS250000008356 Réf. Prel : P70 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 105/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-071 - Référence *EUROFINS250000008355 Réf. Prel : P71 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 109/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-072 - Référence *EUROFINS250000008353 Réf. Prel : P72 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-073 - Référence *EUROFINS250000008354 Réf. Prel : P73 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 110/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-074 - Référence *EUROFINS250000008427 Réf. Prel : P74 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 110/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-075 - Référence *EUROFINS250000008426 Réf. Prel : P75 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 111/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-076 - Référence *EUROFINS250000008422 Réf. Prel : P76 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 111/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-077 - Référence *EUROFINS250000008423 Réf. Prel : P77 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 111/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-078 - Référence *EUROFINS250000008424 Réf. Prel : P78 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 111/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-079 - Référence *EUROFINS250000008425 Réf. Prel : P79 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 111/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-080 - Référence *EUROFINS250000008327 Réf. Prel : P80 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-081 - Référence *EUROFINS250000008358 Réf. Prel : P81 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-082 - Référence *EUROFINS250000008328 Réf. Prel : P82 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-083 - Référence *EUROFINS250000008332 Réf. Prel : P83 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-084 - Référence *EUROFINS250000008329 Réf. Prel : P84 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-085 - Référence *EUROFINS250000008330 Réf. Prel : P85 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-086 - Référence *EUROFINS250000008331 Réf. Prel : P86 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-087 - Référence *EUROFINS250000008333 Réf. Prel : P87 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-088 - Référence *EUROFINS250000008334 Réf. Prel : P88 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-089 - Référence *EUROFINS250000008337 Réf. Prel : P89 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 115/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-090 - Référence *EUROFINS250000008338 Réf. Prel : P90 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 115/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles bitumineuses - (Cassant/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-091 - Référence *EUROFINS250000008340 Réf. Prel : P91 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 116/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-092 - Référence *EUROFINS250000008339 Réf. Prel : P92 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 116/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles bitumineuses - (Cassant/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-093 - Référence *EUROFINS250000008341 Réf. Prel : P93 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de sol : Ragréages - (Fin/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-094 - Référence *EUROFINS250000008342 Réf. Prel : P94 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de sol : Ragréages - (Fin/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-095 - Référence *EUROFINS250000008335 Réf. Prel : P95 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 116/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fin/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-096 - Référence *EUROFINS250000008336 Réf. Prel : P96 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - DÉGAGEMENT 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fin/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-097 - Référence *EUROFINS250000008348 Réf. Prel : P97 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-098 - Référence *EUROFINS250000008347 Réf. Prel : P98 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-099 - Référence *EUROFINS250000008346 Réf. Prel : P99 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-100 - Référence *EUROFINS250000008345 Réf. Prel : P100 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-101 - Référence *EUROFINS250000067281 Réf. Prel : P101 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 117/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-102 - Référence *EUROFINS250000008344 Réf. Prel : P102 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 119/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-103 - Référence *EUROFINS250000008343 Réf. Prel : P103 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 118/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-104 - Référence *EUROFINS250000067280 Réf. Prel : P104 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 118/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-105 - Référence *EUROFINS250000067279 Réf. Prel : P105 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 119/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-106 - Référence *EUROFINS250000067275 Réf. Prel : P106 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 120/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-107 - Référence *EUROFINS250000067277 Réf. Prel : P107 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 120/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-108 - Référence *EUROFINS250000067287 Réf. Prel : P108 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 121/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-109 - Référence *EUROFINS250000067284 Réf. Prel : P109 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 121/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-110 - Référence *EUROFINS250000067283 Réf. Prel : P110 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 120/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-111 - Référence *EUROFINS250000067276 Réf. Prel : P111 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 120/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-112 - Référence *EUROFINS250000067286 Réf. Prel : P112 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-113 - Référence *EUROFINS250000067285 Réf. Prel : P113 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-114 - Référence *EUROFINS250000067274 Réf. Prel : P114 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-115 - Référence *EUROFINS250000067269 Réf. Prel : P115 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-116 - Référence *EUROFINS250000067165 Réf. Prel : P116 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-117 - Référence *EUROFINS250000067166 Réf. Prel : P117 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-118 - Référence *EUROFINS250000067167 Réf. Prel : P118 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-119 - Référence *EUROFINS250000067164 Réf. Prel : P119 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-120 - Référence *EUROFINS250000067163 Réf. Prel : P120 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-121 - Référence *EUROFINS250000067162 Réf. Prel : P121 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-122 - Référence *EUROFINS250000067161 Réf. Prel : P122 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-123 - Référence *EUROFINS250000067146 Réf. Prel : P123 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-124 - Référence *EUROFINS250000067147 Réf. Prel : P124 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-125 - Référence *EUROFINS250000067148 Réf. Prel : P125 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-126 - Référence *EUROFINS250000067152 Réf. Prel : P126 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 134/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-127 - Référence *EUROFINS250000067150 Réf. Prel : P127 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 133/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-128 - Référence *EUROFINS250000067144 Réf. Prel : P128 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 128/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-129 - Référence *EUROFINS250000067151 Réf. Prel : P129 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 128/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-130 - Référence *EUROFINS250000067145 Réf. Prel : P130 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 128/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-131 - Référence *EUROFINS250000067156 Réf. Prel : P131 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-132 - Référence *EUROFINS250000067157 Réf. Prel : P132 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 2/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-133 - Référence *EUROFINS240000041392 Réf. Prel : P133 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Lé/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-134 - Référence *EUROFINS240000041390 Réf. Prel : P134 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Lé/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-135 - Référence *EUROFINS250000067158 Réf. Prel : P135 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 113/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-136 - Référence *EUROFINS250000067159 Réf. Prel : P136 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-137 - Référence *EUROFINS250000067160 Réf. Prel : P137 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-138 - Référence *EUROFINS240000041391 Réf. Prel : P138 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-139 - Référence *EUROFINS250000067273 Réf. Prel : P139 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Lissé/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE032440-140 - Référence *EUROFINS250000067270 Réf. Prel : P140 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Lissé/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD SAS
Laboratoire Analyses Vergèze
75C Avenue de Pascalet
30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 — Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 —
Référence laboratoire N° : 25RB037055 — Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 — Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25KE032440-001 - EUROFINS250000088 96 Réf. Prel : P1 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	25KE032440-002 - EUROFINS250000088 95 Réf. Prel : P2 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / S7VS	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 |
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25KE032440-003 - EUROFINS250000008 93 Réf. Prel : P3 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL SANITAIRES/Revêtem nts de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (2)	25KE032440-004 - EUROFINS250000008 76 Réf. Prel : P4 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL SANITAIRES/Revêtem nts de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page3/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25KE032440-005 - EUROFINS250000008 91 Réf. Prel : P5 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25KE032440-006 - EUROFINS250000008 92 Réf. Prel : P6 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page4/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25KE032440-007 - EUROFINS250000008 90 Réf. Prel : P7 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25KE032440-008 - EUROFINS250000008 89 Réf. Prel : P8 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / S7VS	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page5/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009 (2)	25KE032440-009 - EUROFINS250000008 88 Réf. Prel : P9 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25KE032440-010 - EUROFINS250000008 70 Réf. Prel : P10 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page6/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	25KE032440-011 - EUROFINS250000008 71 Réf. Prel : P11 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (1)	25KE032440-012 - EUROFINS250000008 85 Réf. Prel : P12 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 133/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page7/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25KE032440-013 - EUROFINS250000008 84 Réf. Prel : P13 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 133/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Gris)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25KE032440-014 - EUROFINS250000008 83 Réf. Prel : P14 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 133/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page8/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	25KE032440-015 - EUROFINS250000008 87 Réf. Prel : P15 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25KE032440-016 - EUROFINS250000008 82 Réf. Prel : P16 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 134/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Gris)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page9/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25KE032440-017 - EUROFINS250000008 78 Réf. Prel : P17 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	25KE032440-018 - EUROFINS250000008 69 Réf. Prel : P18 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page10/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25KE032440-019 - EUROFINS250000008 73 Réf. Prel : P19 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL SANITAIRES/Revêtem nts de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
020	25KE032440-020 - EUROFINS250000008 72 Réf. Prel : P20 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page11/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25KE032440-021 - EUROFINS250000008 74 Réf. Prel : P21 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL SANITAIRES/Revêtem nts de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
022 (1)	25KE032440-022 - EUROFINS250000008 75 Réf. Prel : P22 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL SANITAIRES/Revêtem nts de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / S7VS	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page12/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023 (2)	25KE032440-023 - EUROFINS250000008 68 Réf. Prel : P23 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 144/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (2)	25KE032440-024 - EUROFINS250000008 67 Réf. Prel : P24 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 142/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01
Référence laboratoire N° : 25RB037055
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47
Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Date de réception :21/11/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25KE032440-025 - EUROFINS250000008 66 Réf. Prel : P25 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 141/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
026 (2)	25KE032440-026 - EUROFINS250000008 65 Réf. Prel : P26 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 144/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page14/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027 (2)	25KE032440-027 - EUROFINS250000008 63 Réf. Prel : P27 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 141/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (2)	25KE032440-028 - EUROFINS250000008 64 Réf. Prel : P28 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 141/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 |
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	25KE032440-029 - EUROFINS250000008 61 Réf. Prel : P29 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 140/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Marron)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25KE032440-030 - EUROFINS250000008 62 Réf. Prel : P30 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 141/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Marron)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page16/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	25KE032440-031 - EUROFINS250000008 59 Réf. Prel : P31 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)	Matériau dur (gris) ; matériau dur (rose)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25KE032440-032 - EUROFINS250000008 58 Réf. Prel : P32 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page17/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	25KE032440-033 - EUROFINS250000008 57 Réf. Prel : P33 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Semi-dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) en traces ; matériau dur (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25KE032440-034 - EUROFINS250000008 56 Réf. Prel : P34 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Semi-dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page18/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	25KE032440-035 - EUROFINS250000008 54 Réf. Prel : P35 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25KE032440-036 - EUROFINS250000008 53 Réf. Prel : P36 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page19/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	25KE032440-037 - EUROFINS250000008 55 Réf. Prel : P37 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Ragréages - (Ragréage/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25KE032440-038 - EUROFINS250000008 60 Réf. Prel : P38 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Revêtements de sol : Ragréages - (Ragréage/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page20/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	25KE032440-039 - EUROFINS250000008 52 Réf. Prel : P39 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	25KE032440-040 - EUROFINS250000008 51 Réf. Prel : P40 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page21/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	25KE032440-041 - EUROFINS250000008 50 Réf. Prel : P41 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25KE032440-042 - EUROFINS250000008 49 Réf. Prel : P42 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Gaines et coffres verticaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page22/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	25KE032440-043 - EUROFINS250000008 48 Réf. Prel : P43 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Gaines et coffres verticaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25KE032440-044 - EUROFINS250000008 46 Réf. Prel : P44 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page23/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	25KE032440-045 - EUROFINS250000008 47 Réf. Prel : P45 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25KE032440-046 - EUROFINS250000008 45 Réf. Prel : P46 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 146/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Bleu)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page24/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	25KE032440-047 - EUROFINS250000008 43 Réf. Prel : P47 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 146/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Bleu)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25KE032440-048 - EUROFINS250000008 41 Réf. Prel : P48 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 146/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page25/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	25KE032440-049 - EUROFINS250000008 42 Réf. Prel : P49 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 146/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25KE032440-050 - EUROFINS250000008 39 Réf. Prel : P50 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Eviers métalliques : Plaques souples bitumineuses antivibratiles - (Souple/Noir)	Matériau souple (transparent) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page26/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	25KE032440-051 - EUROFINS250000008 35 Réf. Prel : P51 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Revêteme nts de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / S7VS	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	25KE032440-052 - EUROFINS250000008 36 Réf. Prel : P52 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Revêteme nts de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page27/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	25KE032440-053 - EUROFINS250000008 37 Réf. Prel : P53 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Revêteme nts de sol : Colles de carrelage - (Semi-dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25KE032440-054 - EUROFINS250000008 38 Réf. Prel : P54 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Revêteme nts de sol : Colles de carrelage - (Semi-dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page28/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	25KE032440-055 - EUROFINS250000008 34 Réf. Prel : P55 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	25KE032440-056 - EUROFINS250000008 40 Réf. Prel : P56 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 145/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page29/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057	25KE032440-057 - EUROFINS250000008 33 Réf. Prel : P57 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	25KE032440-058 - EUROFINS250000008 32 Réf. Prel : P58 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page30/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059 (3)	25KE032440-059 - EUROFINS250000008 31 Réf. Prel : P59 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Façades lourdes y compris poteaux : Peintures - (Pailleté/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)(i)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
060 (2) (3)	25KE032440-060 - EUROFINS250000008 30 Réf. Prel : P60 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Façades lourdes y compris poteaux : Peintures - (Pailleté/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page31/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	25KE032440-061 - EUROFINS250000008 29 Réf. Prel : P61 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Plafonds Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25KE032440-062 - EUROFINS250000008 28 Réf. Prel : P62 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Plafonds Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page32/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	25KE032440-063 - EUROFINS250000008 49 Réf. Prel : P63 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 107/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige, Bleu)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type mousse (vert)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	25KE032440-064 - EUROFINS250000008 50 Réf. Prel : P64 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 107/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige, Bleu)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page33/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	25KE032440-065 - EUROFINS250000008 51 Réf. Prel : P65 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 107/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige, Bleu)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
066	25KE032440-066 - EUROFINS250000008 52 Réf. Prel : P66 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 107/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige, Bleu)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page34/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	25KE032440-067 - EUROFINS250000008 57 Réf. Prel : P67 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 104/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	25KE032440-068 - EUROFINS250000008 21 Réf. Prel : P68 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 104/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page35/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	25KE032440-069 - EUROFINS250000008 20 Réf. Prel : P69 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 102/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	25KE032440-070 - EUROFINS250000008 56 Réf. Prel : P70 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 105/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page36/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	25KE032440-071 - EUROFINS250000008 55 Réf. Prel : P71 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 109/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	25KE032440-072 - EUROFINS250000008 53 Réf. Prel : P72 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page37/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	25KE032440-073 - EUROFINS250000008 54 Réf. Prel : P73 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 110/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Bleu)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
074	25KE032440-074 - EUROFINS250000008 27 Réf. Prel : P74 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 110/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Bleu)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page38/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	25KE032440-075 - EUROFINS250000008 26 Réf. Prel : P75 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 111/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Marron)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	25KE032440-076 - EUROFINS250000008 22 Réf. Prel : P76 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 111/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Marron)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page39/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077	25KE032440-077 - EUROFINS250000008 23 Réf. Prel : P77 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 111/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	25KE032440-078 - EUROFINS250000008 24 Réf. Prel : P78 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 111/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page40/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	25KE032440-079 - EUROFINS250000008 25 Réf. Prel : P79 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 111/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	25KE032440-080 - EUROFINS250000008 27 Réf. Prel : P80 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page41/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	25KE032440-081 - EUROFINS250000008 58 Réf. Prel : P81 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	25KE032440-082 - EUROFINS250000008 28 Réf. Prel : P82 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page42/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	25KE032440-083 - EUROFINS250000008 32 Réf. Prel : P83 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	25KE032440-084 - EUROFINS250000008 29 Réf. Prel : P84 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page43/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085	25KE032440-085 - EUROFINS250000008 30 Réf. Prel : P85 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	25KE032440-086 - EUROFINS250000008 31 Réf. Prel : P86 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page44/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	25KE032440-087 - EUROFINS250000008 33 Réf. Prel : P87 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	25KE032440-088 - EUROFINS250000008 34 Réf. Prel : P88 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CUISINE/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) (foncé) en traces	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page45/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
089	25KE032440-089 - EUROFINS250000008 37 Réf. Prel : P89 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 115/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/Gris)	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090 (4)	25KE032440-090 - EUROFINS250000008 38 Réf. Prel : P90 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 115/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles bitumineuses - (Cassant/Bleu)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page46/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	25KE032440-091 - EUROFINS250000008 40 Réf. Prel : P91 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 116/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/Gris)	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092 (4)	25KE032440-092 - EUROFINS250000008 39 Réf. Prel : P92 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 116/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles bitumineuses - (Cassant/Bleu)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page47/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
093	25KE032440-093 - EUROFINS250000008 41 Réf. Prel : P93 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de sol : Ragréages - (Fin/Bleu)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	25KE032440-094 - EUROFINS250000008 42 Réf. Prel : P94 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de sol : Ragréages - (Fin/Bleu)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page48/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095	25KE032440-095 - EUROFINS250000008 35 Réf. Prel : P95 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 116/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fin/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	25KE032440-096 - EUROFINS250000008 36 Réf. Prel : P96 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - DÉGAGEMENT 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fin/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page49/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097 (1)	25KE032440-097 - EUROFINS250000008 48 Réf. Prel : P97 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	**MET** / S7VS	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
098	25KE032440-098 - EUROFINS250000008 47 Réf. Prel : P98 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page50/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099	25KE032440-099 - EUROFINS250000008 46 Réf. Prel : P99 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau souple (beige) + (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	25KE032440-100 - EUROFINS250000008 45 Réf. Prel : P100 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau souple (beige) + (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) en traces	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page51/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
101	25KE032440-101 - EUROFINS250000067 81 Réf. Prel : P101 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 117/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	25KE032440-102 - EUROFINS250000008 44 Réf. Prel : P102 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 119/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01
Référence laboratoire N° : 25RB037055
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47
Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Date de réception :21/11/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
103	25KE032440-103 - EUROFINS250000008 43 Réf. Prel : P103 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 118/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
104	25KE032440-104 - EUROFINS250000067 80 Réf. Prel : P104 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 118/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page53/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
105	25KE032440-105 - EUROFINS250000067 79 Réf. Prel : P105 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 119/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
106	25KE032440-106 - EUROFINS250000067 75 Réf. Prel : P106 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 120/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Bleu)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (orange)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page54/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
107	25KE032440-107 - EUROFINS250000067 77 Réf. Prel : P107 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 120/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Bleu)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (orange)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	25KE032440-108 - EUROFINS250000067 87 Réf. Prel : P108 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 121/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page55/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
109	25KE032440-109 - EUROFINS250000067 84 Réf. Prel : P109 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 121/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110	25KE032440-110 - EUROFINS250000067 83 Réf. Prel : P110 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 120/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page56/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
111	25KE032440-111 - EUROFINS250000067 76 Réf. Prel : P111 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 120/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112	25KE032440-112 - EUROFINS250000067 86 Réf. Prel : P112 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige)	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page57/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
113	25KE032440-113 - EUROFINS250000067 85 Réf. Prel : P113 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige)	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
114	25KE032440-114 - EUROFINS250000067 74 Réf. Prel : P114 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page58/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
115 (2)	25KE032440-115 - EUROFINS250000067 69 Réf. Prel : P115 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Beige)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	25KE032440-116 - EUROFINS250000067 65 Réf. Prel : P116 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (beige) en traces	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page59/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
117	25KE032440-117 - EUROFINS25000006766 Réf. Prel : P117 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	25KE032440-118 - EUROFINS25000006767 Réf. Prel : P118 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page60/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
119	25KE032440-119 - EUROFINS25000006764 Réf. Prel : P119 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	25KE032440-120 - EUROFINS25000006763 Réf. Prel : P120 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page61/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
121	25KE032440-121 - EUROFINS250000067 62 Réf. Prel : P121 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122	25KE032440-122 - EUROFINS250000067 61 Réf. Prel : P122 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page62/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123	25KE032440-123 - EUROFINS25000006746 Réf. Prel : P123 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124	25KE032440-124 - EUROFINS25000006747 Réf. Prel : P124 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page63/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
125	25KE032440-125 - EUROFINS25000006748 Réf. Prel : P125 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126	25KE032440-126 - EUROFINS25000006752 Réf. Prel : P126 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 134/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fibreux/)	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page64/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
127	25KE032440-127 - EUROFINS25000006750 Réf. Prel : P127 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 133/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fibreux/)	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
128	25KE032440-128 - EUROFINS25000006744 Réf. Prel : P128 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 128/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page65/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
129	25KE032440-129 - EUROFINS250000067 51 Réf. Prel : P129 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 128/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
130	25KE032440-130 - EUROFINS250000067 45 Réf. Prel : P130 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 128/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/)	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page66/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
131	25KE032440-131 - EUROFINS250000067 56 Réf. Prel : P131 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 129/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/)	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132	25KE032440-132 - EUROFINS250000067 57 Réf. Prel : P132 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 2/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page67/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
133	25KE032440-133 - EUROFINS240000041 92 Réf. Prel : P133 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Lé/Bleu)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134	25KE032440-134 - EUROFINS240000041 90 Réf. Prel : P134 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Lé/Bleu)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page68/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
135	25KE032440-135 - EUROFINS250000067 58 Réf. Prel : P135 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 113/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur matériau semi-dur (beige)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
136	25KE032440-136 - EUROFINS250000067 59 Réf. Prel : P136 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page69/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
137	25KE032440-137 - EUROFINS250000067 60 Réf. Prel : P137 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
138	25KE032440-138 - EUROFINS240000041 91 Réf. Prel : P138 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page70/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
139	25KE032440-139 - EUROFINS250000067 73 Réf. Prel : P139 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Lissé/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140	25KE032440-140 - EUROFINS250000067 70 Réf. Prel : P140 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Lissé/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 |
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

Observation(s) échantillon(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(4) Un matériau (fibreux) (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-058148-01 | Date d'émission de rapport : 27/11/2025 4:47 | Page72/72
Référence laboratoire N° : 25RB037055 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE032440
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 | Date de réception :21/11/2025
Date d'analyse : 25/11/2025
Référence dossier Client:25KE032440 - 1510797812/28777017/S1/1/3_28777017/1/1

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 72 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Benjamin LACOME
450 Rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER

Notre référence : AR-25-KE-062255-01

Numéro de dossier : 25KE033971
Référence de dossier : 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25KE033971-001 - Référence *EUROFINS250000061956 Réf. Prel : P142 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL DEGAGEMENT 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-002 - Référence *EUROFINS250000062053 Réf. Prel : P143 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-003 - Référence *EUROFINS250000062044 Réf. Prel : P144 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 033/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-004 - Référence *EUROFINS250000062047 Réf. Prel : P145 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 033/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Laine de verre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-005 - Référence *EUROFINS250000062043 Réf. Prel : P148 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 033/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-006 - Référence *EUROFINS250000062042 Réf. Prel : P149 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 033/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-007 - Référence *EUROFINS250000062055 Réf. Prel : P150 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 022/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-008 - Référence *EUROFINS250000061990 Réf. Prel : P151 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL O21/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-009 - Référence *EUROFINS250000062041 Réf. Prel : P152 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL O21/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-010 - Référence *EUROFINS250000061943 Réf. Prel : P153 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL DEGAGEMENT 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-011 - Référence *EUROFINS250000062050 Réf. Prel : P154 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL O21/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-012 - Référence *EUROFINS250000062051 Réf. Prel : P155 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 024/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-013 - Référence *EUROFINS250000062052 Réf. Prel : P156 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 028/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-014 - Référence *EUROFINS250000061942 Réf. Prel : P157 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL DEGAGEMENT 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-015 - Référence *EUROFINS250000061845 Réf. Prel : P158 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 08/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-016 - Référence *EUROFINS250000061988 Réf. Prel : P159 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-017 - Référence *EUROFINS250000061941 Réf. Prel : P160 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-018 - Référence *EUROFINS250000061888 Réf. Prel : P161 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 010/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-019 - Référence *EUROFINS250000061889 Réf. Prel : P162 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 010/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-020 - Référence *EUROFINS250000061986 Réf. Prel : P163 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 010/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits projetés (Liste B) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-021 - Référence *EUROFINS250000061985 Réf. Prel : P164 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 010/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-022 - Référence *EUROFINS250000061972 Réf. Prel : P165 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-023 - Référence *EUROFINS250000061987 Réf. Prel : P166 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits projetés (Liste B) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-024 - Référence *EUROFINS250000061975 Réf. Prel : P167 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 012/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-025 - Référence *EUROFINS250000061974 Réf. Prel : P168 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 014/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-026 - Référence *EUROFINS250000061976 Réf. Prel : P169 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 012/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Clair, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-027 - Référence *EUROFINS250000061977 Réf. Prel : P170 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 012/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Clair, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-028 - Référence *EUROFINS250000061983 Réf. Prel : P171 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-029 - Référence *EUROFINS250000061982 Réf. Prel : P172 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-030 - Référence *EUROFINS250000061981 Réf. Prel : P173 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-031 - Référence *EUROFINS250000061984 Réf. Prel : P174 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-032 - Référence *EUROFINS250000061980 Réf. Prel : P175 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 019/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-033 - Référence *EUROFINS250000061979 Réf. Prel : P176 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 016/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-034 - Référence *EUROFINS250000061966 Réf. Prel : P177 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-035 - Référence *EUROFINS250000061967 Réf. Prel : P178 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-036 - Référence *EUROFINS250000061968 Réf. Prel : P179 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-037 - Référence *EUROFINS250000061965 Réf. Prel : P180 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-038 - Référence *EUROFINS250000061973 Réf. Prel : P181 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-039 - Référence *EUROFINS250000061971 Réf. Prel : P182 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-040 - Référence *EUROFINS250000061846 Réf. Prel : P183 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-041 - Référence *EUROFINS250000061969 Réf. Prel : P184 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-042 - Référence *EUROFINS250000061962 Réf. Prel : P185 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 254/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Semi-dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-043 - Référence *EUROFINS250000061963 Réf. Prel : P186 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 254/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Semi-dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-044 - Référence *EUROFINS250000061964 Réf. Prel : P187 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-045 - Référence *EUROFINS250000061959 Réf. Prel : P188 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-046 - Référence *EUROFINS250000061958 Réf. Prel : P189 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-047 - Référence *EUROFINS250000061957 Réf. Prel : P190 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-048 - Référence *EUROFINS250000061886 Réf. Prel : P191 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-049 - Référence *EUROFINS250000061885 Réf. Prel : P192 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-050 - Référence *EUROFINS250000061960 Réf. Prel : P193 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 253/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-051 - Référence *EUROFINS250000061961 Réf. Prel : P194 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 252/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-052 - Référence *EUROFINS250000061872 Réf. Prel : P195 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 234/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-053 - Référence *EUROFINS250000061873 Réf. Prel : P196 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 234/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-054 - Référence *EUROFINS250000061874 Réf. Prel : P197 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 232/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-055 - Référence *EUROFINS250000061883 Réf. Prel : P198 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-056 - Référence *EUROFINS250000061881 Réf. Prel : P199 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 230/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-057 - Référence *EUROFINS250000061882 Réf. Prel : P200 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 230/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-058 - Référence *EUROFINS250000061875 Réf. Prel : P201 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 233/Portes de placard : Plaques souples bitumineuses antivibratiles - (Souple/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-059 - Référence *EUROFINS250000061877 Réf. Prel : P202 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-060 - Référence *EUROFINS250000061876 Réf. Prel : P203 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-061 - Référence *EUROFINS250000061879 Réf. Prel : P204 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-062 - Référence *EUROFINS250000061880 Réf. Prel : P205 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-063 - Référence *EUROFINS250000061878 Réf. Prel : P206 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-064 - Référence *EUROFINS250000061847 Réf. Prel : P207 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-066 - Référence *EUROFINS250000061849 Réf. Prel : P209 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - SDB/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-069 - Référence *EUROFINS250000059541 Réf. Prel : P212 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 220/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-070 - Référence *EUROFINS250000059543 Réf. Prel : P213 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 220/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-071 - Référence *EUROFINS250000059540 Réf. Prel : P214 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 220/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-072 - Référence *EUROFINS250000059538 Réf. Prel : P215 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 215/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-073 - Référence *EUROFINS250000059539 Réf. Prel : P216 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 215/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-074 - Référence *EUROFINS250000059542 Réf. Prel : P217 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 212/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-075 - Référence *EUROFINS250000059544 Réf. Prel : P218 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 211/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-077 - Référence *EUROFINS250000059519 Réf. Prel : P220 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-078 - Référence *EUROFINS250000059520 Réf. Prel : P221 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-079 - Référence *EUROFINS250000061858 Réf. Prel : P222 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 284/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-080 - Référence *EUROFINS240000044214 Réf. Prel : P223 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-081 - Référence *EUROFINS240000041379 Réf. Prel : P224 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-082 - Référence *EUROFINS250000061856 Réf. Prel : P225 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Beige)*, prélevé par vos soins, e analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-083 - Référence *EUROFINS250000059521 Réf. Prel : P226 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 277/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-084 - Référence *EUROFINS250000059518 Réf. Prel : P227 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-085 - Référence *EUROFINS250000061860 Réf. Prel : P228 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 267/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-086 - Référence *EUROFINS250000061859 Réf. Prel : P229 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 263/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-087 - Référence *EUROFINS250000061871 Réf. Prel : P230 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 262/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-088 - Référence *EUROFINS250000061851 Réf. Prel : P231 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 262/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-089 - Référence *EUROFINS250000061864 Réf. Prel : P232 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 318/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-090 - Référence *EUROFINS250000061852 Réf. Prel : P233 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 318/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-091 - Référence *EUROFINS240000041380 Réf. Prel : P234 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-092 - Référence *EUROFINS240000041381 Réf. Prel : P235 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 338/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-093 - Référence *EUROFINS250000061865 Réf. Prel : P236 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 336/Eviers métalliques : Plaques souples bitumineuses antivibratiles - (Semi-dur/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-094 - Référence *EUROFINS240000041382 Réf. Prel : P237 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 336/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-095 - Référence *EUROFINS240000041383 Réf. Prel : P238 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 336/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-096 - Référence *EUROFINS250000061861 Réf. Prel : P239 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Beige)*, prélevé par vos soins, e analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-097 - Référence *EUROFINS250000059522 Réf. Prel : P240 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 330/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-098 - Référence *EUROFINS250000059530 Réf. Prel : P241 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 330/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-099 - Référence *EUROFINS240000044216 Réf. Prel : P242 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-100 - Référence *EUROFINS240000044217 Réf. Prel : P243 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 333/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-101 - Référence *EUROFINS240000041385 Réf. Prel : P244 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Mortier/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-102 - Référence *EUROFINS240000041386 Réf. Prel : P245 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 334/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Mortier/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-103 - Référence *EUROFINS250000059523 Réf. Prel : P246 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL DEGAGEMENT 3/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Carton/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-104 - Référence *EUROFINS250000061978 Réf. Prel : P247 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 022/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Carton/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-105 - Référence *EUROFINS240000041378 Réf. Prel : P248 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL O21/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-106 - Référence *EUROFINS240000059532 Réf. Prel : P249 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL O21/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-107 - Référence *EUROFINS250000060594 Réf. Prel : P250 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-108 - Référence *EUROFINS250000060596 Réf. Prel : P251 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PORCHE 2/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Compact/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-109 - Référence *EUROFINS250000060595 Réf. Prel : P252 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PORCHE 2/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Compact/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-110 - Référence *EUROFINS250000060597 Réf. Prel : P253 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 133/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-111 - Référence *EUROFINS250000061844 Réf. Prel : P254 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 2 - COURS 6/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE033971-112 - Référence *EUROFINS250000061887 Réf. Prel : P255 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - COURS 1/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD SAS
Laboratoire Analyses Vergèze
75C Avenue de Pascalet
30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 — Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 —
Référence laboratoire N° : 25RB038676 — Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 — Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25KE033971-001 - EUROFINS250000061 56 Réf. Prel : P142 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL DEGAGEMENT 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25KE033971-002 - EUROFINS250000062 53 Réf. Prel : P143 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - ESCALIER 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 |
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003 (1)	25KE033971-003 - EUROFINS250000062 44 Réf. Prel : P144 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 033/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25KE033971-004 - EUROFINS250000062 47 Réf. Prel : P145 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 033/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Laine de verre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
005	25KE033971-005 - EUROFINS250000062 43 Réf. Prel : P148 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 033/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page3/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	25KE033971-006 - EUROFINS250000062(42 Réf. Prel : P149 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 033/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25KE033971-007 - EUROFINS250000062(55 Réf. Prel : P150 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 022/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (beige)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page4/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25KE033971-008 - EUROFINS250000061 90 Réf. Prel : P151 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL O21/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/Rouge)	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25KE033971-009 - EUROFINS250000062 41 Réf. Prel : P152 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL O21/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/Rouge)	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page5/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25KE033971-010 - EUROFINS250000061 43 Réf. Prel : P153 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL DEGAGEMENT 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25KE033971-011 - EUROFINS250000062 50 Réf. Prel : P154 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL O21/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page6/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25KE033971-012 - EUROFINS250000062 51 Réf. Prel : P155 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 024/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (2)	25KE033971-013 - EUROFINS250000062 52 Réf. Prel : P156 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 028/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (noir) en traces	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page7/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	25KE033971-014 - EUROFINS250000061 42 Réf. Prel : P157 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL DEGAGEMENT 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
015	25KE033971-015 - EUROFINS250000061 45 Réf. Prel : P158 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 08/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fibreux/)	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (violet) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page8/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25KE033971-016 - EUROFINS250000061 88 Réf. Prel : P159 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (noir)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25KE033971-017 - EUROFINS250000061 41 Réf. Prel : P160 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau (marron) en traces	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 — Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 — Page9/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 — Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 — Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	25KE033971-018 - EUROFINS250000061 88 Réf. Prel : P161 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 010/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
019	25KE033971-019 - EUROFINS250000061 89 Réf. Prel : P162 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 010/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page10/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25KE033971-020 - EUROFINS250000061 86 Réf. Prel : P163 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 010/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits projetés (Liste B) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25KE033971-021 - EUROFINS250000061 85 Réf. Prel : P164 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 010/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page11/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25KE033971-022 - EUROFINS250000061 72 Réf. Prel : P165 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
023	25KE033971-023 - EUROFINS250000061 87 Réf. Prel : P166 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits projetés (Liste B) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page12/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25KE033971-024 - EUROFINS250000061 75 Réf. Prel : P167 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 012/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Gris, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
025	25KE033971-025 - EUROFINS250000061 74 Réf. Prel : P168 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 014/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Gris, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page13/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25KE033971-026 - EUROFINS250000061 76 Réf. Prel : P169 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 012/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Clair, Bleu)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25KE033971-027 - EUROFINS250000061 77 Réf. Prel : P170 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 012/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Clair, Bleu)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page14/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25KE033971-028 - EUROFINS250000061 83 Réf. Prel : P171 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (rouge)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
029	25KE033971-029 - EUROFINS250000061 82 Réf. Prel : P172 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (orange)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page15/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25KE033971-030 - EUROFINS250000061 81 Réf. Prel : P173 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25KE033971-031 - EUROFINS250000061 84 Réf. Prel : P174 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page16/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25KE033971-032 - EUROFINS250000061 80 Réf. Prel : P175 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 019/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25KE033971-033 - EUROFINS250000061 79 Réf. Prel : P176 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 016/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page17/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	25KE033971-034 - EUROFINS250000061 66 Réf. Prel : P177 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25KE033971-035 - EUROFINS250000061 67 Réf. Prel : P178 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01
Référence laboratoire N° : 25RB038676
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17
Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Date de réception :08/12/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	25KE033971-036 - EUROFINS250000061 68 Réf. Prel : P179 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25KE033971-037 - EUROFINS250000061 65 Réf. Prel : P180 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page19/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25KE033971-038 - EUROFINS250000061 73 Réf. Prel : P181 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25KE033971-039 - EUROFINS250000061 71 Réf. Prel : P182 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page20/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25KE033971-040 - EUROFINS250000061 46 Réf. Prel : P183 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25KE033971-041 - EUROFINS250000061 69 Réf. Prel : P184 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page21/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	25KE033971-042 - EUROFINS250000061 62 Réf. Prel : P185 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 254/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Semi-dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25KE033971-043 - EUROFINS250000061 63 Réf. Prel : P186 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 254/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Semi-dur/Gris)	Matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page22/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	25KE033971-044 - EUROFINS250000061 64 Réf. Prel : P187 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
045 (1)	25KE033971-045 - EUROFINS250000061 59 Réf. Prel : P188 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page23/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	25KE033971-046 - EUROFINS250000061 58 Réf. Prel : P189 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25KE033971-047 - EUROFINS250000061 57 Réf. Prel : P190 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page24/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	25KE033971-048 - EUROFINS250000061 86 Réf. Prel : P191 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Noir)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049 (1) (3)	25KE033971-049 - EUROFINS250000061 85 Réf. Prel : P192 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page25/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	25KE033971-050 - EUROFINS250000061 60 Réf. Prel : P193 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 253/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Fibreux/)	Matériau souple fibreux de type moquette (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25KE033971-051 - EUROFINS250000061 61 Réf. Prel : P194 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 252/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau (pulvérulent) (noir)(i)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page26/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25KE033971-052 - EUROFINS250000061 72 Réf. Prel : P195 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 234/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25KE033971-053 - EUROFINS250000061 73 Réf. Prel : P196 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 234/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page27/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	25KE033971-054 - EUROFINS250000061 74 Réf. Prel : P197 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 232/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	25KE033971-055 - EUROFINS250000061 83 Réf. Prel : P198 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page28/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	25KE033971-056 - EUROFINS250000061 81 Réf. Prel : P199 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 230/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/Marron)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type joint (fibreux) (marron)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25KE033971-057 - EUROFINS250000061 82 Réf. Prel : P200 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 230/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/Marron)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (fibreux) (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page29/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058 (1)	25KE033971-058 - EUROFINS250000061 75 Réf. Prel : P201 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 233/Portes de placard : Plaques souples bitumineuses antivibratiles - (Souple/Noir)	Matériau souple (polymérisé) (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
059	25KE033971-059 - EUROFINS250000061 77 Réf. Prel : P202 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page30/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	25KE033971-060 - EUROFINS250000061 76 Réf. Prel : P203 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
061 (1)	25KE033971-061 - EUROFINS250000061 79 Réf. Prel : P204 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page31/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062 (1) (4)	25KE033971-062 - EUROFINS250000061 80 Réf. Prel : P205 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25KE033971-063 - EUROFINS250000061 78 Réf. Prel : P206 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page32/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	25KE033971-064 - EUROFINS250000061 47 Réf. Prel : P207 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 209/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (5)	25KE033971-066 - EUROFINS250000061 49 Réf. Prel : P209 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - SDB/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (blanc)	**MOLP** / FN5U	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page33/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	25KE033971-069 - EUROFINS250000059 41 Réf. Prel : P212 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 220/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	25KE033971-070 - EUROFINS250000059 43 Réf. Prel : P213 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 220/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) en traces	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page34/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	25KE033971-071 - EUROFINS250000059 40 Réf. Prel : P214 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 220/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
072	25KE033971-072 - EUROFINS250000059 38 Réf. Prel : P215 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 215/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page35/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	25KE033971-073 - EUROFINS250000059 39 Réf. Prel : P216 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 215/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	25KE033971-074 - EUROFINS250000059 42 Réf. Prel : P217 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 212/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page36/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	25KE033971-075 - EUROFINS250000059 44 Réf. Prel : P218 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 211/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	25KE033971-077 - EUROFINS250000059 19 Réf. Prel : P220 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page37/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078	25KE033971-078 - EUROFINS250000059 20 Réf. Prel : P221 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	25KE033971-079 - EUROFINS250000061 58 Réf. Prel : P222 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 284/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page38/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080	25KE033971-080 - EUROFINS240000044 14 Réf. Prel : P223 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
081	25KE033971-081 - EUROFINS240000041 79 Réf. Prel : P224 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page39/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
082	25KE033971-082 - EUROFINS250000061 56 Réf. Prel : P225 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	25KE033971-083 - EUROFINS250000059 21 Réf. Prel : P226 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 277/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Lissé/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page40/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084	25KE033971-084 - EUROFINS250000059 18 Réf. Prel : P227 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Marron)	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085 (6)	25KE033971-085 - EUROFINS250000061 60 Réf. Prel : P228 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 267/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/Beige, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page41/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	25KE033971-086 - EUROFINS250000061 59 Réf. Prel : P229 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 263/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	25KE033971-087 - EUROFINS250000061 71 Réf. Prel : P230 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 262/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/Rouge)	Matériau semi-dur de type joint (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page42/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
088	25KE033971-088 - EUROFINS250000061 51 Réf. Prel : P231 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 262/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/Rouge)	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	25KE033971-089 - EUROFINS250000061 64 Réf. Prel : P232 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 318/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Bleu)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 — Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 — Page43/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 — Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 — Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	25KE033971-090 - EUROFINS250000061 52 Réf. Prel : P233 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 318/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Bleu)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	25KE033971-091 - EUROFINS240000041 80 Réf. Prel : P234 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Marron)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page44/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
092	25KE033971-092 - EUROFINS240000041 81 Réf. Prel : P235 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 338/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	25KE033971-093 - EUROFINS250000061 65 Réf. Prel : P236 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 336/Eviers métalliques : Plaques souples bitumineuses antivibratiles - (Semi-dur/Noir)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page45/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	25KE033971-094 - EUROFINS240000041 82 Réf. Prel : P237 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 336/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	25KE033971-095 - EUROFINS240000041 83 Réf. Prel : P238 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 336/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page46/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
096	25KE033971-096 - EUROFINS250000061 61 Réf. Prel : P239 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	25KE033971-097 - EUROFINS250000059 22 Réf. Prel : P240 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 330/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Rose	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page47/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
098	25KE033971-098 - EUROFINS250000059 30 Réf. Prel : P241 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 330/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Rose	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	25KE033971-099 - EUROFINS240000044 16 Réf. Prel : P242 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page48/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	25KE033971-100 - EUROFINS240000044 17 Réf. Prel : P243 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 333/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
101	25KE033971-101 - EUROFINS240000041 85 Réf. Prel : P244 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Mortier/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page49/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102	25KE033971-102 - EUROFINS240000041 86 Réf. Prel : P245 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - LOCAL 334/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Mortier/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	25KE033971-103 - EUROFINS250000059 23 Réf. Prel : P246 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL DEGAGEMENT 3/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Carton/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)(ii)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page50/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104	25KE033971-104 - EUROFINS250000061 78 Réf. Prel : P247 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 022/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Carton/)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)(iii)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (beige)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
105	25KE033971-105 - EUROFINS240000041 78 Réf. Prel : P248 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL O21/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Rouge)	Matériau semi-dur de type joint (rouge) + (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page51/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
106	25KE033971-106 - EUROFINS240000059 32 Réf. Prel : P249 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL O21/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Rouge)	Matériau semi-dur de type joint (rouge) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107	25KE033971-107 - EUROFINS250000060 94 Réf. Prel : P250 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Dur/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (clair)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page52/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108	25KE033971-108 - EUROFINS250000060 96 Réf. Prel : P251 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PORCHE 2/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Compact/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109	25KE033971-109 - EUROFINS250000060 95 Réf. Prel : P252 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PORCHE 2/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Compact/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page53/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
110	25KE033971-110 - EUROFINS250000060 97 Réf. Prel : P253 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 133/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Dur/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	25KE033971-111 - EUROFINS250000061 44 Réf. Prel : P254 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 2 - COURS 6/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Dur/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 |
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
112	25KE033971-112 - EUROFINS250000061 87 Réf. Prel : P255 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - COURS 1/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Dur/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(3) La totalité du matériau semi-dur (beige) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(4) La totalité du matériau dur de type joint ciment (gris) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(5) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (blanc). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(iii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-060281-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 14:17 | Page55/55
Référence laboratoire N° : 25RB038676 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE033971
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 15/12/2025
Référence dossier Client:25KE033971 - 1510797812/28777017/S1/1/5_28777017/1/1

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Benjamin LACOME
450 Rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-062691-01 | Date d'émission de rapport : 18/12/2025 20:35 | Page1/5
Dossier N° : 25KE034956 | Date de réception : 17/12/2025 | Date d'analyse : 17/12/2025
Référence dossier Client:1510797812/28777017/S1/1/6_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	EUROFINS240000097249 Réf. Prel : P256 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	**MET** * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	EUROFINS240000097251 Réf. Prel : P257 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - CIRCULATION 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	**MET** * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-062691-01 | Date d'émission de rapport : 18/12/2025 20:35 | Page2/5
Dossier N° : 25KE034956 | Date de réception : 17/12/2025 | Date d'analyse : 17/12/2025
Référence dossier Client:1510797812/28777017/S1/1/6_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	EUROFINS240000097250 Réf. Prel : P258 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - SDB/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	EUROFINS240000041469 Réf. Prel : P259 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - PASSAGE EXTERIEUR/Façades lourdes y compris poteaux : Peintures - (Pailleté/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-062691-01 | Date d'émission de rapport : 18/12/2025 20:35 | Page3/5
Dossier N° : 25KE034956 | Date de réception : 17/12/2025 | Date d'analyse : 17/12/2025
Référence dossier Client:1510797812/28777017/S1/1/6_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	EUROFINS24000009 7248 Réf. Prel : P260 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Menuiseries intérieures : Joints d'étanchéité - (Compact/)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type joint (jaune)	**MET** * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	EUROFINS25000006 7840 Réf. Prel : P261 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - CIRCULATION 1/Menuiseries intérieures : Joints d'étanchéité - (Compact/)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type joint (jaune)	**MET** * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-062691-01 | Date d'émission de rapport : 18/12/2025 20:35 | Page4/5
Dossier N° : 25KE034956 | Date de réception : 17/12/2025 | Date d'analyse : 17/12/2025
Référence dossier Client:1510797812/28777017/S1/1/6_28777017/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	EUROFINS250000059537 Réf. Prel : P262 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 1 - LOCAL 212/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	EUROFINS250000062046 Réf. Prel : P263 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE (1) - BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 2 - LOCAL 033/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Dur/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)(ii)	**MET** * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées (l<3 µm) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres sont de nature non-asbestiforme

Observation(s) couche(s)

(i) Des fibres minérales asbestiformes inhalables (l < 3µm) ont été observées au sein de la couche/échantillon. Ces fibres, non amiantées, sont suspectées d'être de nature gypse. Elles ont pu être différenciées des amiantes par diff.

(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-062691-01 | Date d'émission de rapport : 18/12/2025 20:35 | Page5/5
Dossier N° : 25KE034956 | Date de réception : 17/12/2025 | Date d'analyse : 17/12/2025
Référence dossier Client:1510797812/28777017/S1/1/6_28777017/1/1

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Marie VIGOUROUX
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Benjamin LACOME
450 Rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER

Notre référence : AR-26-KE-015466-01

Numéro de dossier : 26KE009961
Référence de dossier : 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26KE009961-001 - Référence *EUROFINS250000068447 Réf. Prel : P264 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - CIRCULATION 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-002 - Référence *EUROFINS250000068446 Réf. Prel : P265 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN - CIRCULATION 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-003 - Référence *EUROFINS250000068445 Réf. Prel : P266 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 129/Plafonds : Plots de colle / Plaques (Liste A) - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-004 - Référence *EUROFINS250000068444 Réf. Prel : P267 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 130/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-005 - Référence *EUROFINS250000068443 Réf. Prel : P268 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-006 - Référence *EUROFINS250000068442 Réf. Prel : P269 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 131/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-007 - Référence *EUROFINS250000068440 Réf. Prel : P270 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Sous-couches des revêtements souples - (Semi-dur/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-008 - Référence *EUROFINS250000068441 Réf. Prel : P271 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Sous-couches des revêtements souples - (Semi-dur/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-009 - Référence *EUROFINS250000068438 Réf. Prel : P272 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-010 - Référence *EUROFINS250000068439 Réf. Prel : P273 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-011 - Référence *EUROFINS250000068437 Réf. Prel : P274 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-012 - Référence *EUROFINS250000068436 Réf. Prel : P275 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - R+1 - LOCAL 260/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-013 - Référence *EUROFINS250000068435 Réf. Prel : P276 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - R+1 - LOCAL 260/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-014 - Référence *EUROFINS250000068434 Réf. Prel : P277 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - R+1 - LOCAL 256/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-015 - Référence *EUROFINS250000068432 Réf. Prel : P278 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - R+1 - LOCAL 234/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-016 - Référence *EUROFINS250000068431 Réf. Prel : P279 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - R+1 - LOCAL 236/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-017 - Référence *EUROFINS250000068433 Réf. Prel : P280 BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - R+2 - ESCALIER 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-018 - Référence *EUROFINS250000068430 Réf. Prel : P281 BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - R+2 - LOCAL 337/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-019 - Référence *EUROFINS250000068429 Réf. Prel : P282 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - R+1 - ESCALIER 1/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-020 - Référence *EUROFINS250000068427 Réf. Prel : P283 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - R+1 - ESCALIER 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-021 - Référence *EUROFINS250000068428 Réf. Prel : P284 BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - R+2 - ESCALIER 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-022 - Référence *EUROFINS250000068506 Réf. Prel : P285 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL SANITAIRES/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Fibres-ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-023 - Référence *EUROFINS250000311834 Réf. Prel : P286 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 07/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-024 - Référence *EUROFINS250000061192 Réf. Prel : P287 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 07/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-025 - Référence *EUROFINS250000061191 Réf. Prel : P288 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 07/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-026 - Référence *EUROFINS250000311833 Réf. Prel : P289 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-027 - Référence *EUROFINS250000311824 Réf. Prel : P290 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-028 - Référence *EUROFINS250000311825 Réf. Prel : P291 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-029 - Référence *EUROFINS250000311827 Réf. Prel : P292 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-030 - Référence *EUROFINS250000311826 Réf. Prel : P293 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-031 - Référence *EUROFINS250000311829 Réf. Prel : P294 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses - (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-032 - Référence *EUROFINS250000311828 Réf. Prel : P295 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses - (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-033 - Référence *EUROFINS250000311832 Réf. Prel : P296 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-034 - Référence *EUROFINS250000311831 Réf. Prel : P297 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-035 - Référence *EUROFINS250000311840 Réf. Prel : P298 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 020/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Semi-dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-036 - Référence *EUROFINS250000311841 Réf. Prel : P299 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 020/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Semi-dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-037 - Référence *EUROFINS250000311837 Réf. Prel : P300 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 020/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Semi-dur/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-038 - Référence *EUROFINS250000311842 Réf. Prel : P301 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 020/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Semi-dur/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-039 - Référence *EUROFINS250000311843 Réf. Prel : P302 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN - ESCALIER 2/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-040 - Référence *EUROFINS250000068509 Réf. Prel : P303 BATIMENT A B C - TOITURE ET COMBLES/Toitures : Plaques en fibres-ciment (Liste B) - (Semi-dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-041 - Référence *EUROFINS250000068452 Réf. Prel : P304 BATIMENT A B C - TOITURE ET COMBLES/Conduits en toiture : Conduits de fumée (Liste B) - (Fibres-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-042 - Référence *EUROFINS250000068451 Réf. Prel : P305 BATIMENT A B C - FAÇADES/Conduits en façade : Conduits d'eaux pluviales (Liste B) - (Fibres-ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-043 - Référence *EUROFINS250000068450 Réf. Prel : P306 BATIMENT A B C - FAÇADES/Conduits en façade : Conduits d'eaux pluviales (Liste B) - (Fibres-ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009961-044 - Référence *EUROFINS250000068507 Réf. Prel : P307 BATIMENT A B C - FAÇADES/Conduits en façade : Conduits d'eaux pluviales (Liste B) - (Fibres-ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD SAS
Analyses EABS
75C Avenue de Pascalet
30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01 — Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53 —
Référence laboratoire N° : 26RI023642 — Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 — Date de réception :07/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26KE009961-001 - EUROFINS250000068 47 Réf. Prel : P264 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - CIRCULATION 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26KE009961-002 - EUROFINS250000068 46 Réf. Prel : P265 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN - CIRCULATION 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01
Référence laboratoire N° : 26RI023642
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Date de réception :07/04/2026

Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	26KE009961-003 - EUROFINS250000068 45 Réf. Prel : P266 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 129/Plafonds : Plots de colle / Plaques (Liste A) - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26KE009961-004 - EUROFINS250000068 44 Réf. Prel : P267 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 130/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01
Référence laboratoire N° : 26RI023642
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Date de réception :07/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	26KE009961-005 - EUROFINS250000068 43 Réf. Prel : P268 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / SJNZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26KE009961-006 - EUROFINS250000068 42 Réf. Prel : P269 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 131/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mortier/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / SJNZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01
Référence laboratoire N° : 26RI023642
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Date de réception :07/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	26KE009961-007 - EUROFINS250000068 40 Réf. Prel : P270 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Sous-couches des revêtements souples - (Semi-dur/Rose)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26KE009961-008 - EUROFINS250000068 41 Réf. Prel : P271 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Sous-couches des revêtements souples - (Semi-dur/Rose)	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01
Référence laboratoire N° : 26RI023642
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Date de réception :07/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	26KE009961-009 - EUROFINS250000068 38 Réf. Prel : P272 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26KE009961-010 - EUROFINS250000068 39 Réf. Prel : P273 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01
Référence laboratoire N° : 26RI023642
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Date de réception :07/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	26KE009961-011 - EUROFINS250000068 37 Réf. Prel : P274 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 3 - REZ DE JARDIN - LOCAL 135/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26KE009961-012 - EUROFINS250000068 36 Réf. Prel : P275 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - R+1 - LOCAL 260/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
013 (1)	26KE009961-013 - EUROFINS250000068 35 Réf. Prel : P276 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - R+1 - LOCAL 260/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01
Référence laboratoire N° : 26RI023642
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Date de réception :07/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	26KE009961-014 - EUROFINS250000068 34 Réf. Prel : P277 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - R+1 - LOCAL 256/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	26KE009961-015 - EUROFINS250000068 32 Réf. Prel : P278 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - R+1 - LOCAL 234/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	26KE009961-016 - EUROFINS250000068 31 Réf. Prel : P279 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 2 - R+1 - LOCAL 236/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01
Référence laboratoire N° : 26RI023642
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Date de réception :07/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	26KE009961-017 - EUROFINS250000068 33 Réf. Prel : P280 BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - R+2 - ESCALIER 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	26KE009961-018 - EUROFINS250000068 30 Réf. Prel : P281 BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - R+2 - LOCAL 337/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/)	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	26KE009961-019 - EUROFINS250000068 29 Réf. Prel : P282 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - R+1 - ESCALIER 1/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence laboratoire N° : 26RI023642 Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception :07/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	26KE009961-020 - EUROFINS250000068 27 Réf. Prel : P283 BATIMENT A B C - R+1 - BATIMENT ZONE 3 - R+1 - ESCALIER 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	26KE009961-021 - EUROFINS250000068 28 Réf. Prel : P284 BATIMENT A B C - R+2 - BATIMENT ZONE 3 - R+2 - ESCALIER 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	26KE009961-022 - EUROFINS250000068 06 Réf. Prel : P285 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 2 - REZ DE JARDIN - LOCAL SANITAIRES/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Fibres-ciment/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01 | Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53 |
Référence laboratoire N° : 26RI023642 | Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 | Date de réception :07/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	26KE009961-023 - EUROFINS250000311 34 Réf. Prel : P286 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 07/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	26KE009961-024 - EUROFINS250000061 92 Réf. Prel : P287 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 07/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	**MET** / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01
Référence laboratoire N° : 26RI023642
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Date de réception :07/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025 (2)	26KE009961-025 - EUROFINS250000061 91 Réf. Prel : P288 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 07/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
026 (2)	26KE009961-026 - EUROFINS250000311 33 Réf. Prel : P289 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01
Référence laboratoire N° : 26RI023642
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Date de réception :07/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	26KE009961-027 - EUROFINS250000311 24 Réf. Prel : P290 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Bleu)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	**MET** / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	26KE009961-028 - EUROFINS250000311 25 Réf. Prel : P291 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Bleu)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	26KE009961-029 - EUROFINS250000311 27 Réf. Prel : P292 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01 | Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53 |
Référence laboratoire N° : 26RI023642 | Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 | Date de réception :07/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	26KE009961-030 - EUROFINS250000311 26 Réf. Prel : P293 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	26KE009961-031 - EUROFINS250000311 29 Réf. Prel : P294 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01 | Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53 | Page14/20
Référence laboratoire N° : 26RI023642 | Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 | Date de réception :07/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	26KE009961-032 - EUROFINS250000311 28 Réf. Prel : P295 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 03/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	26KE009961-033 - EUROFINS250000311 32 Réf. Prel : P296 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01
Référence laboratoire N° : 26RI023642
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Date de réception :07/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	26KE009961-034 - EUROFINS250000311 31 Réf. Prel : P297 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	26KE009961-035 - EUROFINS250000311 40 Réf. Prel : P298 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 020/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Semi-dur/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01 | Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53 |
Référence laboratoire N° : 26RI023642 | Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 | Date de réception :07/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036 (2)	26KE009961-036 - EUROFINS250000311 41 Réf. Prel : P299 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 020/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Semi-dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
037	26KE009961-037 - EUROFINS250000311 37 Réf. Prel : P300 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 020/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Semi-dur/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01
Référence laboratoire N° : 26RI023642
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Date de réception :07/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	26KE009961-038 - EUROFINS250000311 42 Réf. Prel : P301 BATIMENT A B C - RDC - BATIMENT ZONE 1 - RDC - LOCAL 020/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Semi-dur/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
039	26KE009961-039 - EUROFINS250000311 43 Réf. Prel : P302 BATIMENT A B C - REZ DE JARDIN - BATIMENT ZONE 1 - REZ DE JARDIN - ESCALIER 2/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / GPRA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	26KE009961-040 - EUROFINS250000068 09 Réf. Prel : P303 BATIMENT A B C - TOITURE ET COMBLES/Toitures : Plaques en fibres-ciment (Liste B) - (Semi-dur/Gris)	Matériau dur de type plaque (fibreux) (gris)	**MOLP** / ASH4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01 | Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53 | Page18/20
Référence laboratoire N° : 26RI023642 | Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 | Date de réception :07/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	26KE009961-041 - EUROFINS250000068 52 Réf. Prel : P304 BATIMENT A B C - TOITURE ET COMBLES/Conduits en toiture : Conduits de fumée (Liste B) - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / ASH4	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
042	26KE009961-042 - EUROFINS250000068 51 Réf. Prel : P305 BATIMENT A B C - FAÇADES/Conduits en façade : Conduits d''eaux pluviales (Liste B) - (Fibres-ciment/)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / ASH4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
043 (3)	26KE009961-043 - EUROFINS250000068 50 Réf. Prel : P306 BATIMENT A B C - FAÇADES/Conduits en façade : Conduits d''eaux pluviales (Liste B) - (Fibres-ciment/)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
044	26KE009961-044 - EUROFINS250000068 07 Réf. Prel : P307 BATIMENT A B C - FAÇADES/Conduits en façade : Conduits d''eaux pluviales (Liste B) - (Fibres-ciment/)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / ASH4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01 | Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53 |
Référence laboratoire N° : 26RI023642 | Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 | Date de réception :07/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	

Observation(s) échantillon(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(3) Echantillon mouillé.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023387-01 | Date d'émission de rapport : 14/04/2026 3:53 | Page20/20
Référence laboratoire N° : 26RI023642 | Référence de suivi du dossier N° : 26KE009961
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 | Date de réception :07/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009961 - 1510797812/28777017/S1/1/7_28777017/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

Validé et approuvé par :



Dominika Dolik
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
