BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
DBE LRO
Immeuble l'Optimum
Zac Blaise Pascal
34000 MONTPELLIER

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28777017/S2/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 17/07/2026

Référence au programme de travaux :
Mail du 24/10/2025 : "IMPORTANT POUR PROGRAMME DE TRAVAUX: BUREAU VERITAS" IMPORTANT POUR PROGRAMME DE TRAVAUX: BUREAU VERITAS
réalisé le 24/10/2025 par REGION ACADEMIQUE

DONNEUR D'ORDRE

REGION ACADAMIQUE OCCITANIE

Alexandra LOF
31, rue de l'Université
34000 MONTPELLIER

SITE D'INTERVENTION

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee

17 Rue abbe de L Epee
34000 MONTPELLIER

BATIMENT D

Latitude : 43.621500 / Longitude : 3.874100

Date(s) d'intervention(s) :
Du 12/11/2025 au 14/11/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Benjamin LACOME	Diagnostiqueur immobilier	Certification N° 9643074	Benjamin LACOME

Le présent rapport comporte 140 pages, dont 113 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 6
2.2. Remarque(s) complémentaire(s) 6
2.3. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre 7
2.4. Obligations réglementaires 8

3. INFORMATIONS GENERALES **9**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 9
3.2. Parties prenantes 9


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **9**
4.1. Références réglementaires 9

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **10**
5.1. Date(s) de visite(s) 10
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 10
5.3. Conditions spécifiques 10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 10

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **11**
6.1. Matériaux et produits repérés 11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 27

7. ANNEXES **28**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 28
7.2. Photos prélèvements 32
7.3. Photos sondages 52
7.4. Photos inaccessibilités 53
7.5. Attestation d'assurance 55
7.6. Certificat de compétence 57
7.7. Croquis de repérage 58
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire 67

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

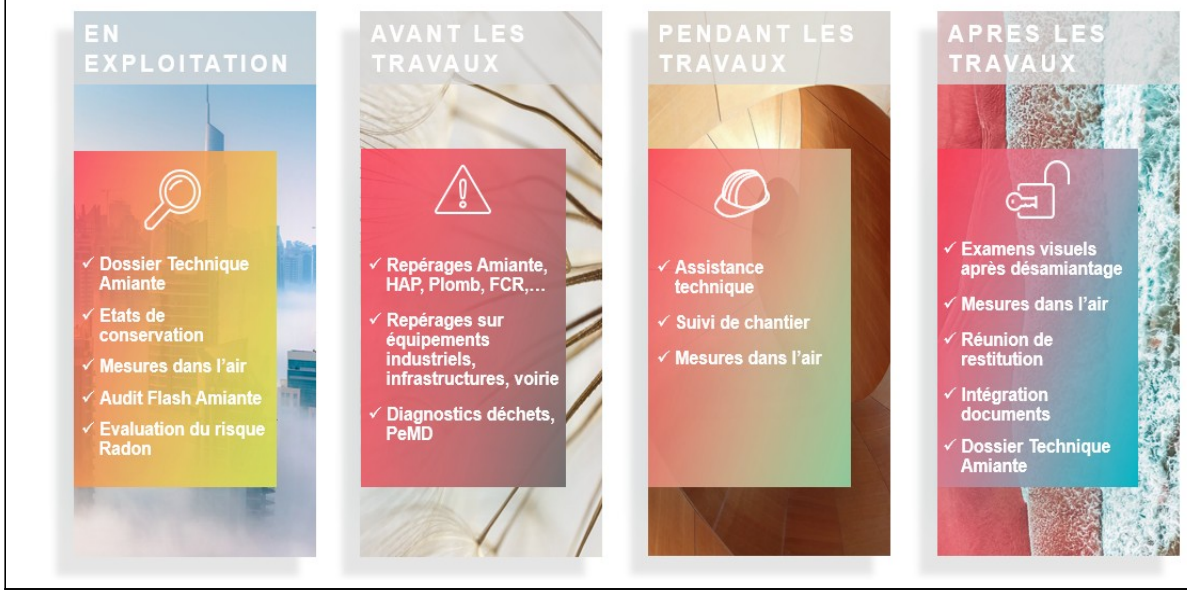

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
"Votre programme initial prévoit : oui (voir également document transmis) Interventions sur sols, murs, plafonds Rénovation installations électriques, sanitaires Travaux CVC Remplacement menuiseries Conservation de la façade (ITE sur batiment D) Éléments potentiels à confirmer : oui Réfection de la toiture (état général non précisé) Reprise des façades (fissures et état du bois à évaluer) Traitement des infiltrations possibles toiture"

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Conduits en toiture	Conduits de fumée, Conduits EP, Conduits EU
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles solins fibrociment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments de toiture, Faitages, Garnissages joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés sous toiture, Flocages sous toiture, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Plaques ondulées et planes	Plaques fibrociment, Plaques matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires couverture fibrociment, Accessoires couverture hors fibrociment, Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bardeaux bitumineux, Plaques fibrociment, Plaques matériaux bitumineux
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits de fumée, Conduits eaux pluviales, Conduits eaux usées
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels (façade)

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bacs fibrociment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis fenêtres fibrociment, Coffrages perdus, Colle, Colles carrelage, Colles faïence, Colles pâte de verre, Couvre-joints, Enduits pelliculaires façades, Enduits projetés/crépis façades, Garnissage joints dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints carrelage, Joints dilatation, Joints faïence, Joints pâte de verre, Maçonnerie silico-calcaire, Peintures façades, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits projetés charpente, Enduits projetés/talochés charpente, Flocages charpente, Joints charpentes, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures charpente, Peintures intumescentes charpente, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres
Suspentes et contrevents	Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.
Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
62	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE 2	Conduits en toiture	Conduits de fumée	Fibres-ciment	Gris
55	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	Eléments associés à la façade	Conduits	Fibres-ciment	/
22	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	/
22	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11				
22	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 2				
36	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Fibreux	/
31	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle cloisons	Dur	Marron
19	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 5	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Gris
19	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 5	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/
44	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> CIRCULATION 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
26	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris
28	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL ESCALIER				

2.2. Remarque(s) complémentaire(s)

Un mastic de fenêtre dans la circulation contient de l'amiante, nous devons réaliser des prélèvements complémentaires afin de pouvoir zoner tous les mastics contenant de l"amiante et pouvoir les quantifier.

2.3. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D (IA 4)	2- Parois verticales extérieures et façades	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D (IA 8)	Cloisons et gaines	Des sondages destructifs doivent être réalisés sur les gaines et les cloisons intérieures afin de vérifier la présence ou l'absence de MPCA.	Prévoir une ré intervention afin d'effectuer des sondages destructifs sur les cloisons et les gaines intérieures.
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 1 (IA 2)	8- Equipements divers et accessoires	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL MONTE CHARGE (IA 7)	7- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Machinerie ascenseur, investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 pour mise à l'arrêt de l'installation et démontage de parties d'équipements.

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee
17 Rue abbe de L Epee
34000 MONTPELLIER

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee	Enseignement supérieur / Recherche	IGH et ERP de la 1ère et la 2ème catégorie	01/01/1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Alexandra LOF	Donneur d'ordre	REGION ACADAMIQUE OCCITANIE	31, rue de l'Université 34000 MONTPELLIER	0467914881
Alexandra LOF	Gestionnaire	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE	31, rue de l'université 34000 MONTPELLIER	+33 4 67 91 46 55 - alexandra.lof@region-academique-occitanie.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 12/11/2025 au 14/11/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Mail du 24/10/2025 : "IMPORTANT POUR PROGRAMME DE TRAVAUX: BUREAU VERITAS"	REGION ACADEMIQUE OCCITANIE représenté par madame LOF Alexandra	24/10/2025	IMPORTANT POUR PROGRAMME DE TRAVAUX: BUREAU VERITAS	/
Repérage amiante avant travaux / Rapport Amiante BatD SOCOTEC-2017	SOCOTEC	19/04/2017	15601/AMI/17/437	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	Eléments associés à la façade	Conduits	Fibres-ciment	/	55	/	S2	AN	8 conduits en façade	*Oui*
	Eléments associés à la façade	Conduits	Fibres-ciment	/	55	P103* P	/	AN	/	*Oui*
	Façades lourdes y compris poteaux	Colles faïence	Ciment	Marron	53	P97* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Colles faïence	Ciment	Marron	53	P98 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Compact	Beige	54	P104* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Compact	Beige	54	P105 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Fin	Beige	56	P106* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Fin	Beige	56	P107 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Clair, Jaune	46	P68* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	46	P68* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Clair, Jaune	46	P69 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	46	P69 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Vert	20	P70* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	20	P70* N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 7	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Clair, Gris	6	P77* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	6	P77* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Clair, Gris	7	P76* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	7	P76* N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 8	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Jaune	48	P74* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	48	P74* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Jaune	48	P75 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	48	P75 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 13	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Jaune	17	P17* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	17	P17* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Bleu	18	P18* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	18	P18* N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 14	Faux plafonds	Plaques	Compact	Blanc	15	P15* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Beige	11	P10* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	11	P10* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	12	P11* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 14	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	12	P11* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Clair, Gris	13	P12* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Silicone	/	14	P13* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	/	16	P16* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Clair, Gris	13	P94 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Blanc	12	P95 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	12	P95 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 15	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Silicone	/	14	P14 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 16	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc	9	P19* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	8	P8* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	8	P8* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	8	P108 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	8	P108 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Lissé	/	10	P9* N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 1 7	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Clair, Gris	6	P6 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	6	P6 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Bleu, Clair	5	P5* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	5	P5* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Clair, Gris	7	P7 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	7	P7 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Bleu, Clair	5	P93 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	5	P93 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 18	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Beige, Blanc	45	P66* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	45	P66* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Beige, Blanc	45	P67 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	45	P67 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> CIRCULATION 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	44	P65* P	/	AN	/	*Oui*
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> CIRCULATION 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	/	52	P91* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	/	52	P92 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	/	49	P78* N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 2	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	4	P4* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	P2* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	2	P2* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Compact	/	3	P3* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	/	16	P96 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 25	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Bleu, Vert	23	P71* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	23	P71* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 25	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	/	47	P72* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	/	47	P73 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	/	58	Idem P 24	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> ESCALIER 1	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	4	P34 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	P33 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	2	P33 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Compact	/	3	P35 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	/	29	P36* N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> CIRCULATION 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Vert	20	P21 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	20	P21 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	26	P29* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Beige	11	P25 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	11	P25 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Bleu, Vert	23	P26 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	23	P26 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige, Gris	24	P27* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	24	P27* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Bleu, Clair	25	P28* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	25	P28* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Jaune	17	P30 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	17	P30 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Bleu, Clair	25	P90 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	25	P90 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Marron	21	P22* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	21	P22* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Marron	21	P23 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	21	P23 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 5	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Gris	19 (i)	P110* N	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	19 (i)	P110* N	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Gris	19	P20 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	19	P20 P	/	AN	/	***Oui***
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> ESCALIER 2	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	/	58	P24* N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL ESCALIER	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	28	P32* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige, Gris	27	P31* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	27	P31* N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	/	22	Idem P 52	/	AN	/	***Oui***
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 2	Faux plafonds	Plaques	Fibres-ciment	Beige	41	P58* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 2	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	42	P60* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	42	P60* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	42	P61 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	42	P61 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Bleu	43	P62* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	43	P62* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Bleu	43	P63 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	43	P63 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Jaune	17	P59 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	17	P59 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Bleu	18	P64 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	18	P64 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 9	Faux plafonds	Plaques	Compact	Blanc	39	P56* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 9	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	38	P55* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	38	P55* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	38	P55* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Néoprène	Jaune	40	P57* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Néoprène	Jaune	40	P99 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 10	Cloisons (légères et préfabriquées)	Jonctions panneaux	Fibreux	Blanc	57	P112* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	/	29	P47 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle cloisons	Dur	Marron	31	P38* P	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle cloisons	Dur	Marron	31	P42 P	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Fibreux	/	36	P46* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Moquettes	Fibreux	/	34	P43* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	34	P43* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Fibreux	/	34	P44 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	34	P44 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Panneaux	Blanc	32	P39* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	Toile	/	33	P40* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Néoprène	/	33	P40* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	Toile	/	33	P41 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Néoprène	/	33	P41 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	35	P45* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Jonctions panneaux	Fibreux	Blanc	57	P111 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	/	22 (i)	P109* N	/	AN	/	***Oui***
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 16	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	1	/	S1	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	1	/	S1	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	30	P37* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	30	P37* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	38	P54 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	38	P54 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	38	P54 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 2	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	4	P53 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	/	22	P52 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	1	P48 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	1	P48 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	37	P49* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	37	P49* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	37	P50 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	37	P50 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Lissé	/	10	P51 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	/	58	Idem P 24	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Jaune	17	P83 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	/	17	P83 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 25	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Noir	37	P80 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	37	P80 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> CIRCULATION 1	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Gris	59	P82* N	/	AN	Idem ZPSO 27	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	59	P82* N	/	AN	Idem ZPSO 27	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige, Gris	27	P88 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	27	P88 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Compact	/	3	P79 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Beige, Gris	24	P81 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	/	24	P81 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	35	P87 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> ESCALIER 1	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Beige	30	P85 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	/	30	P85 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Noir	2	P84 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	/	2	P84 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	/	58	P86 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> ESCALIER 2	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Plâtre	Blanc	4	P89 N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> COMBLES	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton, Toile	/	50	P100* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	50	P100* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton, Toile	/	50	P101 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	50	P101 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Tissu	Gris	51	P102* N	/	AN	/	Non
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE 2	Conduits en toiture	Conduits de fumée	Fibres-ciment	Gris	62	/	S3	AN	/	***Oui***
	Conduits en toiture	Conduits de fumée	Fibres-ciment	Gris	62	/	S4	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE 2	Conduits en toiture	Conduits de fumée	Fibres-ciment	Gris	62	P117* P	/	AN	/	*Oui*
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	Noir	60	P113* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	Noir	60	P114 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	/	Noir	61	P115* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	/	Noir	61	P116 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
31	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle cloisons	20 m²
36	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	30 m²
22	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	100 ml
26	Conduits	Conduits	1 U
28	Conduits	Conduits	1 U
44	Conduits	Conduits	1 U
55	Eléments associés à la façade	Conduits	8 U
62	Conduits en toiture	Conduits de fumée	3 U
19	Revêtements de sol	Colles carrelage	35 m²
19	Revêtements de sol	Joints carrelage	35 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 2	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 3	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 4	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 5	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 6	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 7	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 8	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 9	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 10	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 11	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 12	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 13	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 14	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 15	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 16	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 1 7	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 18	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 19	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 20	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> CIRCULATION 1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> CIRCULATION 2	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 2	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 21	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 22	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 23	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 24	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 25	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> TOITURE	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> ESCALIER 1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 2	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> CIRCULATION 1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 4	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 5	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> ESCALIER 2	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL ESCALIER	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL MONTE CHARGE	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 2	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 3	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 4	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 5	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 6	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 7	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 8	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 9	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 10	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 12	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 13	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 14	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 15	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 16	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> ESCALIER 1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> ESCALIER 2	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 2	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 2	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 3	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 4	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 5	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 6	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 7	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 8	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 9	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 10	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 11	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 12	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 13	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 14	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 15	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 16	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 17	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 18	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 19	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 20	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 21	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 22	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 23	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 24	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 25	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 26	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 27	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 28	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 29	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> CIRCULATION 1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> ESCALIER 1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> ESCALIER 2	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> COMBLES	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R-1	/
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE 2	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 2	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

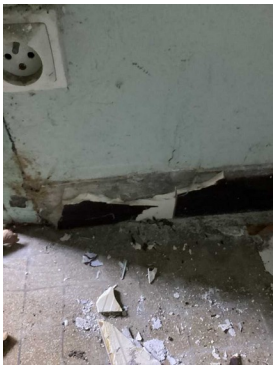P2	ZPSO 2
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P3	ZPSO 3
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	


P4	ZPSO 4
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 2	
	
Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds	

P5	ZPSO 5
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 1 7	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P6	ZPSO 6
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 1 7	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

P7	ZPSO 7

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 1 7

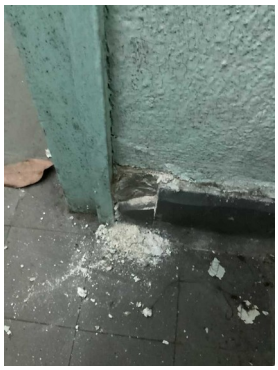

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P8	ZPSO 8


REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 16



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P9	ZPSO 10

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 16

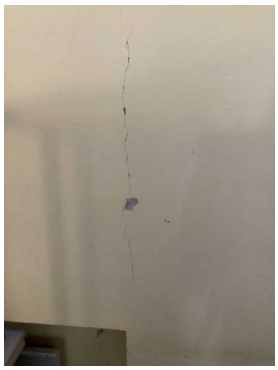

Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P10	ZPSO 11


REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 14



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P11	ZPSO 12

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 14

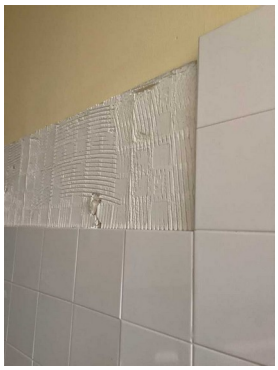

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P12	ZPSO 13

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 14



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P13	ZPSO 14

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 14



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P14	ZPSO 14

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 15



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P15	ZPSO 15

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 14



Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

P16	ZPSO 16

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 14



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales

P17	ZPSO 17

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 13



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P18	ZPSO 18

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 13



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

Copyright BUREAU VERITAS

P19	ZPSO 9

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 16



Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

P20	ZPSO 19

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 5



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P21	ZPSO 20

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> CIRCULATION 1



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P22	ZPSO 21


REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 4



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P23	ZPSO 21

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 4

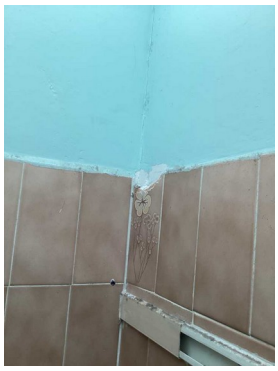

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence


P24	ZPSO 58

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> ESCALIER 2



Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage

P25	ZPSO 11
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

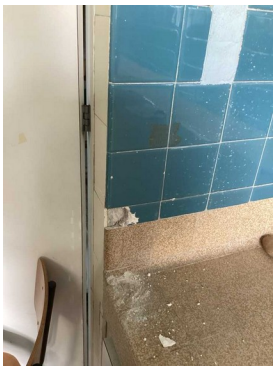P26	ZPSO 23
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P27	ZPSO 24
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P28	ZPSO 25
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P29	ZPSO 26
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P29	ZPSO 26
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P30	ZPSO 17

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P31	ZPSO 27

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL ESCALIER



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P32	ZPSO 28

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL ESCALIER



Conduits -> Conduits (Liste B)

P33	ZPSO 2


REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> ESCALIER 1



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P34	ZPSO 4

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> ESCALIER 1

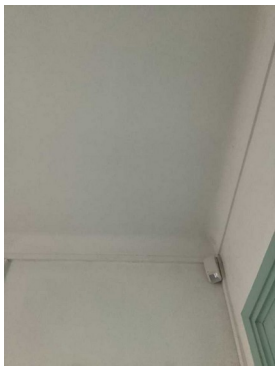

Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds

P35	ZPSO 3

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> ESCALIER 1



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P36	ZPSO 29

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> ESCALIER 1



Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

P37	ZPSO 30

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> ESCALIER 2



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P38	ZPSO 31

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle cloisons

P39	ZPSO 32

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Isolants intérieurs fibreux

P40	ZPSO 33

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales | Colles

P41	ZPSO 33

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales | Colles

P42	ZPSO 31
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle cloisons	

P43	ZPSO 34
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	
	
Revêtements de sol -> Moquettes | Colles non bitumineuses	

P44	ZPSO 34
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	
	
Revêtements de sol -> Moquettes | Colles non bitumineuses	

P45	ZPSO 35
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P46	ZPSO 36
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

P47	ZPSO 29
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 10	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P48	ZPSO 1

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 2



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P49	ZPSO 37

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 2



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P50	ZPSO 37

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 2



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P51	ZPSO 10

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 2



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P52	ZPSO 22

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 2



Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage

P53	ZPSO 4

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 2



Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds

P54	ZPSO 38

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> CIRCULATION 1



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P55	ZPSO 38

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 9



Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P56	ZPSO 39

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 9



Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

P57	ZPSO 40

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 9



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P58	ZPSO 41

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 2



Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

P59	ZPSO 17

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 2



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P60	ZPSO 42

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 2



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P61	ZPSO 42

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 2



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P62	ZPSO 43

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 2



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P63	ZPSO 43


REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 2



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P64	ZPSO 18

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 2

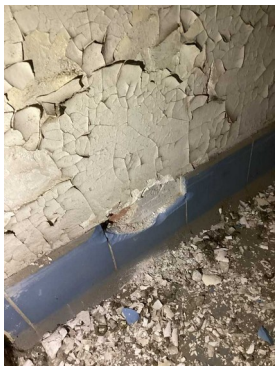

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P65	ZPSO 44


REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> CIRCULATION 1



Conduits -> Conduits (Liste B)

P66	ZPSO 45

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 18

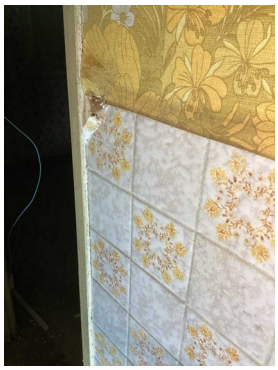

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P67	ZPSO 45


REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 18



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P68	ZPSO 46

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 4

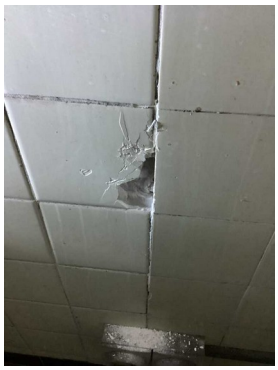

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P69	ZPSO 46

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 4



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P70	ZPSO 20


REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 4



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P71	ZPSO 23

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 25

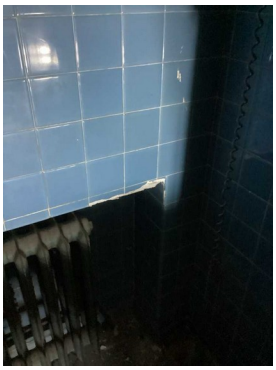

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P72	ZPSO 47

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 25



Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

P73	ZPSO 47

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 25



Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

P74	ZPSO 48

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 8



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses

P75	ZPSO 48


REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 8



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses

P76	ZPSO 7

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 7

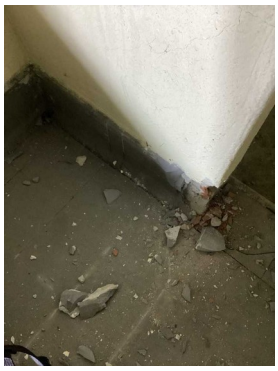

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P77	ZPSO 6

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 7



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P78	ZPSO 49

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 1



Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)

P79	ZPSO 3

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> CIRCULATION 1



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P80	ZPSO 37

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 25



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P81	ZPSO 24

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> CIRCULATION 1



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P82	ZPSO 59

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> CIRCULATION 1



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P83	ZPSO 17

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> LOCAL 1



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P84	ZPSO 2

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> ESCALIER 1



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P85	ZPSO 30

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> ESCALIER 1



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P86	ZPSO 58

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> ESCALIER 1



Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage

P87	ZPSO 35


REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> CIRCULATION 1



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

P88	ZPSO 27

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> CIRCULATION 1

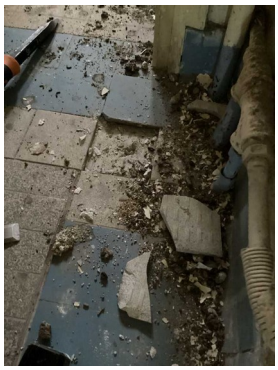

Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P88	ZPSO 27

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+3 -> CIRCULATION 1



Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage

P90	ZPSO 25

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 3



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P91	ZPSO 52

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> CIRCULATION 2



Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

P92	ZPSO 52

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> CIRCULATION 2



Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

P93	ZPSO 5


REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 1 7



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P94	ZPSO 13

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 14

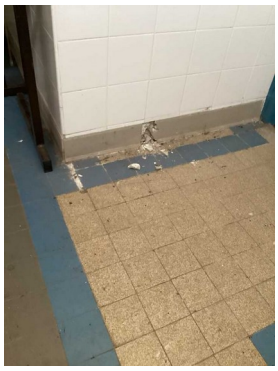

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe


P95	ZPSO 12

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> LOCAL 14



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P96	ZPSO 16
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales	

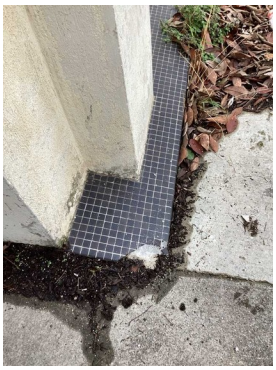P97	ZPSO 53
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colles faïence	

P98	ZPSO 53
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colles faïence	

P100	ZPSO 50
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> COMBLES	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages	

P101	ZPSO 50
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> COMBLES	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages	

P102	ZPSO 51
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> COMBLES	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P103	ZPSO 55
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	
	
Eléments associés à la façade -> Conduits	

P104	ZPSO 54
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P105	ZPSO 54
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P106	ZPSO 56
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P107	ZPSO 56
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P109	ZPSO 22
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P110	ZPSO 19
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL 5	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	


P111	ZPSO 57
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 11	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Jonctions panneaux	

P112	ZPSO 57
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 10	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Jonctions panneaux	

P113	ZPSO 60
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE 2	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	


P114	ZPSO 60
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE 2	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P115	ZPSO 61
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE 2	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

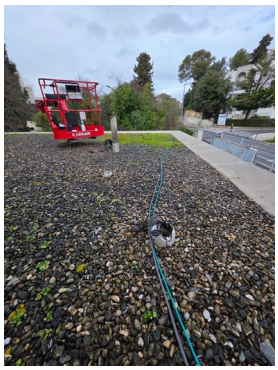
P116	ZPSO 61
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE 2	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	


P117	ZPSO 62
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE 2	
	
Conduits en toiture -> Conduits de fumée (Liste B)	

7.3. Photos sondages

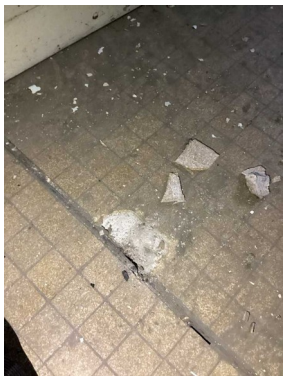S1	ZPSO 1
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+2 -> LOCAL 16	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

S2	ZPSO 55
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> FACADE	
	
Eléments associés à la façade -> Conduits	

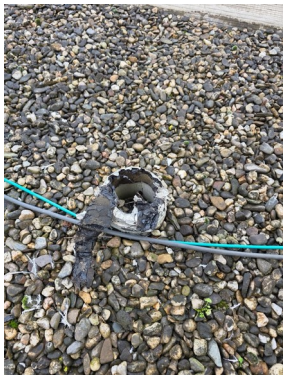S3	ZPSO 62
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE 2	
	
Conduits en toiture -> Conduits de fumée (Liste B)	

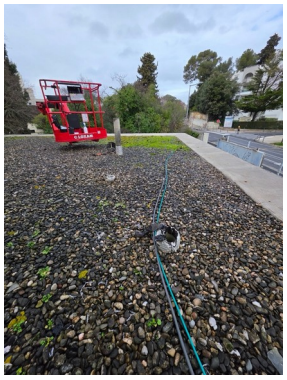S4	ZPSO 62
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> TOITURE 2	
	
Conduits en toiture -> Conduits de fumée (Liste B)	

7.4. Photos inaccessibilités

Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> RDC -> ESCALIER 1	IA 2
8- Equipements divers et accessoires	
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D	IA 4
2- Parois verticales extérieures et façades	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux : Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D -> R+1 -> LOCAL MONTE CHARGE	IA 7
7- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Machinerie ascenseur, investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 pour mise à l'arrêt de l'installation et démontage de parties d'équipements.

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE -> BATIMENT D	IA 8
Cloisons et gaines	
Des sondages destructifs doivent être réalisés sur les gaines et les cloisons intérieures afin de vérifier la présence ou l'absence de MPCA.	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Prévoir une ré intervention afin d'effectuer des sondages destructifs sur les cloisons et les gaines intérieures.

7.5. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Benjamin LACOME

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029

Date :28/03/2022

Numéro de certificat : 9643074

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0067
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation REGION ACADEMIQUE OCCITANIE > BATIMENT D > TOITURE	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S2/1
	Planche	1 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :



Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Conduits


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation REGION ACADEMIQUE OCCITANIE > BATIMENT D > FACADE	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S2/1
	Planche	2 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

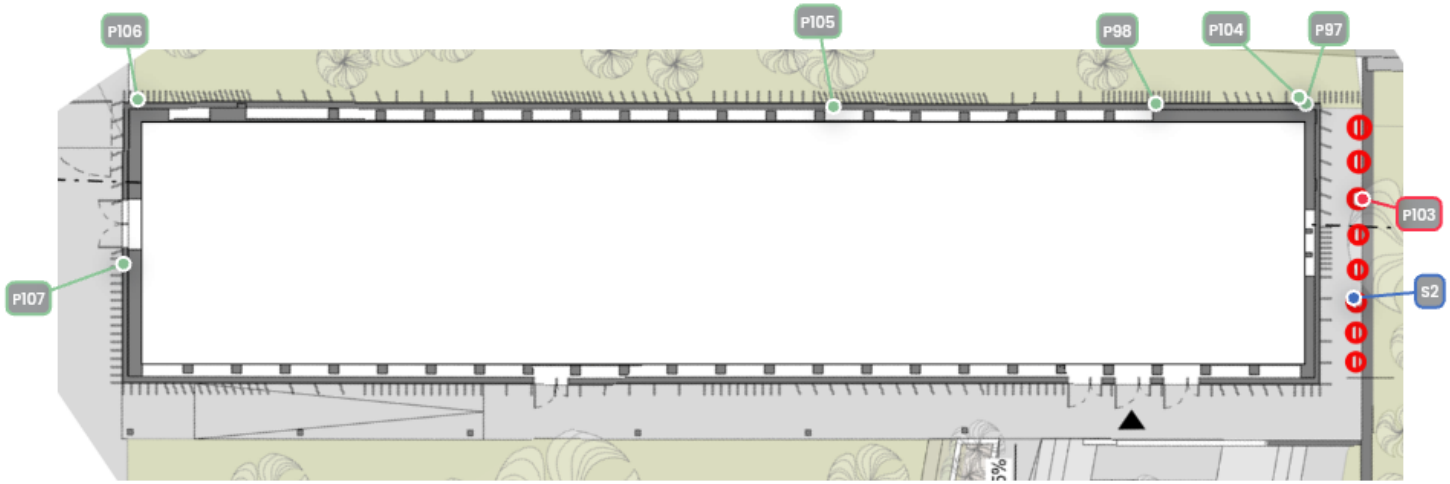

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Conduits

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation REGION ACADEMIQUE OCCITANIE > BATIMENT D > RDC	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S2/1
	Planche	3 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Conduits (Liste B)

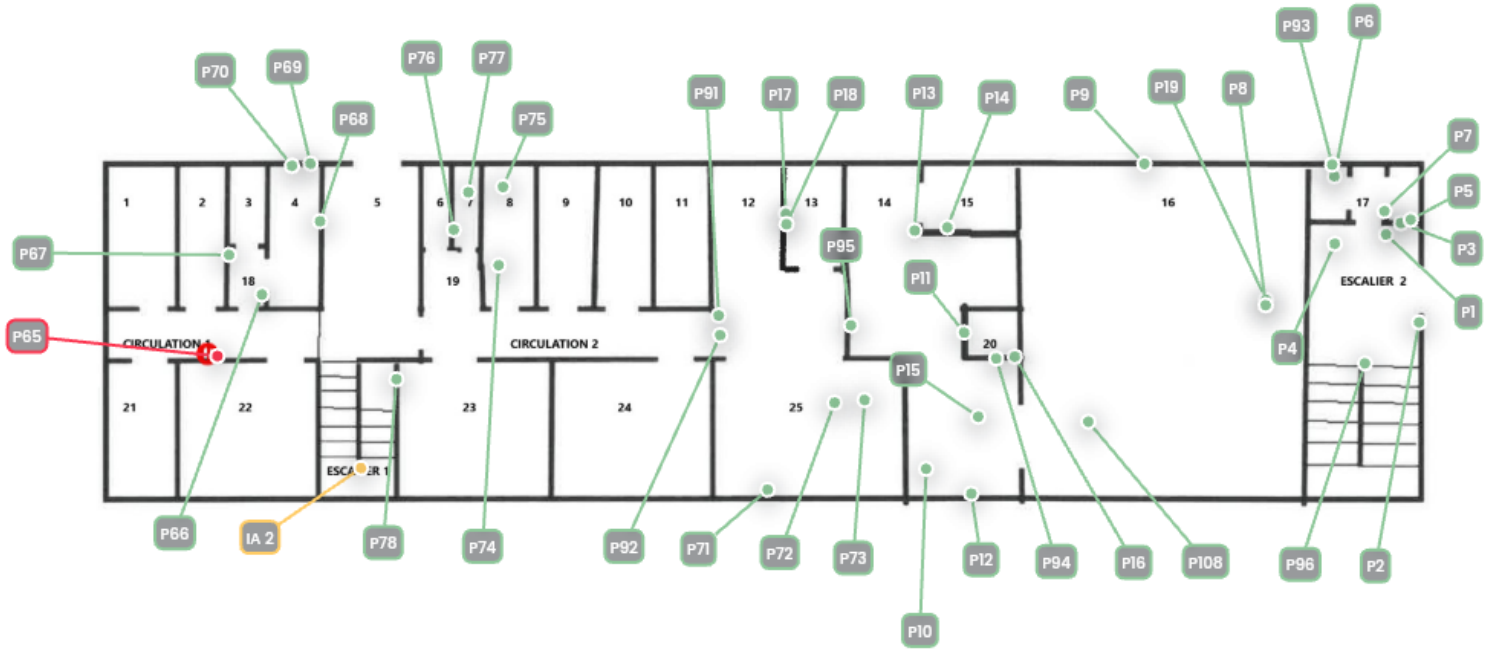

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation REGION ACADEMIQUE OCCITANIE > BATIMENT D > R+1	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S2/1
	Planche	4 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Conduits (Liste B)
- Colles carrelage,Joints carrelage

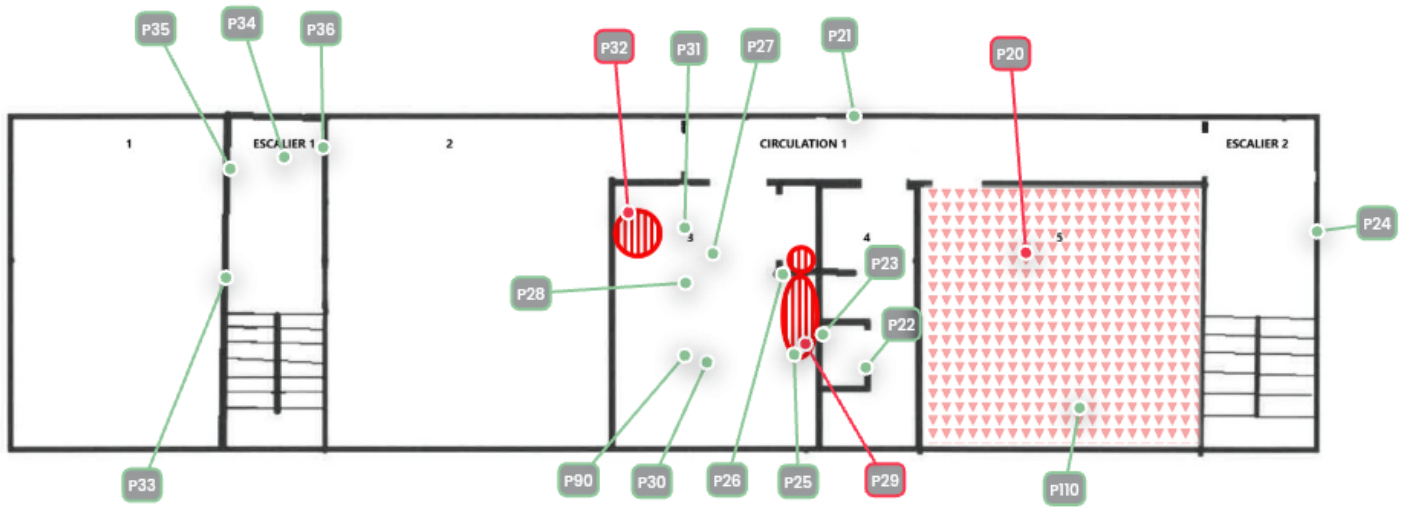

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation REGION ACADEMIQUE OCCITANIE > BATIMENT D > R+2	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S2/1
	Planche	5 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Plots de colle cloisons
- Panneaux cloisons (Liste B)
- Mastic de vitrage

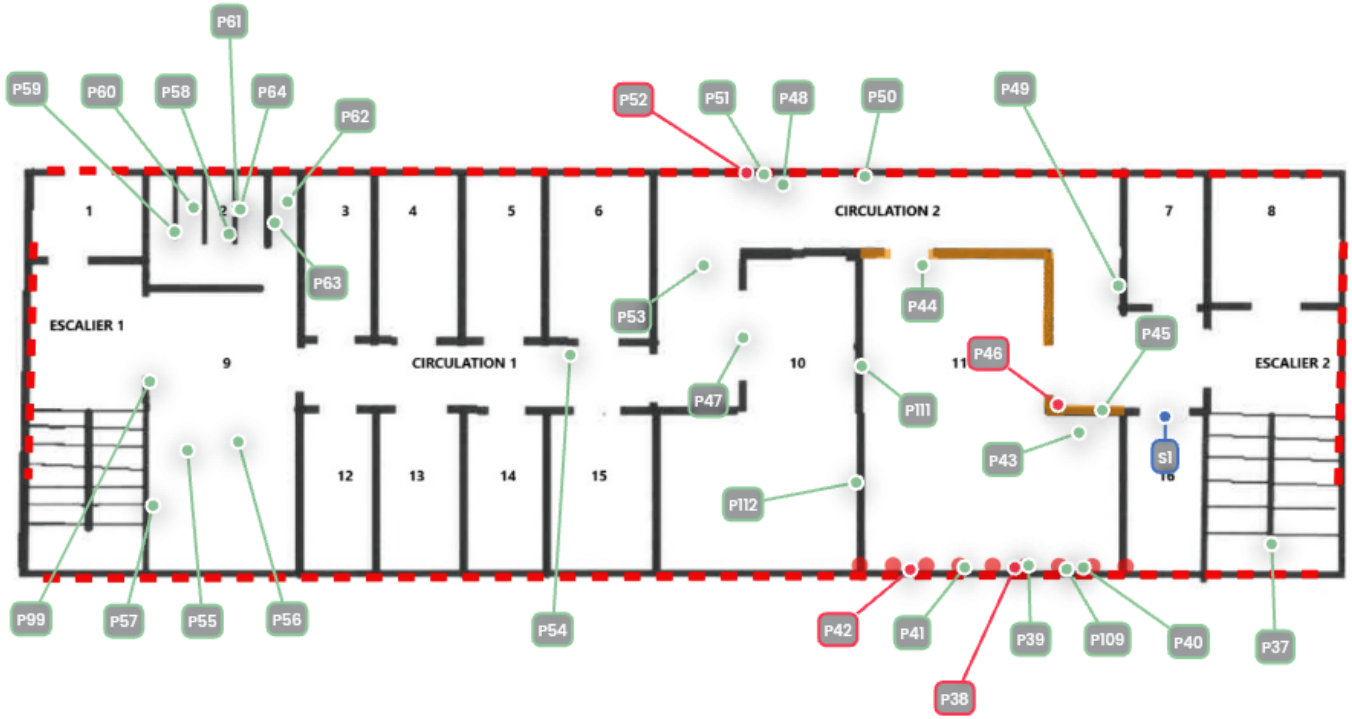

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation REGION ACADEMIQUE OCCITANIE > BATIMENT D > R+3	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S2/1
	Planche	6 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

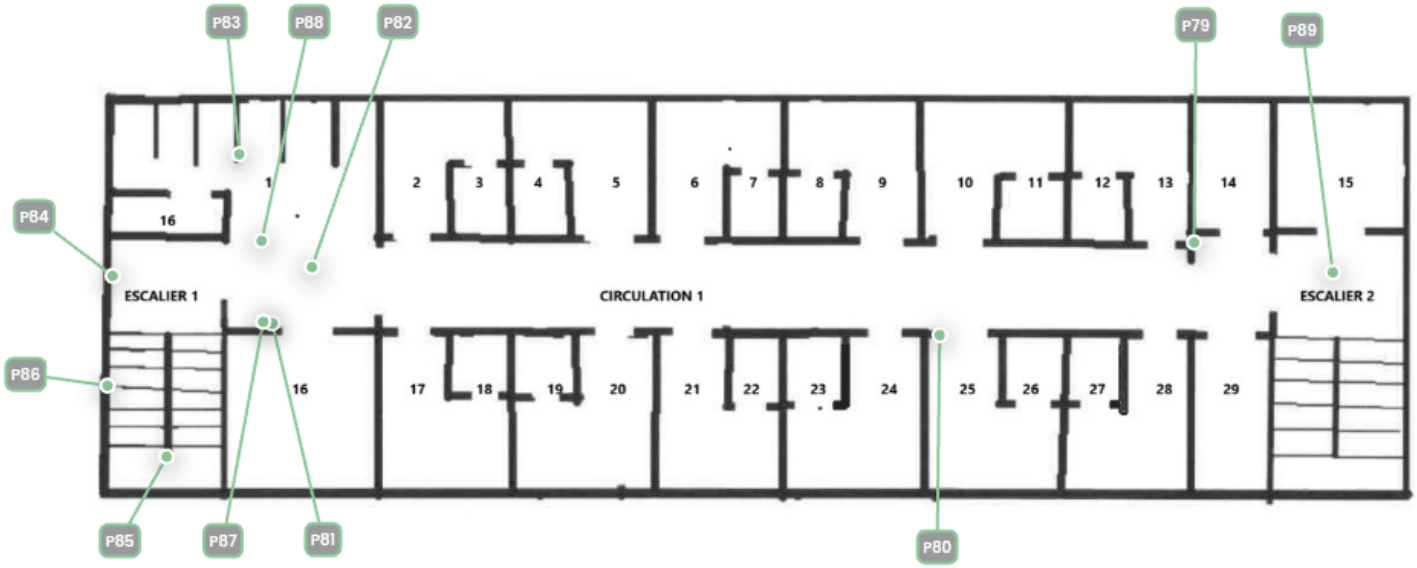

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation REGION ACADEMIQUE OCCITANIE > BATIMENT D > COMBLES	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S2/1
	Planche	7 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

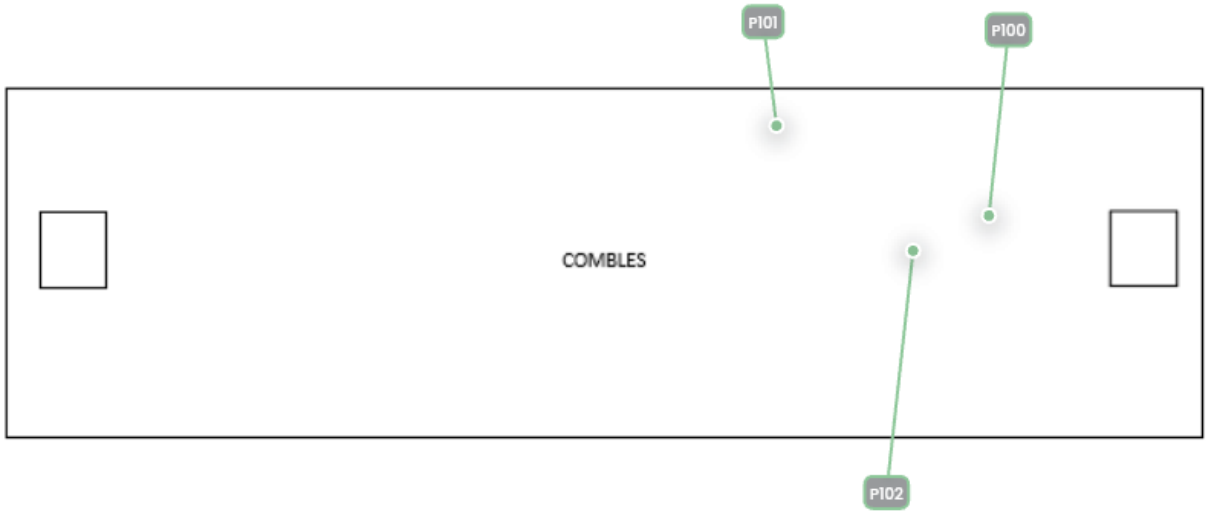


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - Abbe de l epee 17 Rue abbe de L Epee 34000 MONTPELLIER	
Localisation REGION ACADEMIQUE OCCITANIE > BATIMENT D > TOITURE 2	Date visite	Du 12/11/2025 au 14/11/2025
	Auteur	Benjamin LACOME
	N° dossier	28777017/S2/1
	Planche	8 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

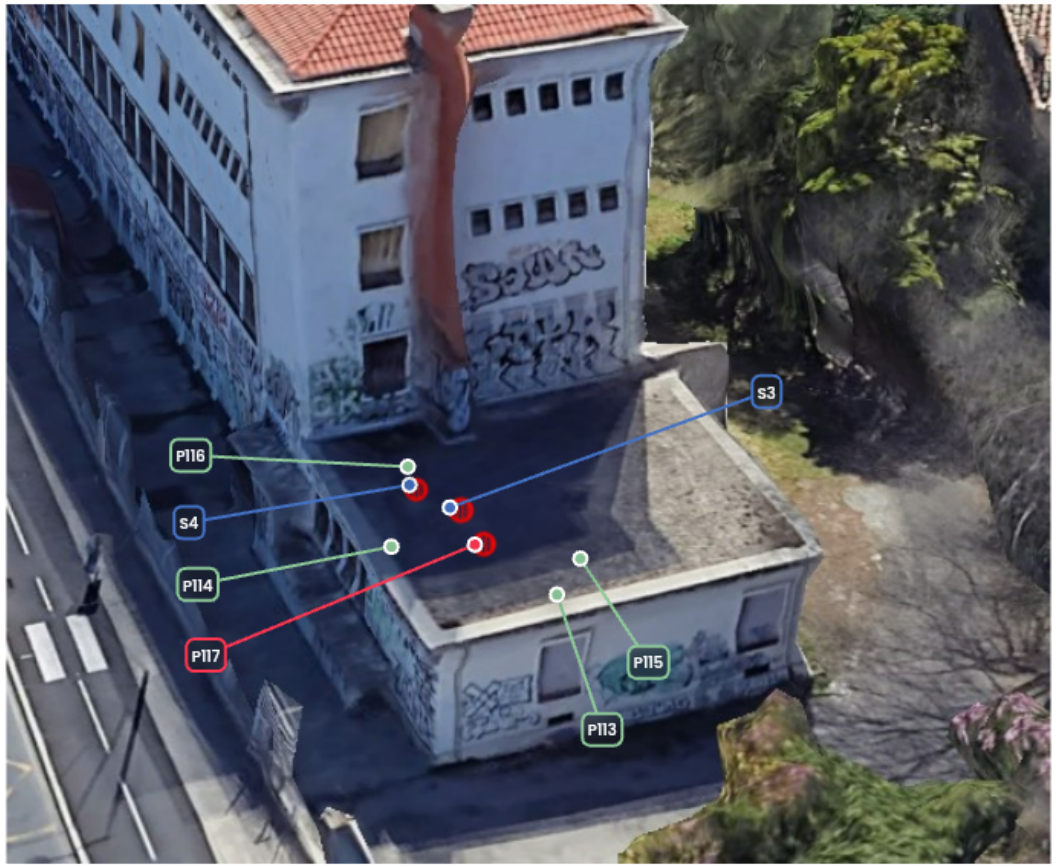

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Conduits de fumée (Liste B)

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Benjamin LACOME
450 Rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-062308-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 20:49 |
Dossier N° : 25KE034746 | Date de réception : 15/12/2025 | Date d'analyse : 16/12/2025
Référence dossier Client:1510797812/28777017/S2/1/3_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS240000097256 Réf. Prel : P109 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	EUROFINS240000097252 Réf. Prel : P110 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 5/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	**MET** * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-062308-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 20:49 | Page2/3
Dossier N° : 25KE034746 | Date de réception : 15/12/2025 | Date d'analyse : 16/12/2025
Référence dossier Client:1510797812/28777017/S2/1/3_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003 (2)	EUROFINS240000097253 Réf. Prel : P111 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Cloisons (légères et préfabriquées) : Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment) - (Fibreux/Blanc)	Matériau (noir) + (marron) ; matériau (fibreux) (blanc)	**MET** * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004 (2)	EUROFINS240000097254 Réf. Prel : P112 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 10/Cloisons (légères et préfabriquées) : Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment) - (Fibreux/Blanc)	Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau (noir)	**MET** * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

(2) Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées (l<3 µm) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres sont de nature non-asbestiforme

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B


ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-062308-01 | Date d'émission de rapport : 16/12/2025 20:49 | Page3/3
Dossier N° : 25KE034746 | Date de réception : 15/12/2025 | Date d'analyse : 16/12/2025
Référence dossier Client:1510797812/28777017/S2/1/3_28777017/2/1

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Marie VIGOUROUX
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Benjamin LACOME
450 Rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER

Notre référence : AR-25-KE-061806-01

Numéro de dossier : 25KE034109
Référence de dossier : 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25KE034109-001 - Référence *EUROFINS250000061129 Réf. Prel : P1 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-002 - Référence *EUROFINS250000061096 Réf. Prel : P2 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-003 - Référence *EUROFINS250000061095 Réf. Prel : P3 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-004 - Référence *EUROFINS250000061094 Réf. Prel : P4 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-005 - Référence *EUROFINS250000061093 Réf. Prel : P5 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 1 7/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-006 - Référence *EUROFINS250000061091 Réf. Prel : P6 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 1 7/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-007 - Référence *EUROFINS250000061092 Réf. Prel : P7 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 1 7/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-008 - Référence *EUROFINS250000061102 Réf. Prel : P8 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 16/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-009 - Référence *EUROFINS250000061101 Réf. Prel : P9 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 16/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Lissé/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-010 - Référence *EUROFINS250000061127 Réf. Prel : P10 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-011 - Référence *EUROFINS250000061123 Réf. Prel : P11 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-012 - Référence *EUROFINS250000061124 Réf. Prel : P12 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-013 - Référence *EUROFINS250000061126 Réf. Prel : P13 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-014 - Référence *EUROFINS250000061125 Réf. Prel : P14 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 15/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-015 - Référence *EUROFINS250000061090 Réf. Prel : P15 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-016 - Référence *EUROFINS250000061121 Réf. Prel : P16 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-017 - Référence *EUROFINS250000060996 Réf. Prel : P17 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 13/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-018 - Référence *EUROFINS250000061100 Réf. Prel : P18 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 13/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-019 - Référence *EUROFINS250000061122 Réf. Prel : P19 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 16/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Laine de verre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-020 - Référence *EUROFINS250000061115 Réf. Prel : P20 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 5/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-021 - Référence *EUROFINS250000061116 Réf. Prel : P21 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-022 - Référence *EUROFINS250000061117 Réf. Prel : P22 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-023 - Référence *EUROFINS250000061120 Réf. Prel : P23 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-024 - Référence *EUROFINS250000060598 Réf. Prel : P24 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - ESCALIER 2/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-025 - Référence *EUROFINS250000061118 Réf. Prel : P25 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-026 - Référence *EUROFINS250000061119 Réf. Prel : P26 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-027 - Référence *EUROFINS250000061097 Réf. Prel : P27 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-028 - Référence *EUROFINS250000061098 Réf. Prel : P28 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-029 - Référence *EUROFINS250000061113 Réf. Prel : P29 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-030 - Référence *EUROFINS250000061105 Réf. Prel : P30 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-031 - Référence *EUROFINS250000061114 Réf. Prel : P31 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL ESCALIER/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-032 - Référence *EUROFINS250000061099 Réf. Prel : P32 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL ESCALIER/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-033 - Référence *EUROFINS250000061106 Réf. Prel : P33 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - ESCALIER 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-034 - Référence *EUROFINS250000061110 Réf. Prel : P34 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - ESCALIER 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-035 - Référence *EUROFINS250000061107 Réf. Prel : P35 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - ESCALIER 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-036 - Référence *EUROFINS250000061108 Réf. Prel : P36 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - ESCALIER 1/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-037 - Référence *EUROFINS250000061139 Réf. Prel : P37 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-038 - Référence *EUROFINS250000061130 Réf. Prel : P38 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Cloisons (légères et préfabriquées) : Plots de colle - (Dur/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-039 - Référence *EUROFINS250000061111 Réf. Prel : P39 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Cloisons (légères et préfabriquées) : Isolants intérieurs fibreux - (Panneaux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-040 - Référence *EUROFINS250000061109 Réf. Prel : P40 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Colles - (Toile/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-041 - Référence *EUROFINS250000061138 Réf. Prel : P41 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Colles - (Toile/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-042 - Référence *EUROFINS250000061112 Réf. Prel : P42 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Cloisons (légères et préfabriquées) : Plots de colle - (Dur/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-043 - Référence *EUROFINS250000061137 Réf. Prel : P43 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-044 - Référence *EUROFINS250000061136 Réf. Prel : P44 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-045 - Référence *EUROFINS250000061131 Réf. Prel : P45 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-046 - Référence *EUROFINS250000061132 Réf. Prel : P46 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-047 - Référence *EUROFINS250000061133 Réf. Prel : P47 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 10/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-048 - Référence *EUROFINS250000061134 Réf. Prel : P48 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-049 - Référence *EUROFINS250000067203 Réf. Prel : P49 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-050 - Référence *EUROFINS250000061135 Réf. Prel : P50 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-051 - Référence *EUROFINS250000067204 Réf. Prel : P51 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Lissé/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-052 - Référence *EUROFINS250000067205 Réf. Prel : P52 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-053 - Référence *EUROFINS250000067206 Réf. Prel : P53 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-054 - Référence *EUROFINS250000067207 Réf. Prel : P54 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-055 - Référence *EUROFINS250000067208 Réf. Prel : P55 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 9/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-056 - Référence *EUROFINS250000067209 Réf. Prel : P56 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 9/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-057 - Référence *EUROFINS250000067210 Réf. Prel : P57 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 9/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Néoprène/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-058 - Référence *EUROFINS250000067212 Réf. Prel : P58 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Fibres-ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-059 - Référence *EUROFINS250000067213 Réf. Prel : P59 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-060 - Référence *EUROFINS250000067214 Réf. Prel : P60 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-061 - Référence *EUROFINS250000067215 Réf. Prel : P61 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-062 - Référence *EUROFINS250000067216 Réf. Prel : P62 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-063 - Référence *EUROFINS250000067219 Réf. Prel : P63 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-064 - Référence *EUROFINS250000067217 Réf. Prel : P64 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-065 - Référence *EUROFINS250000067195 Réf. Prel : P65 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - CIRCULATION 1/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-066 - Référence *EUROFINS250000067186 Réf. Prel : P66 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 18/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-067 - Référence *EUROFINS250000067179 Réf. Prel : P67 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 18/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-068 - Référence *EUROFINS250000067177 Réf. Prel : P68 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Jaune, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-069 - Référence *EUROFINS250000067178 Réf. Prel : P69 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Jaune, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-070 - Référence *EUROFINS250000067200 Réf. Prel : P70 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-071 - Référence *EUROFINS250000067196 Réf. Prel : P71 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 25/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-072 - Référence *EUROFINS250000067197 Réf. Prel : P72 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 25/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-073 - Référence *EUROFINS250000067198 Réf. Prel : P73 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 25/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-074 - Référence *EUROFINS250000067187 Réf. Prel : P74 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 8/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-075 - Référence *EUROFINS250000067188 Réf. Prel : P75 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 8/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-076 - Référence *EUROFINS250000067199 Réf. Prel : P76 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 7/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-077 - Référence *EUROFINS250000067202 Réf. Prel : P77 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 7/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-078 - Référence *EUROFINS250000061104 Réf. Prel : P78 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 1/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Bitumineux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-079 - Référence *EUROFINS250000067176 Réf. Prel : P79 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - CIRCULATION 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-080 - Référence *EUROFINS250000067201 Réf. Prel : P80 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - LOCAL 25/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-081 - Référence *EUROFINS250000067175 Réf. Prel : P81 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-082 - Référence *EUROFINS250000067185 Réf. Prel : P82 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-083 - Référence *EUROFINS250000067184 Réf. Prel : P83 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - LOCAL 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-084 - Référence *EUROFINS250000067183 Réf. Prel : P84 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - ESCALIER 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-085 - Référence *EUROFINS250000067180 Réf. Prel : P85 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - ESCALIER 1/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-086 - Référence *EUROFINS250000067182 Réf. Prel : P86 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - ESCALIER 1/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-087 - Référence *EUROFINS250000067181 Réf. Prel : P87 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - CIRCULATION 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-088 - Référence *EUROFINS250000067171 Réf. Prel : P88 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-089 - Référence *EUROFINS250000059533 Réf. Prel : P89 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - ESCALIER 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-090 - Référence *EUROFINS250000067173 Réf. Prel : P90 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-091 - Référence *EUROFINS250000067191 Réf. Prel : P91 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - CIRCULATION 2/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-092 - Référence *EUROFINS250000067172 Réf. Prel : P92 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - CIRCULATION 2/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-093 - Référence *EUROFINS250000067174 Réf. Prel : P93 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 1 7/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-094 - Référence *EUROFINS250000059531 Réf. Prel : P94 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-095 - Référence *EUROFINS250000059534 Réf. Prel : P95 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-096 - Référence *EUROFINS250000059526 Réf. Prel : P96 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-097 - Référence *EUROFINS250000059529 Réf. Prel : P97 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Colles de faïence - (Ciment/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-098 - Référence *EUROFINS250000059528 Réf. Prel : P98 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Colles de faïence - (Ciment/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-099 - Référence *EUROFINS250000067211 Réf. Prel : P99 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 9/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Néoprène/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-100 - Référence *EUROFINS250000067190 Réf. Prel : P100 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - COMBLES/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Carton, Toile/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-101 - Référence *EUROFINS250000067194 Réf. Prel : P101 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - COMBLES/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Carton, Toile/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-102 - Référence *EUROFINS250000067193 Réf. Prel : P102 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - COMBLES/Conduits : Calorifugeages (Liste A) - (Tissu/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-103 - Référence *EUROFINS250000059535 Réf. Prel : P103 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Eléments associés à la façade : Conduits - (Fibres-ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-104 - Référence *EUROFINS250000059536 Réf. Prel : P104 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Compact/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-105 - Référence *EUROFINS240000044218 Réf. Prel : P105 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Compact/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-106 - Référence *EUROFINS240000044220 Réf. Prel : P106 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Fin/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-107 - Référence *EUROFINS240000044219 Réf. Prel : P107 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Fin/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE034109-108 - Référence *EUROFINS250000061951 Réf. Prel : P108 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 16/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD SAS
Laboratoire Analyses Vergèze
75C Avenue de Pascalet
30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01
Référence laboratoire N° : 25RB038677
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03
Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Date de réception :08/12/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25KE034109-001 - EUROFINS250000061 29 Réf. Prel : P1 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25KE034109-002 - EUROFINS250000061 96 Réf. Prel : P2 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page2/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25KE034109-003 - EUROFINS250000061 95 Réf. Prel : P3 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/)	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) en traces	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25KE034109-004 - EUROFINS250000061 94 Réf. Prel : P4 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page3/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25KE034109-005 - EUROFINS250000061 93 Réf. Prel : P5 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 1 7/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25KE034109-006 - EUROFINS250000061 91 Réf. Prel : P6 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 1 7/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page4/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25KE034109-007 - EUROFINS250000061 92 Réf. Prel : P7 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 1 7/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Gris, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25KE034109-008 - EUROFINS250000061 02 Réf. Prel : P8 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 16/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page5/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25KE034109-009 - EUROFINS250000061 01 Réf. Prel : P9 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 16/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Lissé/)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25KE034109-010 - EUROFINS250000061 27 Réf. Prel : P10 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page6/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	25KE034109-011 - EUROFINS250000061 23 Réf. Prel : P11 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012	25KE034109-012 - EUROFINS250000061 24 Réf. Prel : P12 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page7/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25KE034109-013 - EUROFINS250000061 26 Réf. Prel : P13 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau souple (polymérisé) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
014	25KE034109-014 - EUROFINS250000061 25 Réf. Prel : P14 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 15/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page8/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	25KE034109-015 - EUROFINS250000061 90 Réf. Prel : P15 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau de type peinture (beige) en traces	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25KE034109-016 - EUROFINS250000061 21 Réf. Prel : P16 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/)	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page9/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25KE034109-017 - EUROFINS250000060 96 Réf. Prel : P17 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 13/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25KE034109-018 - EUROFINS250000061 00 Réf. Prel : P18 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 13/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Bleu)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page10/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25KE034109-019 - EUROFINS250000061 22 Réf. Prel : P19 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 16/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Laine de verre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	25KE034109-020 - EUROFINS250000061 15 Réf. Prel : P20 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 5/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
021	25KE034109-021 - EUROFINS250000061 16 Réf. Prel : P21 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Vert)	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page11/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25KE034109-022 - EUROFINS250000061 17 Réf. Prel : P22 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) en traces	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25KE034109-023 - EUROFINS250000061 20 Réf. Prel : P23 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Marron)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page12/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25KE034109-024 - EUROFINS250000060 98 Réf. Prel : P24 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - ESCALIER 2/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25KE034109-025 - EUROFINS250000061 18 Réf. Prel : P25 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page13/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25KE034109-026 - EUROFINS250000061 19 Réf. Prel : P26 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Vert)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25KE034109-027 - EUROFINS250000061 97 Réf. Prel : P27 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige, Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01
Référence laboratoire N° : 25RB038677
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03
Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Date de réception :08/12/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25KE034109-028 - EUROFINS250000061 98 Réf. Prel : P28 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25KE034109-029 - EUROFINS250000061 13 Réf. Prel : P29 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / FN5U	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page15/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25KE034109-030 - EUROFINS250000061 05 Réf. Prel : P30 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25KE034109-031 - EUROFINS250000061 14 Réf. Prel : P31 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL ESCALIER/Revêtemen s de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris, Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page16/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032 (2)	25KE034109-032 - EUROFINS250000061 99 Réf. Prel : P32 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL ESCALIER/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / FN5U	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
033	25KE034109-033 - EUROFINS250000061 06 Réf. Prel : P33 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - ESCALIER 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25KE034109-034 - EUROFINS250000061 10 Réf. Prel : P34 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - ESCALIER 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page17/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	25KE034109-035 - EUROFINS250000061 07 Réf. Prel : P35 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - ESCALIER 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25KE034109-036 - EUROFINS250000061 08 Réf. Prel : P36 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - ESCALIER 1/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25KE034109-037 - EUROFINS250000061 39 Réf. Prel : P37 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - ESCALIER 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur (beige) ; matériau dur (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page18/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038 (3)	25KE034109-038 - EUROFINS250000061 30 Réf. Prel : P38 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Cloisons (légères et préfabriquées) : Plots de colle - (Dur/Marron)	Matériau semi-dur de type mastic (fibreux) (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MOLP** / FN5U	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
039	25KE034109-039 - EUROFINS250000061 11 Réf. Prel : P39 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Cloisons (légères et préfabriquées) : Isolants intérieurs fibreux - (Panneaux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page19/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25KE034109-040 - EUROFINS250000061 09 Réf. Prel : P40 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Colles - (Toile/)	Matériau de type colle (fibreux) (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25KE034109-041 - EUROFINS250000061 38 Réf. Prel : P41 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Moquettes murales / Colles - (Toile/)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page20/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042 (3)	25KE034109-042 - EUROFINS250000061 12 Réf. Prel : P42 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Cloisons (légères et préfabriquées) : Plots de colle - (Dur/Marron)	Matériau semi-dur de type mastic (fibreux) (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MOLP** / FN5U	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
043	25KE034109-043 - EUROFINS250000061 37 Réf. Prel : P43 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/)	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25KE034109-044 - EUROFINS250000061 36 Réf. Prel : P44 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses - (Fibreux/)	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page21/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	25KE034109-045 - EUROFINS250000061 31 Réf. Prel : P45 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25KE034109-046 - EUROFINS250000061 32 Réf. Prel : P46 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 11/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) - (Fibreux/)	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MOLP** / FN5U	6 / 6	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite), grunerite-amiante (amosite)
047 (4)	25KE034109-047 - EUROFINS250000061 33 Réf. Prel : P47 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 10/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (marron)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page22/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	25KE034109-048 - EUROFINS250000061 34 Réf. Prel : P48 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25KE034109-049 - EUROFINS250000067 03 Réf. Prel : P49 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01
Référence laboratoire N° : 25RB038677
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03
Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Date de réception :08/12/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	25KE034109-050 - EUROFINS250000061 35 Réf. Prel : P50 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25KE034109-051 - EUROFINS250000067 04 Réf. Prel : P51 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Lissé/)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page24/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25KE034109-052 - EUROFINS250000067 05 Réf. Prel : P52 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
053	25KE034109-053 - EUROFINS250000067 06 Réf. Prel : P53 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01
Référence laboratoire N° : 25RB038677
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03
Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Date de réception :08/12/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	25KE034109-054 - EUROFINS250000067 07 Réf. Prel : P54 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	25KE034109-055 - EUROFINS250000067 08 Réf. Prel : P55 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 9/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page26/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	25KE034109-056 - EUROFINS250000067 09 Réf. Prel : P56 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 9/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057 (5)	25KE034109-057 - EUROFINS250000067 10 Réf. Prel : P57 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 9/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Néoprène/Jaune)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	25KE034109-058 - EUROFINS250000067 12 Réf. Prel : P58 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Fibres-ciment/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page27/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	25KE034109-059 - EUROFINS250000067 13 Réf. Prel : P59 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25KE034109-060 - EUROFINS250000067 14 Réf. Prel : P60 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page28/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	25KE034109-061 - EUROFINS250000067 15 Réf. Prel : P61 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25KE034109-062 - EUROFINS250000067 16 Réf. Prel : P62 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Bleu)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25KE034109-063 - EUROFINS250000067 19 Réf. Prel : P63 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Bleu)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 |
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	25KE034109-064 - EUROFINS250000067 17 Réf. Prel : P64 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Bleu)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	25KE034109-065 - EUROFINS250000067 95 Réf. Prel : P65 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - CIRCULATION 1/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/)	Matériau semi-dur (fibreux) (gris)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page30/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	25KE034109-066 - EUROFINS25000006786 Réf. Prel : P66 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 18/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige, Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (beige) en traces	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	25KE034109-067 - EUROFINS25000006779 Réf. Prel : P67 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 18/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Beige, Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (beige) en traces	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page31/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	25KE034109-068 - EUROFINS250000067 77 Réf. Prel : P68 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Jaune, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	25KE034109-069 - EUROFINS250000067 78 Réf. Prel : P69 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Jaune, Clair)	Matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page32/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	25KE034109-070 - EUROFINS250000067 00 Réf. Prel : P70 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Vert)	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	25KE034109-071 - EUROFINS250000067 96 Réf. Prel : P71 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 25/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Vert)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page33/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	25KE034109-072 - EUROFINS250000067 97 Réf. Prel : P72 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 25/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	25KE034109-073 - EUROFINS250000067 98 Réf. Prel : P73 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 25/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Mou/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	25KE034109-074 - EUROFINS250000067 87 Réf. Prel : P74 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 8/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page34/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	25KE034109-075 - EUROFINS25000006788 Réf. Prel : P75 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 8/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	25KE034109-076 - EUROFINS25000006799 Réf. Prel : P76 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 7/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Gris, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page35/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077	25KE034109-077 - EUROFINS250000067 02 Réf. Prel : P77 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 7/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	25KE034109-078 - EUROFINS250000061 04 Réf. Prel : P78 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 1/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Bitumineux/)	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / VS8G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	25KE034109-079 - EUROFINS250000067 76 Réf. Prel : P79 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - CIRCULATION 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page36/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080	25KE034109-080 - EUROFINS250000067 01 Réf. Prel : P80 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - LOCAL 25/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	25KE034109-081 - EUROFINS250000067 75 Réf. Prel : P81 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - CIRCULATION 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Beige Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page37/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
082 (4)	25KE034109-082 - EUROFINS250000067 85 Réf. Prel : P82 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	25KE034109-083 - EUROFINS250000067 84 Réf. Prel : P83 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - LOCAL 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Jaune)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page38/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084	25KE034109-084 - EUROFINS250000067 83 Réf. Prel : P84 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - ESCALIER 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	25KE034109-085 - EUROFINS250000067 80 Réf. Prel : P85 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - ESCALIER 1/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page39/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	25KE034109-086 - EUROFINS250000067 82 Réf. Prel : P86 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - ESCALIER 1/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	25KE034109-087 - EUROFINS250000067 81 Réf. Prel : P87 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - CIRCULATION 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	25KE034109-088 - EUROFINS250000067 71 Réf. Prel : P88 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - CIRCULATION 1/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris, Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page40/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
089	25KE034109-089 - EUROFINS250000059 33 Réf. Prel : P89 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+3 - ESCALIER 2/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	25KE034109-090 - EUROFINS250000067 73 Réf. Prel : P90 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+1 - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page41/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091 (6)	25KE034109-091 - EUROFINS250000067 91 Réf. Prel : P91 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - CIRCULATION 2/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau dur (orange) en traces	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092 (6)	25KE034109-092 - EUROFINS250000067 72 Réf. Prel : P92 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - CIRCULATION 2/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Compact/)	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page42/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
093	25KE034109-093 - EUROFINS250000067 74 Réf. Prel : P93 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 1 7/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Ciment/Bleu, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	25KE034109-094 - EUROFINS250000059 31 Réf. Prel : P94 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris, Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page43/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095	25KE034109-095 - EUROFINS250000059 34 Réf. Prel : P95 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 14/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	25KE034109-096 - EUROFINS250000059 26 Réf. Prel : P96 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - ESCALIER 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier/)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page44/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097	25KE034109-097 - EUROFINS250000059 29 Réf. Prel : P97 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Colles de faïence - (Ciment/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	25KE034109-098 - EUROFINS250000059 28 Réf. Prel : P98 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Colles de faïence - (Ciment/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	25KE034109-099 - EUROFINS250000067 11 Réf. Prel : P99 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - R+2 - LOCAL 9/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Néoprène/Jaune)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) en traces	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page45/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	25KE034109-100 - EUROFINS25000006790 Réf. Prel : P100 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - COMBLES/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Carton, Toile/)	Matériau (pulvérulent) (marron) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau de type maillage de fibres et liant (marron) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
101	25KE034109-101 - EUROFINS25000006794 Réf. Prel : P101 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - COMBLES/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Carton, Toile/)	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (beige)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page46/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102	25KE034109-102 - EUROFINS250000067 93 Réf. Prel : P102 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - COMBLES/Conduits : Calorifugeages (Liste A) - (Tissu/Gris)	Matériau (bitumineux) (noir) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (noir) ; matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
103	25KE034109-103 - EUROFINS250000059 35 Réf. Prel : P103 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Eléments associés à la façade : Conduits - (Fibres-ciment/)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
104	25KE034109-104 - EUROFINS250000059 36 Réf. Prel : P104 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Compact/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page47/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
105	25KE034109-105 - EUROFINS240000044 18 Réf. Prel : P105 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Compact/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	25KE034109-106 - EUROFINS240000044 20 Réf. Prel : P106 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Fin/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page48/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
107	25KE034109-107 - EUROFINS240000044 19 Réf. Prel : P107 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Fin/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108 (6)	25KE034109-108 - EUROFINS250000061 51 Réf. Prel : P108 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - RDC - LOCAL 16/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page49/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

Observation(s) échantillon(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibre-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type mastic (fibreux) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(4) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(5) Un matériau de type colle (jaune) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(6) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-059692-01 | Date d'émission de rapport : 11/12/2025 21:03 | Page50/50
Référence laboratoire N° : 25RB038677 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE034109
Reçu au laboratoire le : 10/12/2025 | Date de réception :08/12/2025
Date d'analyse : 10/12/2025
Référence dossier Client:25KE034109 - 1510797812/28777017/S2/1/2_28777017/2/1

Validé et approuvé par :



Andra Enescu
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Benjamin LACOME
450 Rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER

Notre référence : AR-26-KE-015443-01

Numéro de dossier : 26KE009992
Référence de dossier : 1510797812/28777017/S2/1/4_28777017/2/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26KE009992-001 - Référence *EUROFINS250000068453 Réf. Prel : P113 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - TOITURE 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009992-002 - Référence *EUROFINS250000308720 Réf. Prel : P114 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - TOITURE 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009992-003 - Référence *EUROFINS250000068454 Réf. Prel : P115 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - TOITURE 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009992-004 - Référence *EUROFINS250000068448 Réf. Prel : P116 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - TOITURE 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26KE009992-005 - Référence *EUROFINS250000068449 Réf. Prel : P117 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - TOITURE 2/Conduits en toiture : Conduits de fumée (Liste B) - (Fibres-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD SAS
Analyses EABS
75C Avenue de Pascalet
30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023392-01 — Date d'émission de rapport : 14/04/2026 4:22 —
Référence laboratoire N° : 26RI023670 — Référence de suivi du dossier N° : 26KE009992
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 — Date de réception :07/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009992 - 1510797812/28777017/S2/1/4_28777017/2/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26KE009992-001 - EUROFINS250000068 53 Réf. Prel : P113 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - TOITURE 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Paxalu/Noir)	Matériau (gris) ; matériau de type aluminium ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26KE009992-002 - EUROFINS250000308 20 Réf. Prel : P114 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - TOITURE 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Paxalu/Noir)	Matériau (beige) ; matériau de type aluminium ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023392-01
Référence laboratoire N° : 26RI023670
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Date d'émission de rapport : 14/04/2026 4:22
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009992
Date de réception :07/04/2026
Référence dossier Client:26KE009992 - 1510797812/28777017/S2/1/4_28777017/2/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	26KE009992-003 - EUROFINS250000068 54 Réf. Prel : P115 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - TOITURE 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Noir)	Matériau semi-dur (fibreux) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26KE009992-004 - EUROFINS250000068 48 Réf. Prel : P116 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - TOITURE 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Noir)	Matériau semi-dur (fibreux) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	**MET** / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023392-01
Référence laboratoire N° : 26RI023670
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009992 - 1510797812/28777017/S2/1/4_28777017/2/1

Date d'émission de rapport : 14/04/2026 4:22
Référence de suivi du dossier N° : 26KE009992
Date de réception :07/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	26KE009992-005 - EUROFINS250000068 49 Réf. Prel : P117 REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - BATIMENT D - TOITURE 2/Conduits en toiture : Conduits de fumée (Liste B) - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / Y9QX	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-023392-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 4:22
Référence laboratoire N° : 26RI023670 Référence de suivi du dossier N° : 26KE009992
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception :07/04/2026
Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:26KE009992 - 1510797812/28777017/S2/1/4_28777017/2/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Dominika Dolik
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
