Diagramme de Gantt
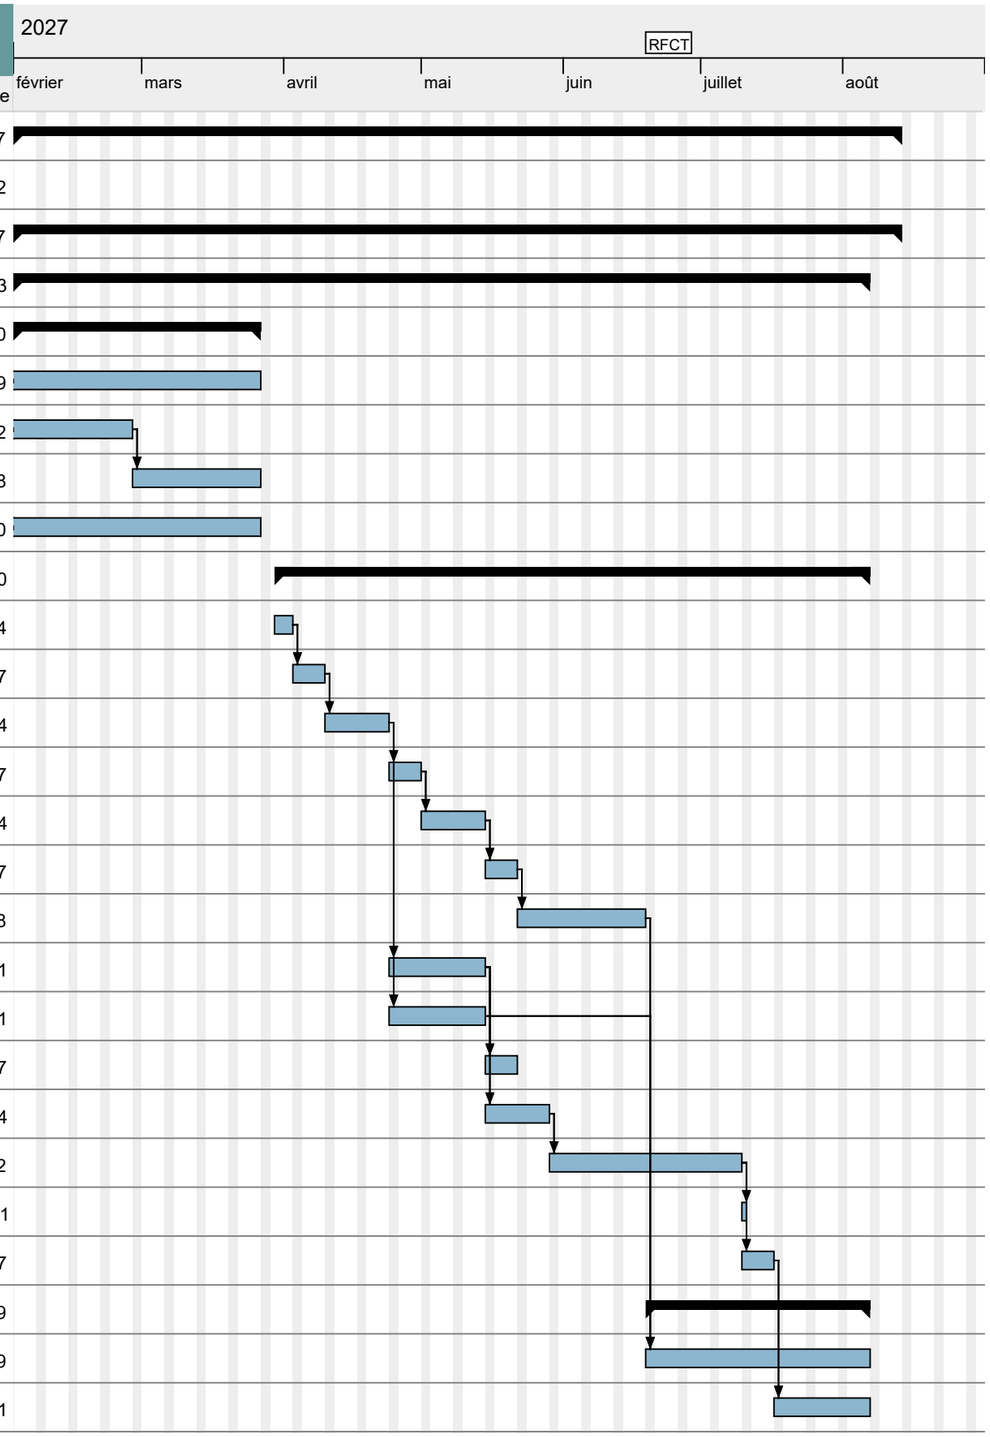
Nom	Durée
PROJET	667
Projet / DCE	52
PRESTATION INTELLECTUELLES	667
TRAVAUX	193
Période de préparation Lot1 / Lot2	60
Rédaction et validation des documents d'exécution (calendreir, note de calcul, plan, FT etc.)	59
Rédaction et validation du PIC	32
Installations commune de chantier (bureaux/hygiène/securité collective/tri déchet)	28
Rédaction et validation des PPSPS	60
Travaux	130
Traitement des nids de guêpes	4
Démontage des couvertures + bardages + ossatures + goutières zones 20/42/66/118/168	7
Arrachage des étanchéités sur tirants, haubands, pieds d'arc et arcs + bandes d'égouts zones 20/42/66/118/168	14
Nettoyage et démoussage des dallages en pavés de verre + panneaux de coffrages zones 20/42/66/118/168	7
Fourniture et pose des armatures en treillis soudé de structure type ST35 zones 20/42/66/118/168	14
Fourniture et mise en œuvre de béton prêt à l'emploi type BPS NF EN206/N C25/30 XC1	7
Séchage du béton 28 jours zones 20/42/66/118/168	28
Dépose et arrachage des étanchéité PVC + bitume + bandes d'égouts en surface courante, pieds d'arc, tirants, haubans, acrotères zone 0 à 115	21
Réparation des ouvrages en béton (épaufrures + reprises localisées)	21
Fourniture et pose couverture bac acier + solin zones 20,42,66,118 et 168	7
Fourniture et pose bandes d'égouts zones 0 à 118 et 168	14
Fourniture et mise en oeuvre des complexe d'étanchéité en surface courante, haubans, pieds d'arc, tirants, arcs, façades et acrotères zone 0 à 118 et 168	42
Fourniture et pose des coiffes d'acrotère zone 0	1
Fourniture et pose des escaliers métalliques zone 20/66/118 et 168	7
Réception	49
OPR Lot 1 Gros oeuvre (constat achèvement>réception)	49
OPR Lot 2 Etanchéité	21
