BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Réglementaire Nouvelle Aquitaine
48 avenue du 8 mai 1945
Espace Mendi Alde Bâtiment A
64100 BAYONNE

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28780469/S7/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 05/12/2025

Référence au programme de travaux :
Constats de localisation UPPA Constats de localisation UPPA Campus de PAU Rev01 réalisé le 01/01/2025 par Bureau Veritas

DONNEUR D'ORDRE

UPPA

Fanny DI FIORTE
Avenue de l'Universite
64000 PAU

SITE D'INTERVENTION

DIAGNOSTICS UPPA PAU

Avenue de l'Universite
64000 PAU

IUT Genie Thermique

Latitude : 43.313200 / Longitude : -0.367200

Date(s) d'intervention(s) :
Le 13/11/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
FADRIQUE Nicolas	Diagnostiqueur	Certification N° 14666998	FADRIQUE Nicolas

Le présent rapport comporte 134 pages, dont 119 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 6
2.2. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Conditions spécifiques 9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 15

7. ANNEXES **16**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 16
7.2. Photos prélèvements 17
7.3. Attestation d'assurance 22
7.4. Certificat de compétence 24
7.5. Croquis de repérage 25
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire 29

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

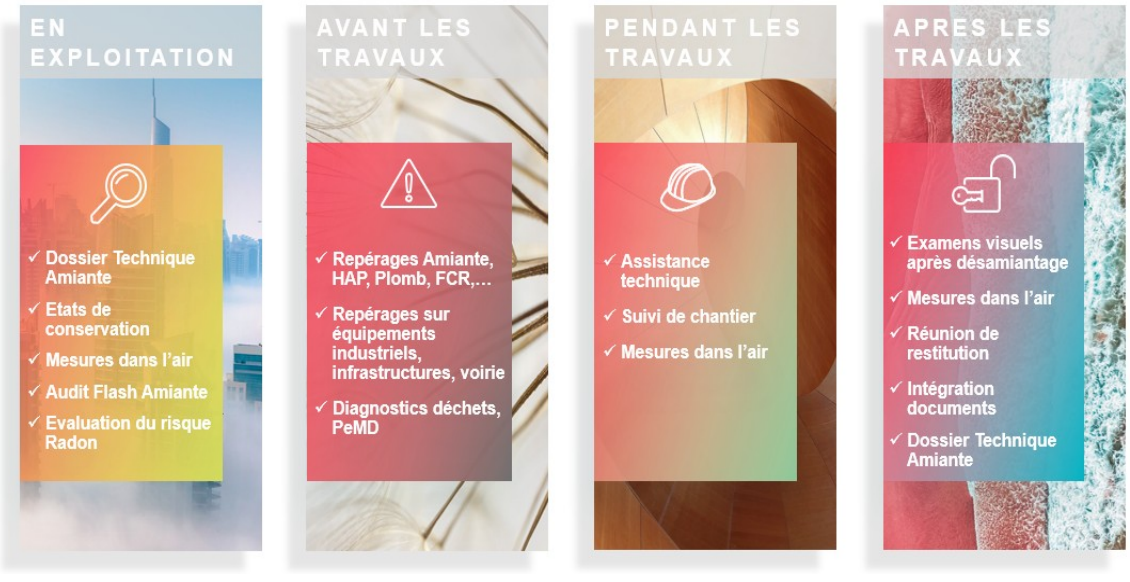

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Reprise diverse suivant "Constats de localisation UPPA Campus de PAU Rev01"

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Suivant "Constats de localisation UPPA Campus de PAU Rev01"

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
2	RDC -> GTE.RDC.09	Poteaux	Coffrages perdus	Fibres-ciment	Gris
2	R+1 -> GTE.01.19				

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DIAGNOSTICS UPPA PAU
Avenue de l'Universite
64000 PAU

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DIAGNOSTICS UPPA PAU	Enseignement supérieur / Recherche	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Fanny DI FIORTE	Donneur d'ordre	UPPA	Avenue de l'Universite 64000 PAU	0627351555

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 13/11/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Constats de localisation UPPA	Bureau Veritas	01/01/2025	Constats de localisation UPPA Campus de PAU Rev01	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> GTE.RDC.09	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	8	P9* N	/	AN	peinture blanche, fine sous face escalier	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	8	P26 N	/	AN	peinture blanche, fine sous face escalier	Non
	Poteaux	Coffrages perdus	Fibres-ciment	Gris	2	P2* P	/	AN	coffrage perdu en fibre, ciment, + peinture rouge	*Oui*
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Marron	3	P3* N	/	AN	lé plastique souple, plus ragréage gris	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	3	P3* N	/	AN	lé plastique souple, plus ragréage gris	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> GTE.RDC.09	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	5	P5* N	/	AN	Joint gris, dur, compact entre carrelage beige	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	6	P6* N	/	AN	Colle grise dure compact sous carrelage beige	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	5	P22 N	/	AN	Joint gris, dur, compact entre carrelage beige	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	6	P23 N	/	AN	Colle grise dure compact sous carrelage beige	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Marron	3	P24 N	/	AN	lé plastique souple, plus ragréage gris	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	3	P24 N	/	AN	lé plastique souple, plus ragréage gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Compact, Dur	Gris	4	P4* N	/	AN	enduit gris, dur compact avec relief sur monticule béton	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Compact, Dur	Gris	7	P8* N	/	AN	peinture beige sur béton gris, limon, escalier	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	7	P8* N	/	AN	peinture beige sur béton gris, limon, escalier	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Compact, Dur	Gris	7	P25 N	/	AN	peinture beige sur béton gris, limon, escalier	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> GTE.RDC.09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	7	P25 N	/	AN	peinture beige sur béton gris, limon, escalier	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Compact, Dur	Gris	4	P27 N	/	AN	enduit gris, dur compact avec relief sur monticule béton	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	joint d'assemblage, gris dur, compact de brique	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	1	P7 N	/	AN	joint d'assemblage, gris dur, compact de brique	Non
RDC -> GTE.RDC.21	Plafonds	Flocages	Cotonneux, Duveteux	Blanc	13	P18* N	/	AN	flocage, blanc, duveteux, coton, plafond	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	11	P16* N	/	AN	colle grise du compact sous carrelage beige	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	12	P17* N	/	AN	joint gris, dur compact entre carrelage beige	Non
RDC -> GTE.RDC.25	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	9	P12* N	/	AN	colle blanche dure compact sous faïence	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Gris	10	P13* N	/	AN	Joint gris, dur, compact, compact entre faïence	Non
RDC -> GTE.RDC.26	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	11	P14 N	/	AN	colle grise du compact sous carrelage beige	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> GTE.RDC.26	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	12	P15 N	/	AN	joint gris, dur compact entre carrelage beige	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	9	P10 N	/	AN	colle blanche dure compact sous faïence	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Gris	10	P11 N	/	AN	Joint gris, dur, compact, compact entre faïence	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Compact, Plâtre	Blanc	15	P20* N	/	AN	Enduit blanc, plâtre, + peinture beige sur mur	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	15	P20* N	/	AN	Enduit blanc, plâtre, + peinture beige sur mur	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Compact, Plâtre	Blanc	15	P21 N	/	AN	Enduit blanc, plâtre, + peinture beige sur mur	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	15	P21 N	/	AN	Enduit blanc, plâtre, + peinture beige sur mur	Non
	Portes	Peintures	Décoratif	Rouge	14	P19* N	/	AN	peinture rouge, fine sur porte bois	Non
R+1 -> GTE.01.19	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Compact, Dur	Gris	16	P28* N	/	AN	enduit, gris dur, compact, + peinture beige	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	16	P28* N	/	AN	enduit, gris dur, compact, + peinture beige	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> GTE.01.19	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Compact, Dur	Gris	16	P29 N	/	AN	enduit, gris dur, compact, + peinture beige	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	16	P29 N	/	AN	enduit, gris dur, compact, + peinture beige	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	17	P30* N	/	AN	joint de vitrage, caoutchouc sur menuiserie aluminium	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	18	P31* N	/	AN	joint d'étanchéité, caoutchouc sur ouvrant de menuiserie aluminium	Non
	Poteaux	Coffrages perdus	Fibres-ciment	Gris	2	Idem P 2	/	AN	coffrage perdu en fibre, ciment, + peinture rouge	***Oui***
R+1 -> GTE.01.30	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	9	Idem P 12	/	AN	colle blanche dure compact sous faïence	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Gris	10	Idem P 13	/	AN	Joint gris, dur, compact, compact entre faïence	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
2	Poteaux	Coffrages perdus	8 U

7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC	/
RDC -> GTE.RDC.09	/
RDC -> GTE.RDC.21	/
RDC -> GTE.RDC.25	/
RDC -> GTE.RDC.26	/
R+1	/
R+1 -> GTE.01.19	/
R+1 -> GTE.01.30	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	


P2	ZPSO 2
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Poteaux -> Coffrages perdus (Liste B)	

P4	ZPSO 4
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P5	ZPSO 5
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

P6	ZPSO 6
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P7	ZPSO 1
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

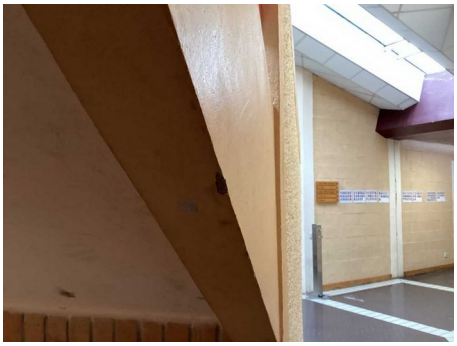P8	ZPSO 7
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B) | Peinture	

P9	ZPSO 8
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	


P10	ZPSO 9
RDC -> GTE.RDC.26	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P11	ZPSO 10
RDC -> GTE.RDC.26	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de faïence	

P12	ZPSO 9
RDC -> GTE.RDC.25	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P13	ZPSO 10
RDC -> GTE.RDC.25	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de faïence	

Copyright BUREAU VERITAS

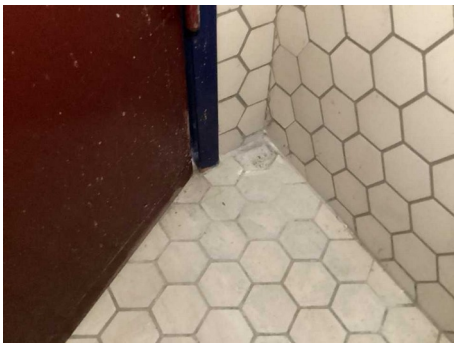
P14	ZPSO 11
RDC -> GTE.RDC.26	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

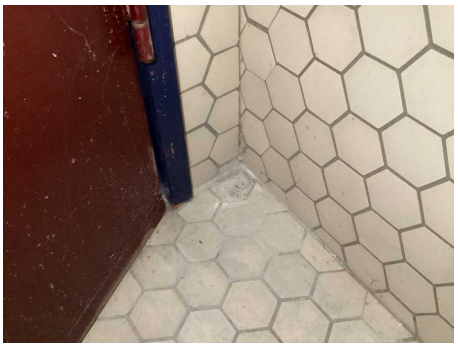P15	ZPSO 12
RDC -> GTE.RDC.26	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

P16	ZPSO 11
RDC -> GTE.RDC.21	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P17	ZPSO 12
RDC -> GTE.RDC.21	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

P19	ZPSO 14
RDC -> GTE.RDC.26	
	
Portes -> Peintures	

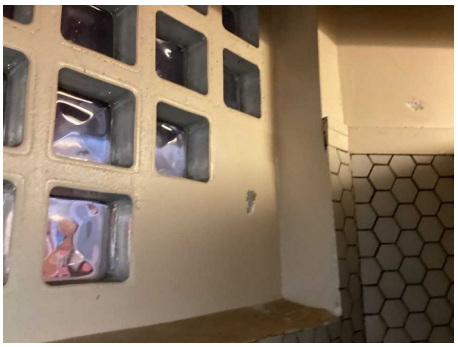P20	ZPSO 15
RDC -> GTE.RDC.26	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B) | Peinture	

P21	ZPSO 15
RDC -> GTE.RDC.26	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B) | Peinture	

P22	ZPSO 5
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

P23	ZPSO 6
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P24	ZPSO 3
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples | Ragréages	

P25	ZPSO 7
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B) | Peinture	

P26	ZPSO 8
RDC -> GTE.RDC.09	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P28	ZPSO 16
R+1 -> GTE.01.19	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B) | Peinture	

P29	ZPSO 16
R+1 -> GTE.01.19	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B) | Peinture	

P31	ZPSO 18
R+1 -> GTE.01.19	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

7.3. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR 00 487 424 608*

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.4. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Nicolas FADRIQUE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Électricité	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	10/04/2018	09/04/2023
Gaz	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	18/01/2018	17/01/2023
DPE sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	10/04/2018	09/04/2023
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	07/09/2022	06/09/2029
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	07/09/2022	06/09/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	19/05/2022	18/05/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	19/05/2022	18/05/2029

Date :18/05/2022

Numéro de certificat : 14666998

Laurent Croguennec, Président

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

BUREAU VERITAS

7.5. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DIAGNOSTICS UPPA PAU Avenue de l'Universite 64000 PAU	
Localisation RDC	Date visite	Le 13/11/2025
	Auteur	FADRIQUE Nicolas
	N° dossier	28780469/S7/1
	Planche	1 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

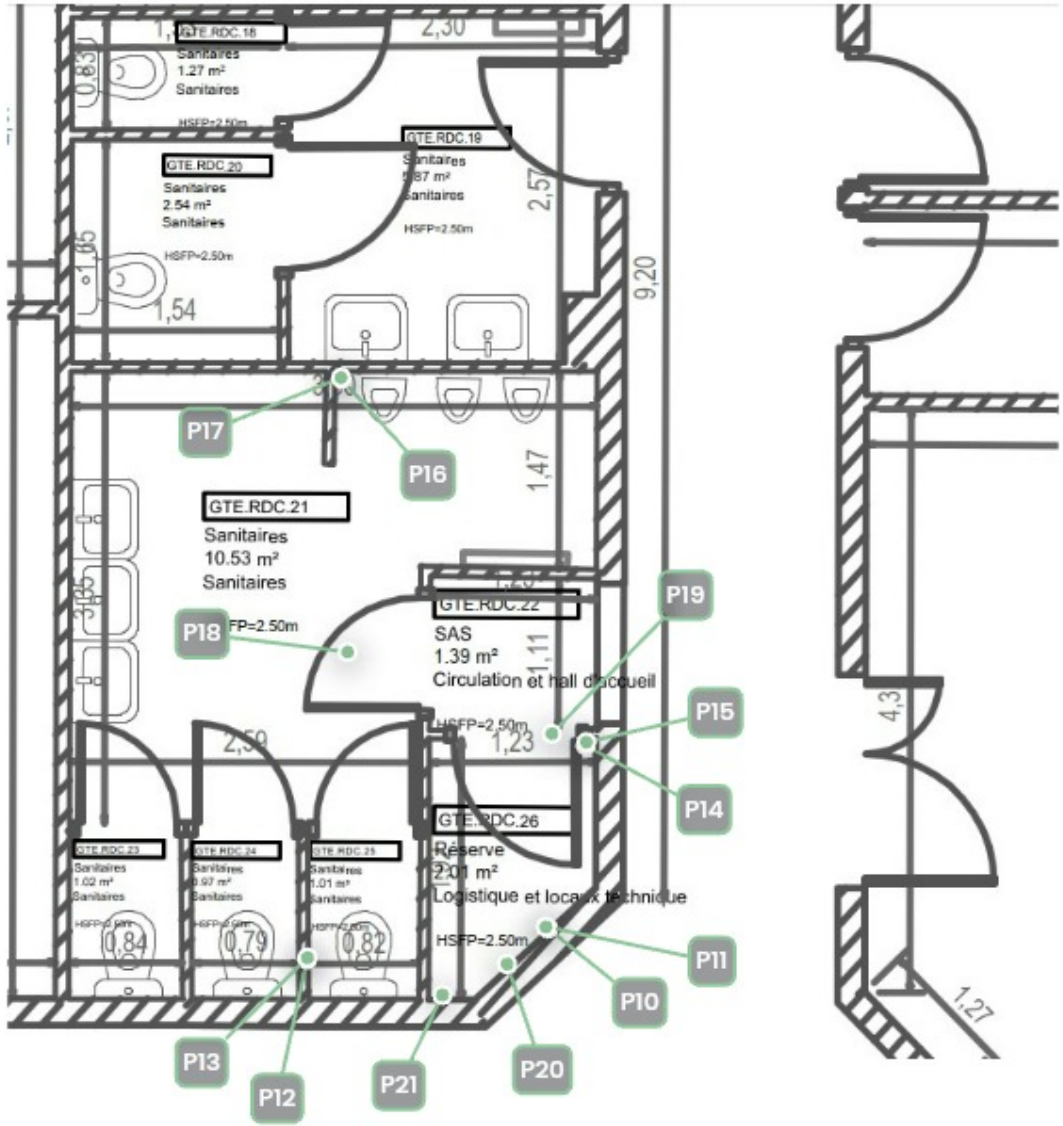

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DIAGNOSTICS UPPA PAU Avenue de l'Universite 64000 PAU	
Localisation RDC > GTE.RDC.09	Date visite	Le 13/11/2025
	Auteur	FADRIQUE Nicolas
	N° dossier	28780469/S7/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- coffrage perdu, en amiante de ciment peint en rouge

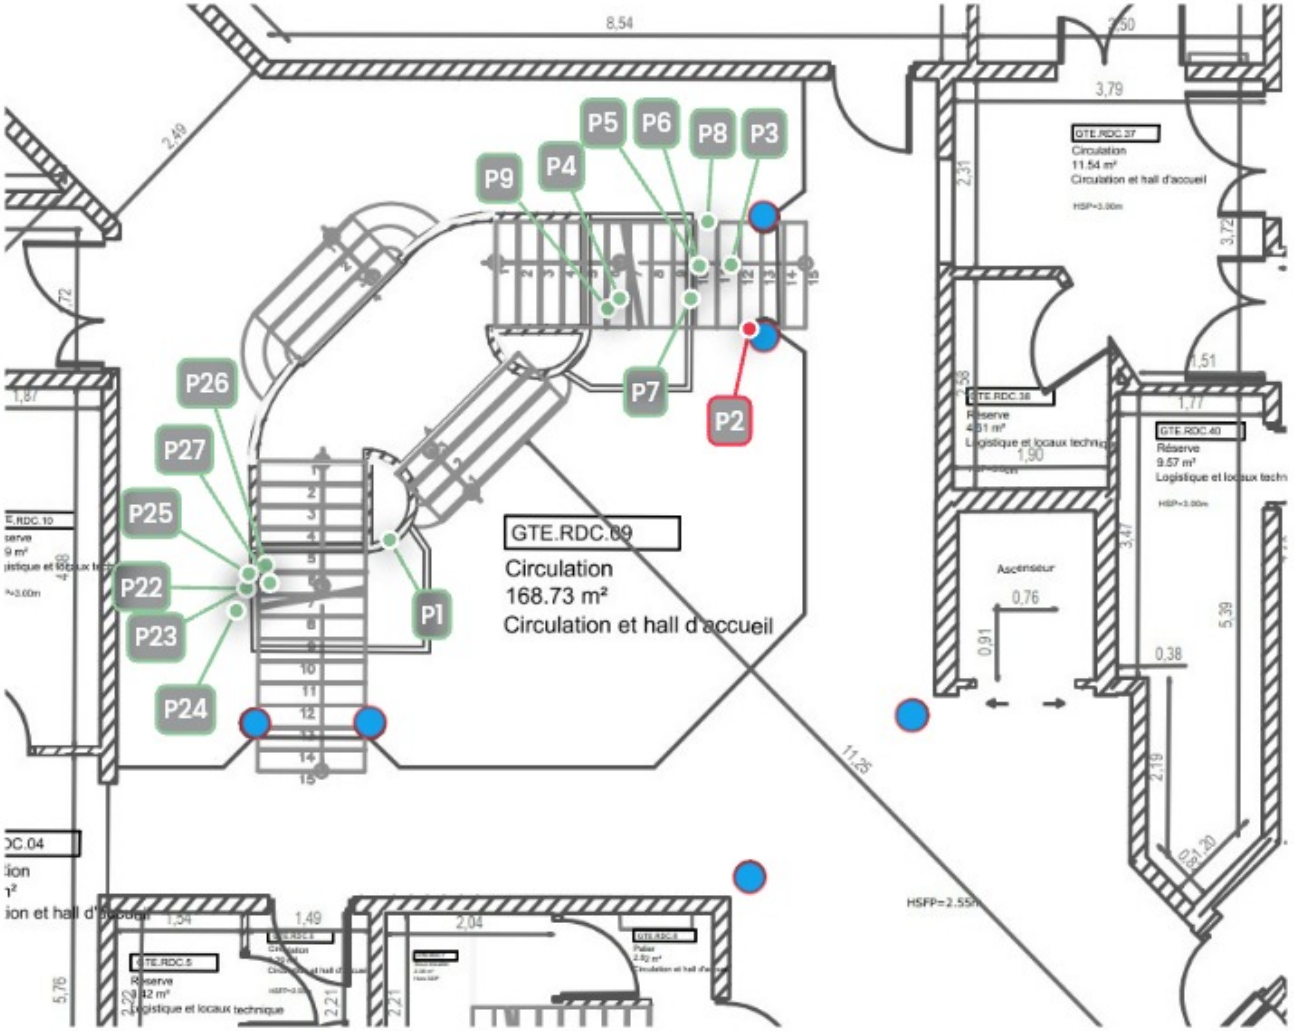

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DIAGNOSTICS UPPA PAU Avenue de l'Universite 64000 PAU	
Localisation R+1	Date visite	Le 13/11/2025
	Auteur	FADRIQUE Nicolas
	N° dossier	28780469/S7/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- coffrage perdu, en amiante de ciment peint en rouge

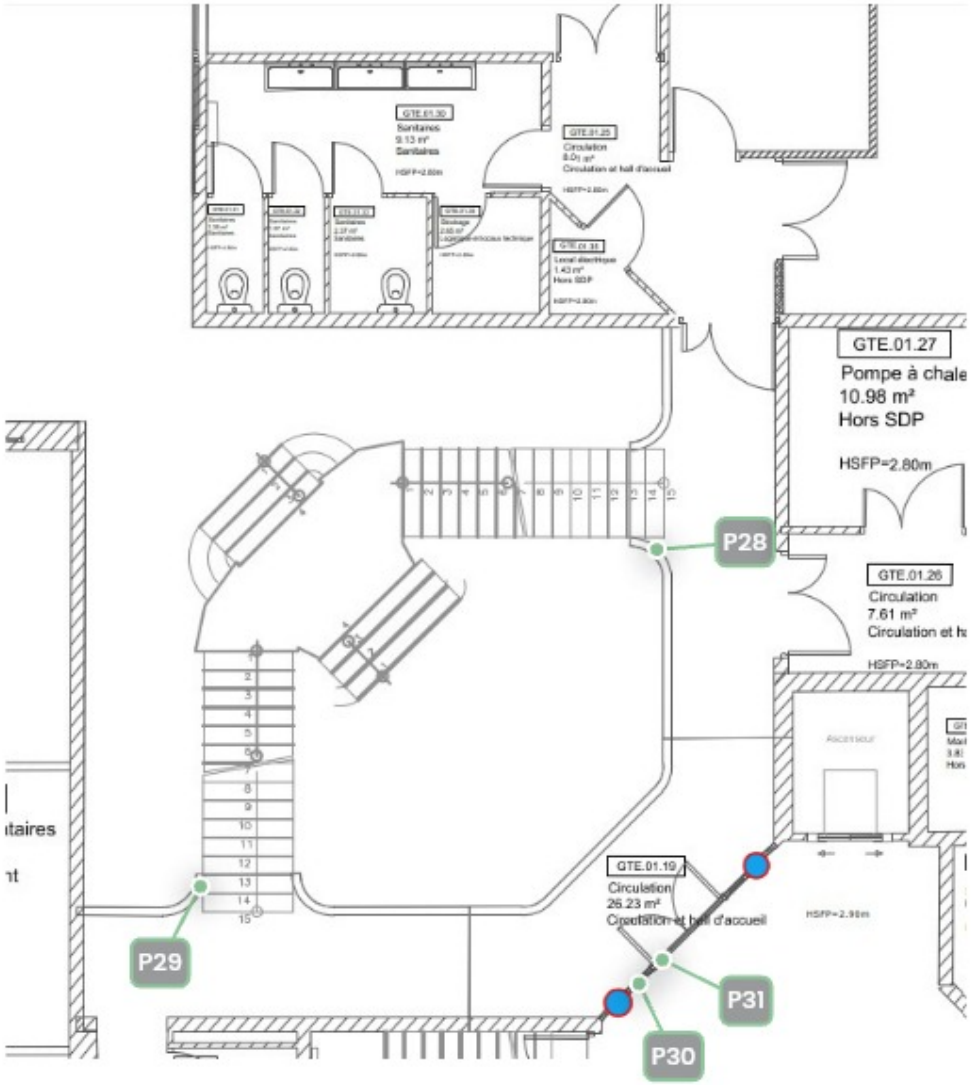

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Nicolas FADRIQUE
30 Avenue Gustave Eiffel
33615 PESSAC CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085555-01 | Date d'émission de rapport : 24/11/2025 23:58 | Page1/9
Dossier N° : 25K037067 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S7/1/1_28780469/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3LO1300 Réf. Prel : P1 RDC - GTE.RDC.09/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Joints d'assemblage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	BV3LO1301 Réf. Prel : P2 RDC - GTE.RDC.09/Poteaux : Coffrages perdus (Liste B) - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** * / D5UE	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
003	BV3LO1302 Réf. Prel : P3 RDC - GTE.RDC.09/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Ragréages - (Lé/Marron)	Matériau souple (gris) (foncé) (violet) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085555-01 | Date d'émission de rapport : 24/11/2025 23:58 | Page2/9
Dossier N° : 25K037067 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S7/1/1_28780469/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (2)	BV3LO1303 Réf. Prel : P4 RDC - GTE.RDC.09/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Compact, Dur/Gris)	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	BV3LO1304 Réf. Prel : P5 RDC - GTE.RDC.09/Revêtements de sol : Joints de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur (beige) + (gris) (cémenteux)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3LO1305 Réf. Prel : P6 RDC - GTE.RDC.09/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Dur/Gris)	Matériau dur (beige) + (gris) (cémenteux)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	BV3LO1306 Réf. Prel : P7 RDC - GTE.RDC.09/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Joints d'assemblage - (Ciment/Gris)	Matériau dur (beige) + (gris) (cémenteux) ; matériau semi-dur (marron) (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085555-01 | Date d'émission de rapport : 24/11/2025 23:58 | Page3/9
Dossier N° : 25K037067 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S7/1/1_28780469/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	BV3LO1307 Réf. Prel : P8 RDC - GTE.RDC.09/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) / Peinture - (Compact, Ciment, Dur/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009 (2)	BV3LO1308 Réf. Prel : P9 RDC - GTE.RDC.09/Plafonds : Peintures décoratives - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (plâtreux)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	BV3LO1309 Réf. Prel : P10 RDC - GTE.RDC.26/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (beige) en traces	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	BV3LO1310 Réf. Prel : P11 RDC - GTE.RDC.26/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Joints de faïence - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085555-01 | Date d'émission de rapport : 24/11/2025 23:58 | Page4/9
Dossier N° : 25K037067 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S7/1/1_28780469/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (2)	BV3LO1311 Réf. Prel : P12 RDC - GTE.RDC.25/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013 (2)	BV3LO1312 Réf. Prel : P13 RDC - GTE.RDC.25/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Joints de faïence - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	BV3LO1313 Réf. Prel : P14 RDC - GTE.RDC.26/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau dur (beige) (granulaire)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	BV3LO1314 Réf. Prel : P15 RDC - GTE.RDC.26/Revêtements de sol : Joints de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur (beige) (cémenteux)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085555-01 | Date d'émission de rapport : 24/11/2025 23:58 | Page5/9
Dossier N° : 25K037067 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S7/1/1_28780469/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (2)	BV3LO1315 Réf. Prel : P16 RDC - GTE.RDC.21/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau de type poussières en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017 (2)	BV3LO1316 Réf. Prel : P17 RDC - GTE.RDC.21/Revêtements de sol : Joints de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau de type poussières en traces ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau (blanc) en traces	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	BV3LO1317 Réf. Prel : P18 RDC - GTE.RDC.21/Plafonds : Flocages (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux/Blanc)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	BV3LO1318 Réf. Prel : P19 RDC - GTE.RDC.26/Portes : Peintures - (Décoratif/Rouge)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP** * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085555-01 | Date d'émission de rapport : 24/11/2025 23:58 | Page6/9
Dossier N° : 25K037067 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S7/1/1_28780469/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	Bv3LO1319 Réf. Prel : P20 RDC - GTE.RDC.26/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) / Peinture - (Compact, Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	Bv3LO1320 Réf. Prel : P21 RDC - GTE.RDC.26/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) / Peinture - (Compact, Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur (gris) (cémenteux)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	Bv3LO1321 Réf. Prel : P22 RDC - GTE.RDC.09/Revêtements de sol : Joints de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau de type poussières en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (plâtreux) en traces ; matériau (gris) en traces ; matériau dur (gris) (granulaire)(i)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023 (2)	Bv3LO1322 Réf. Prel : P23 RDC - GTE.RDC.09/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Dur/Gris)	Matériau de type poussières en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (gris) (granulaire) (granulaire)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085555-01 | Date d'émission de rapport : 24/11/2025 23:58 | Page7/9
Dossier N° : 25K037067 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S7/1/1_28780469/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	Bv3LO1323 Réf. Prel : P24 RDC - GTE.RDC.09/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Ragréages - (Lé/Marron)	Matériau souple (gris) (foncé) (violet) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	Bv3LO1324 Réf. Prel : P25 RDC - GTE.RDC.09/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) / Peinture - (Compact, Ciment, Dur/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	Bv3LO1325 Réf. Prel : P26 RDC - GTE.RDC.09/Plafonds : Peintures décoratives - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	Bv3LO1326 Réf. Prel : P27 RDC - GTE.RDC.09/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Compact, Dur/Gris)	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085555-01 | Date d'émission de rapport : 24/11/2025 23:58 | Page8/9
Dossier N° : 25K037067 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S7/1/1_28780469/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	Bv3LO1327 Réf. Prel : P28 R+1 - GTE.01.19/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) / Peinture - (Ciment, Compact, Dur/Gris)	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	Bv3LO1328 Réf. Prel : P29 R+1 - GTE.01.19/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) / Peinture - (Ciment, Compact, Dur/Gris)	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	Bv3LO1329 Réf. Prel : P30 R+1 - GTE.01.19/Menuiseries intérieures : Joints d'étanchéité - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir) (rose)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031 (2)	Bv3LO1330 Réf. Prel : P31 R+1 - GTE.01.19/Menuiseries intérieures : Joints d'étanchéité - (Caoutchouc/Noir)	Matériau de type poussières en traces ; matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085555-01 | Date d'émission de rapport : 24/11/2025 23:58 | Page9/9
Dossier N° : 25K037067 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S7/1/1_28780469/7/1

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres-ciment gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche (matériau semi-dur (beige)) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Nathan Pouquette
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Le nombre et la localisation précise des prélevements sont à l'appréciation du diagnostiqueur, les repérages

CAMPUS	batiment	Désignation batiment	Date de construction	Constat de localisation	Nature des travaux	Type
ANGLET	BA1	Bâtiment 1 ST CB	1999	SO		SO
	BA2	Bâtiment 2 ST CB Extension	2007	SO		SO
	IUT	IUT BPB	2007	SO		SO
BAYONNE	BU	Bibliothèque Universitaire Florence Delay	2008	SO		
	B1	B1 Porche	2008	SO		
	B2	B2 Grande halle	2008	SO		
	B3	B3 Petite halle	2008	SO		
	B4/5	B4/B5 Sainte Claire	2008	SO		
	EC3	EC3/EC3bis	2008	SO		
	EC6	EC6	2008	SO		
	EC9	EC9 Amphis	2008	SO		
	CNA	CHATEAU NEUF Aile A IKER	1800 réno 2008	161	Remplacement de la Porte entrée	Plomb
	CNB	CHATEAU NEUF Aile B	1800 réno 2008	151, 153	Prolongement de main courante escalier : (Peinture, support fixation main courante)	Amiante/Plomb
				154 ,155, 391,	Réagencement des WC PMR (démolition cloisons selon plans, dépose de sanitaire, repose sanitaire, création de réseaux évacuation ste alimentation, VMC, électricité)	Amiante/Plomb
	CNC	CHATEAU NEUF Aile C	1800 réno 2008	156, 158	Réagencement des WC PMR (démolition cloisons selon plans, dépose de sanitaire, repose sanitaire, création de réseaux évacuation ste alimentation, VMC, électricité)	Amiante/Plomb
	FLO	Halle des Sports "La Floride"	2007	SO		
	MDEB	Maison de l'Etudiant BAYONNE	1850 réno 2003	SO		Plomb
MONT DE MARSAN	BIO	Génie Biologie	1993	37,38,39	Pose de patères sur mur de classe : percement à réaliser	Amiante/Plomb
				41, 42, 43, 44	Réagencement des WC PMR (démolition cloisons selon plans, dépose de sanitaire, repose sanitaire, création de réseaux évacuation ste alimentation, VMC, électricité)	Amiante/Plomb
				47-50	Porte tierce amphitheatre et sortie de secours : Menuiserie à remplacer.	Amiante/Plomb
	RT	Réseaux et Télécom	1997 Ext 2019	20,21,22,24	Réagencement des WC PMR (démolition cloisons selon plans, dépose de sanitaire, repose sanitaire, création de réseaux évacuation ste alimentation, VMC, électricité)	Amiante/Plomb
			1997 Ext 2019	10	création d'un ascenseur PMR : fondatiosn à créer dans le Sol hall d'entrée, découpe des gardes corps étage, reprise de sol, cheminement de câbles par goulottes (Peinture murale ?)	Amiante/Plomb
			1997 Ext 2019	13	Porte tierce sur passerelle communicante interbâtiments : Menuiserie à remplacer.	Amiante/Plomb
	HTB	Halle technologique GB	2010	SO		

	HTM	**Halle technologique SGM**	2010	SO		
	SGM	**Sciences et Génie Matériaux**	2008	SO		

PAU	**DEG**	**DROIT**	1977 ext 91 96 2015	338, 339, 336, 340, 334, 335	Prolongement de main courante escalier : (Peinture, support fixation main courante)	Amiante/Plomb
				337	Modification de la hauteur d'un urinoir : faience urinoir, joints, pleinture, plomberie, évacuation.	Amiante/Plomb
	DUB	**DUBOUÉ**	1991 ext 98	257, 259, 250, 248	Modification de la hauteur d'un urinoir : faience urinoir, joints, pleinture, plomberie, évacuation.	Amiante/Plomb
				253, 254, 263, 262, 264	Prolongement de main courante escalier : (Peinture, support fixation main courante)	Amiante/Plomb
				256, 258	Mise en place de poignée U sur porte WC : percement (peinture)	Amiante/Plomb
	GTE	**IUT Génie Thermique**	1986	227	Sol et peinture sous escalier	Amiante/Plomb
				228, 232, 229	Prolongement de main courante escalier : (Peinture, support fixation main courante)	Amiante/Plomb
				229	Agencement de douche PMR (démolition cloisons selon plans, dépose de sanitaire, repose sanitaire, création de réseaux évacuation ste alimentation, VMC, électricité)	Amiante/Plomb
				231,233	Réagencement des WC PMR (démolition cloisons selon plans, dépose de sanitaire, repose sanitaire, création de réseaux évacuation ste alimentation, VMC, électricité)	Amiante/Plomb
				231,233	Mise en place de poignée U sur porte WC : percement (peinture)	Amiante/Plomb
				234	remplacement de menuiserie hall R+6	Amiante/Plomb
	IBE	**IBEAS**	1984, ext 2008	SO		
	ICL	**Bâtiment Claude Laugénie**	1989, réhab part.2017	309		Amiante/Plomb
	LET	**LETTRES**	1971, ext 95, 2001	285, 286, 288, 293, 294, 305, 300,	Prolongement de main courante escalier : (Peinture, support fixation main courante)	Amiante/Plomb
				306	Modification de la hauteur d'un urinoir : faience urinoir, joints, pleinture, plomberie, évacuation.	Amiante/Plomb
				308, 287	remplacement de menuiserie amphithéatre : peinture	Amiante/Plomb
	PAL	**PALASSOU**	1990	270	Prolongement de main courante escalier : (Peinture, support fixation main courante)	Amiante/Plomb
				277	Modification de la hauteur d'un urinoir : faience urinoir, joints, pleinture, plomberie, évacuation.	Amiante/Plomb
				278	Mise en place de poignée U sur porte WC : percement (peinture)	Amiante/Plomb
				280	remplacement de menuiserie amphithéatre : peinture	Amiante/Plomb
	PRE	**PRESIDENCE**	1994	238	Réagencement des WC PMR (démolition cloisons selon plans, dépose de sanitaire, repose sanitaire, création de réseaux évacuation ste alimentation, VMC, électricité)	Amiante/Plomb
				209, 215, 222, 224, 213, 218 217 , 220,	Prolongement de main courante escalier : (Peinture, support fixation main courante)	Amiante/Plomb

	STI	**IUT STID**	1992	212, 217,219	Modification de la hauteur d'un urinoir : faience urinoir, joints, pleinture, plomberie, évacuation.	Amiante/Plomb
				211	Mise en place de poignée U sur porte WC : percement (peinture)	Amiante/Plomb
				216	Réagencement des WC PMR (démolition cloisons selon plans, dépose de sanitaire, repose sanitaire, création de réseaux évacuation ste alimentation, VMC, électricité)	Amiante/Plomb
				210	Relamping WC : Plafonds	Amiante/Plomb
	IPM 1	**IPREM 1**	2007	SO		
	LAV	**LAVOISIER**	1998	SO		
	HDS	**PAU Halle des Sports**	2001	SO		

TARBES	**HUS**	**Halle des Sports Tarbes**	2001	SO		
	STAPS	**STAPS Tarbes**	2004, ext 2010	SO		

UPPA

Avenue de l'Université
64000 PAU

Campus de Pau

RÔLE	ENTREPRISE	ADRESSE	REPRÉSENTANT	TEL/FAX/M

LOT	ENTREPRISE	ADRESSE	REPRÉSENTANT	TEL/FAX/M

UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
333	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u et remplacer un mitigeur accessible pmr	DEG RDC	
334	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Mettre en place main courante 40ml	DEG RDC	Main courante : 40ml
335	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et mains courantes 40ml	DEG RDC	Largeur de passage : 2,5m Contre marche : 10 ml (nombre 12) Garde corps : 40ml + 3,5 ml prolongement Bande de vigilance : 5 ml (nombre 6)
336	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et mains courante à rallonger	DEG RDC	Largeur de passage : 1,9m Contre marche : 7,6ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : x2
337	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser un urinoir à 50cm	DEG RDC	
338	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Constat sanitaire handicapé, fermer	DEG RDC	Prévoir à minima une poignée U
339	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Constat sanitaire handicapé, fermer	DEG RDC	Prévoir à minima une poignée U
340	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et main courante à créer et bande de vigilance	DEG RDC	Largeur de passage : 1,4m Contre marche : 5,6 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7) Bande de vigilance : 2,8 ml (nombre 2)
341	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DEG RDC	
342	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DEG RDC	
343	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	DEG RDC	
344	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DEG RDC	
345	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	DEG RDC	
346	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	DEG RDC	
347	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DEG RDC	
348	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Place pmr	DEG RDC	
349	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DEG RDC	
350	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique place pmr	DEG RDC	

Photographies des non-conformités



333 Poignée u et remplacer un mitigeur accessible pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



333 Poignée u et remplacer un mitigeur accessible pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



334 Mettre en place main courante 40ml

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



335 Contremarche et mains courantes 40ml

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



336 Contremarche et mains courante à rallonger

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



336 Contremarche et mains courante à rallonger

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



337 Abaisser un urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




338 Constat sanitaire handicapé, fermer

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




339 Constat sanitaire handicapé, fermer

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




340 Contremarche et main courante à créer et bande de vigilance

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



340 Contremarche et main courante à créer et bande de vigilance

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025

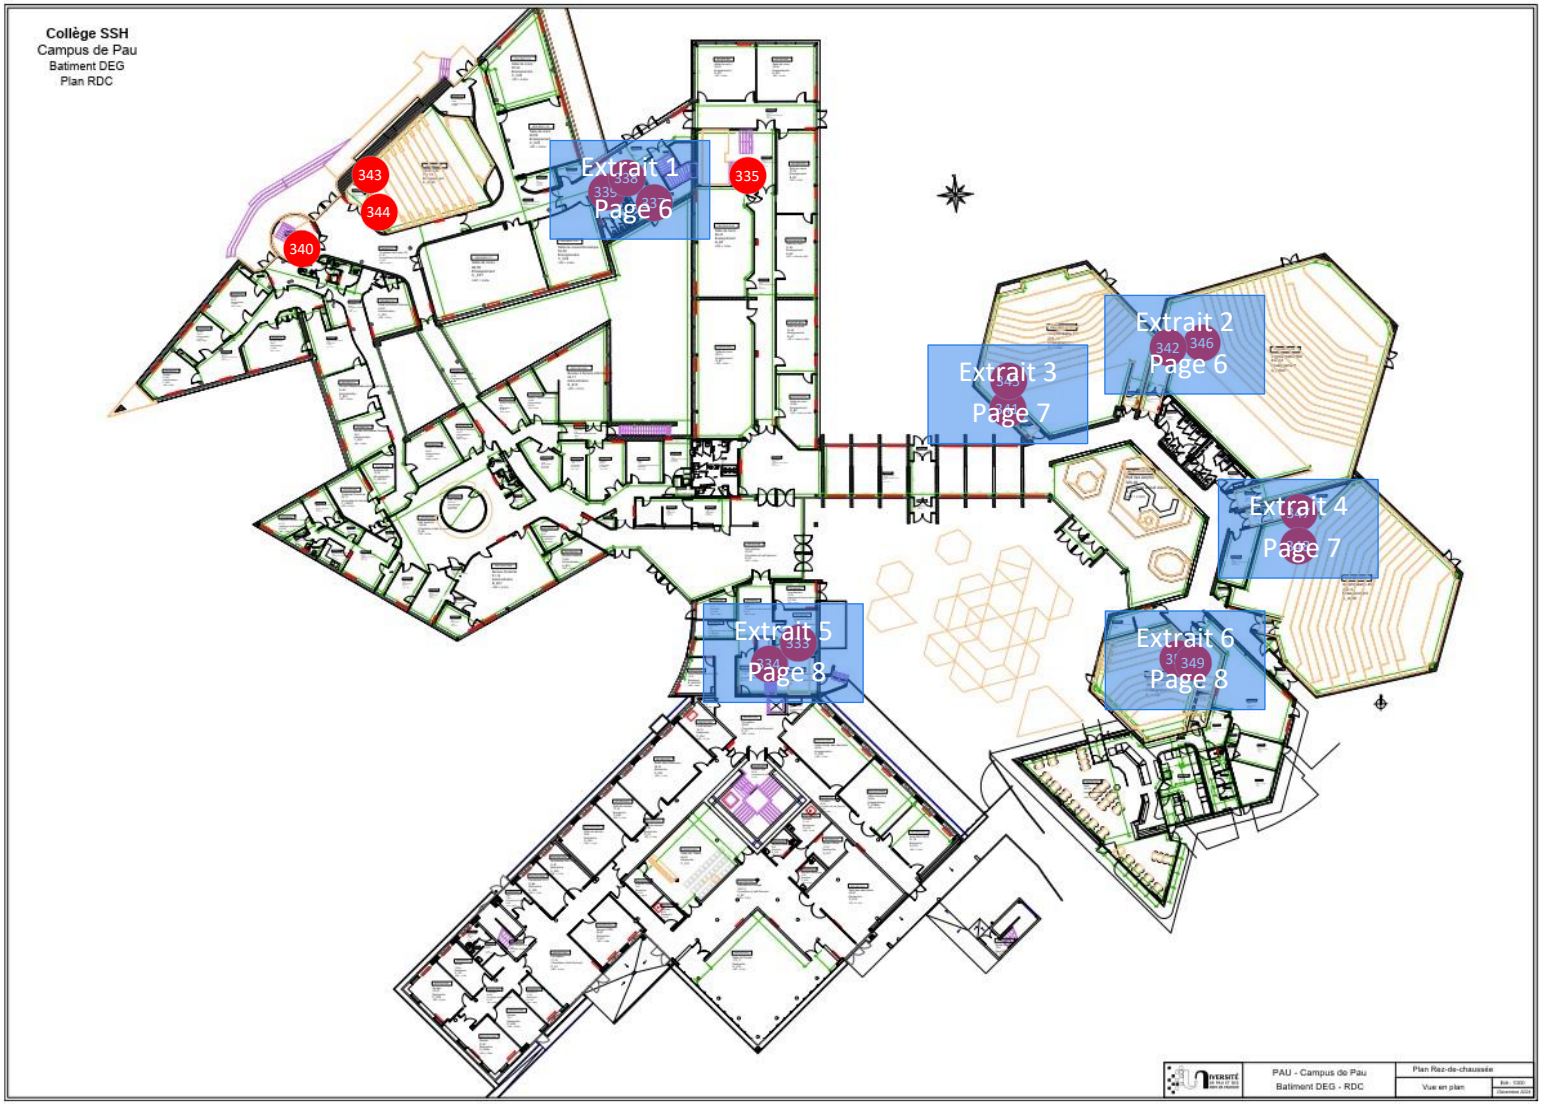
Collège SSH
Campus de Pau
Batiment DEG
Plan RDC
343
344
340
335
Extrait 1
Page 6
Extrait 2
342
346
Page 6
Extrait 3
Page 7
Extrait 4
Page 7
Extrait 5
333
Page 8
Extrait 6
349
Page 8
PAU - Campus de Pau
Batiment DEG - RDC
Plan Rez-de-chaussée
Vue en plan


Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 1






Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 2



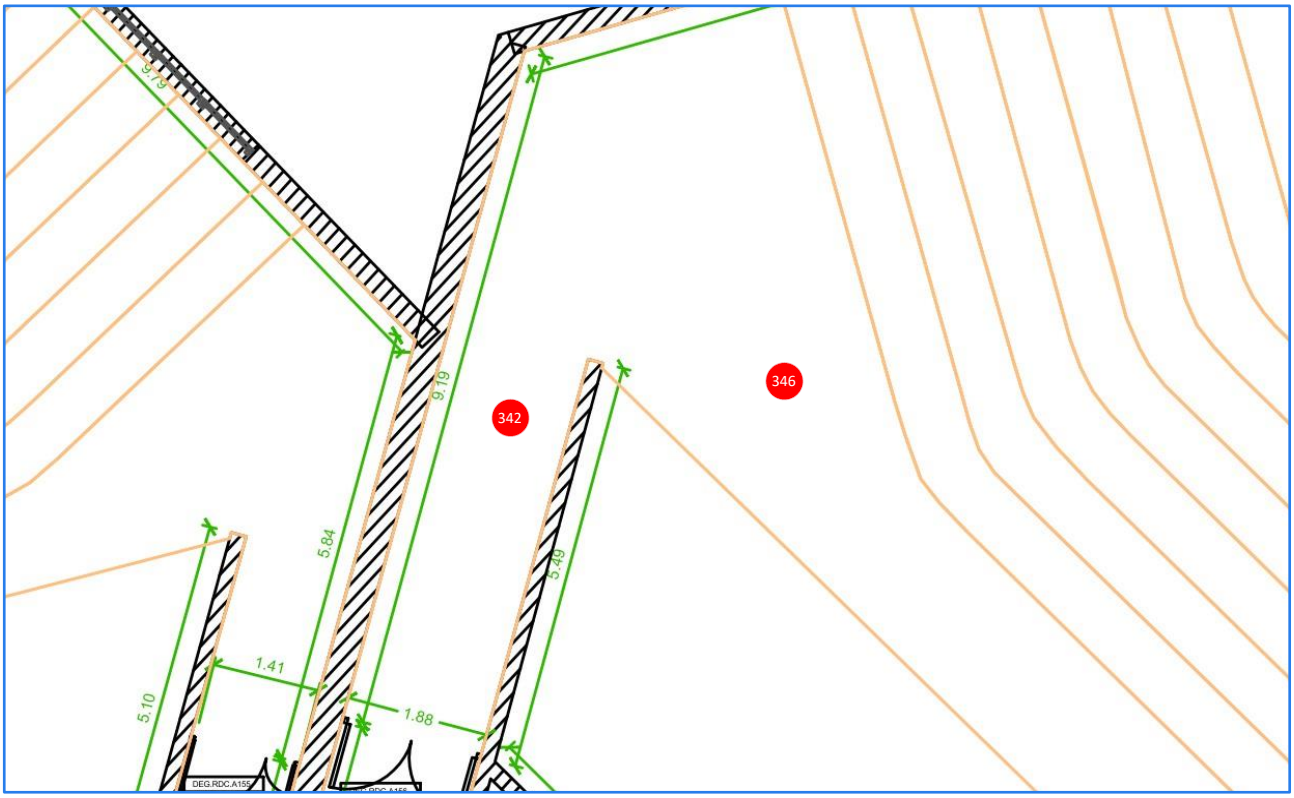


Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 3



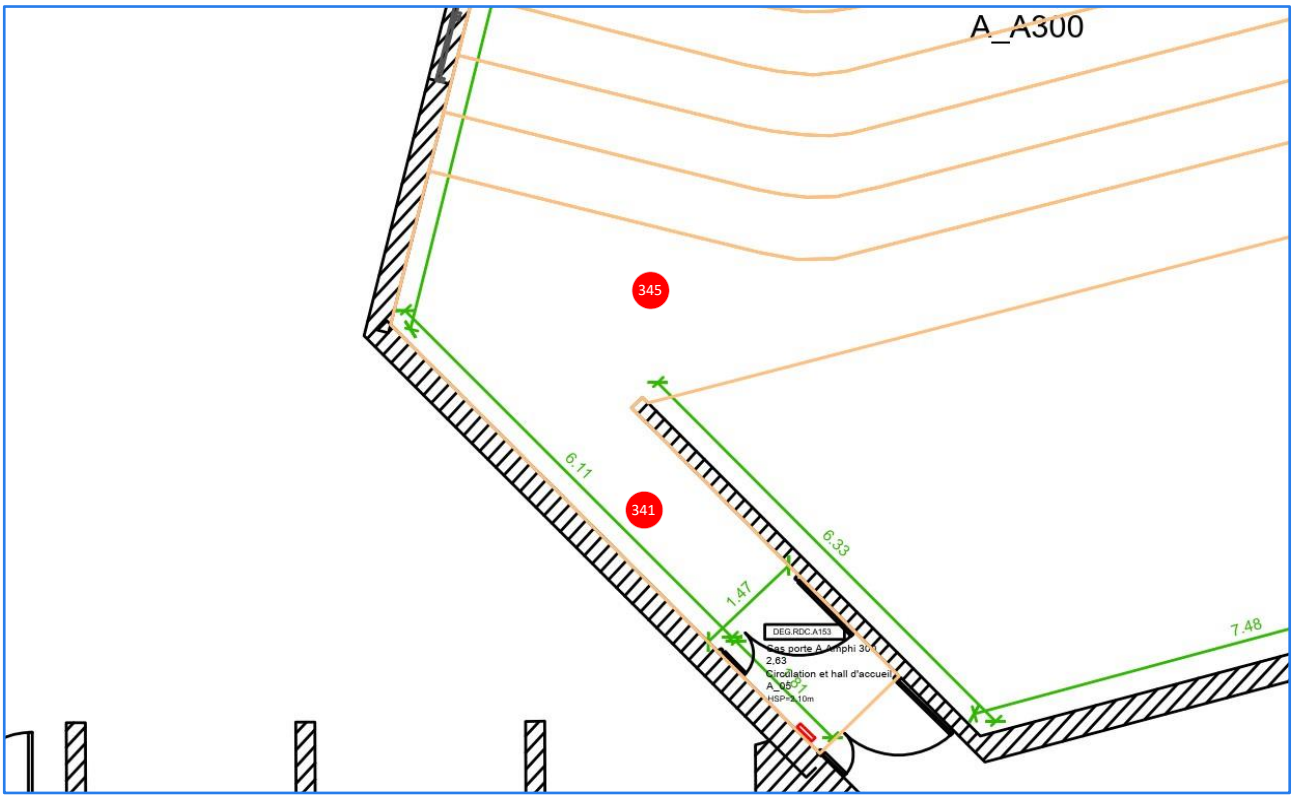


Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 4



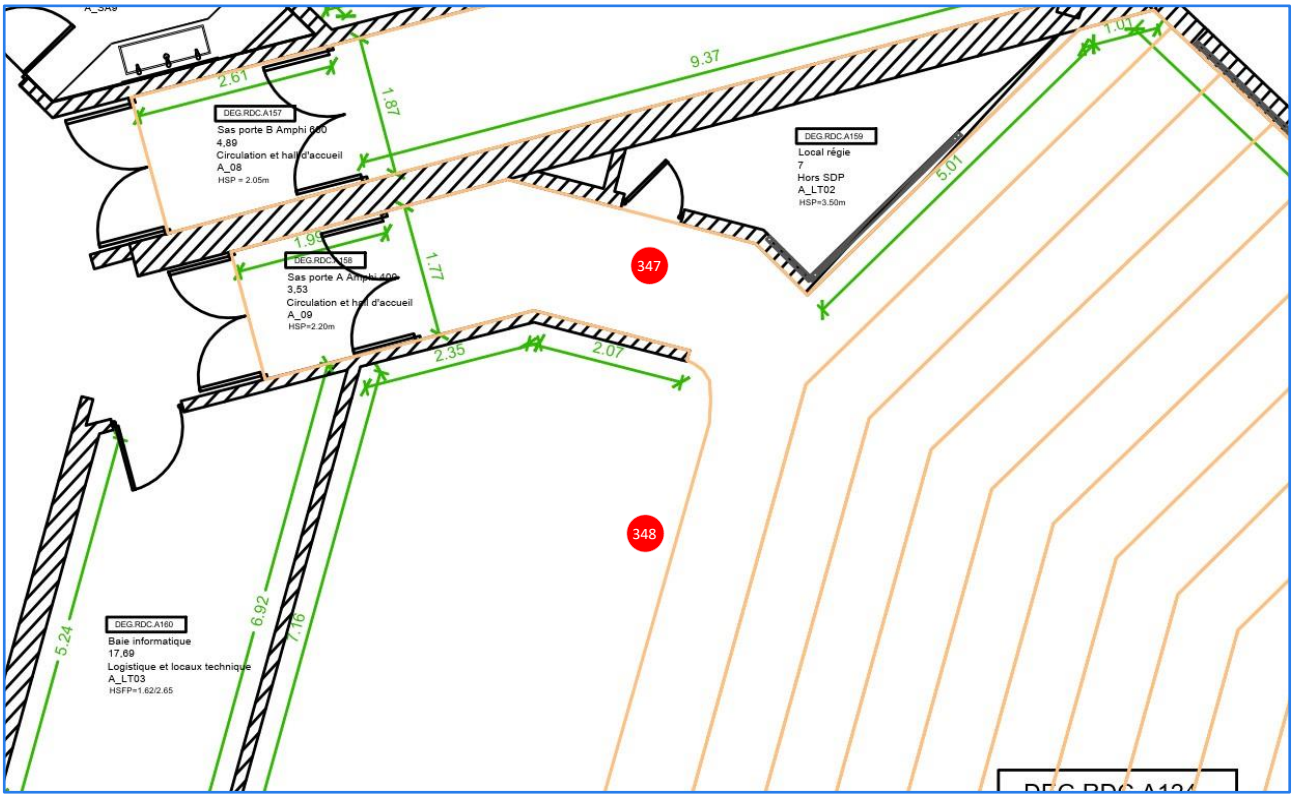


Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 5



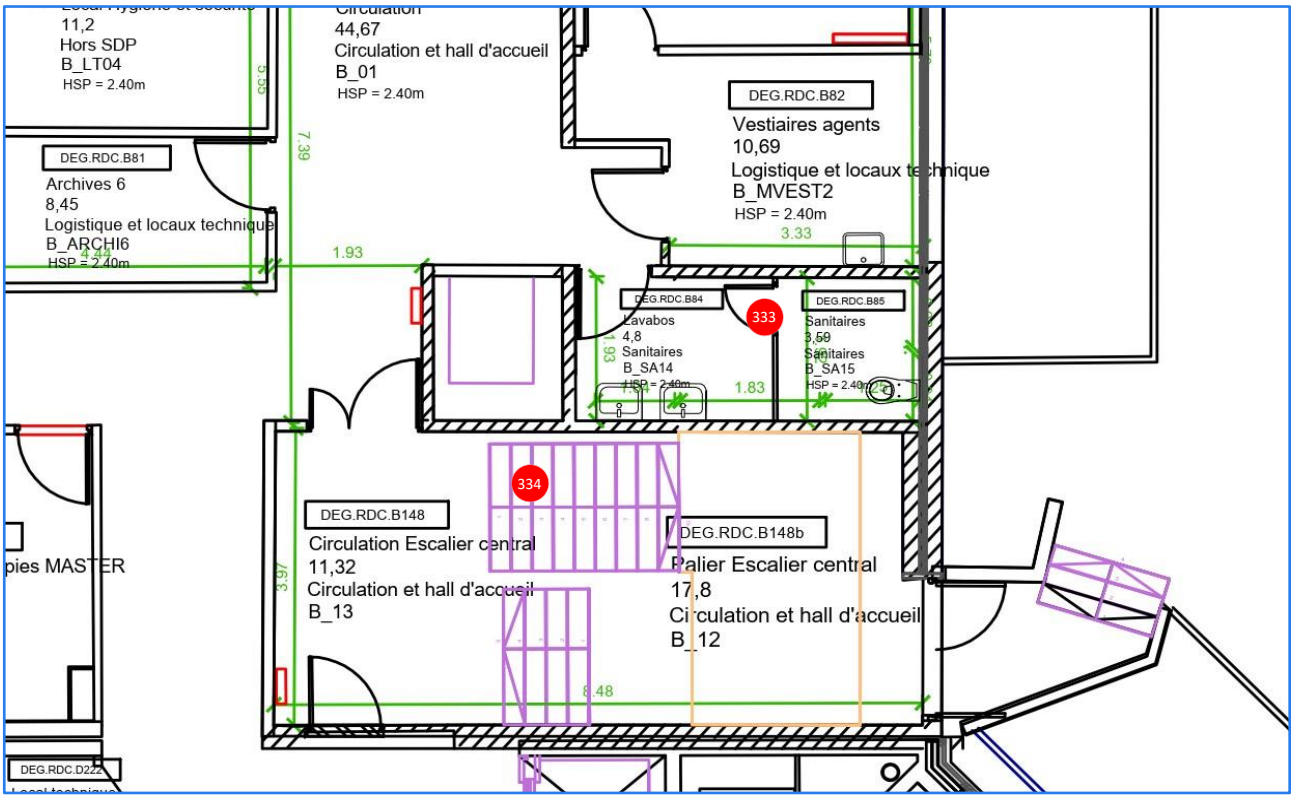

Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 6



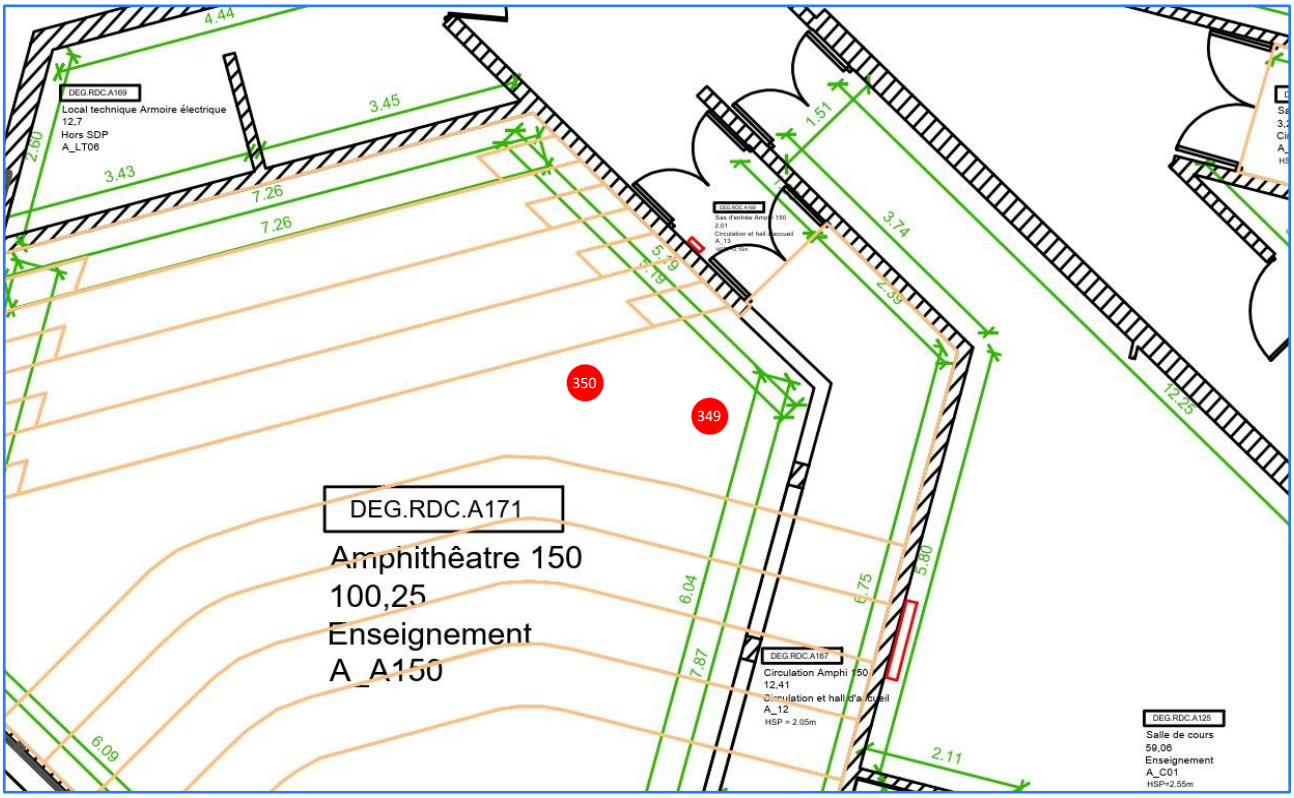

UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_00_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
246	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur vitrage	DUB RDC	
247	06 MENUISERIES INTERIEURES	Mobilier pmr à mettre en place	DUB RDC	
248	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser un urinoir à 50cm	DUB RDC	
249	05 ASCENSEUR	Absence signalétique ascenseur visuel	DUB RDC	
250	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	DUB RDC	
251	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Non conforme pour accessibilité pmr remplacer mitigeur	DUB RDC	
252	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Non conforme pour accessibilité pmr remplacer mitigeur	DUB RDC	
253	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonger main courante	DUB RDC	Mains courantes prolongement : 3ml
265	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DUB RDC	
266	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DUB RDC	

Photographies des non-conformités



246 Signalétique sur vitrage

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



247 Mobilier pmr à mettre en place

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025



248 Abaisser un urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



249 Absence signalétique ascenseur visuel

05 ASCENSEUR
Date butoir : 26/03/2025



250 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



251 Non conforme pour accessibilité pmr remplacer mitigeur

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




251 Non conforme pour accessibilité pmr remplacer mitigeur

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



252 Non conforme pour accessibilité pmr remplacer mitigeur

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



253 Rallonger main courante


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



253 Rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_00_200

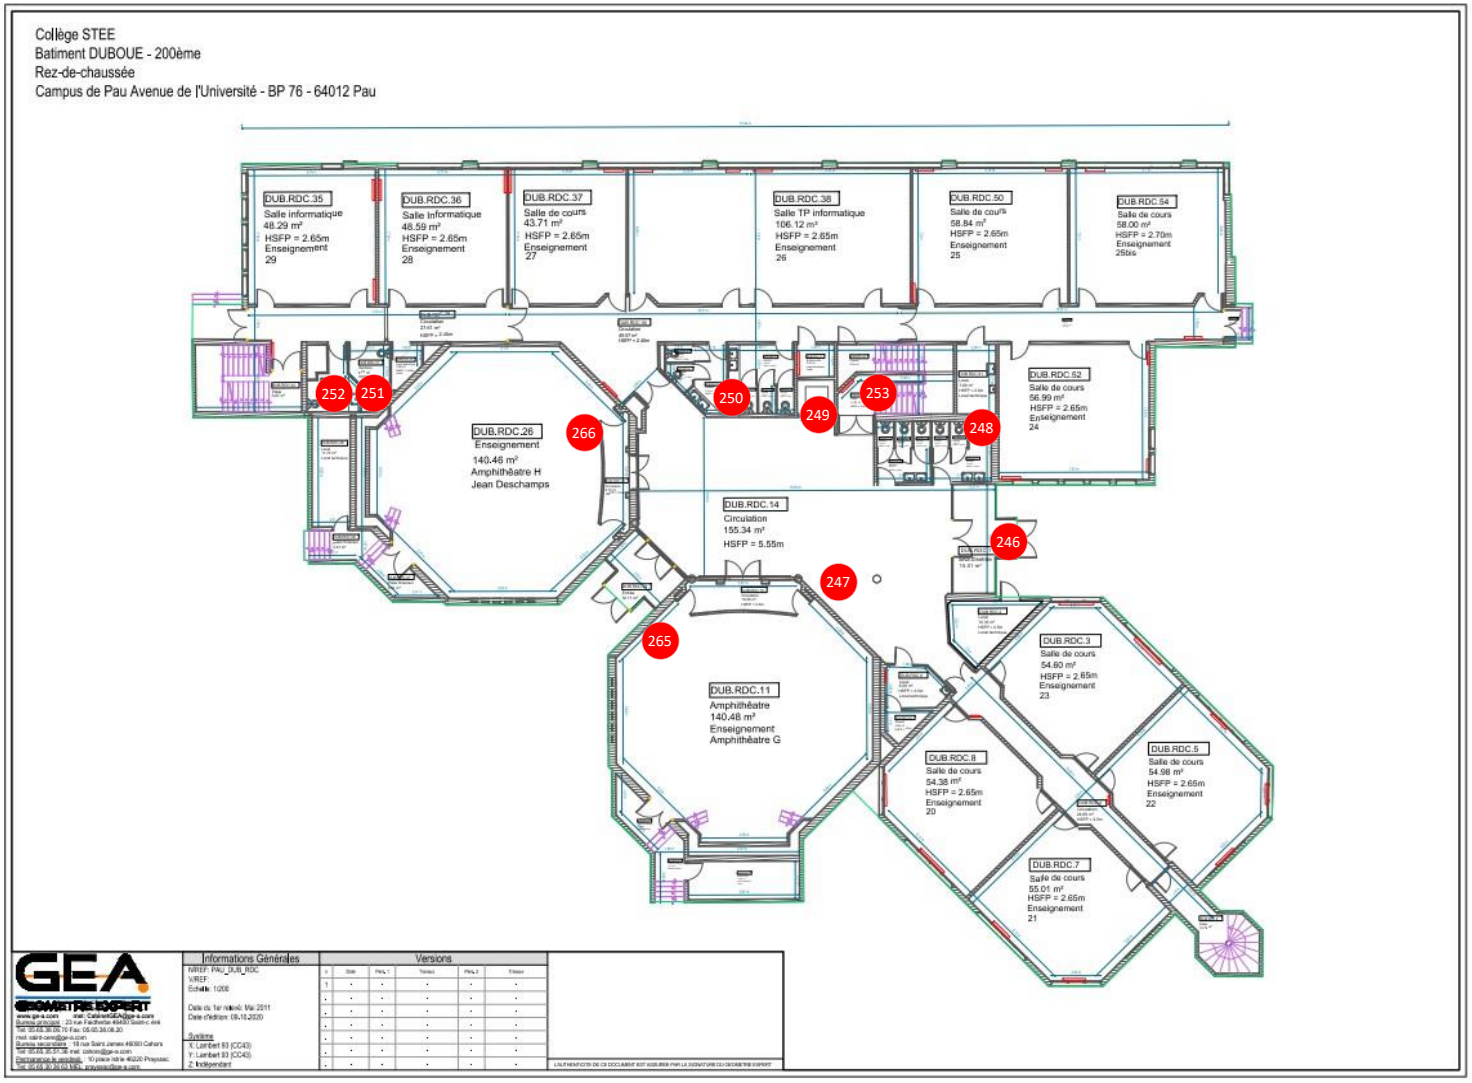


UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_01_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
254	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonger main courante	DUB R+1	
255	05 ASCENSEUR	Indicateur visuel et sonore absent	DUB R+1	
256	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Poignée u et lavabo à mettre en place	DUB R+1	
257	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser un urinoir à 50cm	DUB R+1	
258	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u et lavabo pmr à mettre en place	DUB R+1	
259	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser un urinoir à 50cm	DUB R+1	

Photographies des non-conformités




254 Rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



254 Rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



254 Rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025




255 Indicateur visuel et sonore absent

05 ASCENSEUR
Date butoir : 26/03/2025



256 Poignée u et lavabo à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



256 Poignée u et lavabo à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



256 Poignée u et lavabo à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



257 Abaisser un urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



258 Poignée u et lavabo pmr à mettre en place

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



258 Poignée u et lavabo pmr à mettre en place

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



258 Poignée u et lavabo pmr à mettre en place


02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



259 Abaisser un urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_01_200

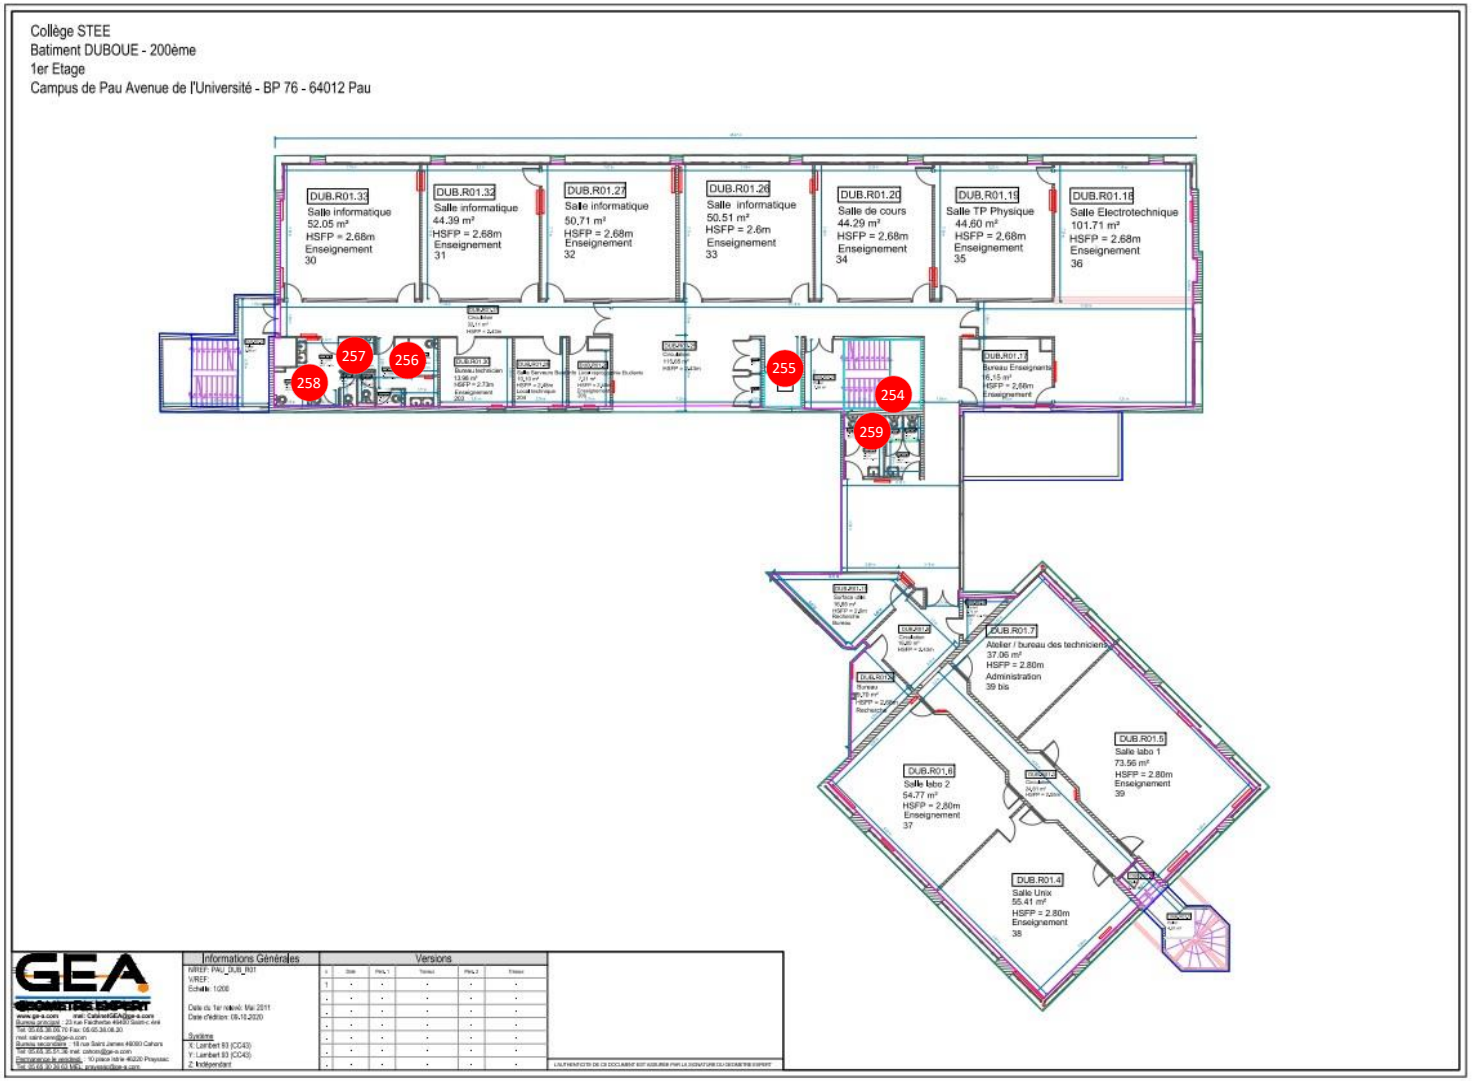

UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_02-200eme

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
260	05 ASCENSEUR	Visuel et sonore absent	DUB R+2	
261	06 MENUISERIES INTERIEURES	Pas de paillasse pmr	DUB R+2	
262	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u et pas de lavabo pmr	DUB R+2	
263	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	DUB R+2	
264	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u et lavabo pmr	DUB R+2	

Photographies des non-conformités



260 Visuel et sonore absent

05 ASCENSEUR
Date butoir : 26/03/2025



261 Pas de paillasse pmr

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025



262 Poignée u et pas de lavabo pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



262 Poignée u et pas de lavabo pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



262 Poignée u et pas de lavabo pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



263 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




264 Poignée u et lavabo pmr


02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



264 Poignée u et lavabo pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025

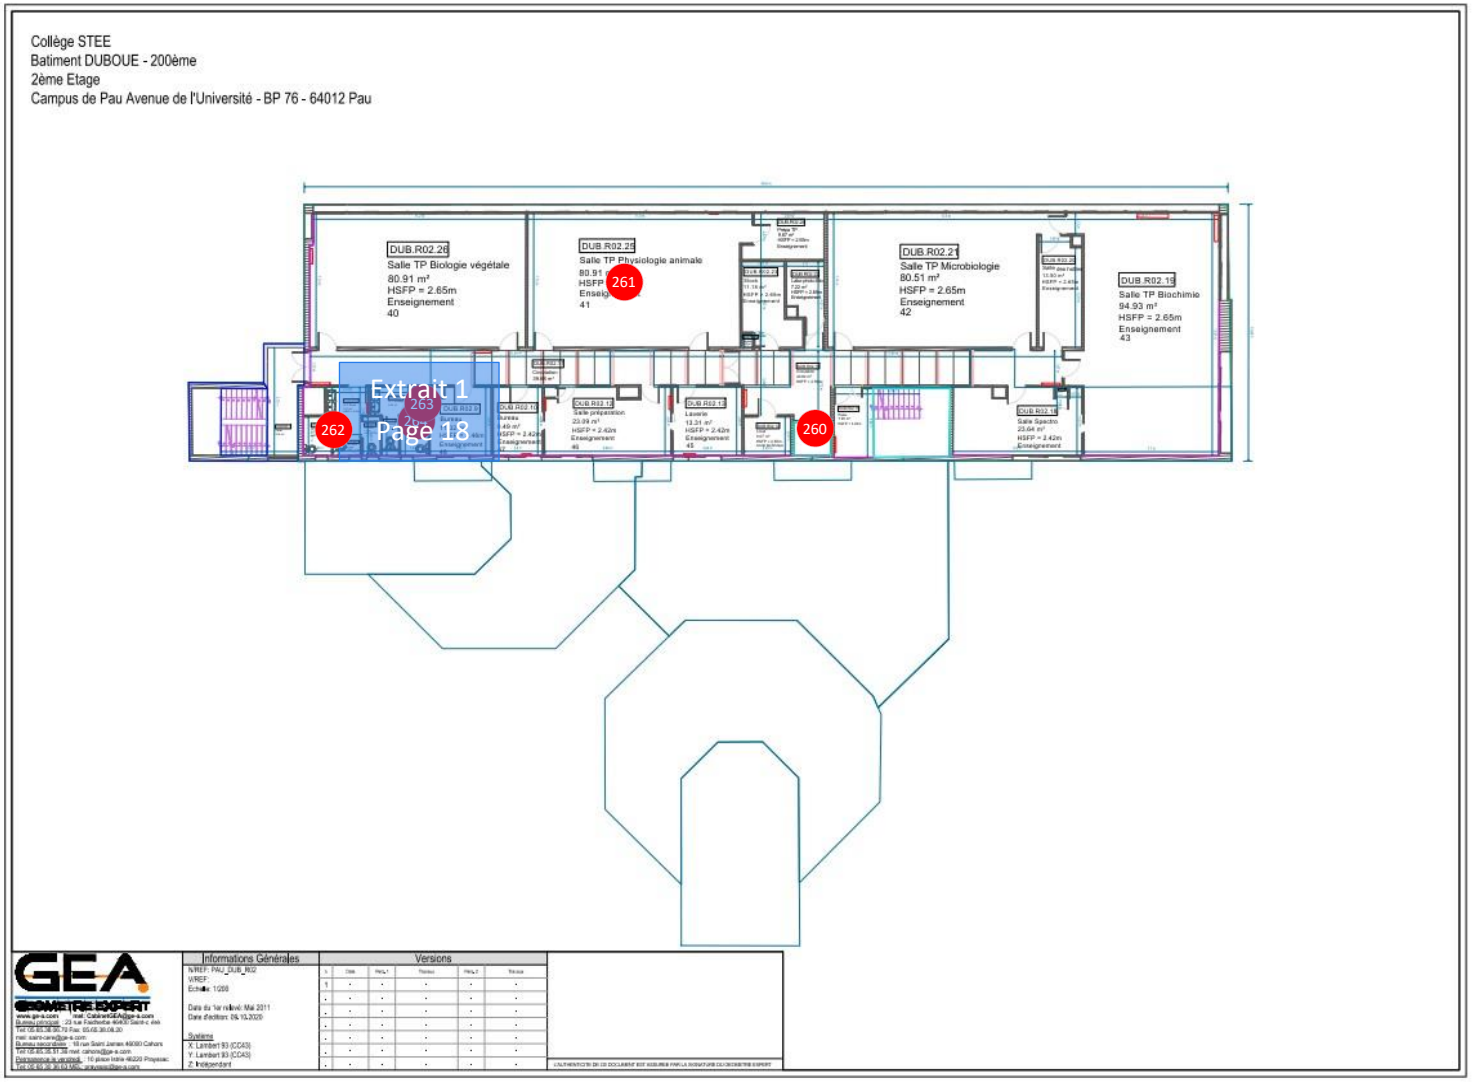
Collège STEE
Batiment DUBOUE - 200ème
2ème Etage
Campus de Pau Avenue de l'Université - BP 76 - 64012 Pau
DUB.R02.26
Salle TP Biologie végétale
80.91 m²
HSFP = 2.65m
Enseignement
40
DUB.R02.25
Salle TP Physiologie animale
41
DUB.R02.21
Salle TP Microbiologie
80.51 m²
HSFP = 2.65m
Enseignement
42
DUB.R02.19
Salle TP Biochimie
94.93 m²
HSFP = 2.65m
Enseignement
43
261
262
263
260
Extrait 1
Page 18
Informations Générales
Versions

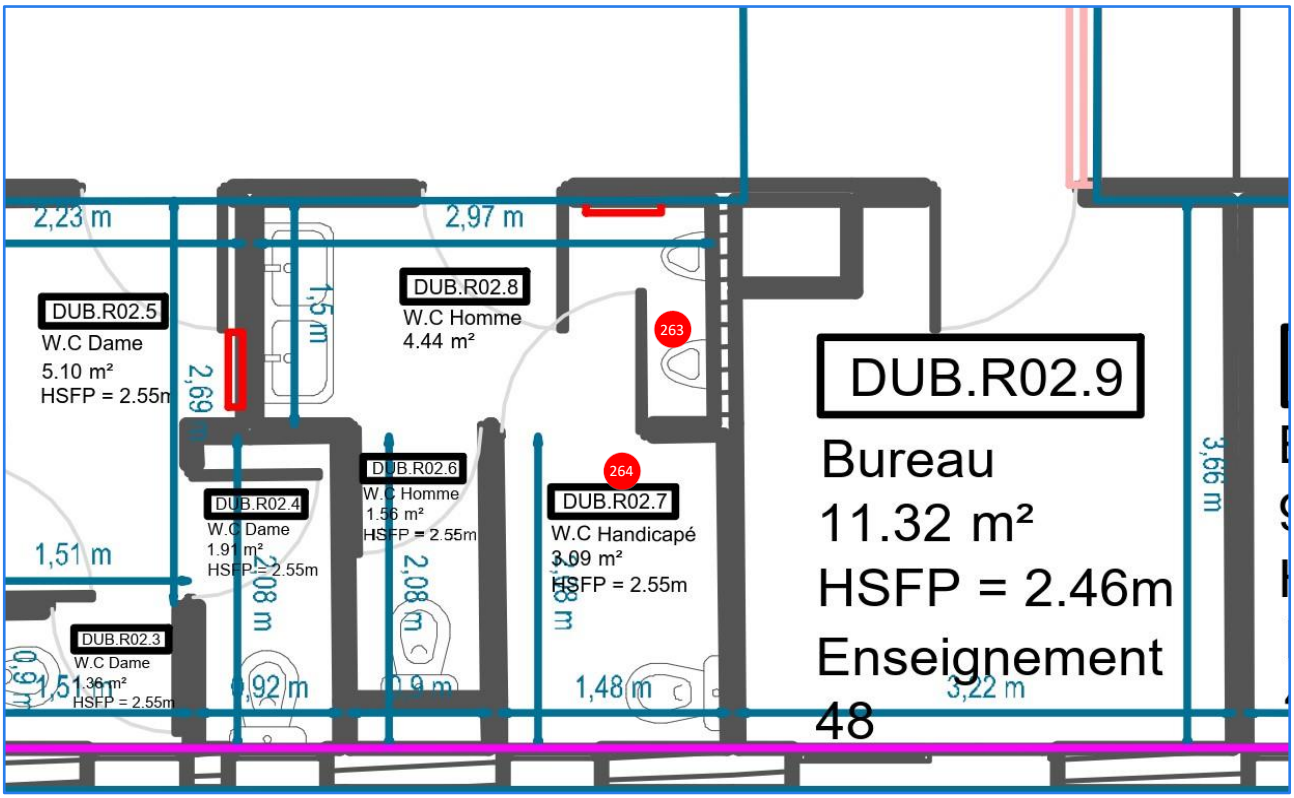
2,23 m
2,97 m
DUB.R02.5
W.C Dame
5.10 m²
HSFP = 2.55m
1,5 m
2,69 m
DUB.R02.8
W.C Homme
4.44 m²
263
DUB.R02.9
Bureau
11.32 m²
HSFP = 2.46m
Enseignement
48
3,66 m
DUB.R02.6
W.C Homme
1.56 m²
HSFP = 2.55m
264
DUB.R02.4
W.C Dame
1.91 m²
HSFP = 2.55m
DUB.R02.7
W.C Handicapé
3.09 m²
HSFP = 2.55m
1,51 m
2,08 m
2,08 m
1,88 m
DUB.R02.3
W.C Dame
1.36 m²
HSFP = 2.55m
0,9 m
1,51 m
0,92 m
0,9 m
1,48 m
3,22 m

UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
225	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique entrée bâtiment non présente	GTE RDC	
226	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Remplacer le caniveau	GTE RDC	
227	09 PLATRERIE - PEINTURE - CLOISONS MODULAIRES	Fermé sous escalier	GTE RDC	
228	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance et main courante a créé	GTE RDC	Création main courante : 2 ml Contre marche : 3,4 ml (nombre 2) Bande vigilance : 1,7 ml (nombre 1) X 2
229	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Faire une douche handicapé dans ce volume	GTE RDC	
230	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Miroirs trop haut à remplacer	GTE RDC	
231	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre en place une barre d'appui, création dans lavabo, poignée U et signalétique, p.m.r et mirroirs trop haut	GTE RDC	

Photographies des non-conformités



225 Signalétique entrée bâtiment non présente

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



226 Remplacer le caniveau

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-
Date butoir : 26/03/2025



227 Fermé sous escalier

09 PLATRERIE - PEINTURE -
Date butoir : 26/03/2025




227 Fermé sous escalier

09 PLATRERIE - PEINTURE -
Date butoir : 26/03/2025



227 Fermé sous escalier

09 PLATRERIE - PEINTURE -
Date butoir : 26/03/2025



228 Contremarche, bande de vigilance et main courante a créé

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



229 Faire une douche handicapé dans ce volume

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



229 Faire une douche handicapé dans ce volume

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



229 Faire une douche handicapé dans ce volume

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



230 Miroirs trop haut à remplacer

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



231 Mettre en place une barre d'appui, création dans lavabo, poignée U et signalétique, p.m.r
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



231 Mettre en place une barre d'appui, création dans lavabo, poignée U et signalétique, p.m.r
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



231 Mettre en place une barre d’appui, création dans lavabo, poignée U et signalétique, p.m.r
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



231 Mettre en place une barre d’appui, création dans lavabo, poignée U et signalétique, p.m.r
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




231 Mettre en place une barre d’appui, création dans lavabo, poignée U et signalétique, p.m.r
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




231 Mettre en place une barre d’appui, création dans lavabo, poignée U et signalétique, p.m.r
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_00

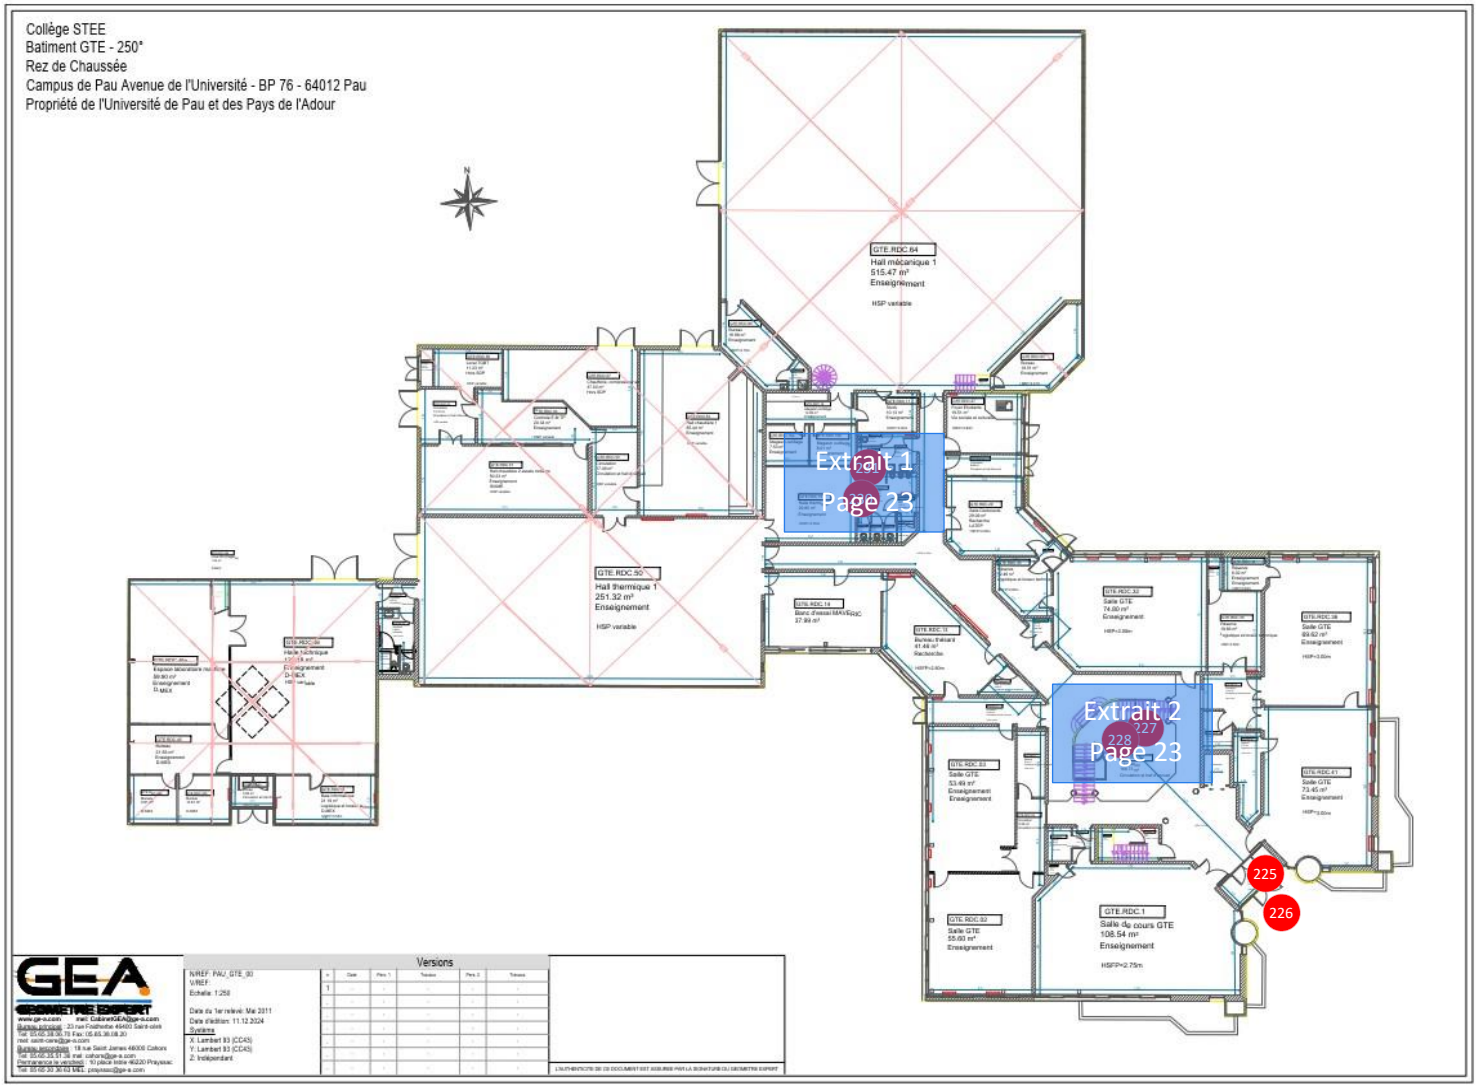


Plan - UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_00 - Extrait 1



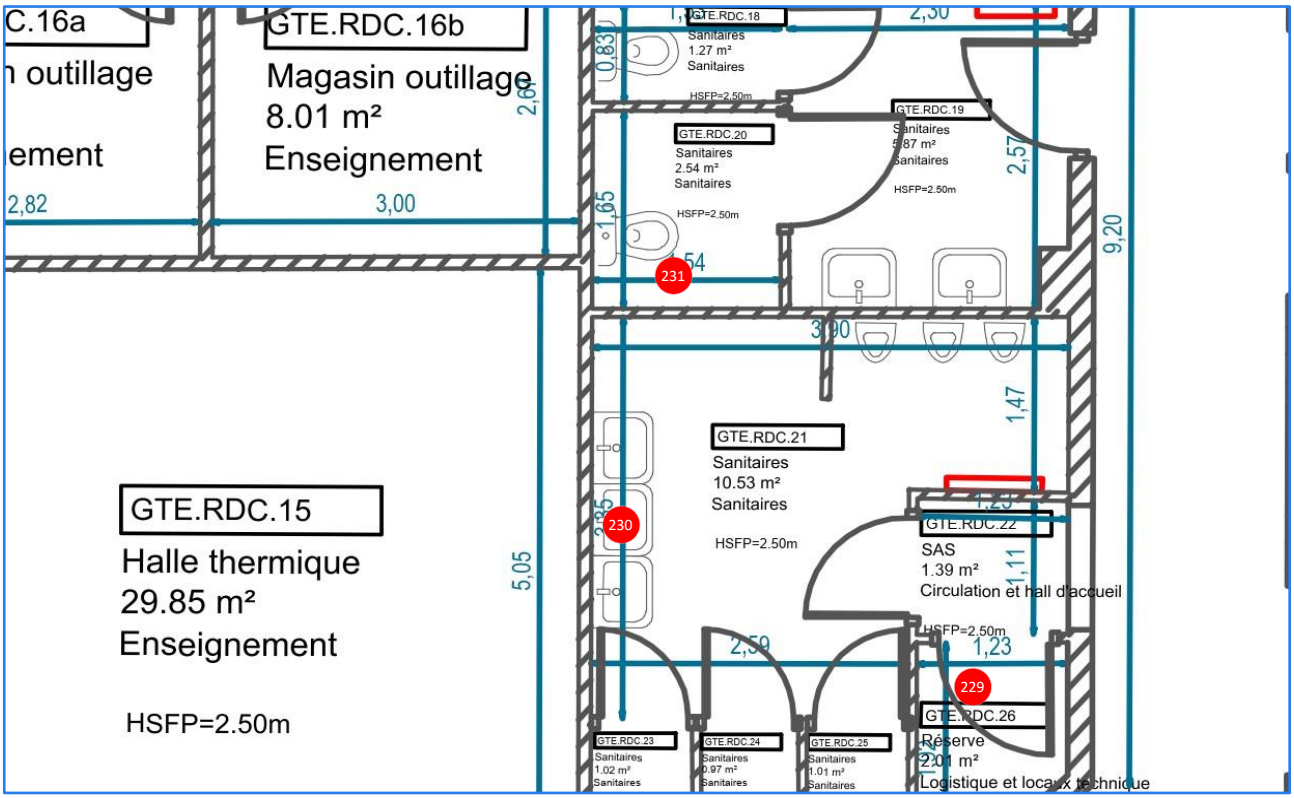

Plan - UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_00 - Extrait 2



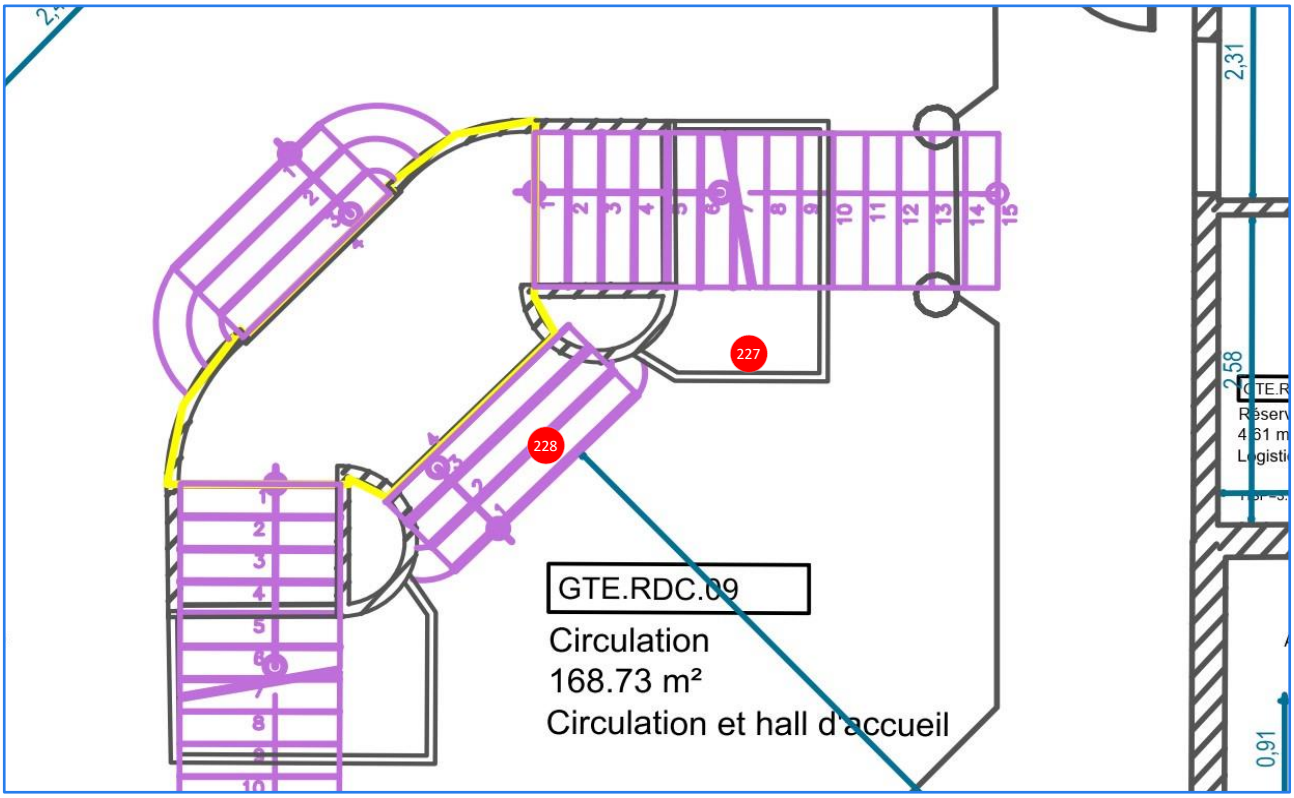

UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
232	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Création de main courante, contremarche bon de vigilance	GTE R+1	Largeur de passage : 1,3m Bande antidérapante : 20ml (nombre 15) Contre marche : 2,6 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1,3 ml (nombre 1) X2
233	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mirroirs trop haut, poignée U et mettre lave main dans le wc pmr	GTE R+1	
234	06 MENUISERIES INTERIEURES	Mise en place porte tierce 140x205	GTE R+1	

Photographies des non-conformités



232 Création de main courante, contremarche bon de vigilance

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



232 Création de main courante, contremarche bon de vigilance

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



233 Mirroirs trop haut, poignée U et mettre lave main dans le wc pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



233 Mirroirs trop haut, poignée U et mettre lave main dans le wc pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



233 Mirroirs trop haut, poignée U et mettre lave main dans le wc pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




234 Mise en place porte tierce 140x205

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_01

Batiment IUT GTE - 200ème
Niveau 1
Campus de Pau Avenue de l'Université - BP 76 - 64012 Pau
Propriété de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour

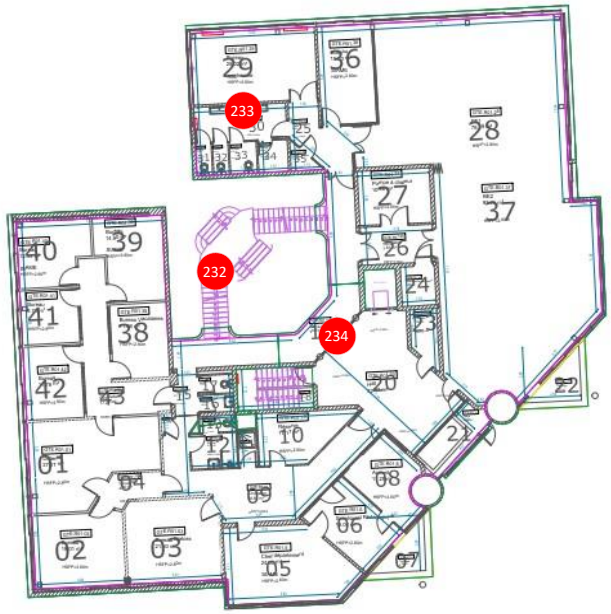


Informations Générales	Versions
N/REF /PAU_GTE_01 V/REF: Echelle: 1:200 Date du 1er relevé: Mai 2011 Date d'édition: 13.11.2024 Système: X: Lambert 93 (CC43) Y: Lambert 93 (CC43) Z: Indépendant	

UPPA / PAU / HDS / PAU_HDS_R01_100


Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
397	05 ASCENSEUR	création EPMR		
453	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées	HDS	
454	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Porte tierce	HDS	Dépose de la baie fixe et pose d'une porte tierce


Photographies des non-conformités



453 Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 15/07/2025




453 Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 15/07/2025



454 Porte tierce

07 MENUISERIES EXTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025

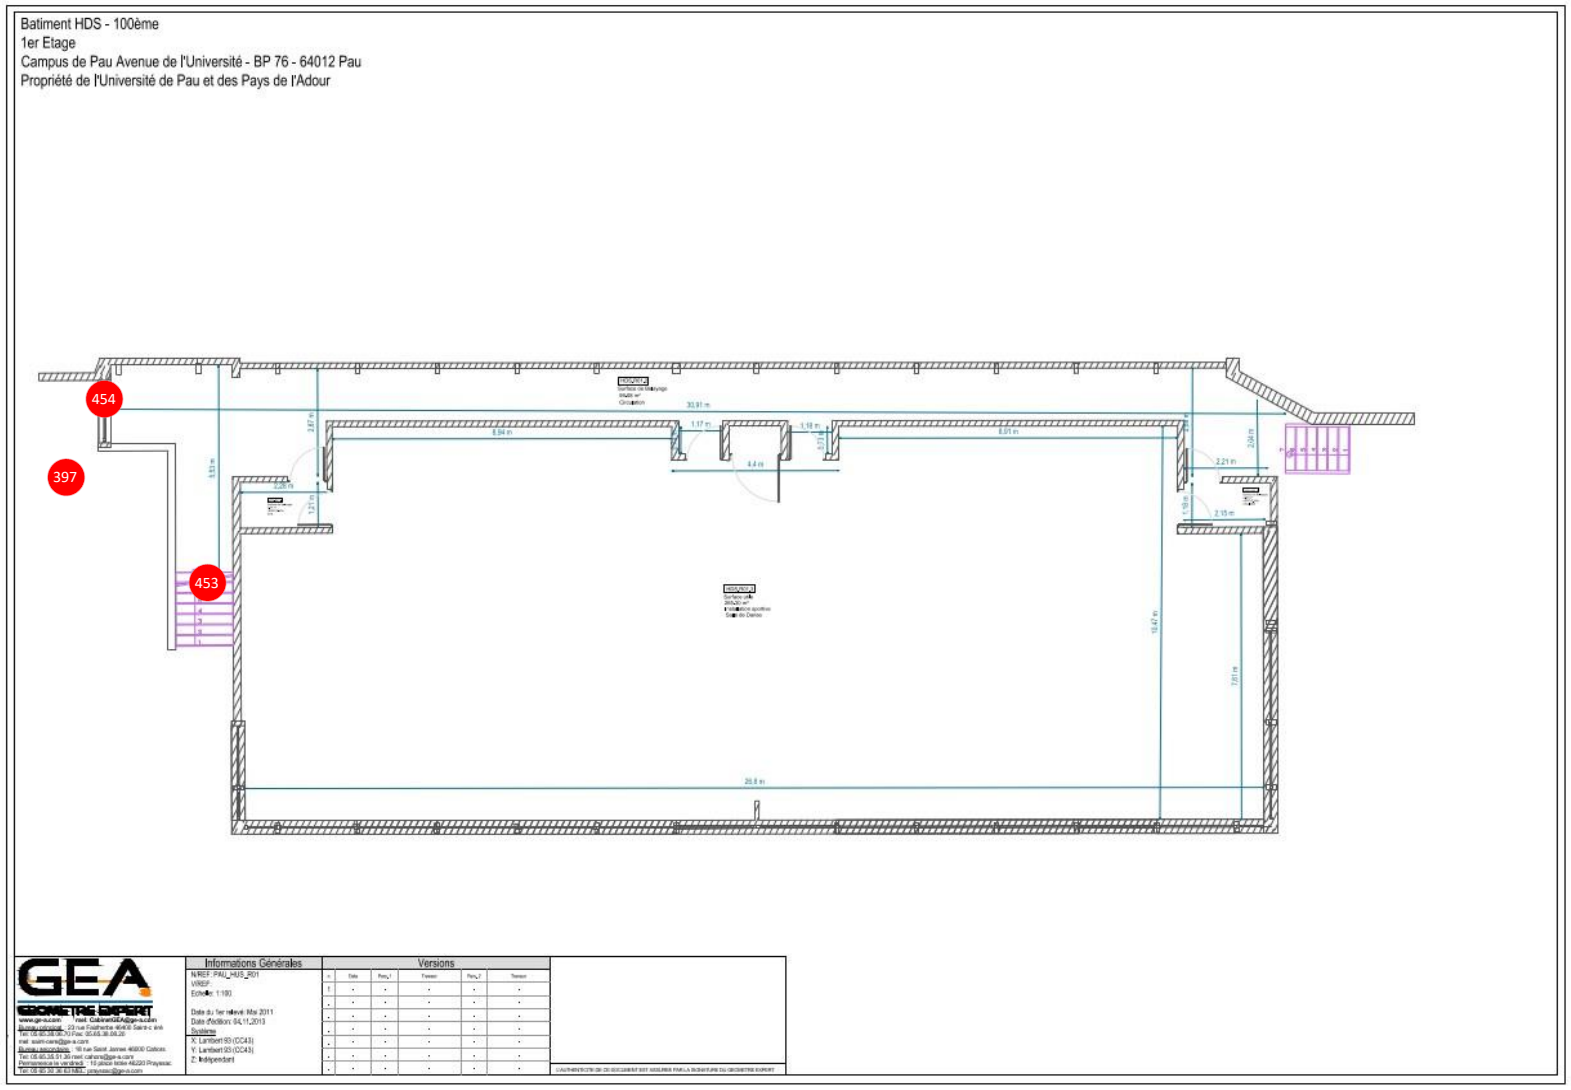
Batiment HDS - 100ème
1er Etage
Campus de Pau Avenue de l'Université - BP 76 - 64012 Pau
Propriété de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
454
397
453
GEA
GEOMETRE EXPERT
Informations Générales
Versions

UPPA / PAU / HDS / PAU_HDS_RDC_250

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
436	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Chanfrein resaut	HDS	
437	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	pictogramme PMR	HDS	
438	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	pictogramme PMR	HDS	
439	06 MENUISERIES INTERIEURES	pateres	HDS	
440	06 MENUISERIES INTERIEURES	pateres	HDS	
441	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	siège de douche	HDS	
442	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	siège de douche	HDS	
443	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	siège de douche	HDS	
444	06 MENUISERIES INTERIEURES	pateres	HDS	
445	06 MENUISERIES INTERIEURES	pateres	HDS	
446	06 MENUISERIES INTERIEURES	pateres	HDS	
447	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Création d'un place PMR	HDS	
448	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaissement urinoir	HDS	
449	05 ASCENSEUR	Création d'un EPMR	HDS	
450	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées	HDS	
451	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées	HDS	
452	06 MENUISERIES INTERIEURES	Prolongation de main courante	HDS	

Photographies des non-conformités



437 pictogramme PMR

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 15/07/2025




438 pictogramme PMR

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 15/07/2025



439 pateres

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025



440 pateres

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025



441 siège de douche

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 15/07/2025



442 siège de douche

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 15/07/2025



443 siège de douche

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 15/07/2025



444 pateres

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025



445 pateres

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025



446 pateres

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025



447 Création d'un place PMR

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-
Date butoir : 15/07/2025



448 Abaissement urinoir

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 15/07/2025




449 Création d'un EPMR

05 ASCENSEUR
Date butoir : 15/07/2025



450 Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 15/07/2025




452 Prolongation de main courante

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025

Plan - UPPA / PAU / HDS / PAU_HDS_RDC_250

Batiment HDS - 250ème
Rez de Chaussée
Campus de Pau Avenue de l'Université - BP 76 - 64012 Pau
Propriété de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour

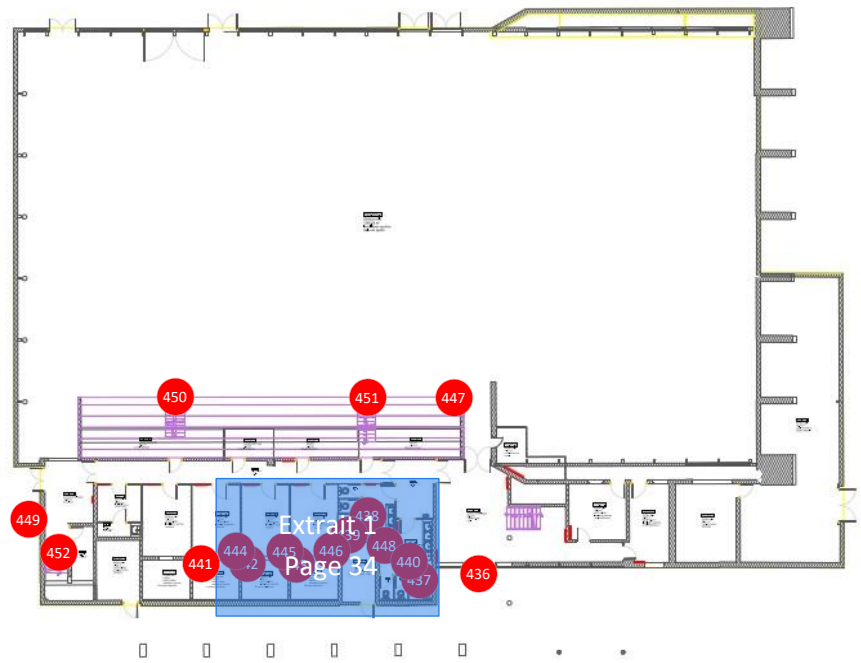


GEA
GEOMETRE EXPERT

Informations Générales	Versions
N/REF: PAU_HDS_RDC	
V/REF:	
Echelle: 1:250	
Date du 1er relevé: Mai 2011	
Date d'édition: 26/05/2019	
Système	
X: Lambert 93 (CC43)	
Y: Lambert 93 (CC43)	
Z: Indépendant	

Plan - UPPA / PAU / HDS / PAU_HDS_RDC_250 - Extrait 1



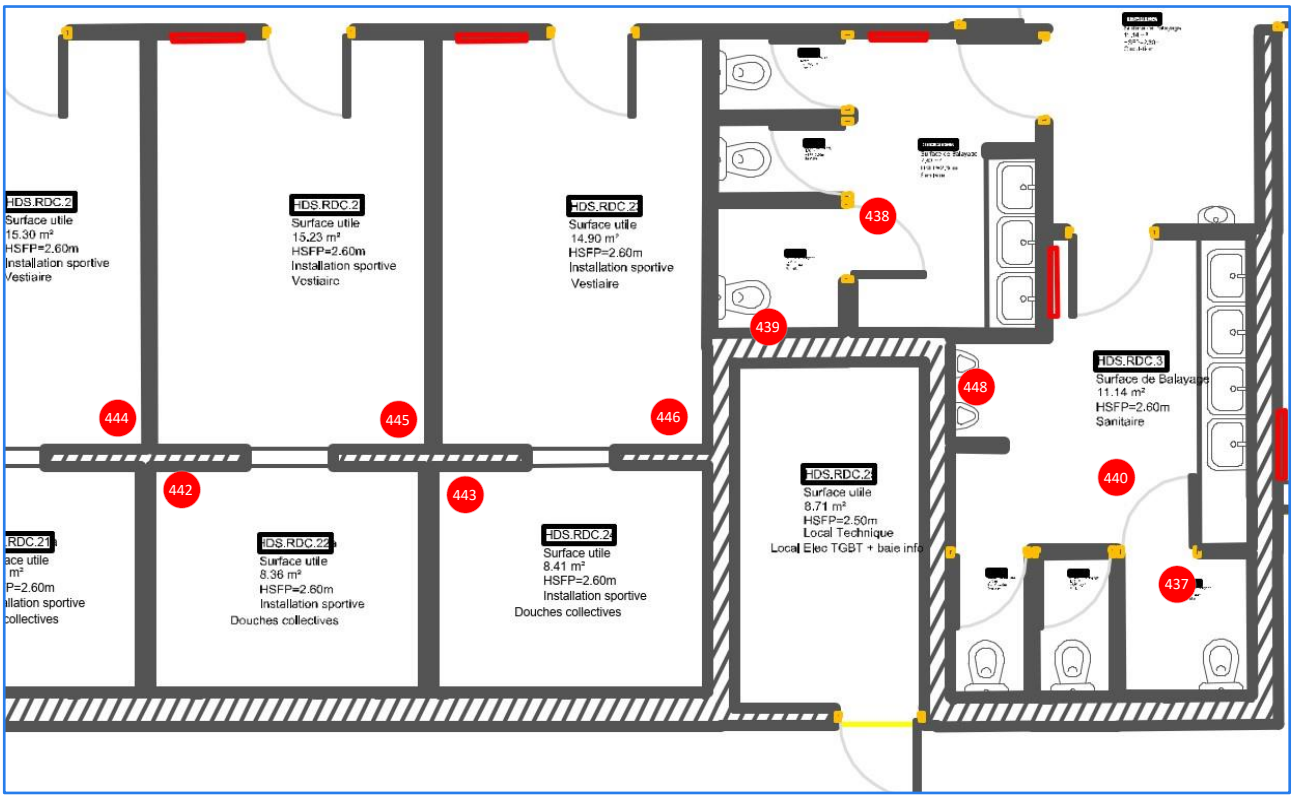

UPPA / PAU / IBE / PAU_IBE_RDC_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
281	06 MENUISERIES INTERIEURES	Adapter la paillasse pour pmr	IBEAS	

Photographies des non-conformités



281 Adapter la paillasse pour pmr


06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025



281 Adapter la paillasse pour pmr

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / IBE / PAU_IBE_RDC_200

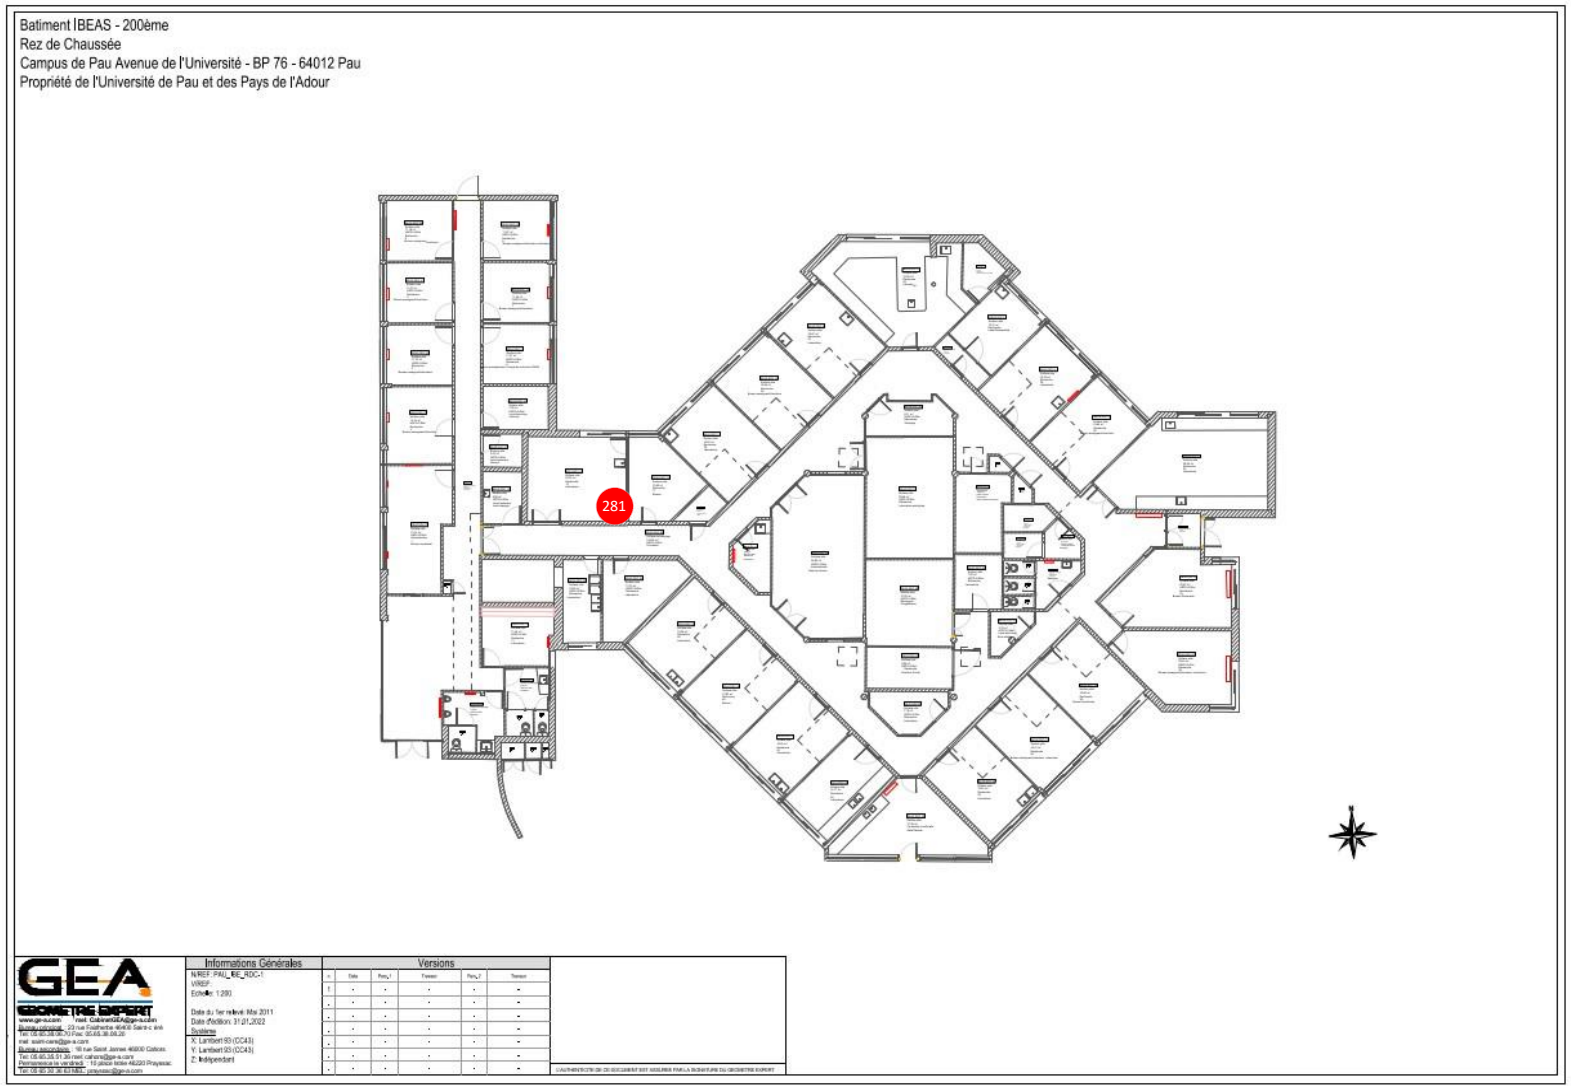

UPPA / PAU / ICL / PAU_ICL_R01_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
310	05 ASCENSEUR	Indicateur visuel et sonore absent en extérieur et dispositif vocal et visuel intérieur absent	ICL R+1	

Photographies des non-conformités




310 Indicateur visuel et sonore absent en extérieur et dispositif vocal et visuel intérieur absent
05 ASCENSEUR
Date butoir : 26/03/2025



310 Indicateur visuel et sonore absent en extérieur et dispositif vocal et visuel intérieur absent
05 ASCENSEUR
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / ICL / PAU_ICL_R01_200

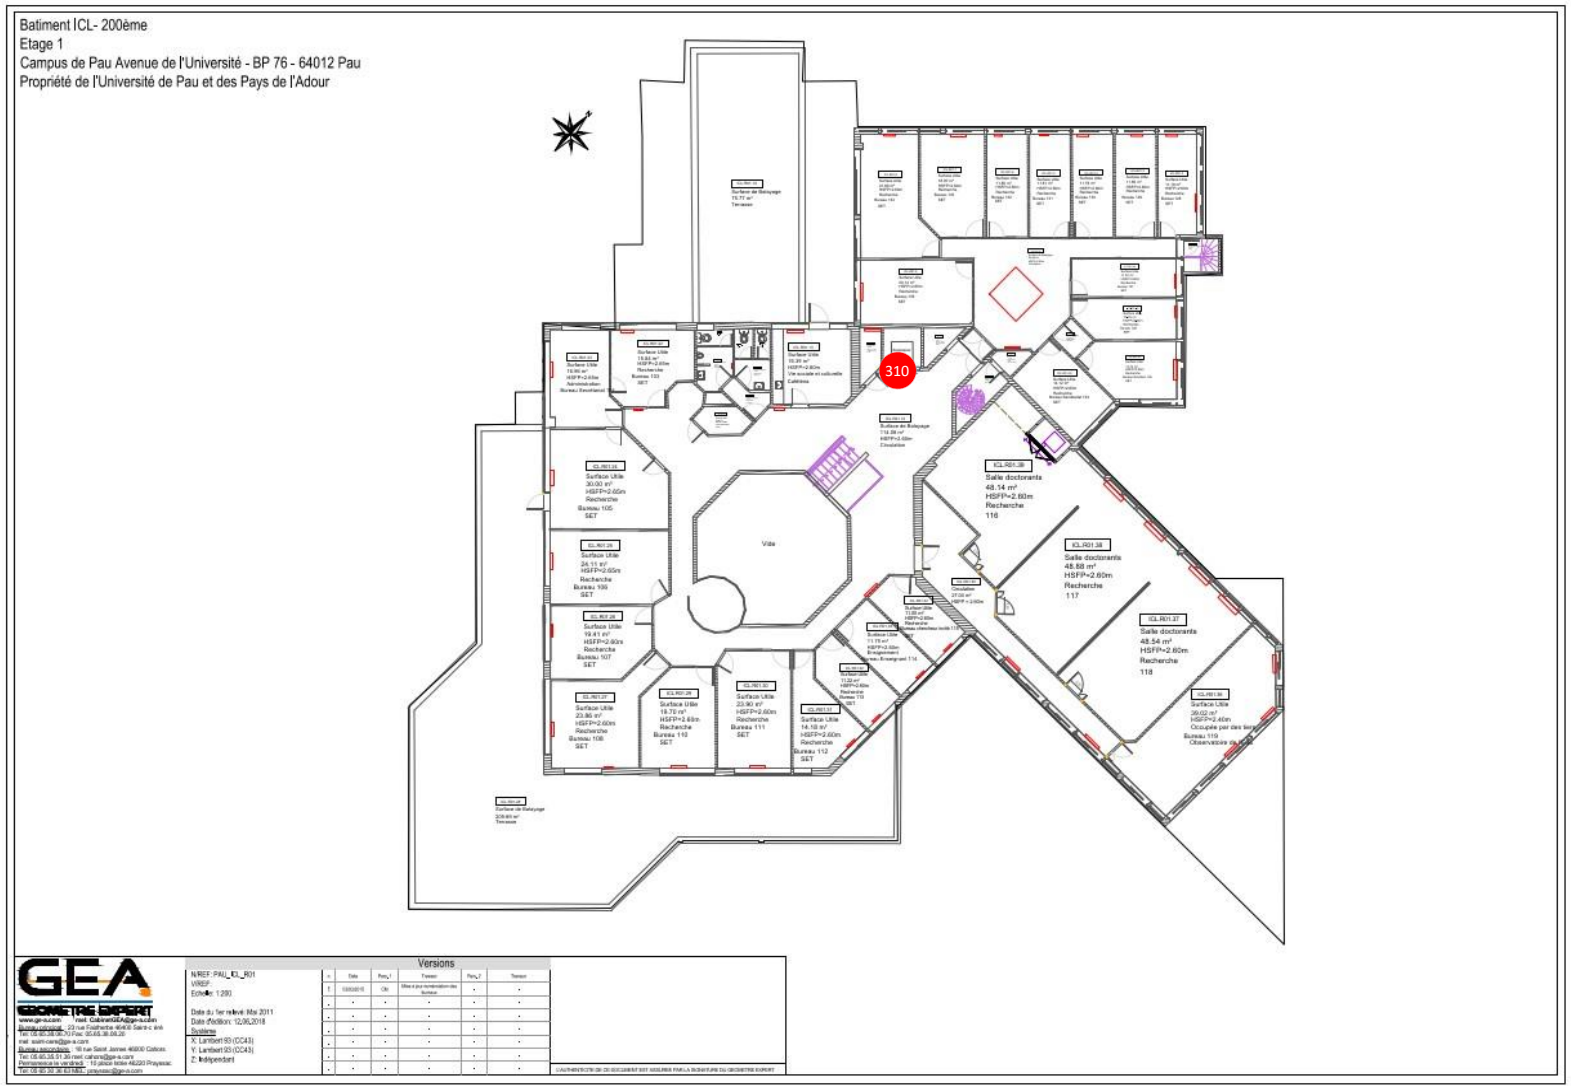

UPPA / PAU / ICL / PAU_ICL_RDC_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
309	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarches 6ml et main courante à rallonger	ICL RDC	Contre marche : 6ml Garde corps : 1 ml
311	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Remplacer la robinetterie accessible pmr	ICL RDC	

Photographies des non-conformités



309 Contremarches 6ml et main courante à rallonger

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



309 Contremarches 6ml et main courante à rallonger


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



311 Remplacer la robinetterie accessible pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / ICL / PAU_ICL_RDC_200

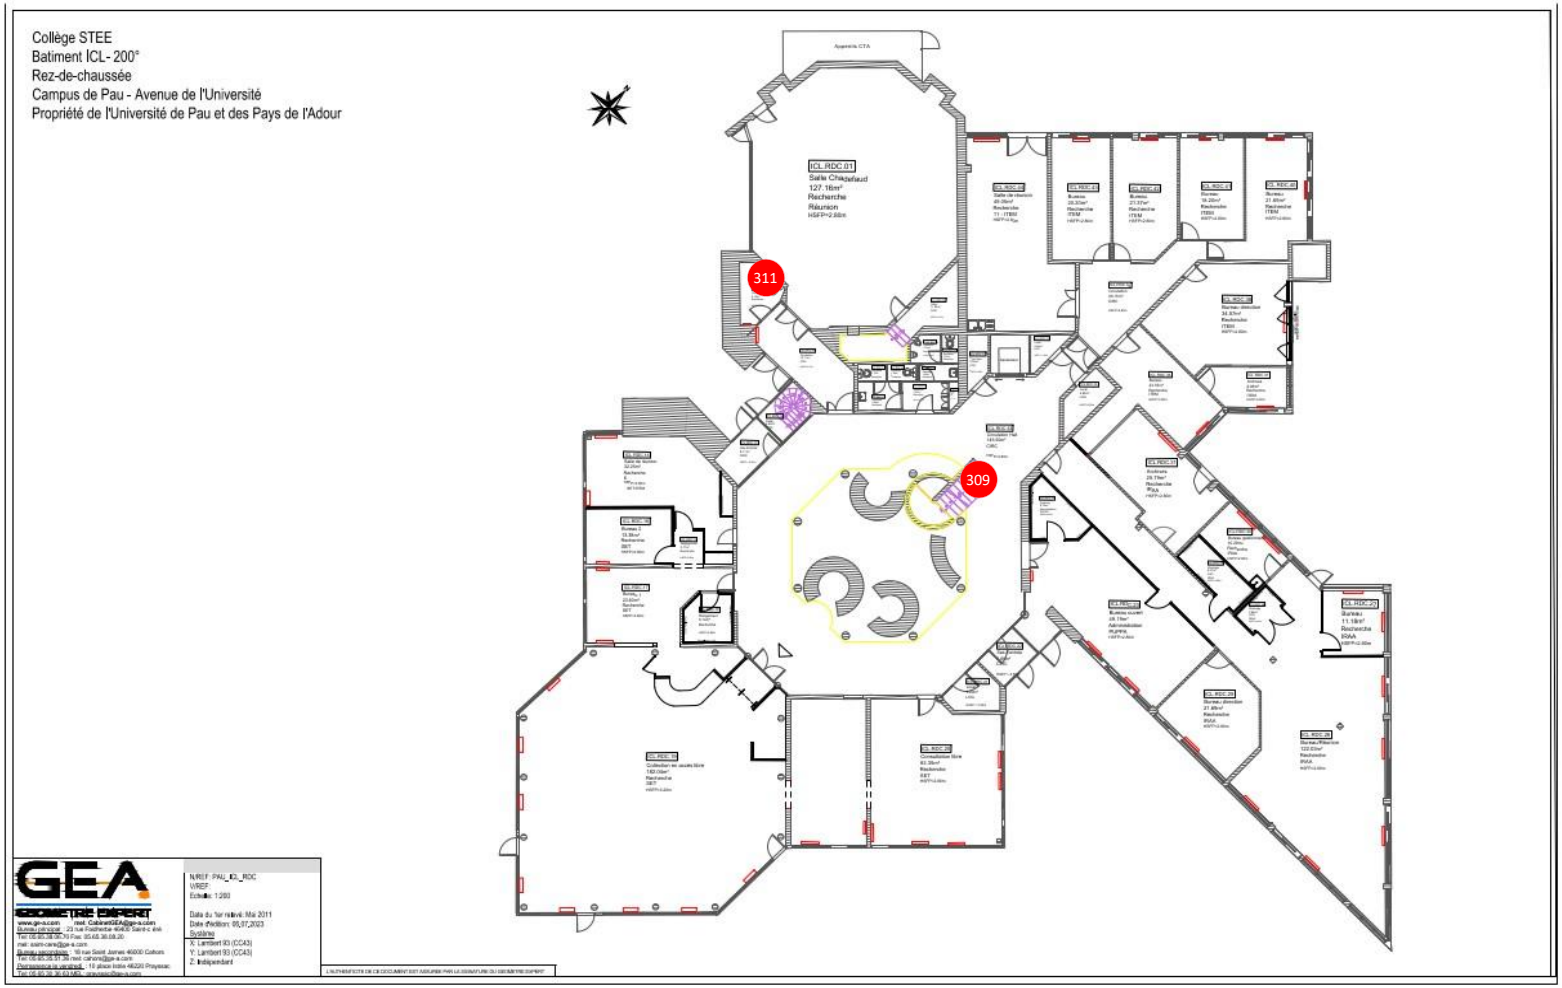

UPPA / PAU / IPM / PAU_IPM_R01_numero

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
321	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	22 marches : mettre nez de marche, contremarche x2 et bande vigilance en partie haute	IPM R+1	Largeur de passage : 1,5m antidérapant : 33ml (nombre 22) Contre marche : 3 ml (nombre 3) Bande de vigilance : 1,5ml(nombre 1)
322	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger sur les 4 niveaux	IPM R+1	Largeur de passage : 1,4m antidérapant : 112ml (nombre 80) Contre marche : 22,4ml (nombre16) Garde corps prolongement : 5 ml (nombre 10) Bande de vigilance : 11,2 ml(nombre 8)
323	05 ASCENSEUR	Signalétique ascenseur sonore et visuel extérieur et intérieur absente	IPM R+1	
324	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger sur les 4 niveaux	IPM R+1	Largeur de passage : 1,4m antidérapant : 112ml (nombre 80) Contre marche : 22,4ml (nombre16) Garde corps prolongement : 5 ml (nombre 10) Bande de vigilance : 11,2 ml(nombre 8)
325	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger sur les 4 niveaux	IPM R+1	Largeur de passage : 1,4m antidérapant : 112ml (nombre 80) Contre marche : 22,4ml (nombre16) Garde corps prolongement : 5 ml (nombre 10) Bande de vigilance : 11,2 ml(nombre 8)
326	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger sur les 4 niveaux	IPM R+1	
327	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Poignée U	IPM R+1	
328	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u	IPM R+1	
396	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger sur les 4 niveaux	IPM R+1	

Plan - UPPA / PAU / IPM / PAU_IPM_R01_numero




UPPA / PAU / IPM / PAU_IPM_RDC_numero

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
320	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance et contremarche et main courante	IPM RDC	Largeur de passage : 4m Contre marche : 8 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 4 ml(nombre 1)
329	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	IPM RDC	
330	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Aménager une place pmr et signalisation	IPM RDC	
331	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u	IPM RDC	
332	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U	IPM RDC	

Plan - UPPA / PAU / IPM / PAU_IPM_RDC_numero

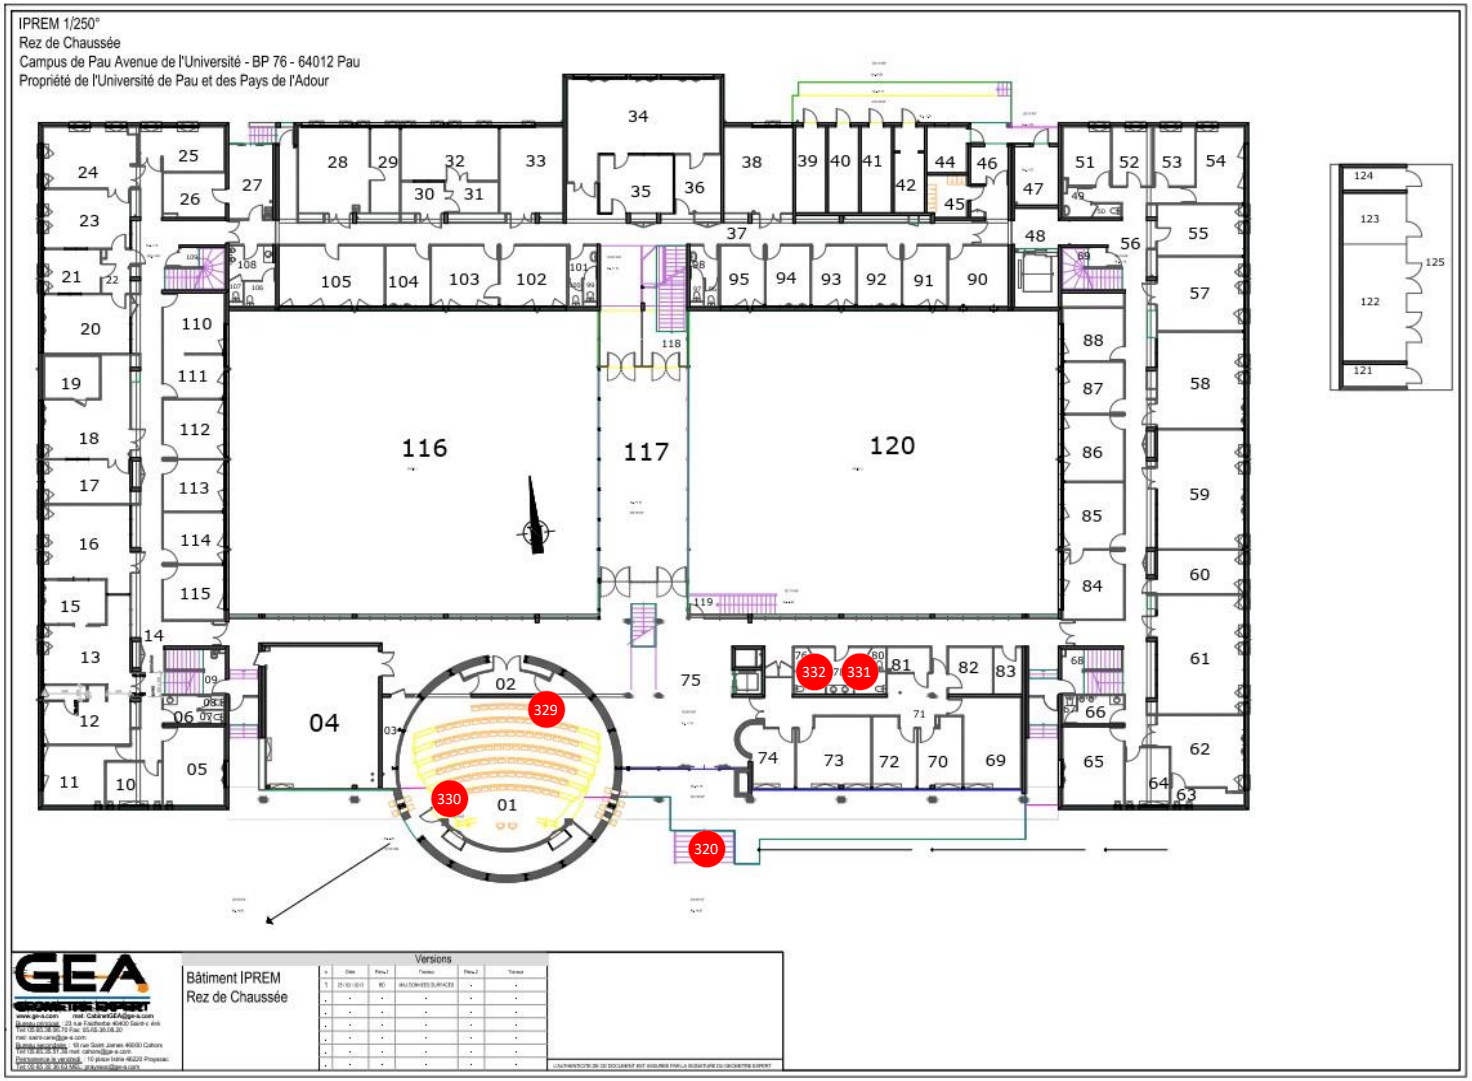

UPPA / PAU / LAV / PAU_LAV_RDC_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
312	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Cheminement à mettre en enrobé	LAV RDC	
313	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Créer des places de stationnement pmr avec bande de guidage	LAV RDC	
314	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Pas de repérage entrée bâtiment	LAV RDC	
315	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur vitrage	LAV RDC	
316	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance et main courante	LAV RDC	Largeur de passage : 1,5m Contre marche : 6 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 3ml(nombre 2)
317	05 ASCENSEUR	Extérieur intérieur visuel et sonore	LAV RDC	
319	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique pmr	LAV RDC	

Photographies des non-conformités



312 Cheminement à mettre en enrobé

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-

Date butoir : 26/03/2025



312 Cheminement à mettre en enrobé

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-

Date butoir : 26/03/2025



313 Créer des places de stationnement pmr avec bande de guidage

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-

Date butoir : 26/03/2025



314 Pas de repérage entrée bâtiment

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER

Date butoir : 26/03/2025




315 Signalétique sur vitrage

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER

Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / LAV / PAU_LAV_RDC_200

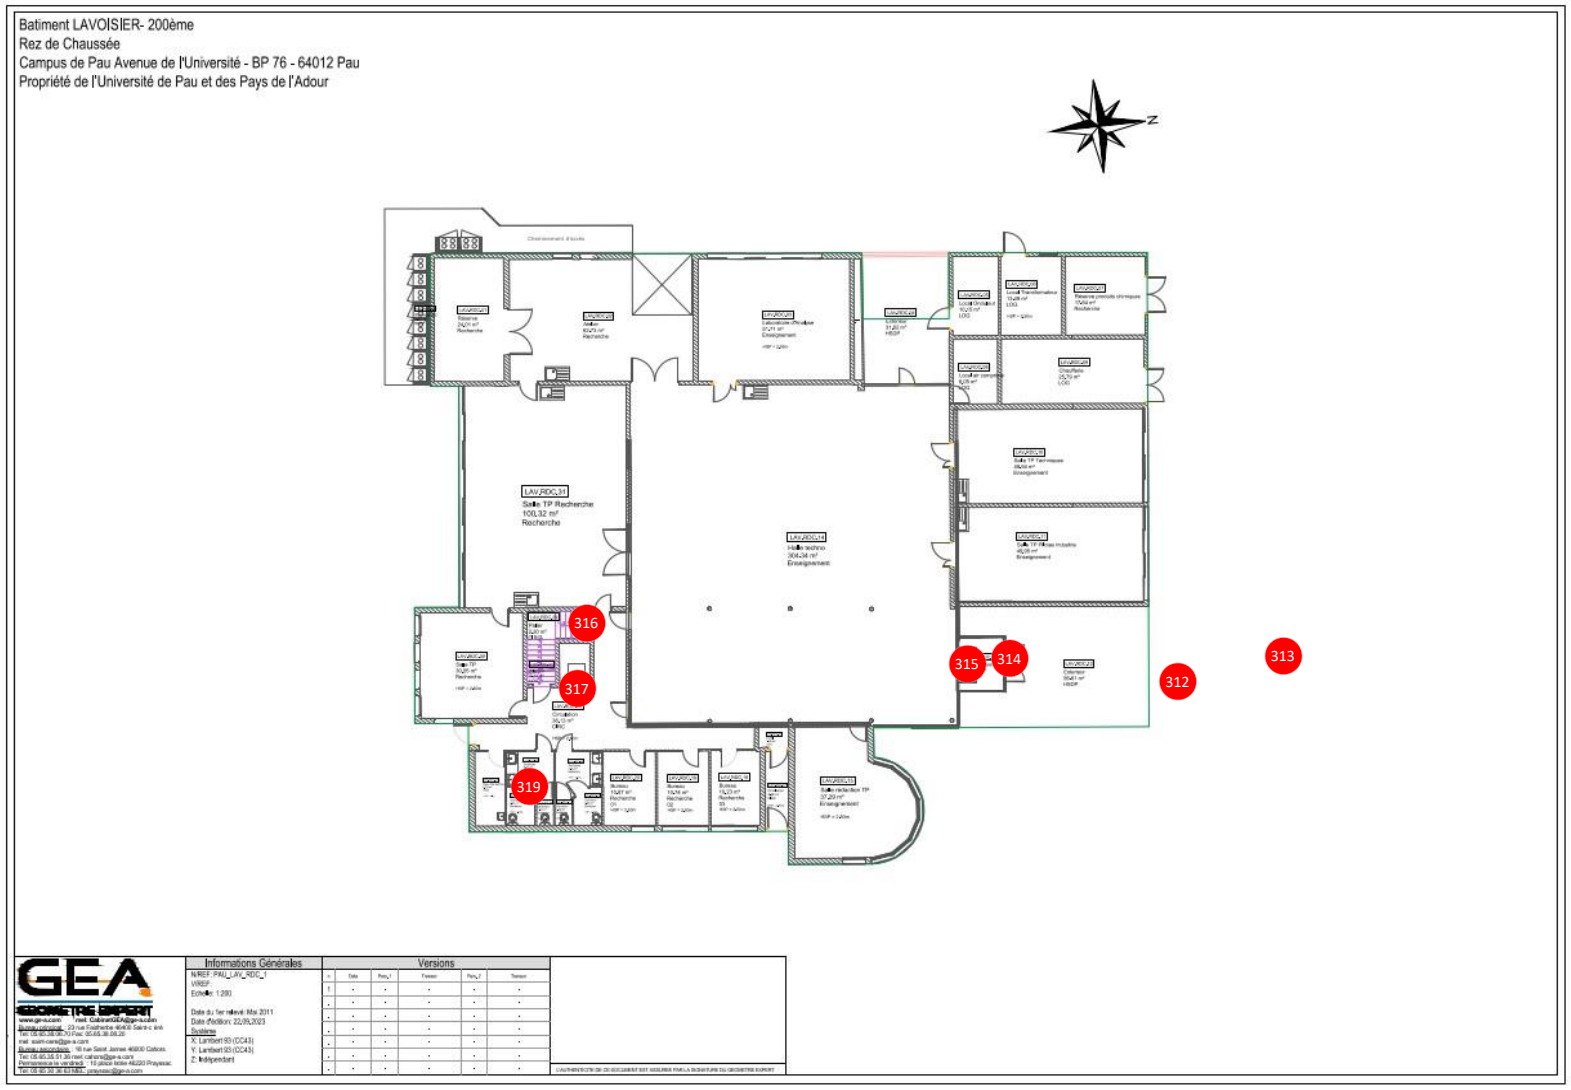

UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
282	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur vitrage	LET RDC	
283	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Panneaux signalisation en place	LET RDC	
284	06 MENUISERIES INTERIEURES	Banque d'accueil non accessible pmr	LET RDC	
285	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche largeur 1m20, bande de vigilance et rallonger main courante	LET RDC	Largeur de passage : 1,2m Contre marche : 2,4 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1,2 ml (nombre 1)
286	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et main courante à rallonger ou à créer	LET RDC	Largeur de passage : 1m Contre marche : 2 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1ml (nombre 1)
287	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u	LET RDC	
288	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, nez de marche contrasté, bande de vigilance et rallonger main courante	LET RDC	Largeur de passage : 2,5m Bande antidérapante : 50 ml (nombre 20) Contre marche : 15 ml (nombre 6) Garde corps prolongement : 3 ml (nombre 6) Bande de vigilance : 7,5ml(nombre 3) X2
293	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à créer à 1m	LET RDC	Largeur de passage : 2,55m Bande antidérapante : 41ml (nombre 16) Contre marche : 10,2 ml (nombre 4) Garde corps : 30ml à 1m de hauteur + prolongement : 3 ml (nombre 6) Bande de vigilance : 5 ml (nombre 2)
294	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, nez de marche, bande de vigilance et création de mains courantes	LET RDC	Largeur de passage : 1,4m nez de marche : 25,2 ml (nombre 18) Contre marche : 5,6 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 2,8 ml (nombre 2)
301	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	LET RDC	
302	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	LET RDC	
303	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	LET RDC	
304	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	LET RDC	
305	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Remplacer les mains courantes 35ml	LET RDC	Main courante : 35ml
306	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	LET RDC	
307	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger	LET RDC	Largeur de passage : 1,4m antidérapant : 25ml (nombre 18) Contre marche : 5,6 ml (nombre4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7) Bande de vigilance : 2,8 ml(nombre 2) X2
308	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacer les quatre portes par des portes tierce x6	LET RDC	

Photographies des non-conformités



282 Signalétique sur vitrage

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025




283 Panneaux signalisation en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



283 Panneaux signalisation en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025




284 Banque d'accueil non accessible pmr

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025



285 Contremarche largeur 1m20, bande de vigilance et rallonger main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



286 Contremarche et main courante à rallonger ou à créer

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025




287 Poignée u

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




288 Contremarche, nez de marche contrasté, bande de vigilance et rallonger main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



288 Contremarche, nez de marche contrasté, bande de vigilance et rallonger main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



288 Contremarche, nez de marche contrasté, bande de vigilance et rallonger main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



288 Contremarche, nez de marche contrasté, bande de vigilance et rallonger main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



293 Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à créer à 1m
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



293 Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à créer à 1m
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



293 Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à créer à 1m
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



293 Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à créer à 1m
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



294 Contremarche, nez de marche, bande de vigilance et création de mains courantes
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025




294 Contremarche, nez de marche, bande de vigilance et création de mains courantes
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



303 Signalisation place pmr

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



305 Remplacer les mains courantes 35ml

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



305 Remplacer les mains courantes 35ml

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



306 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



307 Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



308 Remplacer les quatre portes par des portes tierce x6

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025



308 Remplacer les quatre portes par des portes tierce x6


06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1




Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1 - Extrait 1



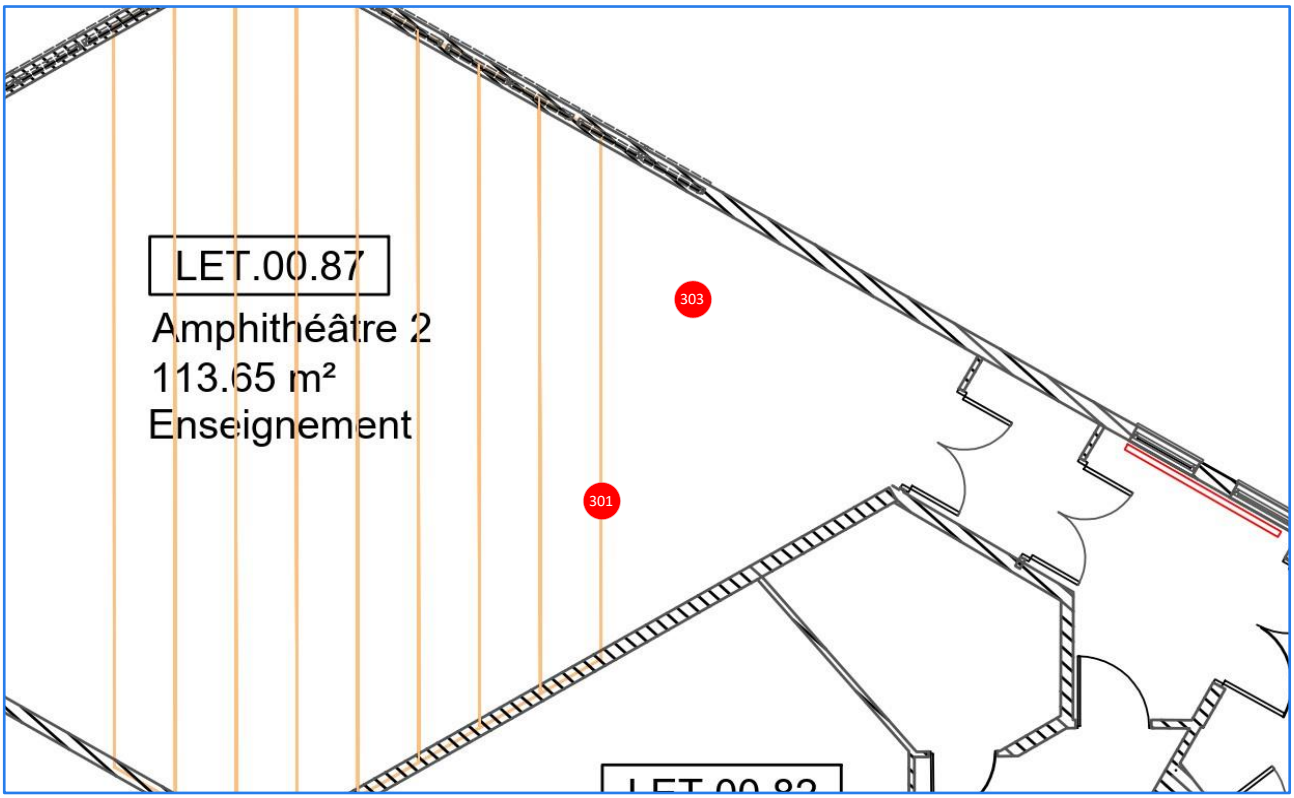


Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1 - Extrait 2



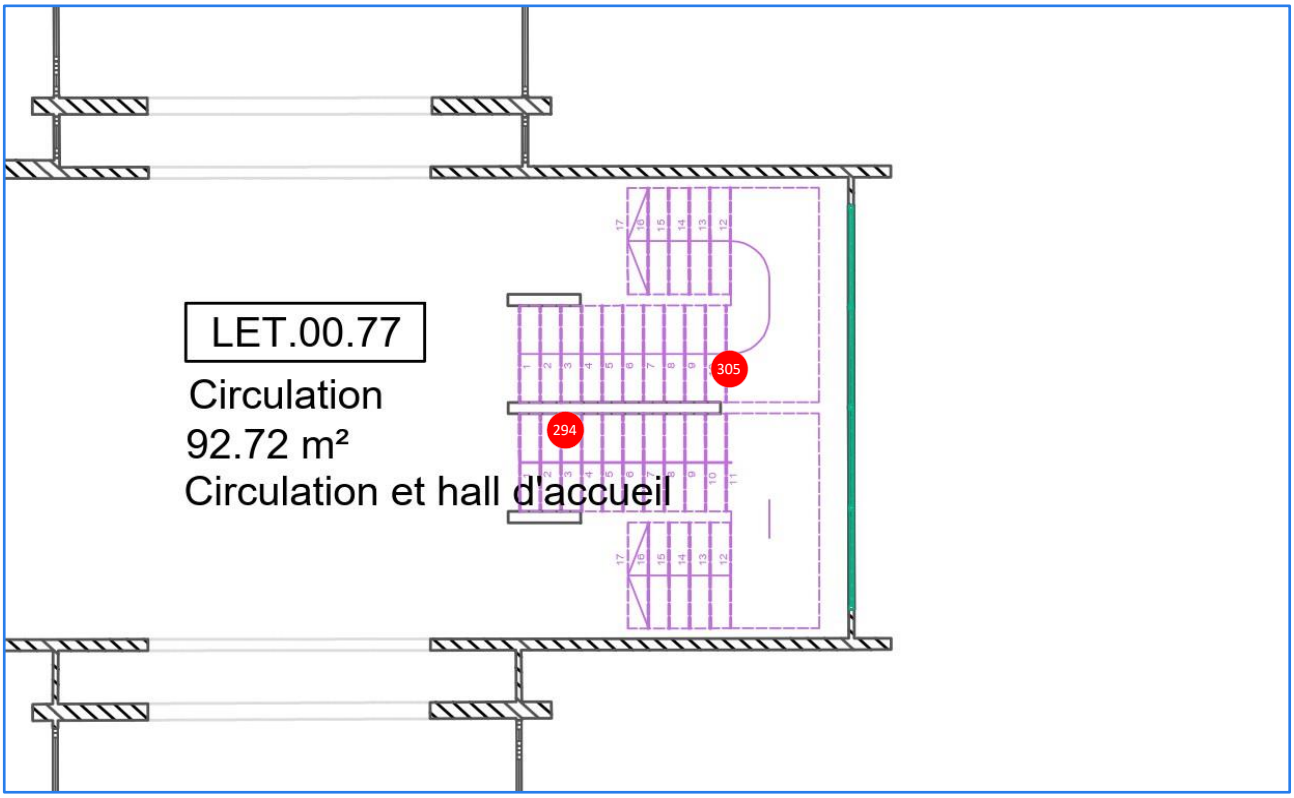


Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1 - Extrait 3



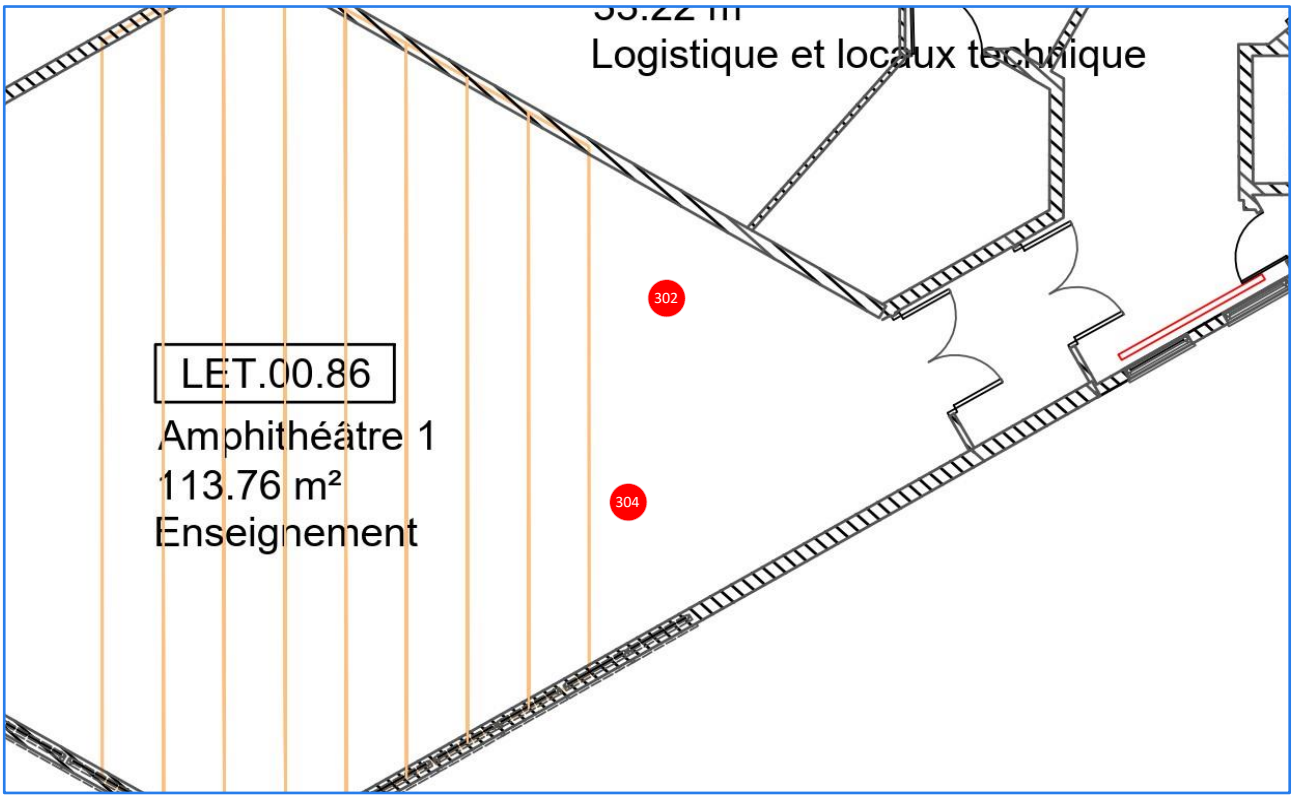

Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1 - Extrait 4



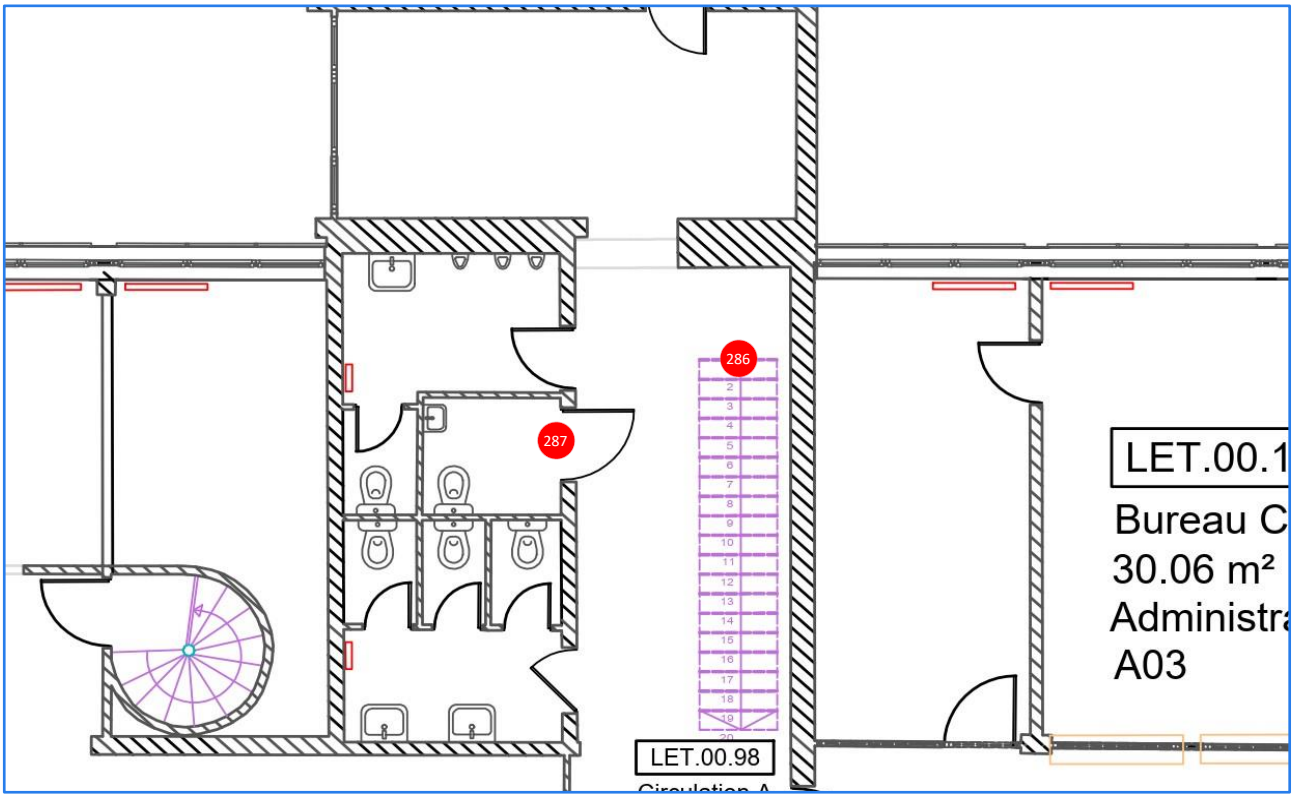

UPPA / PAU / LET / PAU_LET_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
289	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Identifier au rdc	LET R+1	
290	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Identifier au rdc	LET R+1	
291	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche 30ml nez de marche 30ml, rallonger les 18 mains courantes (9ml) et bande de vigilance x4	LET R+1	Largeur de passage : 1,4m Bande antidérapante : 30ml Contre marche : 6 ml Garde corps prolongement : 9ml Bande d'éveil :5,6ml (nombre 4)
292	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche 30ml et 12 mains courante à rallonger (6ml)	LET R+1	Largeur de passage : 1,7m Contre marche : 10,2 ml (nombre 6) Bande de vigilance : 5,1ml(nombre 3) Main courante : 6ml
295	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche 6ml et mains courantes à créer	LET R+1	Largeur de passage : 1,7m Contre marche : 6,8 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 3,4ml(nombre 2) Main courante : 6,4ml
296	05 ASCENSEUR	Signalisation visuelle absente	LET R+1	

Photographies des non-conformités




289 Identifier au rdc

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



289 Identifier au rdc

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025




290 Identifier au rdc

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



290 Identifier au rdc


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



291 Contremarche 30ml nez de marche 30ml, rallonger les 18 mains courantes (9ml) et bande
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



291 Contremarche 30ml nez de marche 30ml, rallonger les 18 mains courantes (9ml) et bande
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



295 Contremarche 6ml et mains courantes à créer

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



295 Contremarche 6ml et mains courantes à créer

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



295 Contremarche 6ml et mains courantes à créer


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



296 Signalisation visuelle absente

05 ASCENSEUR
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_01

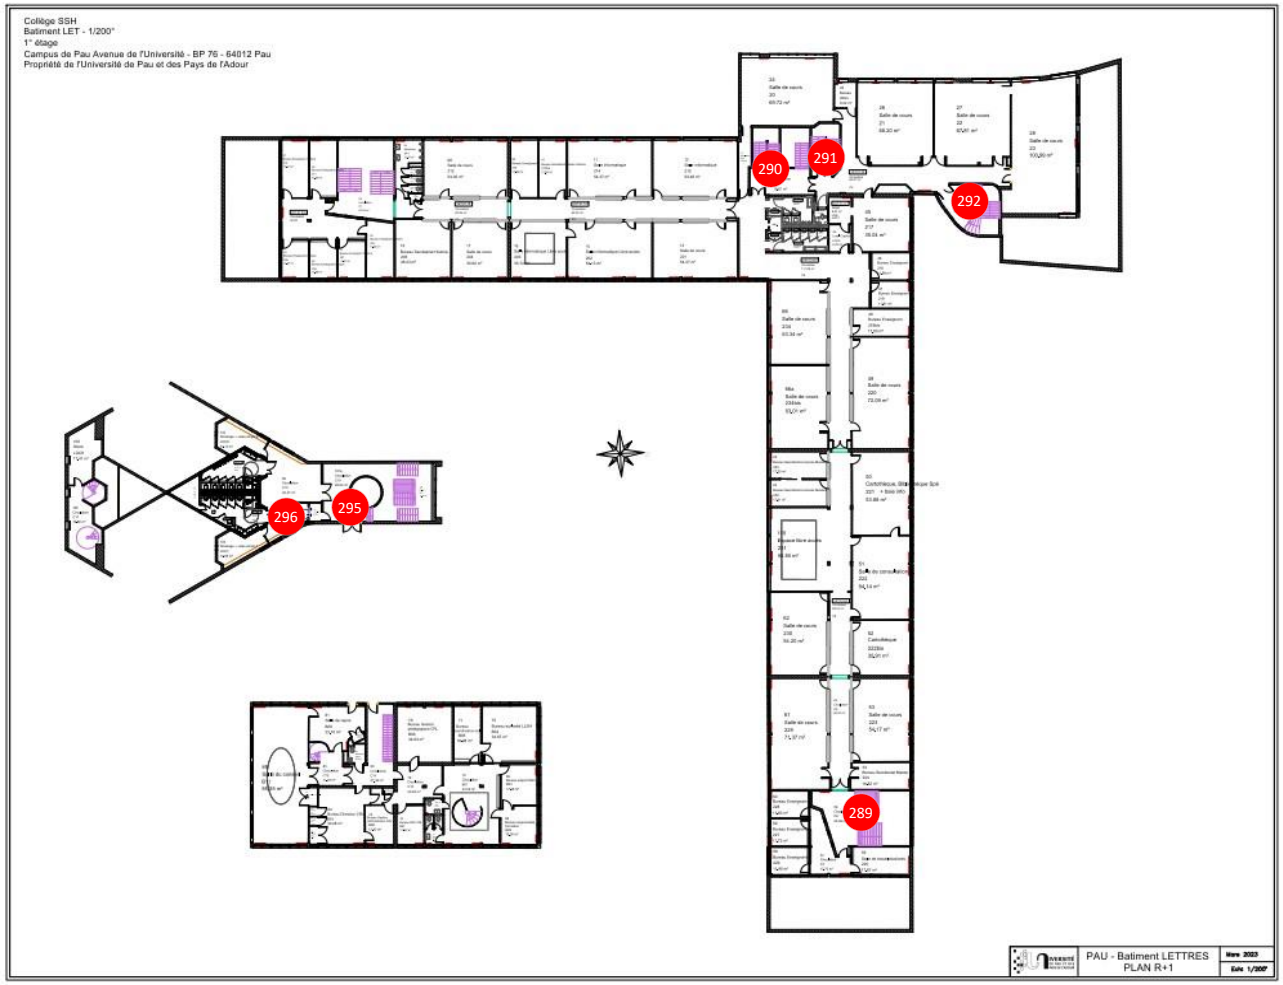

UPPA / PAU / LET / PAU_LET_02_A1

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
297	05 ASCENSEUR	Signalisation visuel absente	LET R+2	
298	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	LET R+2	
299	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique place pmr à mettre en place	LET R+2	
300	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonger main courante 16 (8ml) ou les remplacer (5ml chacune)	LET R+2	

Photographies des non-conformités



297 Signalisation visuel absente

05 ASCENSEUR
Date butoir : 26/03/2025



298 Boucle magnétique

03 ELECTRICITE CFO/CFA
Date butoir : 26/03/2025



299 Signalétique place pmr à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



299 Signalétique place pmr à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



300 Rallonger main courante 16 (8ml) ou les remplacer (5ml chacune)


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



300 Rallonger main courante 16 (8ml) ou les remplacer (5ml chacune)

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_02_A1

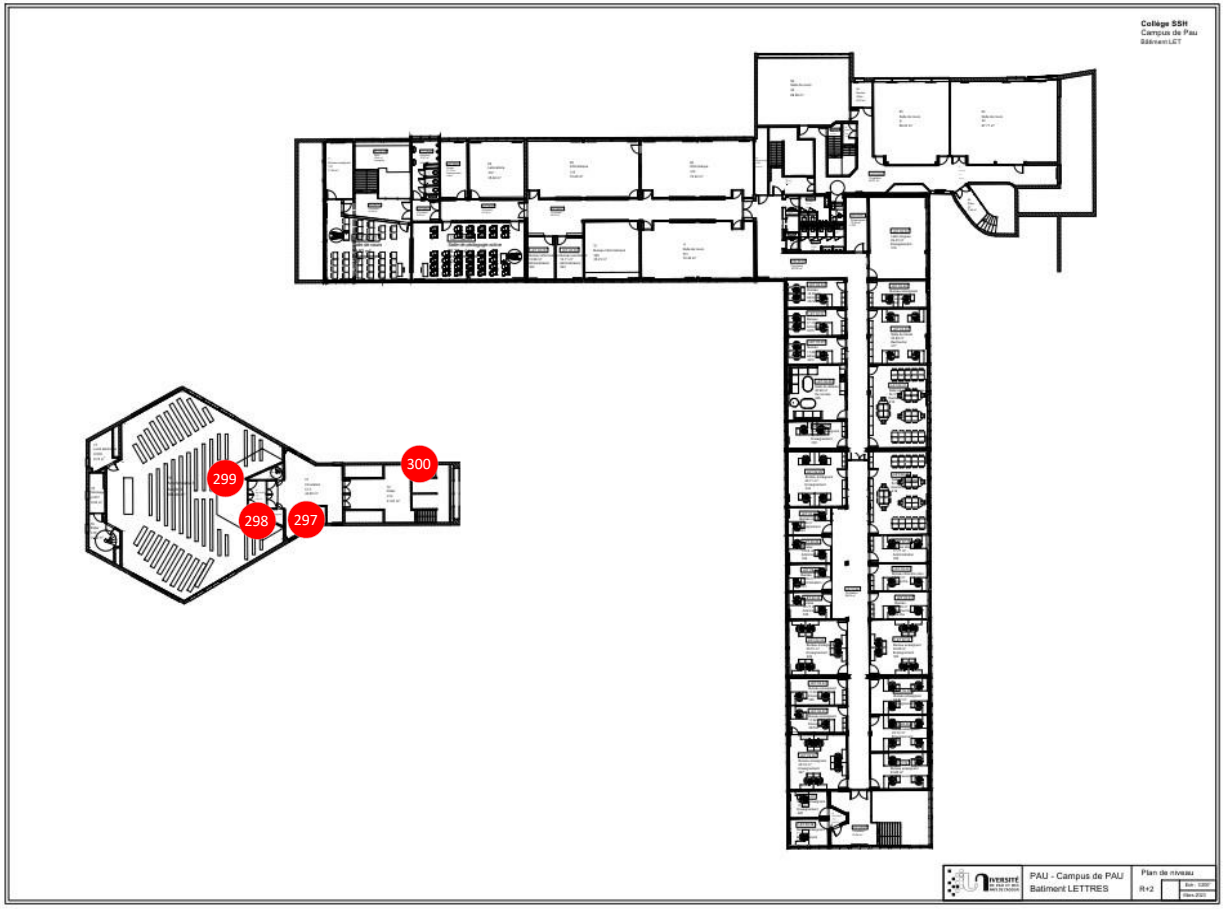

UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
267	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique vitrage porte	PAL RDC	
268	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique vitrage porte	PAL RDC	
269	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U	PAL RDC	
270	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, rallonger main courante, nez de marche et bande de vigilance	PAL RDC	Bande antidérapante : 24 ml Contre marche : 4,7 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1,7ml(nombre 1)
271	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	PAL RDC	
272	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	PAL RDC	
273	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacer les quatre portes par des portes tierce x4	PAL RDC	
274	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique pmr à mettre en place	PAL RDC	
275	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique pmr à mettre en place	PAL RDC	
276	06 MENUISERIES INTERIEURES	Pris en compte dans 273	PAL RDC	
277	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Lavabo entre 75 et 80 cm prévoir remplacement mitigeur	PAL RDC	
278	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U	PAL RDC	

Photographies des non-conformités



267 Signalétique vitrage porte

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



268 Signalétique vitrage porte

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



269 Poignée U

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



270 Contremarche, rallonger main courante, nez de marche et bande de vigilance
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



273 Remplacer les quatre portes par des portes tierce x4

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025




273 Remplacer les quatre portes par des portes tierce x4

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025



276 Pris en compte dans 273

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025



277 Lavabo entre 75 et 80 cm prévoir remplacement mitigeur


02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




278 Poignée U

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025


Plan - UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_00

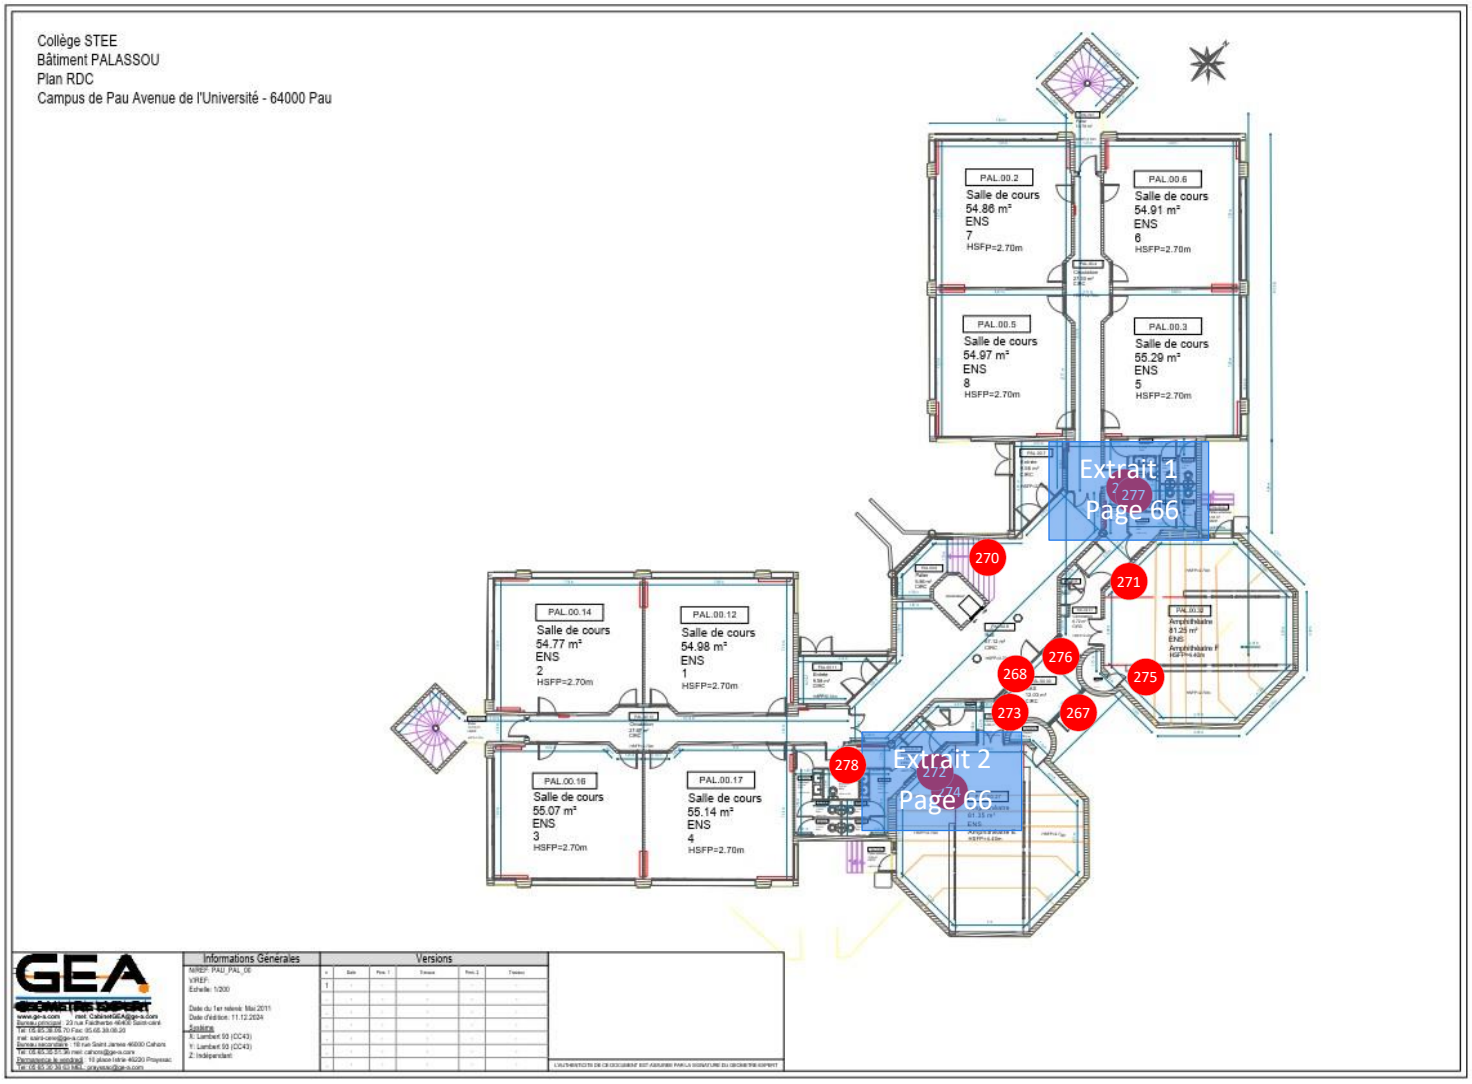

Plan - UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_00 - Extrait 1

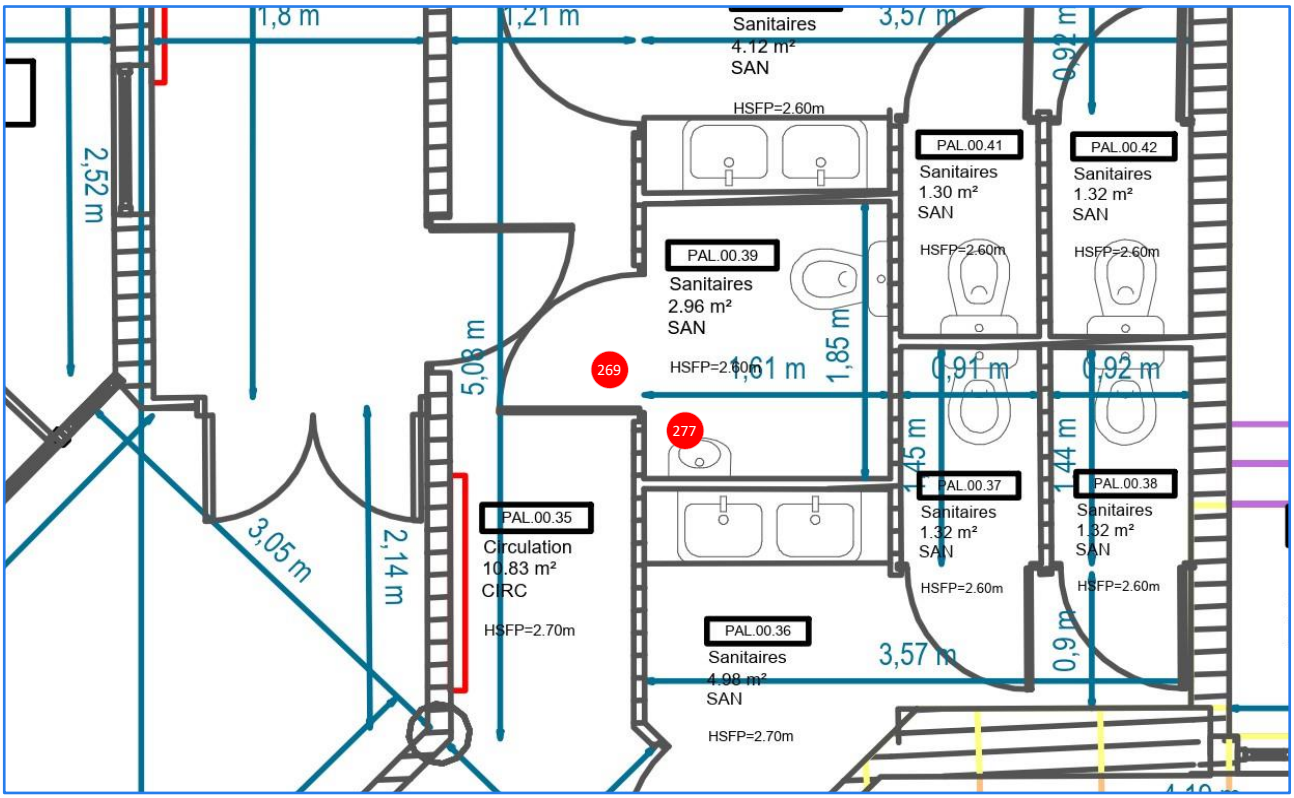

Plan - UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_00 - Extrait 2

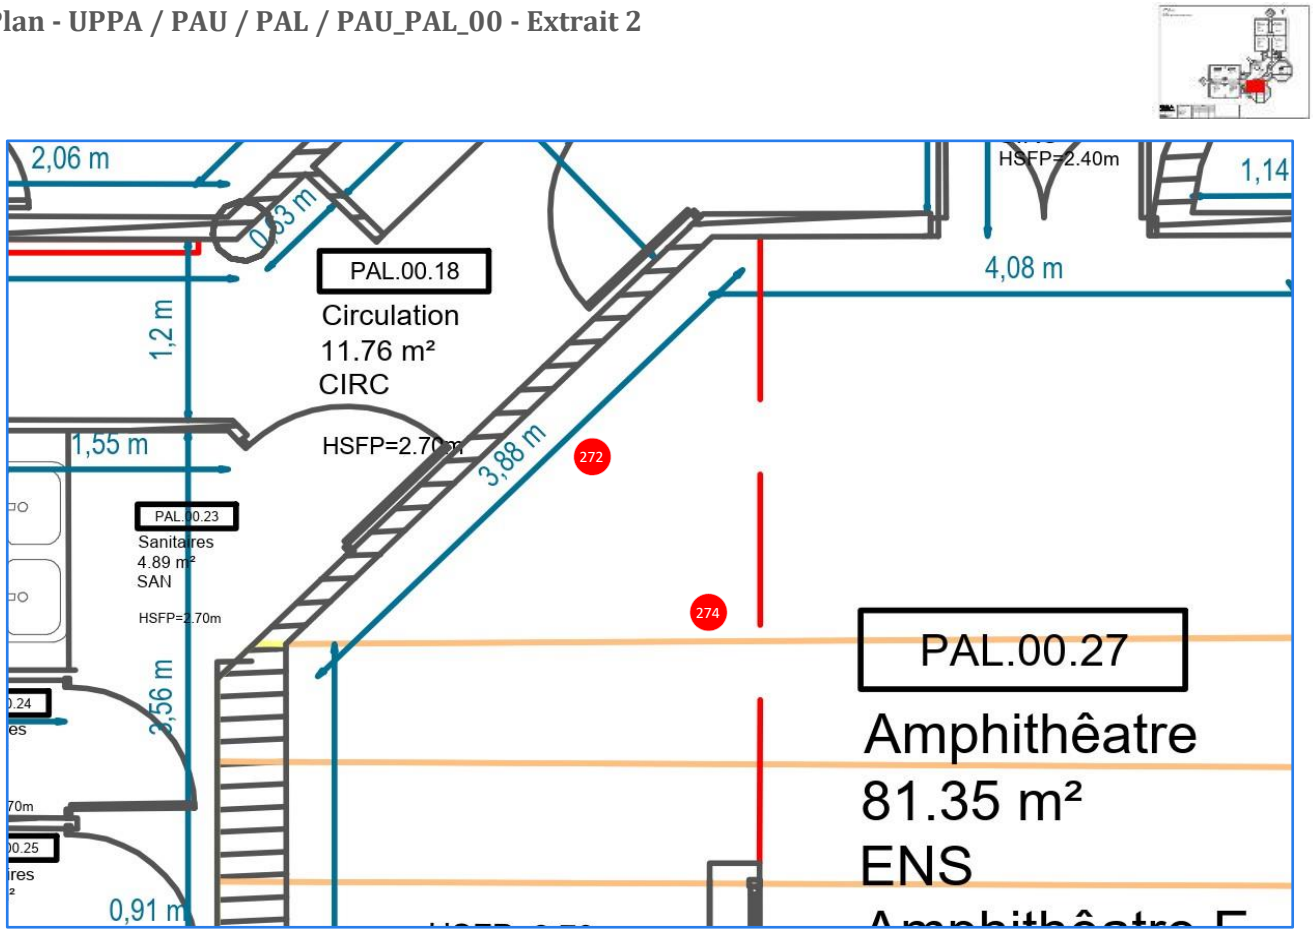


UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_R01-200eme

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
279	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonger main courante, contremarche et bande de vigilance	PAL R+1	Largeur de passage : 1,7m Contre marche : 3,4 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1,7 ml(nombre 1)
280	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	PAL R+1	

Photographies des non-conformités



279 Rallonger main courante, contremarche et bande de vigilance
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025




279 Rallonger main courante, contremarche et bande de vigilance
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



280 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_R01-200eme

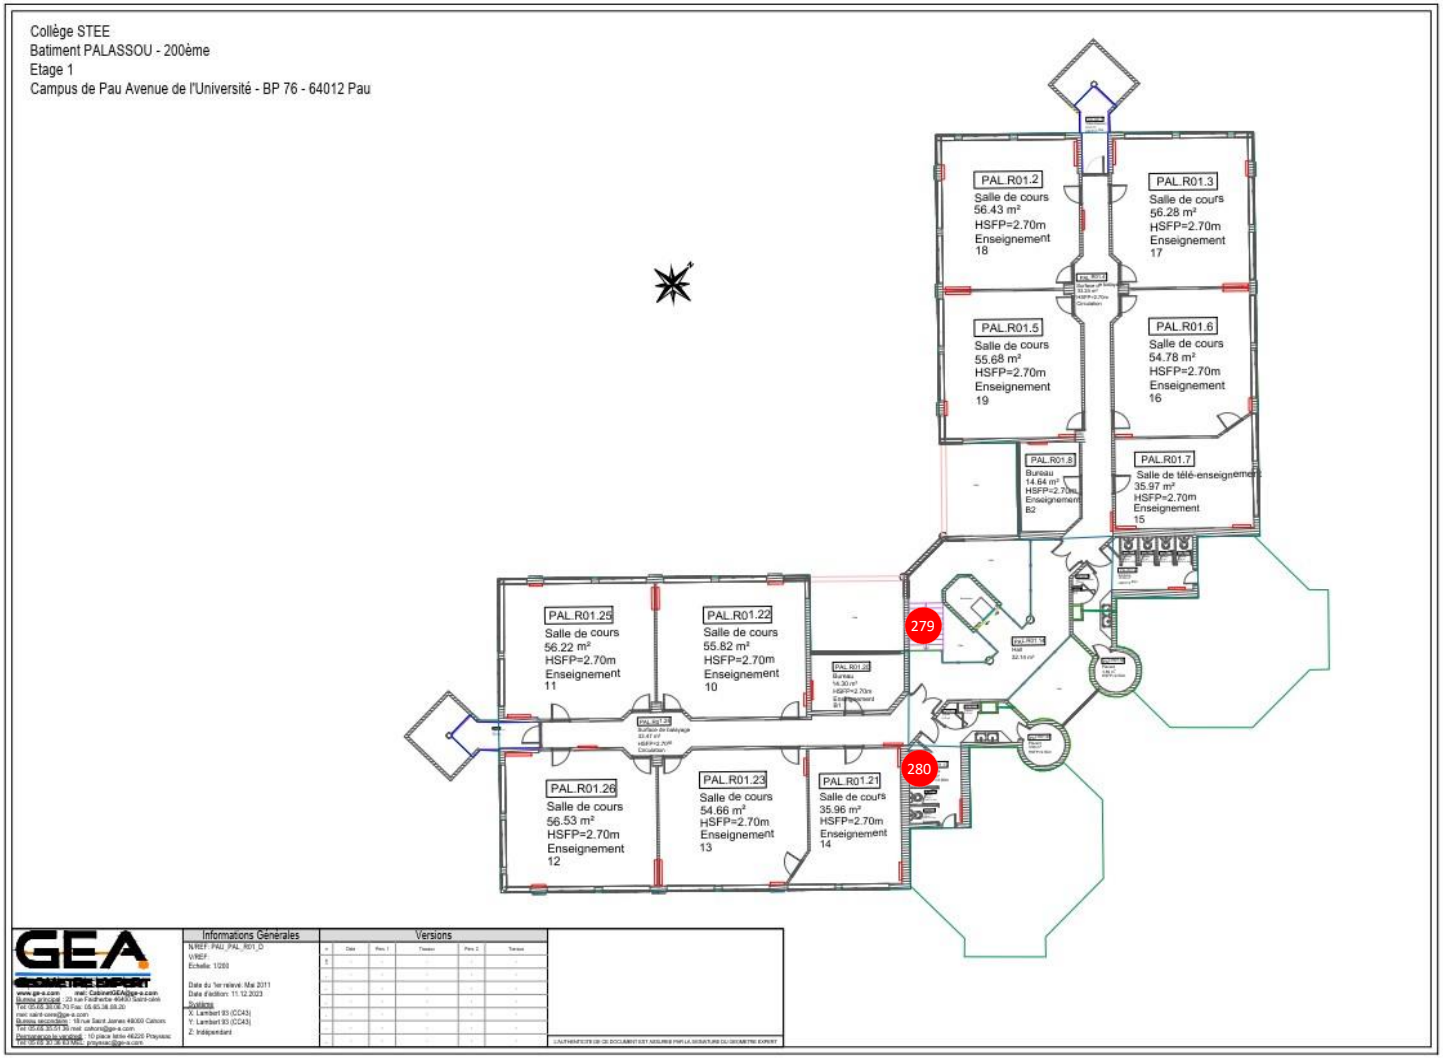

UPPA / PAU / PRE / PAU_PRE_00_150

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
235	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation vitrage porte à mettre en place	PRE RDC	
236	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Contrôle d'accès à baisser	PRE RDC	
237	06 MENUISERIES INTERIEURES	Retirer la porte, passage trop faible	PRE RDC	
238	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Barre d'appui à mettre en place	PRE RDC	
239	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u	PRE RDC	
240	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	PRE RDC	
241	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	PRE RDC	
242	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Création place p.m.r et signalisation	PRE RDC	
243	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contre marche 6ml et bande de vigilance x4	PRE RDC	Contre marche : 8ml (nombre 8) bande de vigilance : 4ml (nombre 4)
244	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Création d'une rampe pmr affaissement du sol extérieur	PRE RDC	

Photographies des non-conformités




235 Signalisation vitrage porte à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



236 Contrôle d'accès à baisser

03 ELECTRICITE CFO/CFA
Date butoir : 26/03/2025



237 Retirer la porte, passage trop faible

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025



238 Barre d'appui à mettre en place

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



239 Poignée u

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



240 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



241 Boucle magnétique

03 ELECTRICITE CFO/CFA
Date butoir : 26/03/2025



242 Création place p.m.r et signalisation

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



242 Création place p.m.r et signalisation

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



243 Contre marche 6ml et bande de vigilance x4


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025




244 Création d'une rampe pmr affaissement du sol extérieur

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / PRE / PAU_PRE_00_150

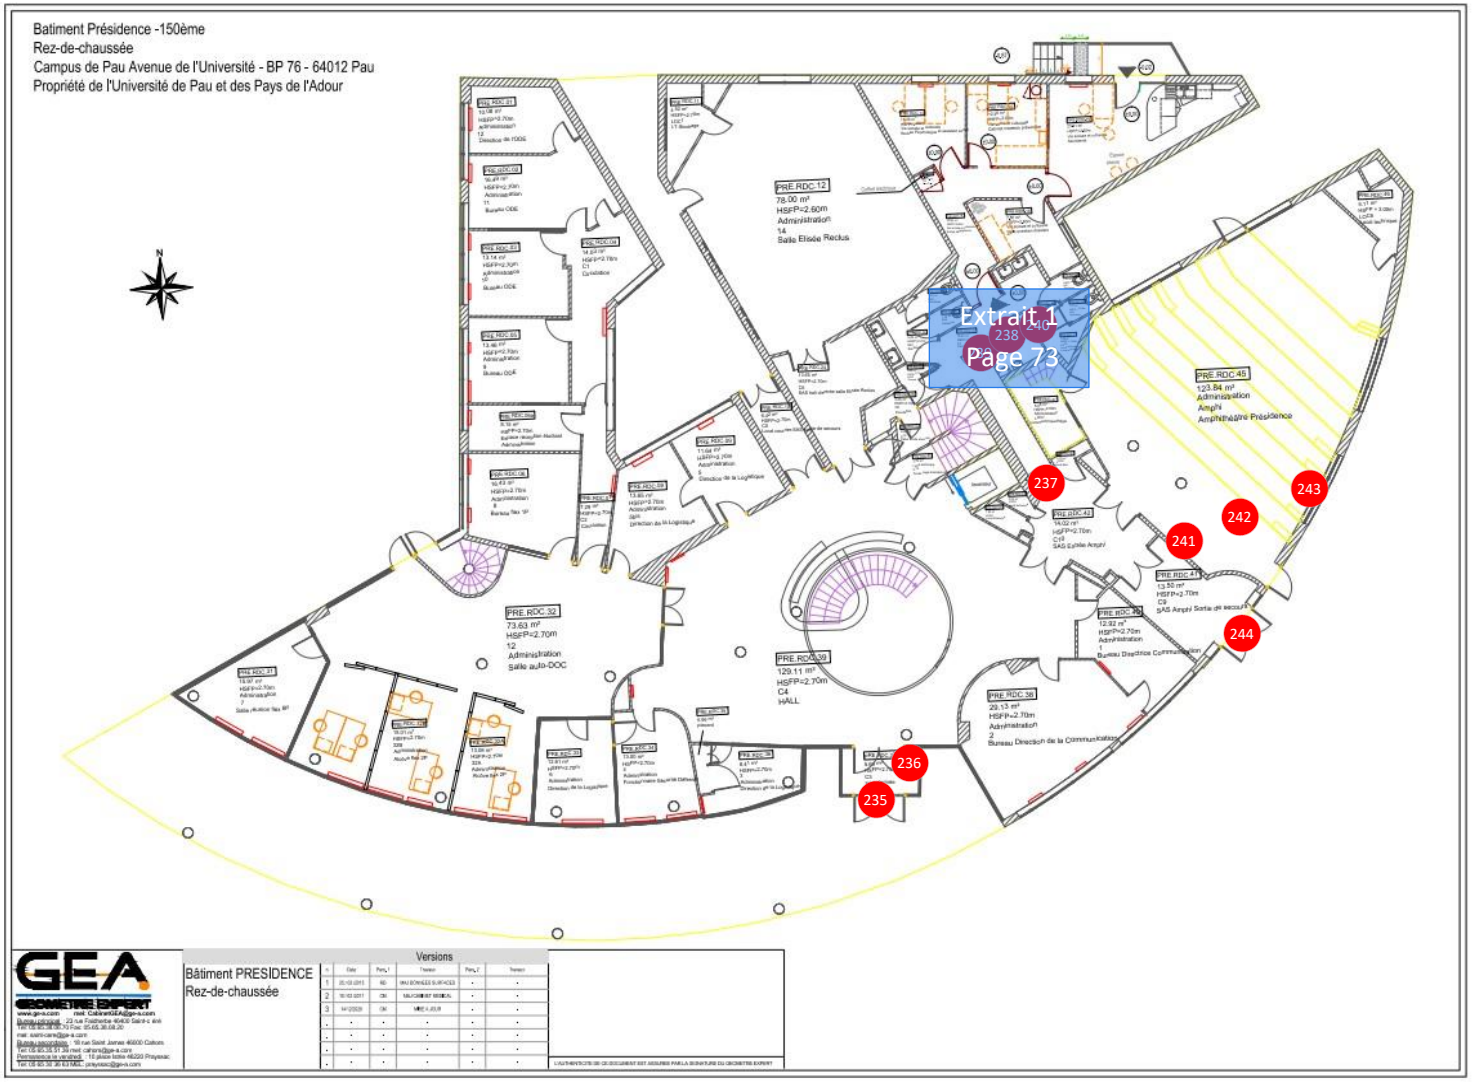

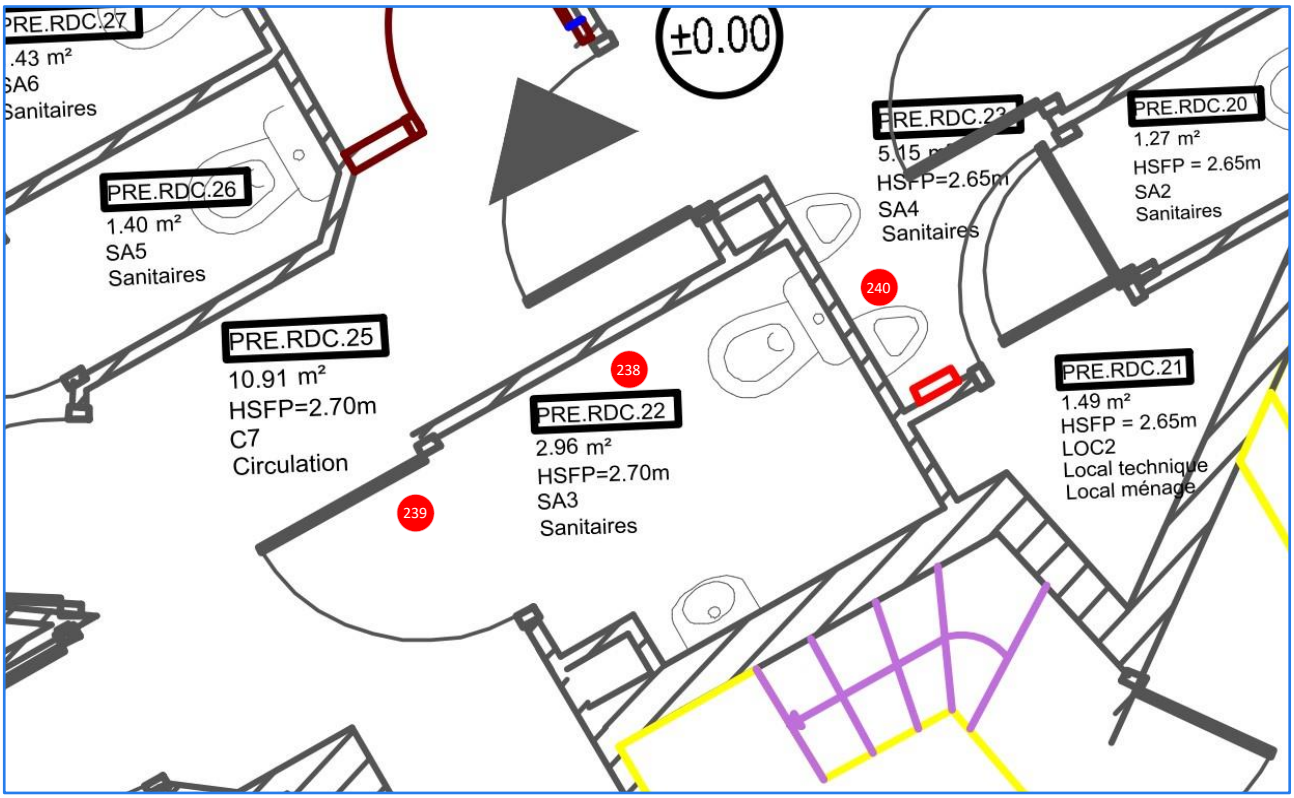



±0.00
PRE.RDC.27
.43 m²
SA6
Sanitaires
PRE.RDC.26
1.40 m²
SA5
Sanitaires
PRE.RDC.25
10.91 m²
HSFP=2.70m
C7
Circulation
238
PRE.RDC.22
2.96 m²
HSFP=2.70m
SA3
Sanitaires
239
PRE.RDC.23
HSFP=2.65m
SA4
Sanitaires
240
PRE.RDC.20
1.27 m²
HSFP = 2.65m
SA2
Sanitaires
PRE.RDC.21
1.49 m²
HSFP = 2.65m
LOC2
Local technique
Local ménage

UPPA / PAU / STI / PAU_STI_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
209	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, rallonger main courante et bande de vigilance	STI RDC	Contremarche : 2,8ml (nombre 2) main courante : 2ml (nombre 4) bande de vigilance : 1,4ml (nombre 1)
210	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Éclairage insuffisant	STI RDC	
211	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U et lavabo dans sanitaire pmr	STI RDC	
212	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	STI RDC	
213	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacer les portes d'entrée a l'amphithéâtre par portes tierce x2	STI RDC	
214	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et bande de vigilance et mobilier à retirer des escaliers et mettre place pmr	STI RDC	Contre marche : 6ml Bande de vigilance : 3ml (nombre 2)
215	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance partie haute et rallonger la courante	STI RDC	Largeur de passage : 1,4m Contre marche : 4,7 ml (nombre4) Garde corps prolongement : 3 ml (nombre 6) Bande de vigilance : 2,8 ml(nombre 2)
216	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U, barre trop éloigné de la cuvette mettre en place une barre d'appui, et lave main dans sanitaire	STI RDC	
217	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	STI RDC	
218	06 MENUISERIES INTERIEURES	Descendre les patère 1,30 dans toutes les salles	STI RDC	

Photographies des non-conformités



209 Contremarche, rallonger main courante et bande de vigilance
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



210 Éclairage insuffisant
03 ELECTRICITE CFO/CFA
Date butoir : 26/03/2025



211 Poignée U et lavabo dans sanitaire pmr
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



211 Poignée U et lavabo dans sanitaire pmr
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



212 Abaisser urinoir à 50cm
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




213 Remplacer les portes d'entrée a l'amphithéâtre par portes tierce x2
06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025



214 Contremarche et bande de vigilance et mobilier à retirer des escaliers et mettre place pmr
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



215 Contremarche, bande de vigilance partie haute et rallonger la courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



216 Poignée U, barre trop éloigné de la cuvette mettre en place une barre d'appui, et lave main dans
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



216 Poignée U, barre trop éloigné de la cuvette mettre en place une barre d'appui, et lave main dans
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



216 Poignée U, barre trop éloigné de la cuvette mettre en place une barre d'appui, et lave main dans
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



217 Abaisser urinoir à 50cm
02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



218

Descendre les patère 1,30 dans toutes les salles

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / STI / PAU_STI_00

Collège STEE
Batiment STID - 250ème
Rez de Chaussée
Campus de Pau Avenue de l'Université - BP 76 - 64012 Pau



GEA
GEOMETRE EXPERT
www.ge-a.com mel: CabinetGEA@ge-a.com
Bureau principal : 23 rue Faidherbe 46400 Saint-céré
Tél: 05.65.38.06.70 Fax: 05.65.38.08.20
mel: saint-cere@ge-a.com
Bureau secondaire : 18 rue Saint James 46000 Cahors
Tél: 05.65.35.01.36 mel: cahors@ge-a.com
Permanence le vendredi : 10 place Istrie 46220 Prayssac
Tél: 05 65 30 36 63 MEL: prayssac@ge-a.com


N/REF: PAU_STI_00
V/REF:
Echelle: 1/250

Date du 1er relevé: Mai 2011
Date d'édition: 11.12.2024
Système
X: Lambert 93 (CC43)
Y: Lambert 93 (CC43)
Z: Indépendant

Versions

n	Date	Pers. 1	Travaux	Pers. 2	Travaux
1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

L'AUTHENTICITE DE CE DOCUMENT EST ASSUREE PAR LA SIGNATURE DU GEOMETRE EXPERT

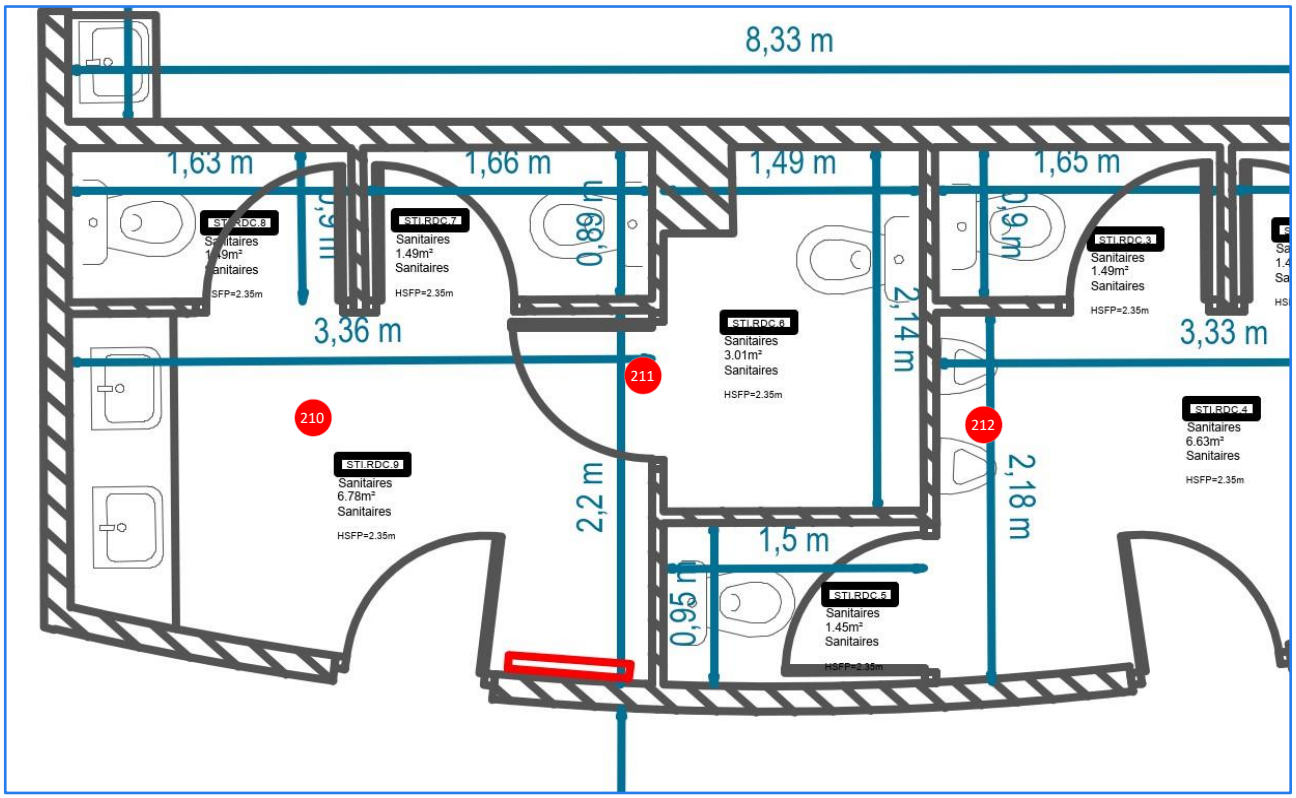
8,33 m
1,63 m
1,66 m
1,49 m
1,65 m
0,89 m
0,9 m
3,36 m
3,33 m
2,14 m
2,2 m
2,18 m
1,5 m
0,95 m
210
211
212
STI.RDC.8
Sanitaires
1.49m²
Sanitaires
HSFP=2.35m
STI.RDC.7
Sanitaires
1.49m²
Sanitaires
HSFP=2.35m
STI.RDC.8
Sanitaires
3.01m²
Sanitaires
HSFP=2.35m
STI.RDC.3
Sanitaires
1.49m²
Sanitaires
HSFP=2.35m
STI.RDC.4
Sanitaires
6.63m²
Sanitaires
HSFP=2.35m
STI.RDC.9
Sanitaires
6.78m²
Sanitaires
HSFP=2.35m
STI.RDC.5
Sanitaires
1.45m²
Sanitaires
HSFP=2.35m

UPPA / PAU / STI / PAU_STI_R01_200

Liste des non-conformités


N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
219	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	STI R+1	
220	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u, et lavabo pmr	STI R+1	
221	06 MENUISERIES INTERIEURES	Patères à prévoir de mettre à 1m30	STI R+1	
222	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance en partie haute et main courante	STI R+1	Largeur de passage : 1,4m Contre marche : 4,7 ml (nombre4) Garde corps prolongement : 3 ml (nombre 6) Bande de vigilance : 2,8 ml(nombre 2)
223	05 ASCENSEUR	Indicateur visuel absent	STI R+1	
224	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et bande de vigilance et rallonger la main courante	STI R+1	

Photographies des non-conformités




219 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025




220 Poignée u, et lavabo pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 26/03/2025



221 Patères à prévoir de mettre à 1m30

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 26/03/2025




222 Bande de vigilance en partie haute et main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025




223 Indicateur visuel absent

05 ASCENSEUR
Date butoir : 26/03/2025



224 Contremarche et bande de vigilance et rallonger la main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



224 Contremarche et bande de vigilance et rallonger la main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025

Plan - UPPA / PAU / STI / PAU_STI_R01_200



UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
245	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique accès handicapés absent	Extérieur	
398	05 VRD	Place PME : ajout signalisation verticale et peinture de sol	Parking Canoé	
399	05 VRD	Place PMR :	Parking LET	Défrichage, pose de signalisation verticale et de peinture de sol
400	05 VRD	Place PMR :	Parking LET	Défrichage et reprise de l'accès au cheminement
401	05 VRD	Place PMR :	Parking LET	Signalisation verticale et peinture de sol
402	05 VRD	voirie	Parking LET	Création de bateau pour l'accès au place PMR
403	05 VRD	Place PME : ajout signalisation verticale et peinture de sol	Parking DEG	ajout signalisation verticale et peinture de sol
404	05 VRD	Acces	Parking DEG	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
405	05 VRD	Place PMR :	Parking DEG	Peinture de sol
406	05 VRD	Place PMR :	Parking STI	ajout signalisation verticale et peinture de sol
407	05 VRD	Acces	Parking STI	AJOUT DE BANDE D'ORIENTATIONET REPRISE DU RESSAUT AU NIVEAU DE TROTTOIR
408	05 VRD	Acces	Parking MDE	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
409	05 VRD	Place PMR :	Parking MDE	ajout signalisation verticale et peinture de sol
410	05 VRD	REVETEMENT DE SOL	Parking MDE	Reprise de l'enrobé
411	05 VRD	Place PMR :	Parking PRE	ajout signalisation verticale et peinture de sol
412	05 VRD	Acces	Parking PRE	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
413	05 VRD	Acces	Entrée Sud	Pose d'éclairage et de bordure périphérique
414	05 VRD	Acces	Entrée Sud	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
415	05 VRD	Place PMR :	Parking Sciences	ajout signalisation verticale et peinture de sol
416	05 VRD	Place PMR :	Parking Sciences	peinture de sol
417	05 VRD	cheminement	Palassou	Réfection du cheminement
418	05 VRD	Place PMR :	Palassou	ajout signalisation verticale et peinture de sol
419	05 VRD	cheminement	Palassou	Réfection du cheminement
420	05 VRD	cheminement	Palassou	Réfection du cheminement
421	05 VRD	Acces	B1	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
422	05 VRD	cheminement	B1	Réfection du cheminement
423	05 VRD	cheminement	B2	Réfection du cheminement
424	05 VRD	cheminement	B3	Réfection du cheminement
425	05 VRD	Place PMR :	Bâtiment Sciences	peinture de sol
426	05 VRD	cheminement	BUP	Réfection du cheminement
427	05 VRD	Acces	PRE	
428	05 VRD	Acces	B2	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
429	05 VRD	Place PMR :	IBEAS	peinture de sol
430	05 VRD	Place PMR :	HDS	ajout signalisation verticale et peinture de sol
431	05 VRD	cheminement	HDS	AJOUT DE BANDE D'ORIENTATION
432	05 ASCENSEUR	création EPMR	HDS	Création d'un EPMR
433	05 VRD	Place PMR :	LAV	Création de place PMR
434	05 VRD	Acces	LAV	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
435	05 VRD	cheminement	LAV	AJOUT DE BANDE D'ORIENTATION

Photographies des non-conformités



245 Signalétique accès handicapés absent

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 26/03/2025



398 Place PME : ajout signalisation verticale et peinture de sol

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



399 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



400 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



400 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



401 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



401 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



402 voirie

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



404 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



405 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



406 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



407 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



408 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



410 REVETEMENT DE SOL

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




411 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



412 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



413 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



413 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



413 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



414 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



415 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



416 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



416 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



417 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



418 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



419 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




420 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



421 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




422 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



423 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



424 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



426 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



427 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



428 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




429 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



430 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



431 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



431 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



431 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




431 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




432 création EPMR


05 ASCENSEUR
Date butoir : 15/07/2025

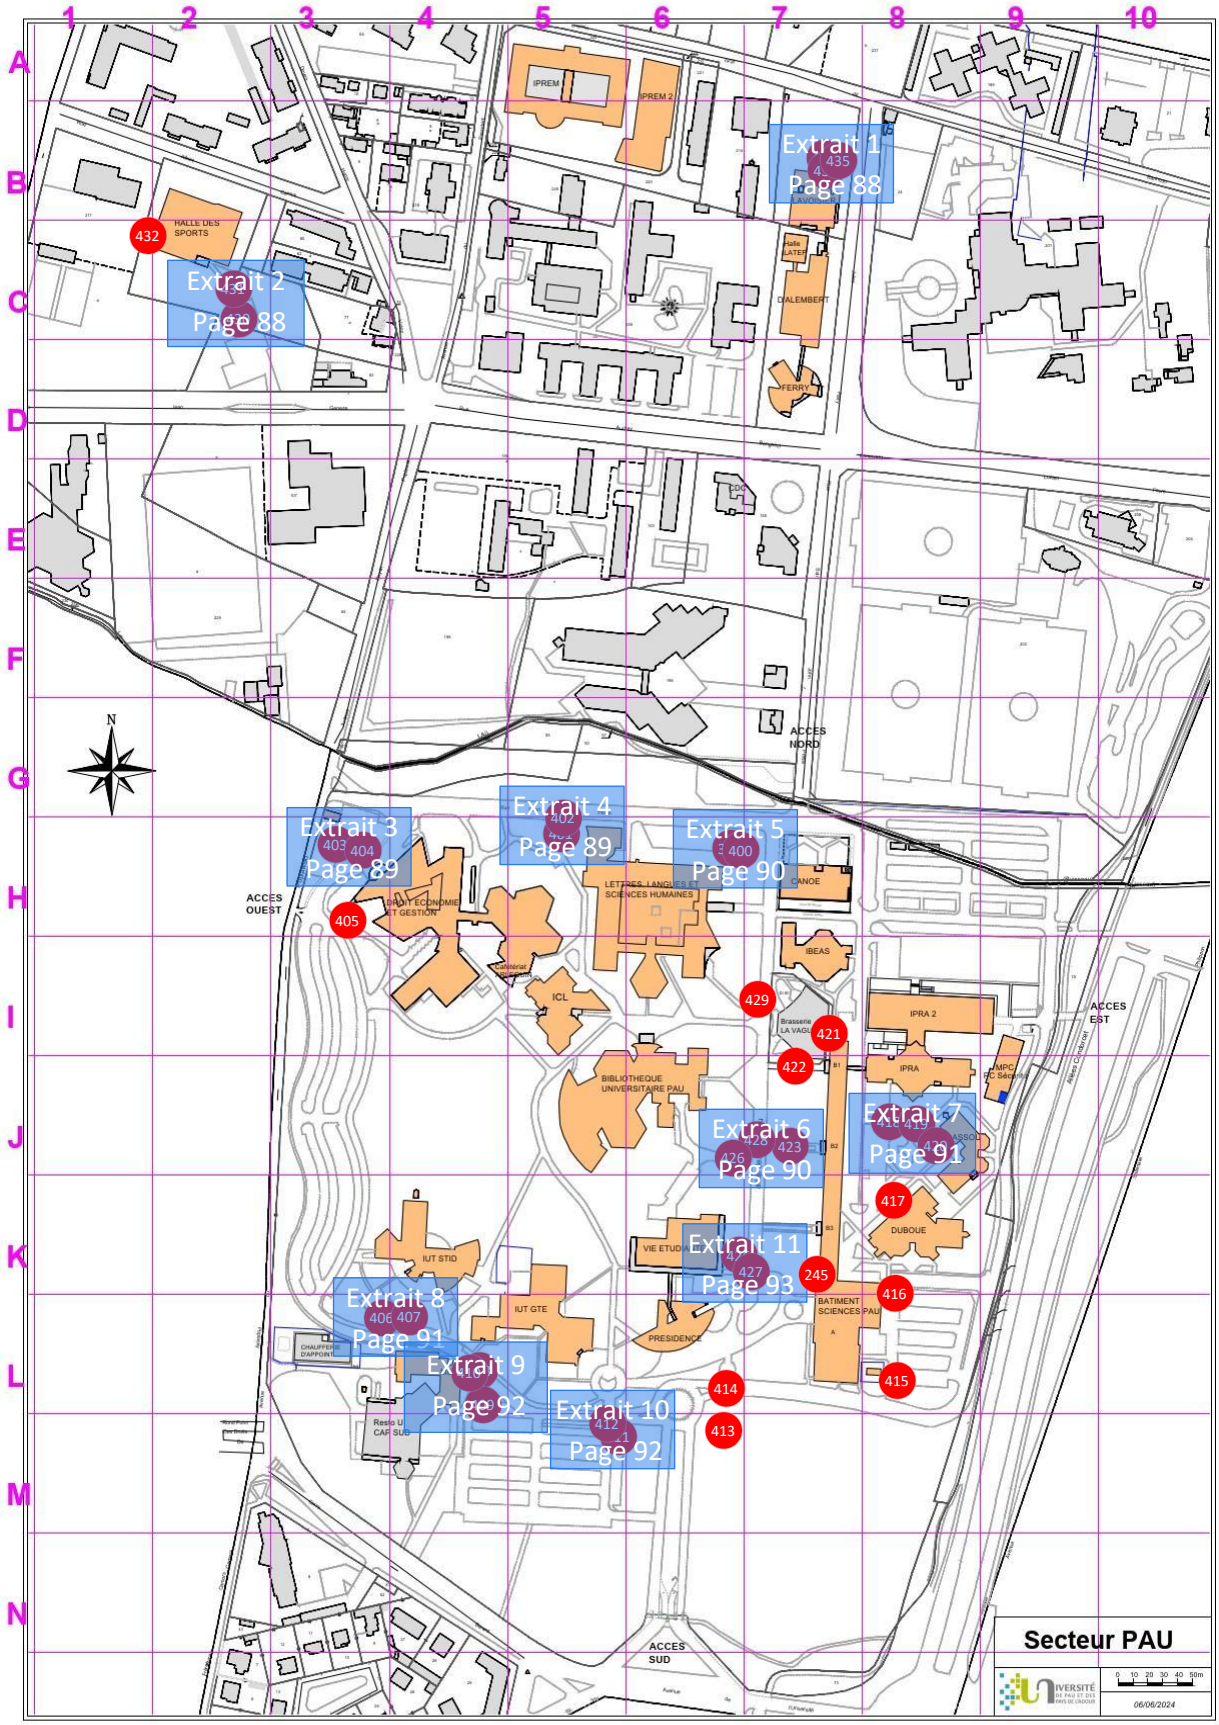
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Extrait 1
Page 88
Extrait 2
Page 88
Extrait 3
Page 89
Extrait 4
Page 89
Extrait 5
Page 90
Extrait 6
Page 90
Extrait 7
Page 91
Extrait 8
Page 91
Extrait 9
Page 92
Extrait 10
Page 92
Extrait 11
Page 93
ACCES NORD
ACCES OUEST
ACCES EST
ACCES SUD
IPREM
IPREM 2
HALLE DES SPORTS
D'ALEMBERT
FERRY
LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
IBEAS
ICL
IPRA 2
IPRA
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE PAU
DUBOUE
IUT STID
IUT GTE
PRESIDENCE
BATIMENT SCIENCES PAU
Secteur PAU
06/06/2024


Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 1

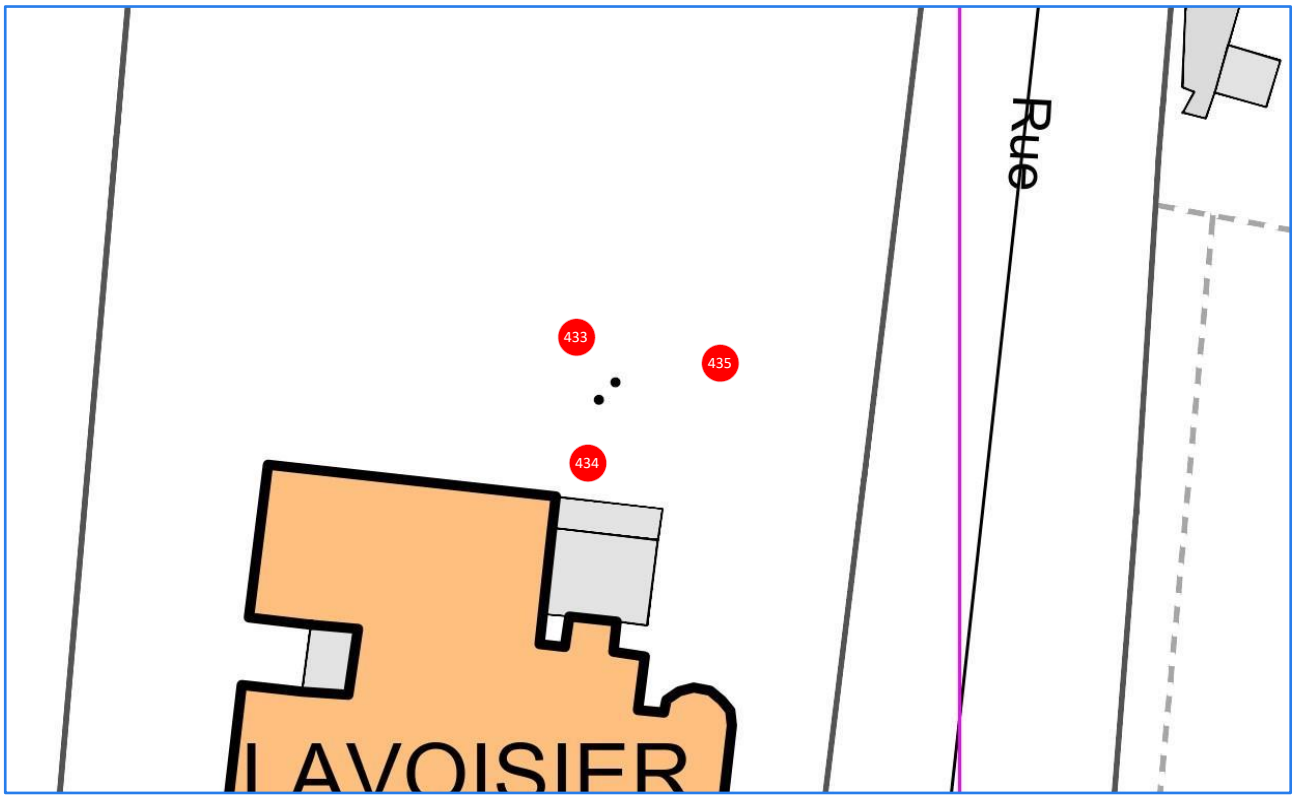


Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 2

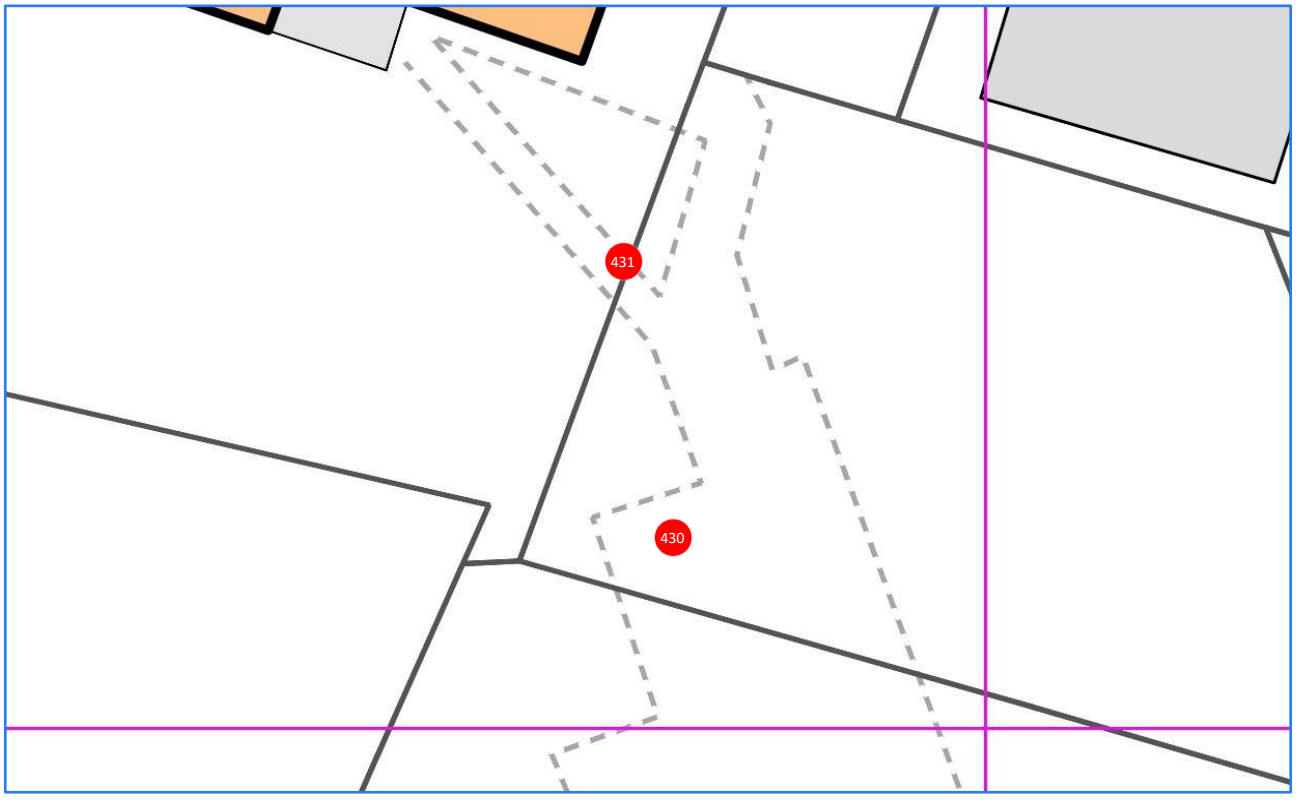


Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 3

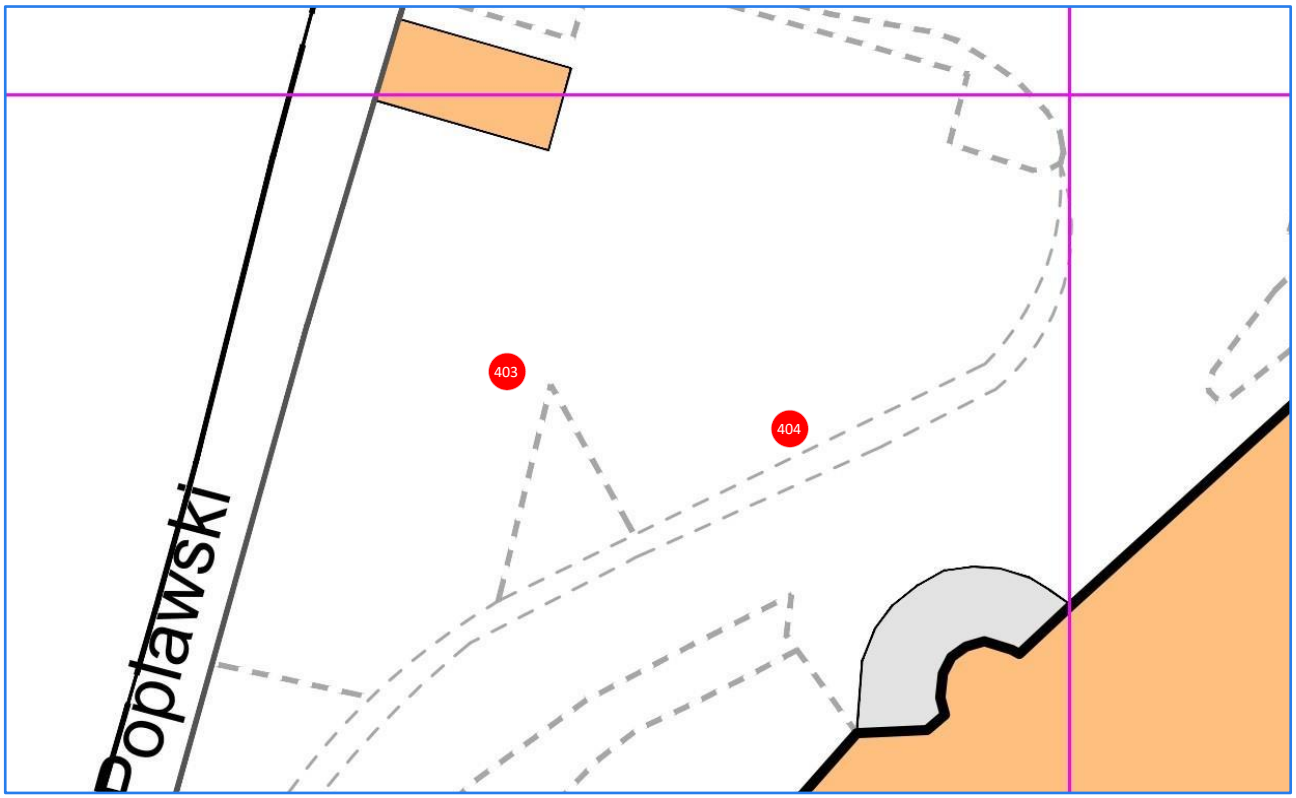


Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 4

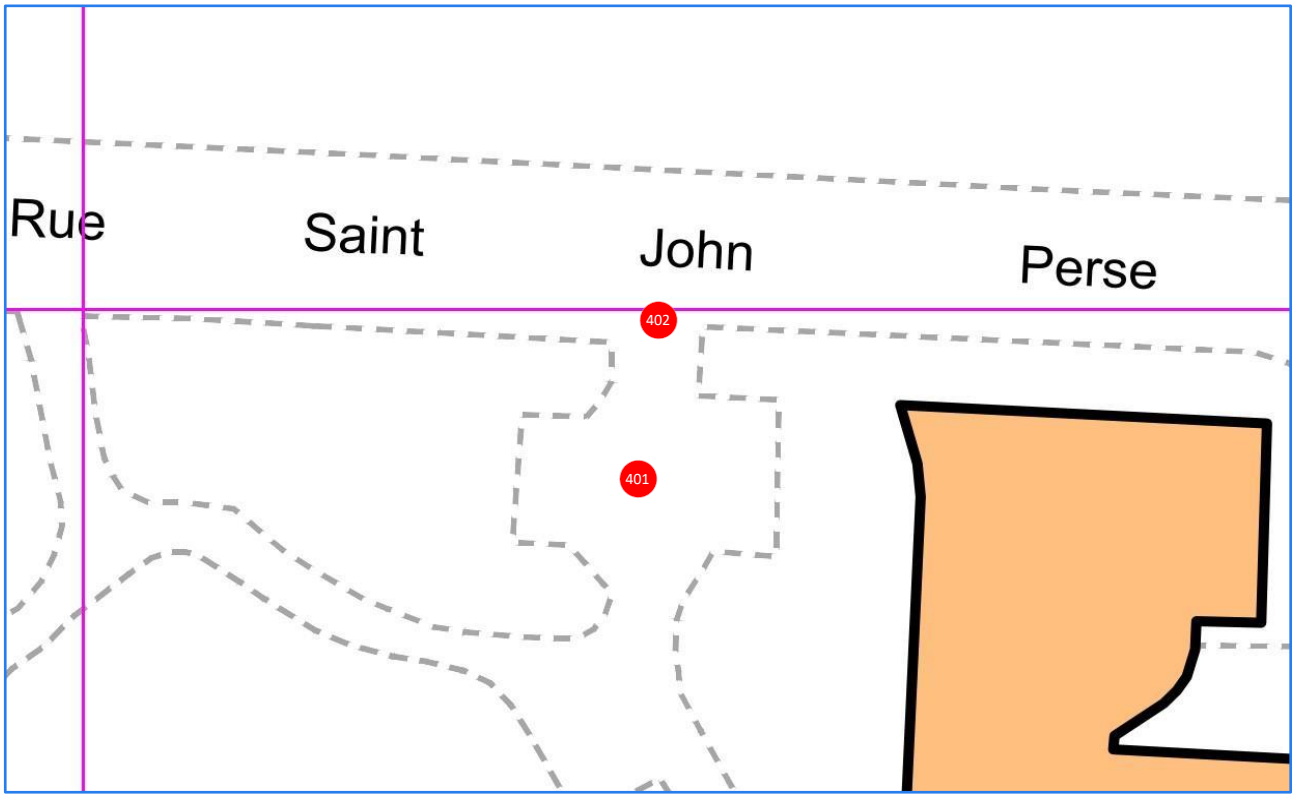


Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 5

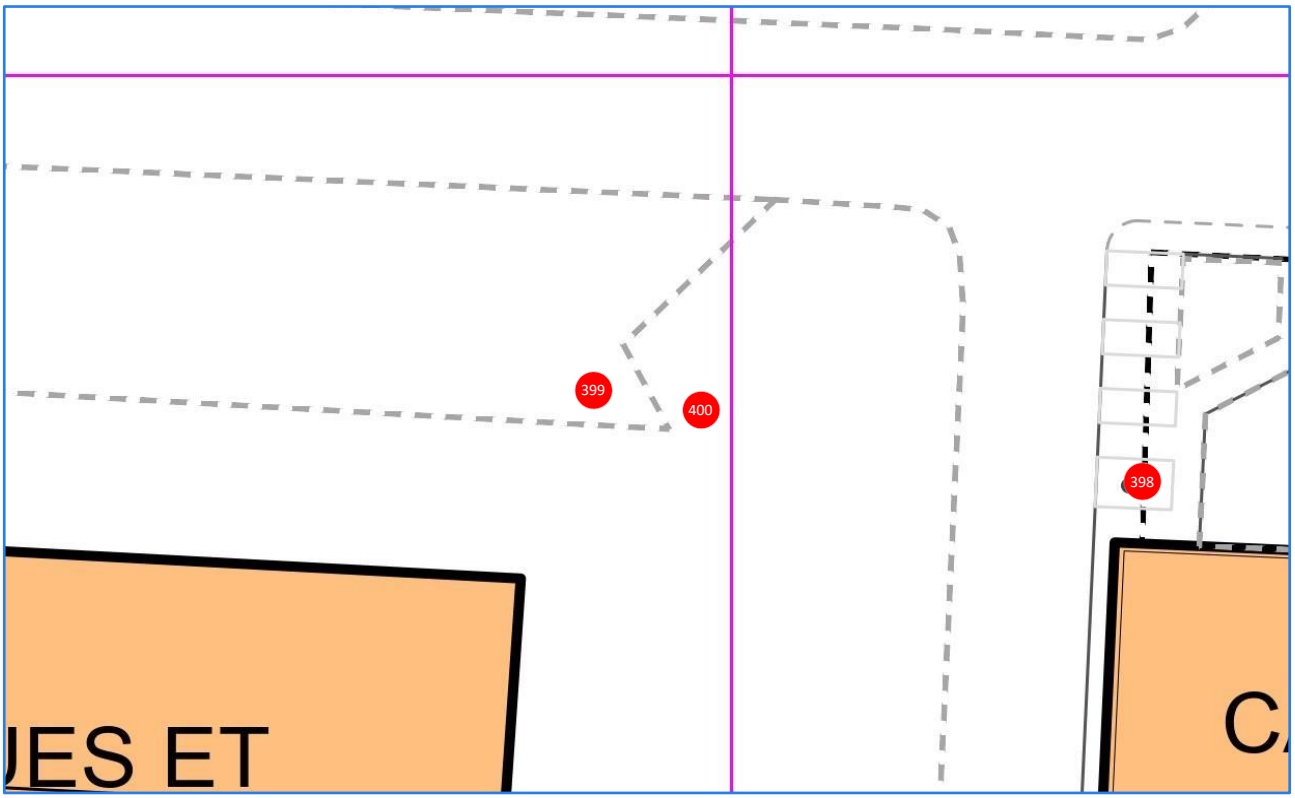


Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 6

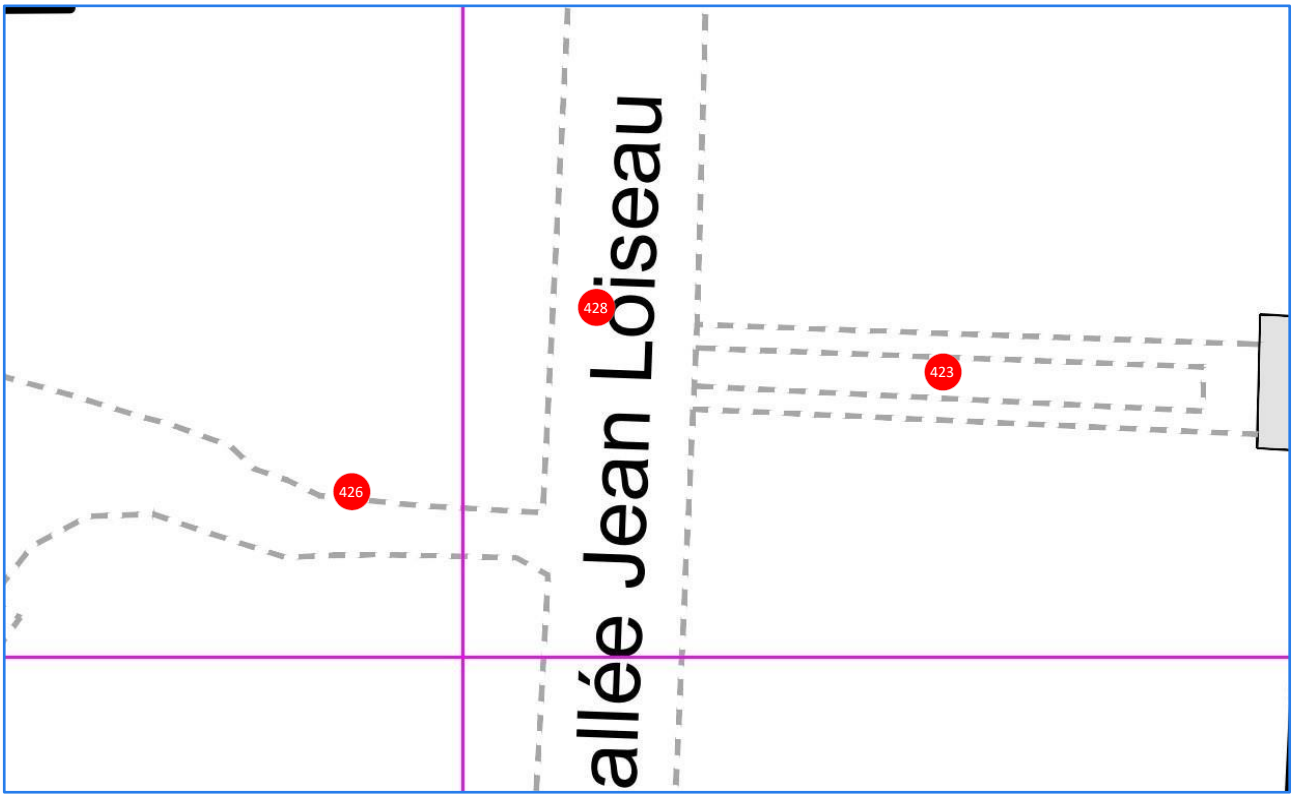


Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 7

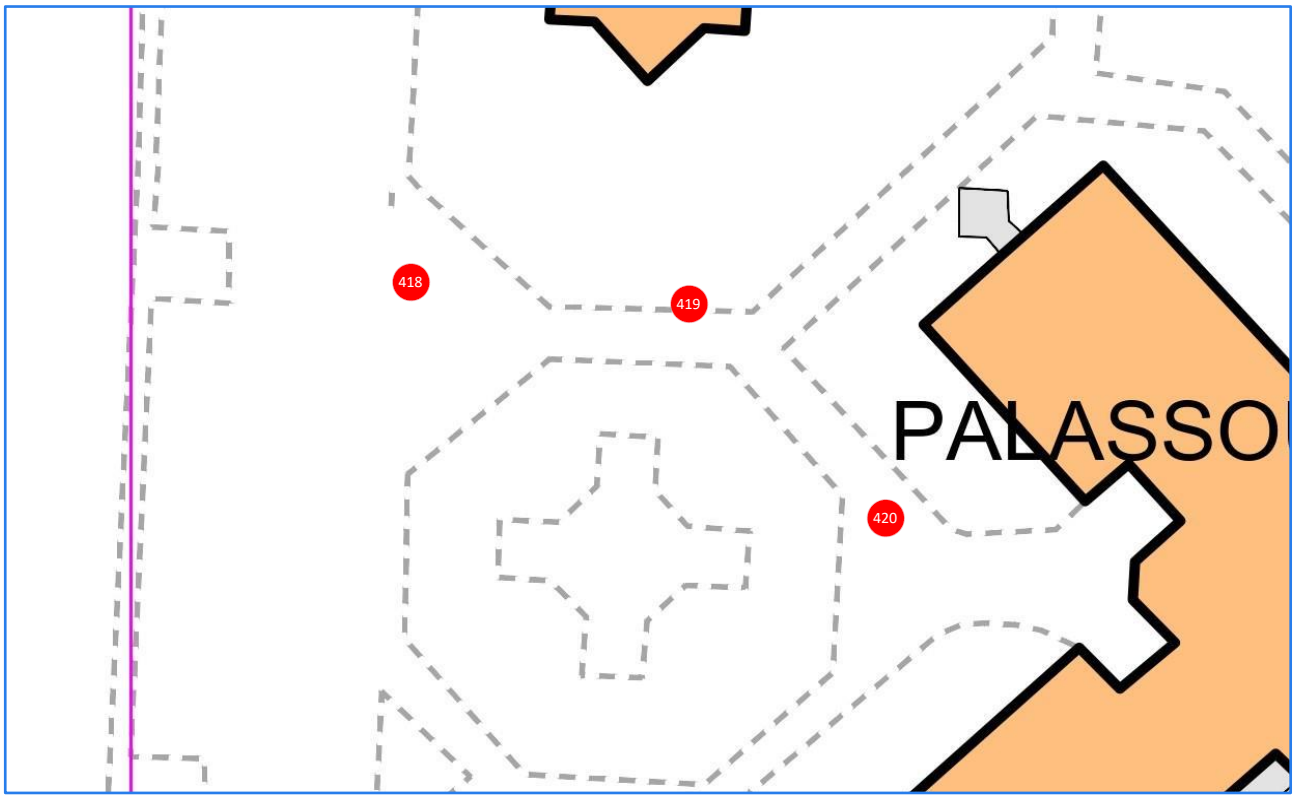


Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 8

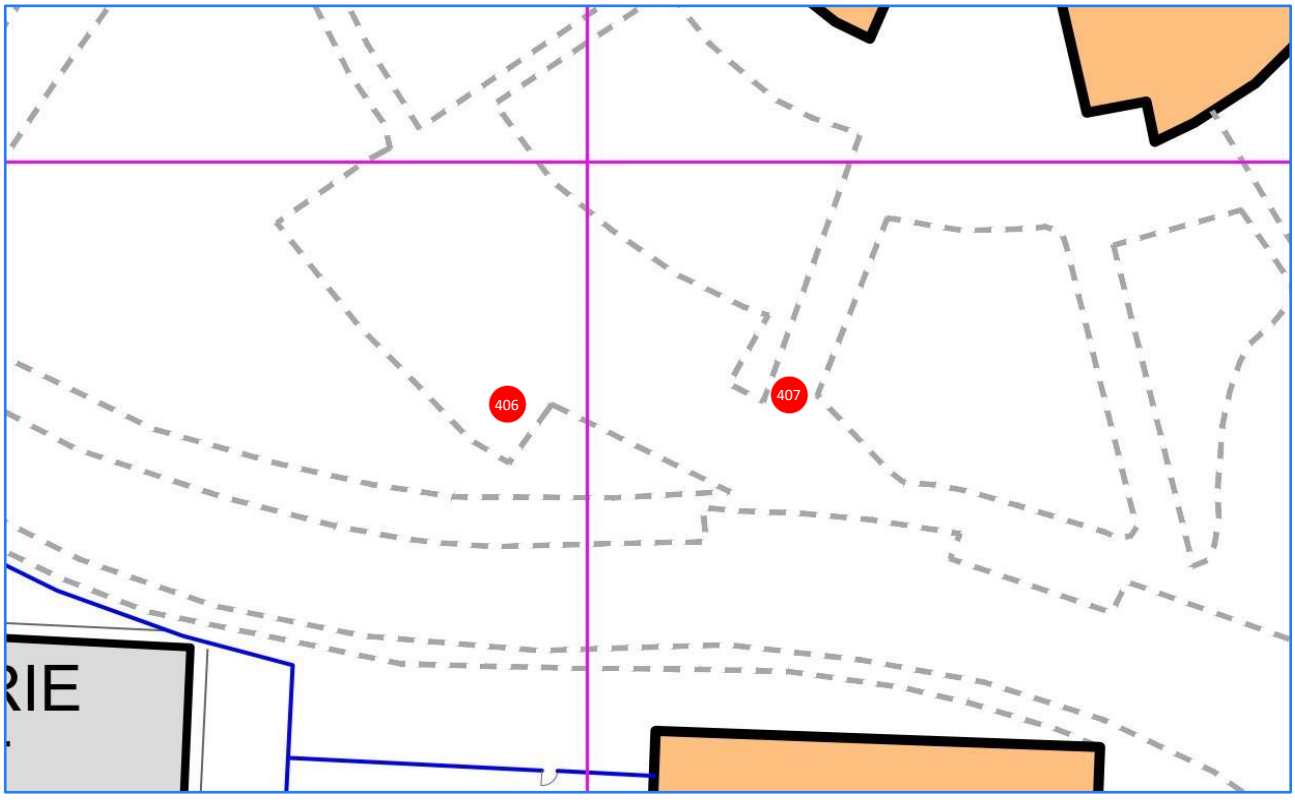


Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 9

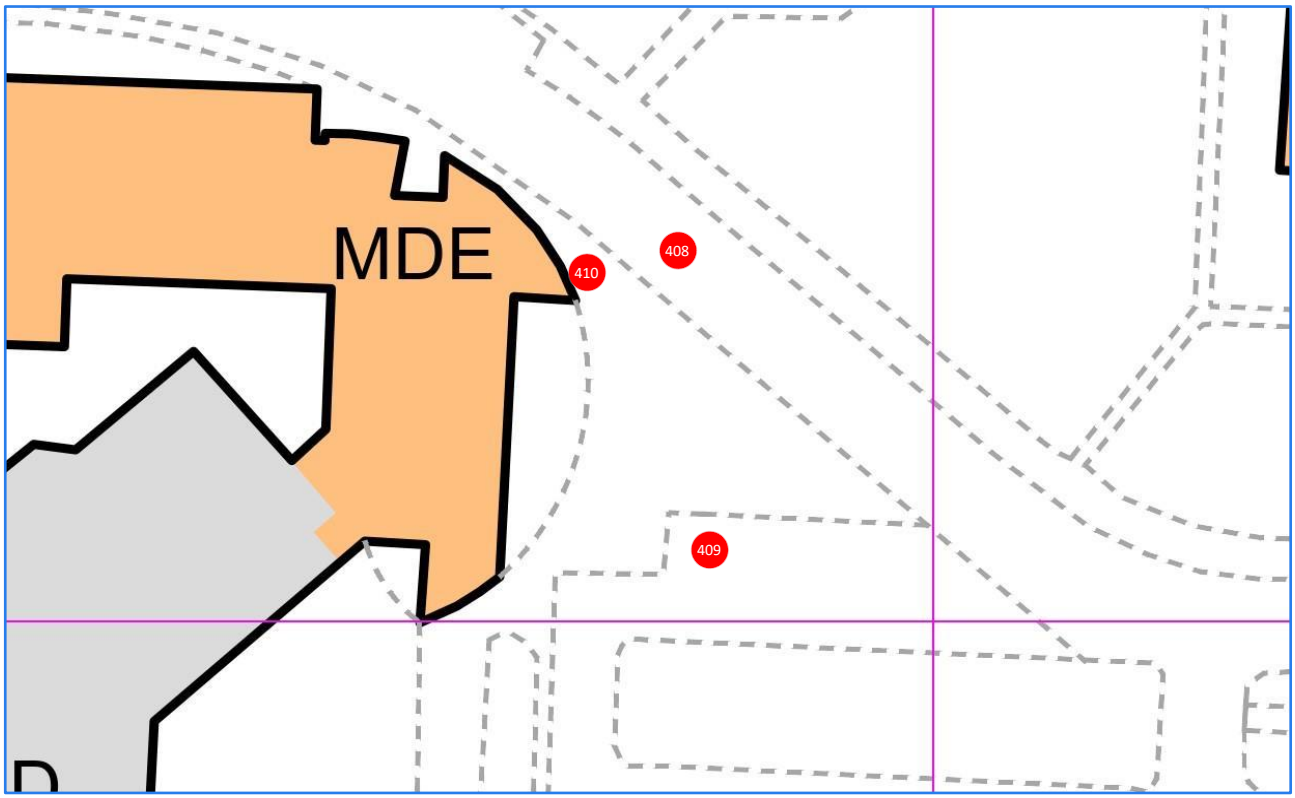

Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 10

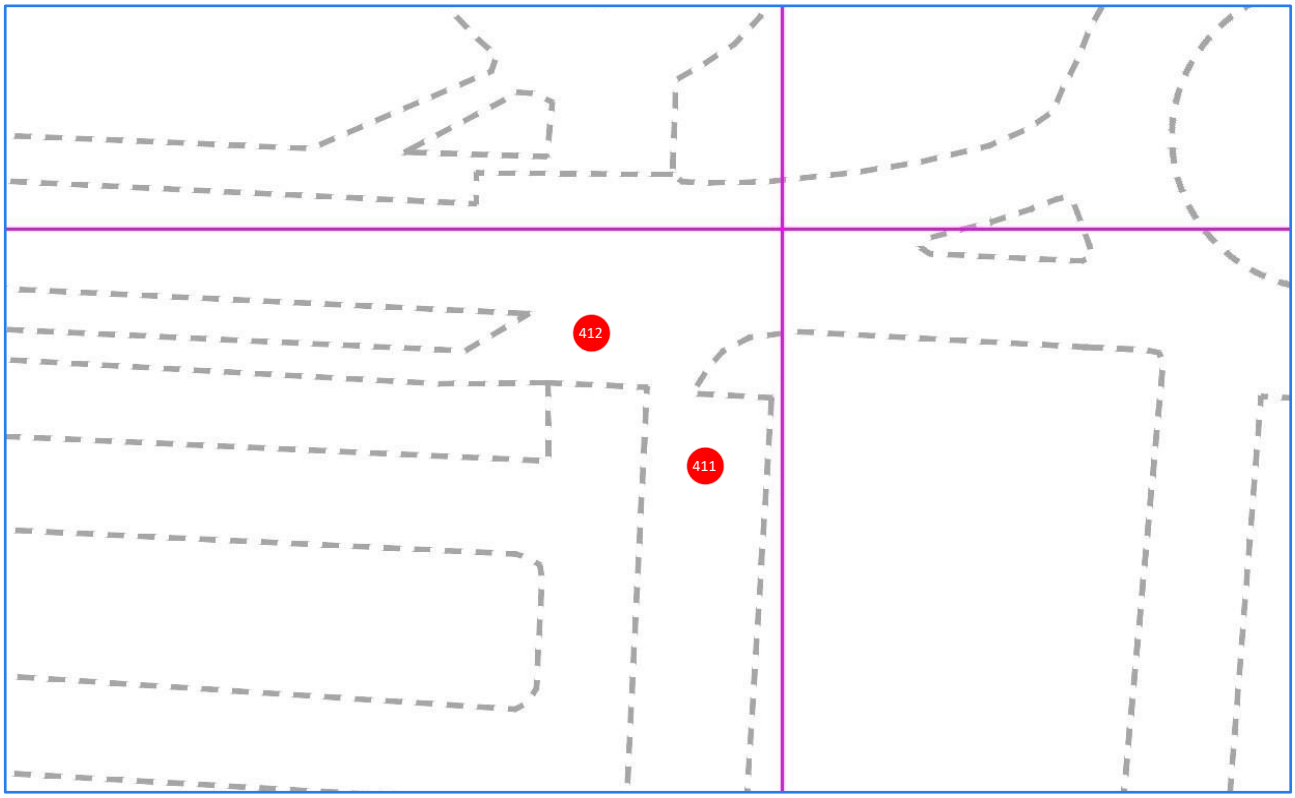

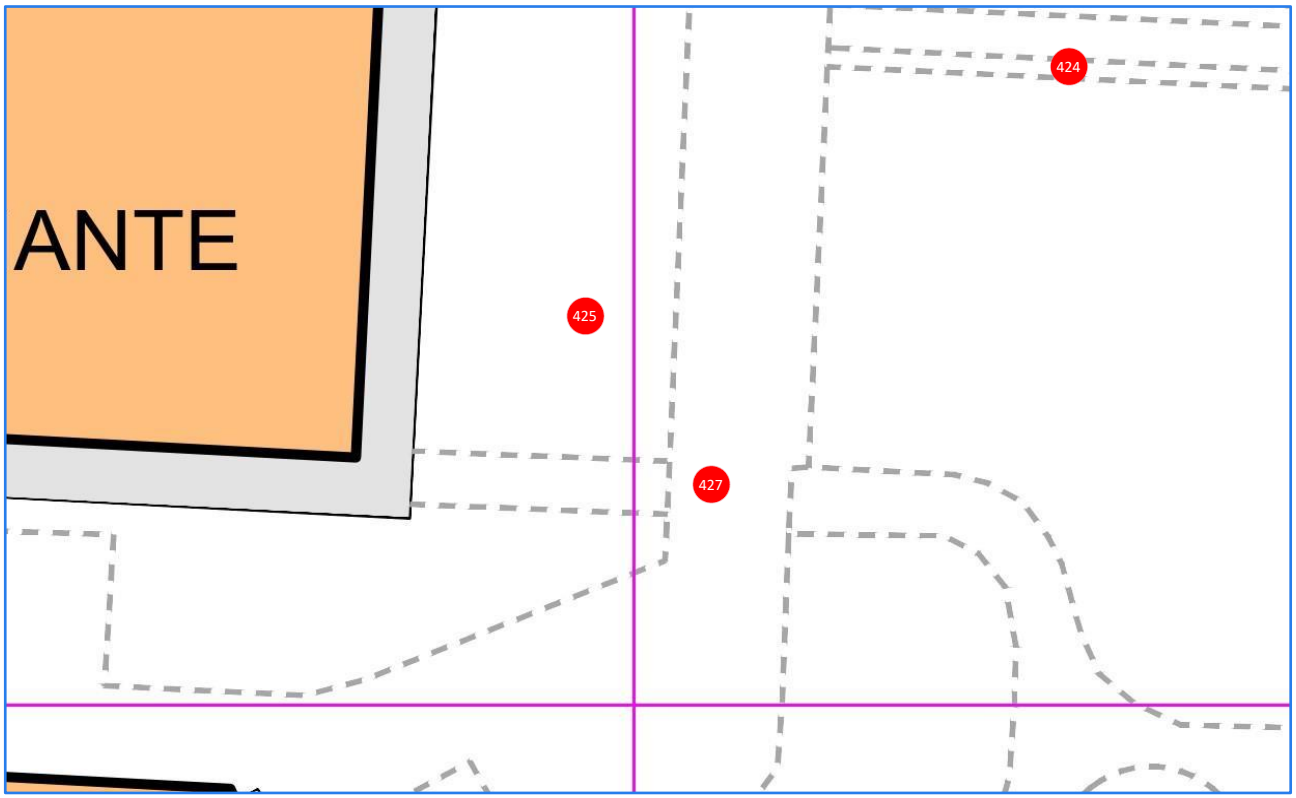
ANTE
424
425
427
