Mise en accessibilité des 5 campus Université de Pau et des Pays de l'Adour

Campus de Mont de Marsan

371 Rue du Ruisseau, 40000 Mont-de-Marsan

Constat de non conformités par localisation

- Constat à traiter
- Constat pris en charge par la Moa
- Constat déjà traité ou soumis à dérogation

UPPA / MDM / BIO / MTM_BIO_00


Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
31	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Peinture marche, contremarche, rallonger les mains courantes, mise en place de bandes antidérapantes	BIO RDC	Largeur de passage : 1,83m Bande antidérapante : 55 ml (nombre 30) Contre marche : 4 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1,8 ml (nombre 1)
32	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur portes du hall	BIO RDC	
33	05 ASCENSEUR	Signalétique, indication ascenseur, inexistante	BIO RDC	
34	06 MENUISERIES INTERIEURES	Aucune paillasse pour personnes handicapées	BIO RDC	A la charge de la MOA
35	06 MENUISERIES INTERIEURES	Aucune paillasse pour personnes handicapées	BIO RDC	A la charge de la MOA
36	06 MENUISERIES INTERIEURES	Aucune paillasse pour personnes handicapées	BIO RDC	A la charge de la MOA
37	06 MENUISERIES INTERIEURES	Mettre en place des patères à 1,30 m	BIO RDC	
38	06 MENUISERIES INTERIEURES	Pas paillasse, handicapé et mettre en place des patères à 1,30 m	BIO RDC	A la charge de la MOA
39	06 MENUISERIES INTERIEURES	Pas de paillasse handicapé et mettre en place une patère 1,30 m	BIO RDC	A la charge de la MOA
40	06 MENUISERIES INTERIEURES	Pas de paillasse pour personne handicapé	BIO RDC	A la charge de la MOA
41	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Sanitaire handicapé non conforme	BIO RDC	
42	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre en place un urinoir à 50 cm	BIO RDC	
43	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Visuel du sanitaire homme pour création d'un wc handicapé	BIO RDC	
44	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Prévois un réaménagement complet des sanitaires pour création de WC, handicapés	BIO RDC	
45	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Mettre en place des nez de marche, antidérapant, peinture, des contremarche, une main courante et une bande de vigilance	BIO RDC	Largeur de passage : 4,8m Bande antidérapante : 29 ml (nombre 6) Contre marche : 10 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 4,8 ml (nombre 1) X 2
46	05 ASCENSEUR	Mettre en place un indicateur visuel et sonore	BIO RDC	
47	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacer les quatre portes de l'accès à l'amphithéâtre 145x205	BIO RDC	
48	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Prévois la signalisation pour place handicapé	BIO RDC	
49	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Mise en place d'une boucle magnétique	BIO RDC	A la charge de la MOA
50	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Prévoir le remplacement de la porte	BIO RDC	
495	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur portes du hall	BIO RDC	
496	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur portes du hall	BIO RDC	
498	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	BIO RDC	

Photographies des non-conformités



31 Peinture marche, contremarche, rallonger les mains courantes, mise en place de bandes
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



32 Signalétique sur portes du hall

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



33 Signalétique, indication ascenseur, inexistante

05 ASCENSEUR



34 Aucune paillasse pour personnes handicapées

06 MENUISERIES INTERIEURES




35 Aucune paillasse pour personnes handicapées

06 MENUISERIES INTERIEURES



36 Aucune paillasse pour personnes handicapées

06 MENUISERIES INTERIEURES



37 Mettre en place des patères à 1,30 m

06 MENUISERIES INTERIEURES



38 Pas paillasse, handicapé et mettre en place des patères à 1,30 m
06 MENUISERIES INTERIEURES



38 Pas paillasse, handicapé et mettre en place des patères à 1,30 m
06 MENUISERIES INTERIEURES



39 Pas de paillasse handicapé et mettre en place une patère 1,30 m
06 MENUISERIES INTERIEURES



39 Pas de paillasse handicapé et mettre en place une patère 1,30 m
06 MENUISERIES INTERIEURES



40 Pas de paillasse pour personne handicapé

06 MENUISERIES INTERIEURES



41 Sanitaire handicapé non conforme

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



42 Mettre en place un urinoir à 50 cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



43 Visuel du sanitaire homme pour création d'un wc handicapé

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



43 Visuel du sanitaire homme pour création d'un wc handicapé

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



43 Visuel du sanitaire homme pour création d'un wc handicapé

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



43 Visuel du sanitaire homme pour création d'un wc handicapé

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



44 Prévois un réaménagement complet des sanitaires pour création de WC, handicapés
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



44 Prévois un réaménagement complet des sanitaires pour création de WC, handicapés
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



44 Prévois un réaménagement complet des sanitaires pour création de WC, handicapés
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



44 Prévois un réaménagement complet des sanitaires pour création de WC, handicapés
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



45 Mettre en place des nez de marche, antidérapant, peinture, des contremarche, une main
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



46 Mettre en place un indicateur visuel et sonore

05 ASCENSEUR



47 Remplacer les quatre portes de l'accès à l'amphithéâtre 145x205

06 MENUISERIES INTERIEURES



47 Remplacer les quatre portes de l'accès à l'amphithéâtre 145x205

06 MENUISERIES INTERIEURES



48 Prévois la signalisation pour place handicapé

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



49 Mise en place d'une boucle magnétique


03 ELECTRICITE CFO/CFA



50 Prévoir le remplacement de la porte


07 MENUISERIES EXTERIEURES

Plan - UPPA / MDM / BIO / MTM_BIO_00

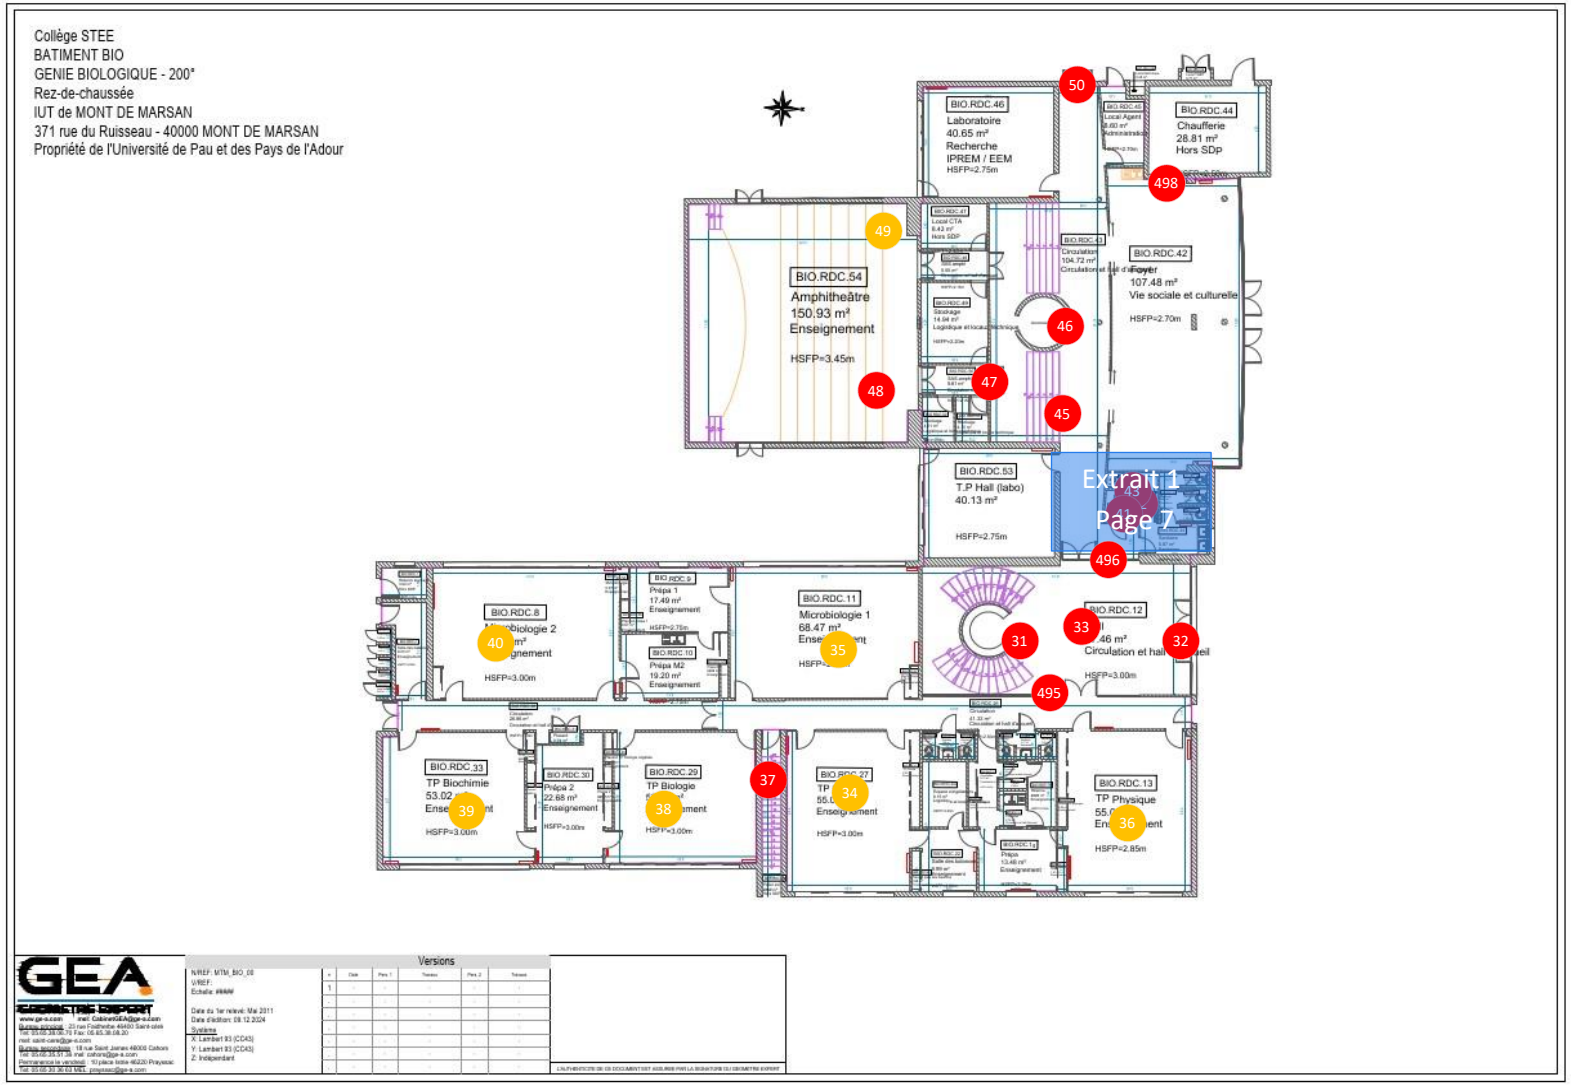

Plan - UPPA / MDM / BIO / MTM_BIO_00 - Extrait 1



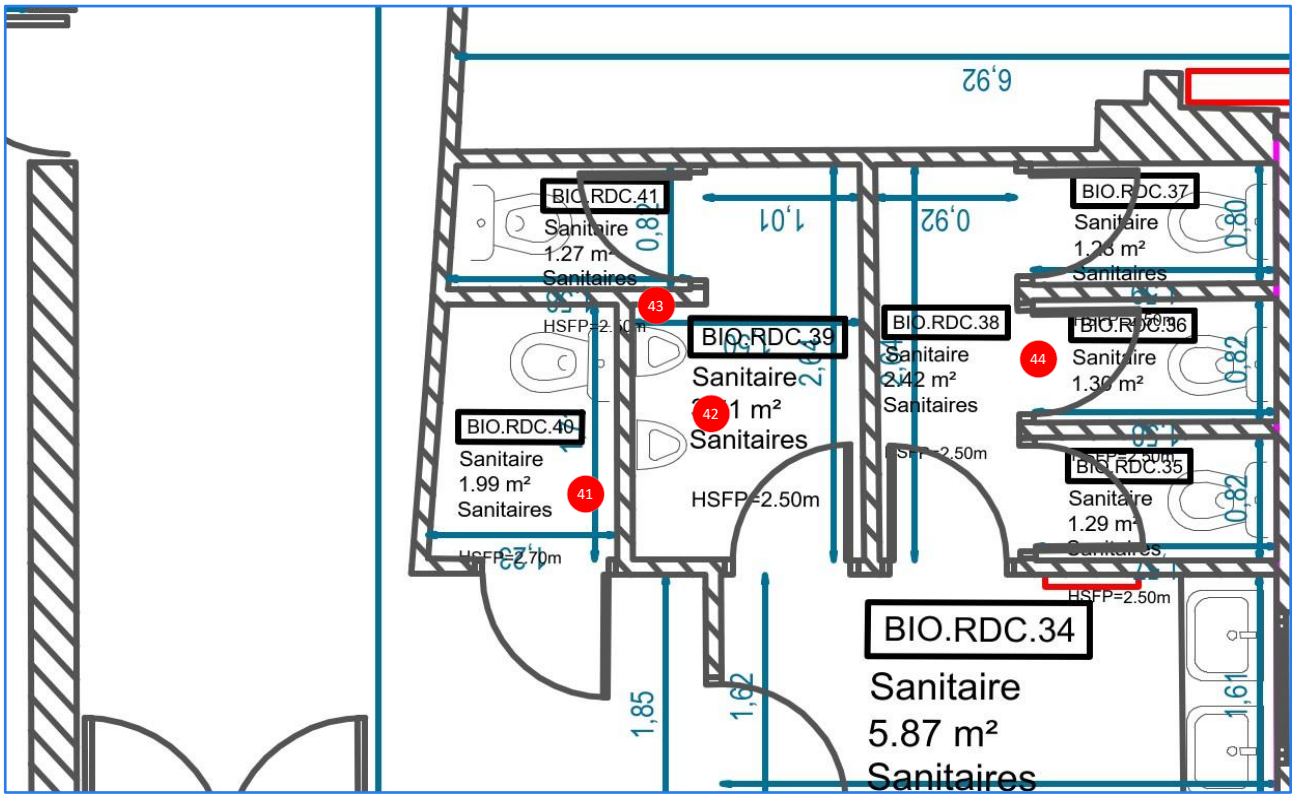

UPPA / MDM / BIO / MTM_BIO_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
25	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Mettre en place une porte tierce existant 150x220	BIO R+1	
26	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacer la porte Salle informatique 146x205	BIO R+1	
27	02 PLOMBERIE-SANITAIRE		BIO R+1	Mettre en place une poignée U pour fermeture de porte, remplacer le lave main par un adapté handicapé et remplacer la barre d'appui. Abaisser miroir
28	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Mettre en place pictogramme handicapé	BIO R+1	
29	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonger les mains courantes et mettre en place une bande de visibilité	BIO R+1	
30	05 ASCENSEUR	Vérifier la conformité de la largeur de l'accès à l'ascenseur qui est de 83 cm, mise en place d'un indicateur visuel et sonore	BIO R+1	
499	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	BIO R+1	
500	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	BIO R+1	
501	06 MENUISERIES INTERIEURES	Ajout de patères à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m	BIO R+1	

Photographies des non-conformités



25 Mettre en place une porte tierce existant 150x220
07 MENUISERIES EXTERIEURES



26 Remplacer la porte Salle informatique 146x205
06 MENUISERIES INTERIEURES



27 02 PLOMBERIE-SANITAIRE



27 02 PLOMBERIE-SANITAIRE



27 02 PLOMBERIE-SANITAIRE



28 Mettre en place pictogramme handicapé
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




29 Rallonger les mains courantes et mettre en place une bande de visibilité
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



30 Vérifier la conformité de la largeur de l'accès à l'ascenseur qui est de 83 cm, mise en place
05 ASCENSEUR

Plan - UPPA / MDM / BIO / MTM_BIO_01

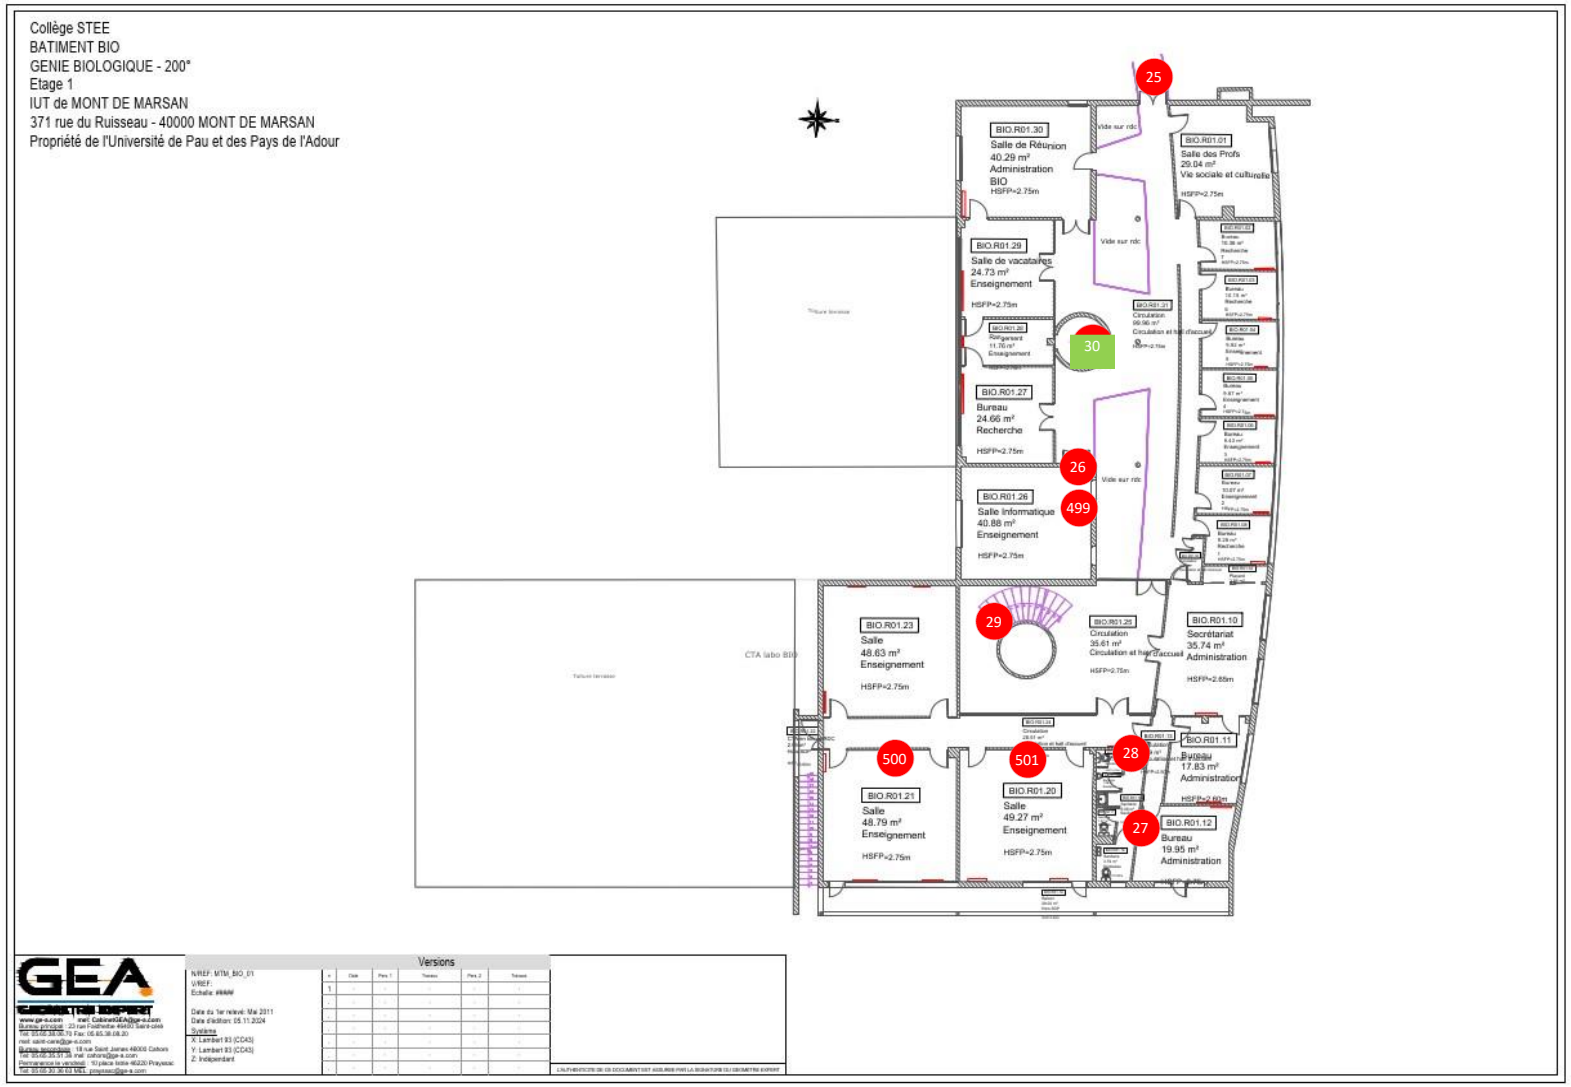

UPPA / MDM / HTB / MTM_HTB_RDC

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
51	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Mise en place du pictogramme pmr	HTB RDC	
52	06 MENUISERIES INTERIEURES	Abaisser patère à 1m30	HTB RDC	
53	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Mettre en place une barre de vertical	HTB RDC	
54	06 MENUISERIES INTERIEURES	Prévoir réaménagement de la salle pour permettre une personne handicapée de circuler	HTB RDC	A la charge de la MOA
55	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Mettre en place signalisation, entrée du bâtiment	HTB RDC	

Photographies des non-conformités



51 Mise en place du pictogramme pmr

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



52 Abaisser patère à 1m30

06 MENUISERIES INTERIEURES



53 Mettre en place une barre de vertical

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



54 Prévoir réaménagement de la salle pour permettre une personne handicapée de circuler


06 MENUISERIES INTERIEURES



55 Mettre en place signalisation, entrée du bâtiment

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER

Plan - UPPA / MDM / HTB / MTM_HTB_RDC

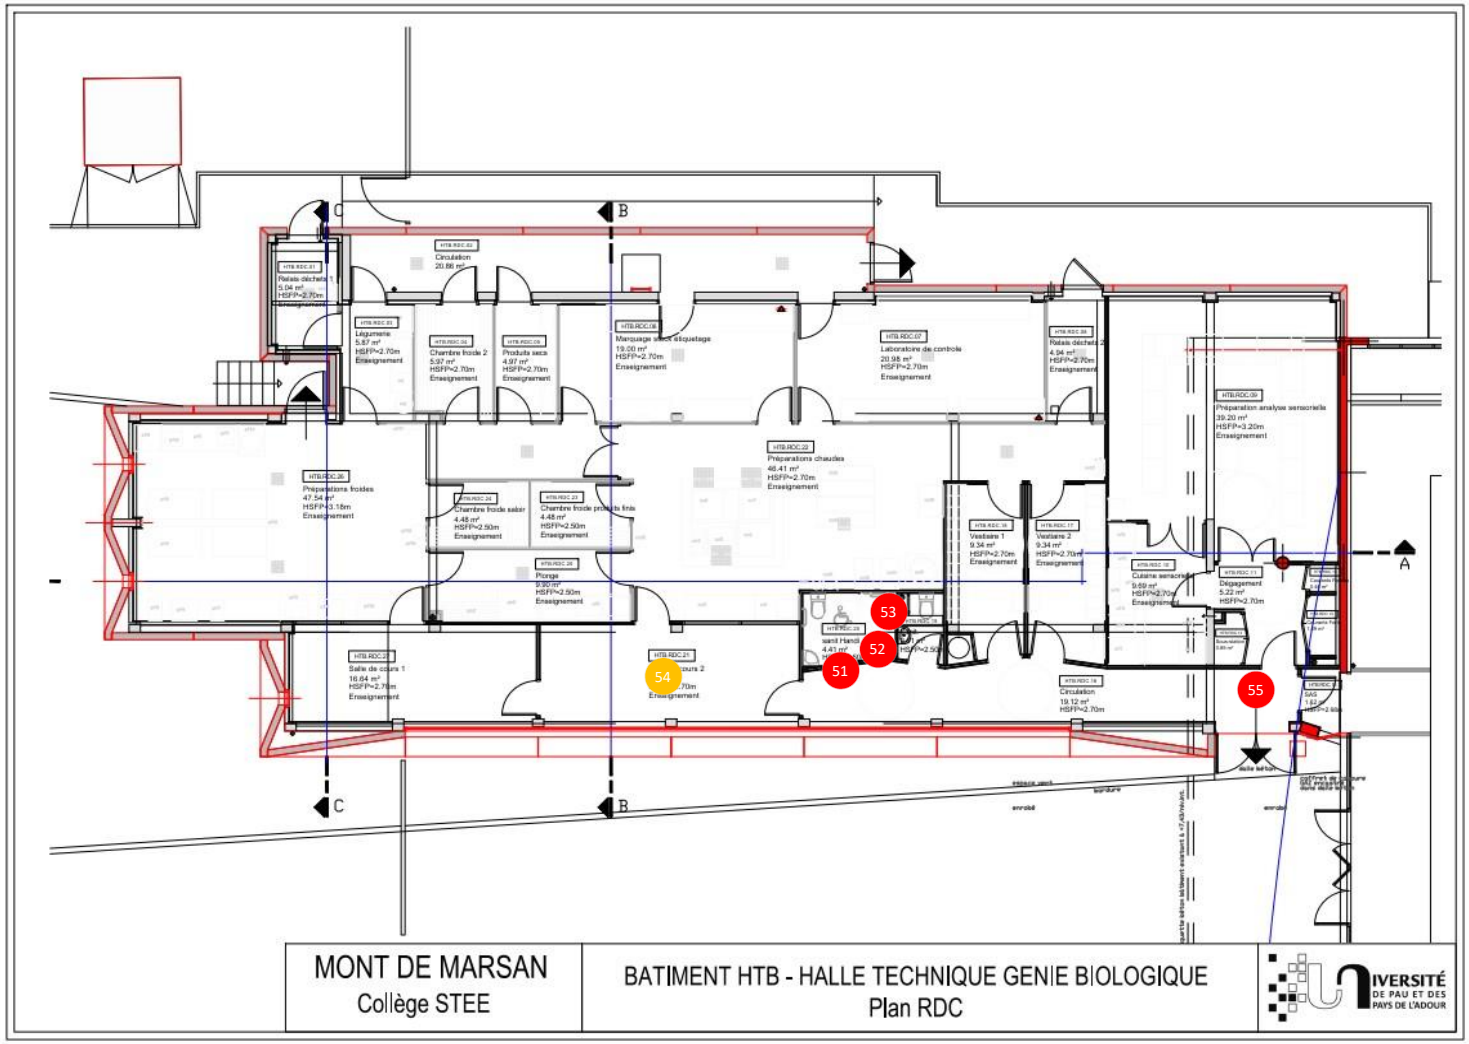

UPPA / MDM / HTM / MTM_HTM_RDC

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
82	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Mettre en place une signalétique sur les portes	HTM RDC	
83	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Mettre en place une barre verticale	HTM RDC	
84	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique inexistante sur douche	HTM RDC	
85	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Mise en place d'un pictogramme pmr	HTM RDC	

Photographies des non-conformités



82 Mettre en place une signalétique sur les portes

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



83 Mettre en place une barre verticale

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



84 Signalétique inexistante sur douche


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




85 Mise en place d'un pictogramme pmr


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER

Plan - UPPA / MDM / HTM / MTM_HTM_RDC

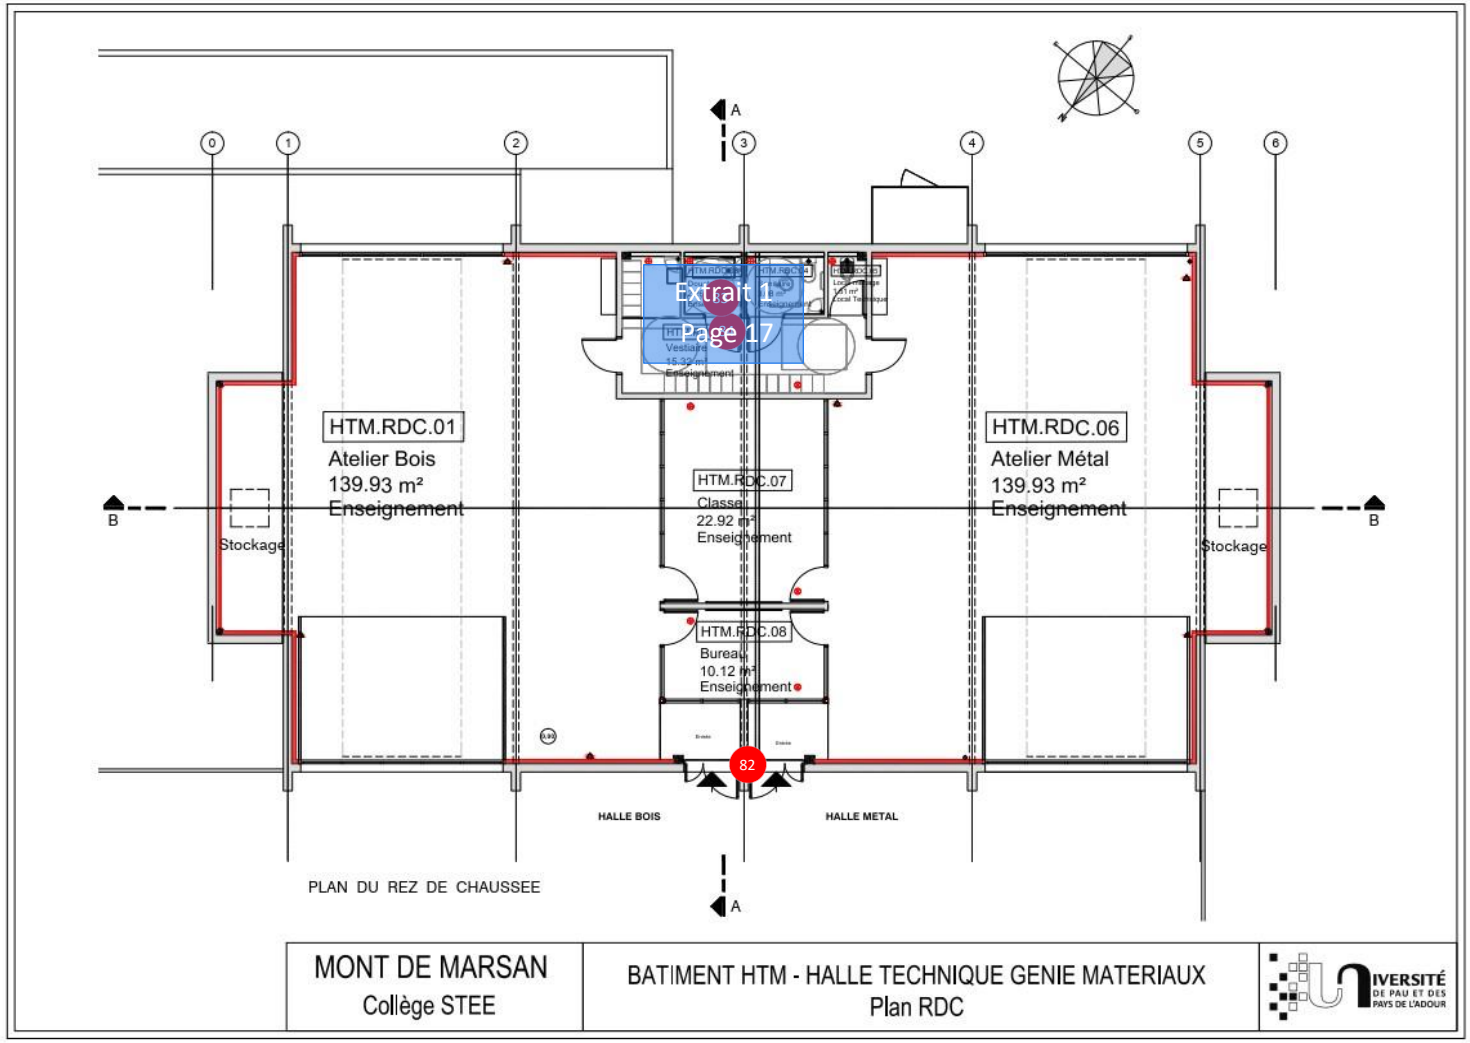

Plan - UPPA / MDM / HTM / MTM_HTM_RDC - Extrait 1



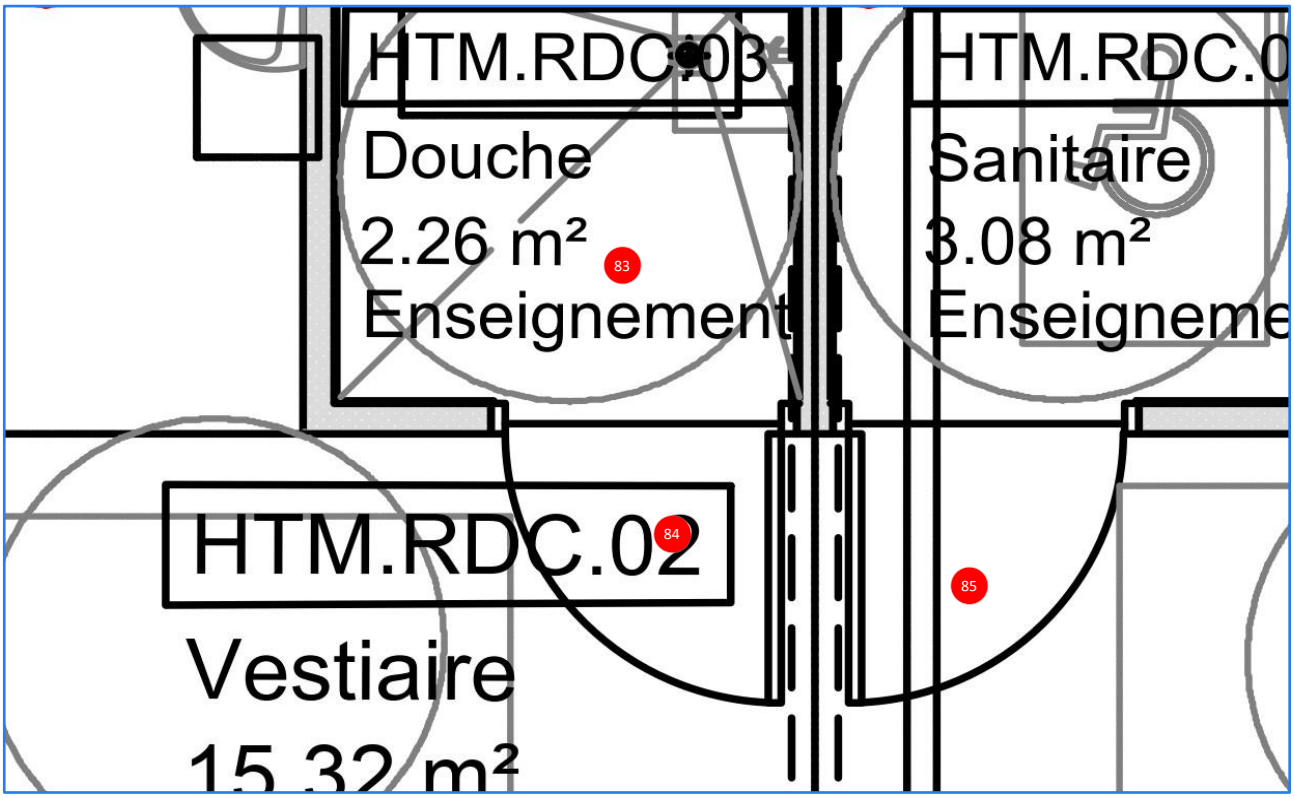

UPPA / MDM / RT / MTM_RT_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
7	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Repérage, entrée du bâtiment inexistante	RT RDC	
8	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Marche, les contremarche à peindre, rallonger les mains courantes et mettre en place des bandes d'éveil	RT RDC	Largeur de passage : 1,4m Bande antidérapante : 42 ml (nombre 30) Contre marche : 3 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1,4 ml (nombre 1)
9	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Supprimer le sas	RT RDC	
10	05 ASCENSEUR	Création d'un monte personne	RT RDC	Dérogation par mail de la DDTM
11	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation sur porte à mettre en place	RT RDC	
17	06 MENUISERIES INTERIEURES	Mettre en place des patères à 1,30	RT RDC	
18	06 MENUISERIES INTERIEURES	Libérer les patères et en mettre en place à 1,30 m	RT RDC	
19	06 MENUISERIES INTERIEURES	Patère à mettre en place à 1m30	RT RDC	
20	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre un urinoir à 50 cm	RT RDC	
21	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Sanitaire handicapé trop petit, pas de zone de retournement de 1,50 m	RT RDC	
22	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Sanitaire handicapé trop petit, pas de zone de retournement	RT RDC	

Photographies des non-conformités



7 Repérage, entrée du bâtiment inexistante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



8 Marche, les contremarche à peindre, rallonger les mains courantes et mettre en place des

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



9 Supprimer le sas

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-



10 Création d'un monte personne

05 ASCENSEUR



10 Création d'un monte personne

05 ASCENSEUR



11 Signalisation sur porte à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



17 Mettre en place des patères à 1,30

06 MENUISERIES INTERIEURES



18 Libérer les patères et en mettre en place à 1,30 m

06 MENUISERIES INTERIEURES



19 Patère à mettre en place à 1m30

06 MENUISERIES INTERIEURES



20 Mettre un urinoir à 50 cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



21 Sanitaire handicapé trop petit, pas de zone de retournement de 1,50 m

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



21 Sanitaire handicapé trop petit, pas de zone de retournement de 1,50 m

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



21 Sanitaire handicapé trop petit, pas de zone de retournement de 1,50 m
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



22 Sanitaire handicapé trop petit, pas de zone de retournement
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



22 Sanitaire handicapé trop petit, pas de zone de retournement
02 PLOMBERIE-SANITAIRE




22 Sanitaire handicapé trop petit, pas de zone de retournement
02 PLOMBERIE-SANITAIRE




22 Sanitaire handicapé trop petit, pas de zone de retournement
02 PLOMBERIE-SANITAIRE

Plan - UPPA / MDM / RT / MTM_RT_00

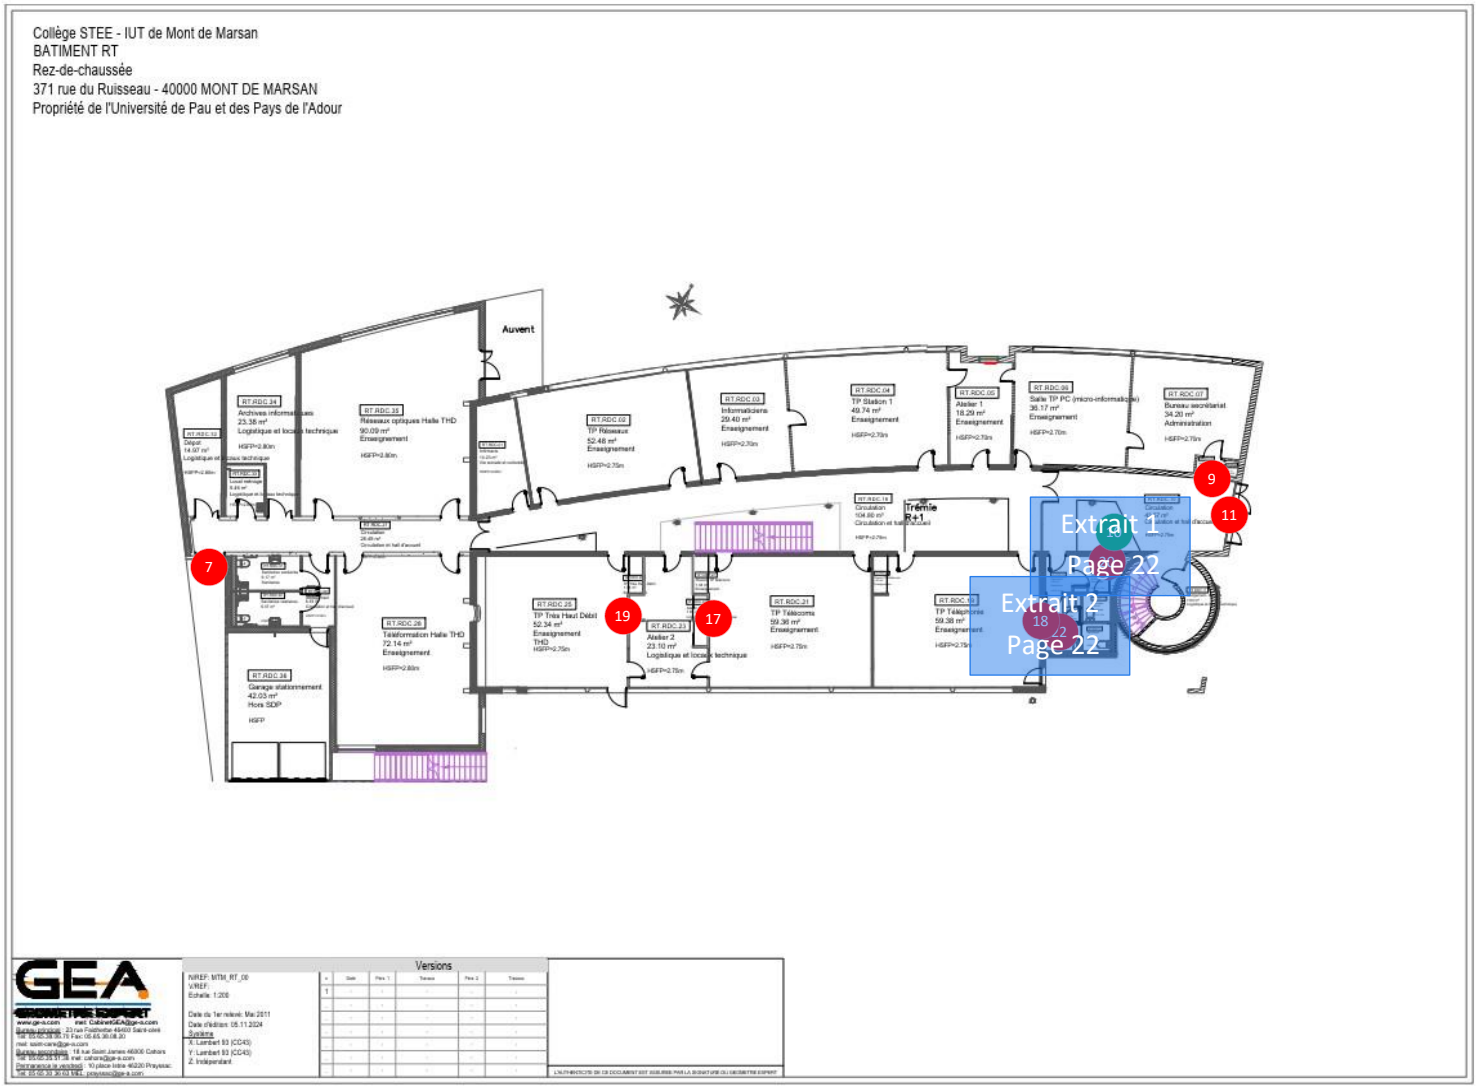


Plan - UPPA / MDM / RT / MTM_RT_00 - Extrait 1



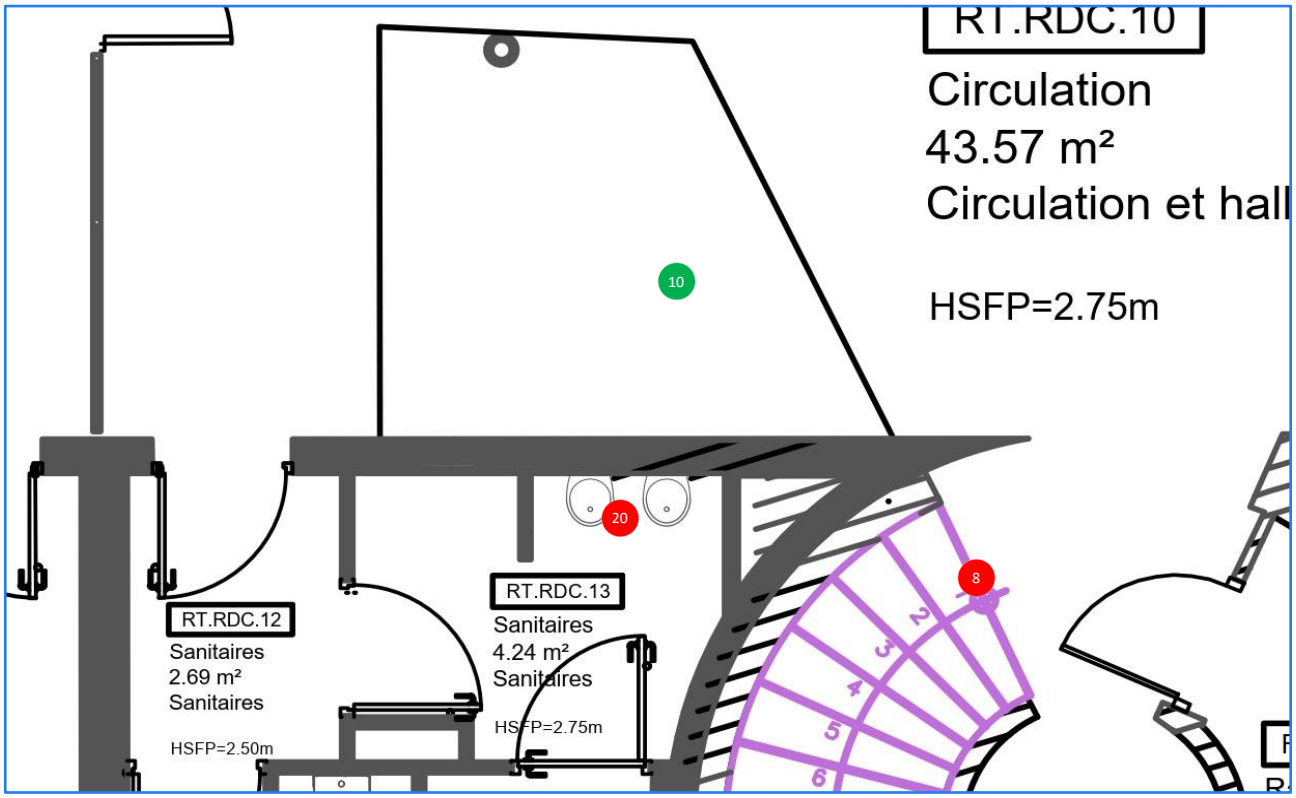

Plan - UPPA / MDM / RT / MTM_RT_00 - Extrait 2



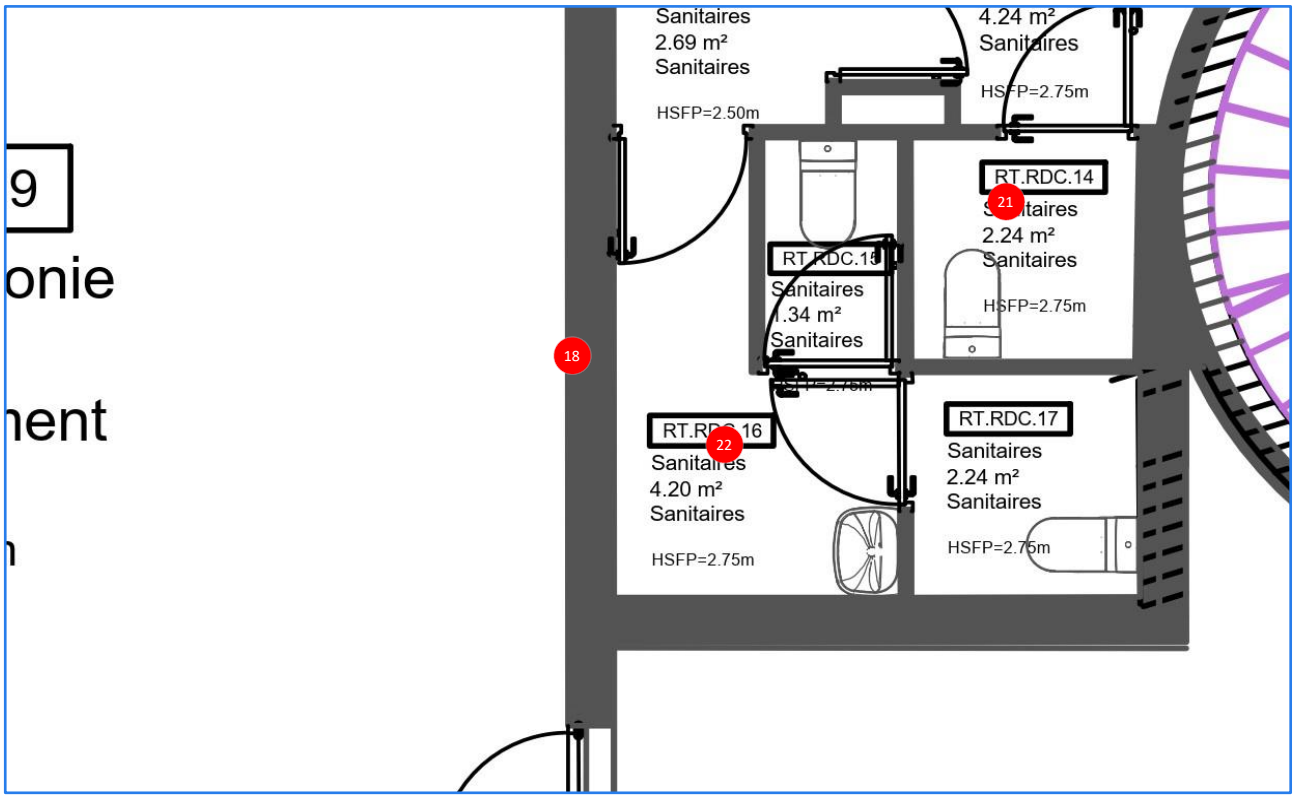

UPPA / MDM / RT / MTM_RT_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
12	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance et main courante à rallonger	RT R+1	
13	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Remplacer porte d'entrée au bâtiment d'en face par la passerelle par une porte tierce	RT R+1	
23	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Sanitaires handicapés, non conforme et urinoir à mettre à 50cm centimètres	RT R+1	
24	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Sanitaire handicapé à revoir	RT R+1	

Photographies des non-conformités



12 Bande de vigilance et main courante à rallonger
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



12 Bande de vigilance et main courante à rallonger
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



13 Remplacer porte d'entrée au bâtiment d'en face par la passerelle par une porte tierce
07 MENUISERIES EXTERIEURES



23 Sanitaires handicapés, non conforme et urinoir à mettre à 50cm centimètres
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



23 Sanitaires handicapés, non conforme et urinoir à mettre à 50cm centimètres
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



23 Sanitaires handicapés, non conforme et urinoir à mettre à 50cm centimètres
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



23 Sanitaires handicapés, non conforme et urinoir à mettre à 50cm centimètres
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



24 Sanitaire handicapé à revoir
02 PLOMBERIE-SANITAIRE




24 Sanitaire handicapé à revoir
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



24 Sanitaire handicapé à revoir

02 PLOMBERIE-SANITAIRE

Plan - UPPA / MDM / RT / MTM_RT_01

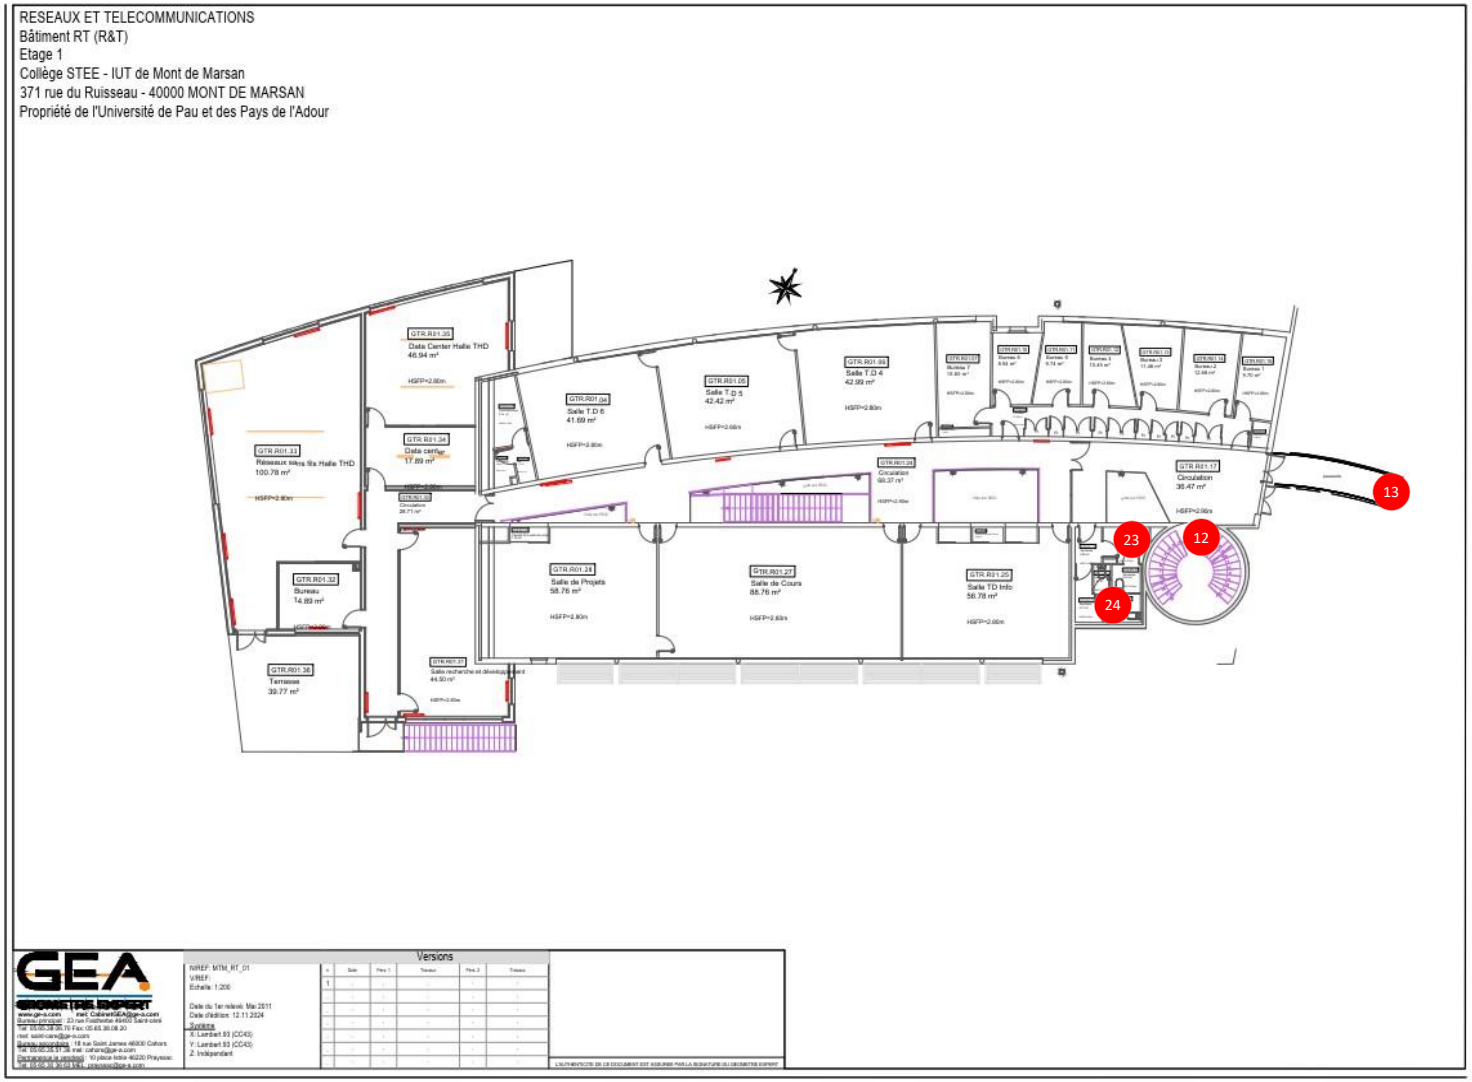

UPPA / MDM / SGM / MTM_SGM_00

Liste des non-conformités


N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
56	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur porte	SGM RDC	
57	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Prévoir le remplacement du caillebotis, plus de 2 cm	SGM RDC	
58	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonger les mains courantes, peindre la première et la dernière contremarche et mettre en place des bandes de vigilance	SGM RDC	Largeur de passage : 2,8m Bande antidérapante : 17 ml (nombre 6) Contre marche : 5,6 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 2,8 ml (nombre 1)
59	05 ASCENSEUR	Mettre en place un indicateur sonore de Niveau	SGM RDC	
60	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacer la porte par une porte adaptée au passage des personnes handicapées	SGM RDC	
61	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacer la porte pour prévoir le passage d'une personne handicapée	SGM RDC	
62	06 MENUISERIES INTERIEURES	Porte en 80 non adapté aux personnes handicapées	SGM RDC	
63	06 MENUISERIES INTERIEURES	Prévoir le remplacement de la porte pour le passage de personnes handicapées	SGM RDC	
64	06 MENUISERIES INTERIEURES	Prévoir du mobilier adapté aux personnes handicapées	SGM RDC	A la charge de la MOA
65	06 MENUISERIES INTERIEURES	Prévoir du mobilier adapté aux personnes handicapées	SGM RDC	A la charge de la MOA
66	06 MENUISERIES INTERIEURES	Prévoir du mobilier adapté aux personnes handicapées	SGM RDC	A la charge de la MOA
67	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Peindre les contremarche, mettre en place des bandes antidérapantes en nez de marche, bande de vigilance et rallonger les mains courantes	SGM RDC	Largeur de passage : 1,5m Bande antidérapante : 34,5 ml (nombre 23) Contre marche : 6 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7)
74	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Création d'un lave main pour personne handicapée, poignée U et portemanteau à 1,30m	SGM RDC	
75	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Mettre en place une signalétique pour les WC	SGM RDC	
76	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance présente	SGM RDC	
77	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Nez de marche antidérapante, bande de vigilance, peinture des contremarche et rallonger les mains courantes	SGM RDC	Largeur de passage : 1,5m Bande antidérapante : 34,5 ml (nombre 23) Contre marche : 6 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7)
78	06 MENUISERIES INTERIEURES	Prévoir du mobilier adapté aux personnes handicapées pour l'informatique	SGM RDC	A la charge de la MOA
79	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Prévoir la mise en place de nez, de marche contrasté	SGM RDC	
80	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Prévoir la signalisation des places handicapés	SGM RDC	
81	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Mettre en place une boucle magnétique	SGM RDC	A la charge de la MOA
503	06 MENUISERIES INTERIEURES	Réglage des fermes portes des sanitaires	SGM RDC	
506	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre en place un lave mains, une poignée U, et un portemanteau à 1,30m	SGM RDC	
507	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre un urinoir à 50cm	SGM RDC	

Photographies des non-conformités




56 Signalétique sur porte

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



57 Prévoir le remplacement du caillebotis, plus de 2 cm

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-



58 Rallonger les mains courantes, peindre la première et la dernière contremarche et mettre
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



58 Rallonger les mains courantes, peindre la première et la dernière contremarche et mettre
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



59 Mettre en place un indicateur sonore de Niveau

05 ASCENSEUR



60 Remplacer la porte par une porte adaptée au passage des personnes handicapées
06 MENUISERIES INTERIEURES



61 Remplacer la porte pour prévoir le passage d'une personne handicapée
06 MENUISERIES INTERIEURES



62 Porte en 80 non adapté aux personnes handicapées

06 MENUISERIES INTERIEURES



63 Prévoir le remplacement de la porte pour le passage de personnes handicapées
06 MENUISERIES INTERIEURES



64 Prévoir du mobilier adapté aux personnes handicapées

06 MENUISERIES INTERIEURES



65 Prévoir du mobilier adapté aux personnes handicapées

06 MENUISERIES INTERIEURES



66 Prévoir du mobilier adapté aux personnes handicapées

06 MENUISERIES INTERIEURES



67 Peindre les contremarche, mettre en place des bandes antidérapantes en nez de
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



75 Mettre en place une signalétique pour les WC

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



76 Bande de vigilance présente

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



77 Nez de marche antidérapante, bande de vigilance, peinture des contremarche et rallonger les
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



78 Prévoir du mobilier adapté aux personnes handicapées pour l'informatique
06 MENUISERIES INTERIEURES



79 Prévoir la mise en place de nez, de marche contrasté

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



80 Prévoir la signalisation des places handicapés

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



81 Mettre en place une boucle magnétique


03 ELECTRICITE CFO/CFA

Plan - UPPA / MDM / SGM / MTM_SGM_00




Plan - UPPA / MDM / SGM / MTM_SGM_00 - Extrait 1



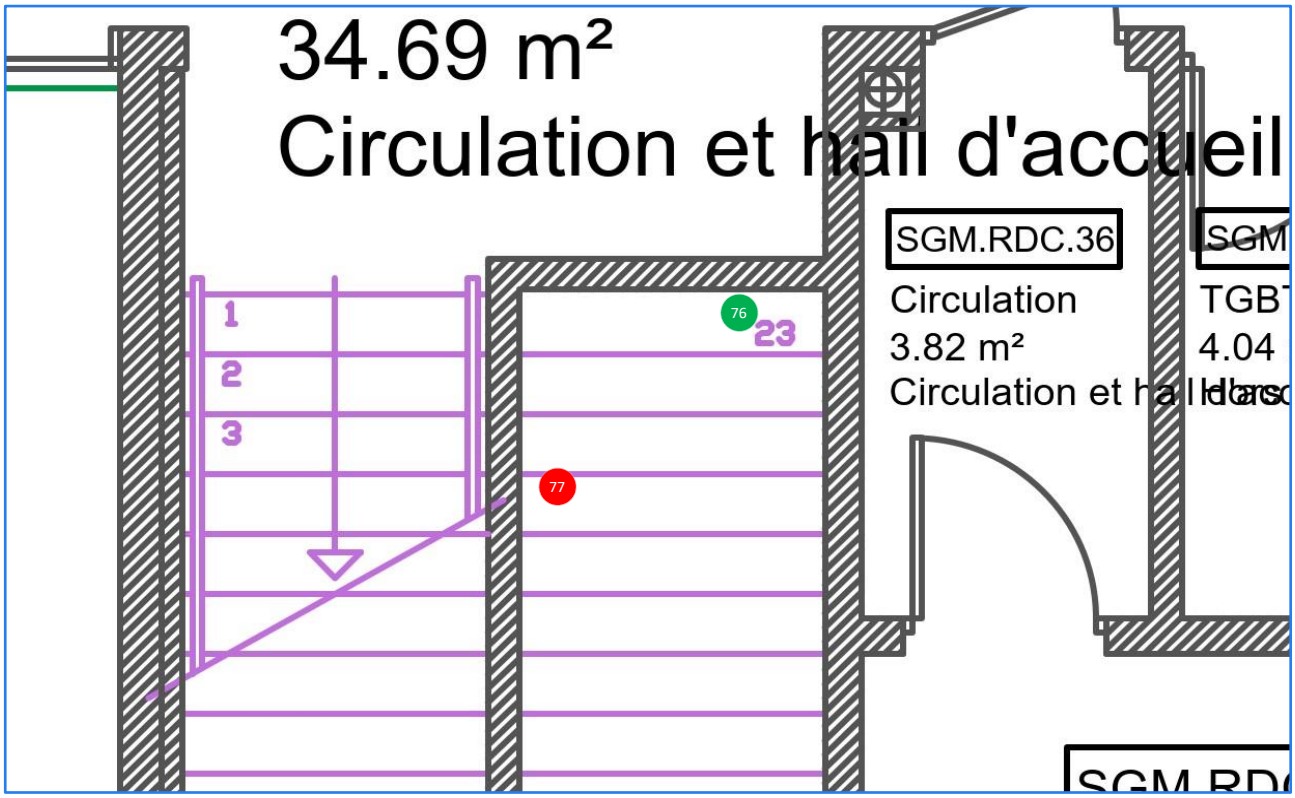


Plan - UPPA / MDM / SGM / MTM_SGM_00 - Extrait 2



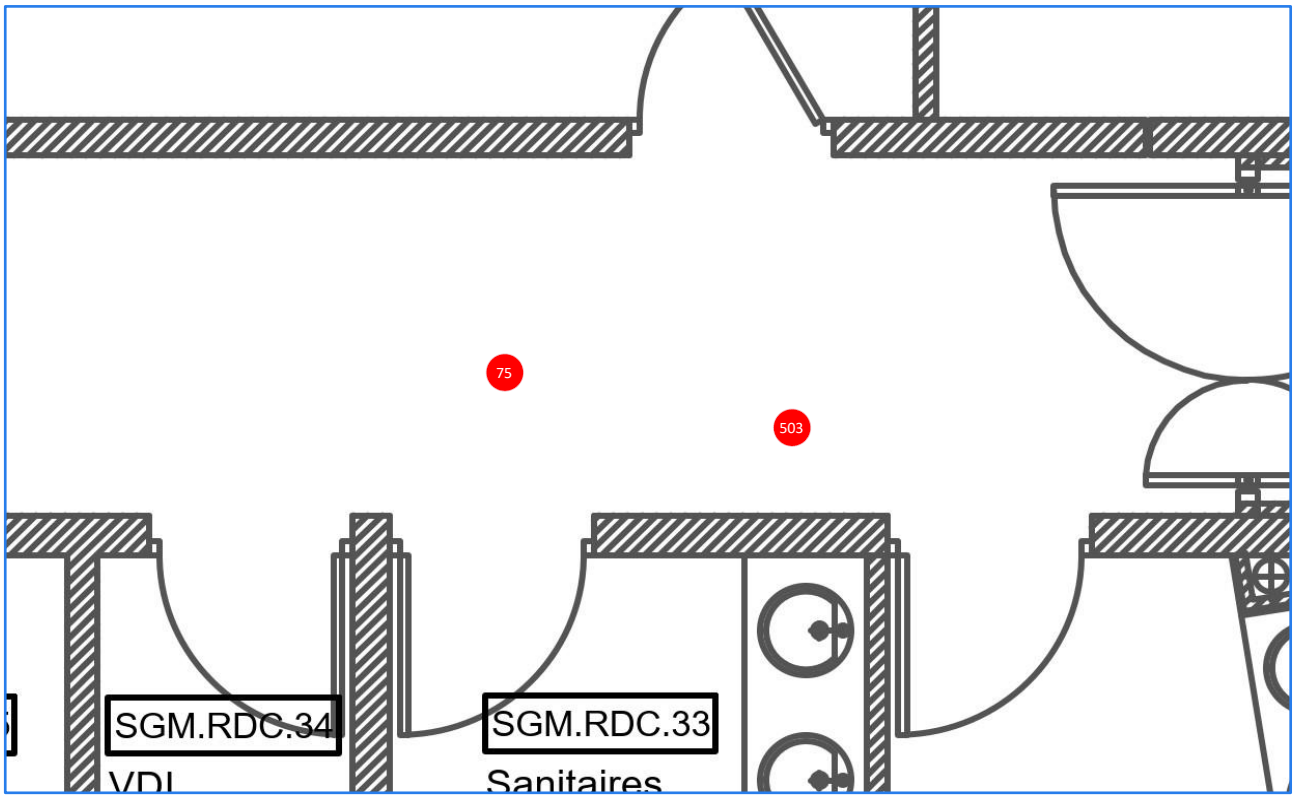


Plan - UPPA / MDM / SGM / MTM_SGM_00 - Extrait 3



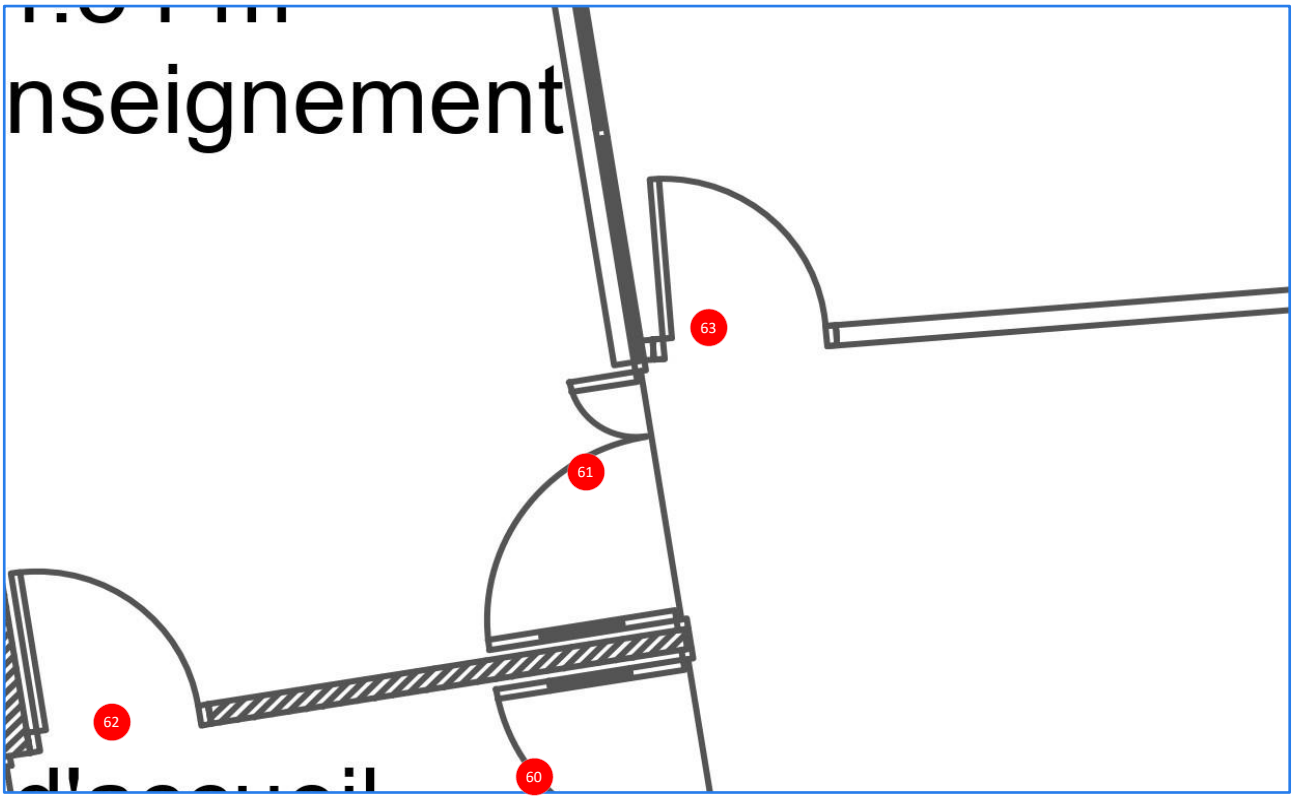

Plan - UPPA / MDM / SGM / MTM_SGM_00 - Extrait 4



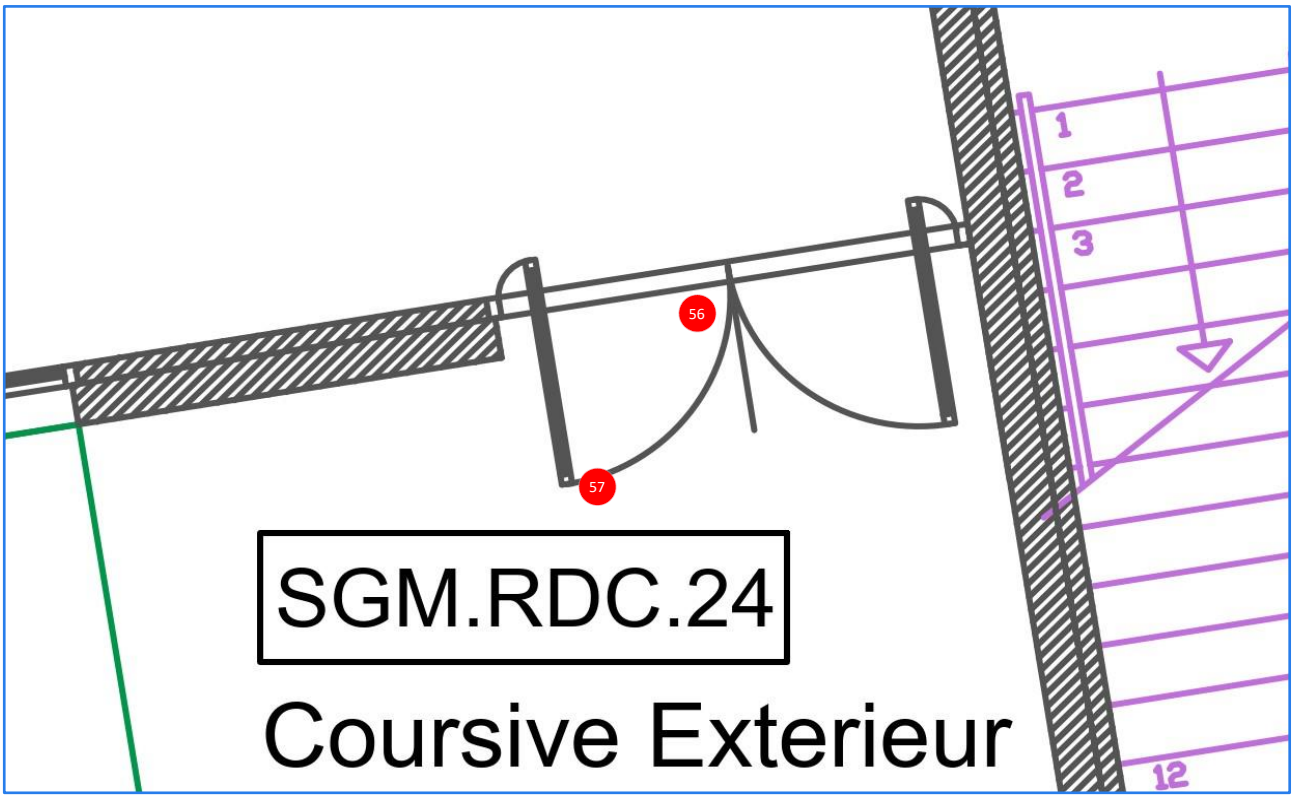

UPPA / MDM / SGM / MTM_SGM_01

Liste des non-conformités


N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
68	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance présente au r +1	SGM R+1	
69	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance présente	SGM R+1	
70	05 ASCENSEUR	Prévoir indicateur, sonore ascenseur	SGM R+1	
71	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre un urinoir à 50 cm	SGM R+1	
72	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre en place un lave mains, une poignée U, et un portemanteau à 1m 30.	SGM R+1	
73	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Création d'un lave main pour personne handicapée, poignée U et portemanteau à 1m 30	SGM R+1	
504	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation porte sanitaire PMR	SGM R+1	
505	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation porte sanitaire PMR	SGM R+1	

Photographies des non-conformités



68 Bande de vigilance présente au r +1

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



69 Bande de vigilance présente

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



70 Prévoir indicateur, sonore ascenseur

05 ASCENSEUR



71 Mettre un urinoir à 50 cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



72 Mettre en place un lave mains, une poignée U, et un portemanteau à 1m 30.
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



72 Mettre en place un lave mains, une poignée U, et un portemanteau à 1m 30.
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



72 Mettre en place un lave mains, une poignée U, et un portemanteau à 1m 30.
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



73 Création d'un lave main pour personne handicapée, poignée U et portemanteau à 1m 30
02 PLOMBERIE-SANITAIRE




73 Création d'un lave main pour personne handicapée, poignée U et portemanteau à 1m 30
02 PLOMBERIE-SANITAIRE



73 Création d'un lave main pour personne handicapée, poignée U et portemanteau à 1m 30
02 PLOMBERIE-SANITAIRE

Plan - UPPA / MDM / SGM / MTM_SGM_01

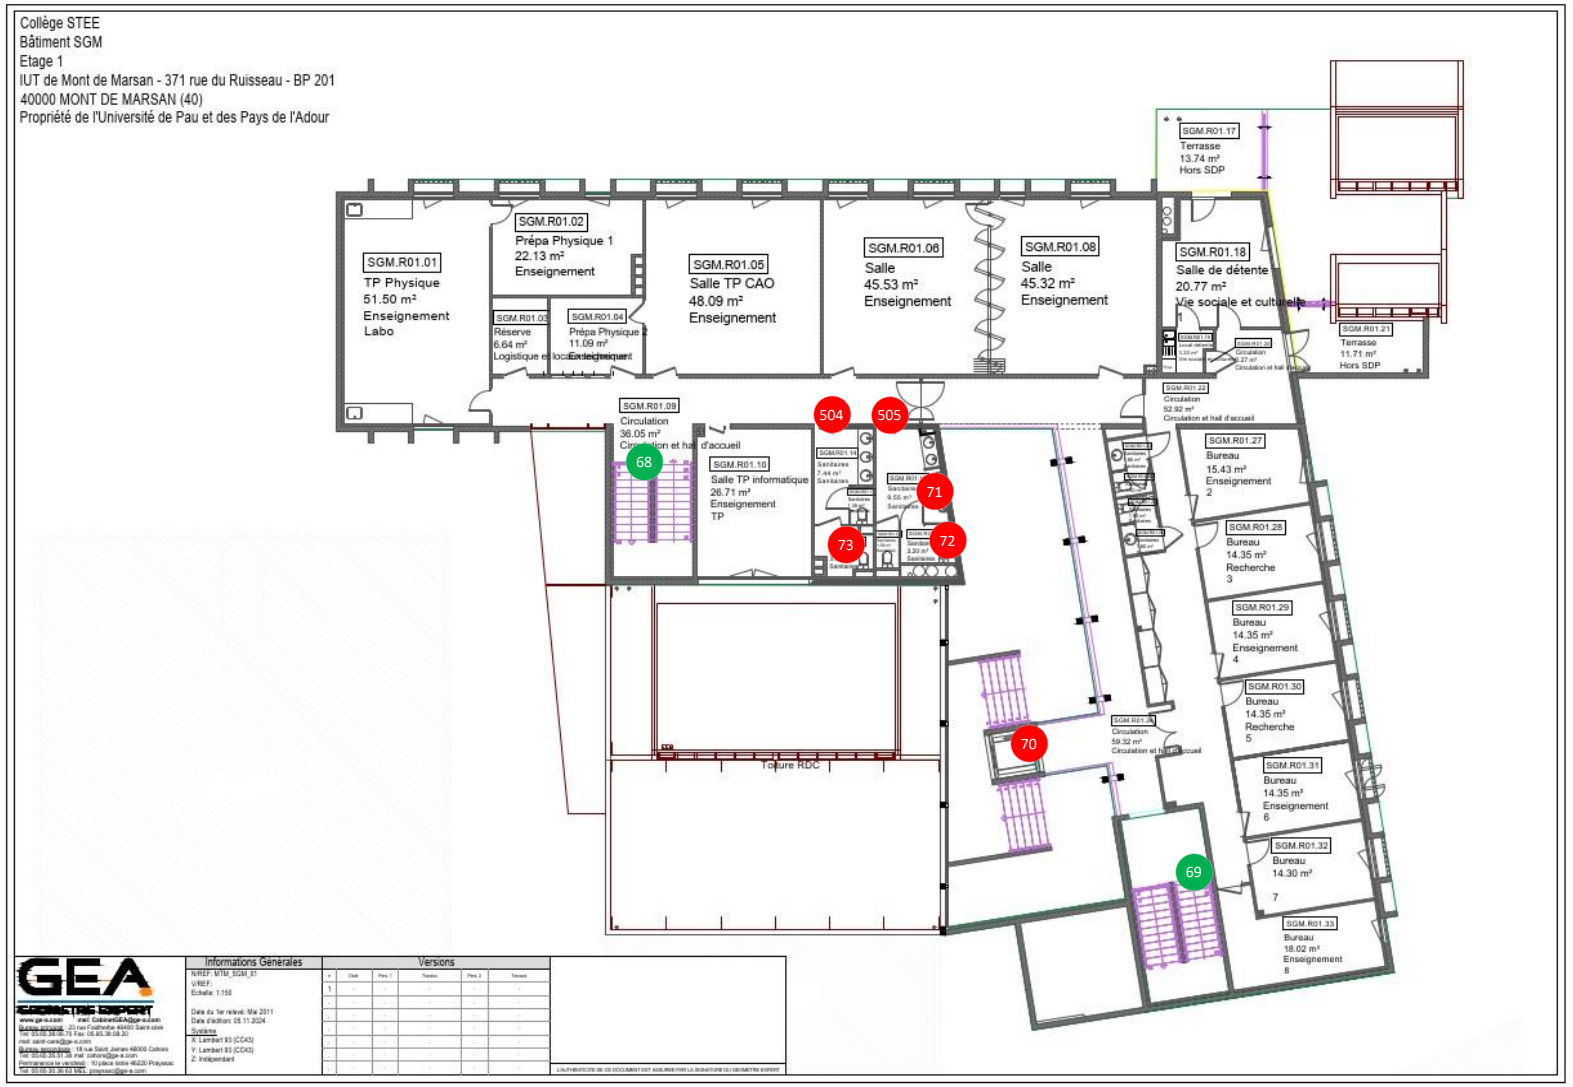

UPPA / MDM / MTM_MAS_2020

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
1	05 VRD	Création d'un bateau	Extérieur	
2	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Création d'une rampe d'un bateau	Extérieur	
3	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Création d'un passage piéton avec bandes de guidage visuel au sol	Extérieur	
4	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Création d'une bande, pépites de guidage	Extérieur	
5	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Place handicapé trop éloigné	Extérieur	
6	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Caillebotis avec trou, trop gros, plus de 2 cm	Extérieur	
497	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Totem	Extérieur	
502	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Totem	Extérieur	

Photographies des non-conformités



1 Création d'un bateau

05 VRD



2 Création d'une rampe d'un bateau

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-



3 Création d'un passage piéton avec bandes de guidage visuel au sol

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



4 Création d'une bande, pépites de guidage

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



5 Place handicapé trop éloigné

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-



6 Caillebotis avec trou, trop gros, plus de 2 cm

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-

Plan - UPPA / MDM / MTM_MAS_2020

