Bâtiment administratif

Dépôt des Essences Marine [DEMa]

ARSENAL DE TOULON

MAITRE D'OUVRAGE

Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Toulon
BCRM TOULON – BP 71 – 83800 TOULON Cedex 9 — Tél. : 04 22 43 67 45

ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE ET COORDINATION

LAND
42 rue du Coq
13001 Marseille — Tél : 04 91 90 00 91

BET GENERALISTE

EGIS BATIMENT SUD
9 boulevard de Dunkerque CS 61001 13471
Marseille Cedex 02 — Tél : 04 91 23 23 23

OPC

SARL ATLANTE
17 BOULEVARD JARDIN ZOOLOGIQUE
13004 MARSEILLE — Tél : 06 67 62 90 37

BET ACOUSTIQUE

IGETEC
2 BOULEVARD DES ALISIERS 13009 MARSEILLE — Tél : 06 03 31 57 47

Contrôleur technique

Alpes Contrôles
Agence de Toulon 67, Rue d'Ollioules Zone Les Millones II 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Tel 04 94 46 37 83 / toulon@alpes-controles.fr — Tél : 04 94 46 37 83

C.S.P.S.

Qualiconsult
Avenue Georges Charpak - Batiment A - 83160 La Valette du Var . toulon;qcs@qualiconsult.fr — Tél : 04 94 08 01 29

MODIFICATIONS:

INDICE	DATE	NATURE	REMIS A


TITRE: CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION — FORMAT: A3 — ECH:						PHASE: DCE
ATLANTE	- DCE	-	-	-	- A	**OPC1**
EMETTEUR	PHASE	TYPE	LOCALISATION	LOT	INDICE	DATE: 09/2026

MAITRE D'OUVRAGE : ESID Toulon

Dépôt des Essences Marines (DEMa) - Arsenal de Toulon

PLANNING PREVISIONNEL de réalisation des Travaux - Phase DCE

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**Planning Prévisionnel des Travaux - phase PRO**	
2	**OS démarrage des Travaux**	0 jr
3	**Période de préparation**	**60 jrs**
4	**Dossier EXE**	45 jrs
5	**F. Technique de sélection du matériel**	20 jrs
6	**Visa Etudes EXE**	45 jrs
7	**DELAI COMMANDE MATERIEL spécifique**	80 jrs
8	**Installation de chantier (cloture , base vie, protection des réseaux existar**	20 jrs
9	**Création ouverture mur enceinte (futur accès du bâtiment)**	10 jrs
10	**Préparation du terrain (rabottage enrobé, terrassement/nivellement)**	5 jrs
11	**TRAVAUX**	**252 jrs**
12	**GROS OEUVRE - FONDATIONS**	**132 jrs**
13	Implatation - installation micopieux	5 jrs
14	Réalisation micropieux y/c évacuation déblais pollués (3 micropieux/jours)	15 jrs
15	Recépage + tête de micropieux	10 jrs
16	Réseaux EP EU entérrés y/c regard	10 jrs
17	Elévation VS - Longrines + poteaux	15 jrs
18	Plancher HT VS	15 jrs
19	Elévation RdC - Poteaux + voiles BA	15 jrs
20	Poutres HT RdC	10 jrs
21	Plancher HT RdC	15 jrs
22	Elévation R+1 - Poteaux + voiles BA	10 jrs
23	Poutres HT R+1	10 jrs
24	Plancher HT R+1	15 jrs
25	Pose FOB	10 jrs
26	Pose poutres allèges BA incurvées de façade - y/c clavetage plancher - Ht RdC	10 jrs
27	Pose poutres allèges BA incurvées de façade - y/c clavetage plancher - Ht R+1	15 jrs
28	Travaux en toiture : acrotède - édicule - souches	10 jrs
29	Neutralisation des 7 jours d'intempéries prévu dans le cadre du CCAP	7 jrs
30	Finitions avant démarrage Clos couvert	20 jrs
31	**CLOS COUVERT**	**93 jrs**
32	Etanchéité toiture	15 jrs
33	Etanchéité terrasse R+1	10 jrs
34	Protection terrasse R+1 - dalles sur plots	10 jrs
35	Résine étanche circulable	5 jrs
36	Pose M. Ext RdC y/c vitrage	10 jrs
37	Pose M. Ext R+1 type mur rideau y/c vitrage	15 jrs
38	Lasure de façade - Lot GO	25 jrs
39	Pose Descentes EP ext. à l'avancementde la lasure	25 jrs
40	**LOTS TECHNIQUES**	**115 jrs**
41	Incorporation plomberie en cloison y/c pose bâti support - RdC	10 jrs
42	Incorporation plomberie en cloison y/c pose bâti support - R+1	10 jrs
43	Distribution des gaines aérauliques y/c calorifuge - RdC	15 jrs
44	Distribution des gaines aérauliques y/c calorifuge - R+1	15 jrs
45	Distribution hydraulique CVC + Pb y/c calorifuge - RdC	15 jrs
46	Distribution hydraulique CVC + Pb y/c calorifuge - R+1	15 jrs
47	Distribution fluides frigo - RdC	5 jrs
48	Distribution fluides frigo - R+1	5 jrs
49	Pose et raccordement groupe VRV en toiture	5 jrs
50	Distribution condensat - RdC	5 jrs
51	Distribution condensat - R+1	5 jrs
52	Distribution elec/régulation CVC - RdC	5 jrs
53	Distribution elec/régulation CVC - R+1	5 jrs
54	Incorporation Elec en cloison - RdC	10 jrs
55	Incorporation Elec en cloison - R+1	10 jrs
56	Pose chemin de câble CFO CFA y/c câblage - RdC	15 jrs
57	Pose chemin de câble CFO CFA y/c cablage - R+1	15 jrs
58	Pose appareillage CFO CFA avant peinture - RdC	10 jrs
59	Pose appareillage CFO CFA avant peinture - R+1	10 jrs
60	Aménagement LT CTA	15 jrs
61	Aménagement LT PAC	15 jrs
62	Aménagement LT TGBT + pose TD	15 jrs
63	Pose ascenseur	15 jrs
64	Pose terminaux CVC - ELEC pendant finition peinture RdC et R+1	20 jrs
65	Pose terminaux CVC - ELEC pendant finition peinture hall principal	5 jrs
66	Pose appareillages sanitaires	15 jrs
67	Mise en service / Essais / Réception technique	10 jrs

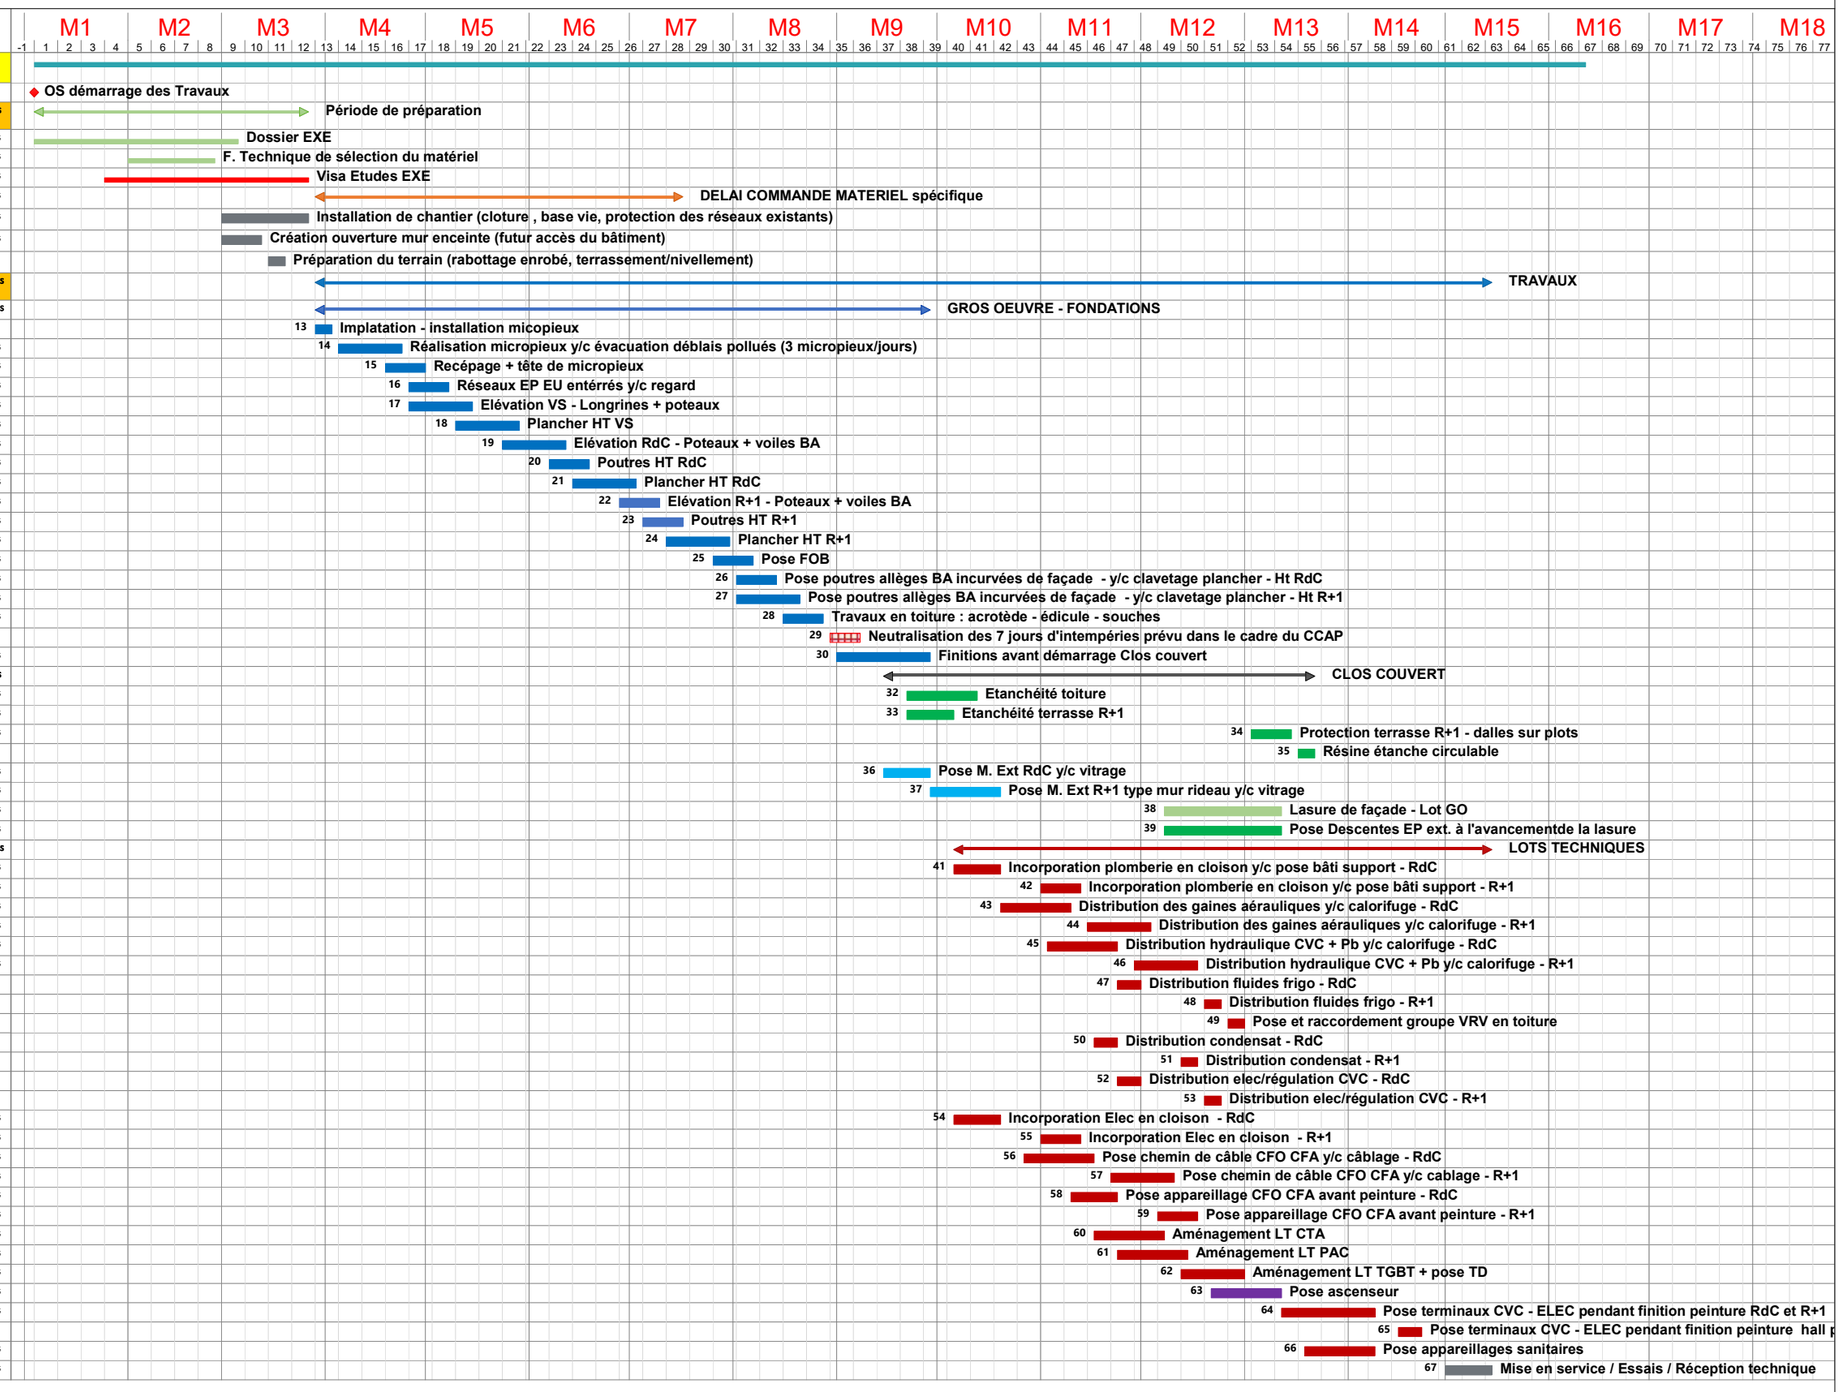

MAITRE D'OUVRAGE : ESID Toulon

Dépôt des Essences Marines (DEMa) - Arsenal de Toulon

PLANNING PREVISIONNEL de réalisation des Travaux - Phase DCE

N°	Nom de la tâche	Durée
68	**SECOND OEUVRE**	**120 jrs**
69	Doublage + cloison 1ere peau RdC	10 jrs
70	Fermeture cloison 2eme peau RdC	7 jrs
71	Finitions bandes RdC	7 jrs
72	Doublage + cloison 1ere peau R+1	10 jrs
73	Fermeture cloison 2eme peau RdC	7 jrs
74	Finitions bandes R+1	8 jrs
75	Préparation peinture et 1ere couche de finition RdC	15 jrs
76	Préparation peinture et 1ere couche de finition R+1	15 jrs
77	Revêtement sols durs / chapes RdC	20 jrs
78	Pose ossature + dalle fx-plafond RdC	10 jrs
79	Pose ossature + dalle fx-plafond R+1	10 jrs
80	Pose fx-plafond décoratif - hall principal	5 jrs
81	Pose plancher technique - RdC (locaux DIRISI)	5 jrs
82	Sols souples y/c ragréage - RdC (locaux DIRISI)	5 jrs
83	Pose plancher technique - R+1 (local DIRISI)	3 jrs
84	Sols souples y/c ragréage - R+1 (local DIRISI)	15 jrs
85	Sols souples y/c ragréage - RdC - hall principal	5 jrs
86	Finition de peinture y/c support bois, métal, PVC - RdC	10 jrs
87	Finition de peinture y/c support bois, métal et PVC - R+1	10 jrs
88	Finition de peinture - RdC - hall principal	5 jrs
89	Pose portes et trappes de visite à peindre RdC	5 jrs
90	Pose portes et trappes de visite à peindre R+1	5 jrs
91	Pose portes stratifiées RdC	5 jrs
92	Pose portes stratifiées R+1	5 jrs
93	Pose cloison mobile multidirectionnelle	5 jrs
94	Pose appareillage et serrure portes RdC et R+1	5 jrs
95	Pose cabines sanitaires en panneaux stratifiées	5 jrs
96	Pose signalétique - identification des locaux, signalétique règlementaire, plans sécurité incendie	5 jrs
97	Serrurerie g.corps extérieur (Esc 02 - terrasse couverte R+1 - Esc 04 et coursive accès technique - Esc 03/05/06)	10 jrs
98	Pose des portes métal extérieures	5 jrs
99	Pose Esc 01 - structure métal - g.corps et marches bois	15 jrs
100	Nettoyage avant OPR	5 jrs
101	**Aménagements Extérieurs**	20 jrs
102	**RECEPTION**	**20 jrs**
103	**OPR**	5 jrs
104	**Levée des réserves**	15 jrs
105	**DOE**	20 jrs
106	**Formation**	1 jr
107	**Réception**	0 jr

