
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Déploiement du réseau d'eau glacée sur la production Fraicheur de Paris

CIMES assistance — Fluides Carbone — Ingénierie & Conseil

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	Réunion de lancement	0 jour	Mer 20/05/26	Mer 20/05/26	
2	**ETUDES**	**73 jours**	**Mer 20/05/26**	**Lun 31/08/26**	
3	DIAG	10 jours	Mer 20/05/26	Mar 02/06/26	1
4	APS/APD	25 jours	Mer 03/06/26	Mar 07/07/26	3
5	PRO/DCE	8 jours	Mer 08/07/26	Lun 20/07/26	4
6	Remise des DCE des 3 lots	0 jour	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26	5
7	Relecture/Corrections	20 jours	Mar 21/07/26	Lun 17/08/26	6
8	Validation	10 jours	Mar 18/08/26	Lun 31/08/26	7
9	**CONSULTATION**	**50 jours**	**Lun 31/08/26**	**Lun 09/11/26**	
10	Publication des 3 appels d'offre	0 jour	Lun 31/08/26	Lun 31/08/26	8
11	Etablissement des offres des candidats (+ visite obligatoire)	26 jours	Mar 01/09/26	Mar 06/10/26	10
12	Remises des offres des candidats	0 jour	Mar 06/10/26	Mar 06/10/26	11
13	Remise du RAO LOT 1 Tuyauterie / CVC / Aéraulique	4 jours	Mer 07/10/26	Lun 12/10/26	12
14	Remise du RAO Lot 2 Second Oeuvre	2 jours	Mar 13/10/26	Mer 14/10/26	13
15	Remise du RAO Lot 3 Elec / GTB	3 jours	Jeu 15/10/26	Lun 19/10/26	14
16	Validation par le CC	9 jours	Mar 20/10/26	Ven 30/10/26	15
17	Rejet et notification du marché	0 jour	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26	16
18	Délai standstill	6 jours	Lun 02/11/26	Lun 09/11/26	17
19	**TRAVAUX**	**248 jours**	**Mar 10/11/26**	**Lun 01/11/27**	
20	Etudes d'exécution - VISA	10 jours	Mar 10/11/26	Mar 24/11/26	18
21	**Travaux PH1 - Froid (Entresol/Boutique/RDC) + Colonne et distribution EC et EG R+4**	**148 jours**	**Mer 25/11/26**	**Lun 28/06/27**	
22	Raccordement en froid Entresol / Boutique / RDC	30 jours	Mer 25/11/26	Mer 13/01/27	20
23	Réseaux de colonne montante EC et EG vers 4ème étage par Escalier 8	30 jours	Mer 25/11/26	Mer 13/01/27	20
24	Distribution des réseaux d'EG et d'EC R+4	40 jours	Mar 19/01/27	Lun 15/03/27	23FD+3 jours
25	Remplacement des émetteurs CVC R+4	30 jours	Mar 26/01/27	Lun 08/03/27	24DD+5 jours
26	**Travaux sous-station d'échange FRDP départ 2**	**148 jours**	**Mer 25/11/26**	**Lun 28/06/27**	
27	Approvisionnement	20 jours	Mer 25/11/26	Mar 22/12/26	20
28	Travaux hydrauliques SST sous-sol	20 jours	Mer 23/12/26	Mer 27/01/27	27
29	Travaux électriques SST sous-sol	10 jours	Jeu 28/01/27	Mer 10/02/27	28
30	Essais	5 jours	Mar 15/06/27	Lun 21/06/27	40
31	Réception	4 jours	Mar 22/06/27	Ven 25/06/27	30
32	Mise en service départ 1	1 jour	Lun 28/06/27	Lun 28/06/27	31
33	**Travaux chaufferie CPCU départ R+4**	**35 jours**	**Mer 25/11/26**	**Mer 20/01/27**	
34	Approvisionnement	20 jours	Mer 25/11/26	Mar 22/12/26	20
35	Travaux hydrauliques chaufferie	5 jours	Mer 23/12/26	Mer 06/01/27	34
36	Travaux électriques chaufferie	2 jours	Jeu 07/01/27	Ven 08/01/27	35
37	Essais	2 jours	Jeu 14/01/27	Ven 15/01/27	23
38	Réception	2 jours	Lun 18/01/27	Mar 19/01/27	37
39	Mise en service	1 jour	Mer 20/01/27	Mer 20/01/27	38
40	Election présidentielle (Interruption)	65 jours	Mar 16/03/27	Lun 14/06/27	24
41	**Travaux PH2 - Travaux R+1 / R+2 / R+3**	**100 jours**	**Mar 15/06/27**	**Lun 01/11/27**	
42	Distribution des réseaux d'EG R+1	30 jours	Mar 15/06/27	Lun 26/07/27	40
43	Distribution des réseaux d'EG R+2	20 jours	Mar 27/07/27	Lun 23/08/27	42
44	Distribution des réseaux d'EG R+3	20 jours	Mar 24/08/27	Lun 20/09/27	43
45	Remplacement des émetteurs des étages R+2 / R+3 / R+4	60 jours	Mar 27/07/27	Lun 18/10/27	42
46	Réfection travaux	10 jours	Mar 19/10/27	Lun 01/11/27	45

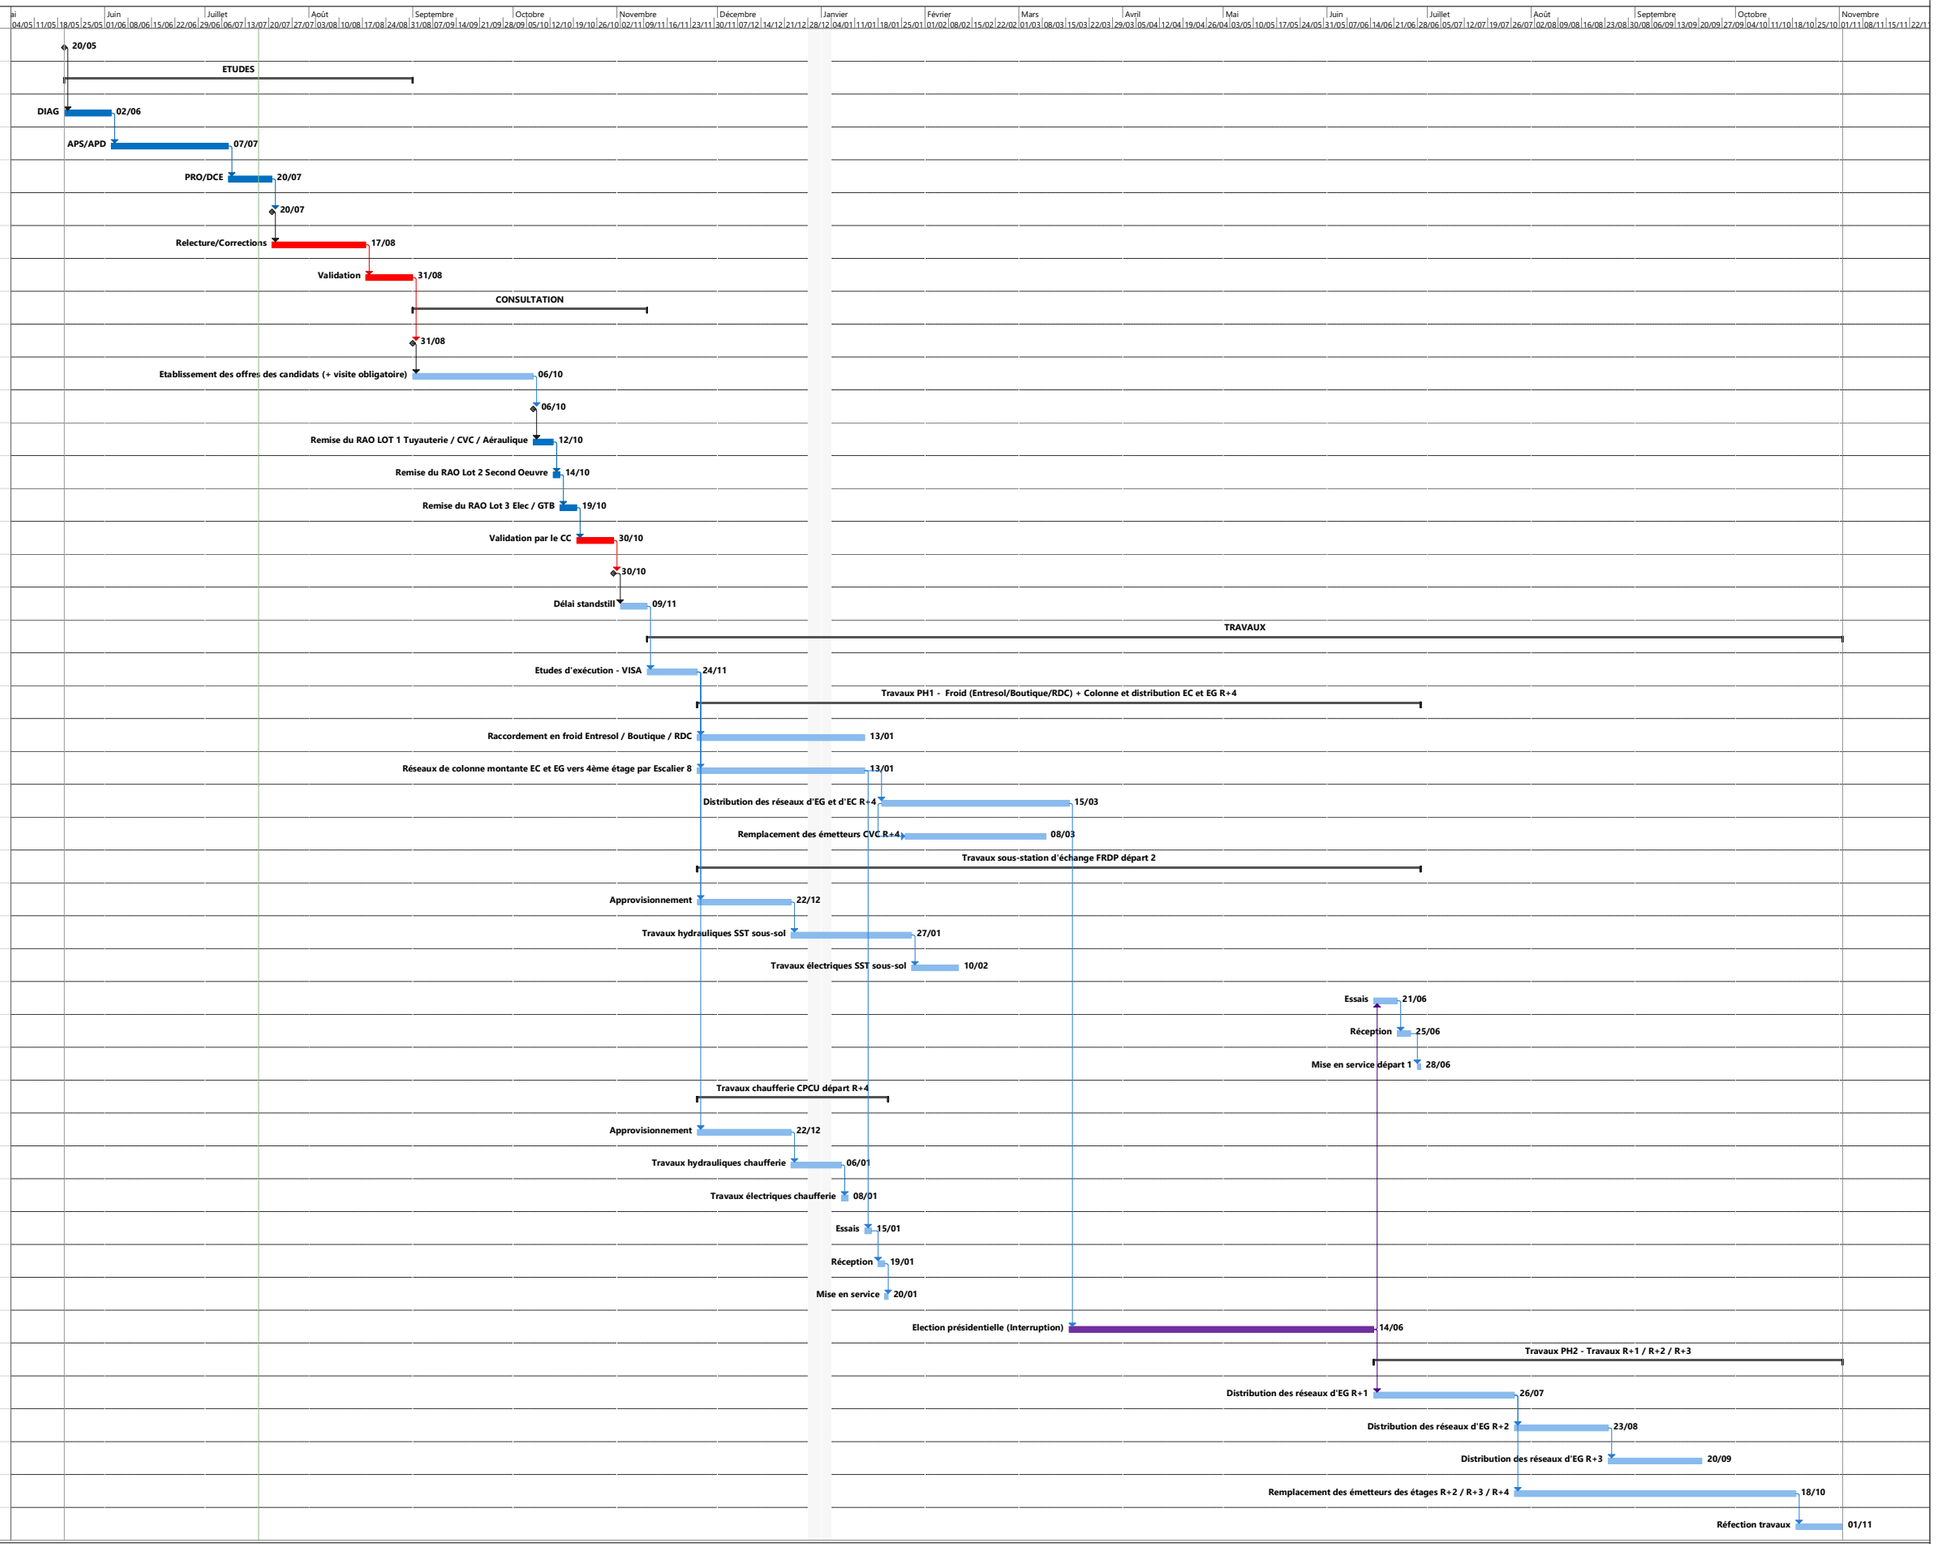

Projet : CC-Planning projet dép.
Date : Ven 17/07/26

Tâche — Jalon — Récapitulatif du projet — Jalon inactif — Tâche manuelle — Report récapitulatif manuel — Début uniquement — Tâches externes — Échéance — Progression manuelle
Fractionnement — Récapitulative — Tâche inactive — Récapitulatif inactif — Durée uniquement — Récapitulatif manuel — Fin uniquement — Jalons externes — Avancement
