# PLANNING PRÉVISIONNEL OPC — Lycée Younoussa BAMANA

B2M consulting

## GANTT PRÉVISIONNEL OPC — Lycée Younoussa BAMANA

*Indice 1 — 3 juin 2026 — B2M CONSULTING*

| ID | Lot | Phase | Désignation | Durée (j) | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *PHASES OUVERTES (vacances scolaires)* | | | |
| 0.1 | OPC | Phase 0 | Notification (T0) — Démarrage période de préparation | 1 | 12/10/2026 | 12/10/2026 |
| 0.2 | L1 | Phase 0 | Études d'exécution Lot 1 (PEO/NDC/Schémas) | 45 | 12/10/2026 | 25/11/2026 |
| 0.3 | L2 | Phase 0 | Études d'exécution Lot 2 (PEO, profils tranchées) | 20 | 12/10/2026 | 31/10/2026 |
| 0.4 | MOE | Phase 0 | Visa MOE des EXE | 15 | 13/10/2026 | 27/10/2026 |
| 0.5 | L1 | Phase 0 | Approvisionnement matériel SSI cat. A (long délai) | 120 | 26/11/2026 | 25/03/2027 |
| 0.6 | L1 | Phase 0 | Approvisionnement CFO/CFA + équipements | 90 | 26/03/2027 | 23/06/2027 |
| 0.7 | L2 | Phase 0 | Approvisionnement des 10 mâts solaires (livraison fin sept.) | 45 | 01/11/2026 | 15/12/2026 |
| 0.8 | L1 | Phase 0 | Démarches concessionnaires EDM (poste 400 kVA) | 60 | 24/06/2027 | 22/08/2027 |
| 0.9 | L1 | Phase 0 | Démarches Orange (FT, fibre, gaines techniques) | 60 | 23/08/2027 | 21/10/2027 |
| 0.10 | OPC | Phase 0 | Inspection commune préalable (ICP) — CSPS BM Holding | 1 | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| 0.11 | L1+L2 | Phase 0 | Remise des PPSPS entreprises (CCAG art. 28.2) | 30 | 29/10/2026 | 27/11/2026 |
| 0.12 | MOA | Phase 0 | Désignation du Coordinateur SSI (CSSI) | 10 | 28/11/2026 | 07/12/2026 |
| 0.13 | OPC | Phase 0 | Validation du planning d'exécution OPC | 1 | 08/12/2026 | 08/12/2026 |
| 1.1 | MOA | Phase 1 | Phase 1 non mobilisée — analyse des offres et commission MAPA en cours (notification mi-octobre) | 17 | 10/10/2026 | 26/10/2026 |
| 2.1 | L1+L2 | Phase 2 | Installation de chantier (clôtures, base vie, signalisation) | 3 | 12/12/2026 | 14/12/2026 |
| 2.2 | L2 | Phase 2 | Implantation, piquetage, repérage des réseaux (DICT) | 2 | 12/12/2026 | 13/12/2026 |
| 2.3 | L2 | Phase 2 | Dépose des regards à reprendre + lampadaires HS uniquement (relevé contradictoire) | 3 | 14/12/2026 | 16/12/2026 |
| 2.4 | L2 | Phase 2 | Tranchées extérieures Zone Nord (fouilles + purge) | 8 | 17/12/2026 | 24/12/2026 |
| 2.5 | L2 | Phase 2 | Fourreaux TPC + grillage avertisseur Zone Nord | 5 | 25/12/2026 | 29/12/2026 |
| 2.6 | L2 | Phase 2 | Tranchées extérieures Zones Sud et Centre | 12 | 30/12/2026 | 10/01/2027 |
| 2.7 | L2 | Phase 2 | Fourreaux TPC + grillage avertisseur Sud et Centre | 8 | 11/01/2027 | 11/01/2027 |
| 2.8 | L2 | Phase 2 | Pose des regards 60 × 60 CFO/CFA (34 unités) | 8 | 19/01/2027 | 11/01/2027 |
| 2.9 | L1 | Phase 2 | Dépose des installations vétustes (bât. 1, 11, 13, 14, 21) | 12 | 12/12/2026 | 23/12/2026 |
| 2.10 | L1 | Phase 2 | Création du local technique TGBT — GC (plateforme, agglos, dallage) | 14 | 24/12/2026 | 06/01/2027 |
| 2.11 | L1 | Phase 2 | Pose et raccordement TGBT + protections | 5 | 07/01/2027 | 11/01/2027 |
| 2.12 | L1 | Phase 2 | Liaison principale BT (poste 400 kVA → TGBT) | 4 | 12/01/2027 | 11/01/2027 |
| 2.13 | L1+L2 | Phase 2 | Repli Phase 2 — protection cyclonique du chantier | 2 | 15/12/2026 | 16/12/2026 |
| 3.1 | L2 | Phase 3 | Pose des 10 mâts solaires + massifs 200 × 200 (avec dépose concomitante des lampadaires fonctionnels) | 6 | 20/02/2027 | 25/02/2027 |
| 3.2 | L2 | Phase 3 | Réfection des enrobés bât. 21 ↔ 31 (524 m²) | 4 | 26/02/2027 | 01/03/2027 |
| 3.3 | L2 | Phase 3 | Finitions et reprises résiduelles Lot 2 | 3 | 02/03/2027 | 04/03/2027 |
| 3.4 | L2 | Phase 3 | OPR finale Lot 2 — Pré-réception du Lot VRD | 2 | 05/03/2027 | 06/03/2027 |
| 3.5 | L1 | Phase 3 | Pose des chemins de câbles intérieurs — admin/CDI | 6 | 20/02/2027 | 25/02/2027 |
| 3.6 | L1 | Phase 3 | Tirage des câbles CFO (zones admin/CDI/labos) | 8 | 26/02/2027 | 05/03/2027 |
| 3.7 | L1 | Phase 3 | Tirage des câbles CFA (VDI, SSI, SSS, vidéo, fibre optique) | 8 | 06/03/2027 | 08/03/2027 |
| 3.8 | L1 | Phase 3 | Pose des tableaux divisionnaires | 5 | 14/03/2027 | 08/03/2027 |
| 3.9 | L1 | Phase 3 | Réseaux de terre + liaisons équipotentielles | 4 | 19/03/2027 | 08/03/2027 |
| 3.10 | L1+L2 | Phase 3 | Repli Phase 3 | 1 | 20/02/2027 | 20/02/2027 |
| 4.1 | L1 | Phase 4 | Pose de l'éclairage normal (pavés LED, réglettes) | 7 | 30/04/2027 | 06/05/2027 |
| 4.2 | L1 | Phase 4 | Pose de l'éclairage de sécurité (BAES) | 4 | 07/05/2027 | 10/05/2027 |
| 4.3 | L1 | Phase 4 | Pose des brasseurs d'air plafonniers | 4 | 11/05/2027 | 14/05/2027 |
| 4.4 | L1 | Phase 4 | Pose de l'appareillage (PC, interrupteurs, arrêt d'urgence) | 4 | 15/05/2027 | 18/05/2027 |
| 4.5 | L1 | Phase 4 | Pose de la centrale SSI + SDI + DM + asservissements | 7 | 19/05/2027 | 18/05/2027 |
| 4.6 | L1 | Phase 4 | Pose des haut-parleurs de sonorisation de sécurité (49 unités extérieures) | 4 | 26/05/2027 | 18/05/2027 |
| 4.7 | L1 | Phase 4 | Pose des caméras de vidéosurveillance (24 unités) + poste opérateur | 4 | 30/05/2027 | 18/05/2027 |
| 4.8 | L1 | Phase 4 | Pose autocom / PABX / brassage VDI / fibre optique | 5 | 03/06/2027 | 18/05/2027 |
| 4.9 | L1 | Phase 4 | Pose onduleurs + supervision énergétique (PSE) | 3 | 08/06/2027 | 18/05/2027 |
| 4.10 | L1 | Phase 4 | Repli Phase 4 | 1 | 11/06/2027 | 18/05/2027 |
| 5.1 | L1 | Phase 5 | Mise sous tension du TGBT (présence EDM et BV) | 1 | 10/07/2027 | 10/07/2027 |
| 5.2 | L1 | Phase 5 | Essais et mise en service éclairage normal et de sécurité | 4 | 11/07/2027 | 14/07/2027 |
| 5.3 | L1 | Phase 5 | Essais SSI catégorie A (présence CSSI et BV) | 5 | 15/07/2027 | 19/07/2027 |
| 5.4 | L1 | Phase 5 | Essais de la sonorisation de sécurité | 3 | 20/07/2027 | 22/07/2027 |
| 5.5 | L1 | Phase 5 | Essais vidéosurveillance + autocom + VDI | 4 | 23/07/2027 | 26/07/2027 |
| 5.6 | L1 | Phase 5 | Mesures du réseau de terre et d'isolement | 2 | 27/07/2027 | 28/07/2027 |
| 5.7 | L1 | Phase 5 | OPR Lot 1 — Pré-réception | 5 | 29/07/2027 | 02/08/2027 |
| 5.8 | L1+L2 | Phase 5 | Levée des réserves | 10 | 10/07/2027 | 19/07/2027 |
| 5.9 | MOA | Phase 5 | Réception des travaux | 1 | 20/07/2027 | 20/07/2027 |
| 5.10 | L1+L2 | Phase 5 | DOE / Dossier de récolement / Formations utilisateurs | 15 | 21/07/2027 | 04/08/2027 |

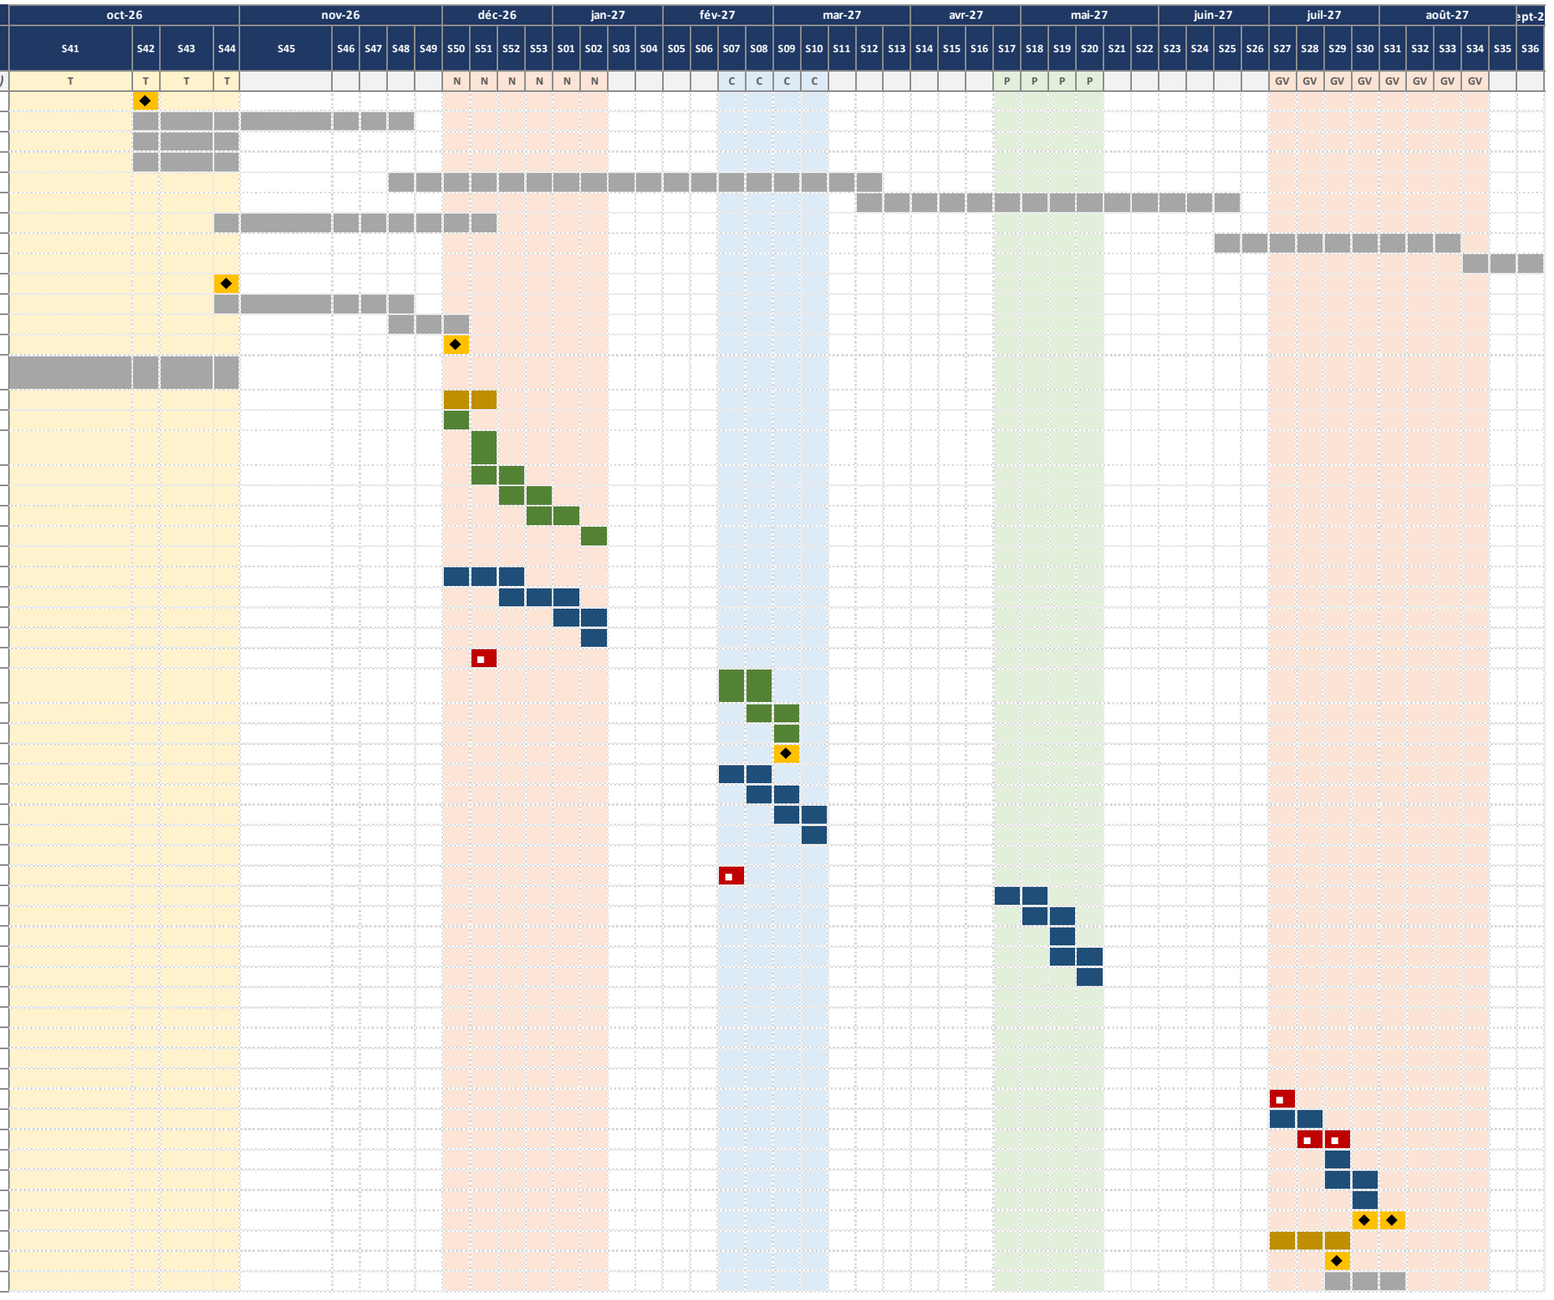


**Légende** Tâche Lot 1 | Tâche Lot 2 | Tâches communes / inter | Préparation / études | ◆ Jalon | ■ Point d'arrêt
