
ESID DE LYON
460 217 - POLEYMIEUX AU MONT D'OR - BA942
Réhab bâtiment 022 et mise en conformité des courettes du chenil
CALENDRIER DCE

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**BASE AERIENNE 942 CHENIL**	567 jrs	Mer 25/11/26	Mar 17/04/29
2		**TRAVAUX**	567 jrs	Mer 25/11/26	Mar 17/04/29
3		**PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER**	40 jrs	Mer 25/11/26	Jeu 21/01/27
4		**PHASES 1, 2 et 3 ZONE COURETTE et AIRE D'ENTRAINEMENT**	222 jrs	Mar 19/01/27	Jeu 23/12/27
5		**lot N° 01 DEMOLITION / DESAMIANTAGE / TERRASSEMENT / VRD**	170 jrs	Mar 19/01/27	Ven 08/10/27
6		PHASE 0 : PREPARATION DE CHANTIER	20 jrs	Mar 19/01/27	Lun 15/02/27
7		**RESEAUX ENTERRES BT EP EU AEP + BASSINS EP CHENIL 60, ISOLEMENT 0108, BAT 22**	20 jrs	Mar 19/01/27	Lun 15/02/27
8		**RAMPE ACCES AUX PHASES 2 ET 3**	3 jrs	Jeu 11/02/27	Lun 15/02/27
9		PHASE 1 : COURETTES 60 TRAVEE 5 ET AIRE PANSAGE 0103 + DETENTE 0106	25 jrs	Mar 16/02/27	Lun 22/03/27
10		**DEMOLITION ET TERRASSEMENT DE LA PLATEFORME**	3 jrs	Mar 16/02/27	Jeu 18/02/27
11		**RESEAUX VRD**	2 jrs	Ven 19/02/27	Lun 22/02/27
12		**CLOTURES CHENIL ET AIRE DE PANSAGE + DETENTE**	15 jrs	Mar 02/03/27	Lun 22/03/27
13		PHASE 2 : COURETTES 60 TRAVEE 3 ET 4	49 jrs	Ven 21/05/27	Jeu 29/07/27
14		**DEMOLITION ET TERRASSEMENT DE LA PLATEFORME**	3 jrs	Ven 21/05/27	Mar 25/05/27
15		**RESEAUX VRD**	3 jrs	Mer 26/05/27	Ven 28/05/27
16		**REMISE EN ETAT ACCES CHANTIER**	4 jrs	Lun 26/07/27	Jeu 29/07/27
17		PHASE 3 : COURETTES 60 TRAVEE 1 ET 2 + AIRE D'ENTRAINEMENT 0034 + AUVENT CASIER 0113	15 jrs	Lun 20/09/27	Ven 08/10/27
18		**COURETTES 60 TRAVEE 1 et 2**	5 jrs	Lun 20/09/27	Ven 24/09/27
19		**DEMOLITION ET TERRASSEMENT DE LA PLATEFORME COURETTES 1 et 2**	3 jrs	Lun 20/09/27	Mer 22/09/27
20		**RESEAUX VRD COURETTES 1 ET 2**	2 jrs	Jeu 23/09/27	Ven 24/09/27
21		**AIRE D'ENTRAINEMENT 0034**	15 jrs	Lun 20/09/27	Ven 08/10/27
22		**CLOTURES AIRE D'ENTRAINEMENT 0034**	15 jrs	Lun 20/09/27	Ven 08/10/27
23		**DESAMIANTAGE BATIMENTS 67 et 68**	8 jrs	Lun 20/09/27	Mer 29/09/27
24		**DEMOLITION 67 ET 68**	2 jrs	Jeu 30/09/27	Ven 01/10/27
25		**TERRASSEMENT BATIMENT 0107 ET 0113**	2 jrs	Lun 04/10/27	Mar 05/10/27
26		**TERRASSEMENT CONTENEUR C1 C2**	1 jr	Mer 06/10/27	Mer 06/10/27
27		**Bâtiment INFIRMERIE 65**	2 jrs	Jeu 23/09/27	Ven 24/09/27
28		**DEMOLITION CURAGE**	2 jrs	Jeu 23/09/27	Ven 24/09/27
29		**Lot N° 02 GROS OEUVRE**	181 jrs	Ven 12/02/27	Lun 22/11/27
30		**MISE EN PLACE BASE VIE + CLOTURES DE CHANTIER**	2 jrs	Ven 12/02/27	Lun 15/02/27
31		PHASE 1 : COURETTES 60 TRAVEE 5 ET AIRE PANSAGE 0103 + DETENTE 0106	40 jrs	Mar 23/02/27	Mar 20/04/27
32		**FONDATIONS ET MUR DE SOUTENEMENT**	10 jrs	Mar 23/02/27	Lun 08/03/27
33		**COURETTES 60 TRAVEE 5**	15 jrs	Mar 02/03/27	Lun 22/03/27
34		**DEPOSES CLOTURES DE CHANTIER**	3 jrs	Ven 16/04/27	Mar 20/04/27
35		PHASE 2 : COURETTES 60 TRAVEE 3 ET 4	48 jrs	Mar 18/05/27	Ven 23/07/27
36		**CLOTURES DE CHANTIER**	3 jrs	Mar 18/05/27	Jeu 20/05/27
37		**COURETTE 60 TRAVEE 3 ET 4**	19 jrs	Lun 31/05/27	Jeu 24/06/27
38		**DEPOSES CLOTURES DE CHANTIER**	3 jrs	Mer 21/07/27	Ven 23/07/27
39		PHASE 3 : COURETTES 60 TRAVEE 1 ET 2 + AIRE D'ENTRAINEMENT 0034 + AUVENT CASIER 0113	49 jrs	Lun 13/09/27	Lun 22/11/27
40		**COURETTES 60 TRAVEE 1 et 2**	48 jrs	Lun 13/09/27	Ven 19/11/27
41		**CLOTURES DE CHANTIER ET POSE CONTENEURS C1 C2**	5 jrs	Lun 13/09/27	Ven 17/09/27
42		**COURETTE 60 TRAVEE 1 ET 2**	20 jrs	Lun 27/09/27	Ven 22/10/27
43		**DEPOSES CLOTURES DE CHANTIER COURETTES 60 1 ET 2**	1 jr	Ven 19/11/27	Ven 19/11/27
44		**AIRE D'ENTRAINEMENT 0034**	30 jrs	Mer 06/10/27	Jeu 18/11/27
45		**BATIMENT 0107**	8 jrs	Mer 06/10/27	Ven 15/10/27
46		**BATIMENT MODULAIRE PROVISOIRE**	7 jrs	Mar 09/11/27	Jeu 18/11/27
47		**AUVENT CASIER 0113**	10 jrs	Lun 25/10/27	Lun 08/11/27

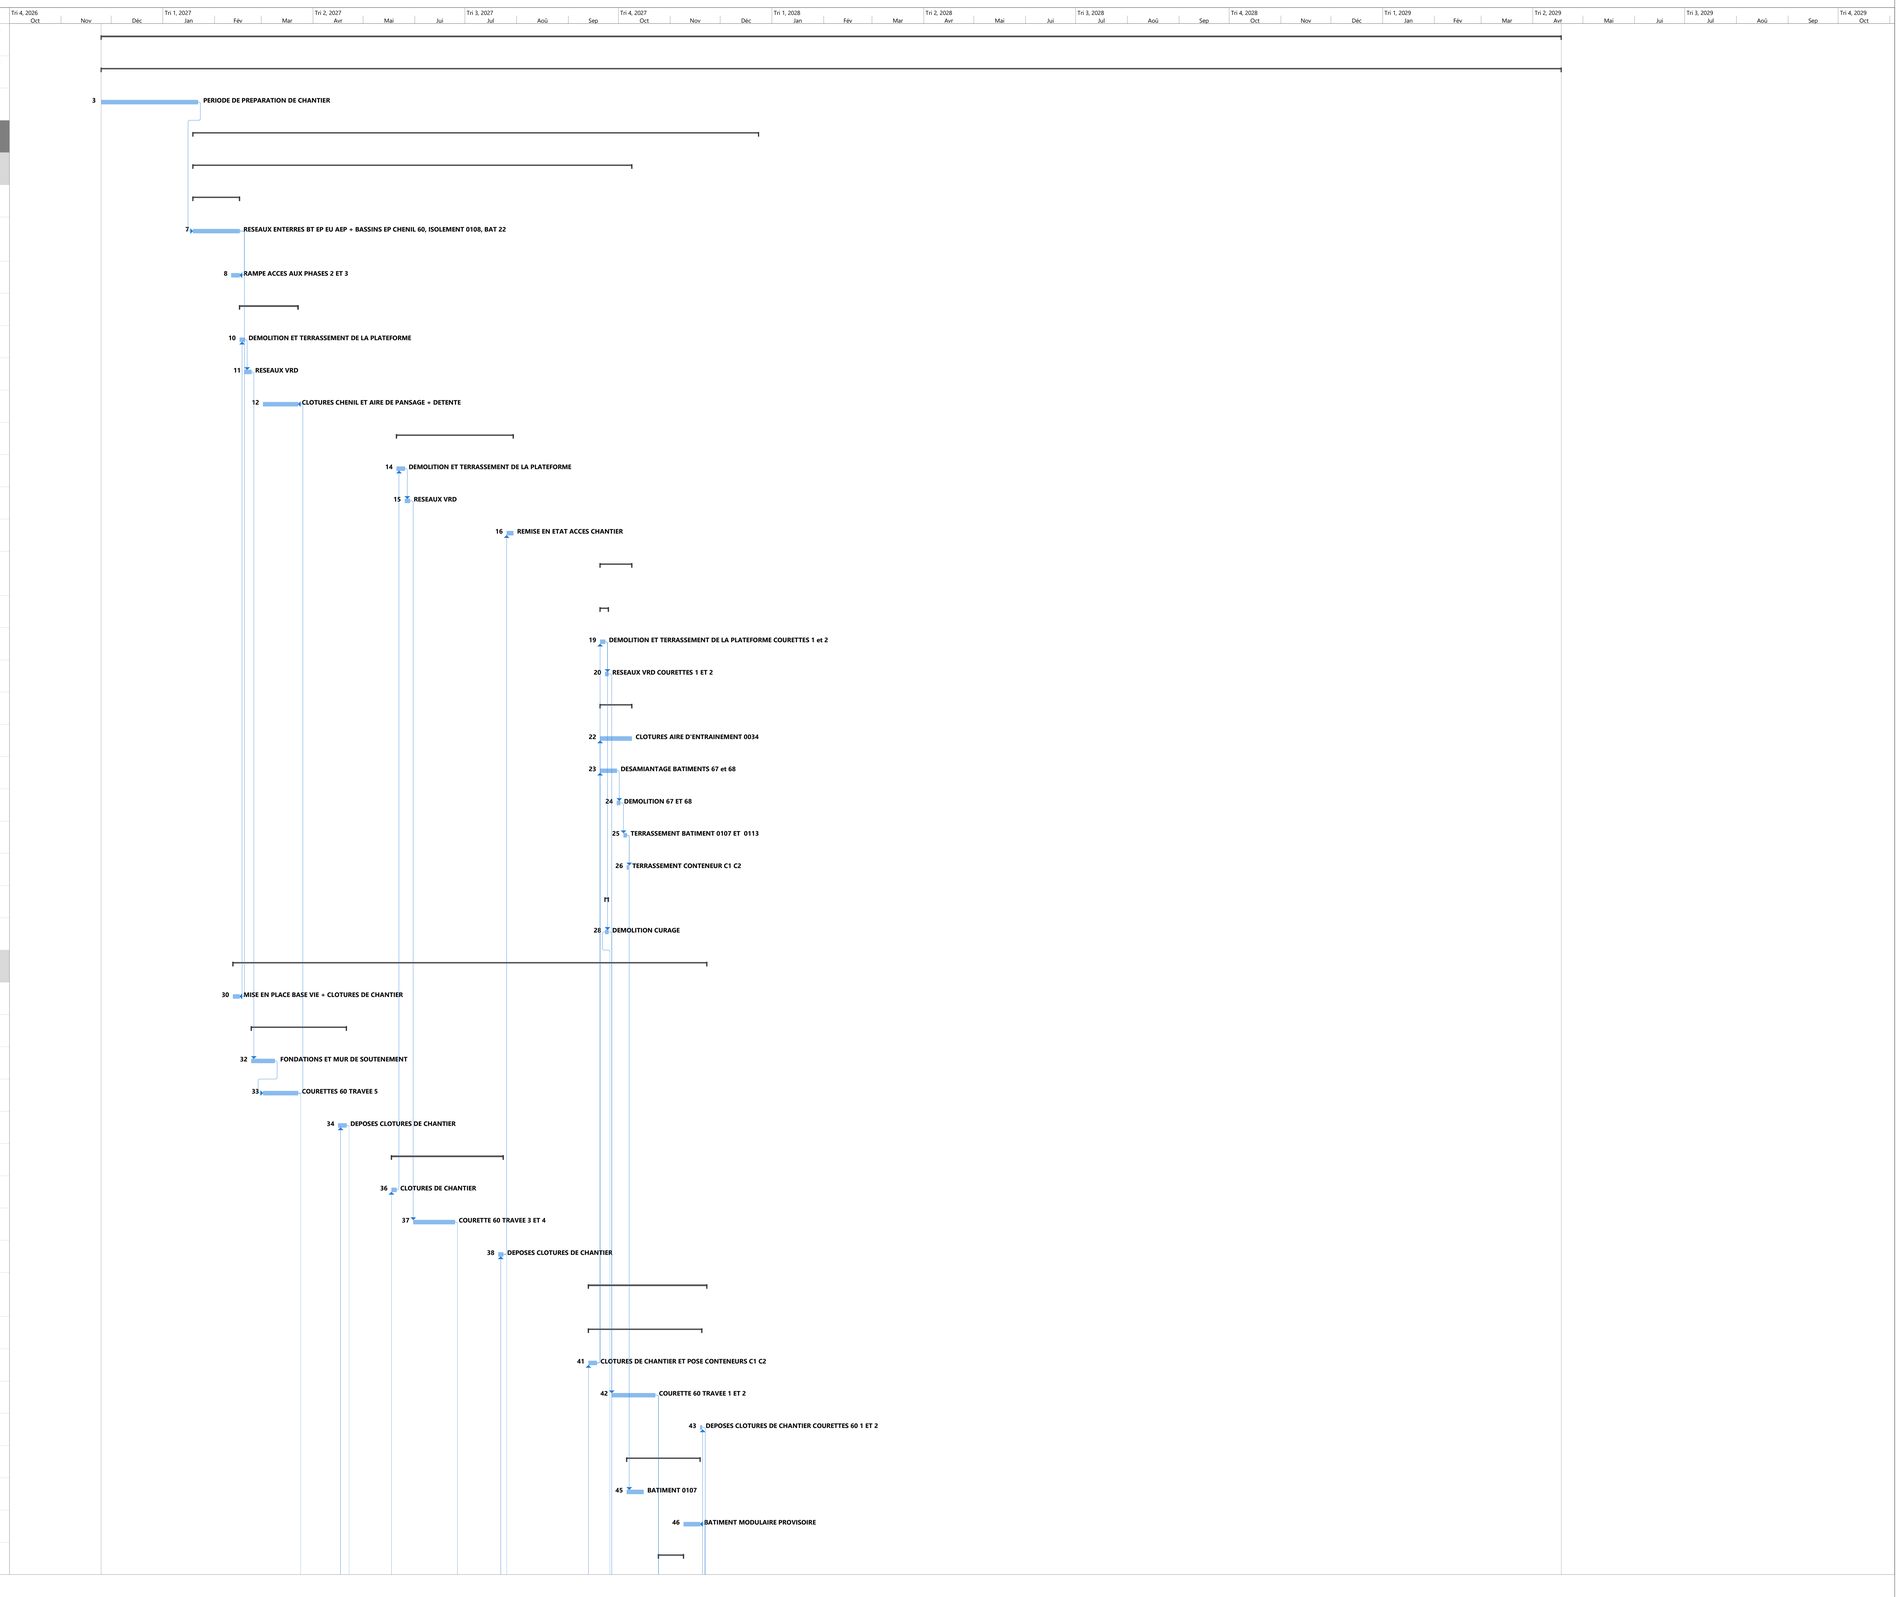


Projet : Calendrier Standard av
Date : Ven 14/08/26

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle

ESID DE LYON
460 217 - POLEYMIEUX AU MONT D'OR - BA942
Réhab bâtiment 022 et mise en conformité des courettes du chenil
CALENDRIER DCE

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
48		FONDATIONS DALLAGE ET MURETS	10 jrs	Lun 25/10/27	Lun 08/11/27
49		BAT LOCAL NOURRITURE 66	7 jrs	Ven 12/11/27	Lun 22/11/27
50		FISSURES ET ENDUITS DE FACADE	7 jrs	Ven 12/11/27	Lun 22/11/27
51		Bâtiment INFIRMERIE 65	11 jrs	Lun 27/09/27	Lun 11/10/27
52		SIPHON ET BAIGNOIRE	2 jrs	Lun 27/09/27	Mar 28/09/27
53		ENDUITS DE FACADE	5 jrs	Mar 05/10/27	Lun 11/10/27
54		Lot N° 04 CLOT COUVERT COURETTES	150 jrs	Mar 23/03/27	Mar 16/11/27
55		PHASE 1 : COURETTES 60 TRAVEE 5 ET AIRE PANSAGE 0103 + DETENTE 0106	15 jrs	Mar 23/03/27	Mar 13/04/27
56		CHARPENTE METALLIQUE et COUVERTURE	10 jrs	Mar 23/03/27	Mar 06/04/27
57		SERRURERIE METALLIQUE	10 jrs	Mer 31/03/27	Mar 13/04/27
58		PHASE 2 : COURETTES 60 TRAVEE 3 ET 4	15 jrs	Ven 25/06/27	Ven 16/07/27
59		CHARPENTE METALLIQUE et COUVERTURE	10 jrs	Ven 25/06/27	Jeu 08/07/27
60		SERRURERIE METALLIQUE	10 jrs	Ven 02/07/27	Ven 16/07/27
61		PHASE 3 : COURETTES 60 TRAVEE 1 ET 2 + AIRE D'ENTRAINEMENT 0034+ AUVENT CASIER 0113	33 jrs	Mer 29/09/27	Mar 16/11/27
62		COURETTES 60 TRAVEE 1 ET 2	15 jrs	Lun 25/10/27	Mar 16/11/27
63		CHARPENTE METALLIQUE et COUVERTURE	10 jrs	Lun 25/10/27	Lun 08/11/27
64		SERRURERIE METALLIQUE	10 jrs	Mar 02/11/27	Mar 16/11/27
65		AUVENT CASIER 0113	6 jrs	Lun 08/11/27	Mar 16/11/27
66		CHARPENTE	1 jr	Lun 08/11/27	Lun 08/11/27
67		COUVERTURE BARDAGE	6 jrs	Lun 08/11/27	Mar 16/11/27
68		BAT LOCAL NOURRITURE 66	2 jrs	Mar 09/11/27	Mer 10/11/27
69		REMPLACEMENT PORTE ET FENETRE	2 jrs	Mar 09/11/27	Mer 10/11/27
70		Bâtiment INFIRMERIE 65	4 jrs	Mer 29/09/27	Lun 04/10/27
71		REMPLACEMENT PORTES BOX , PORTE ET FENETRE INFIRMERIE	4 jrs	Mer 29/09/27	Lun 04/10/27
72		Lot N° 05 AMENAGEMENT INTERIEUR	8 jrs	Lun 04/10/27	Mer 13/10/27
73		Bâtiment INFIRMERIE 65	8 jrs	Lun 04/10/27	Mer 13/10/27
74		CARRELAGE ET FAIENCES	5 jrs	Lun 04/10/27	Ven 08/10/27
75		FAUX PLAFOND	3 jrs	Lun 11/10/27	Mer 13/10/27
76		Lot N° 06 LOTS TECHNIQUES	140 jrs	Ven 09/04/27	Jeu 18/11/27
77		PHASE 1 : COURETTES 60 TRAVEE 5 ET AIRE PANSAGE 0103 + DETENTE 0106	5 jrs	Ven 09/04/27	Jeu 15/04/27
78		CABLAGES ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	5 jrs	Ven 09/04/27	Jeu 15/04/27
79		PHASE 2 : COURETTES 60 TRAVEE 3 ET 4	5 jrs	Mar 13/07/27	Mar 20/07/27
80		CABLAGES ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	5 jrs	Mar 13/07/27	Mar 20/07/27
81		PHASE 3 : COURETTES 60 TRAVEE 1 ET 2 + AIRE D'ENTRAINEMENT 0034 + AUVENT CASIER 0113	41 jrs	Mar 21/09/27	Jeu 18/11/27
82		COURETTES 60 TRAVEES 1 ET 2	5 jrs	Ven 12/11/27	Jeu 18/11/27
83		CABLAGES ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	5 jrs	Ven 12/11/27	Jeu 18/11/27
84		BAT LOCAL NOURRITURE 66	2 jrs	Ven 12/11/27	Lun 15/11/27
85		VENTILATION	2 jrs	Ven 12/11/27	Lun 15/11/27
86		Bâtiment INFIRMERIE 65	19 jrs	Mar 21/09/27	Ven 15/10/27
87		DEPOSE DES INSTALLATIONS	2 jrs	Mar 21/09/27	Jeu 23/09/27
88		VENTILATION , PLOMBERIE ET ECLAIRAGE	3 jrs	Mer 29/09/27	Ven 01/10/27
89		EQUIPEMENTS	2 jrs	Jeu 14/10/27	Ven 15/10/27

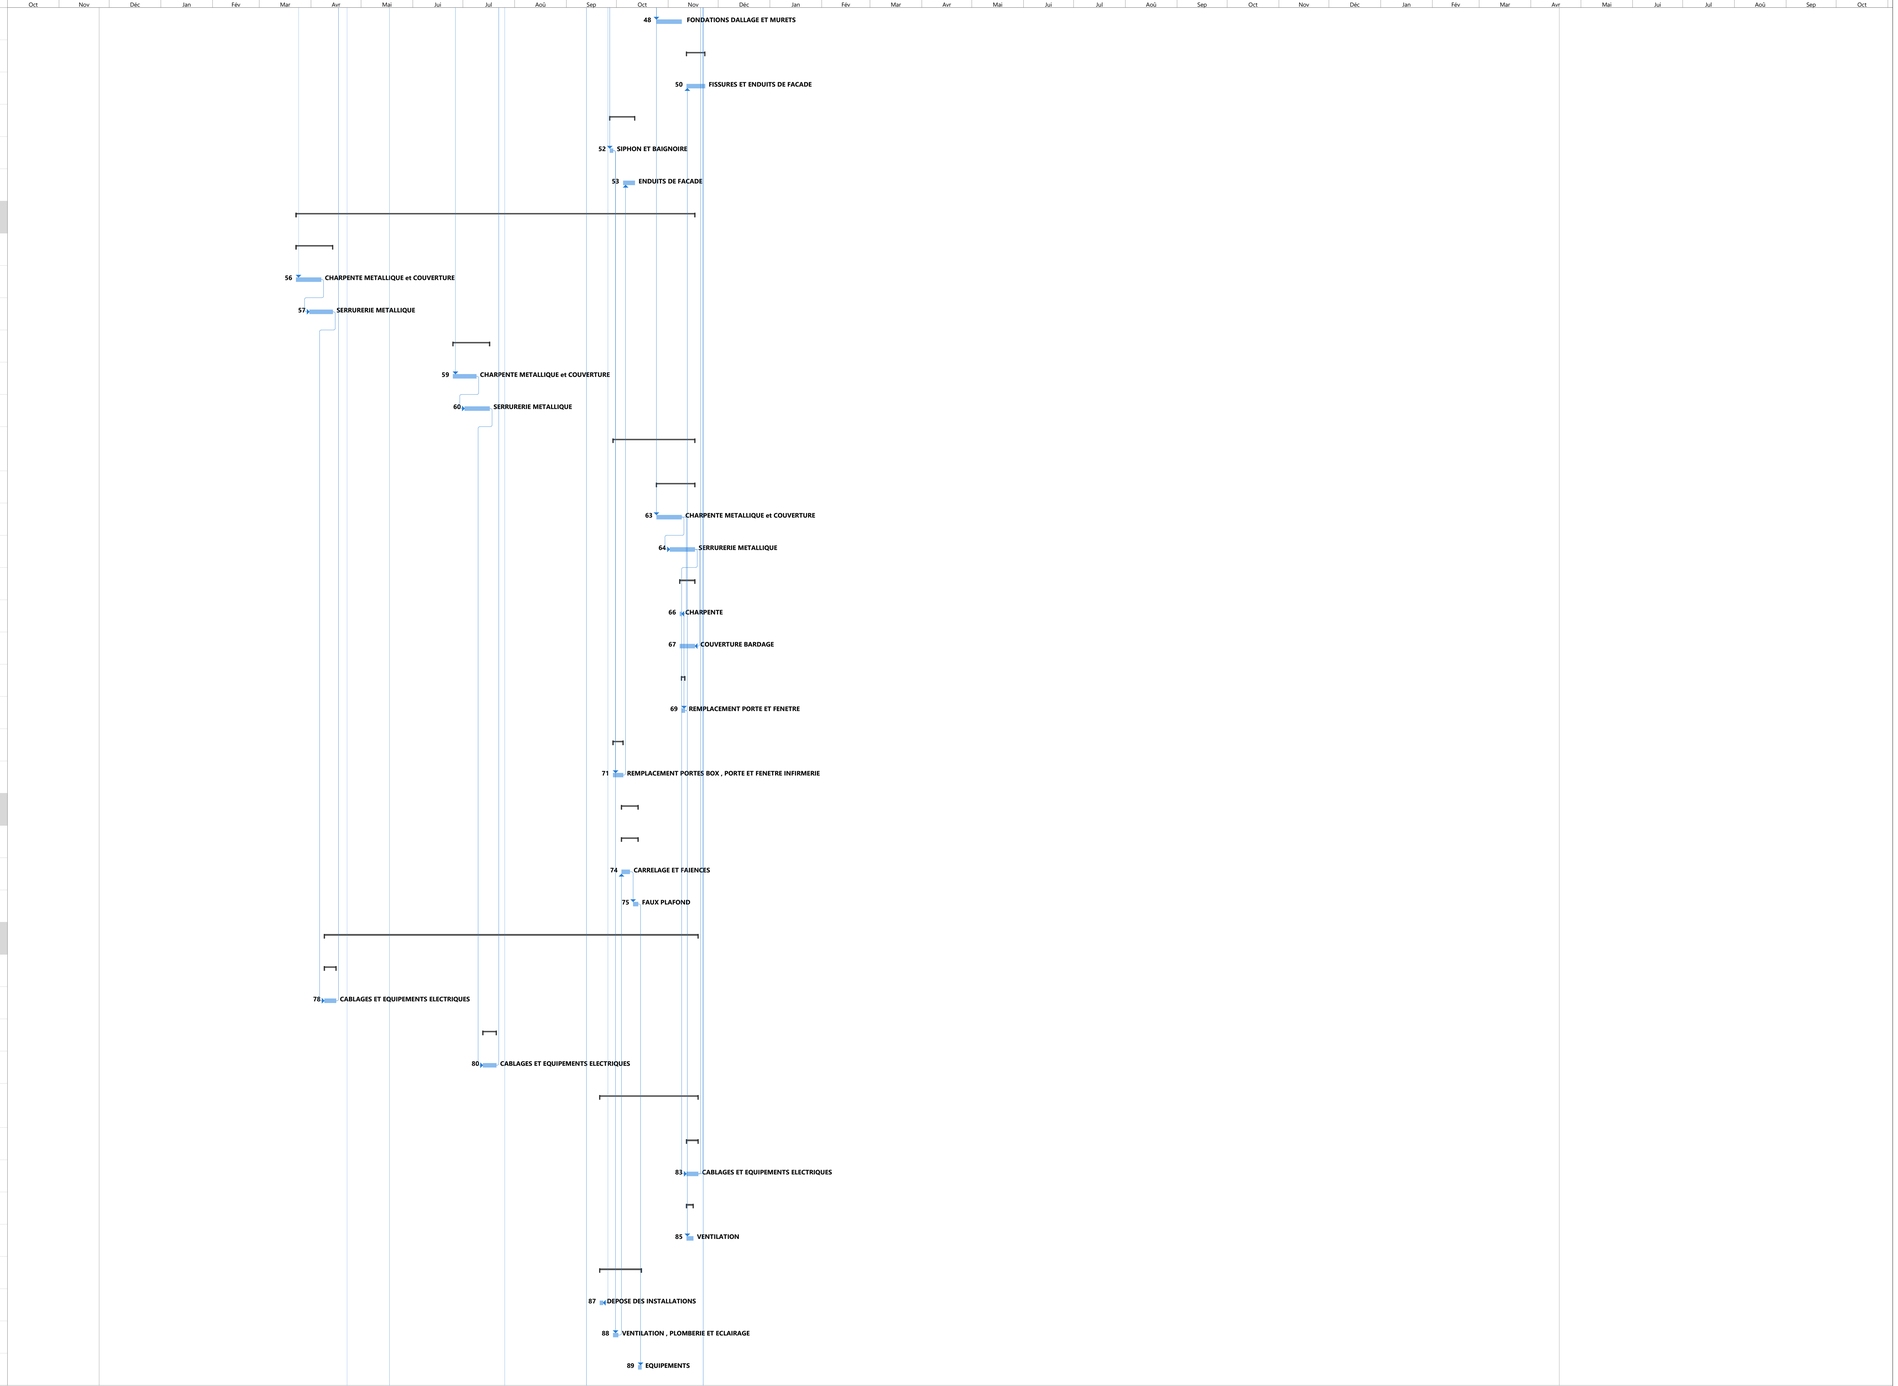


Projet : Calendrier Standard av
Date : Ven 14/08/26

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle

ESID DE LYON
460 217 - POLEYMIEUX AU MONT D'OR - BA942
Réhab bâtiment 022 et mise en conformité des courettes du chenil
CALENDRIER DCE

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
90		**RECEPTIONS PARTIELLES PHASES 1,2 et 3**	**157 jrs**	**Mer 21/04/27**	**Jeu 23/12/27**
91		**PHASE 1 : COURETTES 60 TRAVEE 5 ET AIRE PANSAGE 0103 + DETENTE 0106**	**17 jrs**	**Mer 21/04/27**	**Ven 14/05/27**
92		**RECEPTION PARTIELLE**	**3 jrs**	**Mer 21/04/27**	**Ven 23/04/27**
93		**LEVEE DE RESERVES**	**9 jrs**	**Lun 26/04/27**	**Ven 07/05/27**
94		**MISE A DISPOSITION**	**1 jr**	**Lun 10/05/27**	**Lun 10/05/27**
95		**EMMENAGEMENT COURETTE 60 TRAVEE 5 ET DEMENAGEMENT COURETTES 60 TRAVEES 3/4**	**5 jrs**	**Lun 10/05/27**	**Ven 14/05/27**
96		**PHASE 2 : COURETTES 60 TRAVEE 3 et 4**	**20 jrs**	**Lun 26/07/27**	**Ven 10/09/27**
97		**RECEPTION PARTIELLE**	**3 jrs**	**Lun 26/07/27**	**Mer 28/07/27**
98		**LEVEE DE RESERVES**	**10 jrs**	**Jeu 29/07/27**	**Mer 01/09/27**
99		**MISE A DISPOSITION**	**2 jrs**	**Jeu 02/09/27**	**Ven 03/09/27**
100		**EMMENAGEMENT COURETTES 60 TRAVEES 3/4 et DEMENAGEMENT COURETTES 60 TRAVEES 1/2**	**5 jrs**	**Lun 06/09/27**	**Ven 10/09/27**
101		**PHASE 3 : COURETTES 60 TRAVEES 1 ET 2 + AIRE D'ENTRAINEMENT + AUVENT CASIER**	**24 jrs**	**Lun 22/11/27**	**Jeu 23/12/27**
102		**RECEPTION PARTIELLE**	**3 jrs**	**Lun 22/11/27**	**Mer 24/11/27**
103		**LEVEE DE RESERVES**	**10 jrs**	**Jeu 25/11/27**	**Mer 08/12/27**
104		**MISE A DISPOSITION**	**5 jrs**	**Jeu 09/12/27**	**Mer 15/12/27**
105		**DEMENAGEMENT UTILISATEURS ET EMMENAGEMENT COURETTE 1/2**	**6 jrs**	**Jeu 16/12/27**	**Jeu 23/12/27**

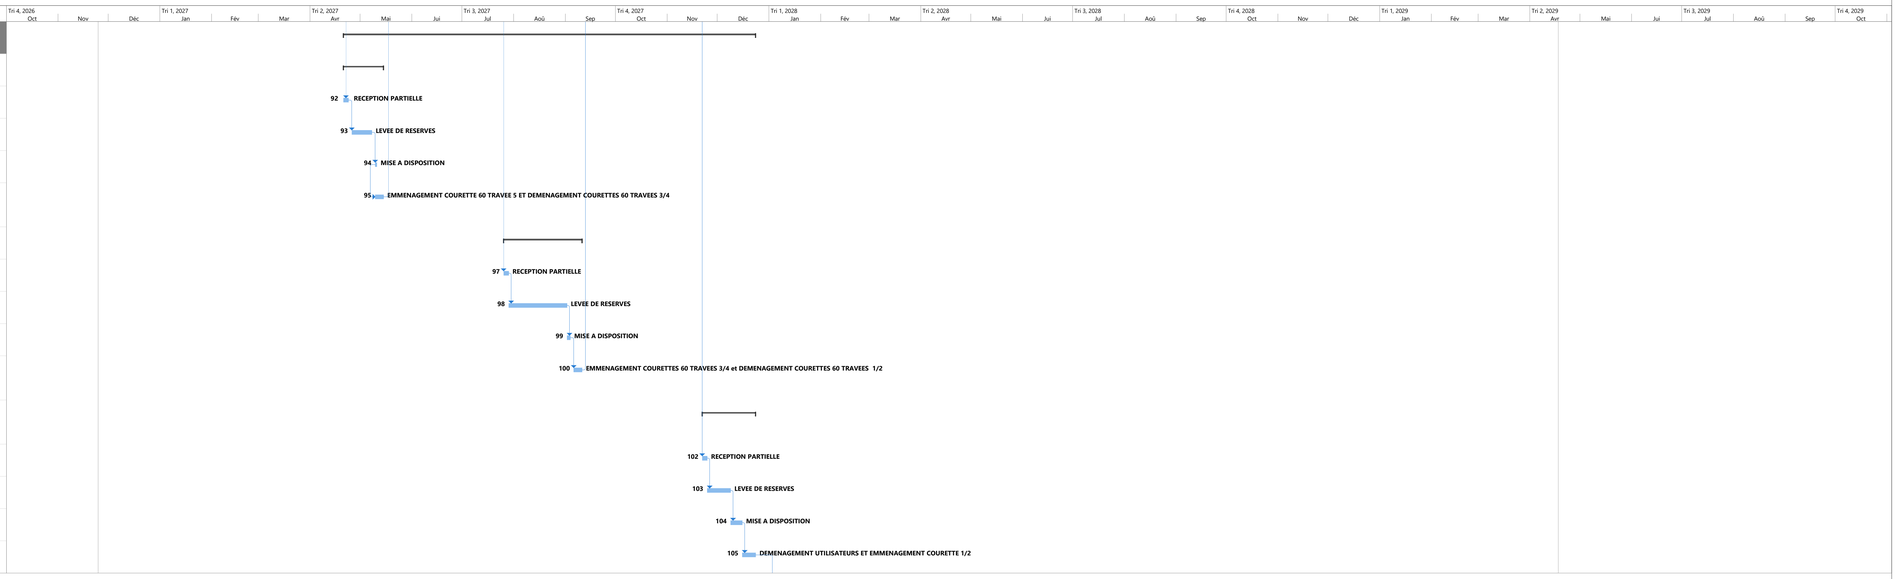


Projet : Calendrier Standard av
Date : Ven 14/08/26

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle

ESID DE LYON
460 217 - POLEYMIEUX AU MONT D'OR - BA942
Réhab bâtiment 022 et mise en conformité des courettes du chenil
CALENDRIER DCE

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
106		**PHASE 4 : BATIMENT 022**	267 jrs	Lun 03/01/28	Ven 16/02/29
107		**lot N° 01A DEMOLITION / DESAMIANTAGE**	30 jrs	Lun 10/01/28	Ven 18/02/28
108		PRE-CURAGE ET DESAMIANTAGE	30 jrs	Lun 10/01/28	Ven 18/02/28
109		**lot N° 01B TERRASSEMENT / VRD**	128 jrs	Lun 20/03/28	Jeu 12/10/28
110		CURAGE ET DEMOLITION	10 jrs	Lun 20/03/28	Ven 31/03/28
111		VRD CUVE EP ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS	14 jrs	Lun 25/09/28	Jeu 12/10/28
112		**Lot N° 02 GROS OEUVRE**	261 jrs	Lun 03/01/28	Jeu 08/02/29
113		CLOTURES DE CHANTIER	5 jrs	Lun 03/01/28	Ven 07/01/28
114		FONDATIONS SPECIALES	20 jrs	Lun 21/02/28	Ven 17/03/28
115		GO	40 jrs	Lun 03/04/28	Jeu 01/06/28
116		REPLI BASE VIE ET DES CLOTURES DE CHANTIER	4 jrs	Lun 05/02/29	Jeu 08/02/29
117		**Lot N° 03 CLOS COUVERT BATIMENT**	64 jrs	Ven 02/06/28	Ven 22/09/28
118		ETANCHEITE	5 jrs	Ven 02/06/28	Ven 09/06/28
119		CHARPENTE	15 jrs	Ven 02/06/28	Ven 23/06/28
120		COUVERTURE	9 jrs	Lun 26/06/28	Jeu 06/07/28
121		MENUISERIES EXTERIEURES	15 jrs	Ven 07/07/28	Ven 28/07/28
122		FACADES	25 jrs	Lun 31/07/28	Ven 22/09/28
123		**Lot N° 05 AMENAGEMENTS INTERIEURS**	123 jrs	Lun 31/07/28	Ven 16/02/29
124		PLATRERIE	30 jrs	Lun 31/07/28	Ven 29/09/28
125		CHAPES	10 jrs	Lun 02/10/28	Ven 13/10/28
126		MENUISERIES INTERIEURES	43 jrs	Lun 25/09/28	Jeu 23/11/28
127		REVETEMENTS DE SOL DUR ET MURAUX	19 jrs	Mar 14/11/28	Ven 08/12/28
128		PEINTURE	29 jrs	Lun 11/12/28	Ven 26/01/29
129		REVEMENTS DE SOLS SOUPLES	15 jrs	Lun 29/01/29	Ven 16/02/29
130		FINITIONS TCE	10 jrs	Lun 29/01/29	Ven 09/02/29
131		NETTOYAGE OPR	3 jrs	Lun 12/02/29	Mer 14/02/29
132		**Lot N° 06 LOTS TECHNIQUES**	147 jrs	Lun 12/06/28	Ven 02/02/29
133		PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILLATION	137 jrs	Lun 12/06/28	Ven 19/01/29
134		ELECTRICITE COURANT CORT COURANT FAIBLES	78 jrs	Lun 25/09/28	Ven 19/01/29
135		ESSAIS ET MISES EN SERVICE	10 jrs	Lun 22/01/29	Ven 02/02/29
136		RECEPTION	43 jrs	Mer 14/02/29	Mar 17/04/29
137		FIN DES TRAVAUX	0 jr	Mer 14/02/29	Mer 14/02/29
138		OPR	20 jrs	Jeu 15/02/29	Mer 14/03/29
139		NETTOYAGE DE LIVRAISON	3 jrs	Jeu 15/03/29	Lun 19/03/29
140		RECEPTION	1 jr	Mar 20/03/29	Mar 20/03/29
141		EMENAGEMENT UTILISATEURS	14 jrs	Mer 21/03/29	Mar 10/04/29
142		REPLI DU GROUPE MODULAIRE, STOCKAGE CYNO ET REMISE EN ETAT DU TERRAIN	5 jrs	Mer 11/04/29	Mar 17/04/29

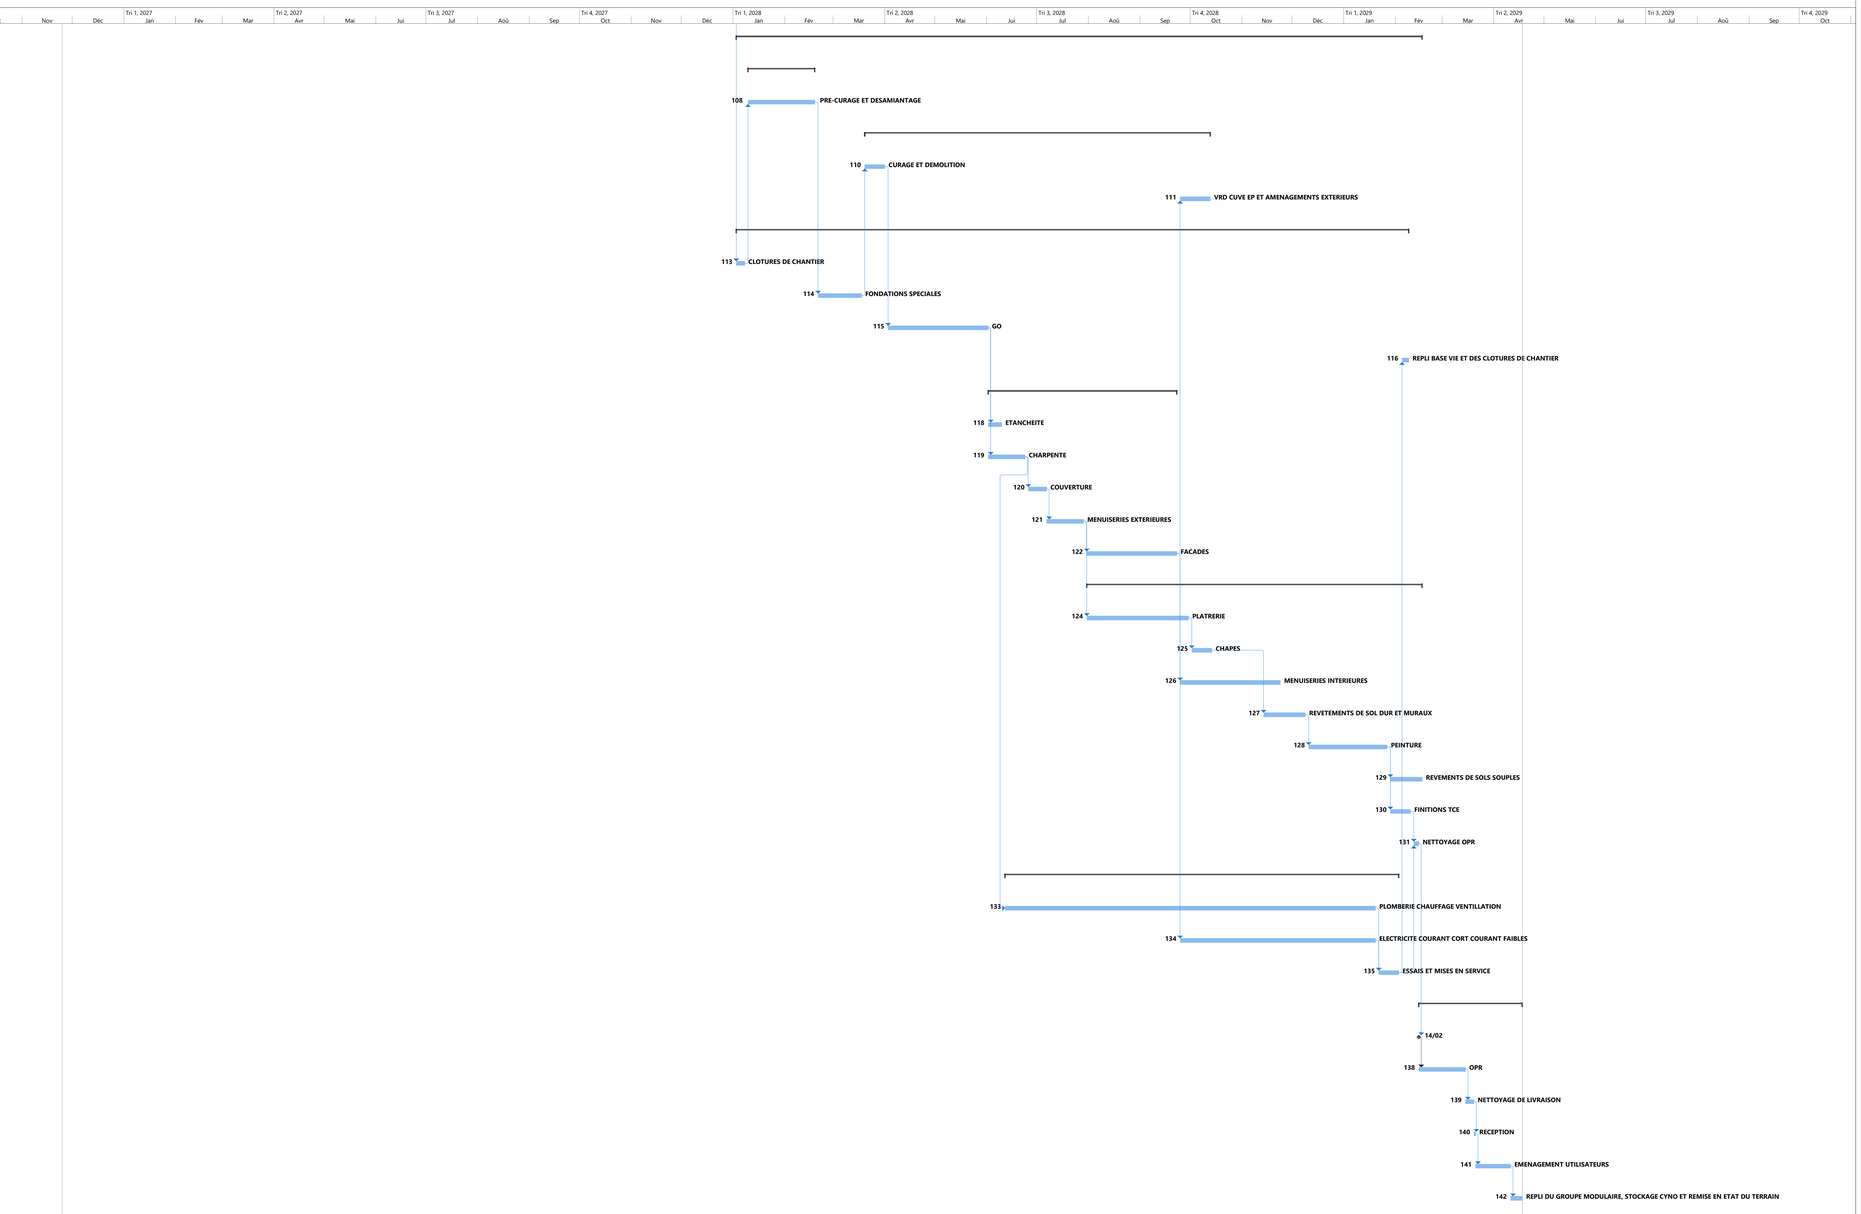

Projet : Calendrier Standard av
Date : Ven 14/08/26

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle
