BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP RAA
Rue du bois joli
CS90002
63801 COURNON D'AUVERGNE

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28730054/S2/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 13/07/2026

Référence au programme de travaux :
Mail client Mail du 13/10/2025 réalisé le 13/10/2025 par IMI (CNE) Maxime KINDEL

DONNEUR D'ORDRE

SID SUD EST

MAXIME KINDEL
BA 942
courettes du chenil
69250 POLEYMIEUX AU MONT D OR

SITE D'INTERVENTION

RHEABILITATION DU CHENIL POLEYMIEUX

BA 942
69250 POLEYMIEUX AU MONT D OR

0022

Latitude : 45.856200 / Longitude : 4.800000

Date(s) d'intervention(s) :
Le 16/10/2025 ; Le 02/06/2026 ; Le 15/02/2023



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Ludovic FRANCOIS	Chargé d'affaires	Certification N° 13777640	Ludovic FRANCOIS

Le présent rapport comporte 42 pages, dont 23 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 6
2.2. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Conditions spécifiques 9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 19

7. ANNEXES **20**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 20
7.2. Photos prélèvements 21
7.3. Photos prélèvements antérieurs 25
7.4. Photos observations 26
7.5. Attestation d'assurance 27
7.6. Certificat de compétence 29
7.7. Croquis de repérage 30
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire 34

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

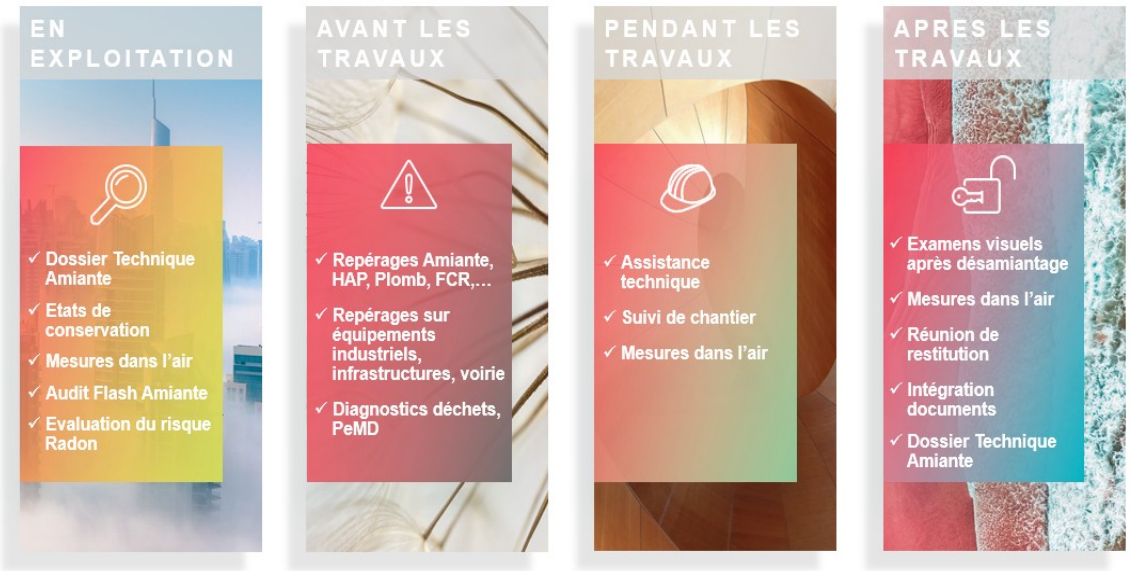

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Rénovation complète (sols, murs et plafonds)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits de fumée, Conduits eaux pluviales, Conduits eaux usées
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels (façade)
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bacs fibrociment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis fenêtres fibrociment, Coffrages perdus, Colle, Colles carrelage, Colles faïence, Colles pâte de verre, Couvre-joints, Enduits pelliculaires façades, Enduits projetés/crépis façades, Garnissage joints dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints carrelage, Joints dilatation, Joints faïence, Joints pâte de verre, Maçonnerie silico-calcaire, Peintures façades, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés sous bardage, Flocages sous bardage
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Plinthes	Peintures plinthes

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Portes	Peintures
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs portes, Joints bandes portes, Joints portes, Joints tresses portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits projetés charpente, Enduits projetés/talochés charpente, Flocages charpente, Joints charpentes, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures charpente, Peintures intumescentes charpente, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres
Suspentes et contrevents	Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements clapets CF, Clapets CF, Joints clapets CF, Lames clapets CF, Rebouchages clapets CF, Tunnels clapets CF
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité trappes, Vidoirs en fibrociment
Volets coupe-feu	Calfeutrements volets CF, Ossature volets CF, Rebouchages volets CF, Volets CF

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
1	Bât 022 avt tx 28730054	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Beige
9	Bât 022 avt tx 28730054	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Gris
10	Bât 022 avt tx 28730054				
8	Bât 022 avt tx 28730054	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Gris
9	Bât 022 avt tx 28730054	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	Blanc
10	Bât 022 avt tx 28730054				
8	Bât 022 avt tx 28730054	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	Blanc
23	Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 01	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir
22	Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 02				
24	Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 03				
23	Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 01	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert
22	Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 02	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Noir
24	Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 03	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige

Copyright BUREAU VERITAS

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : RHEABILITATION DU CHENIL POLEYMIEUX
BA 942
69250 POLEYMIEUX AU MONT D OR

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
RHEABILITATION DU CHENIL POLEYMIEUX	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
MAXIME KINDEL	Donneur d'ordre	SID SUD EST	BA 942 courettes du chenil 69250 POLEYMIEUX AU MONT D OR	04.83.08.15.08 - 07.88.71.71.06

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 16/10/2025
Le 02/06/2026
Le 15/02/2023

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Mail client	IMI (CNE) Maxime KINDEL	13/10/2025	Mail du 13/10/2025	/
Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Bureau Veritas Exploitation SAS - Romain FERRERI	01/03/2023	15809385/S1.6.2.R	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bât 022 avt tx 28730054	Plafonds	Enduits projetés plafonds	Epais	Blanc	12	P17* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits projetés plafonds	Epais	Blanc	12	P18 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Gris	8	P9* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	Blanc	8	P9* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mortier	Gris	8	P10 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Enduit	Blanc	8	P10 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Gris	9	P11* P	/	AN	/	*Oui*

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bât 022 avt tx 28730054	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	Blanc	9	P11* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Gris	9	P12 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	Blanc	9	P12 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Gris	10	P13* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	Blanc	10	P13* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	Gris	10	P14 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Enduit	Blanc	10	P14 P	/	AN	/	*Oui*
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Beige	1	P1* P	/	AN	/	*Oui*
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Compact	Beige	1	P2 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Beige	13	P19* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Beige	13	P19* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	Beige	13	P20 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Beige	13	P20 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Blanc	14	P21* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bât 022 avt tx 28730054	Revêtements de sol	Joints carrelage	Enduit	Gris	14	P21* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Mortier	Blanc	14	P22 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Enduit	Gris	14	P22 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	6	P5* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	6	P6 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Epais	Blanc	11	P15* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Epais	Blanc	11	P16 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Souple	Noir	7	P7* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Souple	Noir	7	P8 N	/	AN	/	Non
Bât 022 avt tx 28730054 -> Vide sanitaire	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Orange	2	P3* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	2	P3* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Orange	2	P4 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	2	P4 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bât 022 avt tx 28730054 -> Toiture	Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés	Bitumineux	Noir	15	P26_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P26	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés	Bitumineux	Noir	15	P27_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P27	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	Noir	16	P28_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P28	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	Noir	16	P29_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P29	Non
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 01	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	23	P12_antP	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P12	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 01	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	23	P12_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P12	***Oui***
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	23	P13_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P13	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	23	P13_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P13	***Oui***
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 02	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Noir	22	P2_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P2	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	22	P2_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P2	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 02	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Noir	22	P3_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P3	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	22	P3_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P3	***Oui***
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Noir	22	P4_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P4	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	22	P4_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P4	***Oui***
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Noir	22	P5_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P5	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 02	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	22	P5_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P5	***Oui***
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Compact	Gris	17	P25_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P25	Non
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 03	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	24	P14_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P14	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	24	P14_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P14	***Oui***
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	24	P15_ant P	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P15	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 03	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	24	P15_antP	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P15	*Oui*
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 08	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Compact	Blanc	18	P23_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P23	Non
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Compact	Blanc	20	P19_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P19	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	21	P17_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P17	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	21	P18_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P18	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 10	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	19	P10_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P10	Non
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 11	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Compact	Gris	17	P24_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P24	Non
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 13	Plafonds	Enduits projetés/talochés plafonds	Compact	Blanc	18	P22_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P22	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	19	P11_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P11	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Compact	Blanc	20	P1_antN	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/03/2023 Prélèvement antérieur : P1	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
8	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	45 ml
8	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	45 ml
9	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	25 ml
9	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	25 ml
10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	25 ml
10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	25 ml
1	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	2 m²
22	Revêtements de sol	Dalles de sol	25 m²
22	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	25 m²
23	Revêtements de sol	Dalles de sol	10 m²
23	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	10 m²
24	Revêtements de sol	Dalles de sol	18 m²
24	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	18 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bât 022 avt tx 28730054	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Vide sanitaire	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Toiture	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 01	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 02	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 03	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 04	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 05	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 07	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 08	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 09	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 10	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 11	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 12	/
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 13	/

7.2. Photos prélèvements

P2	ZPSO 1
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P3	ZPSO 2
Bât 022 avt tx 28730054 -> Vide sanitaire	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) | Enveloppes de calorifuges	

P4	ZPSO 2
Bât 022 avt tx 28730054 -> Vide sanitaire	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) | Enveloppes de calorifuges	

P5	ZPSO 6
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P6	ZPSO 6
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P7	ZPSO 7
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	


P8	ZPSO 7
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P9	ZPSO 8
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P10	ZPSO 8
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe	

P11	ZPSO 9
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P12	ZPSO 9
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

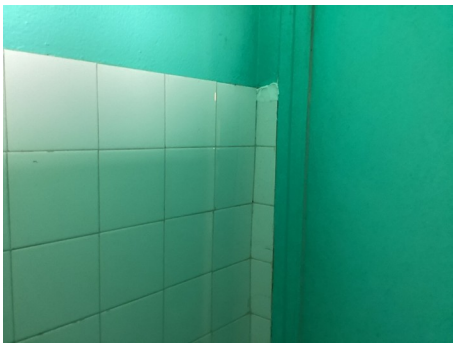P13	ZPSO 10
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

Copyright BUREAU VERITAS

P14	ZPSO 10
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P15	ZPSO 11
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés murs (Liste B)	

P16	ZPSO 11
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés murs (Liste B)	

P17	ZPSO 12
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Plafonds -> Enduits projetés plafonds (Liste B)	

P18	ZPSO 12
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Plafonds -> Enduits projetés plafonds (Liste B)	

P19	ZPSO 13
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses	

P20	ZPSO 13
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses	

P21	ZPSO 14
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

P22	ZPSO 14
Bât 022 avt tx 28730054	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

7.3. Photos prélèvements antérieurs

P2_ant	ZPSO 22
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 02	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles bitumineuses	

P3_ant	ZPSO 22
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 02	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles bitumineuses	


P12_ant	ZPSO 23
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 01	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles bitumineuses	

P13_ant	ZPSO 23
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 01	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles bitumineuses	

P14_ant	ZPSO 24
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 03	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles bitumineuses	

P15_ant	ZPSO 24
Bât 022 avt tx 28730054 -> Local 03	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles bitumineuses	

7.4. Photos observations

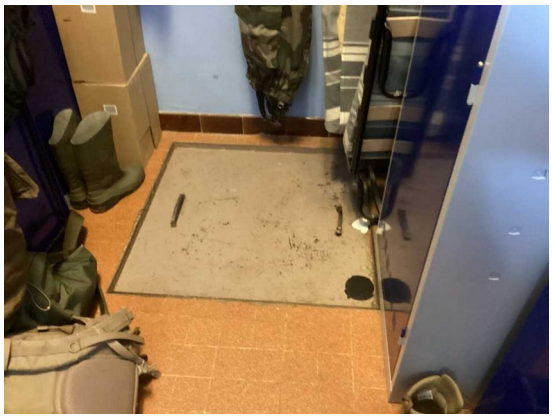Bât 022 avt tx 28730054 -> Vide sanitaire	OBS 1
Autre	
Vide sanitaire	
	**Observation :** Vide sanitaire non visité dans son ensemble (uniquement visible à partir de la trappe d'accès)

7.5. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat attribué à

Ludovic FRANCOIS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date : 31/03/2026
Numéro du certificat : **13777640**

Samuel DUPRIEU - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RHEABILITATION DU CHENIL POLEYMIEUX BA 942 69250 POLEYMIEUX AU MONT D OR	
Localisation Bât 022 avt tx 28730054	Date visite	Le 15/02/2023
	Auteur	Ludovic FRANCOIS
	N° dossier	28730054/S2/1
	Planche	1 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Colles plinthe,Joints plinthe
- Colles faïence,Joints faïence
- Mastic de vitrage
- Dalles de sol (Liste B),Colles bitumineuses

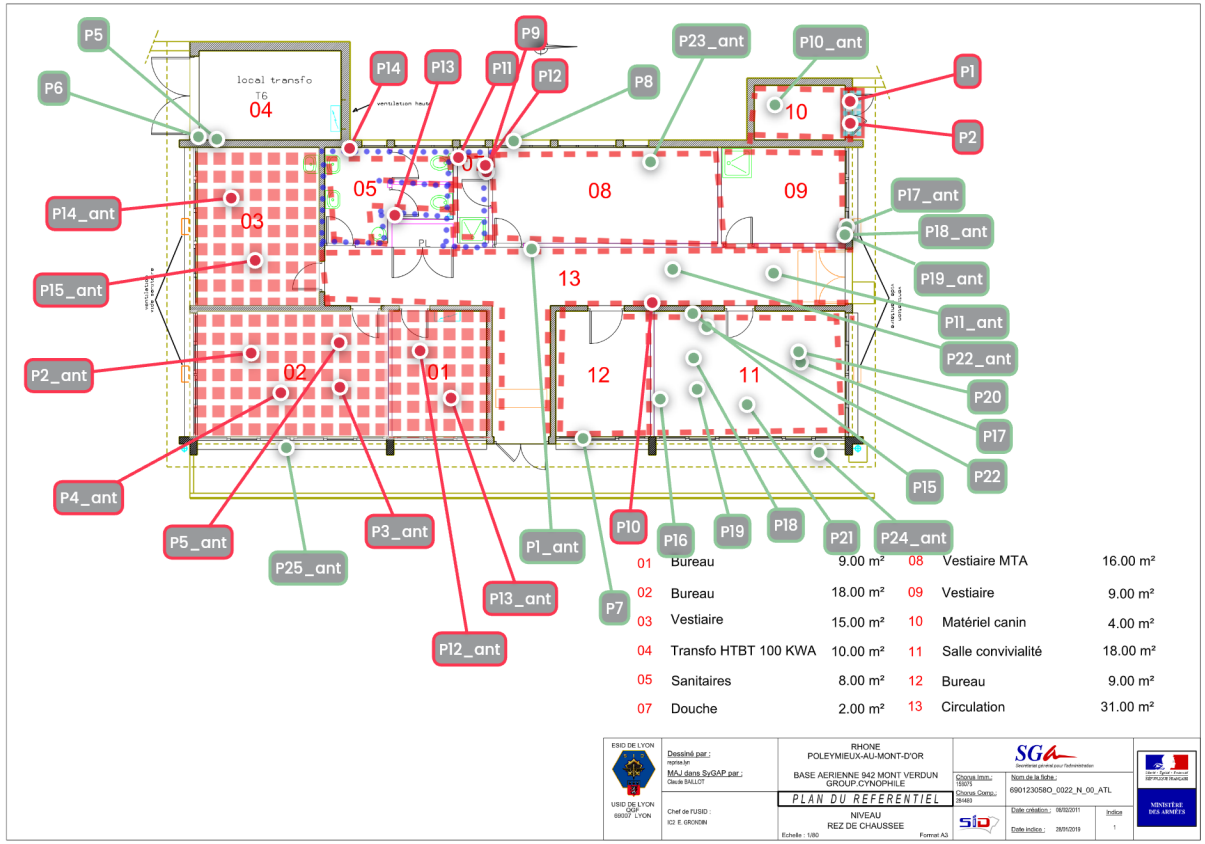

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RHEABILITATION DU CHENIL POLEYMIEUX BA 942 69250 POLEYMIEUX AU MONT D OR	
Localisation Bât 022 avt tx 28730054 > Vide sanitaire	Date visite	Le 15/02/2023
	Auteur	Ludovic FRANCOIS
	N° dossier	28730054/S2/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

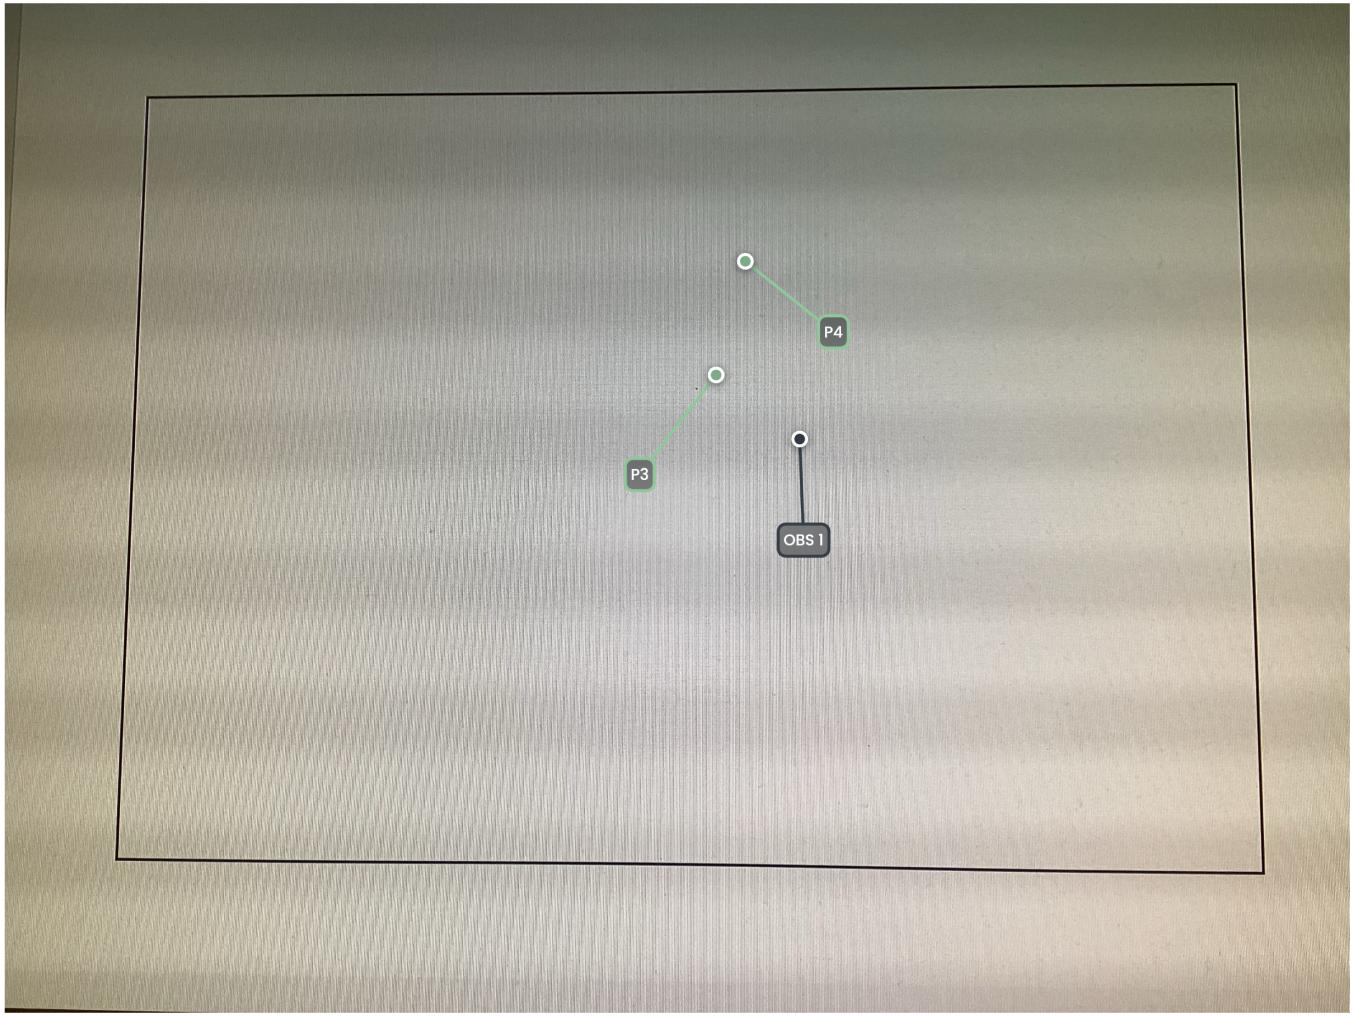

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RHEABILITATION DU CHENIL POLEYMIEUX BA 942 69250 POLEYMIEUX AU MONT D OR	
Localisation Bât 022 avt tx 28730054 > Toiture	Date visite	Le 15/02/2023
	Auteur	Ludovic FRANCOIS
	N° dossier	28730054/S2/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

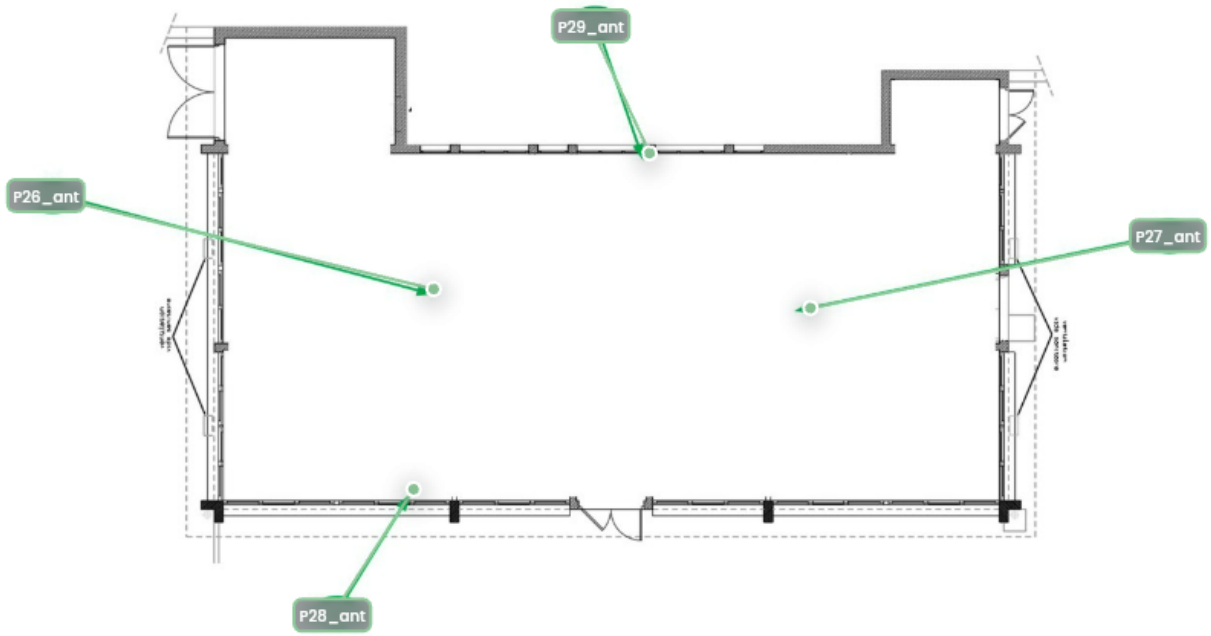

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Ludovic FRANCOIS
Rue du Bois Jolie - CS 90002
63801 COURNON D'AUVERGNE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-054998-01 | Date d'émission de rapport : 29/10/2025 11:34 |
Dossier N° : 25Y028504 | Date de réception : 23/10/2025 | Date d'analyse : 28/10/2025
Référence dossier Client:1510797822/28730054/S2/1/2_28730054/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3KC9050 Réf. Prel : P1 Bât 022 avt tx 28730054/Menuiseries extérieures - (Compact/Beige)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	BV3KC9051 Réf. Prel : P2 Bât 022 avt tx 28730054/Menuiseries extérieures - (Compact/Beige)	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	BV3KC9052 Réf. Prel : P3 Bât 022 avt tx 28730054 - Vide sanitaire/Conduits - (Laine de verre/Orange)	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (orange)	**MOLP** * / FS4F	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
004	BV3KC9053 Réf. Prel : P4 Bât 022 avt tx 28730054 - Vide sanitaire/Conduits - (Laine de verre/Orange)	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-054998-01 | Date d'émission de rapport : 29/10/2025 11:34 |
Dossier N° : 25Y028504 | Date de réception : 23/10/2025 | Date d'analyse : 28/10/2025
Référence dossier Client:1510797822/28730054/S2/1/2_28730054/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (orange)	**MOLP** * / FS4F	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
005	BV3KC9054 Réf. Prel : P5 Bât 022 avt tx 28730054/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3KC9055 Réf. Prel : P6 Bât 022 avt tx 28730054/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B


ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-054998-01 | Date d'émission de rapport : 29/10/2025 11:34 | Page3/3
Dossier N° : 25Y028504 | Date de réception : 23/10/2025 | Date d'analyse : 28/10/2025
Référence dossier Client:1510797822/28730054/S2/1/2_28730054/2/1

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Géraldine JOURJON
Référent(e) Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Ludovic FRANCOIS
Rue du Bois Jolie - CS 90002
63801 COURNON D'AUVERGNE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-027783-01 | Date d'émission de rapport : 15/06/2026 13:47 |
Dossier N° : 26Y015894 | Date de réception : 08/06/2026 | Date d'analyse : 11/06/2026
Référence dossier Client:1510797822/28730054/S2/1/3_28730054/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	BV3NU6047 Réf. Prel : P7 Bât 022 avt tx 28730054/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Souple/Noir)	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	BV3NU6048 Réf. Prel : P8 Bât 022 avt tx 28730054/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Souple/Noir)	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3NU6049 Réf. Prel : P9 Bât 022 avt tx 28730054/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	BV3NU6050 Réf. Prel : P10 Bât 022 avt tx 28730054/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe / Joints de plinthe - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-027783-01 | Date d'émission de rapport : 15/06/2026 13:47 | Page2/5
Dossier N° : 26Y015894 | Date de réception : 08/06/2026 | Date d'analyse : 11/06/2026
Référence dossier Client:1510797822/28730054/S2/1/3_28730054/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	BV3NU6051 Réf. Prel : P11 Bât 022 avt tx 28730054/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET** * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006 (1)	BV3NU6052 Réf. Prel : P12 Bât 022 avt tx 28730054/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	BV3NU6053 Réf. Prel : P13 Bât 022 avt tx 28730054/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (ii)	**MET** * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	BV3NU6054 Réf. Prel : P14 Bât 022 avt tx 28730054/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (ii)	**MET** * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
009	BV3NU6055 Réf. Prel : P15 Bât 022 avt tx 28730054/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-027783-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2026 13:47 Page3/5
Dossier N° : 26Y015894 Date de réception : 08/06/2026 Date d'analyse : 11/06/2026
Référence dossier Client:1510797822/28730054/S2/1/3_28730054/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	BV3NU6056 Réf. Prel : P16 Bât 022 avt tx 28730054/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	BV3NU6057 Réf. Prel : P17 Bât 022 avt tx 28730054/Plafonds : Enduits projetés (Liste B) - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	BV3NU6058 Réf. Prel : P18 Bât 022 avt tx 28730054/Plafonds : Enduits projetés (Liste B) - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	BV3NU6059 Réf. Prel : P19 Bât 022 avt tx 28730054/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)(ii)	**MET** * / YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	BV3NU6060 Réf. Prel : P20 Bât 022 avt tx 28730054/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses - (Lé/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-027783-01 | Date d'émission de rapport : 15/06/2026 13:47 | Page4/5
Dossier N° : 26Y015894 | Date de réception : 08/06/2026 | Date d'analyse : 11/06/2026
Référence dossier Client:1510797822/28730054/S2/1/3_28730054/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (1)	BV3NU6061 Réf. Prel : P21 Bât 022 avt tx 28730054/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Blanc)	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	BV3NU6062 Réf. Prel : P22 Bât 022 avt tx 28730054/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / THR6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-027783-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2026 13:47 Page5/5
Dossier N° : 26Y015894 Date de réception : 08/06/2026 Date d'analyse : 11/06/2026
Référence dossier Client:1510797822/28730054/S2/1/3_28730054/2/1

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Céline PONCELET
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS
