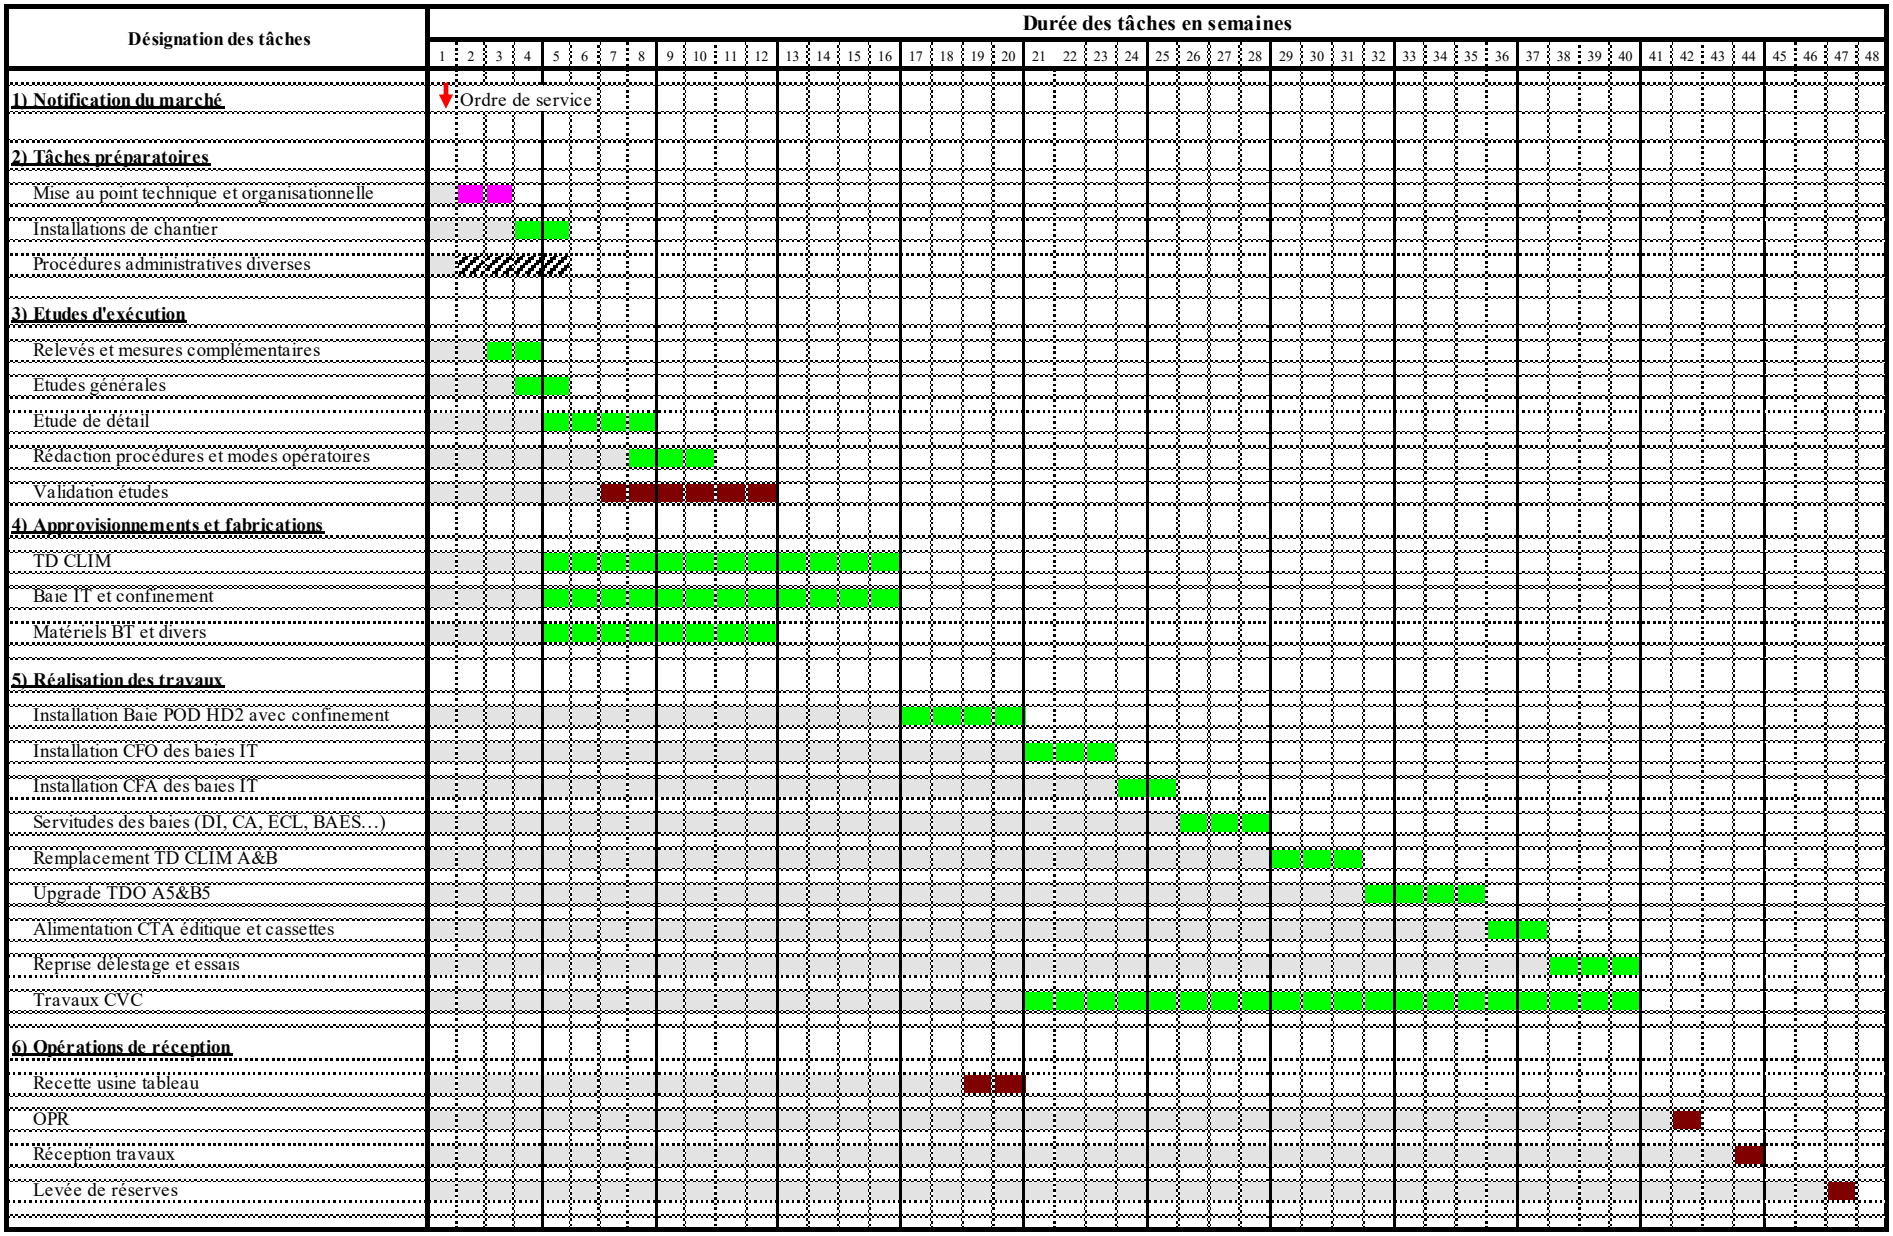
Désignation des tâches
Durée des tâches en semaines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1) Notification du marché
Ordre de service
2) Tâches préparatoires
Mise au point technique et organisationnelle
Installations de chantier
Procédures administratives diverses
3) Etudes d'exécution
Relevés et mesures complémentaires
Etudes générales
Etude de détail
Rédaction procédures et modes opératoires
Validation études
4) Approvisionnements et fabrications
TD CLIM
Baie IT et confinement
Matériels BT et divers
5) Réalisation des travaux
Installation Baie POD HD2 avec confinement
Installation CFO des baies IT
Installation CFA des baies IT
Servitudes des baies (DI, CA, ECL, BAES…)
Remplacement TD CLIM A&B
Upgrade TDO A5&B5
Alimentation CTA éditique et cassettes
Reprise délestage et essais
Travaux CVC
6) Opérations de réception
Recette usine tableau
OPR
Réception travaux
Levée de réserves
