FAUCHÉ Maintenance

Agence Maintenance Méditerranée

04 13 94 32 14 – maintenance-mediterranee@fauche.com
ZI les Estroublans – 6 rue de Madrid – 13127 Vitrolles
SIRET 308 250 570 00857

RAPPORT D'INTERVENTION

N°	313064

Information site		Information client	
Civ./Type	STE	**Code**	GRC30112
Localisation	Site : [S_141] CANJUERS - CFO	**Groupe**	ESID LYON
Adresse	QUARTIER CANJUERS 83131 MONTFERRAT	**Nom**	ESID DE LYON
Tél		**Adresse**	22 AVENUE LECLERC BP 400 69007 LYON--7E--ARRONDISSEMENT
Contrats	P2	**Tél.**	
Télésurveillance	Non	**Email**	
24/24	Oui		

Détail du contrat lié à l'intervention

Numéro	2423 - CFO - CANJUERS
Intitulé	CONTRAT CFO HT/BT
Code/Type	[CO_6] Contrat Maintenance 24/24 Mono Equipement

Détail de l'intervention

Type d'intervention	Préventif		
Agence	ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE JP. FAUCHÉ > FAUCHE MAINTENANCE MEDITERRANEE		
Passages prévus	le 02/09/2025 de 08h00 à 10h00	**Intervenant**	Julien TALLANDIER
Pris en charge le	04/09/2025 à 06h55		
Réalisé le	04/09/2025 de 13h00 à 17h00	**Intervenant**	Anthony BAUDOIN
Activité	GAMME TGBT/TD DRAGUIGNAN - ENS BT 013 CNJ		
Domaine d'activité			
Objet			
Réf. contrat			

Bat 013

Parties communes

Equipement	Désignation	ENS BT 013 CNJ
	Code	EQP_5796
	Situé dans	Parties communes

Activité

- ☑ GAMME TGBT/TD DRAGUIGNAN
- ☑ *Contrôle de l''équilibrage des phases (général armoire)*
- ☑ *Contrôle des appareils de mesure en façade*
- ☑ *Contrôle des liaisons équipotentielles*

- ☑ *Contrôle du serrage des connexions et de l''état des conducteurs de protection*
- ☑ *Dépoussiérage et nettoyage de la tôlerie externe et interne*
- ☑ *Essai dispositif différentiel disjoncteurs par action sur bouton test*
- ☑ *Graissage du sectionneur général*
- ☑ *Rapport de vérification*
- ☑ *Relevé de l''intensité et de la tension (général armoire)*
- ☑ *Relevé de l''isolement général et identification du ou des départs en défauts (<50k)*
- ☑ *Relevé des compteurs*
- ☑ *Vérification absence de traces d''échauffement visuel*
- ☑ *Vérification automatisme : relayage, temporisation, horloge, automate, sécurité, etc.…*
- ☑ *Vérification chargeur : connexions, tension, intensité, batterie, cosses, bornes, fonctionnement, nettoyage de l'ensemble*
- ☑ *Vérification de l''aspect général*
- ☑ *Vérification de la présence des schémas et plans*
- ☑ *Vérification de la signalisation et remplacement voyants*
- ☑ *Vérification des calibrages (disjoncteurs, relais thermiques, fusibles) par rapport au plan*
- ☑ *Vérification du respect de l''étanchéité (IP)*
- ☑ *Vérification fonctionnement Contrôleur Permanent d''Isolement en régime IT*
- ☑ *Vérification fonctionnement de l''arrêt d''urgence*
- ☑ *Vérification position des commutateurs de sélection auto/arrêt/manu et essai*
- ☑ *Contrôle des para-surtenseurs et des parafoudres*
- ☑ *Relevé de l''isolement général et identification du ou des départs en défauts (*

Mesures

Nombre de TD :

Nombre de TGBT :

Commentaire

Commentaires precedents

Par Julien TALLANDIER le 02/09/2025 17:00:00 :

Bilan de l'intervention

Par Julien TALLANDIER le 02/09/2025 à 17:00:00 : CNJ Bat 013 Cvpo Septembre 2025

Rem : pas d'autorisation de coupure, donc pas de test des differentiels ni des arrêt d'urgence.

Contrôle, resserrage et nettoyage des armoires suivantes :

TGBT (Armoire REZ) :
Rem : forte odeur désagréable dans le local.

Le disjoncteur d'ecl "non repéré" C16A 1P+N est de la gamme declic et a un pdc insufisant
- Prévoir de le remplacer par un disjoncteur C16 1P+N avec pdc de 4.5kA

TD Tableau Divisionnaire :
Rajout des disjoncteurs manquants sur les plans électriques : ok

L'inter-diff "caméra" ainsi que ces 3 disjoncteurs C16A 1P+N sont de la gamme dclic et ont un pdc insufisant
- Prévoir se les remplacer par identiques avec pdc de 6kA

TD R+1 :
Les 2 disj C25A 4P "Plancha 1" et "Plancha 2" sont alimentés en 1.5? et d'origine inconnue
- Prévoir de reprendre les cables d'alimentation en 6 carré ou d'adapter le calibre des 2 disjoncteurs en 10A si la puissance des planchas le permet.



Centre d'imputation

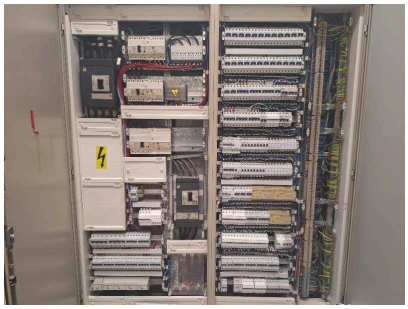

Satisfaction du signataire

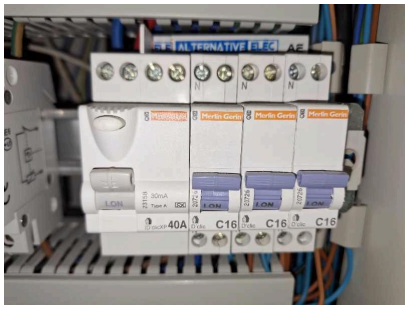
Satisfaction ★ ★ ★ ★ ★ Le client était absent.

Commentaire

Photos de l'intervention



Signature		
	Annulée	☐
	Vérifiée	☐
	Facturation	Non renseigné
	Statut	Intervention terminée

Électricité Industrielle JP Fauché
Siège social : 6 route de Moissac – 82130 Lafrançaise – E-mail : info@fauche.com
SAS au capital de 1 376 000 € – RCS Montauban 308 250 570 – N° TVA FR 88 308 250 570 – APE 4321 A
fauche.com
