CENTRE DES FINANCES DE ROUBAIX

Travaux de réfection des toitures terrasses
PLANNING PREVISIONNEL PHASE PRO
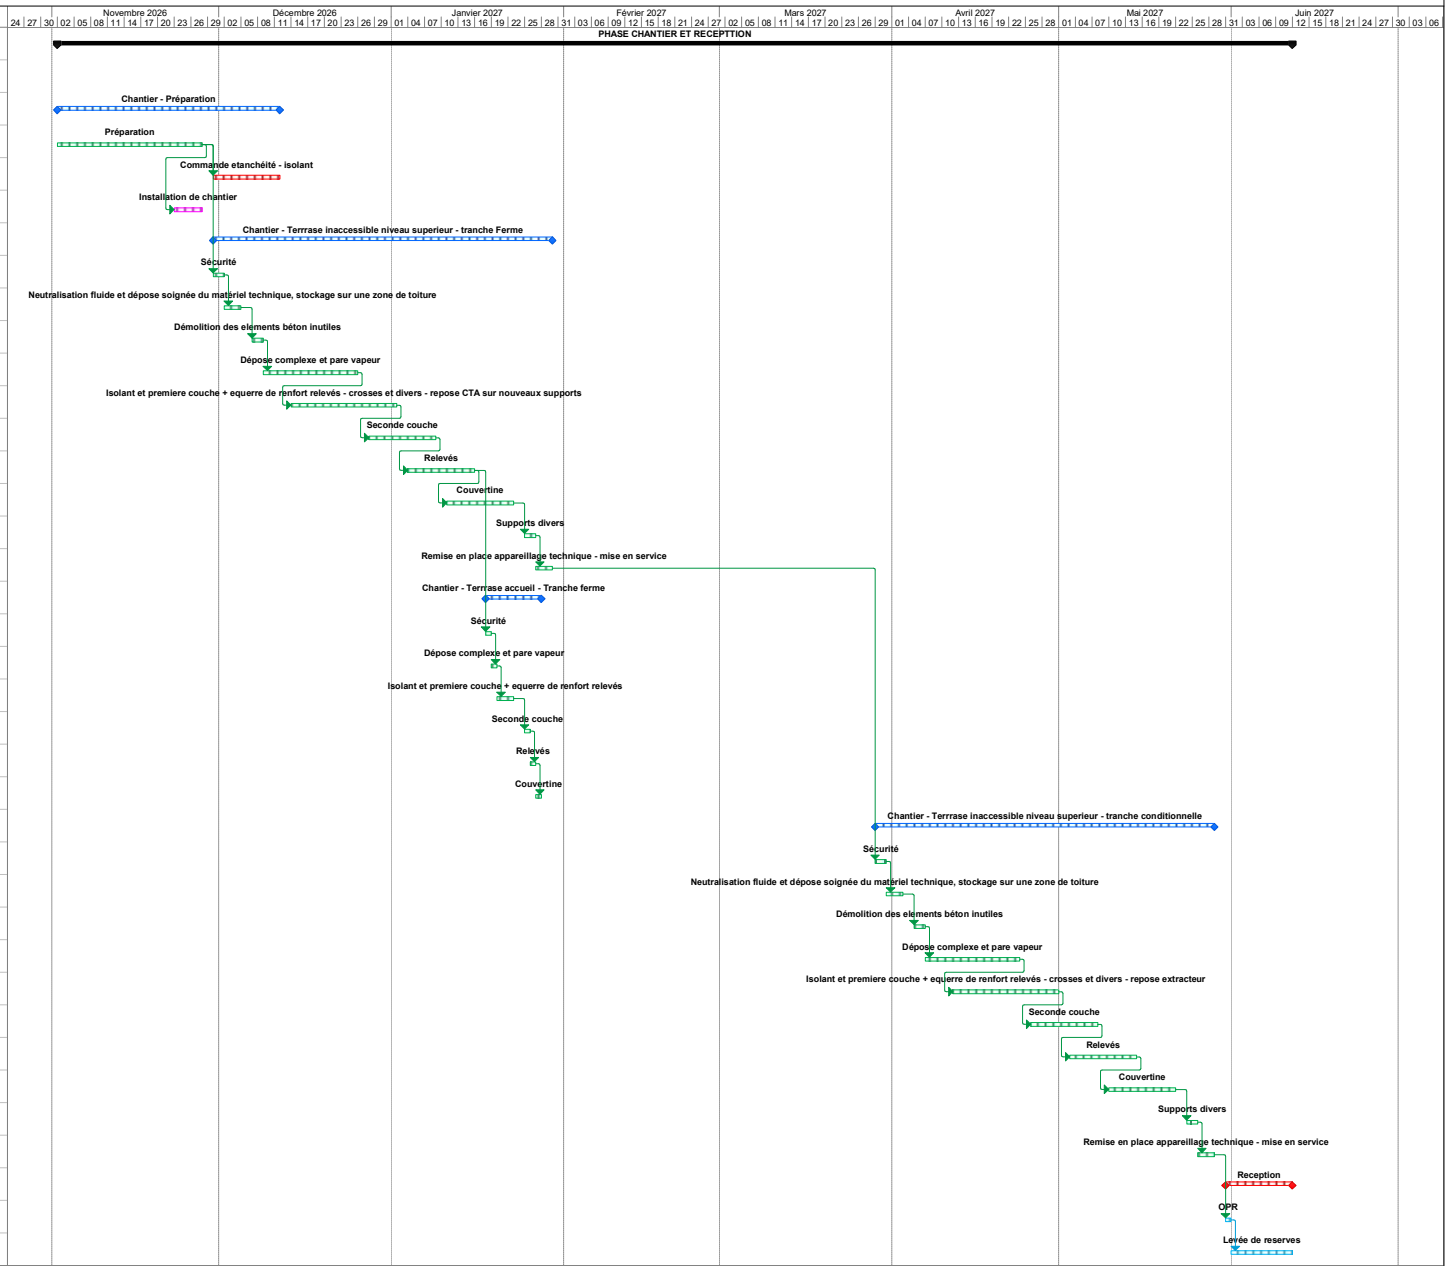
N°	Nom de la tâche	Début	Durée	Fin	Prédécesseurs
1	**PHASE CHANTIER ET RECEPTTION**	**Lun 02/11/26**	**160 jrs**	**Ven 11/06/27**	
2					
3	**Chantier - Préparation**	**Lun 02/11/26**	**30 jrs**	**Ven 11/12/26**	
4	Préparation	Lun 02/11/26	20 jrs	Ven 27/11/26	
5	Commande etanchéité - isolant	Lun 30/11/26	10 jrs	Ven 11/12/26	4
6	Installation de chantier	Lun 23/11/26	5 jrs	Ven 27/11/26	4FD-5 jrs
7	**Chantier - Terrrase inaccessible niveau superieur - tranche Ferme**	**Lun 30/11/26**	**45 jrs**	**Ven 29/01/27**	
8	Sécurité	Lun 30/11/26	2 jrs	Mar 01/12/26	4
9	Neutralisation fluide et dépose soignée du matériel technique, stockage sur une zone de toiture	Mer 02/12/26	3 jrs	Ven 04/12/26	8
10	Démolition des elements béton inutiles	Lun 07/12/26	2 jrs	Mar 08/12/26	9
11	Dépose complexe et pare vapeur	Mer 09/12/26	13 jrs	Ven 25/12/26	10
12	Isolant et premiere couche + equerre de renfort relevés - crosses et divers - repose CTA sur nouveaux supports	Lun 14/12/26	15 jrs	Ven 01/01/27	11FD-10 jrs
13	Seconde couche	Lun 28/12/26	10 jrs	Ven 08/01/27	12FD-5 jrs
14	Relevés	Lun 04/01/27	10 jrs	Ven 15/01/27	13FD-5 jrs
15	Couvertine	Lun 11/01/27	10 jrs	Ven 22/01/27	14FD-5 jrs
16	Supports divers	Lun 25/01/27	2 jrs	Mar 26/01/27	15
17	Remise en place appareillage technique - mise en service	Mer 27/01/27	3 jrs	Ven 29/01/27	16
18	**Chantier - Terrrase accueil - Tranche ferme**	**Lun 18/01/27**	**8 jrs**	**Mer 27/01/27**	
19	Sécurité	Lun 18/01/27	1 jr	Lun 18/01/27	14
20	Dépose complexe et pare vapeur	Mar 19/01/27	1 jr	Mar 19/01/27	19
21	Isolant et premiere couche + equerre de renfort relevés	Mer 20/01/27	3 jrs	Ven 22/01/27	20
22	Seconde couche	Lun 25/01/27	1 jr	Lun 25/01/27	21
23	Relevés	Mar 26/01/27	1 jr	Mar 26/01/27	22
24	Couvertine	Mer 27/01/27	1 jr	Mer 27/01/27	23
25	**Chantier - Terrrase inaccessible niveau superieur - tranche conditionnelle**	**Lun 29/03/27**	**45 jrs**	**Ven 28/05/27**	
26	Sécurité	Lun 29/03/27	2 jrs	Mar 30/03/27	17FD+40 jrs
27	Neutralisation fluide et dépose soignée du matériel technique, stockage sur une zone de toiture	Mer 31/03/27	3 jrs	Ven 02/04/27	26
28	Démolition des elements béton inutiles	Lun 05/04/27	2 jrs	Mar 06/04/27	27
29	Dépose complexe et pare vapeur	Mer 07/04/27	13 jrs	Ven 23/04/27	28
30	Isolant et premiere couche + equerre de renfort relevés - crosses et divers - repose extracteur	Lun 12/04/27	15 jrs	Ven 30/04/27	29FD-10 jrs
31	Seconde couche	Lun 26/04/27	10 jrs	Ven 07/05/27	30FD-5 jrs
32	Relevés	Lun 03/05/27	10 jrs	Ven 14/05/27	31FD-5 jrs
33	Couvertine	Lun 10/05/27	10 jrs	Ven 21/05/27	32FD-5 jrs
34	Supports divers	Lun 24/05/27	2 jrs	Mar 25/05/27	33
35	Remise en place appareillage technique - mise en service	Mer 26/05/27	3 jrs	Ven 28/05/27	34
36	**Reception**	**Lun 31/05/27**	**10 jrs**	**Ven 11/06/27**	
37	OPR	Lun 31/05/27	1 jr	Lun 31/05/27	35
38	Levée de reserves	Mar 01/06/27	9 jrs	Ven 11/06/27	37
