Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti


(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)

SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE :	**Propriétaire**
1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX (France)	Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE Aile "CENTRALE" 1 PLACE SAINT-TAURIN 27000 EVREUX (France) **Demandeur** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE - Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE 1 PLACE SAINT-TAURIN 27000 EVREUX (France)

Nature des travaux : **Rénovation / Réhabilitation : OUI** **Démolition : NON**

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

Date du rapport : 18/05/2026 **Date de visite :** 09/03/2026 **Nombre de pages :** 61 **Fait à :** 76230 ISNEAUVILLE **Référence du dossier :** 2603CHNRO - BI14360000002209	**Le présent rapport est établi par :** CHRISTOPHE DUMOULIN **Contrat d'assurance :** AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025	

Révision	*Date*	*Objet*
Version initiale	*18/05/2026*	*Edition initiale*

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. CADRE DE LA MISSION 3

1. Objet de la mission 3
2. Références règlementaires et normatives 3
3. Programme des travaux du donneur d'ordre 4
4. Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés) 4
5. Description du bien 5

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE 6

1. Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb 6
2. Stratégie de mesurage 6
3. Présentation des résultats 7

III. PROTOCOLE DU REPERAGE 7

1. Identification des locaux 7
2. Identification des zones 7
3. Identification des revêtements 7
4. Identification des unités de repérage et substrat 8

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE 9

V. DEROULEMENT DE LA MISSION 10

1. Prestations réalisées : 10
2. Personnes présentes lors de la visite : 10
3. Informations complémentaires sur la visite 10
4. Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission 10
5. Plans des parties d'immeuble concernées par la mission 10

VI. RESULTATS DETAILLES 11

Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX 50

Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 56

Annexe 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES 57

Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE 58

Annexe 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF 59

Annexe 6 - NOTICE D'INFORMATION 60

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.
La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été inclue dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

> Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

> Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants

> Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb

> Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Curage

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ÉTABLI PAR LE DONNEUR D'ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
Néant		

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée - aile centrale	Local 1
Rez de chaussée - aile centrale	Local 2
Rez de chaussée - aile centrale	Local 3
Rez de chaussée - aile centrale	Local 4
Rez de chaussée - aile centrale	Local 4bis
Rez de chaussée - aile centrale	Local 5
Rez de chaussée - aile centrale	Local 6
Rez de chaussée - aile centrale	Local 7
Rez de chaussée - aile centrale	Local 8
Rez de chaussée - aile centrale	Circulation 1
Rez de chaussée - aile centrale	Circulation 2
Rez de chaussée - aile centrale	Dégagement 1
Rez de chaussée - aile centrale	Dégagement 2
1er étage - aile centrale	Local 9
1er étage - aile centrale	Local 10
1er étage - aile centrale	Local 11
1er étage - aile centrale	Local 12
1er étage - aile centrale	Local 13
1er étage - aile centrale	Local 14
1er étage - aile centrale	Local 15
1er étage - aile centrale	Local 16
1er étage - aile centrale	Local 17
1er étage - aile centrale	Local 18
1er étage - aile centrale	Local 19
1er étage - aile centrale	Local 20
1er étage - aile centrale	Local 21
1er étage - aile centrale	Local 22
1er étage - aile centrale	Local 23
1er étage - aile centrale	Dégagement 3
1er étage - aile centrale	Circulation 3
1er étage - aile centrale	Sanitaire 1
1er étage - aile centrale	Sanitaire 2
2ème étage - aile centrale	Local 24
2ème étage - aile centrale	Local 25
2ème étage - aile centrale	Local 26
2ème étage - aile centrale	Local 27
2ème étage - aile centrale	Local 28
2ème étage - aile centrale	Local 29
2ème étage - aile centrale	Local 30
2ème étage - aile centrale	Local 31

2ème étage - aile centrale	Local 32
2ème étage - aile centrale	Local 33
2ème étage - aile centrale	Local 34
2ème étage - aile centrale	Sanitaire 3
2ème étage - aile centrale	Sanitaire 4
2ème étage - aile centrale	Dégagement 4
2ème étage - aile centrale	Dégagement 5
2ème étage - aile centrale	Circulation 4
3ème étage - aile centrale	Local 35
3ème étage - aile centrale	Local 36
3ème étage - aile centrale	Local 37
3ème étage - aile centrale	Local 38
3ème étage - aile centrale	Local 39
3ème étage - aile centrale	Local 40
3ème étage - aile centrale	Local 41
3ème étage - aile centrale	Local 42
3ème étage - aile centrale	Local 43
3ème étage - aile centrale	Local 44
3ème étage - aile centrale	Local 45
3ème étage - aile centrale	Local 46
3ème étage - aile centrale	Local 47
3ème étage - aile centrale	Local 48
3ème étage - aile centrale	Local 49
3ème étage - aile centrale	Local 50
3ème étage	Local 51
3ème étage - aile centrale	Sanitaire 5
3ème étage - aile centrale	Circulation 5
3ème étage - aile centrale	Dégagement 6
3ème étage - aile centrale	Dégagement 7
Extérieur	Façade côté jardin
Extérieur	Façade côté parking
Rez de chaussée	Escalier 1
1er étage	Escalier 1
2ème étage	Escalier 1
3ème étage	Escalier 1
Sous-Sol	Cave 1
Sous-Sol	Cave 2
Sous-Sol	Cave 3

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
Néant	

Eléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
Néant		

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Autres
Année de construction : Non communiqué

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1mg/cm²) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,…).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, …). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :
> La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :
- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction.

III. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :
- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
> chaque palier ;
> chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
> gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.
Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, …) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement

effectuée, leur recherche n'a pas été inclue dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.
Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :
- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :
> l'ensemble des plinthes d'un même local ;
> l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
> une porte et son huisserie dans un même local ;
> une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
> l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :
> les différents murs d'une même pièce ;
> des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
> les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
> des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile… car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
> une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :
> l'ensemble des marches ;
> l'ensemble des contremarches ;
> l'ensemble des balustres ;
> le limon ;
> la crémaillère ;
> la main courante ;
> le plafond.

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**	
Modèle de l'appareil	**FENX**	
N° de série de l'appareil	**2-0900**	
Nature du radionucléide	**Cd109**	
Date du dernier chargement de la source	**09/07/2021**	Activité à cette date et durée de vie : **850 Mbq**
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1er Janvier 2019	**N° T760757_ CODEP-CAE-2023-055390**	Date de déclaration **09/10/2023 00:00:00**
	Date de fin de validité de l'autorisation **Déclaration ASN / màj 2022**	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	**DELATTRE Olivier**	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	**LAGARRIGUE Florian**	

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	23/03/2026	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1111	23/03/2026	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.
Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.

☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
Croquis plan de situation	Croquis plan de situation
Croquis Rdc aile centrale	Croquis Rdc aile centrale
Croquis R+1 aile centrale	Croquis R+1 aile centrale
Croquis R+2 aile centrale	Croquis R+2 aile centrale
Croquis R+3 aile centrale	Croquis R+3 aile centrale

VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Rez de chaussée - aile centrale - Local 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
2	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
3	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
4	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
5	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
6	Porte (P1)	A	Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,08	0,01	
7	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
8	Porte (P2)	C	Bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,50	0,01	
9	Huisserie Porte (P2)	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,03	0,01	
10	Porte (P3)	C	Bois	Peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,54	0,01	
11	Huisserie Porte (P3)	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,03	0,01	
12	Porte (P4)	C	Bois	Peinture	Porte (P4) (partie basse)	1,27	0,90	
13	Huisserie Porte (P4)	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P4) (partie basse)	0,07	0,01	
14	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
15	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
16	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
17	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
18	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	10,40	2,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

Rez de chaussée - aile centrale - Local 4bis

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
19	Sol		Béton	peinture	Sol (mesure 1)	0,03	0,01	
20	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
21	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
22	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
23	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
24	Porte (P1)	A	Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,45	0,01	
25	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
26	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Rez de chaussée - aile centrale - Local 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
27	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	3,34	1,01	
28	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,10	0,01	
-	Mur	C	porte alu		Mur (Non mesurée)			Elément récent
29	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
30	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
31	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
32	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Rez de chaussée - aile centrale - Dégagement 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
-	Murs	A	porte alu		Murs (partie basse)			Absence de revêtement
33	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
34		B	enduit	peinture		0,06	0,01	
35	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
36	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	1,27	0,90	
37	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
38	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	10,19	1,20	
39	Mur	G	enduit	peinture	Mur (partie basse)	2,44	1,10	
40	Huisserie Porte (P1)	B	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,10	0,01	
41	Porte (P2)	C	bois	Peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,09	0,01	
42	Porte (P3)	D	bois	Peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,09	0,01	
43	Huisserie Porte (P3)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,03	0,01	
44	Porte (P4)	F	bois	Peinture	Porte (P4) (partie haute)	0,04	0,01	
45	Huisserie Porte (P4)	F	bois	Peinture	Huisserie Porte (P4) (partie haute)	0,02	0,01	
46	Marches		Bois	Vernis	Marches (mesure 2)	0,07	0,01	
47	Contremarches		Bois	Vernis	Contremarches (mesure 2)	0,06	0,01	
48	Balustre		Bois	Vernis	Balustre (partie haute)	0,03	0,01	
49	Main courante		Bois	Vernis	Main courante (mesure 2)	0,08	0,01	
50	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 2)	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
51	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
52	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
53	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
54	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
55	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
56	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
57	Porte (P2)	B	bois	Peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,02	0,01	
58	Huisserie Porte (P2)	B	bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,04	0,01	
59	Porte (P3)	C	bois	Peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,09	0,01	
60	Huisserie Porte (P3)	C	bois	Peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,07	0,01	
61	Porte (P4)	D	bois	Peinture	Porte (P4) (partie haute)	0,06	0,01	
62	Huisserie Porte (P4)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P4) (partie haute)	0,05	0,01	
63	Porte (P5)	D	bois	Peinture	Porte (P5) (partie haute)	0,09	0,01	
64	Huisserie Porte (P5)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P5) (partie haute)	0,07	0,01	
65	Fenêtre intérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
66	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
67	Fenêtre extérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
68	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
69	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 2)	0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

Rez de chaussée - aile centrale - Circulation 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
70	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
71	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
72	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
73	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
74	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
75	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,01	0,01	
76	Porte (P2)	B	bois	Peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,07	0,01	
77	Huisserie Porte (P2)	B	bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,05	0,01	
78	Porte (P3)	C	bois	Peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,06	0,01	
79	Huisserie Porte (P3)	C	bois	Peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,08	0,01	
80	Porte (P4)	D	bois	Peinture	Porte (P4) (partie haute)	0,03	0,01	
81	Huisserie Porte (P4)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P4) (partie haute)	0,01	0,01	
82	Porte (P5)	D	bois	Peinture	Porte (P5) (partie haute)	0,07	0,01	
83	Huisserie Porte (P5)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P5) (partie haute)	0,08	0,01	
84	Porte (P6)	D	bois	Peinture	Porte (P6) (partie haute)	0,09	0,01	
85	Huisserie Porte (P6)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P6) (partie haute)	0,07	0,01	
86	Fenêtre intérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
87	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
88	Fenêtre extérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
89	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
90	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 2)	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 22								

Rez de chaussée - aile centrale - Local 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Béton	aucun	Sol (Non mesurée)			Elément récent
91	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
92	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
93	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
94	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
95	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
96	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
97	Poteau		Béton	peinture	Poteau (mesure 2)	0,50	0,01	
98	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 2)	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

Rez de chaussée - aile centrale - Local 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		béton	aucun	Sol (Non mesurée)			Elément récent
99	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
100	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
101	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
102	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
103	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
104	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
105	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 2)	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Rez de chaussée - aile centrale - Local 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
106	Sol		béton	peinture	Sol (mesure 2)	0,09	0,01	
107	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
108	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,09	0,01	
109	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
110	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
111	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
112	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
113	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 2)	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Rez de chaussée - aile centrale - Local 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
114	Sol		béton	peinture	Sol (mesure 2)	0,02	0,01	
115	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
116	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
117	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
118	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
119	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
120	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
121	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
122	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
123	Porte (P2)	B	bois	Peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,02	0,01	
124	Huisserie Porte (P2)	B	bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,07	0,01	
125	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
126	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
127	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
128	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
129	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 2)	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

Rez de chaussée - aile centrale - Local 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
130	Sol		béton	peinture	Sol (mesure 2)	0,07	0,01	
131	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
132	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
133	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
134	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
135	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
136	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
137	Porte (P2)	D	bois	Peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,08	0,01	
138	Huisserie Porte (P2)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,03	0,01	
139	Porte (P3)	D	bois	Peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,06	0,01	
140	Huisserie Porte (P3)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,04	0,01	
141	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
142	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
143	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
144	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
145	Poteau	C	béton	peinture	Poteau (mesure 1)	5,14	1,21	
146	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 2)	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

Rez de chaussée - aile centrale - Local 8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
147	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
148	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
-	Mur	C	placoplâtre	aucun	Mur (Non mesurée)			Elément récent
-		C	placoplâtre	aucun	(Non mesurée)			Elément récent
149	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
150					Mur (partie haute)	0,05	0,01	
151		D	Enduit	Peinture		0,03	0,01	
152	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
153					Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
154	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,02	0,01	
155					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
156	Porte (P2)	B	bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,03	0,01	
157	Huisserie Porte (P2)	B	bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,09	0,01	
158	Fenêtre intérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
159	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
160	Fenêtre extérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
161	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
162	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 2)	0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

1er étage - aile centrale - Local 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
163	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
164	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
165	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,04	0,01	
166	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
167	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
168	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
169					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
170	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
171					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
172	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
173					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
174	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
175					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
176	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
177					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
178	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,03	0,01	
179					Plafond (mesure 2)	0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - aile centrale - Local 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
180	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
181	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
182	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
183	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
184	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
185	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
186	Fenêtre intérieure (F2)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,07	0,01	
187	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,04	0,01	
188	Fenêtre extérieure (F2)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,02	0,01	
189	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,04	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - aile centrale - Local 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
190	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
191	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
192					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
193		B	enduit	peinture		0,03	0,01	
194	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
195					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
196		C	enduit	peinture		0,08	0,01	
197	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
198					Mur (partie haute)	0,09	0,01	
199		D	enduit	peinture		0,06	0,01	
200	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
201					Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
202	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
203					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
204	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
205					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
206	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
207	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
208	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

1er étage - aile centrale - Local 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
209	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
210	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
211	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
212	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
213	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
214	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
215	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
216	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
217	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
218	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
219					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - aile centrale - Local 13

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
220	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
221					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
222		A	enduit	peinture		0,08	0,01	
223	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
224					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
225		B	enduit	peinture		0,02	0,01	
226	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
227					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
228		C	enduit	peinture		0,01	0,01	
229	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
230	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
231	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
232	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
233	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
234	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
235	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

1er étage - aile centrale - Local 14

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
236		A	enduit	peinture		0,06	0,01	
237		B	enduit	peinture		0,03	0,01	
238	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
239	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
240	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
241	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,01	0,01	
242	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
243	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
244	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
245	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - aile centrale - Local 15

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
246	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
247					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
248		A	enduit	peinture		0,02	0,01	
249	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
250					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
251		B	enduit	peinture		0,02	0,01	
252	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
253					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
254		C	enduit	peinture		0,08	0,01	
255	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
256					Mur (partie haute)	0,09	0,01	
257		D	enduit	peinture		0,01	0,01	
258	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
259					Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
260	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,02	0,01	
261					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
262	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
263					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
264	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
265	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
266	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

1er étage - aile centrale - Local 16

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
267	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
268	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
269	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,09	0,01	
270	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,09	0,01	
271	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
272	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
273	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
274	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
275	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
276					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
277	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
278					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - aile centrale - Local 17

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
279	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
280					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
281		A	enduit	peinture		0,01	0,01	
282	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
283					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
284		B	enduit	peinture		0,06	0,01	
285	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
286	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
287	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
288	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
289	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
290	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
291	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
292	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

1er étage - aile centrale - Local 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
293	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
294	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
295	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
296	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
297	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
298	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
299	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
300	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
301	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
302	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - aile centrale - Local 19

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
303	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
304	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
305	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
306	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
307	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,04	0,01	
308	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
309	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
310	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
311	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
312	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - aile centrale - Local 20

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
313	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,10	0,01	
314	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
315	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
316					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
317		C	enduit	peinture		0,08	0,01	
318	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
319					Mur (partie haute)	0,05	0,01	
320		D	enduit	peinture		0,02	0,01	
321	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
322					Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
323	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
324					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
325	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
326					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
327	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
328					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
329	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
330					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
331	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
332					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

1er étage - aile centrale - Local 21

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
333	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
334					Mur (partie haute)	0,01	0,01	
335		A	enduit	peinture		0,09	0,01	
336	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
337					Mur (partie haute)	0,04	0,01	
338		B	enduit	peinture		0,03	0,01	
339	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
340					Mur (partie haute)	0,01	0,01	
341		C	enduit	peinture		0,02	0,01	
342	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
343					Mur (partie haute)	0,04	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
344		D	enduit	peinture		0,07	0,01	
345	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
346					Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
347	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
348					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
349	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
350					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
351	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
352					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
353	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,10	0,01	
354					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
355	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

1er étage - aile centrale - Local 22

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
356	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
357	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
358	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
359	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
360	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
361	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
362	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
363	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
364	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
365	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - aile centrale - Local 23

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
366	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
367					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
368		A	enduit	peinture		0,02	0,01	
369	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
370					Mur (partie haute)	0,06	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
371		B	enduit	peinture		0,03	0,01	
372	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
373					Mur (partie haute)	0,01	0,01	
374		C	enduit	peinture		0,09	0,01	
375	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
376					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
377	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
378	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,01	0,01	
379	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
380	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
381	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
382	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

1er étage - aile centrale - Dégagement 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
383	Sol		Sol plastique		Sol (mesure 2)	0,01	0,01	
384	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
385	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
386	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,04	0,01	
387	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
388	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
389	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,04	0,01	
390	Mur	G	enduit	peinture	Mur (partie basse)	10,36	4,12	
391	Balustre		bois	vernis	Balustre (partie haute)	0,09	0,01	
392	Main courante		bois	vernis	Main courante (mesure 2)	0,08	0,01	
393	Marches		Bois	Vernis	Marches (mesure 2)	0,06	0,01	
394	Contremarches		Bois	Vernis	Contremarches (mesure 2)	0,09	0,01	
395	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
396	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
397	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	5,18	1,21	
398	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,08	0,01	
399	Porte (P3)	E	bois	peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,03	0,01	
400	Huisserie Porte (P3)	E	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,05	0,01	
401	Fenêtre intérieure (F1)	G	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
402	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	G	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
403	Fenêtre extérieure (F1)	G	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
404	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	G	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
405	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 23								

1er étage - aile centrale - Circulation 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
406	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
407	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
408	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
409	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
410	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
411	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
412					Mur (partie haute)	0,07	0,01	
413		F	enduit	peinture		0,05	0,01	
414	Mur	G	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
415					Mur (partie haute)	0,01	0,01	
416		G	enduit	peinture		0,09	0,01	
417	Mur	H	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
418					Mur (partie haute)	0,08	0,01	
419		H	enduit	peinture		0,06	0,01	
420	Mur	I	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
421	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
422	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
423	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,06	0,01	
424	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,05	0,01	
425	Porte (P3)	C	bois	peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,05	0,01	
426	Huisserie Porte (P3)	C	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,03	0,01	
427	Porte (P4)	D	bois	peinture	Porte (P4) (partie haute)	0,04	0,01	
428	Huisserie Porte (P4)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P4) (partie haute)	0,06	0,01	
429	Porte (P5)	E	bois	peinture	Porte (P5) (partie haute)	0,04	0,01	
430	Huisserie Porte (P5)	E	bois	peinture	Huisserie Porte (P5) (partie haute)	0,02	0,01	
431	Porte (P6)	F	bois	peinture	Porte (P6) (partie haute)	0,02	0,01	
432	Huisserie Porte (P6)	F	bois	peinture	Huisserie Porte (P6) (partie haute)	0,06	0,01	
433	Porte (P7)	G	bois	peinture	Porte (P7) (partie haute)	0,01	0,01	
434	Huisserie Porte (P7)	G	bois	peinture	Huisserie Porte (P7) (partie haute)	0,02	0,01	
435	Porte (P8)	H	bois	peinture	Porte (P8) (partie basse)	0,02	0,01	
436					Porte (P8) (partie haute)	0,03	0,01	
437	Huisserie Porte (P8)	H	bois	peinture	Huisserie Porte (P8) (partie basse)	0,09	0,01	
438					Huisserie Porte (P8) (partie haute)	0,05	0,01	
439	Porte (P9)	I	bois	peinture	Porte (P9) (partie basse)	0,06	0,01	
440					Porte (P9) (partie haute)	0,04	0,01	
441	Huisserie Porte (P9)	I	bois	peinture	Huisserie Porte (P9) (partie basse)	0,04	0,01	
442					Huisserie Porte (P9) (partie haute)	0,05	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 32								

1er étage - aile centrale - Sanitaire 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
443	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
444					Mur (partie haute)	0,08	0,01	
445		A	enduit	peinture		0,04	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
446	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
447	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
448	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
449	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
450	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
451	Mur	G	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
452	Mur	H	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
453	Mur	I	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
454	Mur	J	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
455	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,65	0,01	
456	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
457	Porte (P2)	D	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,58	0,01	
458	Huisserie Porte (P2)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,03	0,01	
459	Porte (P3)	I	bois	peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,46	0,01	
460	Huisserie Porte (P3)	I	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,08	0,01	
461	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
462	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,10	0,01	
463	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
464	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 23								

1er étage - aile centrale - Sanitaire 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
465	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
466	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
467	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
468	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
469					Mur (partie haute)	0,02	0,01	
470		D	enduit	peinture		0,01	0,01	
471	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
472					Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
473	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
474					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
475	Porte (P2)	C	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,07	0,01	
476					Porte (P2) (partie haute)	0,04	0,01	
477	Huisserie Porte (P2)	C	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,06	0,01	
478					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,07	0,01	
479	Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
480					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
481	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
482					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
483	Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
484					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
485	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
486					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

2ème étage - aile centrale - Local 24

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette		Sol (Non mesurée)			Elément récent
487	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
488					Mur (partie haute)	0,08	0,01	
489		A	enduit	peinture		0,07	0,01	
490	Mur	B	Bois		Mur (partie basse)	0,06	0,01	
491					Mur (partie haute)	0,08	0,01	
492		B	Bois			0,09	0,01	
493	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
494					Mur (partie haute)	0,02	0,01	
495		C	Enduit	Peinture		0,06	0,01	
496	Mur	D	Bois		Mur (partie basse)	0,08	0,01	
497					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
498		D	Bois			0,03	0,01	
499	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
500	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
501	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
502	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
503	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
504	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

2ème étage - aile centrale - Local 25

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
505	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
506	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
507	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
508	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
509	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,01	0,01	
510	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
511					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
512	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
513					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
514	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
515					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
516	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
517					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
518	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
519					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - aile centrale - Local 26

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
520	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
521	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
522	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
523	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
524	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
525	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
526	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
527	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
528	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
529	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - aile centrale - Local 27

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
530	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
531					Mur (partie haute)	0,08	0,01	
532		A	enduit	Peinture		0,03	0,01	
533	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
534					Mur (partie haute)	0,02	0,01	
535		B	enduit	Peinture		0,02	0,01	
536	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
537					Mur (partie haute)	0,09	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
538		C	enduit	Peinture		0,08	0,01	
539	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
540	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
541	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
542	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
543	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
544	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
545	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

2ème étage - aile centrale - Local 28

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
546	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,09	0,01	
547	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
548	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
549	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
550	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
551					Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
552	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
553					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
554	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
555					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
556	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
557					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
558	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
559					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
560	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
561					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - aile centrale - Local 29

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
562	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
563	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
564	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
565	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
566	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
567	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
568	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
569	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
570	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
571	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - aile centrale - Local 30

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
572	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
573	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
574	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
575	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
576	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,08	0,01	
577	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
578	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
579	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
580	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
581	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - aile centrale - Local 31

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
582	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
583	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
584	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
585	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
586	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
587	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
588	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
589	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
590	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
591	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - aile centrale - Local 32

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
592	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
593	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
594	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
595	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
596	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
597	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
598	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
599	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
600	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
601	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - aile centrale - Local 33

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
602	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
603	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
604	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
605	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
606	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
607	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
608	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
609	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
610	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
611	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
612					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - aile centrale - Local 34

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
613	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
614					Mur (partie haute)	0,09	0,01	
615		A	enduit	Peinture		0,02	0,01	
616	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
617					Mur (partie haute)	0,07	0,01	
618		B	enduit	Peinture		0,08	0,01	
619	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
620					Mur (partie haute)	0,01	0,01	
621		C	enduit	Peinture		0,03	0,01	
622	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
623					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
624		D	enduit	Peinture		0,09	0,01	
625	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
626					Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
627	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
628					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
629	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
630					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
631	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
632					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
633	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
634					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
635	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
636					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

2ème étage - aile centrale - Sanitaire 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
637	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
638					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
639		A	enduit	peinture		0,07	0,01	
640	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
641					Mur (partie haute)	0,08	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
642		B	enduit	peinture		0,03	0,01	
643	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
644					Mur (partie haute)	0,02	0,01	
645		C	enduit	peinture		0,09	0,01	
646	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
647					Mur (partie haute)	0,08	0,01	
648		D	enduit	peinture		0,09	0,01	
649	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
650					Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
651	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
652					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
653	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,01	0,01	
654					Porte (P2) (partie haute)	0,03	0,01	
655	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,04	0,01	
656					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,07	0,01	
657	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
658					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
659	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
660					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
661	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
662					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
663	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
664					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

2ème étage - aile centrale - Sanitaire 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
665	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
666					Mur (partie haute)	0,05	0,01	
667		A	enduit	peinture		0,07	0,01	
668	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
669					Mur (partie haute)	0,01	0,01	
670		B	enduit	peinture		0,03	0,01	
671	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
672	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
673	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
674	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
675	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,90	0,01	
676	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,02	0,01	
677	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,90	0,01	
678	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,07	0,01	
679	Porte (P3)	E	bois	peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,85	0,01	
680	Huisserie Porte (P3)	E	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,04	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

2ème étage - aile centrale - Dégagement 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
681	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
682	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
683	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
684	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
685	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
686	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	10,36	5,12	
687	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
688	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
689	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	5,19	1,19	
690	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,05	0,01	
691	Porte (P3)	E	bois	peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,09	0,01	
692	Huisserie Porte (P3)	E	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,05	0,01	
693	Fenêtre intérieure (F1)	E	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
694	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	E	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
695	Fenêtre extérieure (F1)	E	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
696	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	E	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
697	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,08	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

2ème étage - aile centrale - Circulation 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
698	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
699	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
700	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
701	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
702	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
703	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
704	Mur	G	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
705	Mur	H	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
706	Mur	I	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
707	Mur	J	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
708	Mur	K	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
709	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
710	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
711	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,06	0,01	
712	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,01	0,01	
713	Porte (P3)	D	bois	peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,02	0,01	
714	Huisserie Porte (P3)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,07	0,01	
715	Porte (P4)	E	bois	peinture	Porte (P4) (partie basse)	0,03	0,01	
716	Huisserie Porte (P4)	E	bois	peinture	Huisserie Porte (P4) (partie haute)	0,03	0,01	
717	Porte (P5)	G	bois	peinture	Porte (P5) (partie haute)	0,05	0,01	
718	Huisserie Porte (P5)	G	bois	peinture	Huisserie Porte (P5) (partie haute)	0,09	0,01	
719	Porte (P6)	I	bois	peinture	Porte (P6) (partie haute)	0,05	0,01	
720	Huisserie Porte (P6)	I	bois	peinture	Huisserie Porte (P6) (partie haute)	0,06	0,01	
721	Porte (P7)	K	bois	peinture	Porte (P7) (partie haute)	0,08	0,01	
722	Huisserie Porte (P7)	K	bois	peinture	Huisserie Porte (P7) (partie haute)	0,05	0,01	
723	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,32	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 27								

2ème étage - aile centrale - Dégagement 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
724	Marches		Bois	Vernis	Marches (mesure 2)	0,10	0,01	
725	Contremarches		Bois	Vernis	Contremarches (mesure 2)	0,08	0,01	
726	Balustre		bois	vernis	Balustre (partie haute)	0,02	0,01	
727	Main courante		bois	vernis	Main courante (mesure 2)	0,03	0,01	
728	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
729	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
730	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
731	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
732	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
733	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
734	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
735	Porte (P2)	E	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,04	0,01	
736	Huisserie Porte (P2)	E	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,02	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

3ème étage - aile centrale - Local 35

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Bois		Sol (Non mesurée)			Elément récent
737	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
738	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
739	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
740	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
741	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
742	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
743	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
744	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
745	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
746	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
747	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - aile centrale - Local 36

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		bois		Sol (Non mesurée)			Elément récent
748	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
749	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
750	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
751	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
752	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
753	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,08	0,01	
754	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
755	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
756	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
757	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
758	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - aile centrale - Local 37

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
759	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
760	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
761	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
762	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
763	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,01	0,01	
764	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
765	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
766	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
767	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
768	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
769					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - aile centrale - Local 38

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
770	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
771					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
772		A	enduit	peinture		0,02	0,01	
773	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
774					Mur (partie haute)	0,02	0,01	
775		B	enduit	peinture		0,01	0,01	
776	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
777					Mur (partie haute)	0,04	0,01	
778		C	enduit	peinture		0,03	0,01	
779	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
780					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
781		D	enduit	peinture		0,05	0,01	
782	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,02	0,01	
783					Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
784	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
785					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
786	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
787					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
788	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
789					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
790	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
791					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
792	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
793					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - aile centrale - Local 39

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
794	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
795					Mur (partie haute)	0,04	0,01	
796		A	enduit	peinture		0,08	0,01	
797	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
798					Mur (partie haute)	0,05	0,01	
799		B	enduit	peinture		0,01	0,01	
800	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
801					Mur (partie haute)	0,04	0,01	
802		C	enduit	peinture		0,08	0,01	
803	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
804					Mur (partie haute)	0,04	0,01	
805		D	enduit	peinture		0,06	0,01	
806	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
807					Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
808	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,08	0,01	
809					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
810	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
811					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
812	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
813					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
814	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
815					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
816	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
817					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - aile centrale - Local 40

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
818	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
819					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
820		A	enduit	peinture		0,07	0,01	
821	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
822					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
823		B	enduit	peinture		0,06	0,01	
824	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
825					Mur (partie haute)	0,02	0,01	
826		C	enduit	peinture		0,02	0,01	
827	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
828					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
829		D	enduit	peinture		0,08	0,01	
830	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
831					Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
832	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
833					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
834	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
835					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
836	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
837					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
838	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
839					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
840	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
841					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - aile centrale - Local 41

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
842	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
843					Mur (partie haute)	0,05	0,01	
844		A	enduit	peinture		0,05	0,01	
845	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
846					Mur (partie haute)	0,05	0,01	
847		B	enduit	peinture		0,07	0,01	
848	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
849					Mur (partie haute)	0,07	0,01	
850		C	enduit	peinture		0,04	0,01	
851	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
852					Mur (partie haute)	0,04	0,01	
853		D	enduit	peinture		0,03	0,01	
854	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
855					Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
856	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,04	0,01	
857					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
858	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
859					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
860	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
861					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
862	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
863					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
864	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
865					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - aile centrale - Local 42

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
866	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
867					Mur (partie haute)	0,08	0,01	
868		A	enduit	peinture		0,05	0,01	
869	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
870					Mur (partie haute)	0,01	0,01	
871		B	enduit	peinture		0,03	0,01	
872	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
873					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
874		C	enduit	peinture		0,03	0,01	
875	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
876					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
877		D	enduit	peinture		0,02	0,01	
878	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
879					Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
880	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
881					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
882	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
883					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
884	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
885					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
886	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
887					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
888	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
889					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - aile centrale - Local 43

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
890	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
891					Mur (partie haute)	0,07	0,01	
892		A	enduit	peinture		0,04	0,01	
893	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
894	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
895	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
896	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
897	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
898	Fenêtre intérieure (F1)	D	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
899	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	D	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
900	Fenêtre extérieure (F1)	D	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
901	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	D	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

3ème étage - aile centrale - Local 44

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
902	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
903	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
904	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
905	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
906	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
907	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
908	Mur	G	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
909	Mur	H	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
910	Mur	I	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
911	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
912	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
913	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
914	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
915	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
916	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
917	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

3ème étage - aile centrale - Sanitaire 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
918	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
919	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
920	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
921	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
922	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,01	0,01	
923	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
924	Porte (P2)	C	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,04	0,01	
925					Porte (P2) (partie haute)	0,07	0,01	
926	Huisserie Porte (P2)	C	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,05	0,01	
927					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,04	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

3ème étage - aile centrale - Local 45

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
928	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
929					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
930		A	enduit	peinture		0,02	0,01	
931	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
932					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
933		B	enduit	peinture		0,03	0,01	
934	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
935					Mur (partie haute)	0,01	0,01	
936		C	enduit	peinture		0,05	0,01	
937	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
938					Mur (partie haute)	0,03	0,01	
939		D	enduit	peinture		0,02	0,01	
940	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
941					Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
942	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
943					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
944	Porte (P2)	D	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,01	0,01	
945					Porte (P2) (partie haute)	0,04	0,01	
946	Huisserie Porte (P2)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,06	0,01	
947					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,09	0,01	
948	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
949					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
950	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
951					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
952	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
953					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
954	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
955					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

3ème étage - aile centrale - Local 46

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
956	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
957					Mur (partie haute)	0,02	0,01	
958		A	enduit	peinture		0,03	0,01	
959	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
960					Mur (partie haute)	0,08	0,01	
961		B	enduit	peinture		0,04	0,01	
962	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
963					Mur (partie haute)	0,02	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
964		C	enduit	peinture		0,07	0,01	
965	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
966	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
967	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
968	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,02	0,01	
969	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
970	Porte (P2)	D	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,04	0,01	
971	Huisserie Porte (P2)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,05	0,01	
972	Fenêtre intérieure (F1)	E	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
973	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	E	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
974	Fenêtre extérieure (F1)	E	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
975	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	E	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 19								

3ème étage - aile centrale - Local 47

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
976	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
977	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
978	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
979	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
980	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
981	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
982	Porte (P2)	D	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,03	0,01	
983	Huisserie Porte (P2)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,04	0,01	
984	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
985	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
986	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
987	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

3ème étage - aile centrale - Local 48

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
988	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
989	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
990	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
991	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
992					Mur (partie haute)	0,08	0,01	
993		D	enduit	peinture		0,08	0,01	
994	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
995					Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
996	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
997					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,01	0,01	
998	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,03	0,01	
999					Porte (P2) (partie haute)	0,09	0,01	
1000	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,04	0,01	
1001					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,05	0,01	
1002	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
1003					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
1004	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
1005					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
1006	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
1007					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
1008	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
1009					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

3ème étage - aile centrale - Local 49

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
1010	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
1011					Mur (partie haute)	0,04	0,01	
1012		A	enduit	peinture		0,05	0,01	
1013	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
1014					Mur (partie haute)	0,09	0,01	
1015		B	enduit	peinture		0,06	0,01	
1016	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
1017					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
1018		C	enduit	peinture		0,07	0,01	
1019	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
1020					Mur (partie haute)	0,06	0,01	
1021		D	enduit	peinture		0,09	0,01	
1022	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
1023					Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
1024	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
1025	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
1026	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
1027	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1028	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
-	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - aile centrale - Local 50

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
1029	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
1030	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
1031	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
1032	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
1033	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,02	0,01	
1034	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
1035	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,02	0,01	
1036	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,06	0,01	
1037	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
1038	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
1039	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
1040	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
1041	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

3ème étage - Local 51

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette		Sol (Non mesurée)			Elément récent
-	Mur	A	dalles de faux-plafond		Mur (Non mesurée)			Elément récent
-		A	dalles de faux-plafond		(Non mesurée)			Elément récent
-	Mur	B	dalles de faux-plafond		Mur (Non mesurée)			Elément récent
-		B	dalles de faux-plafond		(Non mesurée)			Elément récent
-	Mur	C	dalles de faux-plafond		Mur (Non mesurée)			Elément récent
-		C	dalles de faux-plafond		(Non mesurée)			Elément récent
-	Mur	D	dalles de faux-plafond		Mur (Non mesurée)			Elément récent
-		D	dalles de faux-plafond		(Non mesurée)			Elément récent
1042	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
1043					Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
1044		A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1045	Huisserie Porte (P1)				Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
1046	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,01	
1047					Plafond (mesure 2)	0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - aile centrale - Dégagement 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
1048	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
1049					Mur (partie haute)	0,09	0,01	
1050		A	Enduit	Peinture		0,04	0,01	
1051	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
1052	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,11	0,01	
1053	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
1054	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
1055	Garde corps	F	Métallique	vernis	Garde corps (mesure 1)	0,09	0,01	
1056	Porte (P1)	B	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,04	0,01	
1057	Huisserie Porte (P1)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
1058	Porte (P2)	E	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,07	0,01	
1059	Huisserie Porte (P2)	E	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,02	0,01	
1060	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

3ème étage - aile centrale - Dégagement 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
1061	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
1062	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
1063	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,10	0,01	
1064	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
1065	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
1066	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
1067	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
1068	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,02	0,01	
1069	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,05	0,01	
1070	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,01	0,01	
1071	Porte (P3)	C	bois	peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,06	0,01	
1072	Huisserie Porte (P3)	C	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,02	0,01	
1073	Porte (P4)	E	bois	peinture	Porte (P4) (partie haute)	0,03	0,01	
1074	Huisserie Porte (P4)	E	bois	peinture	Huisserie Porte (P4) (partie haute)	0,07	0,01	
1075	Porte (P5)	F	bois	peinture	Porte (P5) (partie haute)	0,02	0,01	
1076	Huisserie Porte (P5)	F	bois	peinture	Huisserie Porte (P5) (partie haute)	0,09	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1077	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

3ème étage - aile centrale - Circulation 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
1078	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,04	0,01	
1079	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
1080	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
1081	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
1082	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,04	0,01	
1083	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
1084	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,01	0,01	
1085	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,09	0,01	
1086	Porte (P3)	C	bois	peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,01	0,01	
1087	Huisserie Porte (P3)	C	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,05	0,01	
1088	Porte (P4)	D	bois	peinture	Porte (P4) (partie haute)	0,10	0,01	
1089	Huisserie Porte (P4)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P4) (partie haute)	0,01	0,01	
1090	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

Extérieur - Façade côté jardin

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Crépi		Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
1091	Ensembles Garde corps		métallique	peinture	Garde corps (mesure 1)	2,45	1,14	
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

Extérieur - Façade côté parking

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	crépi		Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
1092	Ensembles Garde corps		métallique	peinture	Garde corps (mesure 1)	1,96	0,70	
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

Sous-Sol - Cave 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol (S1)		Béton	brut	Sol (S1) (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
1093	Mur (M5)	A	Enduit	ciment	Mur (M5) (au centre)	0,01	0,01	
1094	Mur (M6)	B	Enduit	ciment	Mur (M6) (au centre)	0,06	0,01	
1095	Mur (M7)	C	Enduit	ciment	Mur (M7) (au centre)	0,02	0,01	
1096	Mur (M8)	D	Enduit	ciment	Mur (M8) (au centre)	0,09	0,01	
1097	Porte (P1)		Bois	Vernis	Porte (P1) (partie mobile)	0,04	0,01	
1098					Porte (P1) (Huisserie)	0,01	0,01	
-	Plafond (P2)		briques	Brut	Plafond (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Cave 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol (S1)		béton	brut	Sol (S1) (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
1099	Mur (M1)	A	enduit	ciment	Mur (M1) (au centre)	0,06	0,01	
1100	Mur (M2)	B	enduit	ciment	Mur (M2) (au centre)	0,09	0,01	
1101	Mur (M3)	C	enduit	ciment	Mur (M3) (au centre)	0,08	0,01	
1102	Mur (M4)	D	enduit	ciment	Mur (M4) (au centre)	0,04	0,01	
-	Plafond (P1)		briques	Brut	Plafond (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
1103	Porte (P1)		Métal	Peinture	Porte (P1) (partie mobile)	3,94	1,25	
1104					Porte (P1) (Huisserie)	3,94	1,25	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Cave 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol (S1)		béton	brut	Sol (S1) (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
1105	Mur (M1)	A	enduit	ciment	Mur (M1) (au centre)	0,03	0,01	
1106	Mur (M2)	B	enduit	ciment	Mur (M2) (au centre)	0,05	0,01	
1107	Mur (M3)	C	enduit	ciment	Mur (M3) (au centre)	0,07	0,01	
1108	Mur (M4)	D	enduit	ciment	Mur (M4) (au centre)	0,01	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1109	Porte (P1)	A	Bois	Vernis	Porte (P1) (partie mobile)	0,03	0,01	
1110					Porte (P1) (Huisserie)	0,04	0,01	
-	Plafond (P1)		briques	brut	Plafond (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /

ANNEXE 1 -
REPERAGE DES LOCAUX

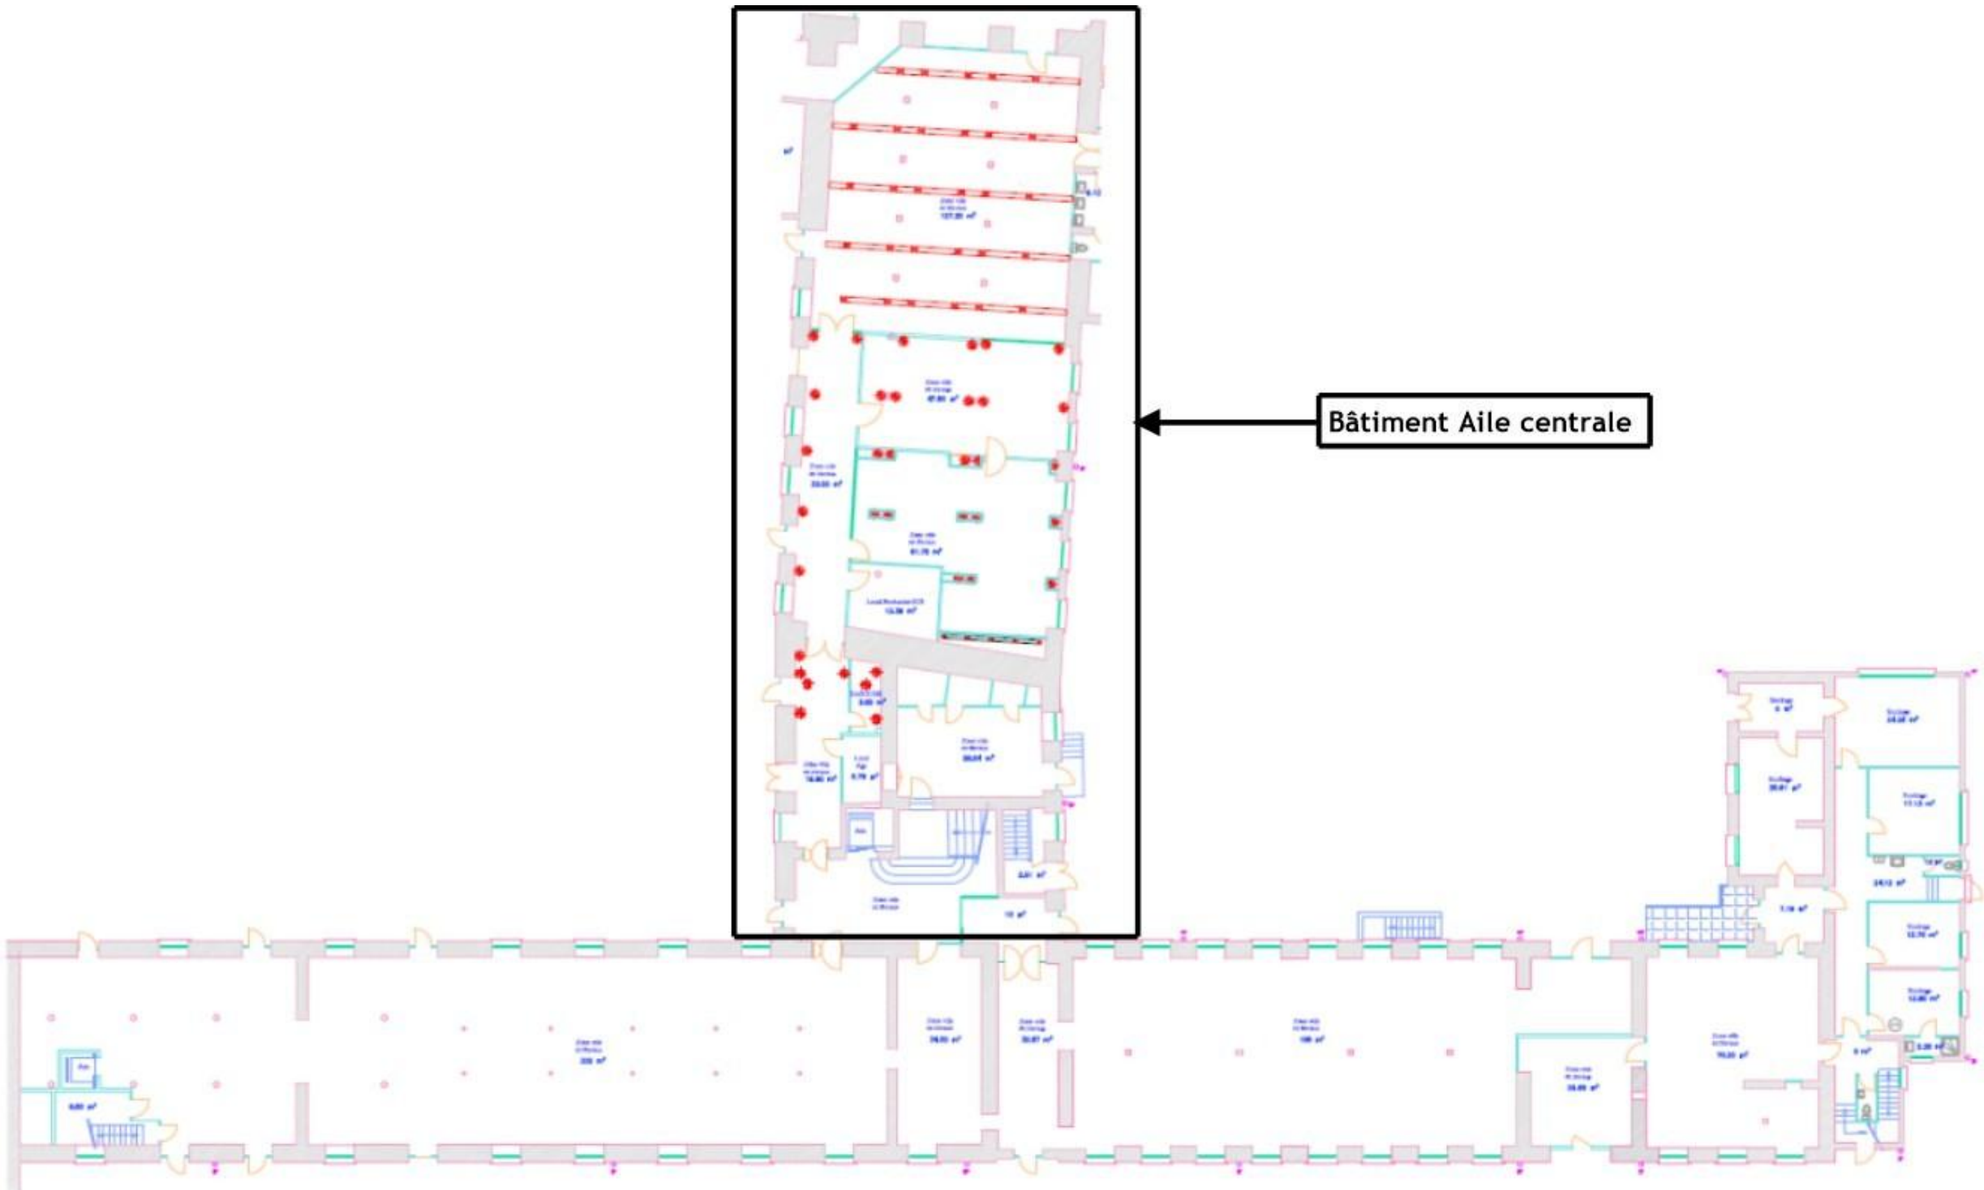


Planche de repérage technique

N° planche: 1/9

Nom du plan:

Croquis plan de situation

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 18/05/2026

Commentaires :

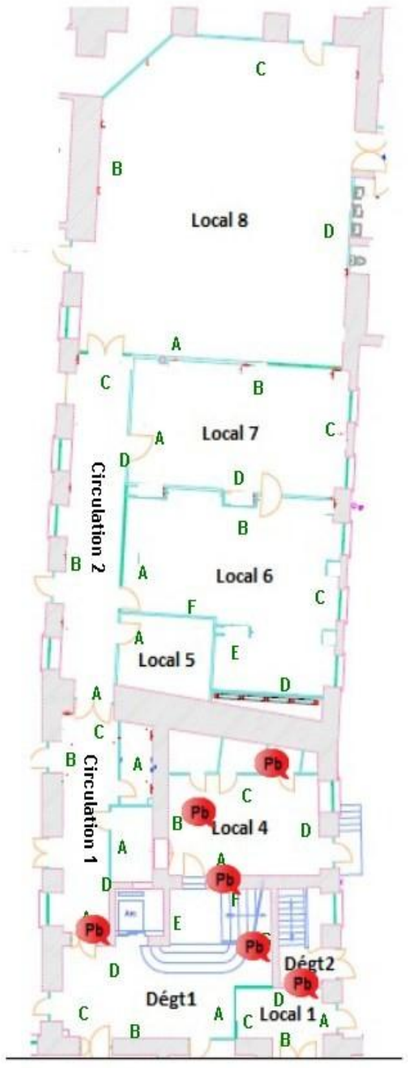

Croquis Rdc aile centrale

Planche de repérage technique

N° planche: 3/9

Nom du plan:

Croquis Rdc aile centrale

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 18/05/2026

Commentaires :

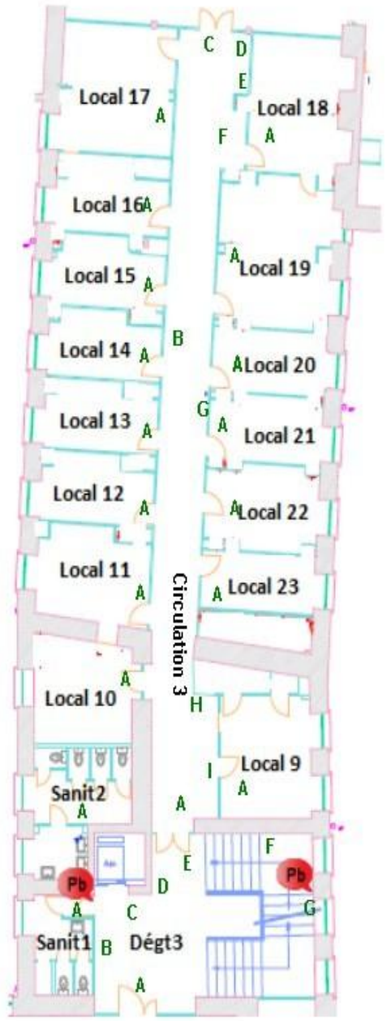

Croquis R+1 aile centrale

Planche de repérage technique

N° planche: 5/9

Nom du plan:

Croquis R+1 aile centrale

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 18/05/2026

Commentaires :



Croquis R+2 aile centrale

Planche de repérage technique

N° planche: 7/9

Nom du plan:

Croquis R+2 aile centrale

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 18/05/2026

Commentaires :

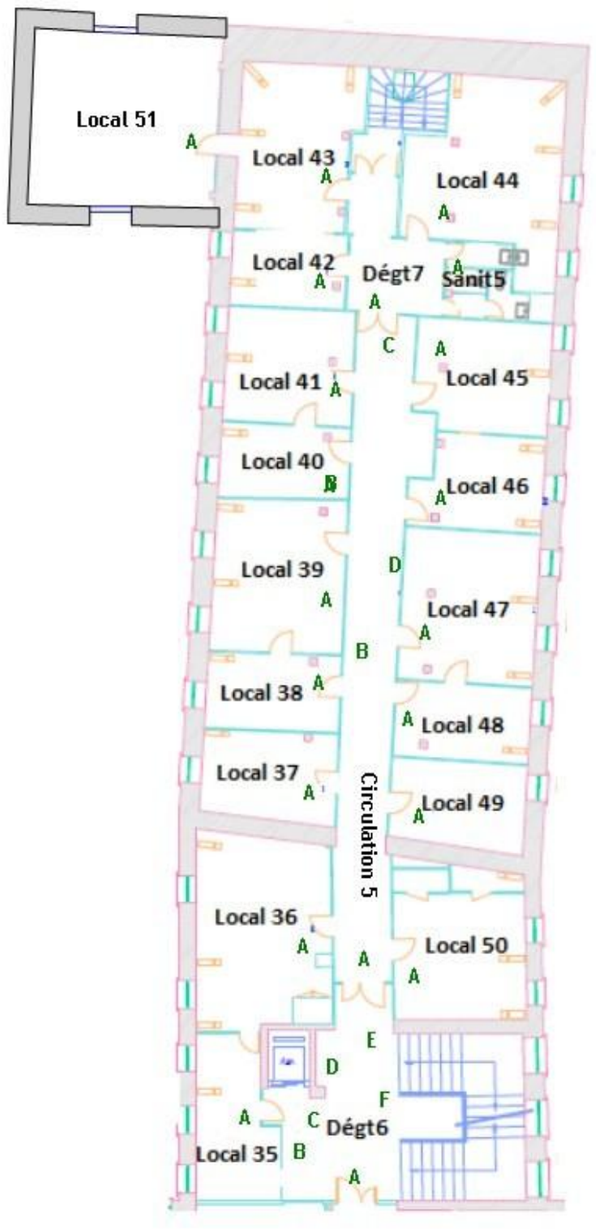

Croquis R+3 aile centrale

Planche de repérage technique

N° planche: 9/9

Nom du plan:

Croquis R+3 aile centrale

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002209
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 18/05/2026

Commentaires :

ANNEXE 2 -
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE



Photo n° PhPb001
Localisation : Sous-Sol - Cave 2
UD : Porte (P1) (partie mobile)
Type de dégradation : Non dégradé - Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 3,94

ANNEXE 3 -
AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES

Néant

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
🖷 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat
Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références
Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 03/01/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 071,30 € - 310 499 959RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
🖷 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat
Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références
Contrat : **37503519275087**
A effet du 01/01/2021
Client : **0010834120**

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées, notamment :

- Diagnostic HAP
- Etat Parasitaire
- Etat des risques et pollutions
- Mesurage loi Carrez et loi Boutin

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 20/12/2024
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 071,30 € - 310 499 959RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 -
ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq.** Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC (Lesquin)	
Modèle de l'analyseur :	FEnX
Numéro de série analyseur :	2-0900
Numéro de série de la source :	RTV-1210-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	09/07/2021
Date de fin de validité de la source :	09/07/2026

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 6 -
NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr

OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr

RSI région Centre
http://www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
    - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
    - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)
