Contrôle après travaux en présence de plomb

Contrôle réglementaire réalisé dans le cas d'un DRIPP
(Norme NF X 46-032 : Avril 2008)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :	Propriétaire
1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX (France)	Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE 1, Place Saint Taurin 27000 EVREUX (France) **Demandeur** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE - Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE 1, Place Saint Taurin 27000 EVREUX (France)

Information sur le bien

Autres **0.00** Usage : .....**Autres** Enseigne.....**CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE**	**jours** Type de travaux réalisés : ..... **Rénovation, remise en état ou remplacement du gros œuvre.**

Date du rapport : 11/06/2026 **Date de visite :** 02/06/2026 **Nombre de pages :** 27 **Fait à :** 76230 ISNEAUVILLE **Référence du dossier :** 2606CHNRO - BI14360000002665	**Auteur du rapport :** Vincent COSNIER **Fonction :** Opérateur de repérage **Certificat de compétence** n° DTI/202012 - 004 **Délivré par :** SOCOTEC Certification France **Contrat d'assurance :** AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026	

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. REFERENCES REGLEMENTAIRES 3

II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA MISSION 3

1. OBJECTIF DE LA MISSION 3
2. DIFFERENTS LOTS DE PRELEVEMENTS UTILISES 3
3. LISTE DES TRACES VISIBLES 3
4. LE LABORATOIRE D'ANALYSE 3

III. METHODOLOGIE EMPLOYEE 3

IV. RESULTATS DETAILLES 4

1. TABLEAU DES PRELEVEMENTS 4
2. TABLEAU DES RESULTATS 7

ANNEXE 1 - REPERAGE DES LOCAUX 9

Annexe 2 - AUTRES DOCUMENTS 14

ANNEXE 3 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 25

ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE 26

I. REFERENCES REGLEMENTAIRES

Le contrôle mentionné aux Articles L.1334-2, L.1334-3 et R.1334-8 du code de la santé publique est effectué par un opérateur agréé par le préfet et sur commande de ce dernier, après signalement de la fin des travaux par le propriétaire. Le syndicat de copropriétaires ou par l'exploitant du local d'hébergement, ou au plus tard à l'issue du délai fixé par le préfet pour la réalisation des travaux.

Le présent rapport est réalisé dans le respect de la norme **NF X 46-032 : Avril 2008** et de l'**Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique.**
Il est vérifié que les travaux ont été réalisés conformément à la notification mentionnée à l'Article L.1334-2 du code de la santé publique, que les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été traitées et que la concentration surfacique des poussières au sol est inférieure à 1 000 µg/m². Dans le cas contraire, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement fait procéder à un nouveau nettoyage minutieux des locaux traités, préalablement à de nouveaux prélèvements de poussières.

II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA MISSION

1. OBJECTIF DE LA MISSION

Dans le cadre des mesures préfectorales d'urgence à la suite du signalement d'un cas de saturnisme ou d'un risque d'exposition au plomb concernant un enfant mineur, les nouvelles dispositions précisent l'obligation pour le propriétaire, en présence de revêtement dégradés contenant du plomb mis en évidence dans le diagnostic, de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'exposition au plomb.

Le présent document permet d'identifier les échantillons de prélèvement nécessaires aux contrôles des traces de plomb sur les différentes surfaces du bien après travaux de mise en conformité.

2. DIFFERENTS LOTS DE PRELEVEMENTS UTILISES

3. LISTE DES TRACES VISIBLES

Type	Localisation	Commentaires
Poussières	Aile centrale - Ensemble du Rez de chaussée	
Poussières	Aile centrale - Ensemble du 1er étage	
Poussières	Aile centrale - Ensemble du 2ème étage	
Poussières	Aile centrale - Ensemble du 3ème étage	

4. LE LABORATOIRE D'ANALYSE

Nom du laboratoire d'analyse	**Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)**
Nom du contact	
Coordonnées	**44 rue Jean Huss – 42000 Saint-Etienne**
Référence du rapport d'essai	
Date d'envoi des prélèvements	**03/06/2026**
Date de réception des résultats	**11/06/2026**

III. METHODOLOGIE EMPLOYEE



La méthode de prélèvement des poussières après travaux dans le cadre d'une mise en conformité législative est définie dans la norme NFX46-032 et consiste à effectuer des prélèvements qualifiés par la mise en place d'un blanc et d'un témoin. Sur le terrain, l'opérateur s'équipe d'une nouvelle paire de sur-chaussure à l'entrée de chaque logement pour les parties à usage commun d'un immeuble d'habitation et utilise des gants à usage unique pour chaque nouveau prélèvement.



IV. RESULTATS DETAILLES

1. TABLEAU DES PRELEVEMENTS

N° de lot	Date du prélèvement	Identification prélèvement	Localisation	Nature du sol / Etat du sol	Surface du gabarit	Photo
	02/06/2026	Echantillon - 1	Rdc degt.3 Sol	Pvc sale	0,1	
		Echantillon - 2	degt.1 rdc Sol	Pvc sale	0,1	
		Echantillon - 3	local 7 rdc sol	Pvc Sale	0,1	
		Echantillon - 4	Local 8 rdc sol	Carrelage Sale	0,1	
		Echantillon - 5	degt.1 rdc estrade Sol marche bois	Bois Sale	0,1	
		Echantillon - 6	degt.2 rdc sol	Pvc Sale	0,1	
		Echantillon - 7	Degt.3 r+1 Sol	Pvc Sale	0,1	

N° de lot	Date du prélèvement	Identification prélèvement	Localisation	Nature du sol / Etat du sol	Surface du gabarit	Photo
		Echantillon - 8	Sanitaires 2 r+1 Sol	carrelage Sale	0,1	
		Echantillon - 9	local 11 r+1 Sol	Pvc Sale	0,1	
		Echantillon - 10	local 16 r+1 sol	Pvc Sale	0,1	
		Echantillon - 11	local 20 r+1 sol	Pvc Sale	0,1	
		Echantillon - 12	degt.4 r+1 Sol	Pvc Sale	0,1	
	04/06/2026	Echantillon - 13	R+2 degt.4 SOL	pvc sale	0,1	
		Echantillon - 14	R+2 sanit 3 SOL	carrelage sale	0,1	

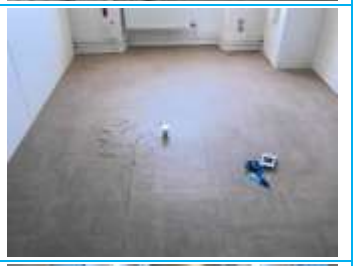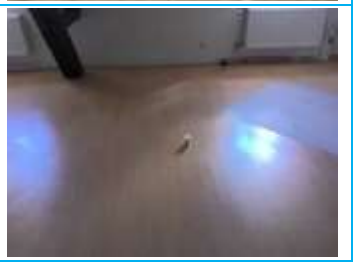N° de lot	Date du prélèvement	Identification prélèvement	Localisation	Nature du sol / Etat du sol	Surface du gabarit	Photo
		Echantillon - 15	R+2 local 25 SOL	pvc sale	0,1	
		Echantillon - 16	R+2 local 27 SOL	pvc sale	0,1	
		Echantillon - 17	R+2 local 29 SOL	pvc sale	0,1	
		Echantillon - 18	R+2 local 31 SOL	pvc sale	0,1	
		Echantillon - 19	R+2 degt 5 SOL	pvc sale	0,1	
		Echantillon - 20	R+3 degt. 6 SOL	pvc sale	0,1	
		Echantillon - 21	R+3 local 36 SOL	pvc sale	0,1	

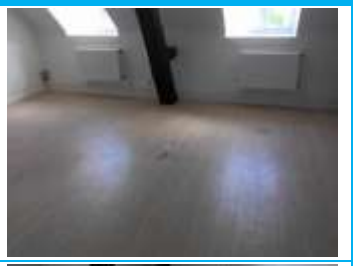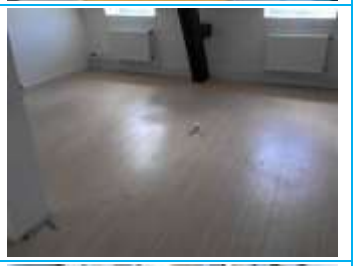
N° de lot	Date du prélèvement	Identification prélèvement	Localisation	Nature du sol / Etat du sol	Surface du gabarit	Photo
		Echantillon - 22	R+3 local 39 SOL	pvc sale	0,1	
		Echantillon - 23	R+3 local 43 SOL	pvc sale	0,1	
		Echantillon - 24	R+3 sanit.5 SOL	Pvc sale	0,1	
		Echantillon - 25	R+3 local 46 SOL	pvc sale	0,1	
		Echantillon - 26	R+3 degt.7 SOL	pvc sale	0,1	

2. TABLEAU DES RESULTATS


N° de lot	Identification prélèvement	Date de reception de l'échantillon	Date d'analyse de l'échantillon	Concentration surfacique (µg/m²)	Commentaires
	Echantillon - 1	11/06/2026	11/06/2026	2670 ± 609	
	Echantillon - 2	11/06/2026	11/06/2026	2530 ± 577	
	Echantillon - 3	11/06/2026	11/06/2026	500 ± 114	
	Echantillon - 4	11/06/2026	11/06/2026	431 ± 98	
	Echantillon - 5	11/06/2026	11/06/2026	1220 ± 278	
	Echantillon - 6	11/06/2026	11/06/2026	12100 ± 2762	
	Echantillon - 7	11/06/2026	11/06/2026	845 ± 193	
	Echantillon - 8	11/06/2026	11/06/2026	1600 ± 365	
	Echantillon - 9	11/06/2026	11/06/2026	928 ± 212	
	Echantillon - 10	11/06/2026	11/06/2026	119 ± 27	
	Echantillon - 11	11/06/2026	11/06/2026	359 ± 82	
	Echantillon - 12	11/06/2026	11/06/2026	227 ± 52	
	Echantillon - 13	11/06/2026	11/06/2026	548 ± 125	
	Echantillon - 14	11/06/2026	11/06/2026	1950 ± 445	
	Echantillon - 15	11/06/2026	11/06/2026	1140 ± 260	

N° de lot	Identification prélèvement	Date de reception de l'échantillon	Date d'analyse de l'échantillon	Concentration surfacique (µg/m²)	Commentaires
	Echantillon - 16	11/06/2026	11/06/2026	594 ± 136	
	Echantillon - 17	11/06/2026	11/06/2026	323 ± 74	
	Echantillon - 18	11/06/2026	11/06/2026	1640 ± 374	
	Echantillon - 19	11/06/2026	11/06/2026	741 ± 169	
	Echantillon - 20	11/06/2026	11/06/2026	575 ± 131	
	Echantillon - 21	11/06/2026	11/06/2026	682 ± 156	
	Echantillon - 22	11/06/2026	11/06/2026	815 ± 186	
	Echantillon - 23	11/06/2026	11/06/2026	616 ± 141	
	Echantillon - 24	11/06/2026	11/06/2026	694 ± 158	
	Echantillon - 25	11/06/2026	11/06/2026	767 ± 175	
	Echantillon - 26	11/06/2026	11/06/2026	549 ± 125	


ANNEXE 1 -
REPERAGE DES LOCAUX

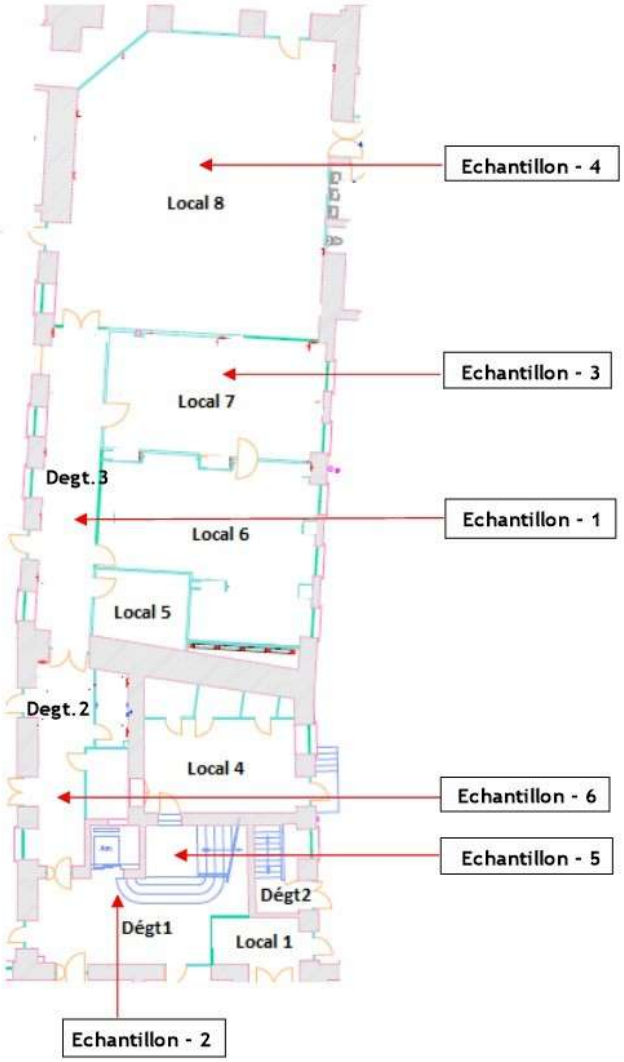


Croquis Rdc aile centrale - Localisation des tests lingettes - SOLS

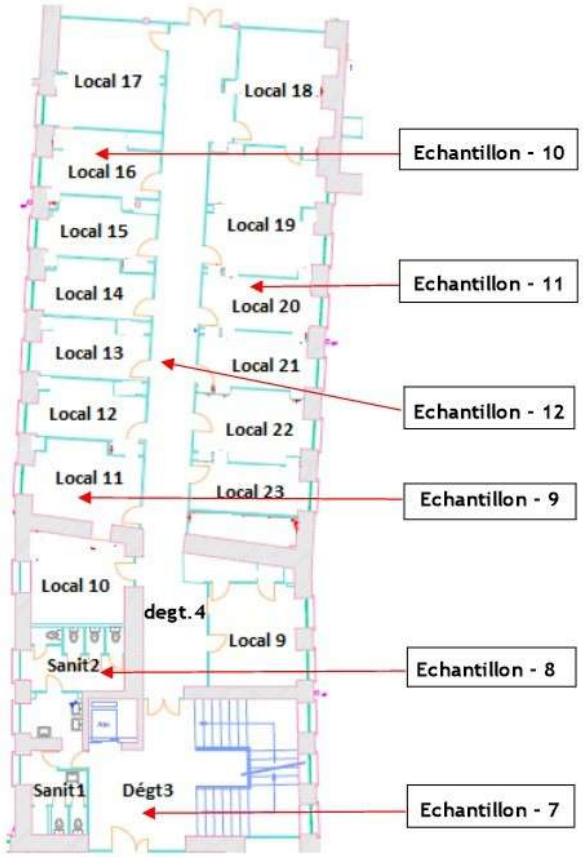

Croquis 1er étage aile centrale - Localisation des tests lingettes - SOLS

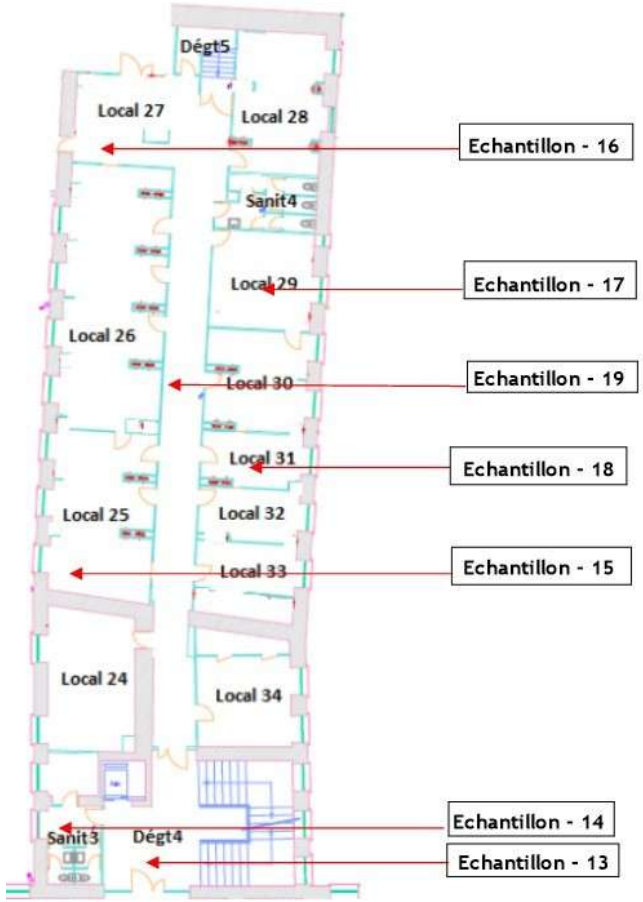

Croquis 2ème étage aile centrale - Localisation des tests lingettes - SOLS

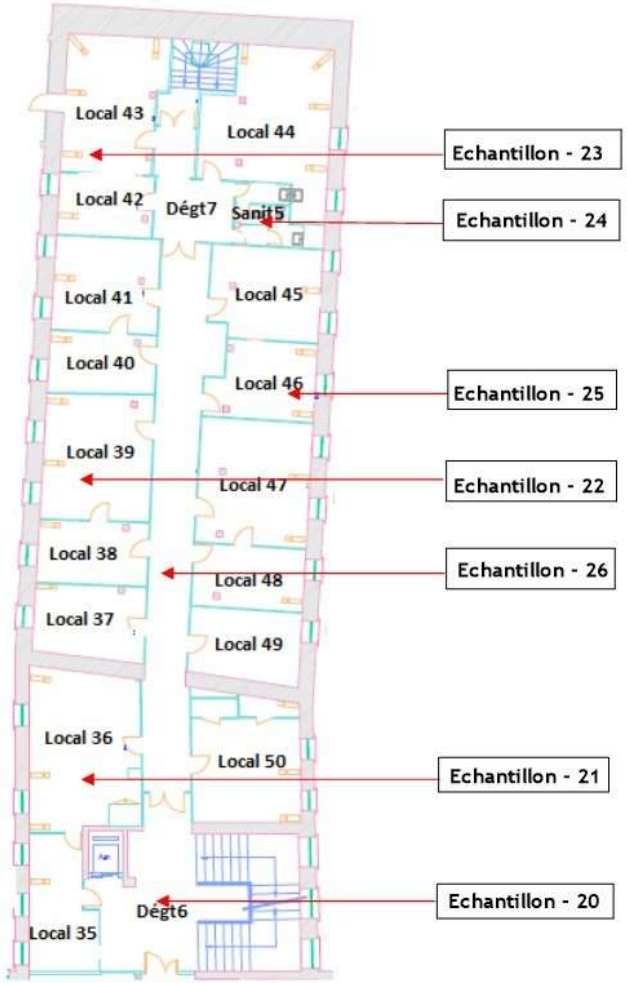

Croquis 3ème étage aile centrale - Localisation des tests lingettes - SOLS

ANNEXE 2 -
PV D'ANALYSES

SOCOTEC

ITGA
Agence de saint-etienne
44, rue Jean Huss
42000 Saint-Etienne
Tel. : 04 77 79 52 80
www.itga.fr - E-Mail : se@itga.fr

Accréditation n°1-1761
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole (C).

Rapport d'essai :	KSP2606-0811-001_1	Date : 11 juin 2026

Client :	SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO)	ITGA :
Réf. commande :	2606CHNRO-BI1430000002665	Date de réception des échantillons : 9 juin 2026
Interlocuteur :	M. COSNIER Vincent	
Adresse :	114 rue Louis Blériot 76237 BOIS-GUILLAUME CEDEX	

Description : Lingette (x26)

Analyses demandées : Concentration en Plomb Acido-soluble

Observations : Prélèvements effectués par vos soins

Saint-Etienne, le jeudi 11 juin 2026

L'Analyste Habilitée
Mathilde BIDAUX

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à essais. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Rapport d'essai	KSP2606-0811-001_1	11/06/2026

Concentration en Plomb Acido-soluble

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : NF X 46-032 - Méthode interne IT 261
Support de prélèvement : Lingette
Méthode de préparation : Extraction aux ultrasons (HCl 0,15 N)- Repos 1h à 37°C - Filtration
Technique analytique : ICP- AES

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

		P001	P002	P003
Emplacement		SOL RDC DEGT 3 Poussière	SOL RDC DEGT 1 Poussère	SOL RDC LOCAL 7 Poussière
Date		15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
Surface essuyée	m²	0,10	0,10	0,10

RÉSULTAT

MASSE	LQ	I		P001	P002	P003
Plomb Acido-soluble(C)	5,00	20%	µg	267 ± 53	253 ± 51	50,0 ± 10,0

CONCENTRATION	I		P001 (1, 2)	P002 (1, 2)	P003 (1, 2)
Plomb Acido-soluble	23%	µg/m²	2670 ± 609	2530 ± 577	500 ± 114

REMARQUES

(1) L'incertitude sur la concentration prend en compte une incertitude sur la mesure de la surface basée sur des données de prélèvements réalisés par nos soins.
(2) La surface essuyée n'a pas été communiquée par le client. La concentration surfacique a été calculée avec la valeur arbitraire de 0,1 m². Si la surface réellement essuyée est différente, la concentration surfacique doit être recalculée.

- Date de préparation des échantillons : 09/06/2026
- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

Concentration en Plomb Acido-soluble

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : NF X 46-032 - Méthode interne IT 261
Support de prélèvement : Lingette
Méthode de préparation : Extraction aux ultrasons (HCl 0,15 N)- Repos 1h à 37°C - Filtration
Technique analytique : ICP- AES

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

		P004	P005	P006
Emplacement		SOL RDC LOCAL 8 Poussière	SOL RDC DEGT 1 Poussière	SOL RDC DEGT 2 Poussière
Date		15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
Surface essuyée	m²	0,10	0,10	0,10

RÉSULTAT

MASSE	LQ	I		P004	P005	P006
Plomb Acido-soluble(C)	5,00	20%	µg	43,1 ± 8,6	122 ± 24	1210 ± 242

CONCENTRATION	I		P004 (1, 2)	P005 (1, 2)	P006 (1, 2)
Plomb Acido-soluble	23%	µg/m²	431 ± 98	1220 ± 278	12100 ± 2762

REMARQUES

(1) L'incertitude sur la concentration prend en compte une incertitude sur la mesure de la surface basée sur des données de prélèvements réalisés par nos soins.
(2) La surface essuyée n'a pas été communiquée par le client. La concentration surfacique a été calculée avec la valeur arbitraire de 0,1 m². Si la surface réellement essuyée est différente, la concentration surfacique doit être recalculée.
- Date de préparation des échantillons : 09/06/2026
- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

Concentration en Plomb Acido-soluble

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : NF X 46-032 - Méthode interne IT 261
Support de prélèvement : Lingette
Méthode de préparation : Extraction aux ultrasons (HCl 0,15 N)- Repos 1h à 37°C - Filtration
Technique analytique : ICP- AES

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

		P007	P008	P009
Emplacement		SOL R+1 DEGT 3 Poussière	SOL R+1 SANIT 2 Poussière	SOL R+1 LOCAL 11 Poussière
Date		15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
Surface essuyée	m^2	0,10	0,10	0,10

RÉSULTAT

MASSE	LQ	I		P007	P008	P009
Plomb Acido-soluble(C)	5,00	20%	µg	84,5 ± 16,9	160 ± 32	92,8 ± 18,6

CONCENTRATION	I		P007 (1, 2)	P008 (1, 2)	P009 (1, 2)
Plomb Acido-soluble	23%	µg/m³	845 ± 193	1600 ± 365	928 ± 212

REMARQUES

(1) L'incertitude sur la concentration prend en compte une incertitude sur la mesure de la surface basée sur des données de prélèvements réalisés par nos soins.
(2) La surface essuyée n'a pas été communiquée par le client. La concentration surfacique a été calculée avec la valeur arbitraire de 0,1 m². Si la surface réellement essuyée est différente, la concentration surfacique doit être recalculée.
- Date de préparation des échantillons : 09/06/2026
- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

Concentration en Plomb Acido-soluble

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : NF X 46-032 - Méthode interne IT 261
Support de prélèvement : Lingette
Méthode de préparation : Extraction aux ultrasons (HCl 0,15 N)- Repos 1h à 37°C - Filtration
Technique analytique : ICP- AES

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

		P010	P011	P012
Emplacement		SOL R+1 LOCAL 16 Poussière	SOL R+1 LOCAL 20 Poussière	SOL R+1 DEGT 4 Poussière
Date		15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
Surface essuyée	m²	0,10	0,10	0,10

RÉSULTAT

MASSE	LQ	I		P010	P011	P012
Plomb Acido-soluble(C)	5,00	20%	µg	11,9 ± 2,4	35,9 ± 7,2	22,7 ± 4,5

CONCENTRATION		I		P010 (1, 2)	P011 (1, 2)	P012 (1, 2)
Plomb Acido-soluble		23%	µg/m²	119 ± 27	359 ± 82	227 ± 52

REMARQUES

(1) L'incertitude sur la concentration prend en compte une incertitude sur la mesure de la surface basée sur des données de prélèvements réalisés par nos soins.
(2) La surface essuyée n'a pas été communiquée par le client. La concentration surfacique a été calculée avec la valeur arbitraire de 0,1 m². Si la surface réellement essuyée est différente, la concentration surfacique doit être recalculée.
- Date de préparation des échantillons : 09/06/2026
- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

Concentration en Plomb Acido-soluble

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : NF X 46-032 - Méthode interne IT 261
Support de prélèvement : Lingette
Méthode de préparation : Extraction aux ultrasons (HCl 0,15 N)- Repos 1h à 37°C - Filtration
Technique analytique : ICP- AES

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

		P013	P014	P015
Emplacement		SOL R+2 DEGT 4 Poussière	SOL R+2 SANIT 3 Poussière	SOL R+2 LOCAL 25 Poussière
Date		15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
Surface essuyée	m²	0,10	0,10	0,10

RÉSULTAT

MASSE	LQ	I		P013	P014	P015
Plomb Acido-soluble(C)	5,00	20%	µg	54,8 ± 11,0	195 ± 39	114 ± 23

CONCENTRATION	I		P013 (1, 2)	P014 (1, 2)	P015 (1, 2)
Plomb Acido-soluble	23%	µg/m³	548 ± 125	1950 ± 445	1140 ± 260

REMARQUES

(1) L'incertitude sur la concentration prend en compte une incertitude sur la mesure de la surface basée sur des données de prélèvements réalisés par nos soins.
(2) La surface essuyée n'a pas été communiquée par le client. La concentration surfacique a été calculée avec la valeur arbitraire de 0,1 m². Si la surface réellement essuyée est différente, la concentration surfacique doit être recalculée.
- Date de préparation des échantillons : 09/06/2026
- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

Concentration en Plomb Acido-soluble

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : NF X 46-032 - Méthode interne IT 261
Support de prélèvement : Lingette
Méthode de préparation : Extraction aux ultrasons (HCl 0,15 N)- Repos 1h à 37°C - Filtration
Technique analytique : ICP- AES

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

		P016	P017	P018
Emplacement		SOL R+ 2 LOCAL 27 Poussière	SOL R+ 2 LOCAL 29 Poussière	SOL R+ 2 LOCAL 31 Poussière
Date		15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
Surface essuyée	m²	0,10	0,10	0,10

RÉSULTAT

MASSE	LQ	I		P016	P017	P018
Plomb Acido-soluble(C)	5,00	20%	µg	59,4 ± 11,9	32,3 ± 6,5	164 ± 33

CONCENTRATION	I		P016 (1, 2)	P017 (1, 2)	P018 (1, 2)
Plomb Acido-soluble	23%	µg/m²	594 ± 136	323 ± 74	1640 ± 374

REMARQUES

(1) L'incertitude sur la concentration prend en compte une incertitude sur la mesure de la surface basée sur des données de prélèvements réalisés par nos soins.
(2) La surface essuyée n'a pas été communiquée par le client. La concentration surfacique a été calculée avec la valeur arbitraire de 0,1 m². Si la surface réellement essuyée est différente, la concentration surfacique doit être recalculée.
- Date de préparation des échantillons : 09/06/2026
- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

Concentration en Plomb Acido-soluble

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : NF X 46-032 - Méthode interne IT 261
Support de prélèvement : Lingette
Méthode de préparation : Extraction aux ultrasons (HCl 0,15 N)- Repos 1h à 37°C - Filtration
Technique analytique : ICP- AES

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

		P019	P020	P021
Emplacement		SOL R+ 2 DEGT 5 Poussière	SOL R+ 3 DEGT 6 Poussière	SOL R+ 3 LOCAL 36 Poussière
Date		15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
Surface essuyée	m²	0,10	0,10	0,10

RÉSULTAT

MASSE	LQ	I		P019	P020	P021
Plomb Acido-soluble(C)	5,00	20%	µg	74,1 ± 14,8	57,5 ± 11,5	68,2 ± 13,6

CONCENTRATION	I		P019 (1, 2)	P020 (1, 2)	P021 (1, 2)
Plomb Acido-soluble	23%	µg/m²	741 ± 169	575 ± 131	682 ± 156

REMARQUES

(1) L'incertitude sur la concentration prend en compte une incertitude sur la mesure de la surface basée sur des données de prélèvements réalisés par nos soins.
(2) La surface essuyée n'a pas été communiquée par le client. La concentration surfacique a été calculée avec la valeur arbitraire de 0,1 m². Si la surface réellement essuyée est différente, la concentration surfacique doit être recalculée.

- Date de préparation des échantillons : 09/06/2026
- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

Concentration en Plomb Acido-soluble

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : NF X 46-032 - Méthode interne IT 261
Support de prélèvement : Lingette
Méthode de préparation : Extraction aux ultrasons (HCl 0,15 N)- Repos 1h à 37°C - Filtration
Technique analytique : ICP- AES

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

		P022	P023	P024
Emplacement		SOL R+ 3 LOCAL 39 Poussière	SOL R+ 3 LOCAL 43 Poussière	SOL R+ 3 SANIT 5 Poussière
Date		15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025
Surface essuyée	m^2	0,10	0,10	0,10

RÉSULTAT

MASSE	LQ	I		P022	P023	P024
Plomb Acido-soluble(C)	5,00	20%	µg	81,5 ± 16,3	61,6 ± 12,3	69,4 ± 13,9

CONCENTRATION	I		P022 (1, 2)	P023 (1, 2)	P024 (1, 2)
Plomb Acido-soluble	23%	µg/m²	815 ± 186	616 ± 141	694 ± 158

REMARQUES

(1) L'incertitude sur la concentration prend en compte une incertitude sur la mesure de la surface basée sur des données de prélèvements réalisés par nos soins.
(2) La surface essuyée n'a pas été communiquée par le client. La concentration surfacique a été calculée avec la valeur arbitraire de 0,1 m². Si la surface réellement essuyée est différente, la concentration surfacique doit être recalculée.
- Date de préparation des échantillons : 09/06/2026
- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

Concentration en Plomb Acido-soluble

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : NF X 46-032 - Méthode interne IT 261
Support de prélèvement : Lingette
Méthode de préparation : Extraction aux ultrasons (HCl 0,15 N)- Repos 1h à 37°C - Filtration
Technique analytique : ICP- AES

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

		P025	P026
Emplacement		SOL R+ 3 local 36 Poussière	SOL R+ 3 degt 7 Poussière
Date		15/12/2025	15/12/2025
Surface essuyée	m²	0,10	0,10

RÉSULTAT

MASSE	LQ	I		P025	P026
Plomb Acido-soluble(C)	5,00	20%	µg	76,7 ± 15,3	54,9 ± 11,0

CONCENTRATION	I		P025 (1, 2)	P026 (1, 2)
Plomb Acido-soluble	23%	µg/m²	767 ± 175	549 ± 125

REMARQUES

(1) L'incertitude sur la concentration prend en compte une incertitude sur la mesure de la surface basée sur des données de prélèvements réalisés par nos soins.
(2) La surface essuyée n'a pas été communiquée par le client. La concentration surfacique a été calculée avec la valeur arbitraire de 0,1 m². Si la surface réellement essuyée est différente, la concentration surfacique doit être recalculée.
- Date de préparation des échantillons : 09/06/2026
- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

ANNEXE 3 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES

ANNEXE 4 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

SOCOTEC

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 071,30 € - 310 499 959 RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. **AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** - SA au capital de 14 627 856,68 € - 572 059 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victoires Sud-ex 78160 Marly le Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**
