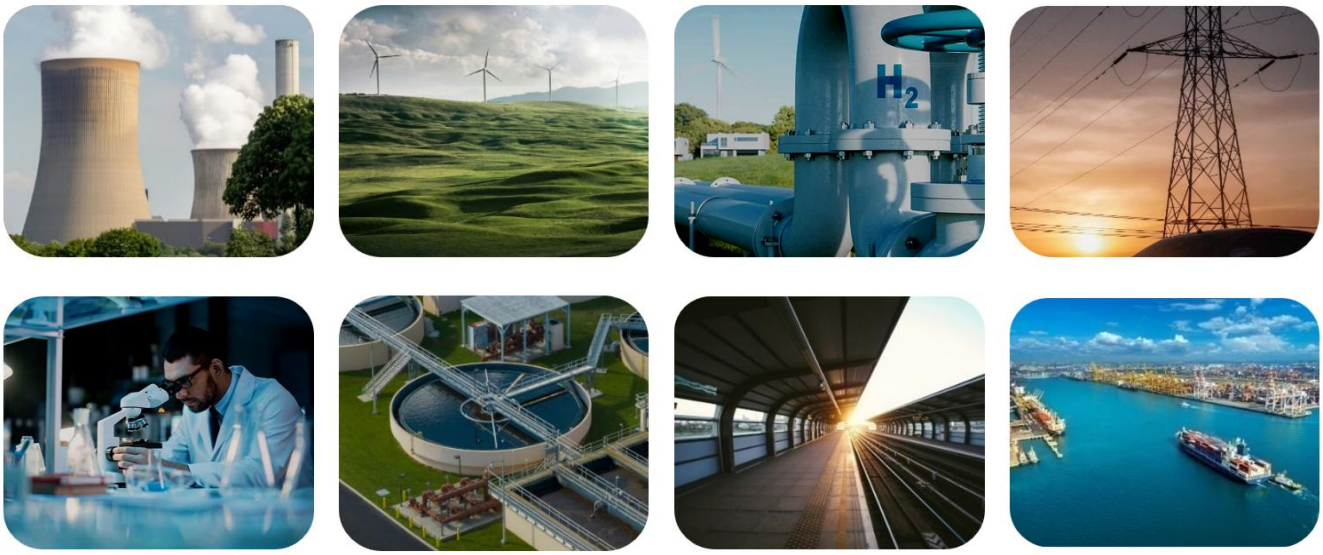


SYNCHROTRON SOLEIL
OS 14 - MISE À NIVEAU STOCKAGE NORD AZOTE LIQUIDE
PRO-DCE

PLANNING

Rédigé par :	Vérifié par :	Approuvé par :
Matthieu Segond Signature numérique de Matthieu Segond Date : 2026.08.14 13:03:02 +02'00'	BURET Caroline Signature numérique de BURET Caroline Date : 2026.08.14 17:22:33 +02'00'	BURET Caroline Signature numérique de BURET Caroline Date : 2026.08.14 17:22:41 +02'00'

1. HISTORIQUE DES REVISIONS

Rév.	Date, Signature et repérages des paragraphes modifiés
B	Rédacteur : Matthieu SEGOND Vérificateur : Caroline BURET Approbateur : Caroline BURET Deuxième émission
	Reprise du planning suite aux commentaires du client, avec l'attribution des travaux les plus contraignants pendant l'arrêt technique du Synchrotron, et le report des travaux restants sur des périodes de coactivité contrôlée.

SYNCHROTRON SOLEIL
OS 14 - MISE À NIVEAU STOCKAGE NORD AZOTE LIQUIDE
PRO-DCE

PLANNING

VULCAIN ENGINEERING GROUP

					2026												2027				
														Arrêt technique synchrotron							
															Fermeture site						
				Semaine	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S01	S02	S03	S04	S05
N°	Tâche	Quantité		Durée															
	Etat inital chantier (à charge de Synchrotron) :																		
	Cuves d'azote retirées, tuyauteries et réseaux d'azote déposés																		
1	**INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX ANNEXES**																		
1.1	Documents d'exécution, visite préalable du chantier	Ens	1	30 Jours															
1.2	Installation de chantier, compris signalisation, raccordement, cloturage et pose de bennes	Ens	1	2 Jours															
1.3	Pose et location d'echafaudage d'accès fixe en toiture type ESCALIB hauteur 8 mètres	Ens	1	2 Mois															
1.4	Pose et location de garde-corps temporaire pour délimiter les zones dangereuses en toiture	Ens	1	1 Mois															
1.5	Pose et location d'un platelage d'étaiement de la couverture	Ens	1	1 Mois															
2	**OUVERTURE ET STRUCTURATION DE LA TRÉMIE**			**15 Jours**															
2.1	Dépose des sujétions en toiture, tracage des découpes	Ens	1	1 Jours															
2.2	Ancrage des anneaux de levage	u	15	1 Jours															
2.3	Pose filet anti-chute	m2	54	1 Jours															
2.4	Pose ligne de vie temporaire	Ens	1	1 Jours															
2.5	Mise en oeuvre d'un batardeau provisoire et traitement de l'étanchéité avant ouverture pour garantir maintien hors d'eau	ml	33	1 Jours															
2.6	Sciage des planchers	ml	33	2 Jours															
2.7	Dépose et grutage des planchers	m2	54	1 Jours															
2.8	Protection charpente	Ens	1	1 Jours															
2.9	Brossage et protections des armatures	m2	17	1 Jours															
2.10	Réalisation des acrotères / poutres de rives	ml	33	3 Jours															
2.11	Enduit de finition	m2	17	1 Jours															
2.12	Pose garde-corps toiture	ml	33	1 Jours															
3	**POSE DE LA NOUVELLE ÉTANCHÉITÉ**			**4 Jours**															
3.1	Nettoyage et préparation des supports	m2	15	1 Jours															
3.2	Pose pare vapeur, isolant et nouvelle membrane d'étancheité	m2	15	1 Jours															
3.3	Finitions sur zones singulières	m2	4	1 Jours															
3.4	Fixation des couvertines	ml	33	1 Jours															
4	**PRÉPARATION DU DALLAGE - RENFORCEMENT**			**10 Jours**															
4.1	Dépose des portes d'accès, dégrafage mécanique, réhaussement isolation	m2	54	4 Jours															
4.2	Nettoyage, repérages des forages	m2	54	1 Jours															
4.3	Percement des trous d'armatures	m2	54	1 Jours															
4.4	Fourniture, pose et scellement des armatures	kg	1876	1 Jours															
4.5	Mise en place cales d'enrobage, coffrage béton	m2	54	1 Jours															
4.6	Coulée gravitaire du béton	m3	11	1 Jours															
4.7	Finitions	Ens	1	1 Jours															
5	**FIN DE CHANTIER**			**5 Jours**															
5.1	Nettoyage et repli de chantier	Ens	1	2 Jours															
5.2	Réception des travaux, levée des réserves et DOE	Ens	1	3 Jours															
	Durée totale projet :			**14** Semaines															

Nota : Planning prévisionnel hors intempéries ; ce planning ne prends pas en compte les intempéries qui ne permettront pas la dépose en cas de nécessité du maintien hors d'eau ; sous réserve des délais des fournisseurs ; **uniquement lors des phases travaux**, il est prévu sur une base de **5 jours de travail par semaine, avec une organisation en 2*8 pour les travaux (on peux donc compter 10 jours de travail réel par semaine)**.

Interne SNCF Réseau
