EXTENSION DU BÂTIMENT G
PURPLE CAMPUS BEZIERS
Planning prévisonnel
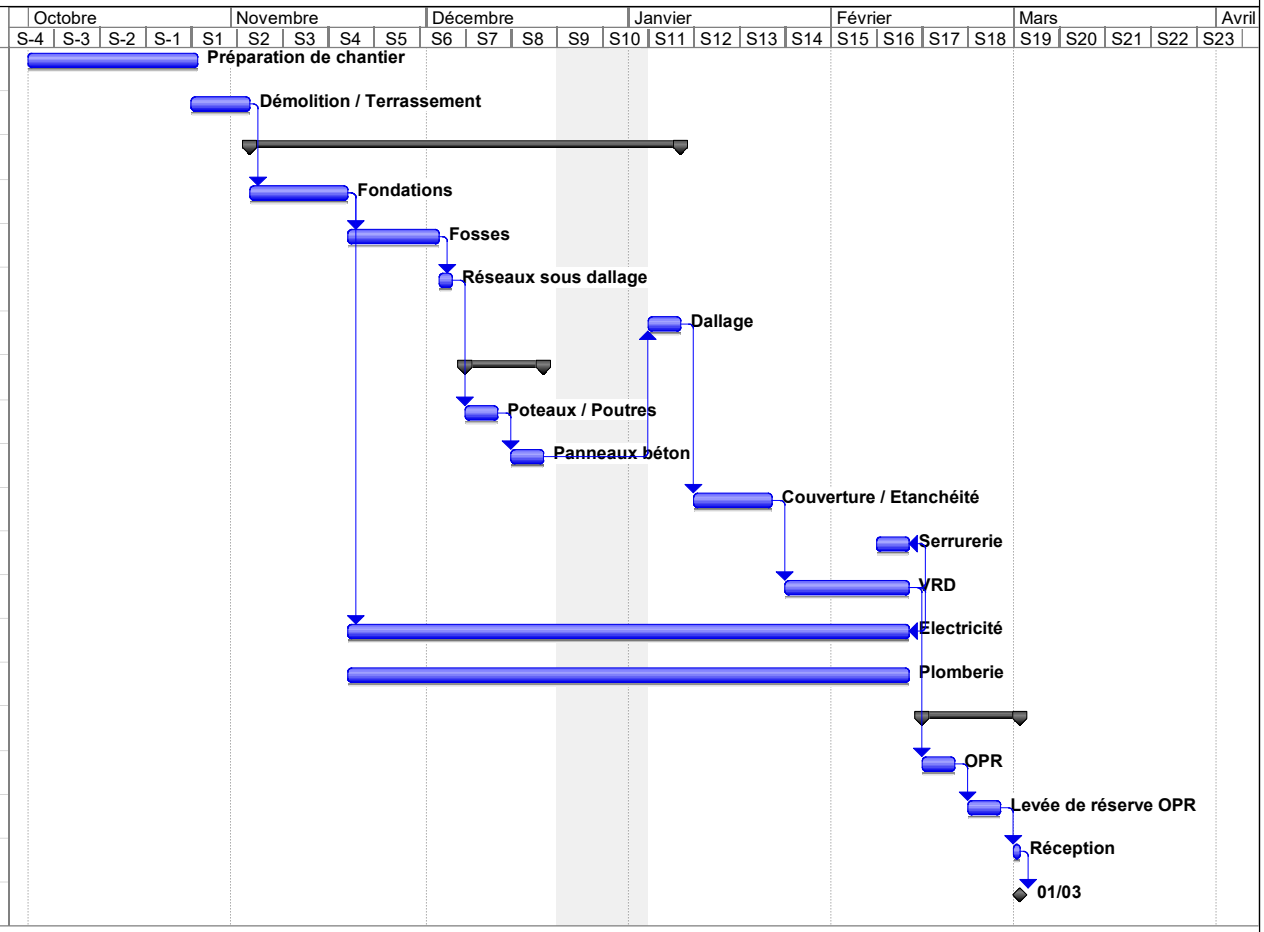
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	Préparation de chantier	18 jours?	Jeu 01/10/26	Lun 26/10/26	
2	Démolition / Terrassement	7 jours	Lun 26/10/26	Mar 03/11/26	
3	**Gros œuvre**	**37 jours**	**Mer 04/11/26**	**Ven 08/01/27**	
4	Fondations	10 jours	Mer 04/11/26	Mer 18/11/26	2
5	Fosses	10 jours	Jeu 19/11/26	Mer 02/12/26	4
6	Réseaux sous dallage	2 jours	Jeu 03/12/26	Ven 04/12/26	5
7	Dallage	5 jours	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27	10
8	**Charpente préfabriquées**	**10 jours**	**Lun 07/12/26**	**Ven 18/12/26**	
9	Poteaux / Poutres	5 jours	Lun 07/12/26	Ven 11/12/26	6
10	Panneaux béton	5 jours	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26	9
11	Couverture / Etanchéité	10 jours	Lun 11/01/27	Ven 22/01/27	7
12	Serrurerie	5 jours	Lun 08/02/27	Ven 12/02/27	13FF
13	VRD	15 jours	Lun 25/01/27	Ven 12/02/27	11
14	Electricité	52 jours?	Jeu 19/11/26	Ven 12/02/27	4;13FF
15	Plomberie	52 jours?	Jeu 19/11/26	Ven 12/02/27	
16	**Livraison**	**11 jours**	**Lun 15/02/27**	**Lun 01/03/27**	
17	OPR	5 jours	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27	13
18	Levée de réserve OPR	5 jours	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27	17
19	Réception	1 jour	Lun 01/03/27	Lun 01/03/27	18
20	Livraison client	0 jour	Lun 01/03/27	Lun 01/03/27	19
