Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011)

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

A INFORMATIONS GENERALES

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : **Bâtiment 3C 3D**
Cat. du bâtiment : **Autres**
Nombre de Locaux :
Etage :
Numéro de Lot :
Référence Cadastrale : **NC**
Date du Permis de Construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**

Adresse : **22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ**
Escalier :
Bâtiment :
Porte :

Propriété de: **EPSM Morbihan**
22 rue de l'hôpital
56890 SAINT-AVÉ

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **EPSM Morbihan**
Adresse : **22 rue de l'hôpital**
56890 SAINT-AVÉ
Qualité :

Documents remis : **Néant**

Moyens mis à disposition : **Néant**

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : 108187 EPSM Morbihan 22.06.26 A
Le repérage a été réalisé le : **15/04/2025**
Par : **DENIAUD Michel**
N° certificat de qualification : **CPDI3609**
Date d'obtention : **09/06/2021**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
ICERT
Batiment G
Parc Edonia - rue de la terre victoria
35760 SAINT-GRÉGOIRE

Date de commande : 05/03/2025

Date d'émission du rapport : **30/06/2026**
Accompagnateur : **Aucun**
Laboratoire d'Analyses : **ITGA**
Adresse laboratoire : **Parc Edonia – Rue de la Terre Adelie – Bât R CS 66862 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX**
Numéro d'accréditation : **1-0913**
Organisme d'assurance professionnelle : **ALLIANZ IARD**
Adresse assurance : **CS 30051 1 cours Michelet 92076 NANTERRE CEDEX**
N° de contrat d'assurance : **43370182**
Date de validité : **31/12/2026**

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise



Date d'établissement du rapport :
Fait à **SAINT-HERBLAIN** le **30/06/2026**
Cabinet : **ELIBAT**
Nom du responsable : **Christian JEGAT**
Nom du diagnostiqueur : **DENIAUD Michel**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES 1

DESIGNATION DU BATIMENT 1

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 1

EXECUTION DE LA MISSION 1

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 1

SOMMAIRE 2

CONCLUSION(S) 3

LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION 18

LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION 18

PROGRAMME DE REPERAGE 19

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 20

RAPPORTS PRECEDENTS 20

..... 20

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 20

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION 21

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 22

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 22

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE 23

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS. 27

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) 41

COMMENTAIRES 41

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 42

ANNEXE 2 – CROQUIS 188

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES 202

ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS 321

ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 322

ATTESTATION(S) 324

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :





N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Photo
1	Façade		Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Coffrage conduit de ventilation n°1	Sol	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Coffrage conduit de ventilation n°2	Sol	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Coffrage conduit de ventilation n°3	Sol	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Coffrage conduit de ventilation n°4	Sol	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Coffrage conduit de ventilation n°5	Sol	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°2	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro





Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Photo
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
2	Activité	S/Sol	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P103-ZPSO)	
3	Circulation sous-sol	S/Sol	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P103-ZPSO)	
4	Sanitaire sous-sol	S/Sol	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P103-ZPSO)	
5	Salle réunion	S/Sol	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P103-ZPSO)	
7	Salle musculation	S/Sol	Conduit de fluide n°2	Façade/WC	Fibrociment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P103)	
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P104)	
8	WC salle muscu	S/Sol	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P103-ZPSO)	
9	Hall 3D	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)	Résultat d'analyse (P003)	
10	Salon visiteur	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P005)	
11	Couloir 3D	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P205)	
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P227)	
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P229)	
12	Rgt	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)	
13	Linge salle	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)	
14	Local élec (3D)	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)	Résultat d'analyse (P187)	
17	Sanitaires n°1	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)	
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P017)	
18	Salle à Manger	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux collés	Résultat d'analyse (P130)	
20	Activités	RDC	Murs et cloisons	B	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P206)	








Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Photo
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P021)	
21	Activités (ex rgt personnel)	RDC	Murs et cloisons	D	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P128)	
22	Office propre	RDC	Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)	
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P022)	
23	Lingerie	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P024)	
28	Local ASH	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P029)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)	
29	Bureau cadre	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)	
32	Chambre n°5	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 15*15	Résultat d'analyse (P031)	
33	Sanitaires PMR 1	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)	
34	Sanitaires/WC 1	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P033)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)	
43	Sanitaire/WC 2	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P039)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)	
45	Chambre n°6	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 15*15	Résultat d'analyse (P031-ZPSO)	
54	Couloir n°4	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P216)	
			Mur de Refend	Toutes zones	Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P249)	
56	Rgt linge	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P054)	
57	Bureau	RDC	Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P230)	
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P218-ZPSO)	
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P144)	
58	Salon visiteur 2	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P218)	
59	Soins	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P233)	

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B





N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Photo
60	Rgt	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P235)	
63	Sanitaire 3C	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 15*15	Résultat d'analyse (P060)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)	
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P145)	
64	Salon / TV	RDC	Fenêtre	Toutes zones	Joint de finition platre tapisserie	Résultat d'analyse (P254)	
68	Escalier 3D	RDC/1 étage	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P069)	
69	Circulation 3D	1er	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P156)	
70	Chambre n°11	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	Résultat d'analyse (P074)	
71	Chambre n°12	1er	Fenêtre	Toutes zones	Platre+Bande papier	Résultat d'analyse (P261)	
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)	
72	Chambre n°13	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)	
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P238-ZPSO)	
73	Chambre n°14	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)	
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P238)	
74	Chambre n°15	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 15*15	Résultat d'analyse (P076)	
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P209)	
75	Chambre n°16	1er	Doublage/cloisons n°2	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P238-ZPSO)	
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 15*15	Résultat d'analyse (P076-ZPSO)	
76	Sanitaires F 3D	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience	Résultat d'analyse (P077)	
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P159)	
77	Chambre n°17	1er	Doublage/cloisons n°1	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P238-ZPSO)	
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	Résultat d'analyse (P075)	
78	Chambre n°18	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)	
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P238-ZPSO)	
79	Chambre n°19	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)	
80	Chambre n°20	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)	

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Photo
82	Sanitaire H 3D	1er	Conduit de ventilation n°3	Du sol au plafond	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Faïence n°1	Douche	Colle de Faience 10*10	Résultat d'analyse (P199)	
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P163)	
			Conduit de ventilation n°2	Sol	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes (rouge)	Résultat d'analyse (P080)	
			Conduit de ventilation n°1	Sol	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
83	Escalier 3C	RDC/1 étage	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P086)	
91	Chambre n°27	1er	Fenêtre	Toutes zones	Joint de finition platre	Résultat d'analyse (P251)	
92	Chambre n°26	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 15*15	Résultat d'analyse (P094-ZPSO)	
93	Chambre n°25	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 15*15	Résultat d'analyse (P094)	
95	Chambre n°24	1er	Fenêtre	Toutes zones	Joint fibreux intérieur	Résultat d'analyse (P224)	
99	Combles 3C	2ème	Conduit de ventilation	Du sol au plafond	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
102	Vide sanitaire	S/Sol	Conduit de ventilation	Murs/Façade	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	
			Coffrages perdus	Murs	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)	

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
1	Façade		Mur de façade	3D	Enduit ciment peinture
			Mur de façade	Centre	Enduit ciment peinture
			Mur de façade	3C	Enduit ciment peinture
			Façade	Toutes zones	Joint de dilatation
2	Activité	S/Sol	Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Poteau	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture
			Poutres	Plafond	Enduit Plâtre peinture
			Sol	Marches	Colle de carrelage
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration
3	Circulation sous-sol	S/Sol	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
4	Sanitaire sous-sol	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
5	Salle réunion	S/Sol	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture
			Poutres	Plafond	Enduit Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Sol	Marches	Colle de carrelage
6	Sous station	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
7	Salle musculation	S/Sol	Sol	Marches	Colle de carrelage
			Poteau	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Poutres	Plafond	Enduit Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture
8	WC salle muscu.	S/Sol	Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
9	Hall 3D	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	Extérieur	Colle de Plinthes

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
10	**Salon visiteur**	RDC	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Fenêtre	Toutes zones	Mastic de vitre
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
11	**Couloir 3D**	RDC	**Cloisons/doublage**	Toutes zones	Peinture tapisserie
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Mur de Refend	Toutes zones	Peinture tapisserie
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre
12	**Rgt**	RDC	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
13	**Linge salle**	RDC	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
14	**Local élec (3D)**	RDC	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
15	**Office**	RDC	**Fenêtre**	Toutes zones	Mastic de vitre
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
16	**Salle pause**	RDC	**Mur de Refend**	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Panneaux collés
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
17	**Sanitaires n°1**	RDC	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
18	**Salle à Manger**	RDC	**Fenêtre n°2**	Toutes zones	Platre
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle
			Fenêtre n°1	Toutes zones	Mastic de vitre
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Poutre/Poteau	Toutes zones	Enduit plâtre peinture
19	**Bureau**	RDC	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	D	Enduit bande calicot
20	**Activités**	RDC	**Murs et cloisons**	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
21	**Activités (ex rgt personnel)**	RDC	**Cloisons/doublage**	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
22	**Office propre**	RDC	**Murs et cloisons**	B	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
23	**Lingerie**	RDC	**Fenêtre n°2**	Toutes zones	Platre
			Fenêtre n°1	Toutes zones	Mastic de vitre
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Sol	Sol	Colle de carrelage
24	**Bureau ASH**	RDC	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10
25	**Couloir n°2**	RDC	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
26	**Chambre n°1**	RDC	**Faïence**	Toutes zones	Colle de faïence 10*10
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
27	**Chambre n°2**	RDC	**Cloisons/doublage**	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
28	**Local ASH**	RDC	**Cloisons/doublage**	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
29	**Bureau cadre**	RDC	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
30	**Chambre n°3**	RDC	**Sol**	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
31	**Chambre n°4**	RDC	**Faïence**	Toutes zones	Colle de faïence 10*10
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
32	**Chambre n°5**	RDC	**Sol**	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
33	**Sanitaires PMR 1**	RDC	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
34	**Sanitaires/WC 1**	RDC	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Fenêtre	Toutes zones	Platre+Joint d'étanchéité blanc + tapisserie
35	**Pharmacie**	RDC	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
36	**Bureau infirmier 1**	RDC	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
37	**Bureau infirmier**	RDC	**Plafond**	Plafond	Panneaux collés
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Panneaux collés
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle
38	**SAS**	RDC	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
39	**Hall 3C**	RDC	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plinthes	Extérieur	Colle de Plinthes
			Sol	Sol	Colle de carrelage

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
40	**Bureau polyvalent**	RDC	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
41	**Couloir n°3**	RDC	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
42	**Chambre n°10**	RDC	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
43	**Sanitaire/WC 2**	RDC	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
44	**Sanitaires PMR 2**	RDC	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
45	**Chambre n°6**	RDC	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
46	**Chambre n°7**	RDC	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Fenêtre	Toutes zones	Platre+Joint d'étanchéité blanc
47	**Chambre n°8**	RDC	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
48	**Médecin généraliste**	RDC	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
49	**Linge/Laverie**	RDC	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
50	**Chambre n°9**	RDC	**Faïence**	Toutes zones	Colle de faïence 10*10
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
51	**Bureau psychologue**	RDC	**Faïence**	Toutes zones	Colle de faïence 10*10

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
52	**WC personnel**	RDC	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
53	**Salon visiteur 1**	RDC	**Fenêtre**	Toutes zones	Mastic de vitre
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
54	**Couloir n°4**	RDC	**Mur de Refend**	Toutes zones	Peinture tapisserie
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
55	**PMR Visiteurs**	RDC	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
56	**Rgt linge**	RDC	**Fenêtre n°1**	Toutes zones	Mastic de vitre
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Fenêtre n°2	Toutes zones	Joint de finition platre
57	**Bureau**	RDC	**Mur de Refend**	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
58	**Salon visiteur 2**	RDC	**Sol**	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
59	**Soins**	RDC	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
60	**Rgt**	RDC	**Faïence**	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
61	**Espace détente**	RDC	**Murs et cloisons**	D	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Panneaux collés

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)
			Poutre/Poteau	Toutes zones	Enduit plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Fenêtre	Toutes zones	Joint de finition platre
62	**Salle polyvalente**	RDC	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Plafond	Plafond	Panneaux collés
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle
			Murs et cloisons	D	Enduit bande calicot
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)
63	**Sanitaire 3C**	RDC	**Faïence**	D	Colle de faïence 20*20
			Murs et cloisons	D	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	D	Colle de Plinthes
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
64	**Salon / TV**	RDC	**Plafond**	Plafond	Panneaux collés
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
65	**Activité Cuisine**	RDC	**Mur de Refend**	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 15*15
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Sol	Sol	Colle de carrelage
			Fenêtre	Toutes zones	Mastic de vitre
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
66	**Local élec 3C**	RDC	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
67	**Salon visiteurs 3**	RDC	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
68	**Escalier 3D**	RDC/1 étage	**Marches**	Sol	Colle de carrelage
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
69	**Circulation 3D**	1er	**Doublage/cloisons n°2**	Toutes zones	Plâtre peinture

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Sol	Marches	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons n°1	Toutes zones	Plâtre peinture
70	**Chambre n°11**	1er	**Murs et cloisons**	C et D	Enduit bande calicot
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
71	**Chambre n°12**	1er	**Sol**	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Murs et cloisons	B	Enduit bande calicot
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
72	**Chambre n°13**	1er	**Murs et cloisons**	C et D	Enduit bande calicot
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
73	**Chambre n°14**	1er	**Murs et cloisons**	B et C	Enduit bande calicot
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
74	**Chambre n°15**	1er	**Sol**	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	C	Enduit bande calicot
75	**Chambre n°16**	1er	**Sol**	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons n°1	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	C	Enduit bande calicot
76	**Sanitaires F 3D**	1er	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Murs et cloisons	CD	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
77	**Chambre n°17**	1er	**Doublage/cloisons**	Toutes zones	Bande bitumineuse
			Fenêtre	Toutes zones	Platre
			Murs et cloisons	CD	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
78	**Chambre n°18**	1er	**Sol**	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Murs et cloisons	B	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
79	**Chambre n°19**	1er	**Doublage/cloisons**	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	B	Enduit bande calicot
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
80	**Chambre n°20**	1er	**Sol**	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Murs et cloisons	C	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
81	**Rangement**	1er	**Doublage/cloisons**	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
82	**Sanitaire H 3D**	1er	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Sol	Sol (douche)	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence 10*10 n°1	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Faïence n°1	WC	Colle de Faience 15*15
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes (marron)
			Faïence 10*10 n°2	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
			Sol	Sol	Colle de carrelage (rouge)
83	**Escalier 3C**	RDC/1 étage	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Marches	Sol	Colle de carrelage
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
84	**Circulation 3C**	1er	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Marches	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
85	**WC**	1er	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
86	**Sanitaires H 3C**	1er	**Sol**	Sol	Colle de carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
			Sol	Sol (douche)	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
87	**Chambre n°31**	1er	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
88	**Chambre n°30**	1er	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
89	**Chambre n°29**	1er	**Doublage/cloisons**	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
90	**Chambre n°28**	1er	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
91	**Chambre n°27**	1er	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
92	**Chambre n°26**	1er	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
93	**Chambre n°25**	1er	**Plafond**	Plafond	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
94	**Sanitaire F 3C**	1er	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
95	**Chambre n°24**	1er	**Doublage/cloisons**	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
96	**Chambre n°23**	1er	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture
97	**Chambre n°22**	1er	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
			Doublage/cloisons n°1	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
98	**Chambre n°21**	1er	**Sol**	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
101	**Toiture**	2ème	**Toiture (centrale) n°1**	Toiture	Revêtement bitumineux
			Toiture (centrale) n°2	Toiture	Remontée bitumineuse

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :
Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Eléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 15/04/2025

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.
Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.
NOTA 3 – Compte tenu de l'impossibilité technique de contrôle des fondations et des réseaux en sous-sol du bâtiment lors du repérage initial, ceux-ci sont exclus du présent contrôle.
Nous nous tenons à la disposition si nécessaire du maitre d'ouvrage pour effectuer un repérage complémentaire lorsque ces zones seront accessibles.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :

Périmètre de la démolition : **Démolition totale du batiment.**

G RAPPORTS PRECEDENTS

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
27/04/2022	35401	EXIM ELIBAT	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
17/03/2021	30982	ELIBAT	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
01/03/2006	05329348	APAVE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Façade		OUI	
2	Activité	S/Sol	OUI	
3	Circulation sous-sol	S/Sol	OUI	
4	Sanitaire sous-sol	S/Sol	OUI	
5	Salle réunion	S/Sol	OUI	
6	Sous station	S/Sol	OUI	
7	Salle musculation	S/Sol	OUI	
8	WC salle muscu.	S/Sol	OUI	
9	Hall 3D	RDC	OUI	
10	Salon visiteur	RDC	OUI	
11	Couloir 3D	RDC	OUI	
12	Rgt	RDC	OUI	
13	Linge salle	RDC	OUI	
14	Local élec (3D)	RDC	OUI	
15	Office	RDC	OUI	
16	Salle pause	RDC	OUI	
17	Sanitaires n°1	RDC	OUI	
18	Salle à Manger	RDC	OUI	
19	Bureau	RDC	OUI	
20	Activités	RDC	OUI	
21	Activités (ex rgt personnel)	RDC	OUI	
22	Office propre	RDC	OUI	
23	Lingerie	RDC	OUI	
24	Bureau ASH	RDC	OUI	
25	Couloir n°2	RDC	OUI	
26	Chambre n°1	RDC	OUI	
27	Chambre n°2	RDC	OUI	
28	Local ASH	RDC	OUI	
29	Bureau cadre	RDC	OUI	
30	Chambre n°3	RDC	OUI	
31	Chambre n°4	RDC	OUI	
32	Chambre n°5	RDC	OUI	
33	Sanitaires PMR 1	RDC	OUI	
34	Sanitaires/WC 1	RDC	OUI	
35	Pharmacie	RDC	OUI	
36	Bureau infirmier 1	RDC	OUI	
37	Bureau infirmier	RDC	OUI	
38	SAS	RDC	OUI	
39	Hall 3C	RDC	OUI	
40	Bureau polyvalent	RDC	OUI	
41	Couloir n°3	RDC	OUI	
42	Chambre n°10	RDC	OUI	
43	Sanitaire/WC 2	RDC	OUI	
44	Sanitaires PMR 2	RDC	OUI	
45	Chambre n°6	RDC	OUI	
46	Chambre n°7	RDC	OUI	
47	Chambre n°8	RDC	OUI	
48	Médecin généraliste	RDC	OUI	
49	Linge/Laverie	RDC	OUI	
50	Chambre n°9	RDC	OUI	
51	Bureau psychologue	RDC	OUI	
52	WC personnel	RDC	OUI	
53	Salon visiteur 1	RDC	OUI	
54	Couloir n°4	RDC	OUI	
55	PMR Visiteurs	RDC	OUI	
56	Rgt linge	RDC	OUI	
57	Bureau	RDC	OUI	
58	Salon visiteur 2	RDC	OUI	

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
59	Soins	RDC	OUI	
60	Rgt	RDC	OUI	
61	Espace détente	RDC	OUI	
62	Salle polyvalente	RDC	OUI	
63	Sanitaire 3C	RDC	OUI	
64	Salon / TV	RDC	OUI	
65	Activité Cuisine	RDC	OUI	
66	Local élec 3C	RDC	OUI	
67	Salon visiteurs 3	RDC	OUI	
68	Escalier 3D	RDC/1 étage	OUI	
69	Circulation 3D	1er	OUI	
70	Chambre n°11	1er	OUI	
71	Chambre n°12	1er	OUI	
72	Chambre n°13	1er	OUI	
73	Chambre n°14	1er	OUI	
74	Chambre n°15	1er	OUI	
75	Chambre n°16	1er	OUI	
76	Sanitaires F 3D	1er	OUI	
77	Chambre n°17	1er	OUI	
78	Chambre n°18	1er	OUI	
79	Chambre n°19	1er	OUI	
80	Chambre n°20	1er	OUI	
81	Rangement	1er	OUI	
82	Sanitaire H 3D	1er	OUI	
83	Escalier 3C	RDC/1 étage	OUI	
84	Circulation 3C	1er	OUI	
85	WC	1er	OUI	
86	Sanitaires H 3C	1er	OUI	
87	Chambre n°31	1er	OUI	
88	Chambre n°30	1er	OUI	
89	Chambre n°29	1er	OUI	
90	Chambre n°28	1er	OUI	
91	Chambre n°27	1er	OUI	
92	Chambre n°26	1er	OUI	
93	Chambre n°25	1er	OUI	
94	Sanitaire F 3C	1er	OUI	
95	Chambre n°24	1er	OUI	
96	Chambre n°23	1er	OUI	
97	Chambre n°22	1er	OUI	
98	Chambre n°21	1er	OUI	
99	Combles 3C	2ème	OUI	
100	Combles 3D	2ème	OUI	
101	Toiture	2ème	OUI	
102	Vide sanitaire	S/Sol	OUI	

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence
1	**Façade**		Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Coffrage conduit de ventilation n°1	Sol	Amiante ciment	P175-ZPSO	**A**
			Coffrage conduit de ventilation n°2	Sol	Amiante ciment	P175-ZPSO	**A**
			Coffrage conduit de ventilation n°3	Sol	Amiante ciment	P175-ZPSO	**A**
			Coffrage conduit de ventilation n°4	Sol	Amiante ciment	P175-ZPSO	**A**
			Coffrage conduit de ventilation n°5	Sol	Amiante ciment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°2	Façade	Fibrociment	P175	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Conduit de fluide n°1	Façade	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
2	**Activité**	S/Sol	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P103-ZPSO	**A**
3	**Circulation sous-sol**	S/Sol	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P103-ZPSO	**A**
4	**Sanitaire sous-sol**	S/Sol	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P103-ZPSO	**A**
5	**Salle réunion**	S/Sol	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P103-ZPSO	**A**
7	**Salle musculation**	S/Sol	Conduit de fluide n°2	Façade/WC	Fibrociment	P175-ZPSO	**A**
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P103	**A**
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P104	**A**
8	**WC salle muscu.**	S/Sol	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P103-ZPSO	**A**
9	**Hall 3D**	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)	P003	**A**
10	**Salon visiteur**	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P005	**A**
11	**Couloir 3D**	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P205	**A**

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P227	A
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P229	A
12	Rgt	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P005-ZPSO	A
13	Linge salle	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P005-ZPSO	A
14	Local élec (3D)	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)	P187	A
17	Sanitaires n°1	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P005-ZPSO	A
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P017	A
18	Salle à Manger	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux collés	P130	A
20	Activités	RDC	Murs et cloisons	B	Enduit bande calicot	P206	A
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P021	A
21	Activités (ex rgt personnel)	RDC	Murs et cloisons	D	Enduit bande calicot	P128	A
22	Office propre	RDC	Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P128-ZPSO	A
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P022	A
23	Lingerie	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P024	A
28	Local ASH	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P029	A
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P005-ZPSO	A
29	Bureau cadre	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P005-ZPSO	A
32	Chambre n°5	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 15*15	P031	A
33	Sanitaires PMR 1	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P005-ZPSO	A
34	Sanitaires/WC 1	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P033	A
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P005-ZPSO	A
43	Sanitaire/WC 2	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P039	A
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P005-ZPSO	A
45	Chambre n°6	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 15*15	P031-ZPSO	A
54	Couloir n°4	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P216	A
			Mur de Refend	Toutes zones	Peinture tapisserie	P249	A
56	Rgt linge	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P054	A
57	Bureau	RDC	Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P230	A
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P218-ZPSO	A
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P144	A
58	Salon visiteur 2	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P218	A
59	Soins	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P233	A
60	Rgt	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P235	A
63	Sanitaire 3C	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 15*15	P060	A

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P005-ZPSO	A
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P145	A
64	**Salon / TV**	RDC	Fenêtre	Toutes zones	Joint de finition platre tapisserie	P254	A
68	**Escalier 3D**	RDC/1 étage	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P069	A
69	**Circulation 3D**	1er	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P156	A
70	**Chambre n°11**	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P074	A
71	**Chambre n°12**	1er	Fenêtre	Toutes zones	Platre+Bande papier	P261	A
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P074-ZPSO	A
72	**Chambre n°13**	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P074-ZPSO	A
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P238-ZPSO	A
73	**Chambre n°14**	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P074-ZPSO	A
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P238	A
74	**Chambre n°15**	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 15*15	P076	A
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P209	A
75	**Chambre n°16**	1er	Doublage/cloisons n°2	Toutes zones	Plâtre peinture	P238-ZPSO	A
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 15*15	P076-ZPSO	A
76	**Sanitaires F 3D**	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience	P077	A
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P159	A
77	**Chambre n°17**	1er	Doublage/cloisons n°1	Toutes zones	Plâtre peinture	P238-ZPSO	A
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P075	A
78	**Chambre n°18**	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P074-ZPSO	A
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P238-ZPSO	A
79	**Chambre n°19**	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P074-ZPSO	A
80	**Chambre n°20**	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P074-ZPSO	A
82	**Sanitaire H 3D**	1er	Conduit de ventilation n°3	Du sol au plafond	Amiante ciment	P175-ZPSO	A
			Faïence n°1	Douche	Colle de Faience 10*10	P199	A
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P163	A
			Conduit de ventilation n°2	Sol	Amiante ciment	P175-ZPSO	A
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes (rouge)	P080	A
			Conduit de ventilation n°1	Sol	Amiante ciment	P175-ZPSO	A
83	**Escalier 3C**	RDC/1 étage	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P086	A
91	**Chambre n°27**	1er	Fenêtre	Toutes zones	Joint de finition platre	P251	A
92	**Chambre n°26**	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 15*15	P094-ZPSO	A
93	**Chambre n°25**	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 15*15	P094	A

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence
95	**Chambre n°24**	1er	Fenêtre	Toutes zones	Joint fibreux intérieur	P224	**A**
99	**Combles 3C**	2ème	Conduit de ventilation	Du sol au plafond	Amiante ciment	P175-ZPSO	**A**
102	**Vide sanitaire**	S/Sol	Conduit de ventilation	Murs/Façade	Amiante ciment	P175-ZPSO	**A**
			Coffrages perdus	Murs	Amiante ciment	P175-ZPSO	**A**

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
1	**Façade**		Mur de façade	3D	Enduit ciment peinture	P201	Résultat d'analyse (P201)
			Mur de façade	Centre	Enduit ciment peinture	P202	Résultat d'analyse (P202)
			Mur de façade	3C	Enduit ciment peinture	P203	Résultat d'analyse (P203)
			Façade	Toutes zones	Joint de dilatation	P178	Résultat d'analyse (P178)
2	**Activité**	S/Sol	Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P111	Résultat d'analyse (P111)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P106	Résultat d'analyse (P106)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P105	Résultat d'analyse (P105)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P113	Résultat d'analyse (P113)
			Poteau	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture	P115	Résultat d'analyse (P115)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P101-ZPSO	Résultat d'analyse (P101-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P119-ZPSO	Résultat d'analyse (P119-ZPSO)
			Poutres	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P118-ZPSO	Résultat d'analyse (P118-ZPSO)
			Sol	Marches	Colle de carrelage	P102-ZPSO	Résultat d'analyse (P102-ZPSO)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P109	Résultat d'analyse (P109)
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration	P107	Résultat d'analyse (P107)
3	**Circulation sous-sol**	S/Sol	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P105-ZPSO	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P101-ZPSO	Résultat d'analyse (P101-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P113-ZPSO	Résultat d'analyse (P113-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P119-ZPSO	Résultat d'analyse (P119-ZPSO)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P109-ZPSO	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P111-ZPSO	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
4	**Sanitaire sous-sol**	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P119-ZPSO	Résultat d'analyse (P119-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P106-ZPSO	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P108	Résultat d'analyse (P108)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P112	Résultat d'analyse (P112)
			Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond		Marquage du matériau
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P101-ZPSO	Résultat d'analyse (P101-ZPSO)
5	**Salle réunion**	S/Sol	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P105-ZPSO	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P110	Résultat d'analyse (P110)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P114	Résultat d'analyse (P114)
			Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P121	Résultat d'analyse (P121)
			Poutres	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P120	Résultat d'analyse (P120)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P101-ZPSO	Résultat d'analyse (P101-ZPSO)
			Sol	Marches	Colle de carrelage	P102-ZPSO	Résultat d'analyse (P102-ZPSO)

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
6	**Sous station**	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P119-ZPSO	Résultat d'analyse (P119-ZPSO)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P111-ZPSO	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P109-ZPSO	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
			Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifugeage		Document consulté
7	**Salle musculation**	S/Sol	Sol	Marches	Colle de carrelage	P102	Résultat d'analyse (P102)
			Poteau	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture	P116	Résultat d'analyse (P116)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P117	Résultat d'analyse (P117)
			Poutres	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P118	Résultat d'analyse (P118)
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Calorifugeage		Document consulté
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P101	Résultat d'analyse (P101)
			Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P119	Résultat d'analyse (P119)
8	**WC salle muscu.**	S/Sol	Sol	Sol	Colle de carrelage	P101-ZPSO	Résultat d'analyse (P101-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P119-ZPSO	Résultat d'analyse (P119-ZPSO)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P109-ZPSO	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P111-ZPSO	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
9	**Hall 3D**	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P133	Résultat d'analyse (P133)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plinthes	Extérieur	Colle de Plinthes	P002	Résultat d'analyse (P002)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139	Résultat d'analyse (P139)
10	**Salon visiteur**	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
			Fenêtre	Toutes zones	Mastic de vitre	P204-ZPSO	Résultat d'analyse (P204-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P004	Résultat d'analyse (P004)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P006	Résultat d'analyse (P006)
11	**Couloir 3D**	RDC	Cloisons/doublage	Toutes zones	Peinture tapisserie	P243	Résultat d'analyse (P243)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre	P244	Résultat d'analyse (P244)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P129-ZPSO	Résultat d'analyse (P129-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P007	Résultat d'analyse (P007)
			Mur de Refend	Toutes zones	Peinture tapisserie	P245	Résultat d'analyse (P245)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre	P246	Résultat d'analyse (P246)
12	**Rgt**	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
13	**Linge salle**	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P008	Résultat d'analyse (P008)

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
14	**Local élec (3D)**	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
15	**Office**	RDC	Fenêtre	Toutes zones	Mastic de vitre	P204-ZPSO	Résultat d'analyse (P204-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P129-ZPSO	Résultat d'analyse (P129-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P009	Résultat d'analyse (P009)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P011	Résultat d'analyse (P011)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P010	Résultat d'analyse (P010)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123	Résultat d'analyse (P123)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P122	Résultat d'analyse (P122)
16	**Salle pause**	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P122-ZPSO	Résultat d'analyse (P122-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Panneaux collés	P132	Résultat d'analyse (P132)
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration	P152	Résultat d'analyse (P152)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P129-ZPSO	Résultat d'analyse (P129-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P012	Résultat d'analyse (P012)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)	P013	Résultat d'analyse (P013)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P014	Résultat d'analyse (P014)
17	**Sanitaires n°1**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle	P015	Résultat d'analyse (P015)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P122-ZPSO	Résultat d'analyse (P122-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P129	Résultat d'analyse (P129)
18	**Salle à Manger**	RDC	Fenêtre n°2	Toutes zones	Platre	P258	Résultat d'analyse (P258)
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle	P184	Résultat d'analyse (P184)
			Fenêtre n°1	Toutes zones	Mastic de vitre	P200	Résultat d'analyse (P200)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P018	Résultat d'analyse (P018)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P019	Résultat d'analyse (P019)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P125	Résultat d'analyse (P125)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P124	Résultat d'analyse (P124)
			Poutre/Poteau	Toutes zones	Enduit plâtre peinture	P126	Résultat d'analyse (P126)
19	**Bureau**	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P129-ZPSO	Résultat d'analyse (P129-ZPSO)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P192	Résultat d'analyse (P192)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P122-ZPSO	Résultat d'analyse (P122-ZPSO)
			Murs et cloisons	D	Enduit bande calicot	P127	Résultat d'analyse (P127)
20	**Activités**	RDC	Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P207	Résultat d'analyse (P207)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P129-ZPSO	Résultat d'analyse (P129-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P228	Résultat d'analyse (P228)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020	Résultat d'analyse (P020)
21	**Activités (ex rgt personnel)**	RDC	Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P122-ZPSO	Résultat d'analyse (P122-ZPSO)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P225	Résultat d'analyse (P225)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P131	Résultat d'analyse (P131)
22	**Office propre**	RDC	Murs et cloisons	B	Enduit bande calicot	P135-ZPSO	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P129-ZPSO	Résultat d'analyse (P129-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P122-ZPSO	Résultat d'analyse (P122-ZPSO)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P023	Résultat d'analyse (P023)
23	**Lingerie**	RDC	Fenêtre n°2	Toutes zones	Platre	P257	Résultat d'analyse (P257)
			Fenêtre n°1	Toutes zones	Mastic de vitre	P204-ZPSO	Résultat d'analyse (P204-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P135-ZPSO	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
24	**Bureau ASH**	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P135-ZPSO	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10	P242	Résultat d'analyse (P242)
25	**Couloir n°2**	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P122-ZPSO	Résultat d'analyse (P122-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P025	Résultat d'analyse (P025)
26	**Chambre n°1**	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10	P027	Résultat d'analyse (P027)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P135	Résultat d'analyse (P135)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P026	Résultat d'analyse (P026)
27	**Chambre n°2**	RDC	Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10	P027-ZPSO	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
28	**Local ASH**	RDC	Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P134	Résultat d'analyse (P134)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P028	Résultat d'analyse (P028)
29	**Bureau cadre**	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P030	Résultat d'analyse (P030)
30	**Chambre n°3**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple non collé		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
31	**Chambre n°4**	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10	P193	Résultat d'analyse (P193)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P135-ZPSO	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
32	**Chambre n°5**	RDC	Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P135-ZPSO	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
33	**Sanitaires PMR 1**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P028-ZPSO	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P140	Résultat d'analyse (P140)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P186	Résultat d'analyse (P186)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
34	**Sanitaires/WC 1**	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	P032	Résultat d'analyse (P032)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Fenêtre	Toutes zones	Platre+Joint d'étanchéité blanc + tapisserie	P256	Résultat d'analyse (P256)
35	**Pharmacie**	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	P035	Résultat d'analyse (P035)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P136	Résultat d'analyse (P136)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P034	Résultat d'analyse (P034)
36	**Bureau infirmier 1**	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P122-ZPSO	Résultat d'analyse (P122-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P034-ZPSO	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P136-ZPSO	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
37	**Bureau infirmier**	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux collés	P226	Résultat d'analyse (P226)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P036	Résultat d'analyse (P036)
			Plafond	Plafond	Panneaux collés	P185	Résultat d'analyse (P185)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P136-ZPSO	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle	P183	Résultat d'analyse (P183)
38	**SAS**	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P036-ZPSO	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P136-ZPSO	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
39	**Hall 3C**	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Plinthes	Extérieur	Colle de Plinthes	P002-ZPSO	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P037	Résultat d'analyse (P037)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P137	Résultat d'analyse (P137)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P188	Résultat d'analyse (P188)
40	**Bureau polyvalent**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038	Résultat d'analyse (P038)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
41	**Couloir n°3**	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P188-ZPSO	Résultat d'analyse (P188-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P122-ZPSO	Résultat d'analyse (P122-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P037-ZPSO	Résultat d'analyse (P037-ZPSO)
42	**Chambre n°10**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
43	**Sanitaire/WC 2**	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P141	Résultat d'analyse (P141)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P138	Résultat d'analyse (P138)
44	**Sanitaires PMR 2**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P040	Résultat d'analyse (P040)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
45	**Chambre n°6**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P041	Résultat d'analyse (P041)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
46	**Chambre n°7**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P041-ZPSO	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P027-ZPSO	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Fenêtre	Toutes zones	Platre+Joint d'étanchéité blanc	P255	Résultat d'analyse (P255)
47	**Chambre n°8**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P041-ZPSO	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10	P042	Résultat d'analyse (P042)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
48	**Médecin généraliste**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P045	Résultat d'analyse (P045)

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P044	Résultat d'analyse (P044)
49	**Linge/Laverie**	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P189	Résultat d'analyse (P189)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P046	Résultat d'analyse (P046)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
50	**Chambre n°9**	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10	P027-ZPSO	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
51	**Bureau psychologue**	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10	P194	Résultat d'analyse (P194)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P048	Résultat d'analyse (P048)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P142	Résultat d'analyse (P142)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
52	**WC personnel**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P049	Résultat d'analyse (P049)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
53	**Salon visiteur 1**	RDC	Fenêtre	Toutes zones	Mastic de vitre	P204	Résultat d'analyse (P204)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P050	Résultat d'analyse (P050)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P223	Résultat d'analyse (P223)
54	**Couloir n°4**	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Peinture tapisserie	P247	Résultat d'analyse (P247)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre	P250	Résultat d'analyse (P250)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)	P188-ZPSO	Résultat d'analyse (P188-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P059-ZPSO	Résultat d'analyse (P059-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P217	Résultat d'analyse (P217)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre	P248	Résultat d'analyse (P248)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P037-ZPSO	Résultat d'analyse (P037-ZPSO)
55	**PMR Visiteurs**	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P051	Résultat d'analyse (P051)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P052	Résultat d'analyse (P052)
56	**Rgt linge**	RDC	Fenêtre n°1	Toutes zones	Mastic de vitre	P204-ZPSO	Résultat d'analyse (P204-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P053	Résultat d'analyse (P053)
			Fenêtre n°2	Toutes zones	Joint de finition platre	P253	Résultat d'analyse (P253)
57	**Bureau**	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P143	Résultat d'analyse (P143)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P150	Résultat d'analyse (P150)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P231	Résultat d'analyse (P231)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P232	Résultat d'analyse (P232)
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10	P056	Résultat d'analyse (P056)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P055	Résultat d'analyse (P055)
58	**Salon visiteur 2**	RDC	Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P055-ZPSO	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10	P056-ZPSO	Résultat d'analyse (P056-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P150-ZPSO	Résultat d'analyse (P150-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
59	**Soins**	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P057	Résultat d'analyse (P057)
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 10*10	P197	Résultat d'analyse (P197)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P150-ZPSO	Résultat d'analyse (P150-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P220	Résultat d'analyse (P220)
60	**Rgt**	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P056-ZPSO	Résultat d'analyse (P056-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P150-ZPSO	Résultat d'analyse (P150-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P041-ZPSO	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
61	**Espace détente**	RDC	Murs et cloisons	D	Enduit bande calicot	P149	Résultat d'analyse (P149)
			Plafond	Plafond	Panneaux collés	P180	Résultat d'analyse (P180)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P058	Résultat d'analyse (P058)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)	P059	Résultat d'analyse (P059)
			Poutre/Poteau	Toutes zones	Enduit plâtre peinture	P148	Résultat d'analyse (P148)
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle	P181	Résultat d'analyse (P181)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P221	Résultat d'analyse (P221)
			Fenêtre	Toutes zones	Joint de finition platre	P252	Résultat d'analyse (P252)
62	**Salle polyvalente**	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Panneaux collés	P180-ZPSO	Résultat d'analyse (P180-ZPSO)

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle	P181-ZPSO	Résultat d'analyse (P181-ZPSO)
			Murs et cloisons	D	Enduit bande calicot	P135-ZPSO	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)	P059-ZPSO	Résultat d'analyse (P059-ZPSO)
63	**Sanitaire 3C**	RDC	Faïence	D	Colle de faïence 20*20	P061	Résultat d'analyse (P061)
			Murs et cloisons	D	Enduit bande calicot	P147	Résultat d'analyse (P147)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P151	Résultat d'analyse (P151)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	P062	Résultat d'analyse (P062)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
			Plinthes	D	Colle de Plinthes	P063	Résultat d'analyse (P063)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P146	Résultat d'analyse (P146)
64	**Salon / TV**	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux collés	P179	Résultat d'analyse (P179)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)	P191	Résultat d'analyse (P191)
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle	P182	Résultat d'analyse (P182)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P222	Résultat d'analyse (P222)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P234	Résultat d'analyse (P234)
65	**Activité Cuisine**	RDC	Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P219	Résultat d'analyse (P219)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P064	Résultat d'analyse (P064)
			Faïence	Toutes zones	Colle de faïence 15*15	P066	Résultat d'analyse (P066)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Fenêtre	Toutes zones	Mastic de vitre	P204-ZPSO	Résultat d'analyse (P204-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)	P059-ZPSO	Résultat d'analyse (P059-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P150-ZPSO	Résultat d'analyse (P150-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P065	Résultat d'analyse (P065)
66	**Local élec 3C**	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes (noire)	P190	Résultat d'analyse (P190)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
67	**Salon visiteurs 3**	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P195	Résultat d'analyse (P195)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
			Cloisons/doublage	Toutes zones	Plâtre peinture	P123-ZPSO	Résultat d'analyse (P123-ZPSO)
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration	P196	Résultat d'analyse (P196)

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P067	Résultat d'analyse (P067)
68	**Escalier 3D**	RDC/1 étage	Marches	Sol	Colle de carrelage	P068	Résultat d'analyse (P068)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P153	Résultat d'analyse (P153)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P154	Résultat d'analyse (P154)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P155	Résultat d'analyse (P155)
69	**Circulation 3D**	1er	Doublage/cloisons n°2	Toutes zones	Plâtre peinture	P236	Résultat d'analyse (P236)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P070	Résultat d'analyse (P070)
			Sol	Marches	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P071	Résultat d'analyse (P071)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P162	Résultat d'analyse (P162)
			Doublage/cloisons n°1	Toutes zones	Plâtre peinture	P208	Résultat d'analyse (P208)
70	**Chambre n°11**	1er	Murs et cloisons	C et D	Enduit bande calicot	P157-ZPSO	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P240	Résultat d'analyse (P240)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P162-ZPSO	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
71	**Chambre n°12**	1er	Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Murs et cloisons	B	Enduit bande calicot	P157	Résultat d'analyse (P157)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P158	Résultat d'analyse (P158)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P162-ZPSO	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)
72	**Chambre n°13**	1er	Murs et cloisons	C et D	Enduit bande calicot	P157-ZPSO	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P162-ZPSO	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P215	Résultat d'analyse (P215)
73	**Chambre n°14**	1er	Murs et cloisons	B et C	Enduit bande calicot	P157-ZPSO	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P162-ZPSO	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P160-ZPSO	Résultat d'analyse (P160-ZPSO)
74	**Chambre n°15**	1er	Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P072	Résultat d'analyse (P072)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P162-ZPSO	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P160-ZPSO	Résultat d'analyse (P160-ZPSO)
			Murs et cloisons	C	Enduit bande calicot	P157-ZPSO	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)
75	**Chambre n°16**	1er	Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P162-ZPSO	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)
			Doublage/cloisons n°1	Toutes zones	Plâtre peinture	P237	Résultat d'analyse (P237)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P160-ZPSO	Résultat d'analyse (P160-ZPSO)
			Murs et cloisons	C	Enduit bande calicot	P157-ZPSO	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
76	**Sanitaires F 3D**	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P073	Résultat d'analyse (P073)
			Murs et cloisons	CD	Enduit bande calicot	P157-ZPSO	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P212	Résultat d'analyse (P212)
77	**Chambre n°17**	1er	Doublage/cloisons	Toutes zones	Bande bitumineuse	P260	Résultat d'analyse (P260)
			Fenêtre	Toutes zones	Platre	P259	Résultat d'analyse (P259)
			Murs et cloisons	CD	Enduit bande calicot	P157-ZPSO	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P162-ZPSO	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P160	Résultat d'analyse (P160)
78	**Chambre n°18**	1er	Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Murs et cloisons	B	Enduit bande calicot	P161	Résultat d'analyse (P161)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P213	Résultat d'analyse (P213)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P160-ZPSO	Résultat d'analyse (P160-ZPSO)
79	**Chambre n°19**	1er	Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P158-ZPSO	Résultat d'analyse (P158-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P162-ZPSO	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)
			Murs et cloisons	B	Enduit bande calicot	P157-ZPSO	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
80	**Chambre n°20**	1er	Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Murs et cloisons	C	Enduit bande calicot	P157-ZPSO	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P214	Résultat d'analyse (P214)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P210	Résultat d'analyse (P210)
81	**Rangement**	1er	Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P158-ZPSO	Résultat d'analyse (P158-ZPSO)
			Sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P241	Résultat d'analyse (P241)
82	**Sanitaire H 3D**	1er	Sol	Sol	Colle de carrelage	P078	Résultat d'analyse (P078)
			Sol	Sol (douche)	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P082	Résultat d'analyse (P082)
			Faïence 10*10 n°1	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P083	Résultat d'analyse (P083)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P211	Résultat d'analyse (P211)
			Faïence n°1	WC	Colle de Faience 15*15	P084	Résultat d'analyse (P084)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes (marron)	P081	Résultat d'analyse (P081)
			Faïence 10*10 n°2	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P239	Résultat d'analyse (P239)
			Sol	Sol	Colle de carrelage (rouge)	P079	Résultat d'analyse (P079)
83	**Escalier 3C**	RDC/1 étage	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P166	Résultat d'analyse (P166)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P165	Résultat d'analyse (P165)
			Marches	Sol	Colle de carrelage	P085	Résultat d'analyse (P085)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P164	Résultat d'analyse (P164)
84	**Circulation 3C**	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P087	Résultat d'analyse (P087)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P167	Résultat d'analyse (P167)

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
			Sol	Marches	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P088	Résultat d'analyse (P088)
85	**WC**	1er	Sol	Sol	Colle de carrelage	P097-ZPSO	Résultat d'analyse (P097-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P098-ZPSO	Résultat d'analyse (P098-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P090-ZPSO	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
86	**Sanitaires H 3C**	1er	Sol	Sol	Colle de carrelage	P097	Résultat d'analyse (P097)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P098	Résultat d'analyse (P098)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P099	Résultat d'analyse (P099)
			Sol	Sol (douche)	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P100	Résultat d'analyse (P100)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173	Résultat d'analyse (P173)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
87	**Chambre n°31**	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P089-ZPSO	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P090-ZPSO	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168	Résultat d'analyse (P168)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
88	**Chambre n°30**	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P089	Résultat d'analyse (P089)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P090	Résultat d'analyse (P090)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
89	**Chambre n°29**	1er	Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P089-ZPSO	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P090-ZPSO	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
90	**Chambre n°28**	1er	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P167-ZPSO	Résultat d'analyse (P167-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P089-ZPSO	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P198	Résultat d'analyse (P198)
91	**Chambre n°27**	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P089-ZPSO	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P090-ZPSO	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P167-ZPSO	Résultat d'analyse (P167-ZPSO)
92	**Chambre n°26**	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P089-ZPSO	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P167-ZPSO	Résultat d'analyse (P167-ZPSO)
93	**Chambre n°25**	1er	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P167-ZPSO	Résultat d'analyse (P167-ZPSO)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P093	Résultat d'analyse (P093)
94	**Sanitaire F 3C**	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P095	Résultat d'analyse (P095)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience	P096	Résultat d'analyse (P096)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P169	Résultat d'analyse (P169)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P171	Résultat d'analyse (P171)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
95	**Chambre n°24**	1er	Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P089-ZPSO	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P090-ZPSO	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P170	Résultat d'analyse (P170)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
96	**Chambre n°23**	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P091	Résultat d'analyse (P091)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P092	Résultat d'analyse (P092)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P174	Résultat d'analyse (P174)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
			Mur de Refend	Toutes zones	Plâtre peinture	P167-ZPSO	Résultat d'analyse (P167-ZPSO)
97	**Chambre n°22**	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P089-ZPSO	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P090-ZPSO	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
			Doublage/cloisons n°1	Toutes zones	Plâtre peinture	P172	Résultat d'analyse (P172)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
98	**Chambre n°21**	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P089-ZPSO	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faience 10*10	P090-ZPSO	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P173-ZPSO	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
			Doublage/cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P168-ZPSO	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
101	**Toiture**	2ème	Toiture (centrale) n°1	Toiture	Revêtement bitumineux	P176	Résultat d'analyse (P176)

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Toiture (centrale) n°2	Toiture	Remontée bitumineuse	P177	Résultat d'analyse (P177)
			Toiture (ailes 3D/3C)	Toiture	Ardoises naturelles		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
102	**Vide sanitaire**	S/Sol	Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifugeage		Document consulté

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE

Présence	**A** : Amiante	**N** : Non Amianté	**a?** : Probabilité de présence d'Amiante

COMMENTAIRES

L'accès au vide-sanitaire du bâtiment 3C est très étroit. Il est très probable que des coffrages perdus soient présents comme dans le vide-sanitaire au niveau des murs de traverse comme dans le vide-sanitaire du 3D.

Le système d'incendie date de 2011 (marquage matériau)

Présence d'un enduit "type plâtre" entre le plâtre de la cloison et le pourtour des dormants bois des fenêtres sur les fenêtres et portes-fenêtres rénovés.

Le repérage a été établi sans moyen de destruction lourd, nous restons à votre disposition pour des analyses complémentaires si lors de la démolition du bâtiement des matériaux ou des produits susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts et rendu accessibles.

Il n'est pas à exclure l'existence de conduits en fibrociment amianté enterrés non visible le jour de notre visite.

Nous restons à disposition du donneur d'ordre pour effectuer de nouvelles investigations si des conduits sont découverts lors de la démolition.

De nombreux prélèvements et sondages ont été réalisés autour des fenêtres, malgré les investigations, cela n'a pas permis d'écarter avec certitude la présence ou non d'enduit autour des fenêtres ; Par mesure de précaution, il est préférable de conclure à une éventuelle présence d'enduit amianté autour des fenêtres qui ont été rénovées.

Suite aux investigations et au nombre important de prélèvements réalisés sur les murs et les plafonds, ce sont les revêtements de murs "peinture/tapisserie" qui sont amiantés, les plâtres ne le sont pas.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante

Emplacement



ELEMENT : Coffrage conduit de ventilation n°3		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Coffrage conduit de ventilation n°3 - Sol		Présence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Conduit de fluide n°1 - Façade	Présence d'amiante	

Emplacement



ELEMENT : Coffrage conduit de ventilation n°4		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Coffrage conduit de ventilation n°4 - Sol	Présence d'amiante	

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Coffrage conduit de ventilation n°5		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Coffrage conduit de ventilation n°5 - Sol		Présence d'amiante

Emplacement



ELEMENT : Conduit de ventilation		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de ventilation - Murs/Façade		Présence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante

Emplacement



ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante

Emplacement



ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante
Emplacement		



ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante
Emplacement		



ELEMENT : Conduit de fluide		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Sous station
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de ventilation		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	2ème - Combles 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de ventilation - Du sol au plafond		Présence d'amiante

Emplacement



ELEMENT : Coffrage conduit de ventilation n°2		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Coffrage conduit de ventilation n°2 - Sol		Présence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante
Emplacement		



ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante
Emplacement		



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante

Emplacement



ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Façade		Présence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Conduit de fluide n°1 - Façade	Présence d'amiante	
Emplacement		



ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Conduit de fluide n°1 - Façade	Présence d'amiante	
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de ventilation n°3		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de ventilation n°3 - Du sol au plafond		Présence d'amiante

Emplacement



ELEMENT : Conduit de ventilation n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de ventilation n°1 - Sol		Présence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de ventilation n°2		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de ventilation n°2 - Sol		Présence d'amiante

Emplacement



ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle musculation
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°1 - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de fluide n°2		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle musculation
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°2 - Façade/WC		Présence d'amiante

Emplacement



ELEMENT : Coffrages perdus		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Vide sanitaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Coffrages perdus - Murs		Présence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Conduit de fluide n°1 - Façade	Présence d'amiante	

Emplacement



ELEMENT : Coffrage conduit de ventilation n°1		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Coffrage conduit de ventilation n°1 - Sol	Présence d'amiante	

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P001		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P002		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Extérieur		absence d'amiante

Emplacement




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P003		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes (noire)	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement

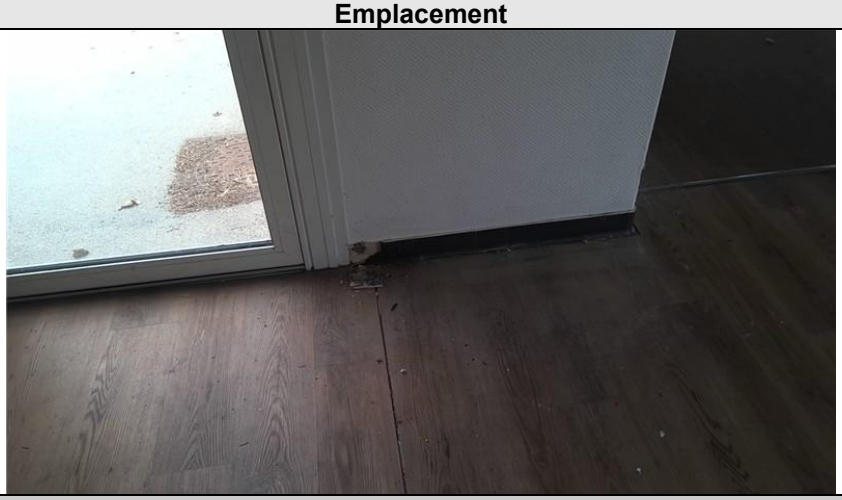

PRELEVEMENT : P004		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon visiteur
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement




Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon visiteur
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		

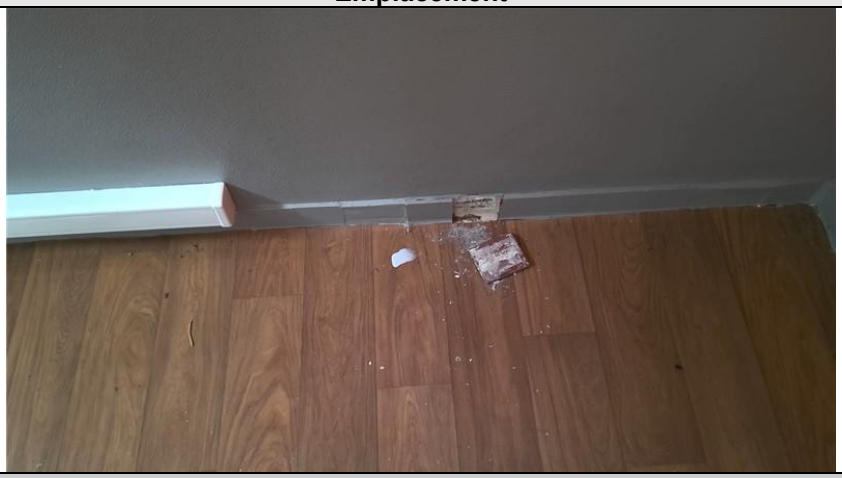

PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon visiteur
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P007		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	
Emplacement		

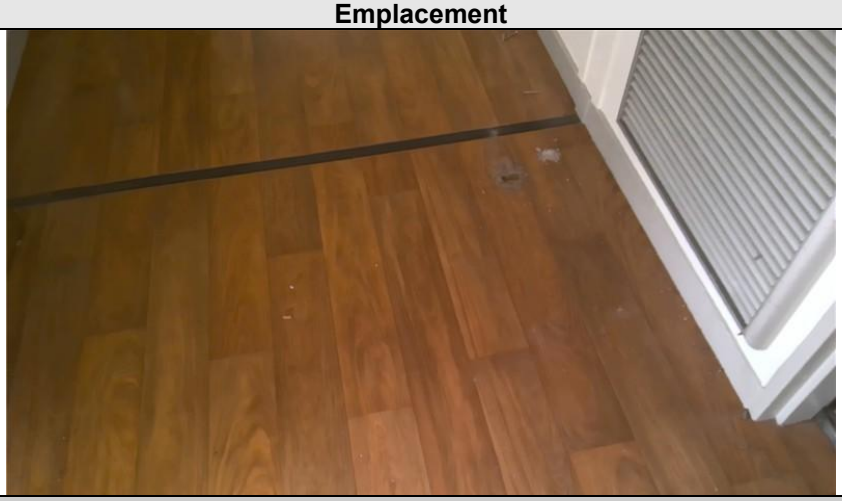

PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Linge salle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	
Emplacement		

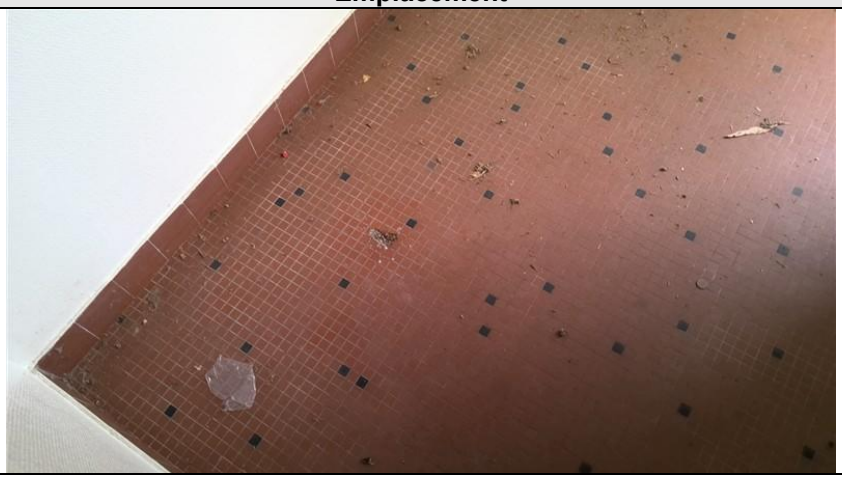

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Office
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Office
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P011		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Office
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P012		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle pause
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement

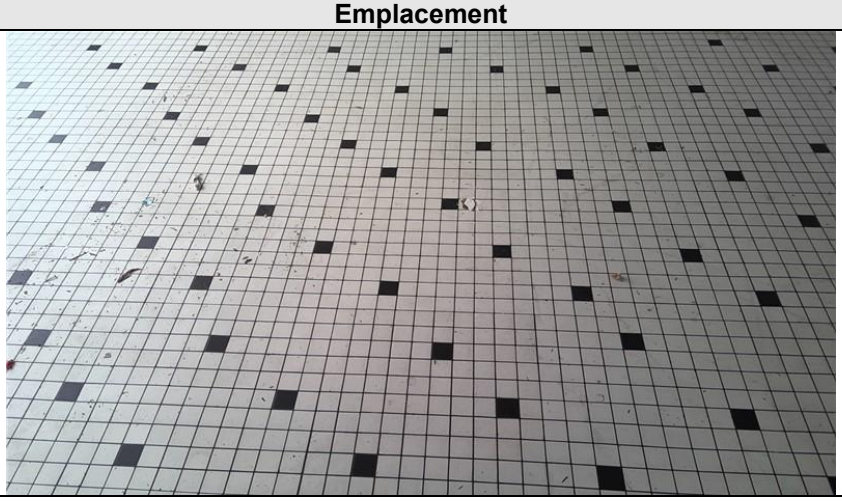

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P013		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle pause
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes (noire)	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P014		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle pause
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P015		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P016		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P017		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



PRELEVEMENT : P018		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P019		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P020		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalles de sol + colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P021		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



PRELEVEMENT : P022		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Office propre
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P023		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Office propre
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	
Emplacement		



PRELEVEMENT : P024		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Lingerie
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plinthes - Toutes zones	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	
Emplacement		




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P025		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	
Emplacement		

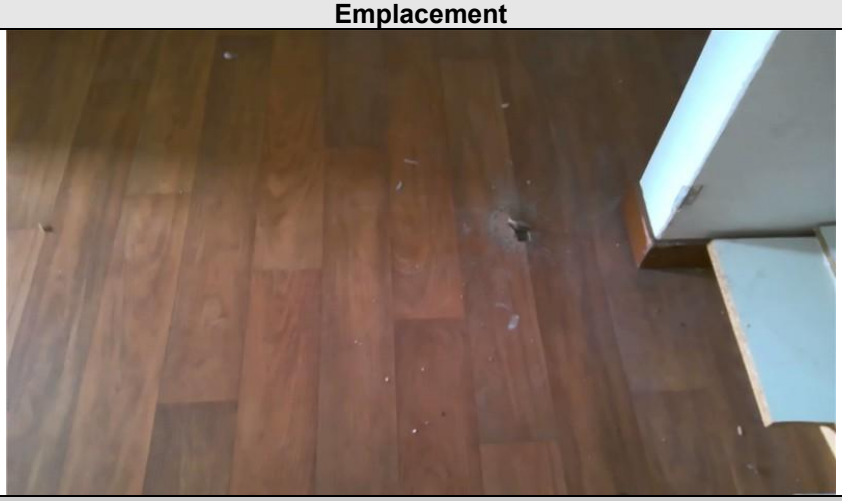

PRELEVEMENT : P026		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalles de sol + colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P027		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P028		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Local ASH
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P029		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Local ASH
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Faïence - Toutes zones	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	

Emplacement



PRELEVEMENT : P030		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau cadre
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P031		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°5
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence 15*15	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



PRELEVEMENT : P032		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires/WC 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P033		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires/WC 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		

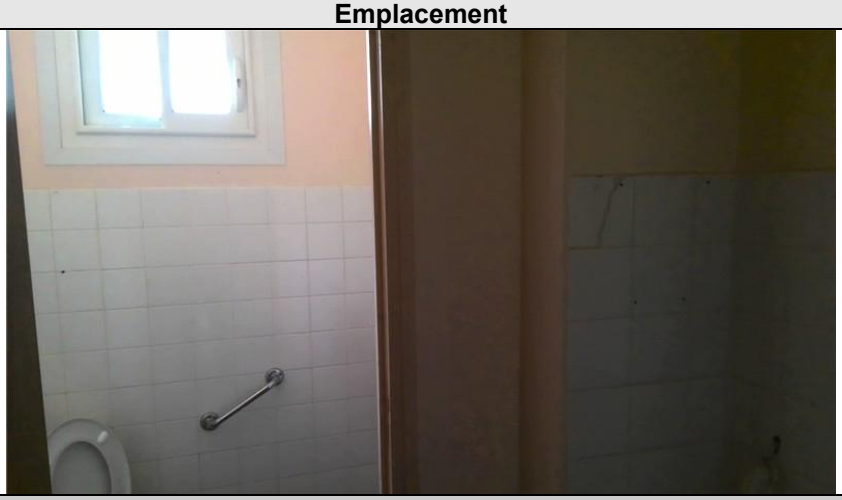

PRELEVEMENT : P034		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Pharmacie
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P035		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Pharmacie
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P036		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau infirmier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P037		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	
Emplacement		

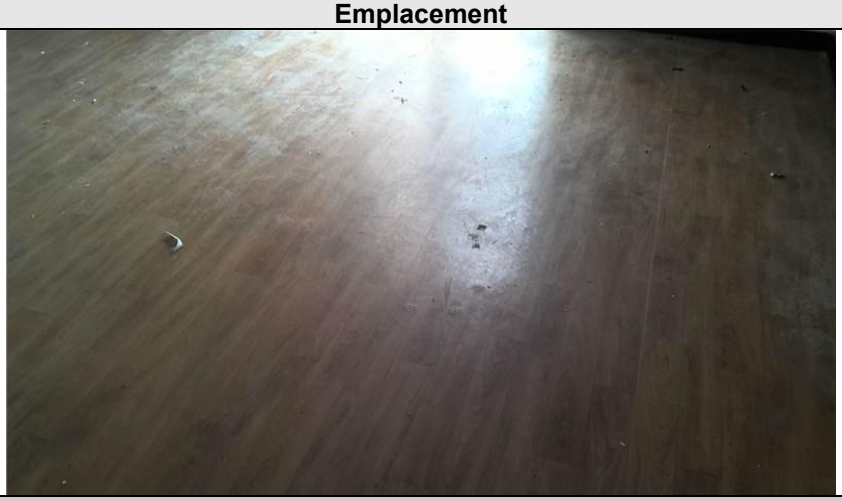

PRELEVEMENT : P038		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau polyvalent
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P039		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire/WC 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



PRELEVEMENT : P040		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires PMR 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P041		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P042		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°8
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P043		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Médecin généraliste
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P044		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Médecin généraliste
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		

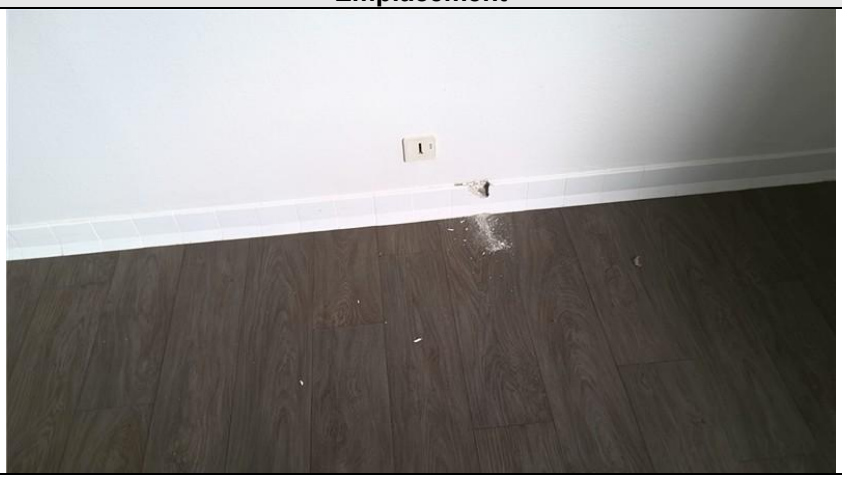

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P045		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Médecin généraliste
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P046		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Linge/Laverie
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

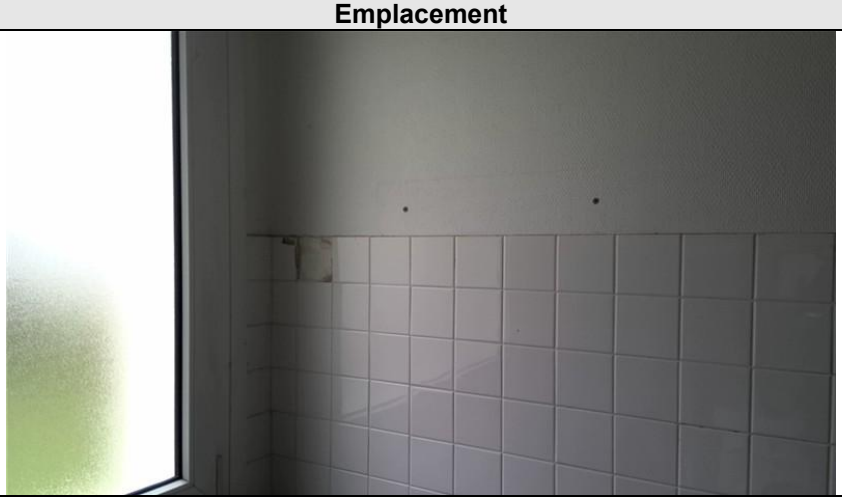

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P047		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°9
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	
Emplacement		



PRELEVEMENT : P048		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau psychologue
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P049		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - WC personnel
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P050		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon visiteur 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P051		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - PMR Visiteurs
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		

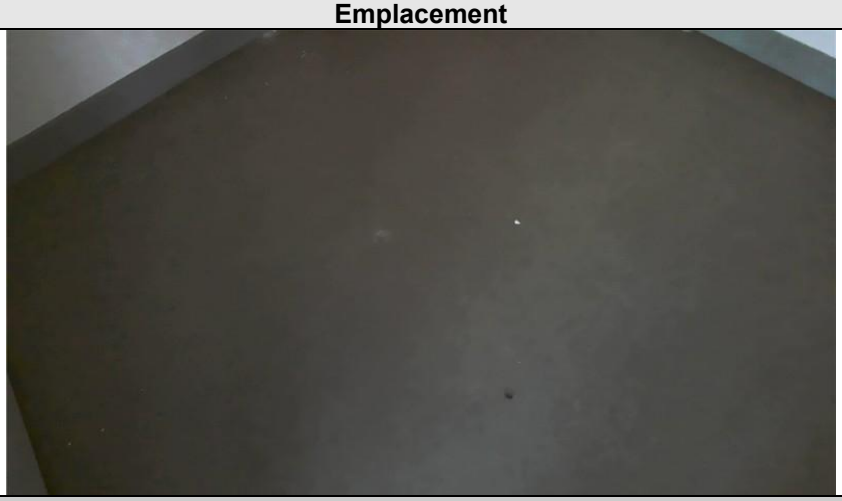

PRELEVEMENT : P052		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - PMR Visiteurs
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P053		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Rgt linge
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P054		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Rgt linge
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plinthes - Toutes zones	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P055		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalles de sol + colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P056		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P057		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Soins
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P058		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Espace détente
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		

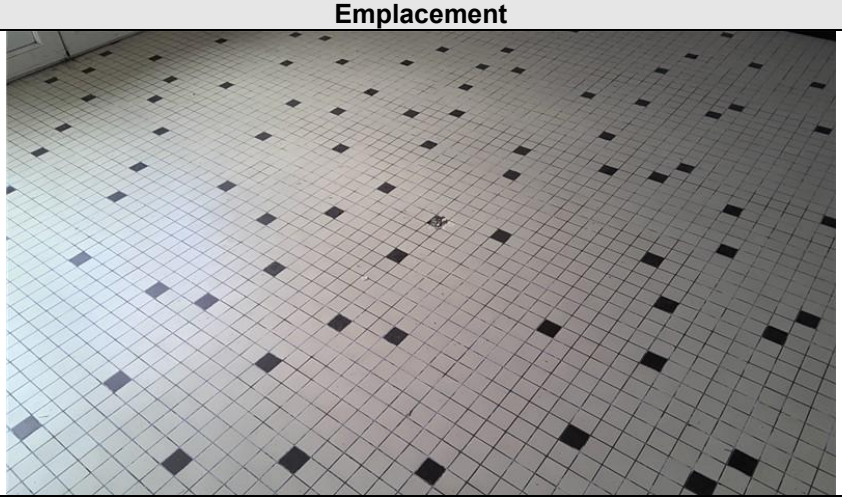

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P059		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Espace détente
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes (noire)	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P060		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence 15*15	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P061		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence 20*20	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - D		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P062		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P063		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - D		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P064		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activité Cuisine
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P065		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activité Cuisine
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P066		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activité Cuisine
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence 15*15	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

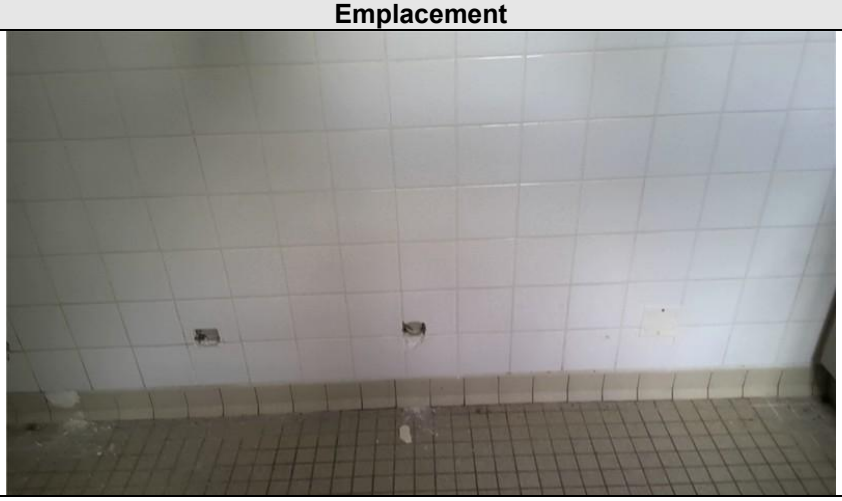

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P067		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon visiteurs 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P068		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Marches - Sol		absence d'amiante

Emplacement




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P069		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement

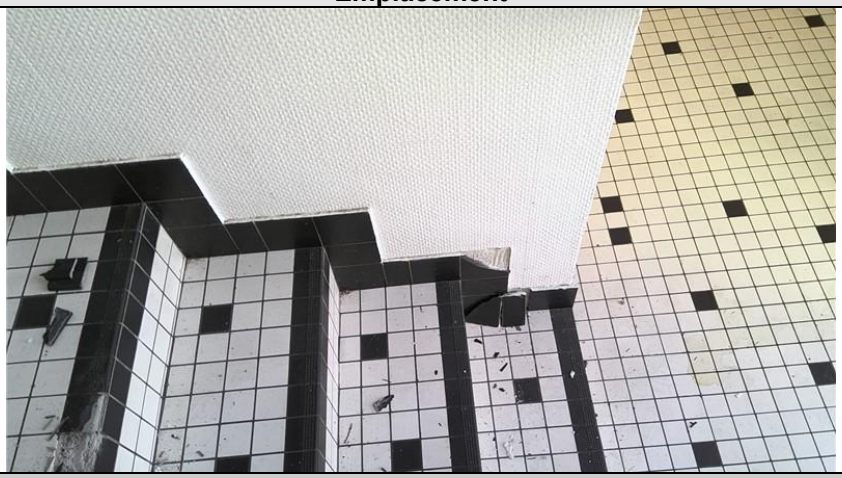

PRELEVEMENT : P070		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P071		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Marches		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P072		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°15
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalles de sol + colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P073		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires F 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	
Emplacement		



PRELEVEMENT : P074		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°11
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Faïence - Toutes zones	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	
Emplacement		

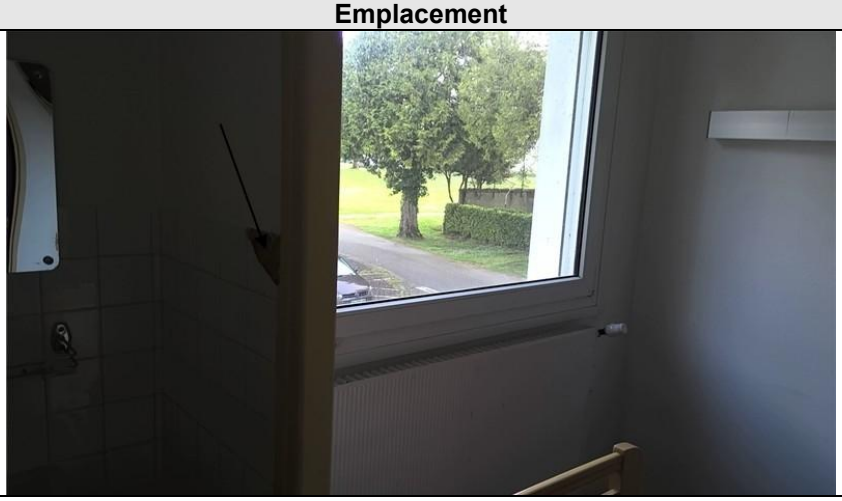

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P075		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°17
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



PRELEVEMENT : P076		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°15
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 15*15	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P077		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires F 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement



PRELEVEMENT : P078		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P079		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage (rouge)	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P080		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes (rouge)	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P081		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes (marron)	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P082		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol (douche)		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P083		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence 10*10 n°1 - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P084		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 15*15	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence n°1 - WC		absence d'amiante

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P085		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Marches - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P086		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		

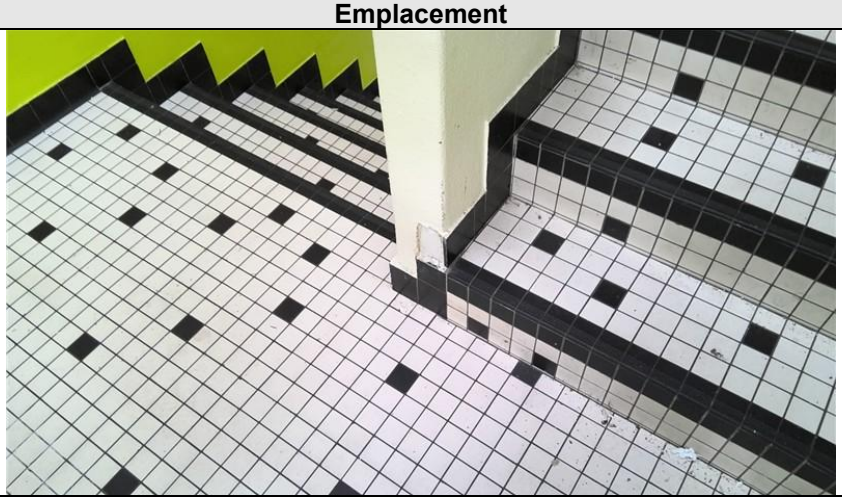


Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P087		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

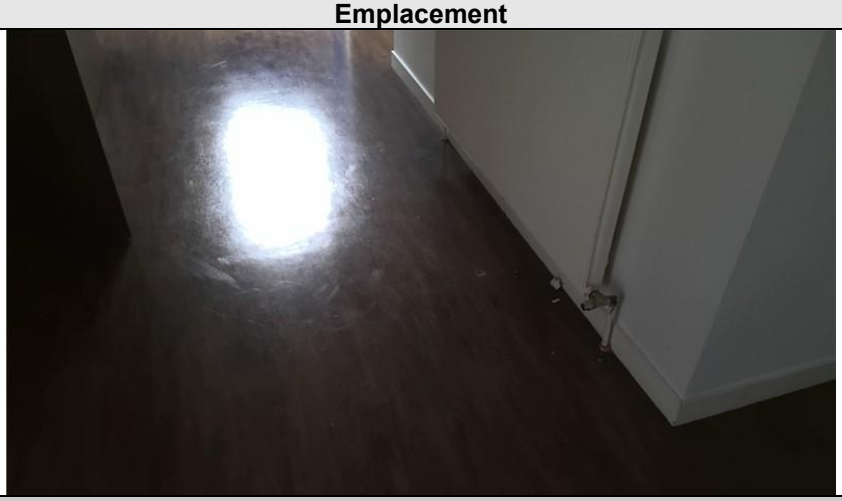

PRELEVEMENT : P088		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Marches	absence d'amiante	

Emplacement




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P089		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°30
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		

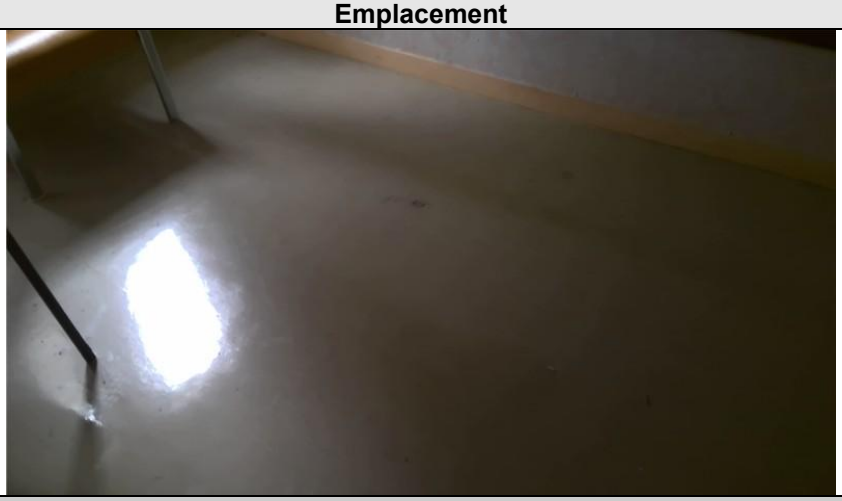

PRELEVEMENT : P090		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°30
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P091		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°23
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P092		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°23
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P093		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°25
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	
Emplacement		



PRELEVEMENT : P094		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°25
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 15*15	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Faïence - Toutes zones	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P095		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire F 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P096		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire F 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P097		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires H 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P098		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires H 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

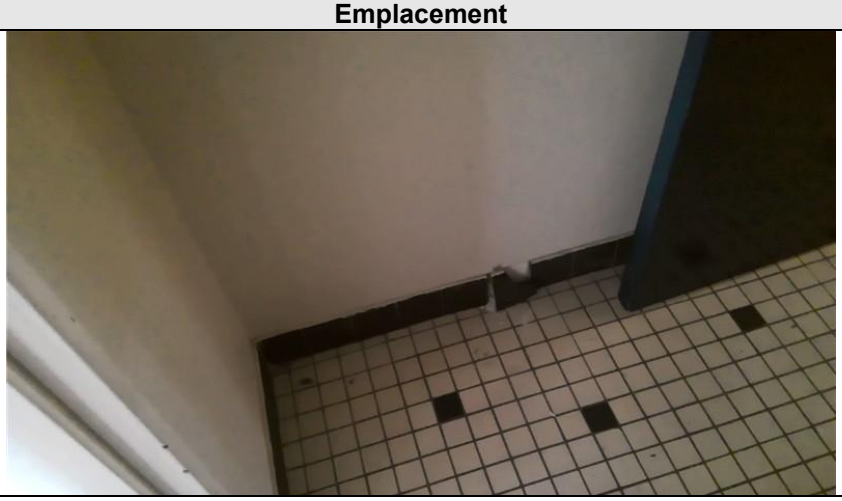

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P099		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires H 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P100		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires H 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol (douche)		absence d'amiante

Emplacement




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P101		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle musculation
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		

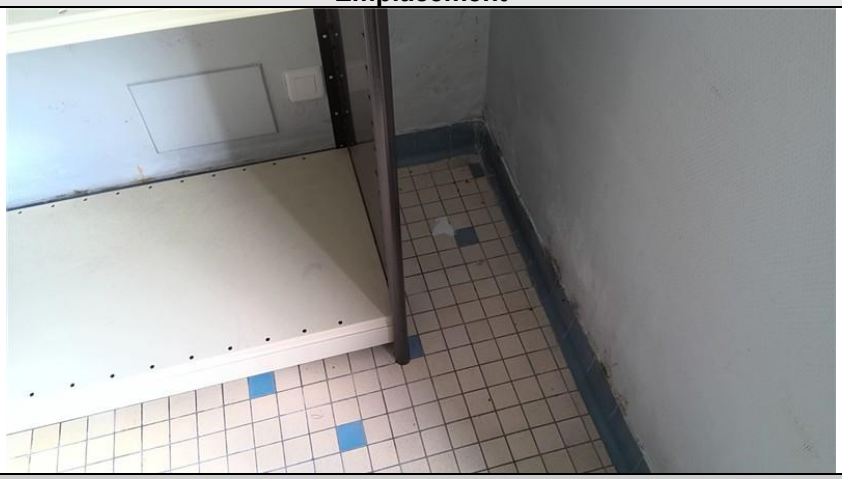

PRELEVEMENT : P102		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle musculation
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Marches		absence d'amiante
Emplacement		




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P103		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle musculation
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement

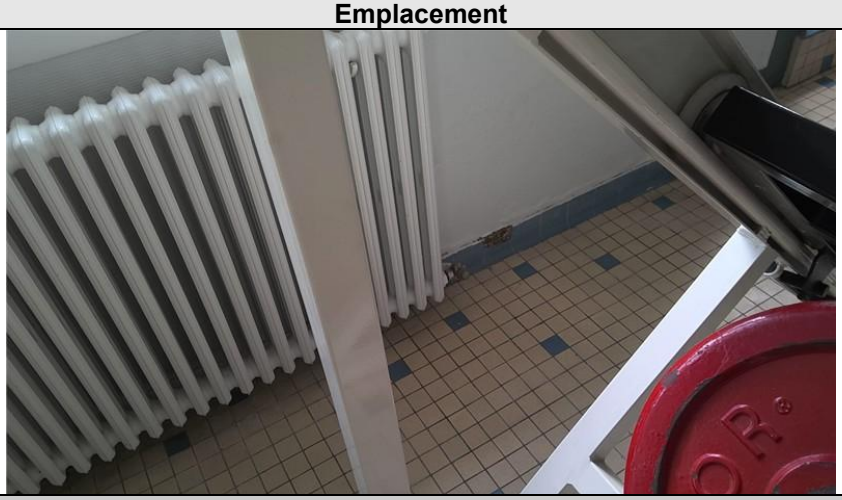

PRELEVEMENT : P104		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle musculation
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P105		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Activité
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P106		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Activité
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P107		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Activité
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
plaque anti vibration	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Evier - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P108		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Sanitaire sous-sol
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Sol - Sol		absence d'amiante

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P109		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Activité
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur périphérique - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P110		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle réunion
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur périphérique - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P111		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Activité
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P112		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Sanitaire sous-sol
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P113		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Activité
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P114		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle réunion
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

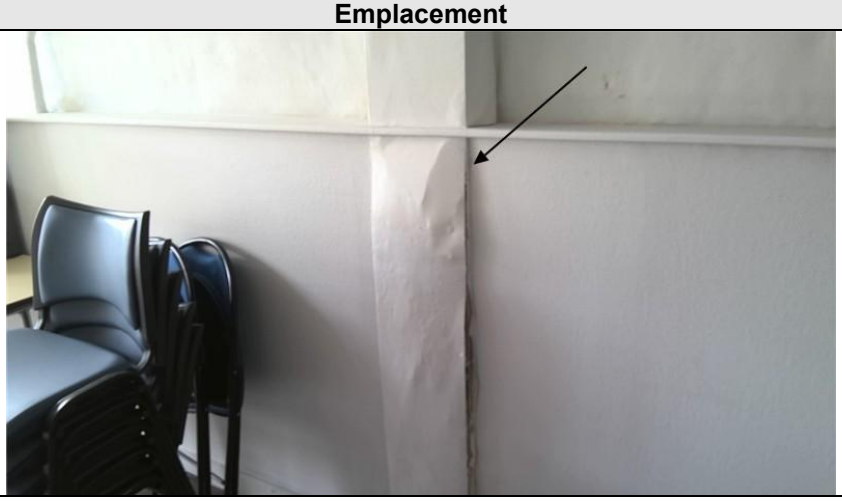


Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P115		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Activité
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Poteau - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

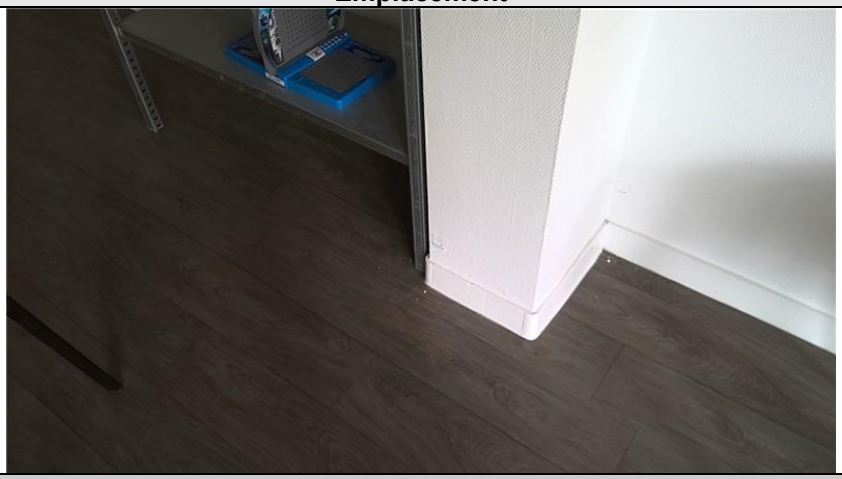

PRELEVEMENT : P116		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle musculation
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Poteau - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P117		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle musculation
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Mur périphérique - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P118		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle musculation
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Poutres - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement

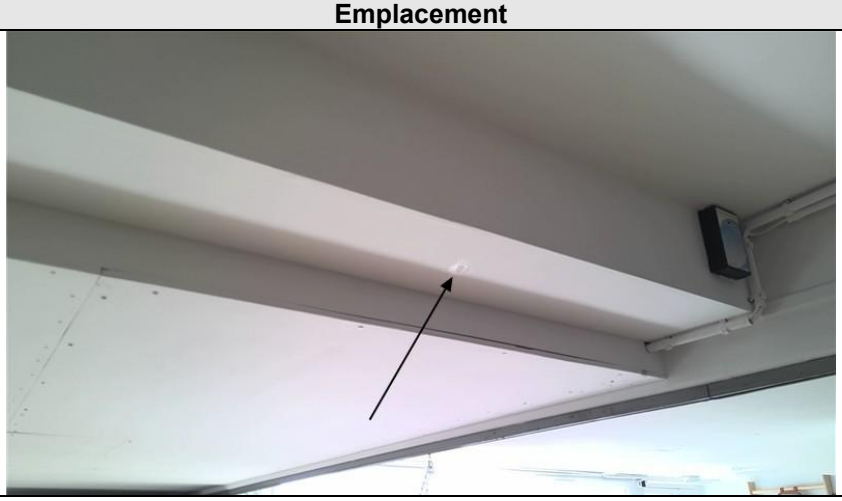

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P119		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle musculation
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P120		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle réunion
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Poutres - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P121		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle réunion
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P122		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Office
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Mur de Refend - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P123		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Office
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P124		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P125		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P126		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Poutre/Poteau - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

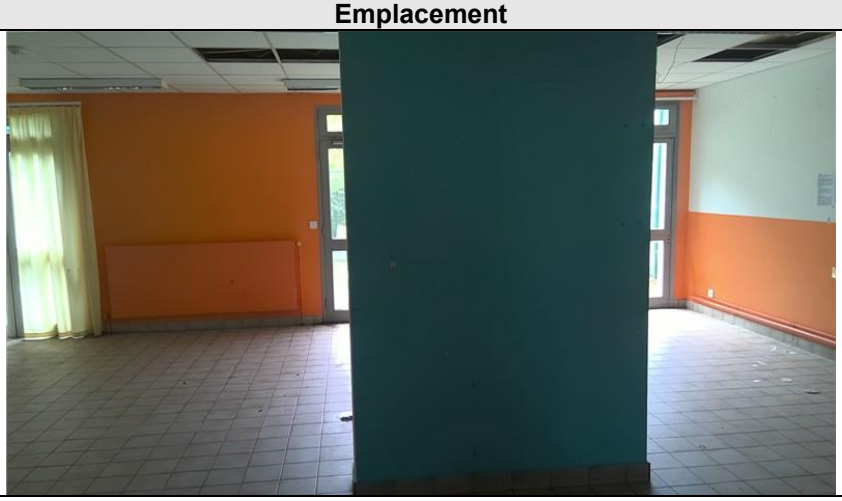

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P127		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Murs et cloisons - D	absence d'amiante	
Emplacement		



PRELEVEMENT : P128		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités (ex rgt personnel)
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Murs et cloisons - D	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P129		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P130		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux collés	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Trémolite)	

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P131		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités (ex rgt personnel)
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P132		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle pause
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux collés	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P133		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P134		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Local ASH
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P135		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P136		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Pharmacie
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		

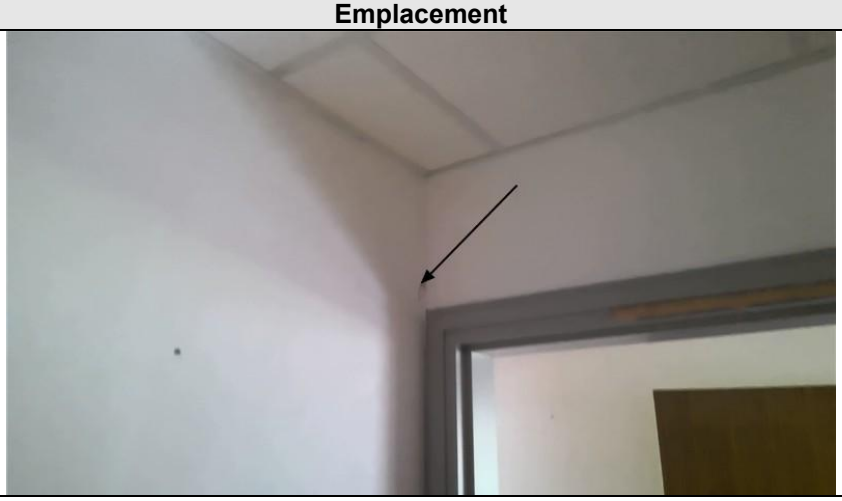


Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P137		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

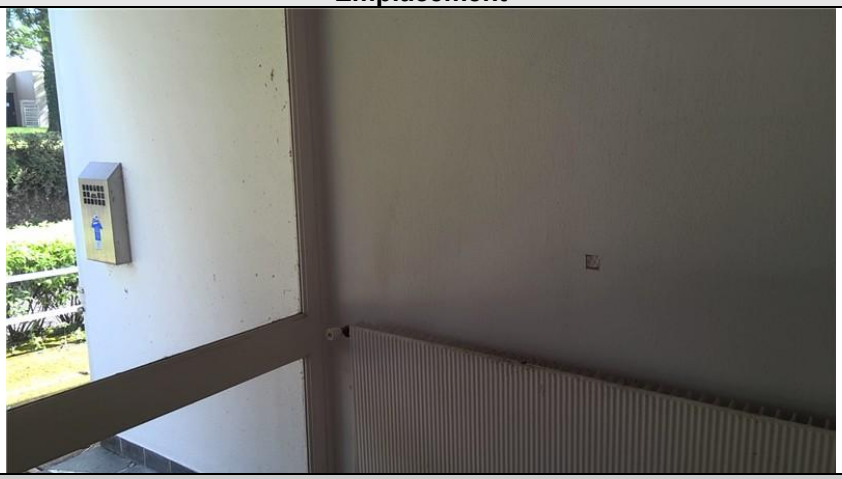

PRELEVEMENT : P138		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire/WC 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P139		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P140		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires PMR 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement

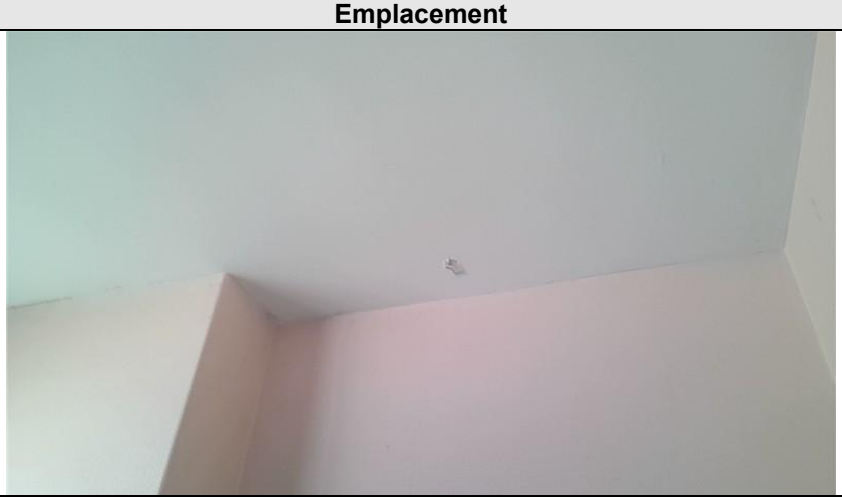

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P141		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire/WC 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P142		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau psychologue
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P143		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P144		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		

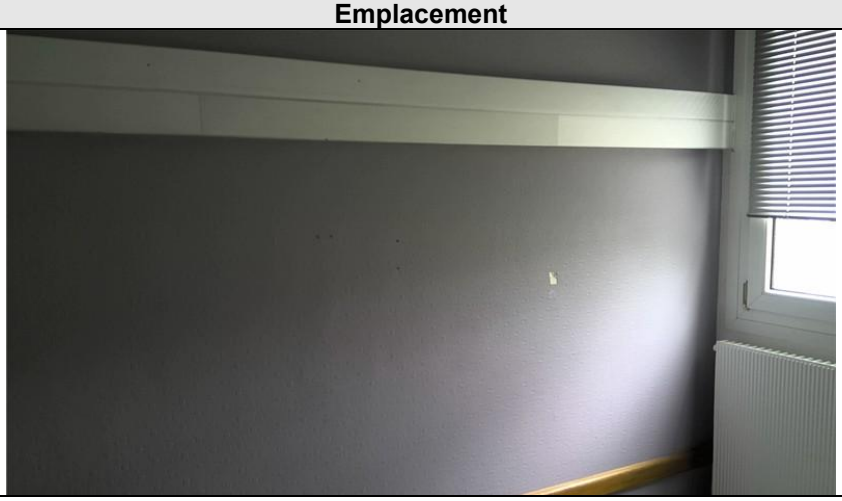


Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P145		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		

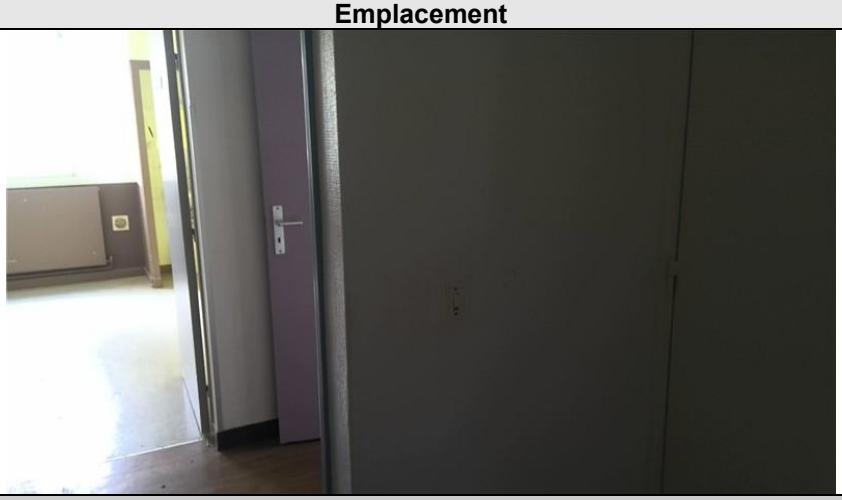

PRELEVEMENT : P146		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P147		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - D		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P148		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Espace détente
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Poutre/Poteau - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P149

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Espace détente
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - D		absence d'amiante

Emplacement

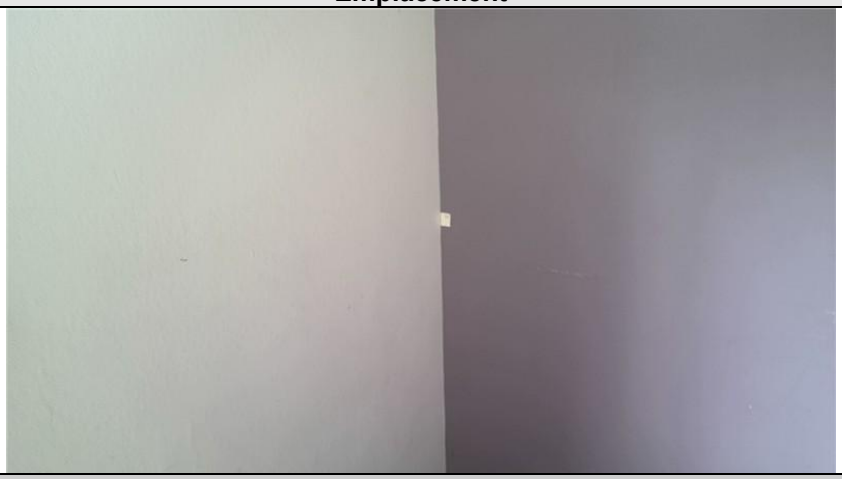

PRELEVEMENT : P150

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P151		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P152		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle pause
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
plaque anti vibration	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Evier - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P153		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P154		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P155		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P156		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P157		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°12
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - B		absence d'amiante
Emplacement		

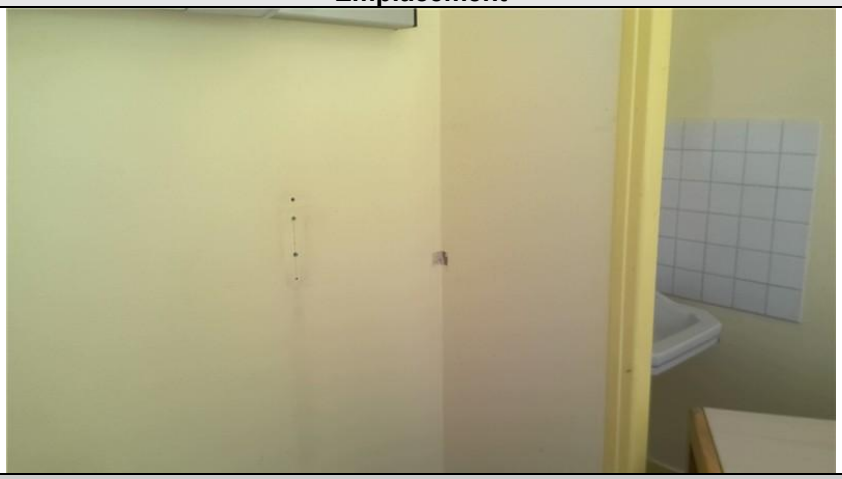

PRELEVEMENT : P158		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°12
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P159		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires F 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



PRELEVEMENT : P160		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°17
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P161		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°18
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - B		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P162		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

Emplacement

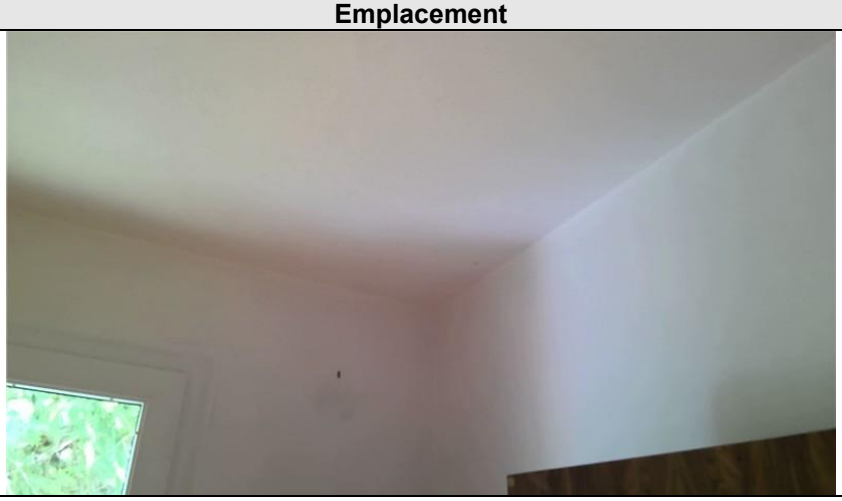

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P163		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	
Emplacement		



PRELEVEMENT : P164		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Mur de Refend - Toutes zones	absence d'amiante	
Emplacement		



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P165		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P166		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		

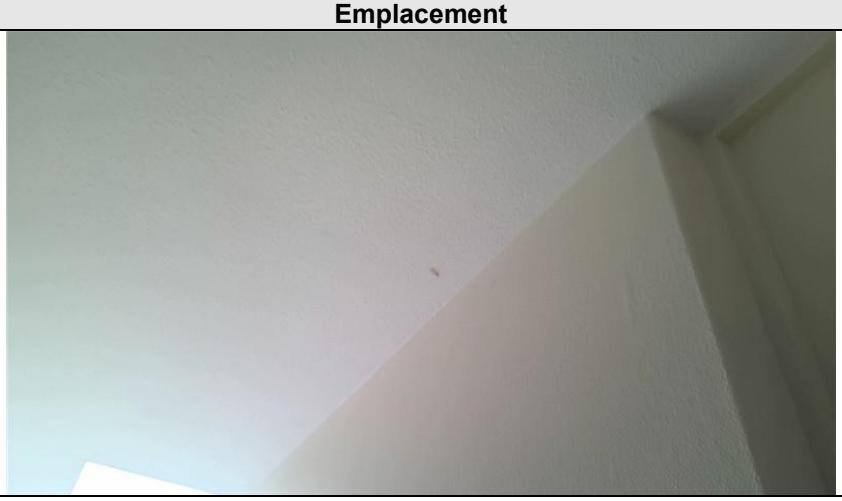


Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P167		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

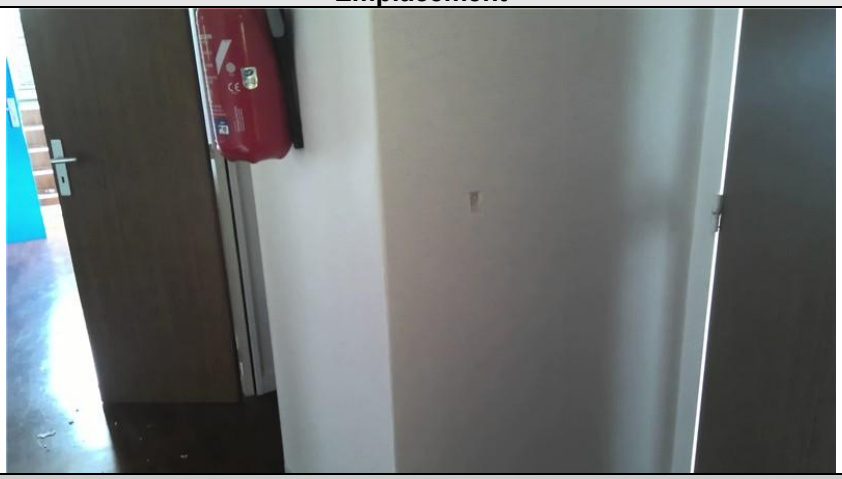

PRELEVEMENT : P168		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°31
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P169		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire F 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P170		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°24
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P171		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire F 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P172		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°22
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons n°1 - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P173		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires H 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P174		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°23
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P175		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibrociment	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluide n°2 - Façade		Présence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P176		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	2ème - Toiture
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement bitumineux	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Toiture (centrale) n°1 - Toiture		absence d'amiante

Emplacement

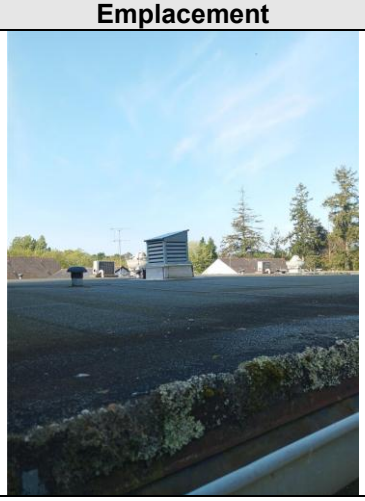

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P177		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	2ème - Toiture
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Remontée bitumineuse	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Toiture (centrale) n°2 - Toiture		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P178		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint de dilatation	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Façade - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P179		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon / TV
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux collés	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P180		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Espace détente
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux collés	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

Emplacement

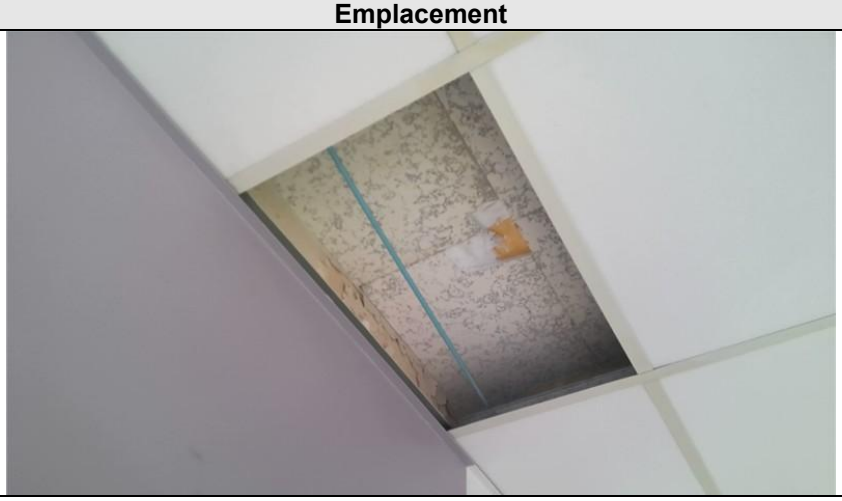

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P181		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Espace détente
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre+Colle	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P182		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon / TV
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre+Colle	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P183		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau infirmier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre+Colle	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P184		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre+Colle	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P185		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau infirmier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux collés	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P186		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires PMR 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		




Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P187		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Local élec (3D)
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes (noire)	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement

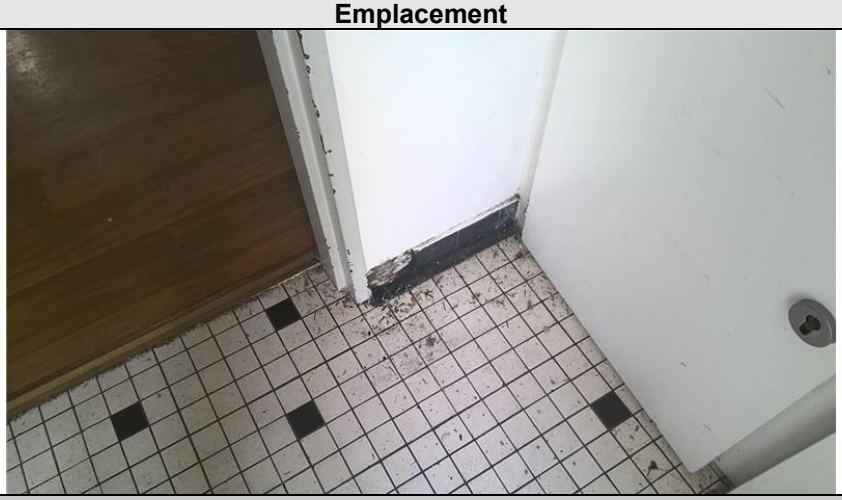

PRELEVEMENT : P188		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P189		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Linge/Laverie
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Plinthes	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P190		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Local élec 3C
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes (noire)	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P191		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon / TV
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes (noire)	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P192		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

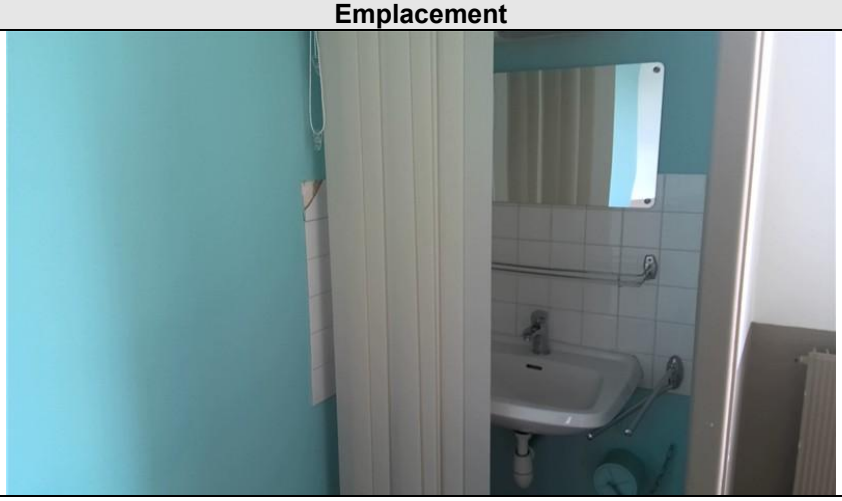

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P193		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P194		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau psychologue
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P195		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon visiteurs 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P196		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon visiteurs 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
plaque anti vibration	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Evier - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P197		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Soins
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P198		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°28
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P199		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence n°1 - Douche		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



PRELEVEMENT : P200		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic de vitre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Fenêtre n°1 - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		

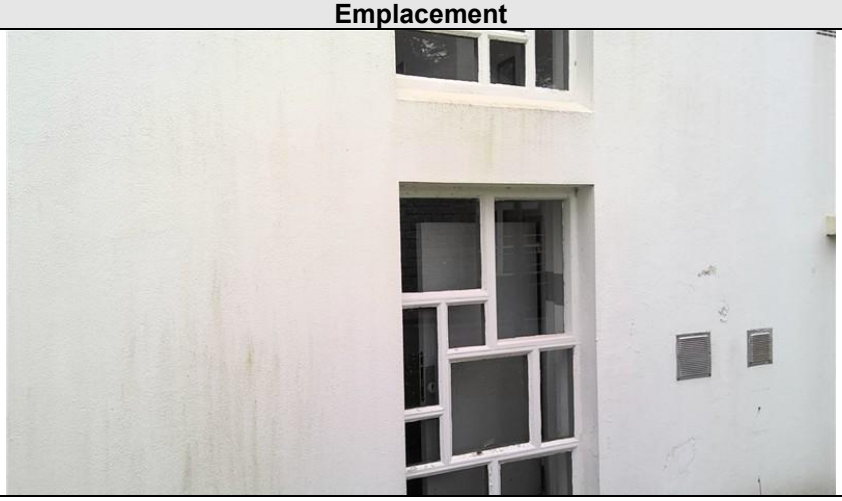

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P201		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de façade - 3D		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P202		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de façade - Centre		absence d'amiante

Emplacement



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P203		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de façade - 3C		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P204		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon visiteur 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic de vitre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Fenêtre - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

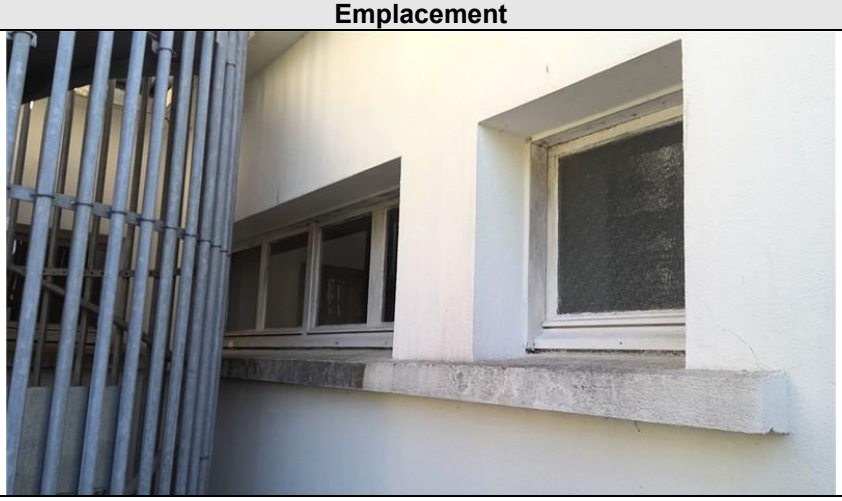

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P205		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement



PRELEVEMENT : P206		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - B		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement

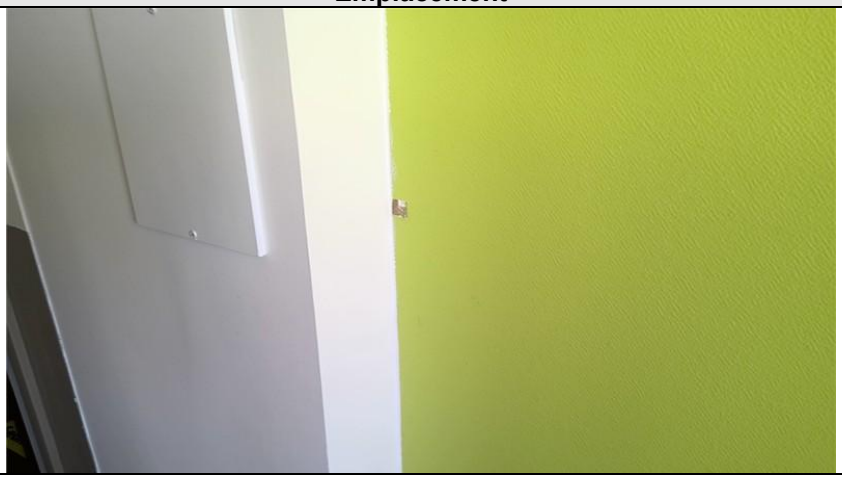


Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P207		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

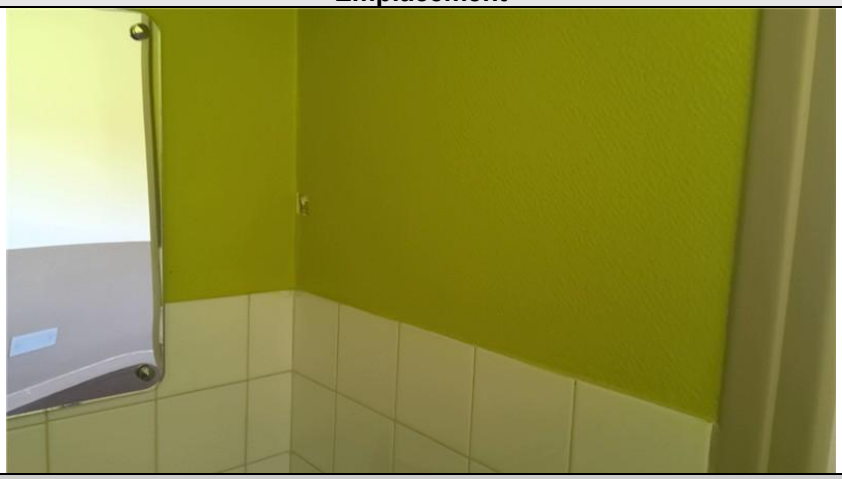

PRELEVEMENT : P208		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons n°1 - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P209		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°15
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



PRELEVEMENT : P210		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°20
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P211		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P212		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires F 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

Emplacement

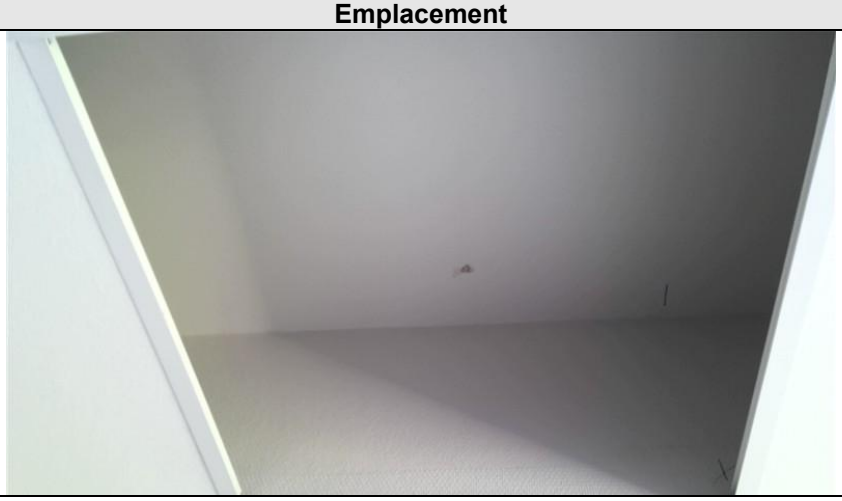

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P213		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°18
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P214		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°20
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		

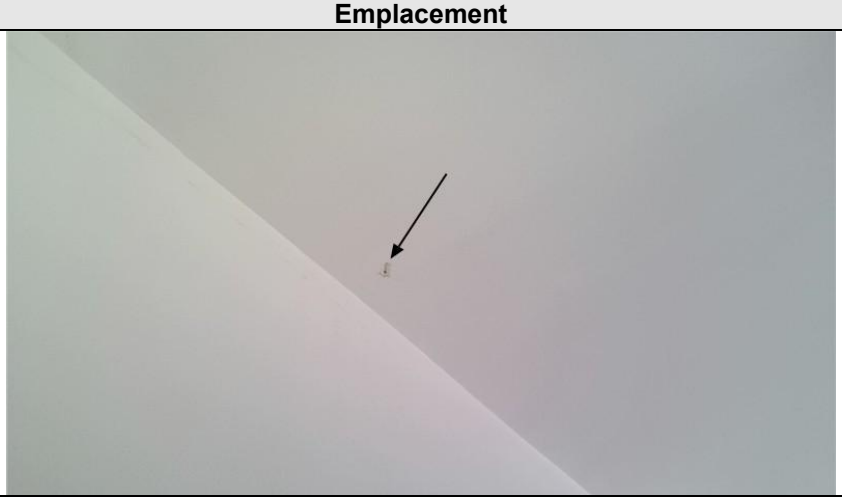

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P215		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°13
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P216		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P217		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		

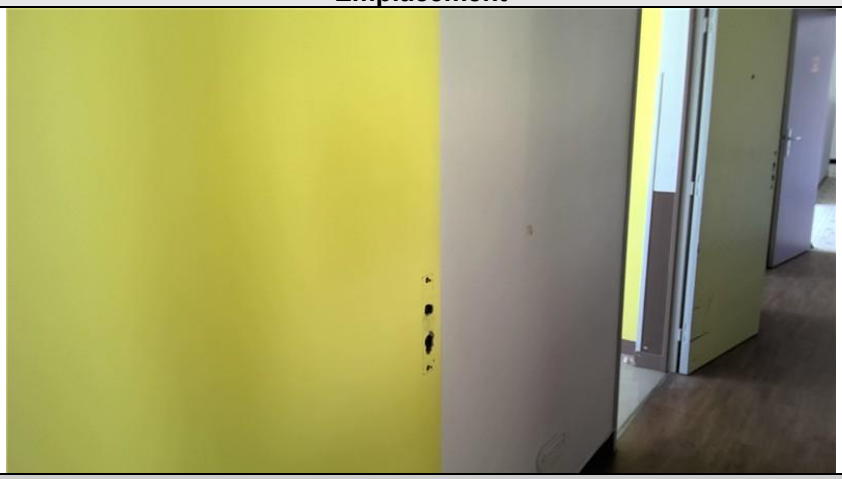

PRELEVEMENT : P218		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon visiteur 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P219		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activité Cuisine
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P220		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Soins
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P221		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Espace détente
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P222		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon / TV
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		




Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P223		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon visiteur 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande calicot	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Murs et cloisons - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		

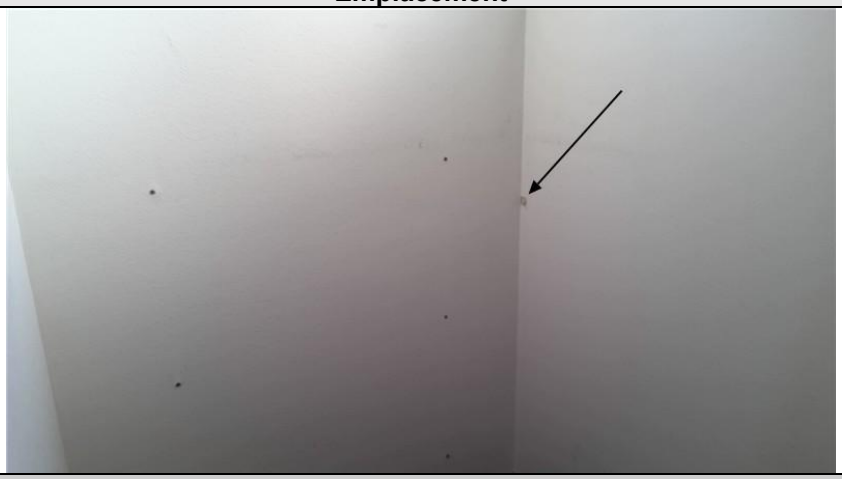

PRELEVEMENT : P224		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°24
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint fibreux intérieur	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Fenêtre - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P225		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités (ex rgt personnel)
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faïence	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P226		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau infirmier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux collés	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P227		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



PRELEVEMENT : P228		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P229		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement



PRELEVEMENT : P230		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement

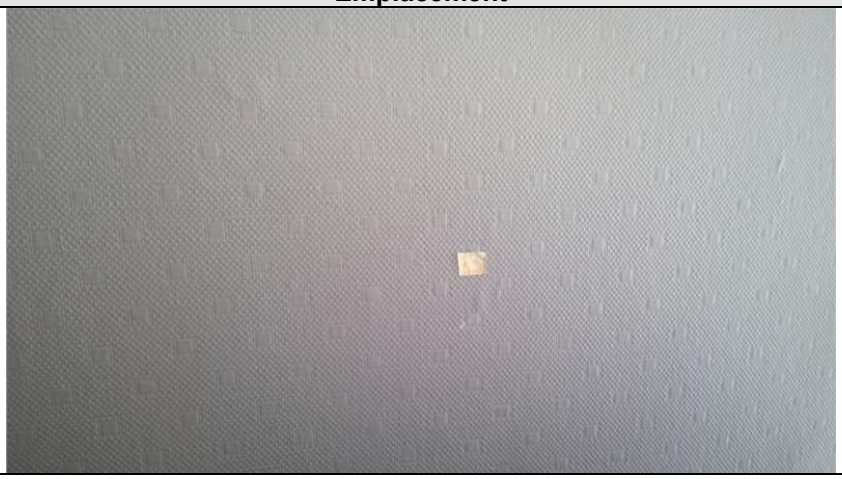

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P231		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P232		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Cloisons/doublage - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

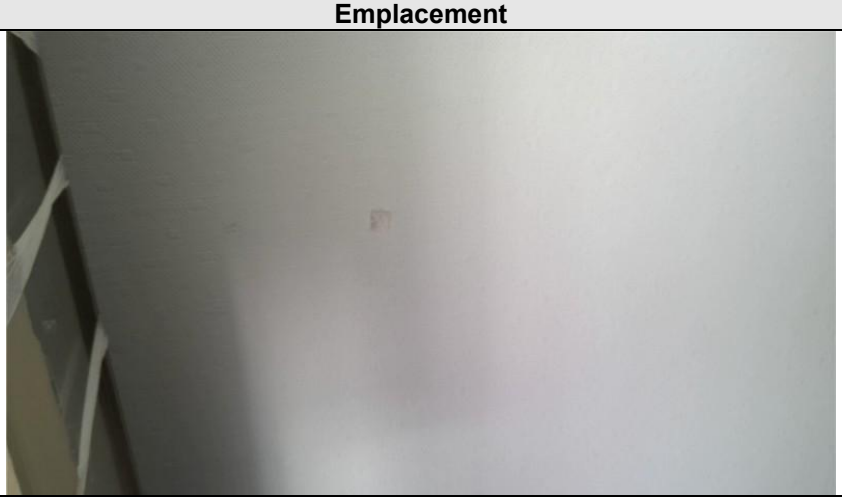

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P233		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Soins
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement



PRELEVEMENT : P234		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon / TV
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P235		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Rgt
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Emplacement



PRELEVEMENT : P236		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons n°2 - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

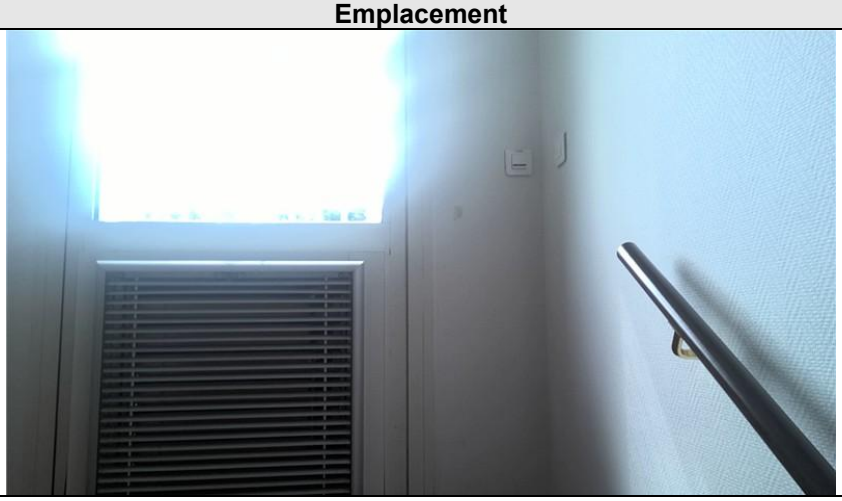

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P237		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°16
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons n°1 - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P238		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°14
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P239		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaire H 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de Faience 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence 10*10 n°2 - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P240		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°11
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P241		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Rangement
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre peinture	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P242		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau ASH
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence 10*10	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

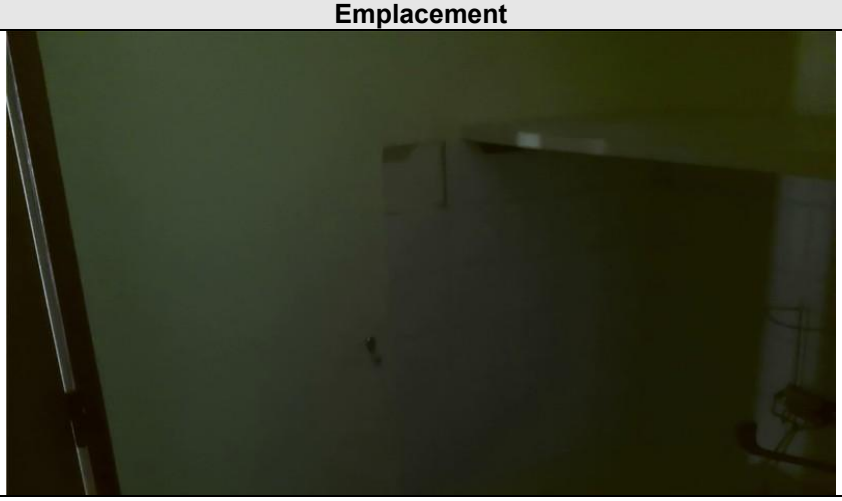

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P243		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture tapisserie	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Cloisons/doublage - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P244		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Cloisons/doublage - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P245		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture tapisserie	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P246		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir 3D
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

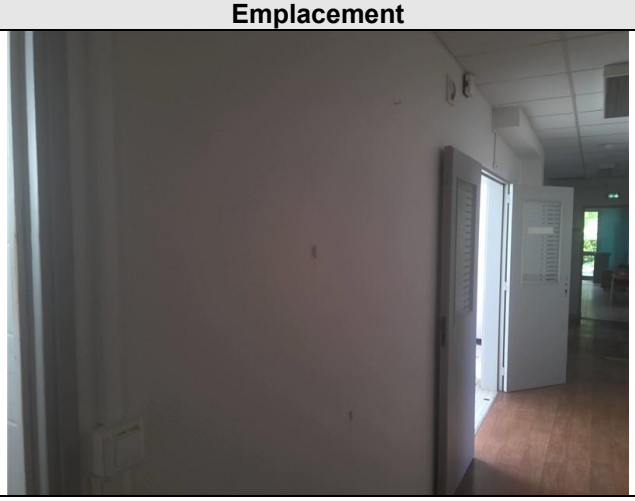


Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P247		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture tapisserie	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		

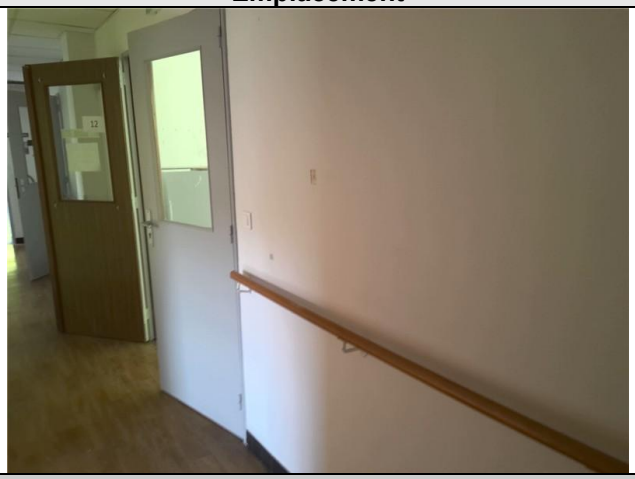

PRELEVEMENT : P248		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P249		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture tapisserie	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)
Emplacement		



PRELEVEMENT : P250		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Couloir n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Mur de Refend - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		

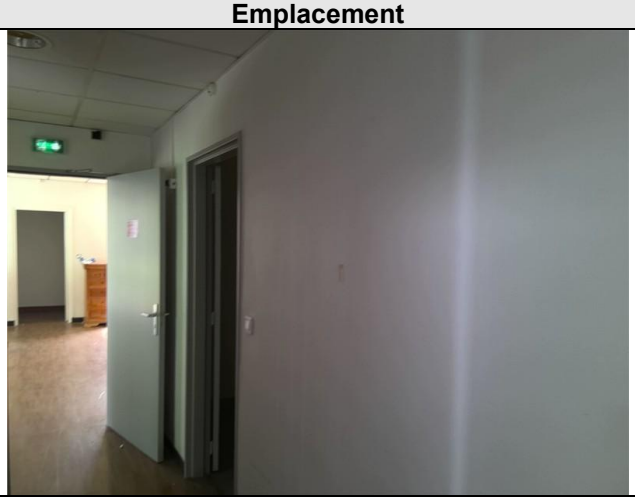

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P251		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°27
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint de finition platre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Fenêtre - Toutes zones	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)	
Emplacement		



PRELEVEMENT : P252		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Espace détente
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint de finition platre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Fenêtre - Toutes zones	absence d'amiante	
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P253		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Rgt linge
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint de finition platre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Fenêtre n°2 - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P254		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salon / TV
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint de finition platre tapisserie	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Fenêtre - Toutes zones	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)	

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P255		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Platre+Joint d'étanchéité blanc	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Fenêtre - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P256		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires/WC 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Platre+Joint d'étanchéité blanc + tapisserie	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Fenêtre - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


PRELEVEMENT : P257		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Lingerie
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Platre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Fenêtre n°2 - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P258		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Platre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Fenêtre n°2 - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement

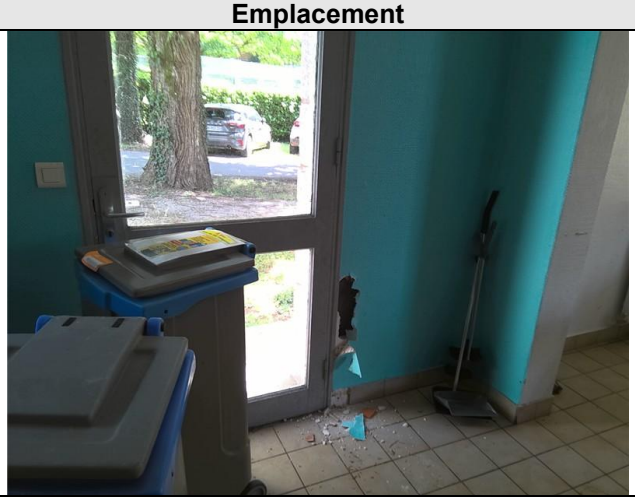

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P259		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°17
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Platre	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Fenêtre - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P260		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°17
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bande bitumineuse	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation		**Résultat**
Doublage/cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

Emplacement



Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P261		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
EPSM Morbihan	108187 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°12
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Platre+Bande papier	15/04/2025	DENIAUD Michel
Localisation	**Résultat**	
Fenêtre - Toutes zones	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)	
Emplacement		



Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ANNEXE 2 – CROQUIS

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN


SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	1/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**Façade et Toiture**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Conduit fibrociment

Légende :

Plan de masse :

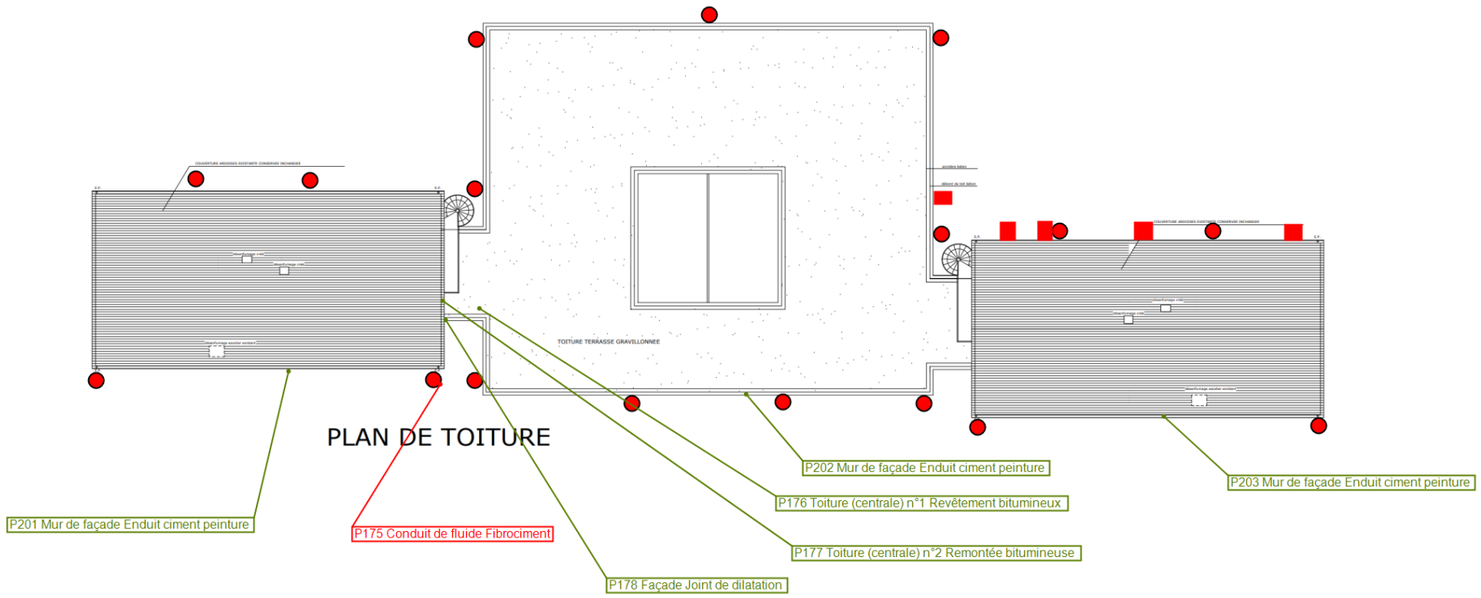

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN


SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	2/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**Sous-sol**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :	1er SS	
Commentaire :		

Prélèvements négatifs
Prélèvements positifs
Colle de plinthe
Colle de faïence
Sondage non amianté

Légende :

Plan de masse :

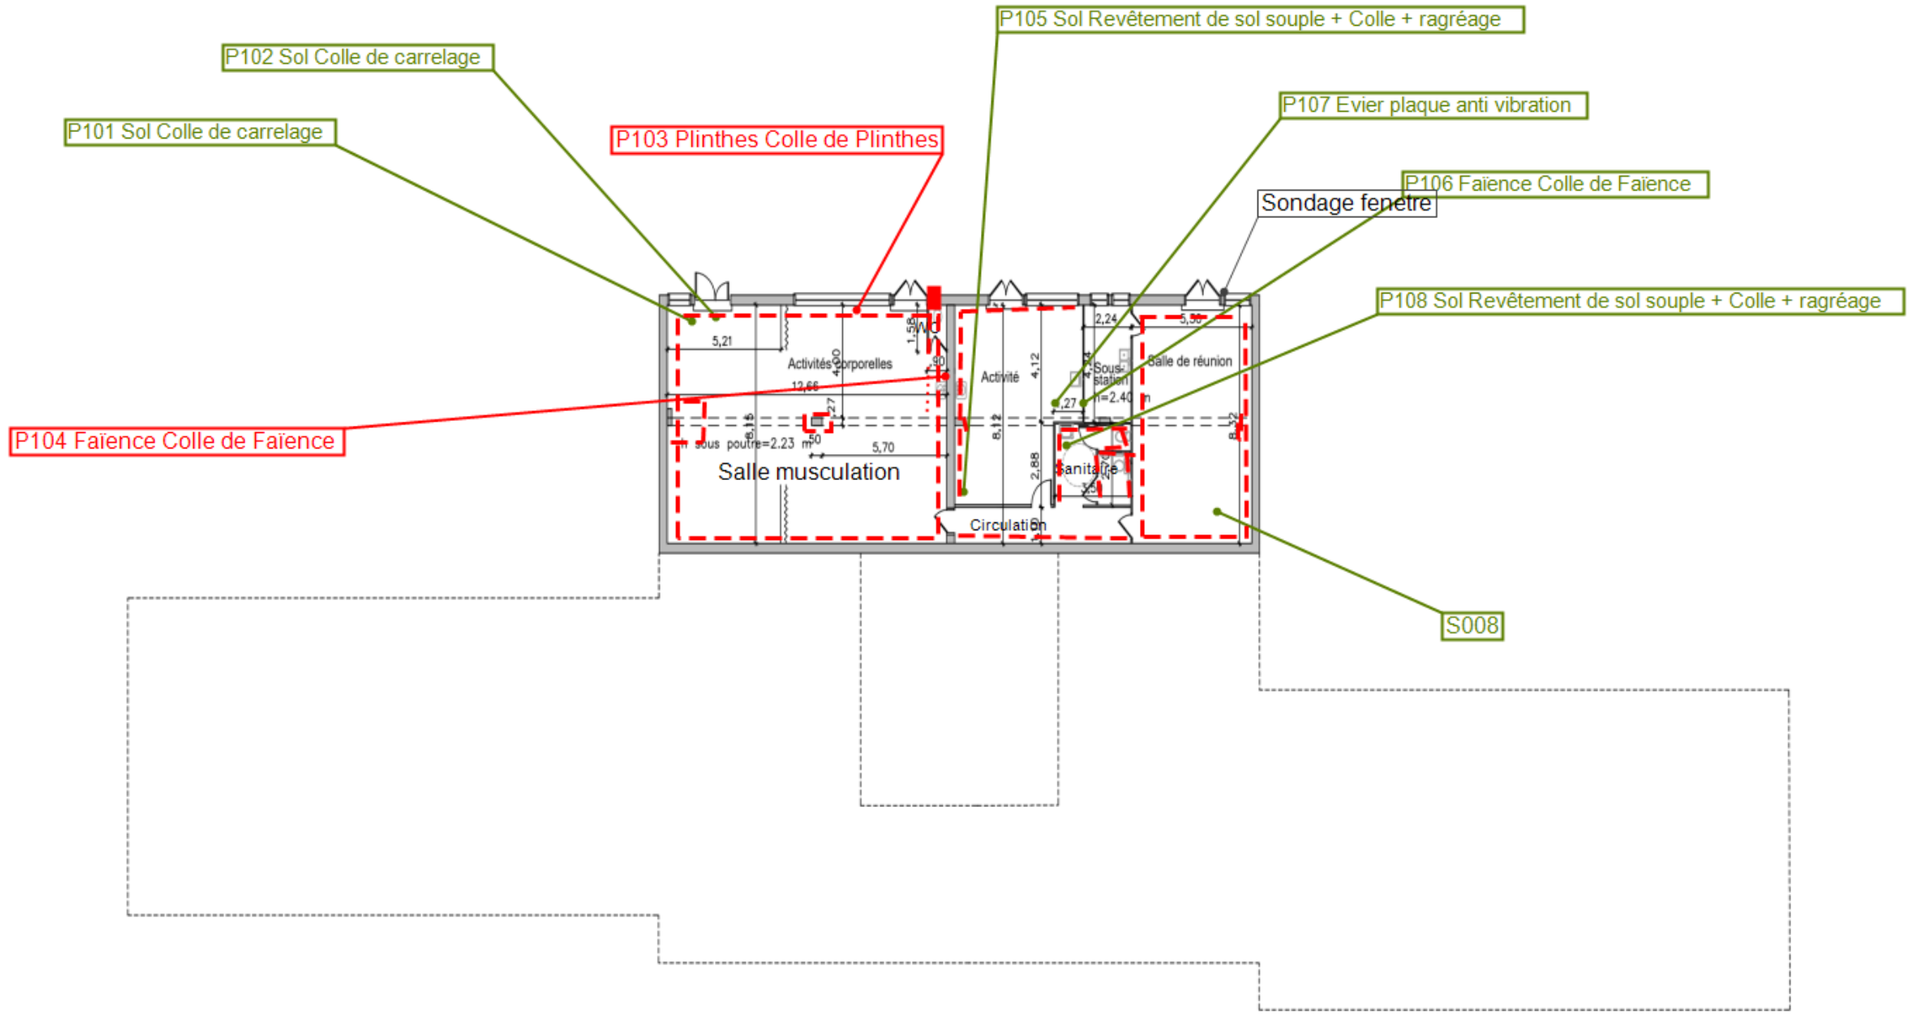

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	3/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**RDC 3D**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :	RDC	
Commentaire :		

Prélèvements négatifs


Prélèvements positifs

Colle de faïence

Colle de plinthe

Légende :

Plan de masse :

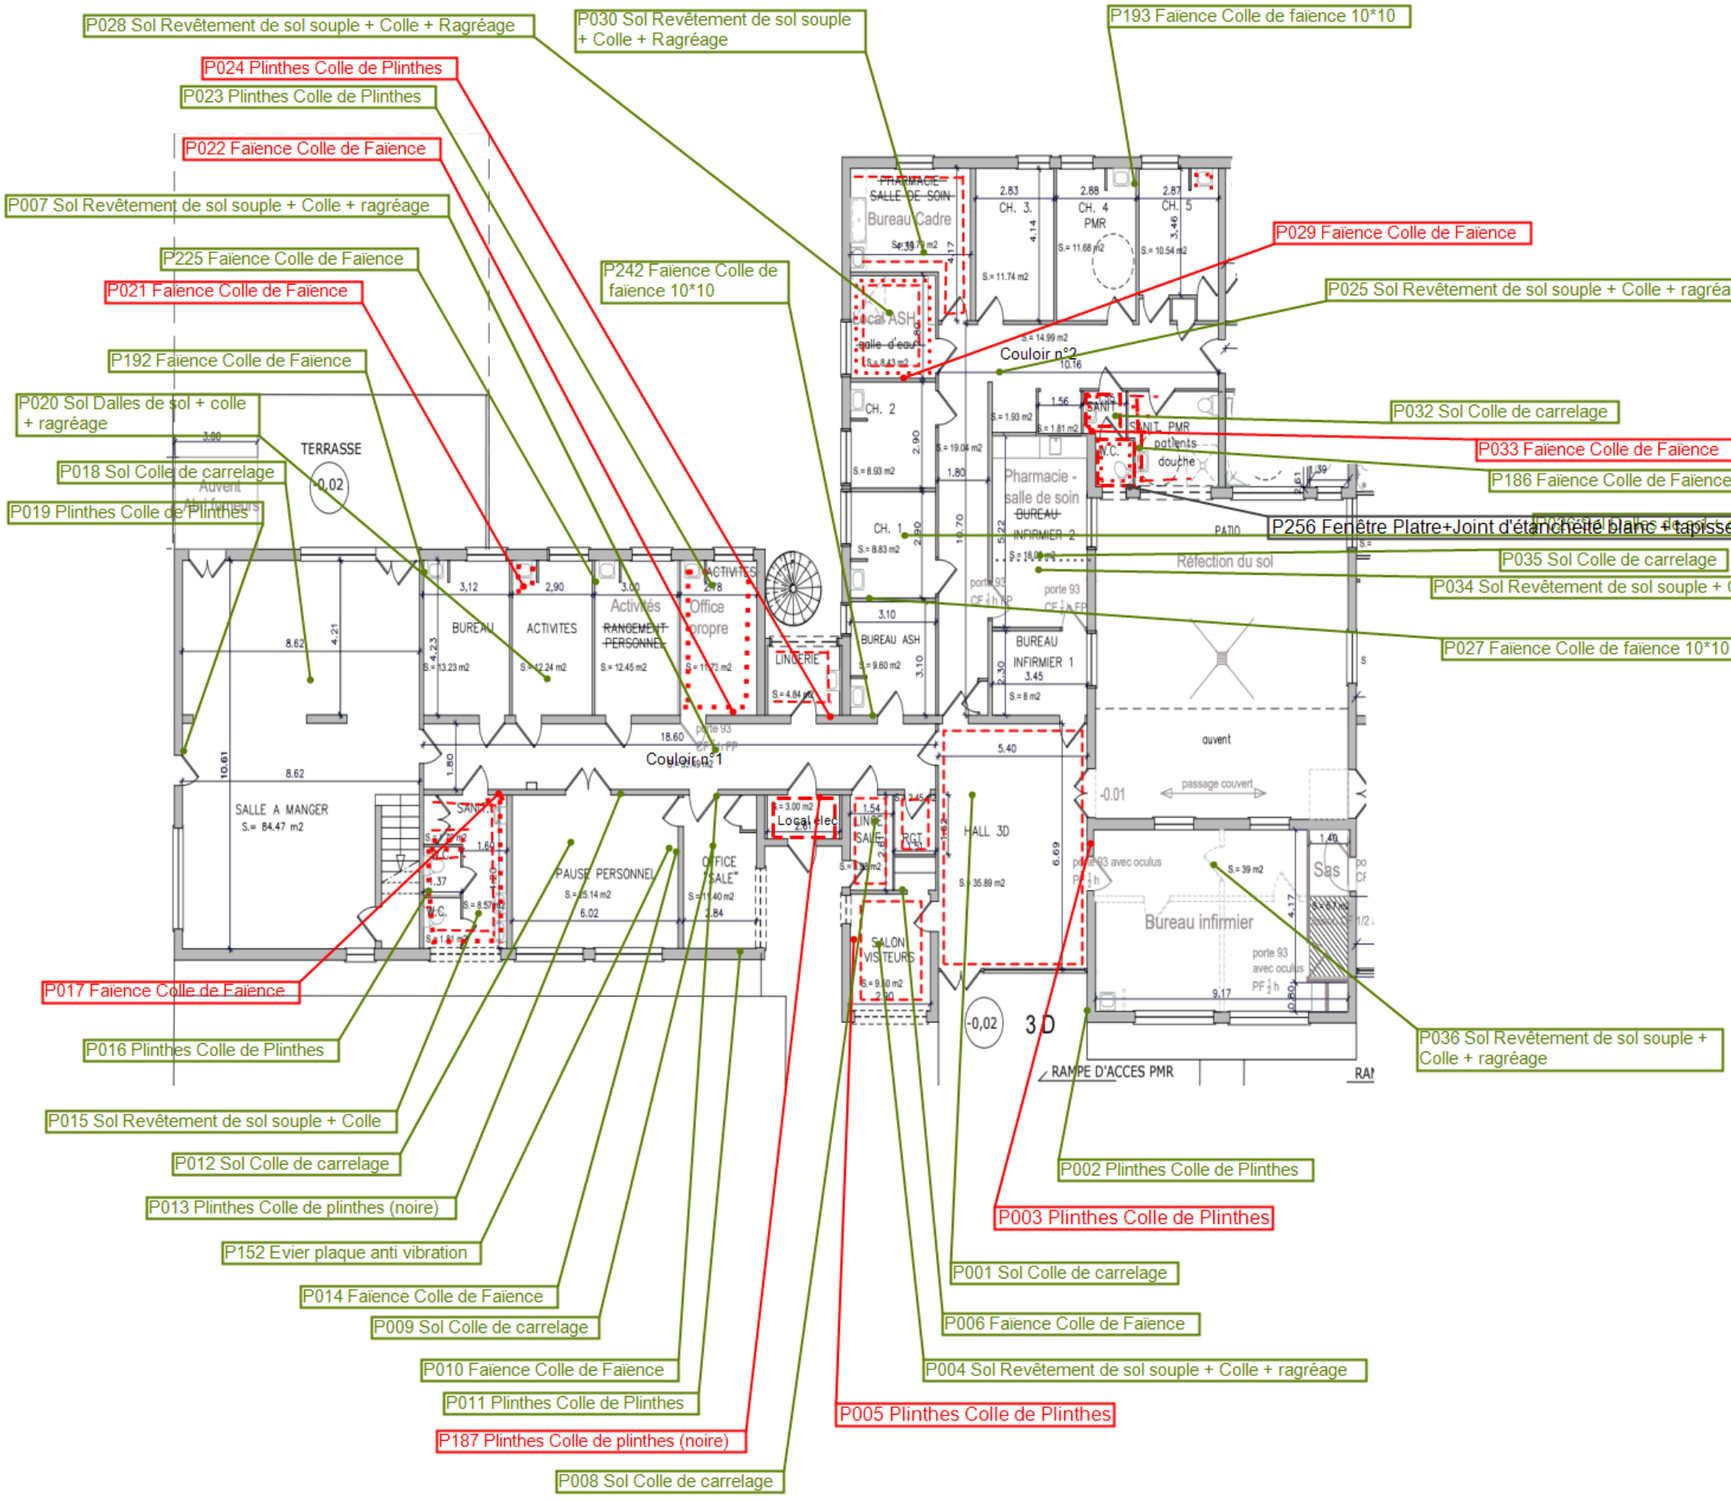

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN


SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	4/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**RDC 3C**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Prélèvements négatifs
Prélèvements positifs
Colle de plinthe
Colle de faïence
Sondage non amianté

Légende :

Plan de masse :

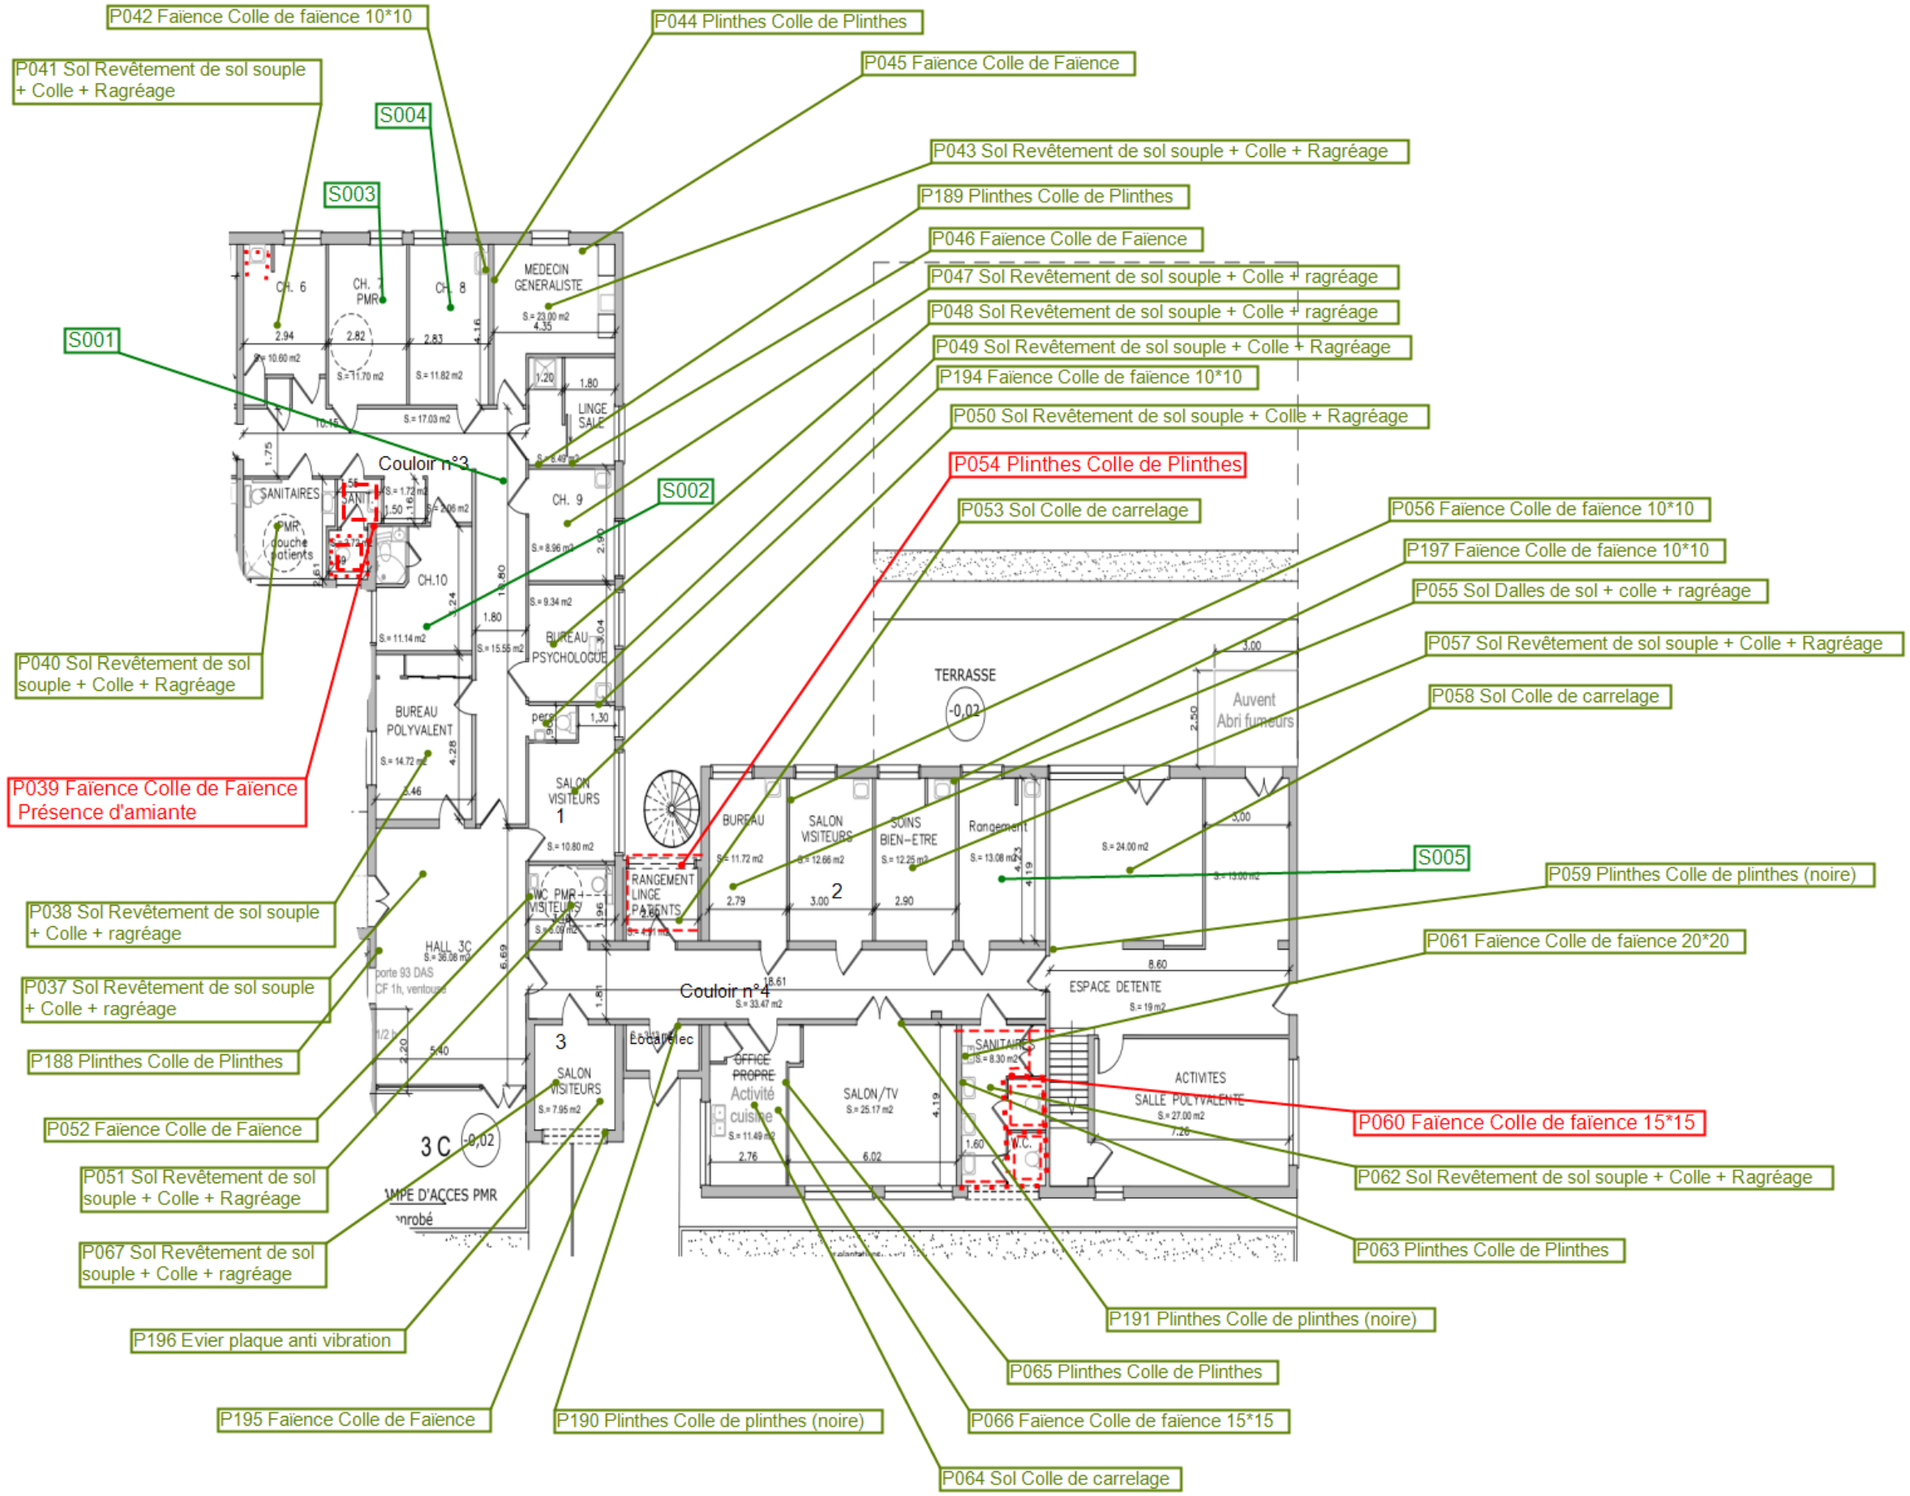


Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	5/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**R+1 3D**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :	1er	
Commentaire :		

Colle de plinthe
Conduit en amiante ciment
Prélèvements négatifs
Prélèvements positifs
Colle de faïence
Sondage non amianté

Légende :

Plan de masse :

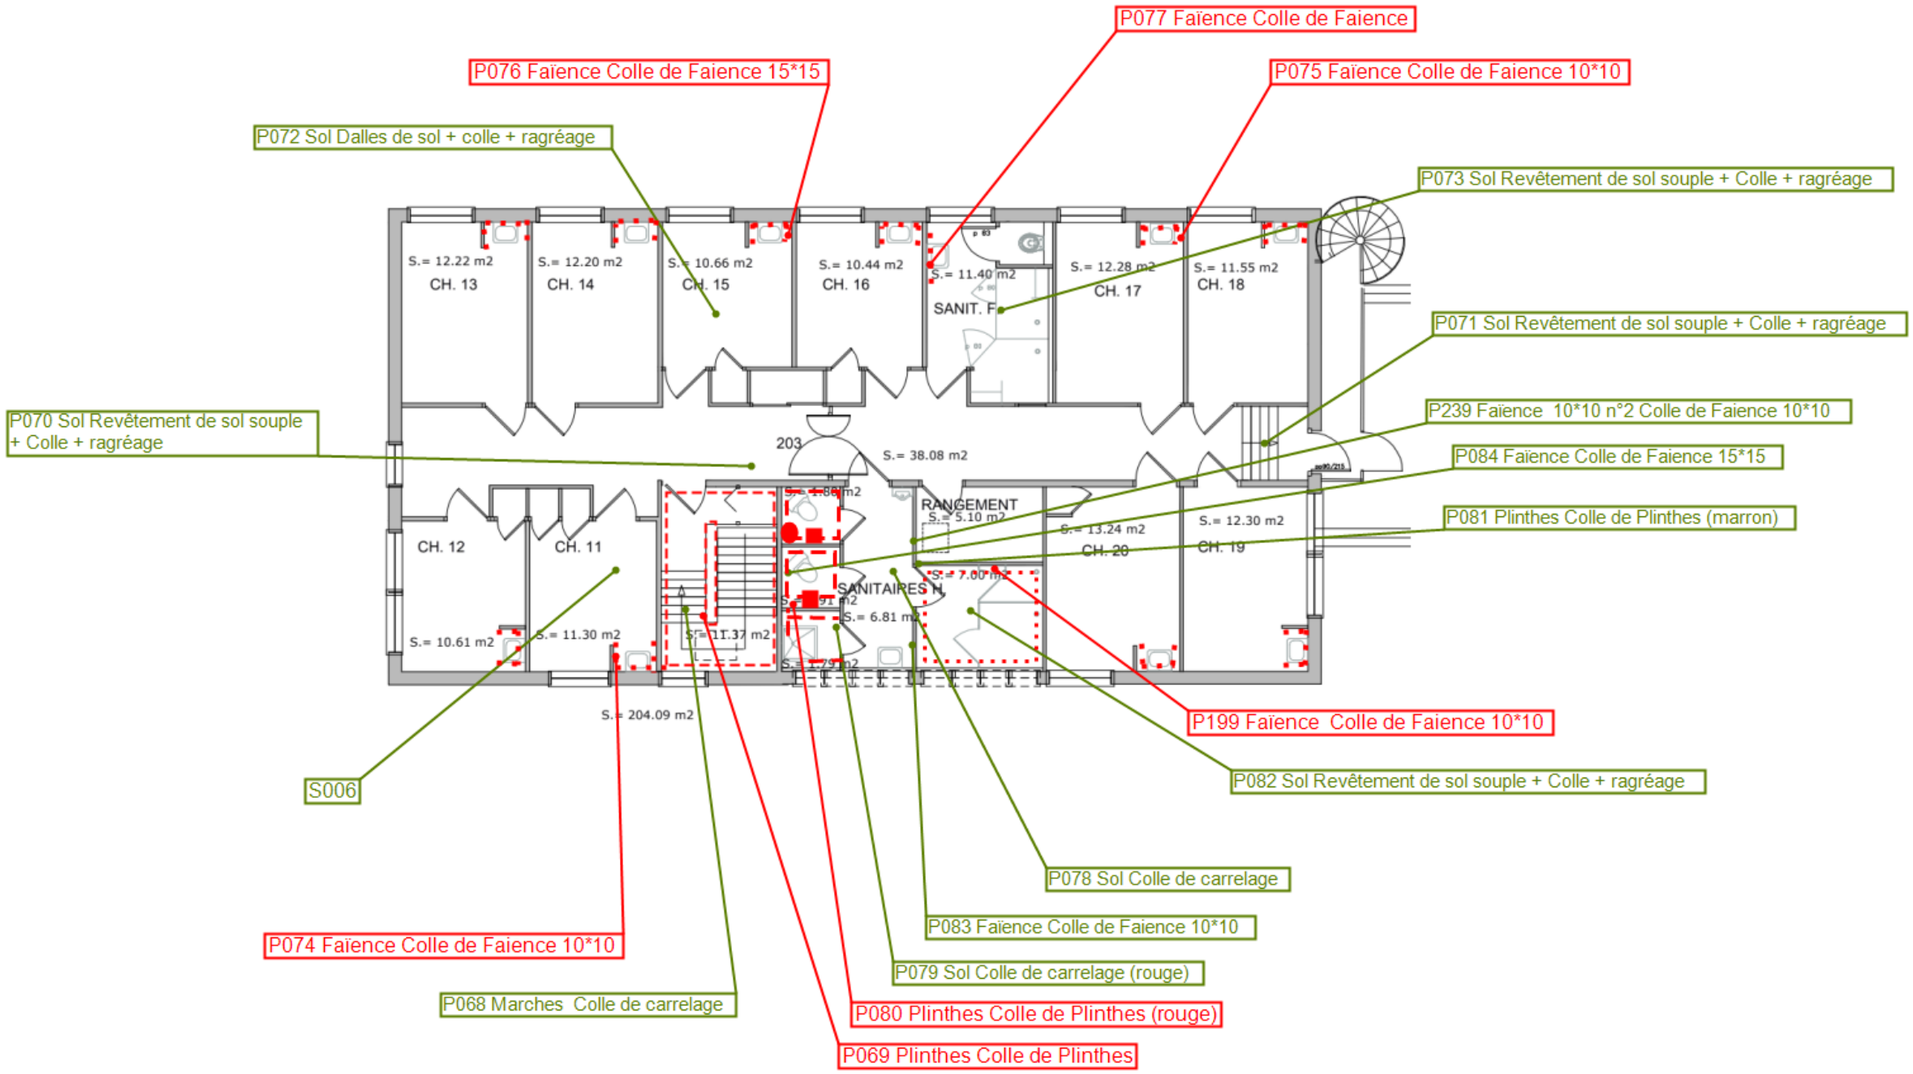


Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	6/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**R+1 3C**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :	1er	
Commentaire :		

Prélèvements négatifs
Prélèvements positifs
Colle de faïence
Colle de plinthe

Légende :

Plan de masse :

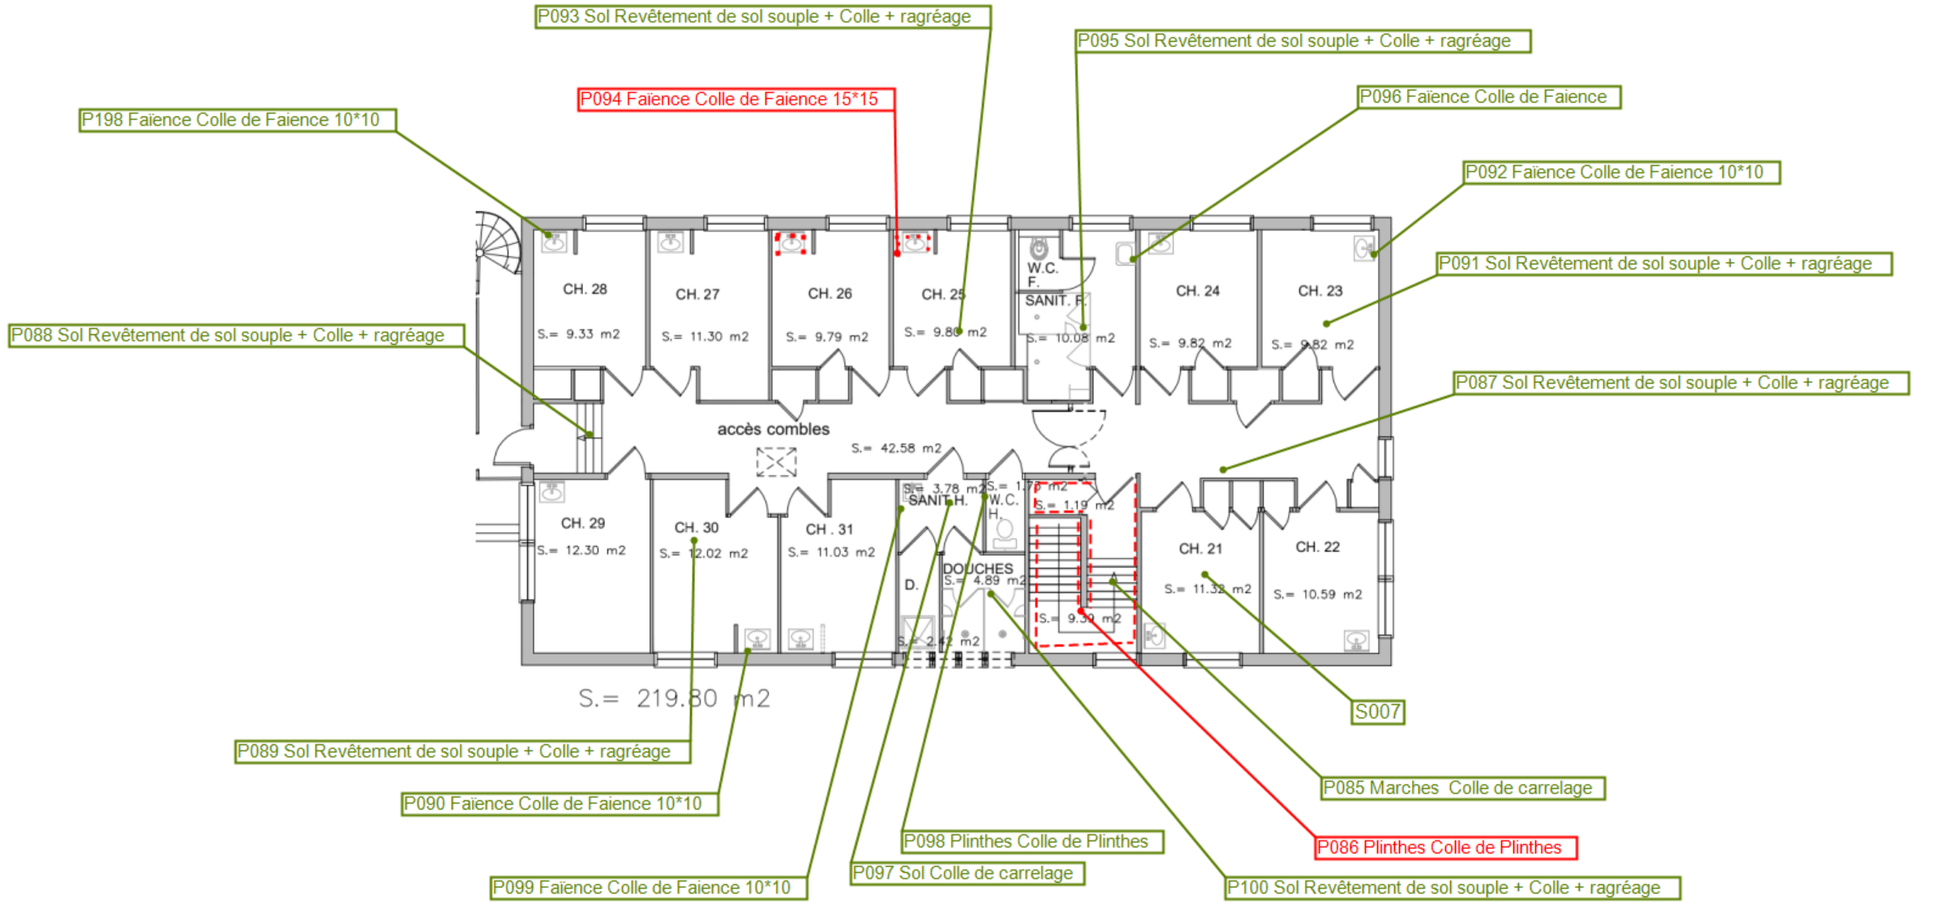

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	7/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**Sous-sol**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :	S/Sol	
Commentaire :		

Prélèvements négatifs

Enduit "type plâtre" entre le plâtre de la cloison et le pourtour des dormants bois des fenêtres.

Légende :

Plan de masse :

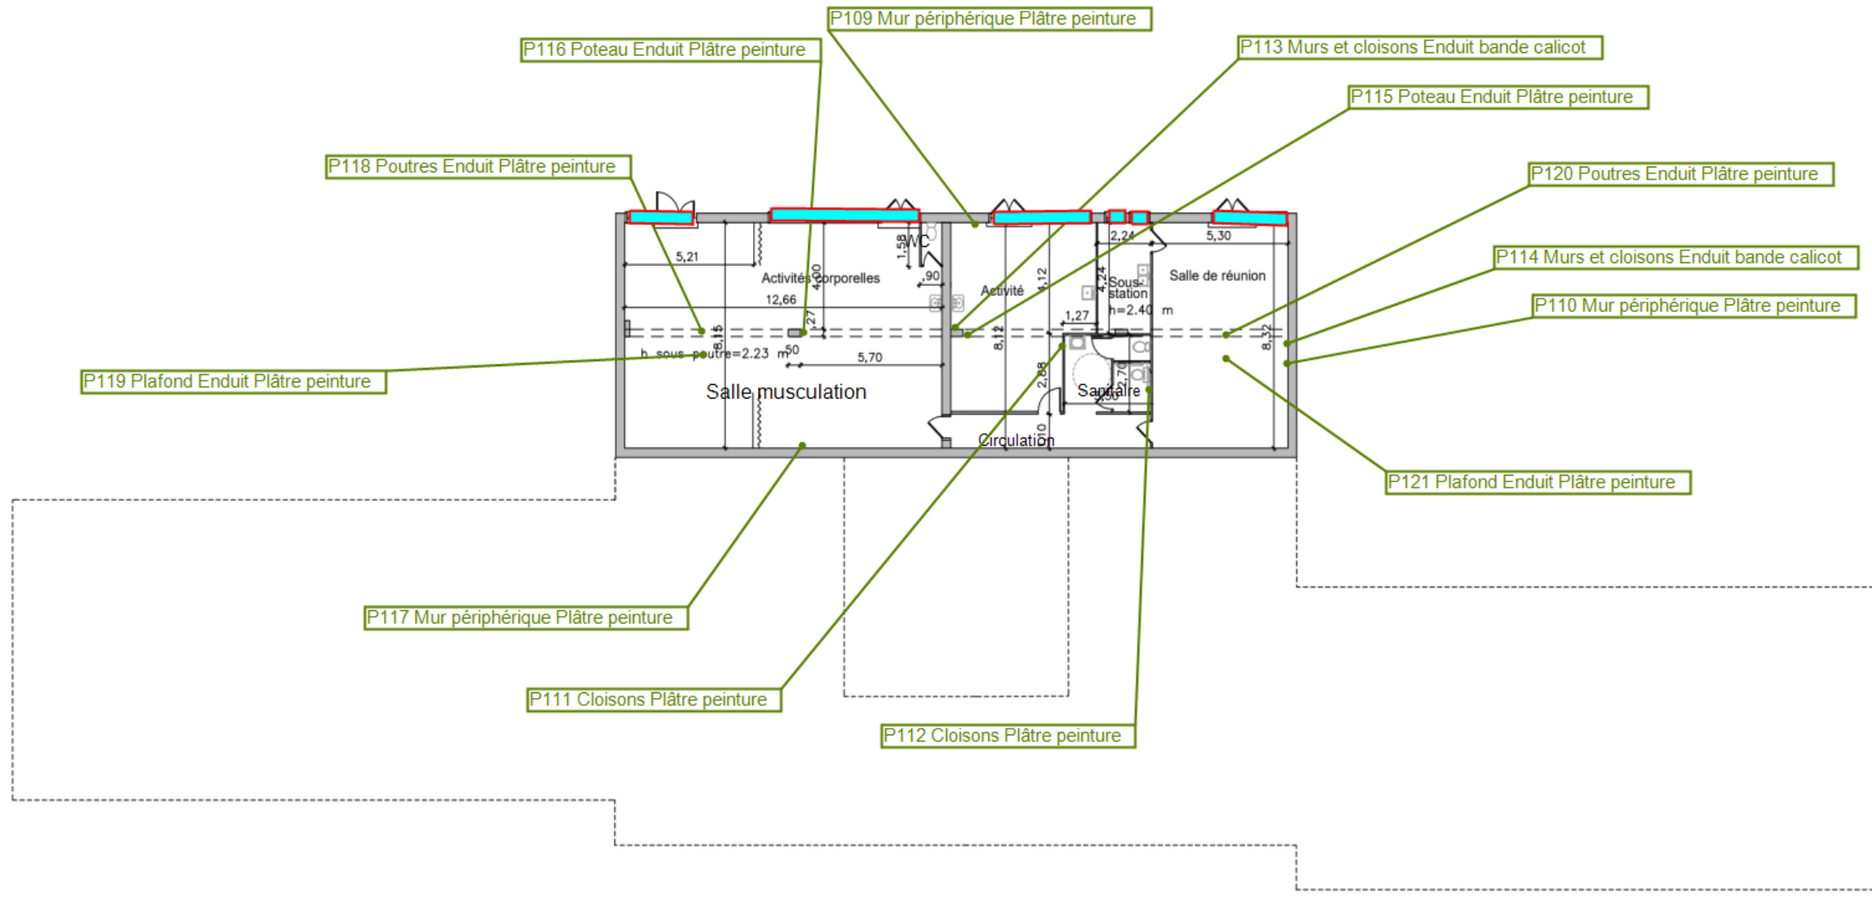

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	8/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**RDC 3D (Murs et Plafonds)**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :	RDC	
Commentaire :		

Prélèvements négatifs

Prélèvements positifs

Panneaux collés


Revêtement de mur "Tapisserie peinture"

(platre négatif)

Enduit "type plâtre" entre le plâtre de la cloison et le pourtour des dormants bois des fenêtres.

Légende :

Plan de masse :

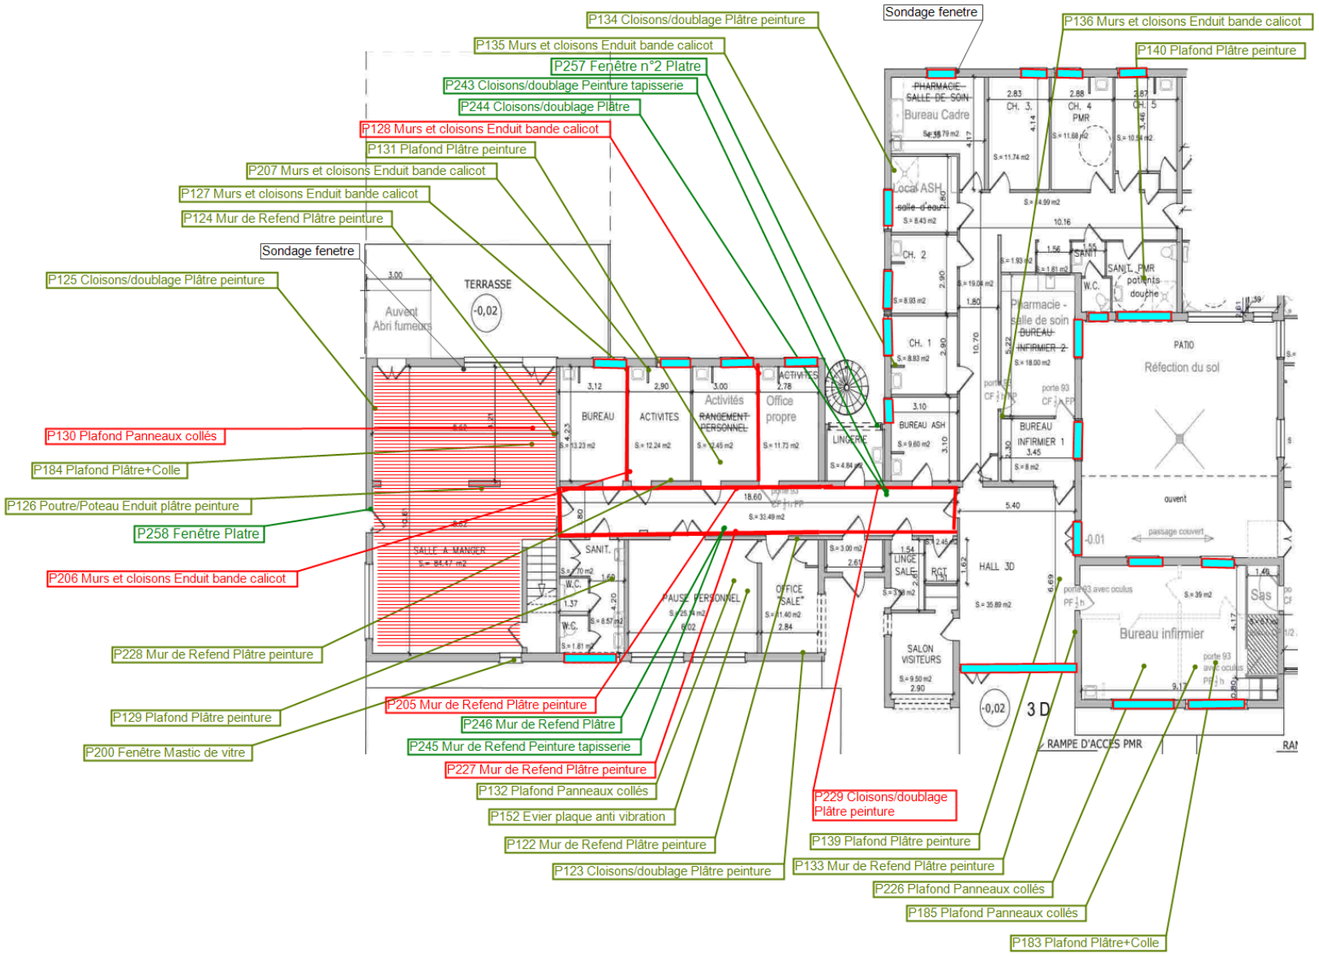

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	9/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**RDC 3C (Murs et Plafonds)**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :	RDC	
Commentaire :		

Prélèvements négatifs
Prélèvements positifs
Revêtement de mur "Tapisserie peinture"

(platre négatif)
Enduit "type plâtre" entre le plâtre de la cloison et le pourtour des dormants bois des fenêtres.

Légende :

Plan de masse :

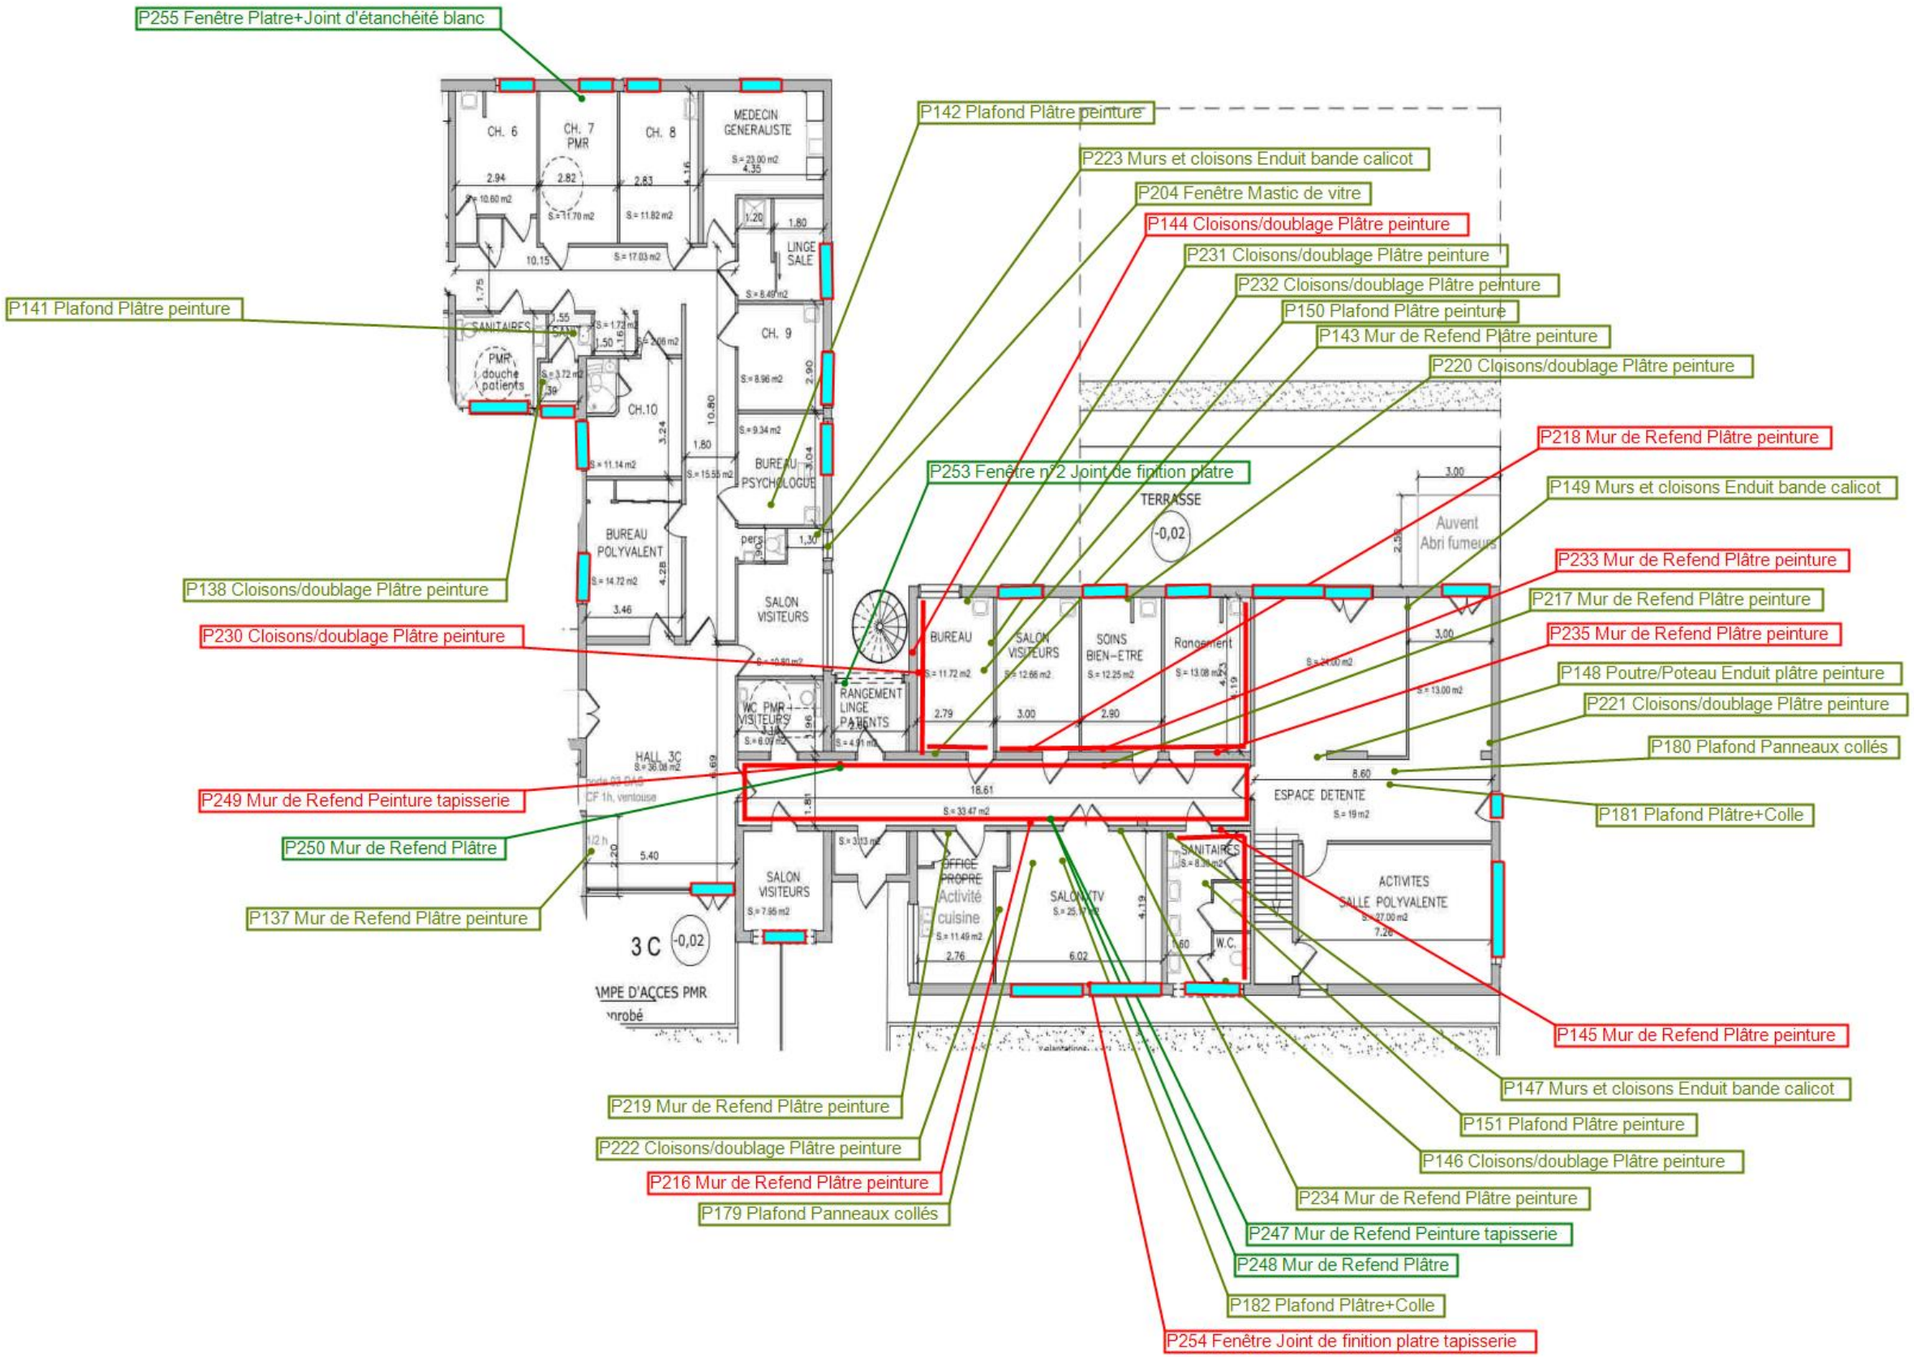


Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	10/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**1er étage 3D (Murs et**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :	1er	
Commentaire :		

Prélèvements négatifs
Prélèvements positifs
Revêtement de plafond
Enduit "type plâtre" entre le plâtre de la cloison et le pourtour des dormants bois des fenêtres.
Revêtement de mur "Tapisserie peinture"
(platre négatif)

Légende :

Plan de masse :

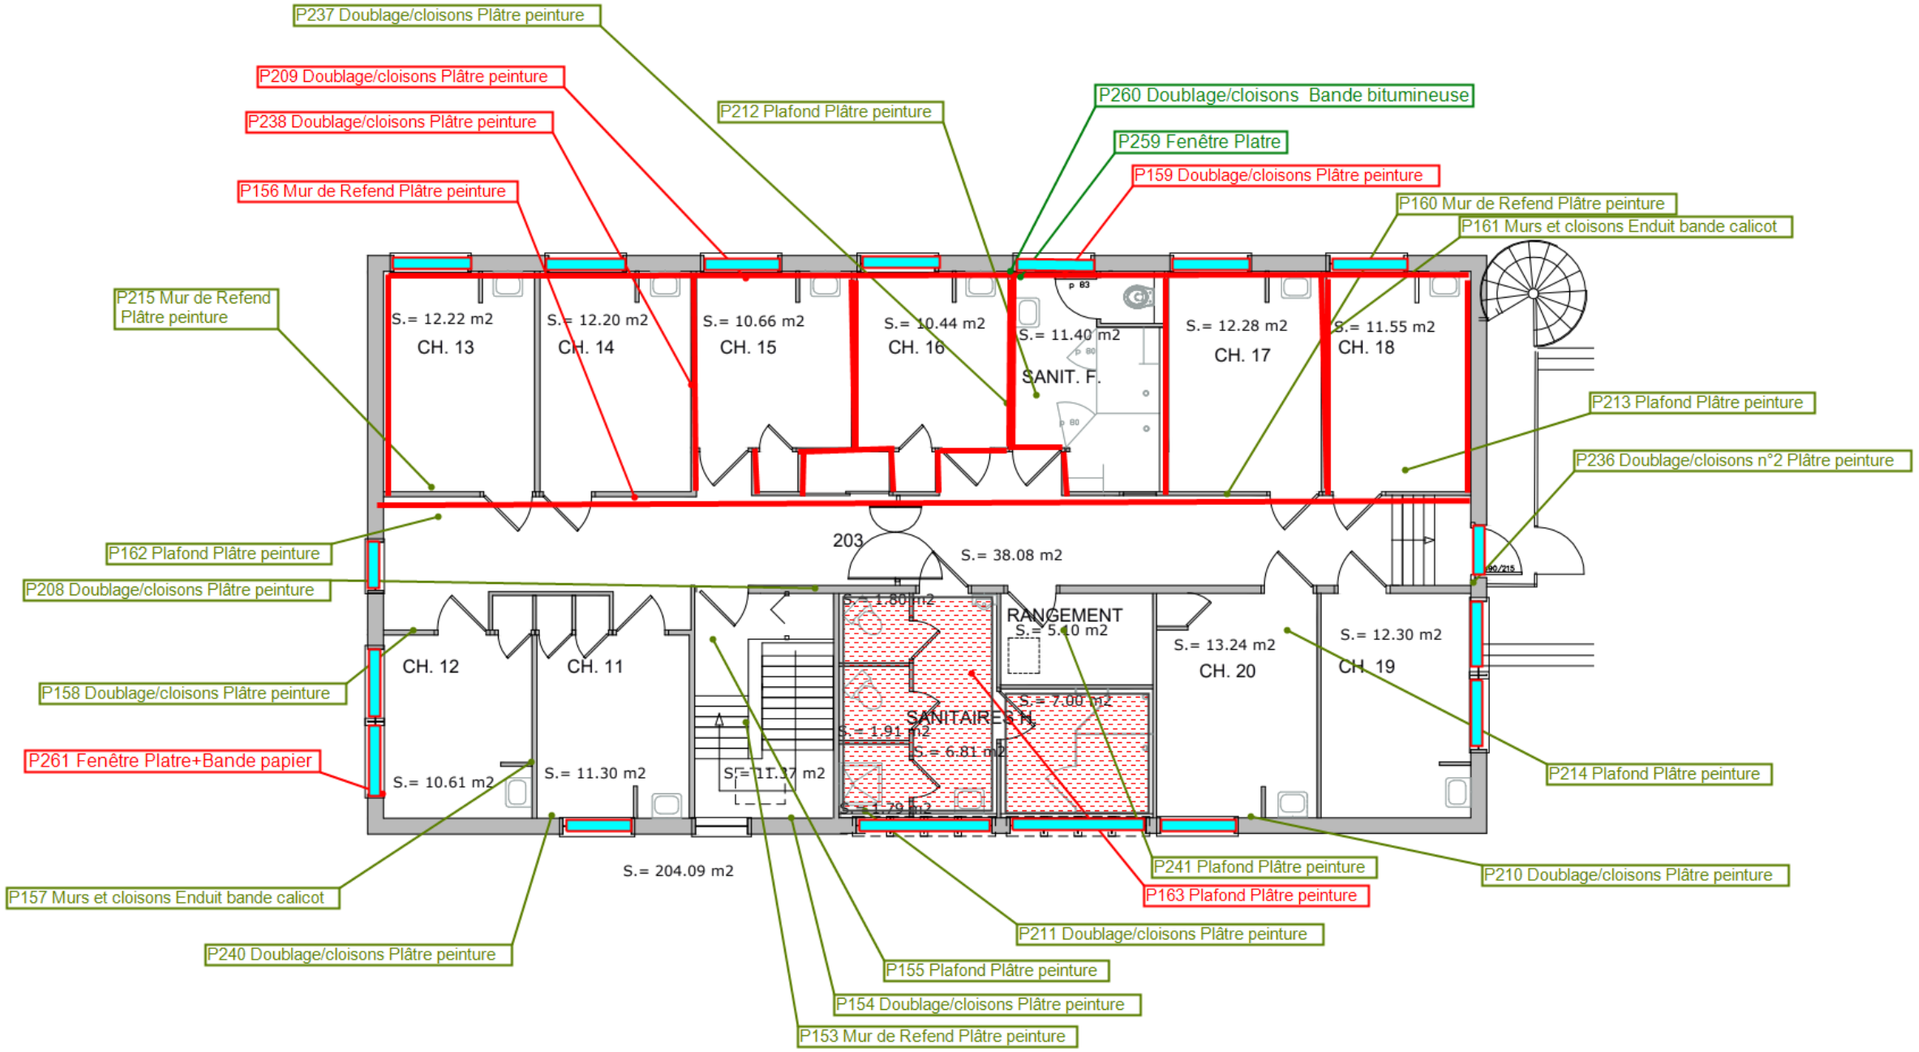


Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	11/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**1er étage 3C (Murs et**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :	1er	
Commentaire :		

Prélèvements négatifs
Prélèvements positifs
Enduit "type plâtre" entre le plâtre de la cloison et le pourtour des dormants bois des fenêtres.

Légende :

Plan de masse :

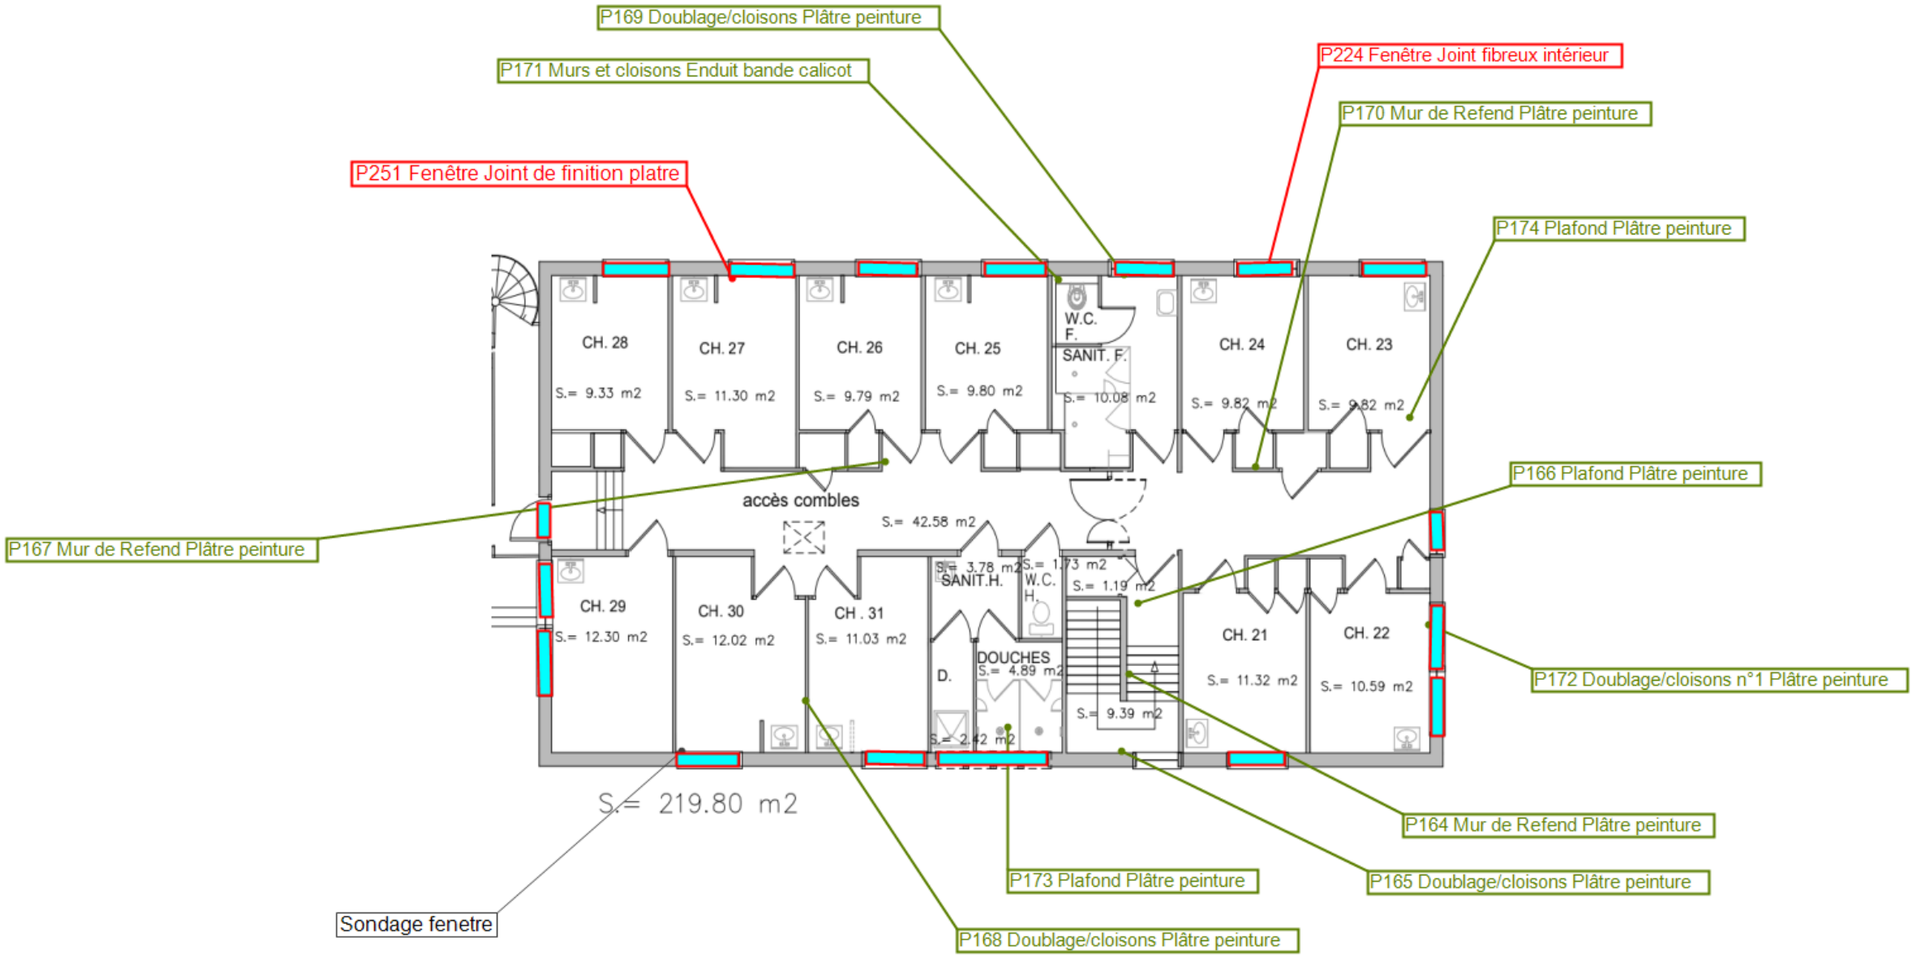


Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	12/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**Sous-sol**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Conduit en amiante ciment

Légende :

Plan de masse :

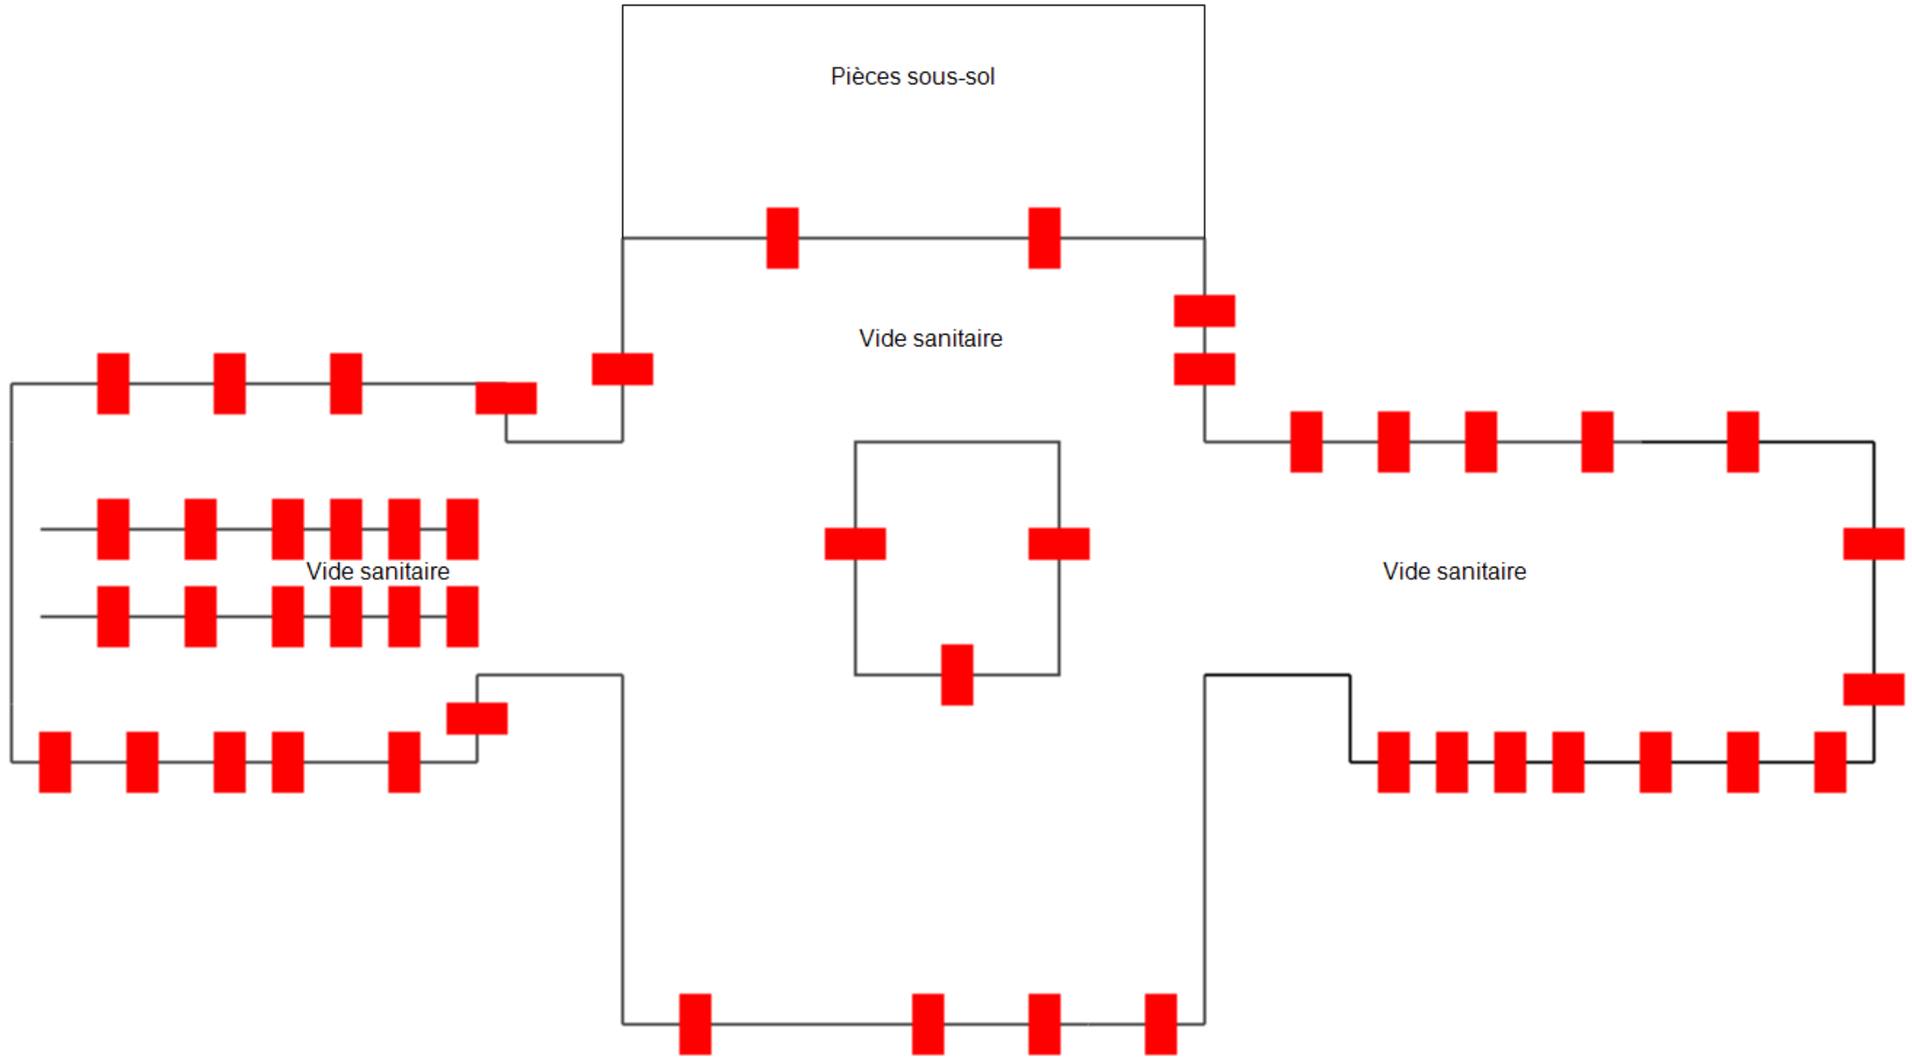

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN


SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108187 EPSM Morbihan	
N° planche :	13/13	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	**Combles**	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :	2ème	
Commentaire :		

Conduit en amiante ciment

Légende :

Plan de masse :

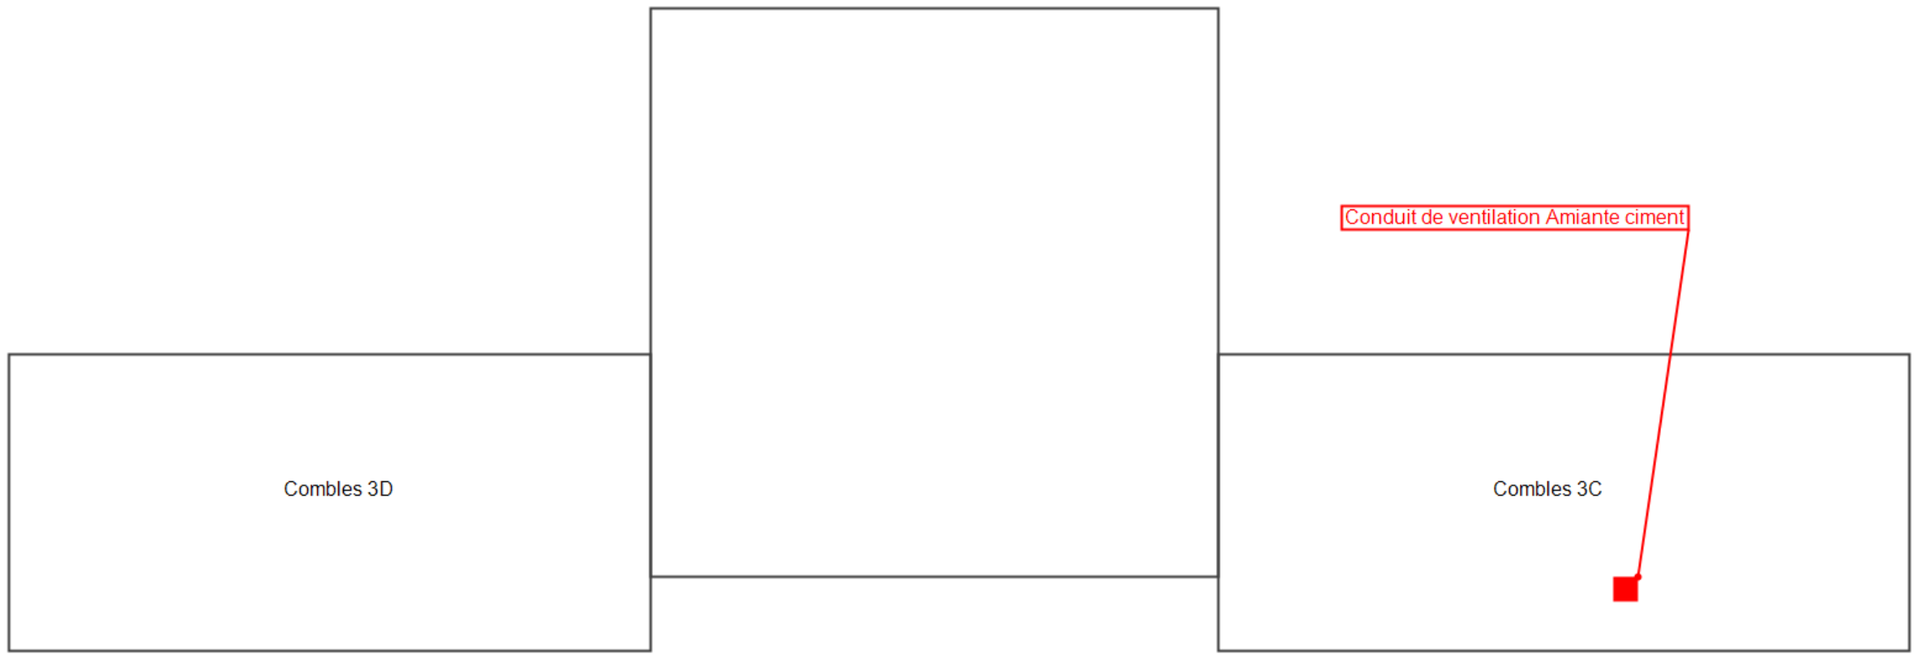

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.2971654.0

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-42360 EN DATE DU 02/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0723-42360 Réf. Commande Client : 39847 EPSM Morbihan 27.07.23--2762--6511--1320-140002625

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 31/07/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P001 - Calorifugeage - 1er SS - Local n°2 - Toutes zones - Conduit de fluide		Réf échantillon ITGA : IT072307-40794 Description ITGA : **Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Matériau fibreux orange**	
Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau fibreux orange	MOLP + META (A) le 02/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P002 - Calorifugeage - 1er SS - Salle musculation - Toutes zones - Conduit de fluide		Réf échantillon ITGA : IT072307-40796 Description ITGA : **Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Matériau fibreux orange / Peinture**	
Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau fibreux orange + Peinture non séparable	MOLP + META (A) le 02/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-42360 EN DATE DU 02/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Céline BLIN Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3424457.0

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT 44 (EX IM - NANTES) Le Grand large 5 rue de St Nazaire 44800 SAINT HERBLAIN	Réf. Commande ITGA : IT0725-15559 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--45-182002677

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26036	
Réf échantillon client : P001 - Colle de carrelage - RDC - Hall 3D - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène non séparable + Joint cassant gris hétérogène non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26037	
Réf échantillon client : P002 - Colle de Plinthes - RDC - Hall 3D - Extérieur - Plinthes		Description ITGA : Matériau compact beige / Colle noire / Peintures multiples en faible quantité en vrac	
Matériau compact beige non séparable + Colle noire non séparable + Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26038	
Réf échantillon client : P003 - Colle de Plinthes - RDC - Hall 3D - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Carrelage / Colle grise hétérogène	
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Colle grise hétérogène non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26039	
Réf échantillon client : P004 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Salon visiteur - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26040	
Réf échantillon client : P005 - Colle de Plinthes - RDC - Salon visiteur - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26041	
Réf échantillon client : P006 - Colle de Faience - RDC - Salon visiteur - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26042	
Réf échantillon client : P007 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Couloir n°1 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau compact gris	
▸ Revêtement souple rouge	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Peinture + Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26043	
Réf échantillon client : P008 - Colle de carrelage - RDC - Linge salle - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26044	
Réf échantillon client : P009 - Colle de carrelage - RDC - Office - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26045	
Réf échantillon client : P010 - Colle de Faïence - RDC - Office - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant beige en faible quantité	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26046	
Réf échantillon client : P011 - Colle de Plinthes - RDC - Office - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26047	
Réf échantillon client : P012 - Colle de carrelage - RDC - Salle pause - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène + Joint cassant gris en vrac	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26048	
Réf échantillon client : P013 - Colle de Plinthes - RDC - Salle pause - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26049	
Réf échantillon client : P014 - Colle de Faience - RDC - Salle pause - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc	
▸ Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26050	
Réf échantillon client : P015 - Revêtement de sol souple + Colle - RDC - Sanitaires n°1 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26051	
Réf échantillon client : P016 - Colle de Plinthes - RDC - Sanitaires n°1 - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Matériau souple incolore / Carrelage / Colle blanche avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple incolore non séparable	META (B) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche avec couche cartonnée	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SSH
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26052	
Réf échantillon client : P017 - Colle de Faïence - RDC - Sanitaires n°1 - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26053	
Réf échantillon client : P018 - Colle de carrelage - RDC - Salle à Manger - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Peinture non séparable + Joint cassant gris en vrac	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26056	
Réf échantillon client : P019 - Colle de Plinthes - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise / Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
▸ Peintures multiples non séparable + Colle grise non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26057	
Réf échantillon client : P020 - Dalles de sol + colle + ragréage - RDC - Activités - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple marron	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26058	
Réf échantillon client : P021 - Colle de Faience - RDC - Activités - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée	
Peintures multiples non séparable + Colle grise avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SSH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26059	
Réf échantillon client : P022 - Colle de Faience - RDC - Office propre - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc	
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SSH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26060	
Réf échantillon client : P023 - Colle de Plinthes - RDC - Office propre - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche + Joint cassant gris	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26061	
Réf échantillon client : P024 - Colle de Plinthes - RDC - Lingerie - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Matériau compact gris hétérogène / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
Peinture non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26062	
Réf échantillon client : P025 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Couloir n°2 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple rouge	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26063	
Réf échantillon client : P026 - Dalles de sol + colle + ragréage - RDC - Chambre n°1 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple marron	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26064	
Réf échantillon client : P027 - Colle de Faïence - RDC - Chambre n°1 - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26065	
Réf échantillon client : P028 - Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage - RDC - Local ASH - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Revêtement souple bleu	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26066	
Réf échantillon client : P029 - Colle de Faïence - RDC - Local ASH - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH (4)
▸ Joint cassant blanc	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26067	
Réf échantillon client : P030 - Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage - RDC - Bureau cadre - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26068	
Réf échantillon client : P031 - Colle de Faience - RDC - Chambre n°5 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SSH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26069	
Réf échantillon client : P032 - Colle de carrelage - RDC - Sanitaires/WC 1 - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26070	
Réf échantillon client : P033 - Colle de Faience - RDC - Sanitaires/WC 1 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26071	
Réf échantillon client : P034 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Pharmacie - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26072	
Réf échantillon client : P035 - Colle de carrelage - RDC - Pharmacie - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26073	
Réf échantillon client : P036 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Bureau infirmier - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Matériau compact gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26074	
Réf échantillon client : P037 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Hall 3C - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26075	
Réf échantillon client : P038 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Bureau polyvalent - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple rouge	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26076	
Réf échantillon client : P039 - Colle de Faience - RDC - Sanitaire/WC 2 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige	
Peinture non séparable + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26077	
Réf échantillon client : P040 - Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage - RDC - Sanitaires PMR 2 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple bleu	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26078	
Réf échantillon client : P041 - Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage - RDC - Chambre n°6 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26079	
Réf échantillon client : P042 - Colle de Faïence - RDC - Chambre n°8 - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige	
Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26080	
Réf échantillon client : P043 - Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage - RDC - Médecin généraliste - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26081	
Réf échantillon client : P044 - Colle de Plinthes - RDC - Médecin généraliste - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris	
Carrelage	---	Non analysé	
‣ Colle beige non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26082	
Réf échantillon client : P045 - Colle de Faïence - RDC - Médecin généraliste - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples avec couche en toile	
Carrelage	---	Non analysé	
‣ Colle beige non séparable + Peintures multiples avec couche en toile non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26083	
Réf échantillon client : P046 - Colle de Faïence - RDC - Linge/Laverie - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
‣ Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste(s) : ATH / SSH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26084	
Réf échantillon client : P047 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Chambre n°9 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
‣ Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
‣ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26085	
Réf échantillon client : P048 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Bureau psychologue - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène	
‣ Revêtement souple bleu	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
‣ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15559 EN DATE DU 18/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26086	
Réf échantillon client : P049 - Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage - RDC - WC personnel - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26087	
Réf échantillon client : P050 - Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage - RDC - Salon visiteur 1 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3424458.0

itga
Innovateur en fiabilité
7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tel : 0230821209
www.itga.fr
aFEL
Made in France

Accréditation n° 1-6090
ilac-MRA
cofrac
ESSAIS
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15560 EN DATE DU 22/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT 44 (EX IM - NANTES) Le Grand large 5 rue de St Nazaire 44800 SAINT HERBLAIN	Réf. Commande ITGA : IT0725-15560 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--45-182002677

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26136	
Réf échantillon client : P051 - Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage - RDC - PMR Visiteurs - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26137	
Réf échantillon client : P052 - Colle de Faïence - RDC - PMR Visiteurs - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : **Peinture** / Carrelage / Colle beige / **Peinture** / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + (Peinture non séparable) + (Couche plâtreuse blanche)	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15560 EN DATE DU 22/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26138	
Réf échantillon client : P053 - Colle de carrelage - RDC - Rgt linge - Sol - Sol		Description ITGA : **Joint cassant gris** / Carrelage / Colle grise en faible quantité en vrac / Matériau compact gris hétérogène	
Joint cassant gris + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en faible quantité en vrac non séparable + (Matériau compact gris hétérogène)	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26139	
Réf échantillon client : P054 - Colle de Plinthes - RDC - Rgt linge - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Colle beige	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EOC
Couche plâtreuse blanche	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26140	
Réf échantillon client : P055 - Dalles de sol + colle + ragréage - RDC - Bureau - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Revêtement cassant noir / Colle polymère jaune / Bois sous forme de fibres	
▸ Revêtement cassant gris	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
▸ Revêtement cassant noir	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Bois sous forme de fibres	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26141	
Réf échantillon client : P056 - Colle de Faïence - RDC - Bureau - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche**	
Joint cassant blanc + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + (Couche plâtreuse blanche non séparable)	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15560 EN DATE DU 22/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26142	
Réf échantillon client : P057 - Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage - RDC - Soins - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère beige / Matériau blanc en faible quantité	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 19/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
▸ Colle polymère beige non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26143	
Réf échantillon client : P058 - Colle de carrelage - RDC - Espace détente - Sol - Sol		Description ITGA : **Joint cassant gris** / Carrelage / Colle grise / **Matériau compact gris en vrac**	
Joint cassant gris non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + (Matériau compact gris en vrac non séparable)	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26144	
Réf échantillon client : P059 - Colle de Plinthes - RDC - Espace détente - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : **Joint cassant gris en faible quantité** / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche**	
Joint cassant gris en faible quantité + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + (Couche plâtreuse blanche non séparable)	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26145	
Réf échantillon client : P060 - Colle de faience 15*15 - RDC - Sanitaire - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche**	
Peinture en faible quantité + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + (Couche plâtreuse blanche non séparable)	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EOC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15560 EN DATE DU 22/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26146	
Réf échantillon client : P061 - Colle de faience 20*20 - RDC - Sanitaire - D - Faience		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / **Peinture** / **Carton**	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + (Peinture non séparable) + (Carton non séparable)	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26147	
Réf échantillon client : P062 - Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage - RDC - Sanitaire - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26148	
Réf échantillon client : P063 - Colle de Plinthes - RDC - Sanitaire - D - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26149	
Réf échantillon client : P064 - Colle de carrelage - RDC - Activité Cuisine - Sol - Sol		Description ITGA : **Joint cassant gris** / Carrelage / Colle grise	
Joint cassant gris + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26150	
Réf échantillon client : P065 - Colle de Plinthes - RDC - Activité Cuisine - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : **Joint cassant gris** / Carrelage / Colle beige / **Peinture** / **Couche plâtreuse blanche**	
Joint cassant gris + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + (Peinture non séparable) + (Couche plâtreuse blanche non séparable)	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-15560 EN DATE DU 22/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26151	
Réf échantillon client : P066 - Colle de faience 15*15 - RDC - Activité Cuisine - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche**	
Joint cassant blanc + Carrelage	---	Non analysé	
‣ Colle beige non séparable + (Couche plâtreuse blanche non séparable)	META (A) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-26152	
Réf échantillon client : P067 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Salon visiteurs 3 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
‣ Revêtement souple bleu	META (A) le 19/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC
‣ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (B) le 22/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couches(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3426960.0

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16161 EN DATE DU 24/04/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT 44 (EX IM - NANTES) Le Grand large 5 rue de St Nazaire 44800 SAINT HERBLAIN	Réf. Commande ITGA : IT0725-16161 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--46-170138481

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P068 - Colle de carrelage - RDC/1 étage - Escalier 3D - Sol - Marches		Réf échantillon ITGA : IT072504-31042 Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P069 - Colle de Plinthes - RDC/1 étage - Escalier 3D - Toutes zones - Plinthes		Réf échantillon ITGA : IT072504-31044 Description ITGA : Peintures multiples / Colle beige / Matériau noir en faible quantité en vrac	
Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Matériau noir en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16161 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P070 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Circulation 3D - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072504-31045 Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple rouge non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Revêtement souple beige	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P071 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Circulation 3D - Marches - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072504-31047 Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène	
Revêtement souple orange	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P072 - Dalles de sol + colle + ragréage - 1er - Chambre n°15 - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072504-31049 Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple rouge	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P073 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Sanitaires F 3D - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072504-31051 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16161 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31053	
Réf échantillon client : P074 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Chambre n°11 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée / Joint cassant blanc	
Peinture non séparable + Colle grise avec couche cartonnée non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYK (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31055	
Réf échantillon client : P075 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Chambre n°17 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Colle grise avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : LDA / RLP (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31056	
Réf échantillon client : P076 - Colle de Faience 15*15 - 1er - Chambre n°15 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31057	
Réf échantillon client : P077 - Colle de Faience - 1er - Sanitaires F 3D - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture non séparable + Colle beige non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31058	
Réf échantillon client : P078 - Colle de carrelage - 1er - Sanitaire H 3D - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16161 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31059	
Réf échantillon client : P079 - Colle de carrelage (rouge) - 1er - Sanitaire H 3D - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31060	
Réf échantillon client : P080 - Colle de Plinthes (rouge) - 1er - Sanitaire H 3D - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31061	
Réf échantillon client : P081 - Colle de Plinthes (marron) - 1er - Sanitaire H 3D - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant gris	
▸ Peinture non séparable + Colle grise en vrac hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31062	
Réf échantillon client : P082 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Sanitaire H 3D - Sol (douche) - Sol		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Revêtement souple bleu	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31063	
Réf échantillon client : P083 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Sanitaire H 3D - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16161 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31064	
Réf échantillon client : P084 - Colle de Faience 15*15 - 1er - Sanitaire H 3D - WC - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31065	
Réf échantillon client : P085 - Colle de carrelage - RDC/1 étage - Escalier 3C - Sol - Marches		Description ITGA : Peinture en vrac / Carrelage / Colle grise hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Colle grise hétérogène non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31066	
Réf échantillon client : P086 - Colle de Plinthes - RDC/1 étage - Escalier 3C - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31067	
Réf échantillon client : P087 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Circulation 3C - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple rouge	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31068	
Réf échantillon client : P088 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Circulation 3C - Marches - Sol		Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène	
Revêtement souple orange	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16161 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31069	
Réf échantillon client : P089 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Chambre n°30 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31070	
Réf échantillon client : P090 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Chambre n°30 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31071	
Réf échantillon client : P091 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Chambre n°23 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31072	
Réf échantillon client : P092 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Chambre n°23 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
▸ Peinture non séparable + Colle beige non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31073	
Réf échantillon client : P093 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Chambre n°25 - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16161 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31074	
Réf échantillon client : P094 - Colle de Faience 15*15 - 1er - Chambre n°25 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche	
▸ Peinture non séparable + Colle blanche non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31075	
Réf échantillon client : P095 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Sanitaire F 3C - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31077	
Réf échantillon client : P096 - Colle de Faience - 1er - Sanitaire F 3C - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31078	
Réf échantillon client : P097 - Colle de carrelage - 1er - Sanitaires H 3C - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène non séparable + Joint cassant non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31081	
Réf échantillon client : P098 - Colle de Plinthes - 1er - Sanitaires H 3C - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16161 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31083	
Réf échantillon client : P099 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Sanitaires H 3C - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : AHZ (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31085	
Réf échantillon client : P100 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Sanitaires H 3C - Sol (douche) - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31088	
Réf échantillon client : P101 - Colle de carrelage - S/Sol - Salle musculation - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène + Joint cassant gris en vrac	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31089	
Réf échantillon client : P102 - Colle de carrelage - S/Sol - Salle musculation - Marches - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31090	
Réf échantillon client : P103 - Colle de Plinthes - S/Sol - Salle musculation - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Colle beige hétérogène non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16161 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31091	
Réf échantillon client : P104 - Colle de Faïence - S/Sol - Salle musculation - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31093	
Réf échantillon client : P105 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - S/Sol - Activité - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31095	
Réf échantillon client : P106 - Colle de Faïence - S/Sol - Activité - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Peinture en faible quantité avec couche en toile	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche non séparable + Peinture en faible quantité avec couche en toile non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31097	
Réf échantillon client : P107 - plaque anti vibration - S/Sol - Activité - Toutes zones - Evier		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
▸ Matériau bitumineux noir	META (B) le 23/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-31099	
Réf échantillon client : P108 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - S/Sol - Sanitaire sous-sol - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16161 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P109 - Plâtre peinture - S/Sol - Activité - Toutes zones - Mur périphérique		Réf échantillon ITGA : IT072504-31101 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P110 - Plâtre peinture - S/Sol - Salle réunion - Toutes zones - Mur périphérique		Réf échantillon ITGA : IT072504-31102 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau compact beige	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P111 - Plâtre peinture - S/Sol - Activité - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-31104 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau compact beige hétérogène	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 23/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P112 - Plâtre peinture - S/Sol - Sanitaire sous-sol - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-31107 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact beige en vrac hétérogène	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P113 - Enduit bande calicot - S/Sol - Activité - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-31108 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16161 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P114 - Enduit bande calicot - S/Sol - Salle réunion - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-31110 Description ITGA : Papiers peints avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Papiers peints avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P115 - Enduit Plâtre peinture - S/Sol - Activité - Toutes zones - Poteau		Réf échantillon ITGA : IT072504-31113 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P116 - Enduit Plâtre peinture - S/Sol - Salle musculation - Toutes zones - Poteau		Réf échantillon ITGA : IT072504-31115 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact beige en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit compact beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 23/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P117 - Plâtre peinture - S/Sol - Salle musculation - Toutes zones - Mur périphérique		Réf échantillon ITGA : IT072504-31117 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 23/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Vincent GEFFROY Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

E.25535049.0.PDF

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072504-31171 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ELIBAT 44 (EX IM - NANTES)
Jean Christian PELE
Le Grand large 5 rue de St Nazaire
44800 SAINT HERBLAIN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0725-16162
Echantillon ITGA : IT072504-31171
Reçu au laboratoire le : 22/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--46-170138481
Dossier client	EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ
Echantillon	P118 - Enduit Plâtre peinture - S/Sol - Salle musculation - Plafond - Poutres

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SYK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Vincent GEFFROY Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

E.25535050.0.PDF

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072504-31172 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ELIBAT 44 (EX IM - NANTES)
Jean Christian PELE
Le Grand large 5 rue de St Nazaire
44800 SAINT HERBLAIN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0725-16162
Echantillon ITGA : IT072504-31172
Reçu au laboratoire le : 22/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--46-170138481
Dossier client	EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ
Echantillon	P119 - Enduit Plâtre peinture - S/Sol - Salle musculation - Plafond - Plafond
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Vincent GEFFROY Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

E.25535051.0.PDF

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072504-31173 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ELIBAT 44 (EX IM - NANTES)
Jean Christian PELE
Le Grand large 5 rue de St Nazaire
44800 SAINT HERBLAIN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0725-16162
Echantillon ITGA : IT072504-31173
Reçu au laboratoire le : 22/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--46-170138481
Dossier client	EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ
Echantillon	P120 - Enduit Plâtre peinture - S/Sol - Salle réunion - Plafond - Poutres

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Vincent GEFFROY Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

E.25535052.0.PDF

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Innovateur en fiabilité

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072504-31174 EN DATE DU 24/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ELIBAT 44 (EX IM - NANTES)
Jean Christian PELE
Le Grand large 5 rue de St Nazaire
44800 SAINT HERBLAIN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0725-16162
Echantillon ITGA : IT072504-31174
Reçu au laboratoire le : 22/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--46-170138481
Dossier client	EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ
Echantillon	P121 - Enduit Plâtre peinture - S/Sol - Salle réunion - Plafond - Plafond

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Vincent GEFFROY Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3429298.0

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

AFEL
Made in France

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

ilac-MRA

cofrac
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-16591 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--48-173432851

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P122 - Plâtre peinture - RDC - Office - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35928 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P123 - Plâtre peinture - RDC - Office - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35929 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P124 - Plâtre peinture - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35930 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P125 - Plâtre peinture - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35931 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P126 - Enduit plâtre peinture - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Poutre/Poteau		Réf échantillon ITGA : IT072504-35932 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P127 - Enduit bande calicot - RDC - Bureau - CD - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35933 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : AHZ (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P128 - Enduit bande calicot - RDC - Activités (ex rgt personnel) - D - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35934 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P129 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaires n°1 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35935 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P130 - Panneaux collés - RDC - Salle à Manger - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35936 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau fibreux blanc / Colle polymère jaune	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau fibreux blanc + Colle polymère jaune non séparable	MOLP + META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Trémolite	Analyste : DMI (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P131 - Plâtre peinture - RDC - Activités (ex rgt personnel) - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35937 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P132 - Panneaux collés - RDC - Salle pause - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35938 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P133 - Plâtre peinture - RDC - Hall 3D - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35939 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FTM (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P134 - Plâtre peinture - RDC - Local ASH - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35940 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P135 - Enduit bande calicot - RDC - Chambre n°1 - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35941 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FTM (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P136 - Enduit bande calicot - RDC - Pharmacie - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35942 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P137 - Plâtre peinture - RDC - Hall 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35943 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P138 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire/WC 2 - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35944 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P139 - Plâtre peinture - RDC - Hall 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35945 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P140 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaires PMR 1 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35946 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P141 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire/WC 2 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35947 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P142 - Plâtre peinture - RDC - Bureau psychologue - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35948 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P143 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35949 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P144 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35950 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P145 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35951 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P146 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire 3C - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35952 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : PES (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P147 - Enduit bande calicot - RDC - Sanitaire 3C - D - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35953 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
‣ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P148 - Enduit plâtre peinture - RDC - Espace détente - Toutes zones - Poutre/Poteau		Réf échantillon ITGA : IT072504-35954 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : AHZ (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P149 - Enduit bande calicot - RDC - Espace détente - D - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35955 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
‣ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P150 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35956 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P151 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire 3C - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35957 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P152 - plaque anti vibration - RDC - Salle pause - Toutes zones - Evier		Réf échantillon ITGA : IT072504-35958 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
‣ Matériau bitumineux noir	META (B) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P153 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3D - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35959 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P154 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35960 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P155 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35961 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P156 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3D - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35962 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FTM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P157 - Enduit bande calicot - 1er - Chambre n°12 - B - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35963 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P158 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°12 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35964 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P159 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaires F 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35965 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P160 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°17 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35966 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P161 - Enduit bande calicot - 1er - Chambre n°18 - B - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35967 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P162 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35968 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P163 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaire H 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35969 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P164 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35970 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
▸ Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P165 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3C - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35971 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P166 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3C - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35972 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P167 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35973 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P168 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°31 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35974 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P169 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaire F 3C - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35975 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P170 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°24 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35976 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
• Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P171 - Enduit bande calicot - 1er - Sanitaire F 3C - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35977 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier	
• Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3429299.0

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16592 EN DATE DU 29/04/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-16592 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--48-173432851

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P172 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°22 - Toutes zones - Doublage/cloisons n°1		Réf échantillon ITGA : IT072504-36017 Description ITGA : **Papier peint** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P173 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaires H 3C - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-36018 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16592 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P174 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°23 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-36019 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P175 - Fibrociment - Façade - Façade - Conduit de fluide		Réf échantillon ITGA : IT072504-36020 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles / **Peinture**	
‣ Fibrociment gris avec fibres visibles + Peinture non séparable	MOLP le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MKP (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3431570.0

itga
Innovateur en fiabilité
3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA
cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-17038 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--49-170113726

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P176 - Revêtement bitumineux - 2ème - Toiture - Toiture - Toiture (centrale) n°1		Réf échantillon ITGA : IT072504-40257 Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec fibres	
Revêtement bitumineux noir avec fibres	META (B) le 30/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P177 - Remontée bitumineuse - 2ème - Toiture - Toiture - Toiture (centrale) n°2		Réf échantillon ITGA : IT072504-40258 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec fibres	
Matériau bitumineux noir avec fibres	META (B) le 30/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40259	
Réf échantillon client : P178 - Joint de dilatation - Façade - Toutes zones - Façade		Description ITGA : Poussières / Matériau souple beige	
Poussières	---	Non analysé	
▸ Matériau souple beige	META (B) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40260	
Réf échantillon client : P179 - Panneaux collés - RDC - Salon / TV - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Colle jaune / Matériau plâtreux blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Peinture non séparable + Colle jaune	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
▸ Matériau plâtreux blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40261	
Réf échantillon client : P180 - Panneaux collés - RDC - Espace détente - Plafond - Plafond		Description ITGA : Colle jaune / Polystyrène expansé (billes) / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac	
▸ Colle jaune non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Peinture en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Polystyrène expansé (billes)	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40262	
Réf échantillon client : P181 - Plâtre+Colle - RDC - Espace détente - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40263	
Réf échantillon client : P182 - Plâtre+Colle - RDC - Salon / TV - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40264	
Réf échantillon client : P183 - Plâtre+Colle - RDC - Bureau infirmier - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Polystyrène expansé (billes)	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)
Polystyrène expansé (billes)	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40265	
Réf échantillon client : P184 - Plâtre+Colle - RDC - Salle à Manger - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40266	
Réf échantillon client : P185 - Panneaux collés - RDC - Bureau infirmier - Plafond - Plafond		Description ITGA : Colle jaune / Polystyrène expansé (billes) blanc / Matériau plâtreux blanc / **Peinture**	
▸ Colle jaune + Matériau plâtreux blanc non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Polystyrène expansé (billes) blanc	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40267	
Réf échantillon client : P186 - Colle de Faïence - RDC - Sanitaires PMR 1 - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40268	
Réf échantillon client : P187 - Colle de plinthes (noire) - RDC - Local élec (3D) - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
▸ Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40269	
Réf échantillon client : P188 - Colle de Plinthes - RDC - Hall 3C - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40270	
Réf échantillon client : P189 - Colle de Plinthes - RDC - Linge/Laverie - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40271	
Réf échantillon client : P190 - Colle de plinthes (noire) - RDC - Local élec 3C - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
Peinture	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Joint cassant gris	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40272	
Réf échantillon client : P191 - Colle de plinthes (noire) - RDC - Salon / TV - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40273	
Réf échantillon client : P192 - Colle de Faience - RDC - Bureau - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40274	
Réf échantillon client : P193 - Colle de faience 10*10 - RDC - Chambre n°4 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40275	
Réf échantillon client : P194 - Colle de faience 10*10 - RDC - Bureau psychologue - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40276	
Réf échantillon client : P195 - Colle de Faïence - RDC - Salon visiteurs 3 - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40277	
Réf échantillon client : P196 - plaque anti vibration - RDC - Salon visiteurs 3 - Toutes zones - Evier		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple	
Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 30/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40278	
Réf échantillon client : P197 - Colle de faience 10*10 - RDC - Soins - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture + Colle beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40279	
Réf échantillon client : P198 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Chambre n°28 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige	
Peinture + Joint cassant beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40280	
Réf échantillon client : P199 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Sanitaire H 3D - Douche - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40281	
Réf échantillon client : P200 - Mastic de vitre - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40282	
Réf échantillon client : P201 - Enduit ciment peinture - Façade - 3D - Mur de façade		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40283	
Réf échantillon client : P202 - Enduit ciment peinture - Façade - Centre - Mur de façade		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40284	
Réf échantillon client : P203 - Enduit ciment peinture - Façade - 3C - Mur de façade		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3434936.0

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649 EN DATE DU 06/05/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-17649 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--53-161057533

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/05/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P204 - Mastic de vitre - RDC - Salon visiteur 1 - Toutes zones - Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT072505-151 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige avec poussières	
(Peinture non séparable) + Matériau compact beige avec poussières non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P205 - Plâtre peinture - RDC - Couloir n°1 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-153 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649 EN DATE DU 06/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P206 - Enduit bande calicot - RDC - Activités - B - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-154 Description ITGA : **Peinture avec couche en toile** / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYK (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P207 - Enduit bande calicot - RDC - Activités - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-155 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : KSA / LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P208 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-156 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P209 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°15 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-157 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P210 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°20 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-158 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PES (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649 EN DATE DU 06/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P211 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaire H 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-159 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste(s) : AFE / PES (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P212 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaires F 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072505-160 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P213 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°18 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072505-161 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P214 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°20 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072505-162 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P215 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°13 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-163 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P216 - Plâtre peinture - RDC - Couloir n°4 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-164 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PDL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649 EN DATE DU 06/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P217 - Plâtre peinture - RDC - Couloir n°4 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-165 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PDL (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P218 - Plâtre peinture - RDC - Salon visiteur 2 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-166 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P219 - Plâtre peinture - RDC - Activité Cuisine - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-167 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P220 - Plâtre peinture - RDC - Soins - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072505-168 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Papier peint / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLP (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P221 - Plâtre peinture - RDC - Espace détente - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072505-169 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PDL (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P222 - Plâtre peinture - RDC - Salon / TV - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072505-170 Description ITGA : Peinture avec couche en mousse / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en mousse non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AFE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649 EN DATE DU 06/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P223 - Enduit bande calicot - RDC - Salon visiteur 1 - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-171 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
‣ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : OFP / FTM (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P224 - Joint fibreux intérieur - 1er - Chambre n°24 - Toutes zones - Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT072505-172 Description ITGA : Peinture avec couche fibreuse / Matériau beige en faible quantité en vrac	
‣ Peinture avec couche fibreuse + Matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : SYK (4)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couches(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3443994.0

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-19332 EN DATE DU 20/05/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-19332 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--58-182757167

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/05/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-14768	
Réf échantillon client : P225 - Colle de Faïence - RDC - Activités (ex rgt personnel) - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : **Peinture** / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche**	
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-14769	
Réf échantillon client : P226 - Panneaux collés - RDC - Bureau infirmier - Plafond - Plafond		Description ITGA : **Peinture** / Polystyrène / Colle polymère incolore en faible quantité avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Colle polymère incolore en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Polystyrène	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-19332 EN DATE DU 20/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-14770	
Réf échantillon client : P227 - Plâtre peinture - RDC - Couloir n°1 - Toutes zones - Mur de Refend		Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LYA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-14771	
Réf échantillon client : P228 - Plâtre peinture - RDC - Activités - Toutes zones - Mur de Refend		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-14772	
Réf échantillon client : P229 - Plâtre peinture - RDC - Couloir n°1 - Toutes zones - Cloisons/doublage		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFE (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-14773	
Réf échantillon client : P230 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Toutes zones - Cloisons/doublage		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-14774	
Réf échantillon client : P231 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Toutes zones - Cloisons/doublage		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-14775	
Réf échantillon client : P232 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Toutes zones - Cloisons/doublage		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-19332 EN DATE DU 20/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P233 - Plâtre peinture - RDC - Soins - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-14776 Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : AFE (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P234 - Plâtre peinture - RDC - Salon / TV - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-14777 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P235 - Plâtre peinture - RDC - Rgt - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-14778 Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFE (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P236 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons n°2		Réf échantillon ITGA : IT072505-14779 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P237 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°16 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-14780 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : ILM / AFE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-19332 EN DATE DU 20/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P238 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°14 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-14781 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ILM (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P239 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Sanitaire H 3D - Toutes zones - Faience 10*10 n°2		Réf échantillon ITGA : IT072505-14782 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Carrelage / Colle beige / Matériau gris hétérogène	
Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P240 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°11 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-14783 Description ITGA : **Peinture avec couche en toile** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P241 - Plâtre peinture - 1er - Rangement - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072505-14784 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P242 - Colle de faience 10*10 - RDC - Bureau ASH - Toutes zones - Faience		Réf échantillon ITGA : IT072505-14785 Description ITGA : **Peinture** / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche** / **Joint cassant beige en faible quantité**	
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant beige en faible quantité non séparable	META (A) le 20/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Carrelage	---	Non analysé	

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-19332 EN DATE DU 20/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Vincent GEFFROY Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3434936.0

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649 EN DATE DU 06/05/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-17649 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--53-161057533

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/05/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-151	
Réf échantillon client : P204 - Mastic de vitre - RDC - Salon visiteur 1 - Toutes zones - Fenêtre		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige avec poussières	
(Peinture non séparable) + Matériau compact beige avec poussières non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-153	
Réf échantillon client : P205 - Plâtre peinture - RDC - Couloir n°1 - Toutes zones - Mur de Refend		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649 EN DATE DU 06/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P206 - Enduit bande calicot - RDC - Activités - B - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-154 Description ITGA : **Peinture avec couche en toile** / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYK (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P207 - Enduit bande calicot - RDC - Activités - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-155 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : KSA / LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P208 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-156 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P209 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°15 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-157 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P210 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°20 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-158 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PES (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649 EN DATE DU 06/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P211 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaire H 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-159 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste(s) : AFE / PES (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P212 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaires F 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072505-160 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P213 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°18 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072505-161 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P214 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°20 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072505-162 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P215 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°13 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-163 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P216 - Plâtre peinture - RDC - Couloir n°4 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-164 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PDL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649 EN DATE DU 06/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P217 - Plâtre peinture - RDC - Couloir n°4 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-165 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PDL (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P218 - Plâtre peinture - RDC - Salon visiteur 2 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-166 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P219 - Plâtre peinture - RDC - Activité Cuisine - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-167 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P220 - Plâtre peinture - RDC - Soins - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072505-168 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Papier peint / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLP (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P221 - Plâtre peinture - RDC - Espace détente - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072505-169 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PDL (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P222 - Plâtre peinture - RDC - Salon / TV - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072505-170 Description ITGA : Peinture avec couche en mousse / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en mousse non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AFE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649 EN DATE DU 06/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P223 - Enduit bande calicot - RDC - Salon visiteur 1 - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-171 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
‣ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : OFP / FTM (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P224 - Joint fibreux intérieur - 1er - Chambre n°24 - Toutes zones - Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT072505-172 Description ITGA : Peinture avec couche fibreuse / Matériau beige en faible quantité en vrac	
‣ Peinture avec couche fibreuse + Matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : SYK (4)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couches(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3434936.1

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649/m1 EN DATE DU 19/05/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Ce rapport annule et remplace le rapport IT0725-17649 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-17649 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--53-161057533

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/05/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : **M** Résultat modifié depuis la version précédente **N** Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P204 - Mastic de vitre - RDC - Salon visiteur 1 - Toutes zones - Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT072505-151 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige avec poussières	
(Peinture non séparable) + Matériau compact beige avec poussières non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P205 - Plâtre peinture - RDC - Couloir n°1 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-153 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P206 - Enduit bande calicot - RDC - Activités - B - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-154 Description ITGA : **Peinture avec couche en toile** / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYK (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P207 - Enduit bande calicot - RDC - Activités - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-155 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : KSA / LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P208 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-156 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P209 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°15 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-157 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P210 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°20 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-158 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PES (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P211 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaire H 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-159 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste(s) : AFE / PES (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P212 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaires F 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072505-160 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P213 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°18 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072505-161 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P214 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°20 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072505-162 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P215 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°13 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-163 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P216 - Plâtre peinture - RDC - Couloir n°4 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072505-164/m1 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
M Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RLP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-165/m1	
Réf échantillon client : P217 - Plâtre peinture - RDC - Couloir n°4 - Toutes zones - Mur de Refend		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
M ‣ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-166/m1	
Réf échantillon client : P218 - Plâtre peinture - RDC - Salon visiteur 2 - Toutes zones - Mur de Refend		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
M ‣ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RLP (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-167	
Réf échantillon client : P219 - Plâtre peinture - RDC - Activité Cuisine - Toutes zones - Mur de Refend		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-168	
Réf échantillon client : P220 - Plâtre peinture - RDC - Soins - Toutes zones - Cloisons/doublage		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Papier peint / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture avec couche en toile non séparable + Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLP (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-169	
Réf échantillon client : P221 - Plâtre peinture - RDC - Espace détente - Toutes zones - Cloisons/doublage		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PDL (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-170	
Réf échantillon client : P222 - Plâtre peinture - RDC - Salon / TV - Toutes zones - Cloisons/doublage		Description ITGA : Peinture avec couche en mousse / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture avec couche en mousse non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AFE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17649/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P223 - Enduit bande calicot - RDC - Salon visiteur 1 - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072505-171 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : OFP / FTM (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P224 - Joint fibreux intérieur - 1er - Chambre n°24 - Toutes zones - Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT072505-172 Description ITGA : Peinture avec couche fibreuse / Matériau beige en faible quantité en vrac	
Peinture avec couche fibreuse + Matériau beige en faible quantité en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : SYK (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3431570.0

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-17038 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--49-170113726

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P176 - Revêtement bitumineux - 2ème - Toiture - Toiture - Toiture (centrale) n°1		Réf échantillon ITGA : IT072504-40257 Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec fibres	
Revêtement bitumineux noir avec fibres	META (B) le 30/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P177 - Remontée bitumineuse - 2ème - Toiture - Toiture - Toiture (centrale) n°2		Réf échantillon ITGA : IT072504-40258 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec fibres	
Matériau bitumineux noir avec fibres	META (B) le 30/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40259	
Réf échantillon client : P178 - Joint de dilatation - Façade - Toutes zones - Façade		Description ITGA : Poussières / Matériau souple beige	
Poussières	---	Non analysé	
▸ Matériau souple beige	META (B) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40260	
Réf échantillon client : P179 - Panneaux collés - RDC - Salon / TV - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Colle jaune / Matériau plâtreux blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Peinture non séparable + Colle jaune	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
▸ Matériau plâtreux blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40261	
Réf échantillon client : P180 - Panneaux collés - RDC - Espace détente - Plafond - Plafond		Description ITGA : Colle jaune / Polystyrène expansé (billes) / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac	
▸ Colle jaune non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Peinture en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Polystyrène expansé (billes)	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40262	
Réf échantillon client : P181 - Plâtre+Colle - RDC - Espace détente - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40263	
Réf échantillon client : P182 - Plâtre+Colle - RDC - Salon / TV - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40264	
Réf échantillon client : P183 - Plâtre+Colle - RDC - Bureau infirmier - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Polystyrène expansé (billes)	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)
Polystyrène expansé (billes)	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40265	
Réf échantillon client : P184 - Plâtre+Colle - RDC - Salle à Manger - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40266	
Réf échantillon client : P185 - Panneaux collés - RDC - Bureau infirmier - Plafond - Plafond		Description ITGA : Colle jaune / Polystyrène expansé (billes) blanc / Matériau plâtreux blanc / **Peinture**	
▸ Colle jaune + Matériau plâtreux blanc non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Polystyrène expansé (billes) blanc	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40267	
Réf échantillon client : P186 - Colle de Faïence - RDC - Sanitaires PMR 1 - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40268	
Réf échantillon client : P187 - Colle de plinthes (noire) - RDC - Local élec (3D) - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
▸ Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40269	
Réf échantillon client : P188 - Colle de Plinthes - RDC - Hall 3C - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40270	
Réf échantillon client : P189 - Colle de Plinthes - RDC - Linge/Laverie - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40271	
Réf échantillon client : P190 - Colle de plinthes (noire) - RDC - Local élec 3C - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
Peinture	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Joint cassant gris	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40272	
Réf échantillon client : P191 - Colle de plinthes (noire) - RDC - Salon / TV - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40273	
Réf échantillon client : P192 - Colle de Faïence - RDC - Bureau - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40274	
Réf échantillon client : P193 - Colle de faïence 10*10 - RDC - Chambre n°4 - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40275	
Réf échantillon client : P194 - Colle de faïence 10*10 - RDC - Bureau psychologue - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40276	
Réf échantillon client : P195 - Colle de Faïence - RDC - Salon visiteurs 3 - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
▸ Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40277	
Réf échantillon client : P196 - plaque anti vibration - RDC - Salon visiteurs 3 - Toutes zones - Evier		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple	
▸ Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 30/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40278	
Réf échantillon client : P197 - Colle de faience 10*10 - RDC - Soins - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
▸ Peinture + Colle beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40279	
Réf échantillon client : P198 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Chambre n°28 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige	
▸ Peinture + Joint cassant beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40280	
Réf échantillon client : P199 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Sanitaire H 3D - Douche - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40281	
Réf échantillon client : P200 - Mastic de vitre - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40282	
Réf échantillon client : P201 - Enduit ciment peinture - Façade - 3D - Mur de façade		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40283	
Réf échantillon client : P202 - Enduit ciment peinture - Façade - Centre - Mur de façade		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40284	
Réf échantillon client : P203 - Enduit ciment peinture - Façade - 3C - Mur de façade		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3431570.1

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038/m1 EN DATE DU 15/05/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Ce rapport annule et remplace le rapport IT0725-17038 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-17038 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--49-170113726

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : **M** Résultat modifié depuis la version précédente **N** Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40257	
Réf échantillon client : P176 - Revêtement bitumineux - 2ème - Toiture - Toiture - Toiture (centrale) n°1		Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec fibres	
Revêtement bitumineux noir avec fibres	META (B) le 30/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40258	
Réf échantillon client : P177 - Remontée bitumineuse - 2ème - Toiture - Toiture - Toiture (centrale) n°2		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec fibres	
Matériau bitumineux noir avec fibres	META (B) le 30/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038/m1 EN DATE DU 15/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40259	
Réf échantillon client : P178 - Joint de dilatation - Façade - Toutes zones - Façade		Description ITGA : Poussières / Matériau souple beige	
Poussières	---	Non analysé	
‣ Matériau souple beige	META (B) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40260	
Réf échantillon client : P179 - Panneaux collés - RDC - Salon / TV - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Colle jaune / Matériau plâtreux blanc / Matériau fibreux beige	
‣ Peinture non séparable + Colle jaune	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
‣ Matériau plâtreux blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40261/m1	
Réf échantillon client : P180 - Panneaux collés - RDC - Espace détente - Plafond - Plafond		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture / Matériau fibreux blanc	
M ‣ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 14/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (3)
M ‣ Matériau fibreux blanc	MOLP le 14/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / Aucune	Analyste : OOS
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40262	
Réf échantillon client : P181 - Plâtre+Colle - RDC - Espace détente - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40263	
Réf échantillon client : P182 - Plâtre+Colle - RDC - Salon / TV - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038/m1 EN DATE DU 15/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40264	
Réf échantillon client : P183 - Plâtre+Colle - RDC - Bureau infirmier - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Polystyrène expansé (billes)	
‣ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)
Polystyrène expansé (billes)	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40265	
Réf échantillon client : P184 - Plâtre+Colle - RDC - Salle à Manger - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40266/m1	
Réf échantillon client : P185 - Panneaux collés - RDC - Bureau infirmier - Plafond - Plafond		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / **Peinture** / Matériau fibreux blanc	
M ‣ Matériau plâtreux blanc non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 14/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
M ‣ Matériau fibreux blanc	MOLP le 14/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / Aucune	Analyste : OOS
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40267	
Réf échantillon client : P186 - Colle de Faïence - RDC - Sanitaires PMR 1 - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
‣ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40268	
Réf échantillon client : P187 - Colle de plinthes (noire) - RDC - Local élec (3D) - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
‣ Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Carrelage	---	Non analysé	
‣ Colle grise	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038/m1 EN DATE DU 15/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40269	
Réf échantillon client : P188 - Colle de Plinthes - RDC - Hall 3C - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40270	
Réf échantillon client : P189 - Colle de Plinthes - RDC - Linge/Laverie - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40271	
Réf échantillon client : P190 - Colle de plinthes (noire) - RDC - Local élec 3C - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
Peinture	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Joint cassant gris	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038/m1 EN DATE DU 15/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40272	
Réf échantillon client : P191 - Colle de plinthes (noire) - RDC - Salon / TV - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40273	
Réf échantillon client : P192 - Colle de Faïence - RDC - Bureau - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40274	
Réf échantillon client : P193 - Colle de faïence 10*10 - RDC - Chambre n°4 - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40275	
Réf échantillon client : P194 - Colle de faïence 10*10 - RDC - Bureau psychologue - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038/m1 EN DATE DU 15/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40276	
Réf échantillon client : P195 - Colle de Faience - RDC - Salon visiteurs 3 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40277	
Réf échantillon client : P196 - plaque anti vibration - RDC - Salon visiteurs 3 - Toutes zones - Evier		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple	
Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 30/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40278	
Réf échantillon client : P197 - Colle de faience 10*10 - RDC - Soins - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture + Colle beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40279	
Réf échantillon client : P198 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Chambre n°28 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige	
Peinture + Joint cassant beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038/m1 EN DATE DU 15/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40280	
Réf échantillon client : P199 - Colle de Faience 10*10 - 1er - Sanitaire H 3D - Douche - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40281	
Réf échantillon client : P200 - Mastic de vitre - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40282	
Réf échantillon client : P201 - Enduit ciment peinture - Façade - 3D - Mur de façade		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40283	
Réf échantillon client : P202 - Enduit ciment peinture - Façade - Centre - Mur de façade		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40284	
Réf échantillon client : P203 - Enduit ciment peinture - Façade - 3C - Mur de façade		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 03/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17038/m1 EN DATE DU 15/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

Validé par : Hélène COCHET Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3429298.0

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-16591 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--48-173432851

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P122 - Plâtre peinture - RDC - Office - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35928 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P123 - Plâtre peinture - RDC - Office - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35929 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P124 - Plâtre peinture - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35930 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P125 - Plâtre peinture - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35931 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P126 - Enduit plâtre peinture - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Poutre/Poteau		Réf échantillon ITGA : IT072504-35932 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P127 - Enduit bande calicot - RDC - Bureau - CD - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35933 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : AHZ (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P128 - Enduit bande calicot - RDC - Activités (ex rgt personnel) - D - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35934 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P129 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaires n°1 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35935 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P130 - Panneaux collés - RDC - Salle à Manger - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35936 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau fibreux blanc / Colle polymère jaune	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau fibreux blanc + Colle polymère jaune non séparable	MOLP + META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Trémolite	Analyste : DMI (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P131 - Plâtre peinture - RDC - Activités (ex rgt personnel) - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35937 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P132 - Panneaux collés - RDC - Salle pause - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35938 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P133 - Plâtre peinture - RDC - Hall 3D - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35939 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FTM (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P134 - Plâtre peinture - RDC - Local ASH - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35940 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P135 - Enduit bande calicot - RDC - Chambre n°1 - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35941 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FTM (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P136 - Enduit bande calicot - RDC - Pharmacie - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35942 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P137 - Plâtre peinture - RDC - Hall 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35943 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P138 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire/WC 2 - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35944 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P139 - Plâtre peinture - RDC - Hall 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35945 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P140 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaires PMR 1 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35946 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P141 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire/WC 2 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35947 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P142 - Plâtre peinture - RDC - Bureau psychologue - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35948 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P143 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35949 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P144 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35950 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P145 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35951 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P146 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire 3C - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35952 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : PES (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P147 - Enduit bande calicot - RDC - Sanitaire 3C - D - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35953 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
‣ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P148 - Enduit plâtre peinture - RDC - Espace détente - Toutes zones - Poutre/Poteau		Réf échantillon ITGA : IT072504-35954 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : AHZ (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P149 - Enduit bande calicot - RDC - Espace détente - D - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35955 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
‣ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P150 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35956 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P151 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire 3C - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35957 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P152 - plaque anti vibration - RDC - Salle pause - Toutes zones - Evier		Réf échantillon ITGA : IT072504-35958 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
‣ Matériau bitumineux noir	META (B) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P153 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3D - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35959 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P154 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35960 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P155 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35961 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P156 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3D - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35962 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FTM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P157 - Enduit bande calicot - 1er - Chambre n°12 - B - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35963 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P158 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°12 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35964 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P159 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaires F 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35965 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P160 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°17 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35966 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P161 - Enduit bande calicot - 1er - Chambre n°18 - B - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35967 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P162 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35968 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P163 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaire H 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35969 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P164 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35970 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P165 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3C - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35971 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P166 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3C - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35972 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P167 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35973 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P168 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°31 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35974 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P169 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaire F 3C - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35975 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P170 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°24 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35976 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
‣ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P171 - Enduit bande calicot - 1er - Sanitaire F 3C - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35977 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier	
‣ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3429298.1

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591/m1 EN DATE DU 19/05/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Ce rapport annule et remplace le rapport IT0725-16591 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-16591 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--48-173432851

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : **M** Résultat modifié depuis la version précédente **N** Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P122 - Plâtre peinture - RDC - Office - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35928 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P123 - Plâtre peinture - RDC - Office - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35929 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P124 - Plâtre peinture - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35930 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P125 - Plâtre peinture - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35931 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P126 - Enduit plâtre peinture - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Poutre/Poteau		Réf échantillon ITGA : IT072504-35932 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P127 - Enduit bande calicot - RDC - Bureau - CD - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35933 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : AHZ (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P128 - Enduit bande calicot - RDC - Activités (ex rgt personnel) - D - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35934 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P129 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaires n°1 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35935 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P130 - Panneaux collés - RDC - Salle à Manger - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35936/m1 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau fibreux blanc / Colle polymère jaune	
M Peinture en faible quantité non séparable + Matériau fibreux blanc + Colle polymère jaune non séparable	MOLP + META (A) le 19/05/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante / Trémolite	Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P131 - Plâtre peinture - RDC - Activités (ex rgt personnel) - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35937 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P132 - Panneaux collés - RDC - Salle pause - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35938 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P133 - Plâtre peinture - RDC - Hall 3D - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35939 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FTM (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P134 - Plâtre peinture - RDC - Local ASH - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35940 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P135 - Enduit bande calicot - RDC - Chambre n°1 - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35941 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FTM (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P136 - Enduit bande calicot - RDC - Pharmacie - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35942 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P137 - Plâtre peinture - RDC - Hall 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35943 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P138 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire/WC 2 - Toutes zones - Cloisons/doublage		Réf échantillon ITGA : IT072504-35944 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P139 - Plâtre peinture - RDC - Hall 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35945 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P140 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaires PMR 1 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35946 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-35947	
Réf échantillon client : P141 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire/WC 2 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-35948	
Réf échantillon client : P142 - Plâtre peinture - RDC - Bureau psychologue - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-35949	
Réf échantillon client : P143 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Toutes zones - Mur de Refend		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-35950/m1	
Réf échantillon client : P144 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Toutes zones - Cloisons/doublage		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	
M Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RLP (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-35951/m1	
Réf échantillon client : P145 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
M Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RLP (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-35952	
Réf échantillon client : P146 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire 3C - Toutes zones - Cloisons/doublage		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : PES (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P147 - Enduit bande calicot - RDC - Sanitaire 3C - D - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35953 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
‣ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P148 - Enduit plâtre peinture - RDC - Espace détente - Toutes zones - Poutre/Poteau		Réf échantillon ITGA : IT072504-35954 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : AHZ (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P149 - Enduit bande calicot - RDC - Espace détente - D - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35955 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
‣ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P150 - Plâtre peinture - RDC - Bureau - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35956 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P151 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire 3C - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35957 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P152 - plaque anti vibration - RDC - Salle pause - Toutes zones - Evier		Réf échantillon ITGA : IT072504-35958 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
‣ Matériau bitumineux noir	META (B) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P153 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3D - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35959 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P154 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35960/m1 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
M Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P155 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35961 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P156 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3D - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35962 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FTM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P157 - Enduit bande calicot - 1er - Chambre n°12 - B - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35963 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P158 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°12 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35964 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P159 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaires F 3D - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35965 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P160 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°17 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35966 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P161 - Enduit bande calicot - 1er - Chambre n°18 - B - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35967 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P162 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35968 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P163 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaire H 3D - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35969/m1 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
M Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 19/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RLP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P164 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35970 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P165 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3C - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35971 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P166 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier 3C - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-35972 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P167 - Plâtre peinture - 1er - Circulation 3C - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35973 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P168 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°31 - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35974 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P169 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaire F 3C - Toutes zones - Doublage/cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35975 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16591/m1 EN DATE DU 19/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P170 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°24 - Toutes zones - Mur de Refend		Réf échantillon ITGA : IT072504-35976 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P171 - Enduit bande calicot - 1er - Sanitaire F 3C - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-35977 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Papier	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA (5)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3429299.0

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16592 EN DATE DU 29/04/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-16592 Réf. Commande Client : 56-108187 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1402--48-173432851

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P172 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°22 - Toutes zones - Doublage/cloisons n°1		Réf échantillon ITGA : IT072504-36017 Description ITGA : **Papier peint** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P173 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaires H 3C - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-36018 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16592 EN DATE DU 29/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P174 - Plâtre peinture - 1er - Chambre n°23 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072504-36019 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P175 - Fibrociment - Façade - Façade - Conduit de fluide		Réf échantillon ITGA : IT072504-36020 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles / **Peinture**	
‣ Fibrociment gris avec fibres visibles + Peinture non séparable	MOLP le 29/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MKP (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3767650.0.PDF

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-26286 EN DATE DU 29/06/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0726-26286 Réf. Commande Client : 108187 EPSM Morbihan 22.06.26--47--113-0-190618694

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/06/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P243 - RDC - Couloir 3D - Toutes zones - Cloisons/doublage - Peinture tapisserie		Réf échantillon ITGA : IT072606-40464 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P244 - RDC - Couloir 3D - Toutes zones - Cloisons/doublage - Plâtre		Réf échantillon ITGA : IT072606-40465 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
1 Matériau plâtreux blanc	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LYA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-26286 EN DATE DU 29/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P245 - RDC - Couloir 3D - Toutes zones - Mur de Refend - Peinture tapisserie		Réf échantillon ITGA : IT072606-40466 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ‣ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LYA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P246 - RDC - Couloir 3D - Toutes zones - Mur de Refend - Plâtre		Réf échantillon ITGA : IT072606-40467 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
1 ‣ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P247 - RDC - Couloir n°4 - Toutes zones - Mur de Refend - Peinture tapisserie		Réf échantillon ITGA : IT072606-40468 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ‣ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 29/06/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P248 - RDC - Couloir n°4 - Toutes zones - Mur de Refend - Plâtre		Réf échantillon ITGA : IT072606-40469 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
1 ‣ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P249 - RDC - Couloir n°4 - Toutes zones - Mur de Refend - Peinture tapisserie		Réf échantillon ITGA : IT072606-40470 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ‣ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LYA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P250 - RDC - Couloir n°4 - Toutes zones - Mur de Refend - Plâtre		Réf échantillon ITGA : IT072606-40471 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
1 ‣ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LYA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-26286 EN DATE DU 29/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40472	
Réf échantillon client : P251 - 1er - Chambre n°27 - Toutes zones - Fenêtre - Joint de finition platre		Description ITGA : Peinture avec fibres / Matériau plâtreux blanc avec poussières	
1 ‣ Peinture avec fibres non séparable + Matériau plâtreux blanc avec poussières (1)	META (A) le 29/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : LDA / ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40473	
Réf échantillon client : P252 - RDC - Espace détente - Toutes zones - Fenêtre - Joint de finition platre		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
1 ‣ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MVS
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40474	
Réf échantillon client : P253 - RDC - Rgt linge - Toutes zones - Fenêtre n°2 - Joint de finition platre		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
1 ‣ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 29/06/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40475	
Réf échantillon client : P254 - RDC - Salon / TV - Toutes zones - Fenêtre - Joint de finition platre tapisserie		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Couche souple beige avec fibres / Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
1 ‣ Matériau plâtreux blanc non séparable + Couche souple beige avec fibres non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 29/06/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : OFP (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40476	
Réf échantillon client : P255 - RDC - Chambre n°7 - Toutes zones - Fenêtre - Platre+Joint d'étanchéité blanc		Description ITGA : Matériau souple blanc / Matériau plâtreux blanc	
1 ‣ Matériau souple blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : RLP (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-26286 EN DATE DU 29/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40477	
Réf échantillon client : P256 - RDC - Sanitaires/WC 1 - Toutes zones - Fenêtre - Platre+Joint d'étanchéité blanc + tapisserie		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau compact blanc en faible quantité / Matériau souple blanc	
1 ‣ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau compact blanc en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 29/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 (6)	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ (5)
1 ‣ Matériau souple blanc	META (B) le 29/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40478	
Réf échantillon client : P257 - RDC - Lingerie - Toutes zones - Fenêtre n°2 - Platre		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
1 ‣ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RLP
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40479	
Réf échantillon client : P258 - RDC - Salle à Manger - Toutes zones - Fenêtre n°2 - Platre		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
1 ‣ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : RLP
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40480	
Réf échantillon client : P259 - 1er - Chambre n°17 - Toutes zones - Fenêtre - Platre		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac	
1 ‣ Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40481	
Réf échantillon client : P260 - 1er - Chambre n°17 - Toutes zones - Doublage/cloisons - Bande bitumineuse		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
1 ‣ Matériau bitumineux noir non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable (1)	META (B) le 29/06/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-26286 EN DATE DU 29/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40482	
Réf échantillon client : P261 - 1er - Chambre n°12 - Toutes zones - Fenêtre - Platre+Bande papier		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
1 ‣ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier non séparable (1)	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LYA (4)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
(6) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.
1.accréditation n° 1-5967

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

***a)* Dangerosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

***b)* Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation**

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

– perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;

– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

– travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : **www.amiante.inrs.fr**.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

– de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

– de la mairie ;

– ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : **www.sinoe.org.**

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ATTESTATION(S)

Agence Versailles Château
MANDEFIELD & DARGNIES
32 rue du Maréchal Foch
78000 Versailles
Tél : 01 39 50 12 12
e-mail : versailleschateau@allianz.fr

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

ALLIANZ IARD, COMPAGNIE D'ASSURANCES dont le siège social est situé **1 cours Michelet CS 3051 92076 Paris la Défense Cedex**, certifie que :

ELIBAT
5 rue Saint Nazaire
44800 SAINT HERBLAIN

Est garantie par un contrat **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :**
n° **43 370 182**
Ce contrat a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux dispositions particulières, à savoir :

Recherche d'amiante selon la législation et réglementation en vigueur.

Diagnostic et contrôle dans le cadre de la réglementation amiante selon les décrets parus ou à paraître, sans réalisation de travaux mais avec les prélèvements pour analyse (Diagnostic en parties communes et privatives)

Diagnostics parasitaires (Diagnostics termites et autres xylophages)

Diagnostic plomb :

- CREP Constat de risque d'exposition au plomb

- Diagnostic plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine y compris dans les tours aéro réfrigérantes (Evaluation du risque sanitaire lié au paramètre plomb dans les réseaux communs de distribution d'eau potable selon la norme NF P 41-021 ou toute autre norme qui lui serait substituée)

-Diagnostic adapté aux différentes situations (vente, principe de précaution et décent, diagnostic avant travaux.

-Surveillance annuelle des risques diagnostiqués.

-Recommandation en terme de travaux à réaliser (délais, type de travaux…)

Contrôle légionnelle : Diagnostic légionnelle dans les réseaux d'eau chaude sanitaire et les tours aéro réfrigérantes dans le cadre de l'arrêté du 13/12/2004.

Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé.

Diagnostic de Performance Energétique dans le cadre du décret N°2006-1147 du 14 septembre 2006

Evaluation des risques professionnels dans le cadre du document (aide à la rédaction du document unique : établissement d'un dossier à partir des informations données par le client de documents permettant à ce dernier de réaliser et de valider le document unique, actualisation annuelle de ces dossiers)

Diagnostic qualité sécurité des installations intérieures de gaz chez les particuliers.

- Diagnostic en habitation pour le compte de GAZ de France l'activité est réalisée selon les recommandations de GAZ DE France, conformément au référentiel NF EN ISO/CEI 17020 ou tout autre référentiel qui lui serait substitué,

Conseil en matière de travaux à effectuer en cas de danger grave et immédiat, et d'aide au financement de ces travaux.

Diagnostic réglementaire des installations intérieures de gaz des locaux à usage d'habitation.

Métré des locaux selon la loi dite CARREZ(loi 96/1107 du 18 décembre 1996 et décret N°97/532 du 23 mai 1997)

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Etats des lieux

Etablissement d'états des lieux relatifs à la conformité des logements aux normes de surface et d'habitabilité dans le cadre du prêt à taux zéro

Diagnostic des installations électriques chez les particuliers

Dossier Diagnostic technique(DDT) selon ordonnance 2005-655 du 08 juin 2005 (location et ventes)

Audits et attestations d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et gestion des agendas AD'apP

Diagnostics techniques avant mise en copropriété dans le cadre de la loi SRU

Etat des risques naturels et technologiques (ERNT) dans le cadre du décret 2005-134 du 15 février 2005

Vérifications techniques réglementaires au titre de la protection contre les risques de panique et incendie dans les ERP ou les ERT, dans le cadre de l'agrément délivré par le ministère de l'intérieur et du certificat d'accréditation N°3-049

Vérifications réglementaires de toutes installations électriques, à caractère périodique et initial, première mise en service, mise en demeure, dans les ERP-IGH et bâtiments industriels

Vérifications Consuel (décret du 14 / 12 /1972) Contrôles des installations électriques par thermographie infrarouge, déclaration Q18 et Q19 selon documents techniques D18 et D19 de l'APSAD,

Vérifications réglementaires sur les appareils et engins de levage,

Vérifications réglementaires d'appareils à pression des gaz,

Mesures de bruit,

Audit technique complet et de mise en sécurité des ascenseurs et des escalators dans le cadre réglementaire en vigueur (loi SAE), dans les ERP et IGH, portes et portails, À L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE ET/OU DE PRÉCONISATION OU RÉALISATION DE TRAVAUX DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (INSTALLATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE…)

Contrôles réglementaires des portes et portails automatiques Attestation de contrôle en vue de crédit d'impôts des pompes à chaleur AIR / AIR.

Contrôle et vérification de compactage de remblais et de tranchées par pénétromètre, Inspections télévisées de réseaux,

Contrôle d'étanchéité des canalisations et regards, à l'air, à l'eau,

Visites et examen approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique dans le cadre de l'agrément délivré au titre du décret du 16/09/98,

Contrôle et diagnostic sécurité dans le cadre de l'arrêté du 02 08 1977 portant sur les installations de gaz combustibles situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

DAAF Détecteur Avertisseur Autonome de Fumées.

AUDIT ENERGETIQUE pour les diagnostiqueurs certifiés DPE.

La présente attestation valable du 01 Janvier 2026 au 31 Décembre 2026, ne peut engager ALLIANZ IARD en dehors des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Toute adjonction autre que le cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Versailles, le 18 décembre 2025

Agence Versailles Château
MANDEFIELD & DARGNIES

Conformément à l'article L.112-3 du Code des Assurances, la présente Attestation vaut présomption de garantie

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

Certificat diagnostiqueur immobilier numérique

N° CPDI3609 Version 014

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DENIAUD Michel

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 11/10/2021 - Date d'expiration : 10/10/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 11/10/2021 - Date d'expiration : 10/10/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 modifié définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev23

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 modifié définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
ACCREDITATION N° 4-0522 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 5 rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : 02.40.48.83.09 - E-mail : pole.travaux@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B
