BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP BRETAGNE
26 rue de l'eau blanche

29200 BREST

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 33034019/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 22/07/2026

Référence au programme de travaux :
Mail CHU Brest // Stérilisation, endoscopie, odontologie Carhaix: réalisé le 06/05/2026 par M. Erwan LE LANN

DONNEUR D'ORDRE

CHU DE BREST

Erwan LE LANN
2 avenue Foch
29609 BREST

SITE D'INTERVENTION

CARHAIX

14 B Rue du Dr Menguy
29270 CARHAIX PLOUGUER

Batiment MCO

Latitude : 48.274300 / Longitude : -3.578900

Date(s) d'intervention(s) :
Le 20/05/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION

SANS AMIANTE repéré

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Arnaud JEGOUIC	Diagnostiqueur	Certification N° 9643066	Arnaud JEGOUIC

Le présent rapport comporte 62 pages, dont 32 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Conditions spécifiques 9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10

7. ANNEXES **31**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 31
7.2. Photos prélèvements 33
7.3. Attestation d'assurance 44
7.4. Certificat de compétence 46
7.5. Croquis de repérage 47
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire 50

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

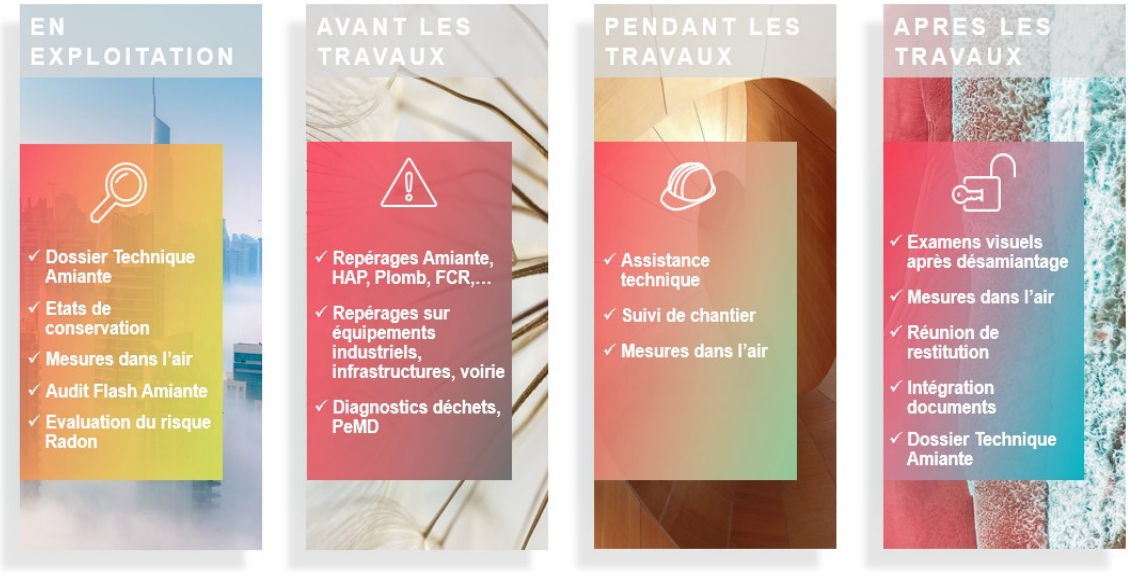

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Dépose des revêtements de sols, cloisons, revêtements de murs, faux-plafond, menuiseries et réseaux

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis fenêtres fibrociment, Coffrages perdus, Colle, Colles carrelage, Colles faïence, Colles pâte de verre, Couvre-joints, Enduits pelliculaires façades, Enduits projetés/crépis façades, Garnissage joints dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints carrelage, Joints dilatation, Joints faïence, Joints pâte de verre, Maçonnerie silico-calcaire, Peintures façades, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Plinthes	Peintures plinthes
Portes	Peintures

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres
Suspentes et contrevents	Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Services stérilisation, endoscopie et odontologie

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CARHAIX
14 B Rue du Dr Menguy
29270 CARHAIX PLOUGUER

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CARHAIX	Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	IGH et ERP de la 1ère et la 2ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Erwan LE LANN	Donneur d'ordre	CHU DE BREST	2 avenue Foch 29609 BREST	02 98 22 32 73 - 06 08 14 71 79
Michaël BALLER	Accompagnateur	CHU BREST CARHAIX	15 rue du docteur Menguy 29835 CARHAIX	+33 6 11 12 38 17 - michael.baller@chu-brest.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 20/05/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Bureau Veritas - Sebastien DEROO	18/10/2024	22668172/S9/7/AM-RTV_V1	Absence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Cyril CAIRA - APAVE	26/11/2021	21497673	Absence d'amiante
Repérage amiante pour constitution de DTA / Pré rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante	Xavier LE CALVEZ - Bureau Veritas	22/12/2022	17171126/S9.23.2.R	Absence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Sebastien DEROO - Bureau Veritas	22/08/2024	22668151/S5.7.2.R	Absence d'amiante
Programme de travaux / Mail	M. Erwan LE LANN	06/05/2026	CHU Brest // Stérilisation, endoscopie, odontologie Carhaix:	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C006 Réunion	Conduits	Conduits	PVC	/	17	/	S1	PN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	18	/	S2	PN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	20	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C006 Réunion	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C004 Médecin	Cloisons (légères et préfabriquées)	Jonctions panneaux	Mousse expensée	Gris	22	/	S3	AN	revêtement entre plaque de plâtre et conduit de ventilation	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	20	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie &	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	P29* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
radiologie -> C003 Médecin	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P29* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C003 Médecin	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P29* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	20	/	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C002 Salle d"attente	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	P26 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P26 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P26 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	P27* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	P27* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	P27* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie &	Poteaux	Peintures poteaux	/	Blanc	14	P30* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
radiologie -> C001 Circulation	Poteaux	Enduits lissage/ragréage poteaux	Ciment	Gris	14	P30* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C001 Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	/	Jaune, Marron	15	P31* N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	Blanc	14	P33 N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissage/ragréage poteaux	Ciment	Gris	14	P33 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	19	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A030	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A032	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	20	/	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A032	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	P8 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P8 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P8 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	7	P9* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	7	P9* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle cloisons	Dur	Blanc	8	P10* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Jonctions panneaux	Bande	Noir	9	P11* N	/	AN	revêtement entre plaque de plâtre et conduit de ventilation	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Plâtre	Blanc	6	P12* N	/	AN	enduit de rebouchage	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
	Conduits	Mastics	/	Gris	5	P13* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	20	/	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A037	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C007 Accueil	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C021 Radio	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	P2_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 26/11/2021	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P2_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 26/11/2021	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P2_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 26/11/2021	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	P3_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P3 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 26/11/2021	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	P3_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P3 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 26/11/2021	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C021 Radio	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	P3_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P3 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 26/11/2021	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	/	Jaune, Marron	15	P4_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P4 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 26/11/2021	Non
	Plafonds	Peintures plafonds	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C019 WC	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	19	/	/	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C020 Deshabillage	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C020 Deshabillage	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C018 Radiologie 2	Plafonds	Peintures plafonds	/	Blanc	4	P4* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	P1_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P1 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 18/10/2024	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P1_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P1 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 18/10/2024	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P1_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P1 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 18/10/2024	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C018 Radiologie 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C016 Generateur	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C009	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	20	P3_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P3 Repérage amiante pour constitution de DTA - Pré rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante - 22/12/2022	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	P2_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 18/10/2024	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C009	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P2_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 18/10/2024	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P2_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 18/10/2024	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Plâtre	Blanc	6	P7 N	/	AN	enduit de rebouchage	Non
	Conduits	Mastics	/	Gris	5	P6 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C008 Interpretation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Plâtre	Blanc	6	P28 N	/	AN	enduit de rebouchage	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	20	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C008 Interpretation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C010 Chambre noire	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	P1 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P1 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P1 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	/	Blanc	2	P2* N	/	AN	faïence blanche format 10x10cm	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	P3 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	P3 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	P3 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie &	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	19	/	/	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
radiologie -> C013 WC	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C013 WC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C014 WC	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	19	/	/	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C012	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	P5_antN	/	AN	Prélèvement antérieur : P5 Repérage amiante pour constitution de DTA - Pré rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante - 22/12/2022	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
attente brancard	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	/	Jaune, Marron	15	P32 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C012 attente brancard	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C017	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Plafonds	Peintures plafonds	/	Blanc	4	P5 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C015 Echographie	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C015 Echographie	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Panoramique dentaire	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	/	Gris	16	P35* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	12	P24* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	12	P25 N	/	AN	joint entre menuiserie et structure	Non
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	12	P34 N	/	AN	joint entre menuiseries métalliques	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	/	Gris	16	P6_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P6 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 22/08/2024	Non
1er étage -> Endoscopie -> C157 Bureau 1	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	P19 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1er étage -> Endoscopie -> Bureau 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P19 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P19 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
1er étage -> Endoscopie -> Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
1er étage -> Endoscopie -> C158 salle d'attente	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
1er étage -> Endoscopie -> Lavage	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Endoscopie -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	P20 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	P20 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	P20 N	/	AN	/	Non
1er étage -> Endoscopie -> Circulation	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Endoscopie -> 115 Lavage	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Stérilisation -> C112 Sas	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1er étage -> Stérilisation -> C113 Vestiaire	Plafonds	Peintures plafonds	/	Blanc	10	P16* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot plafonds	Papier	Beige	10	P16* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits finition plafonds plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	10	P16* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	P14 N	/	AN	/	Non
1er étage -> Stérilisation -> C113 Vestiaire	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P14 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P14 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
1er étage -> Stérilisation -> C114 Vestiaire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	11	P15* N	/	AN	revêtement mural étanche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	11	P15* N	/	AN	revêtement mural étanche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Sous couches tissus muraux	/	Gris	11	P15* N	/	AN	revêtement mural étanche	Non
	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Plafonds	Peintures plafonds	/	Blanc	10	P21 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1er étage -> Stérilisation -> A131 Sas	Plafonds	Bandes calicot plafonds	Papier	Beige	10	P21 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits finition plafonds plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	10	P21 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	P22 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P22 N	/	AN	/	Non
1er étage -> Stérilisation -> A131 Sas	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P22 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	P23 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	P23 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	P23 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
1er étage -> Stérilisation -> A130 Lavage	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	P17 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P17 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P17 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	11	P18 N	/	AN	revêtement mural étanche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	11	P18 N	/	AN	revêtement mural étanche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Sous couches tissus muraux	/	Gris	11	P18 N	/	AN	revêtement mural étanche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
1er étage -> Stérilisation -> A126 Rangement	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Stérilisation -> A126 Rangement	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Stérilisation -> A127 désinfection	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Stérilisation -> A131 Brossage	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Blanc, Jaune	21	/	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches revêtements souples	Lé	/	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	Idem P 29	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Beige	3	Idem P 27	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Plâtre	Blanc	3	Idem P 27	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez-de-chaussée	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C006 Réunion	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C004 Médecin	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C003 Médecin	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C002 Salle d''attente	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C001 Circulation	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A030	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A032	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A037	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C007 Accueil	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C021 Radio	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C019 WC	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C020 Deshabillage	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C018 Radiologie 2	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C016 Generateur	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C009	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C008 Interpretation	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C010 Chambre noire	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C013 WC	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C014 WC	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C012 attente brancard	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C017	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C015 Echographie	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Panoramique dentaire	/
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Façades	/
1er étage	/
1er étage -> Endoscopie	/
1er étage -> Endoscopie -> C157 Bureau 1	/
1er étage -> Endoscopie -> Bureau 2	/
1er étage -> Endoscopie -> C158 salle d'attente	/
1er étage -> Endoscopie -> Lavage	/
1er étage -> Endoscopie -> Circulation	/
1er étage -> Endoscopie -> 115 Lavage	/
1er étage -> Stérilisation	/
1er étage -> Stérilisation -> C112 Sas	/
1er étage -> Stérilisation -> C113 Vestiaire	/
1er étage -> Stérilisation -> C114 Vestiaire	/
1er étage -> Stérilisation -> A131 Sas	/
1er étage -> Stérilisation -> A130 Lavage	/
1er étage -> Stérilisation -> A126 Rangement	/
1er étage -> Stérilisation -> A127 désinfection	/
1er étage -> Stérilisation -> A131 Brossage	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C010 Chambre noire



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P1	ZPSO 1

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C010 Chambre noire



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P2	ZPSO 2

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C010 Chambre noire



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

P2	ZPSO 2

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C010 Chambre noire



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

P3	ZPSO 3

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C010 Chambre noire



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture cloisons | Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales


P3	ZPSO 3


Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C010 Chambre noire




Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture cloisons | Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales

Copyright BUREAU VERITAS

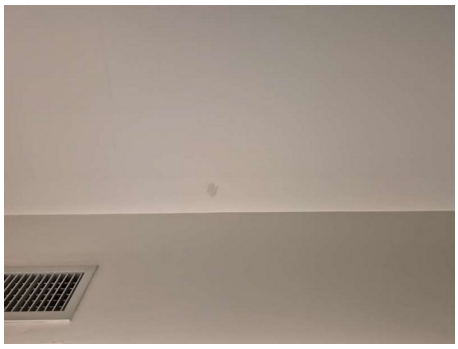P4	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C018 Radiologie 2	
	
Plafonds -> Peintures plafonds	

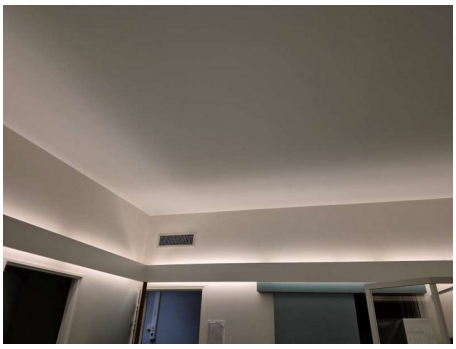P4	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C018 Radiologie 2	
	
Plafonds -> Peintures plafonds	

P5	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C015 Echographie	
	
Plafonds -> Peintures plafonds	

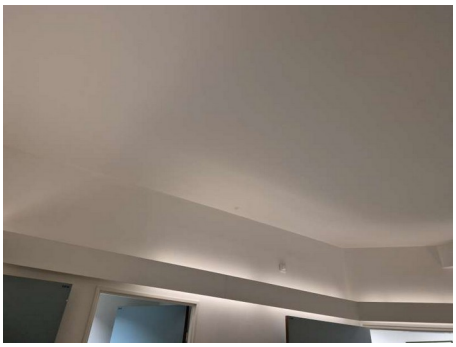P5	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C015 Echographie	
	
Plafonds -> Peintures plafonds	


P6	ZPSO 5
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C009	
	
Conduits -> Mastics	

P6	ZPSO 5
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C009	
	
Conduits -> Mastics	

P7	ZPSO 6
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C009	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

P7	ZPSO 6
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C009	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

P8	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment	

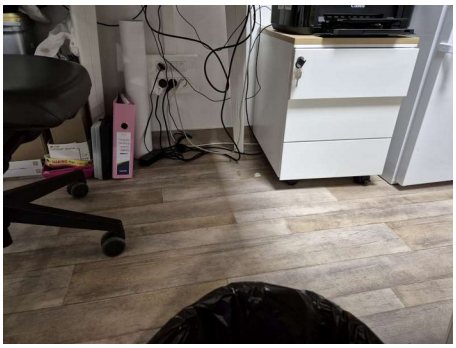P8	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment	

P9	ZPSO 7
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

P9	ZPSO 7
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

P10	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle cloisons	

P10	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle cloisons	

P11	ZPSO 9
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Jonctions panneaux	

P11	ZPSO 9
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Jonctions panneaux	


P12	ZPSO 6
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

P12	ZPSO 6
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

Copyright BUREAU VERITAS

P13	ZPSO 5
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Conduits -> Mastics	

P13	ZPSO 5
Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> A034	
	
Conduits -> Mastics	

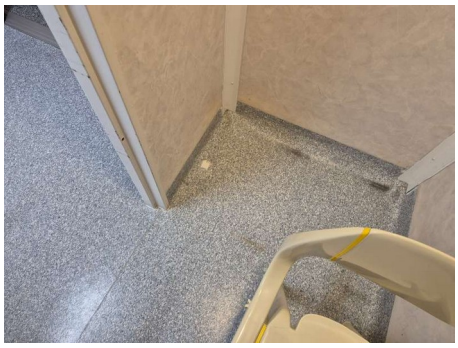P14	ZPSO 1
1er étage -> Stérilisation -> C113 Vestiaire	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment	


P14	ZPSO 1
1er étage -> Stérilisation -> C113 Vestiaire	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment	

P15	ZPSO 11
1er étage -> Stérilisation -> C114 Vestiaire	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales | Sous couches tissus muraux	

P15	ZPSO 11
1er étage -> Stérilisation -> C114 Vestiaire	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales | Sous couches tissus muraux	

P16	ZPSO 10

1er étage -> Stérilisation -> C113 Vestiaire

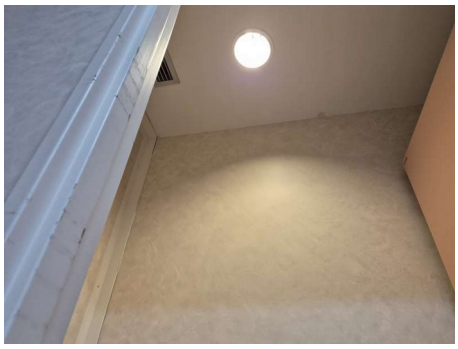

Plafonds -> Peintures plafonds | Bandes calicot plafonds | Enduits finition plafonds plaques de plâtre

P16	ZPSO 10

1er étage -> Stérilisation -> C113 Vestiaire



Plafonds -> Peintures plafonds | Bandes calicot plafonds | Enduits finition plafonds plaques de plâtre

P17	ZPSO 1

1er étage -> Stérilisation -> A130 Lavage



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P17	ZPSO 1

1er étage -> Stérilisation -> A130 Lavage



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P18	ZPSO 11

1er étage -> Stérilisation -> A130 Lavage



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales | Sous couches tissus muraux

P18	ZPSO 11

1er étage -> Stérilisation -> A130 Lavage



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales | Sous couches tissus muraux

Copyright BUREAU VERITAS

P19	ZPSO 1

1er étage -> Endoscopie -> Bureau 2



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P19	ZPSO 1

1er étage -> Endoscopie -> Bureau 2



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P20	ZPSO 3

1er étage -> Endoscopie -> Circulation



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture cloisons | Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales

P20	ZPSO 3

1er étage -> Endoscopie -> Circulation



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture cloisons | Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales

P22	ZPSO 1


1er étage -> Stérilisation -> A131 Sas



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P22	ZPSO 1

1er étage -> Stérilisation -> A131 Sas

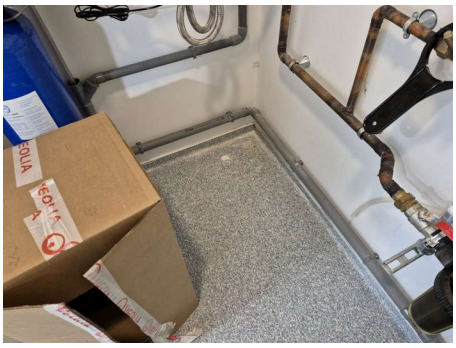

Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P23	ZPSO 3

1er étage -> Stérilisation -> A131 Sas



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture cloisons | Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales

P23	ZPSO 3

1er étage -> Stérilisation -> A131 Sas



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture cloisons | Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales

P24	ZPSO 12

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Façades



Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité

P24	ZPSO 12

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Façades



Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité

P25	ZPSO 12

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Façades



Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité

P25	ZPSO 12

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Façades



Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité

P26	ZPSO 1

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C002 Salle d''attente



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P26	ZPSO 1

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C002 Salle d''attente



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P27	ZPSO 3


Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C002 Salle d''attente



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture cloisons | Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales

P27	ZPSO 3

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C002 Salle d''attente

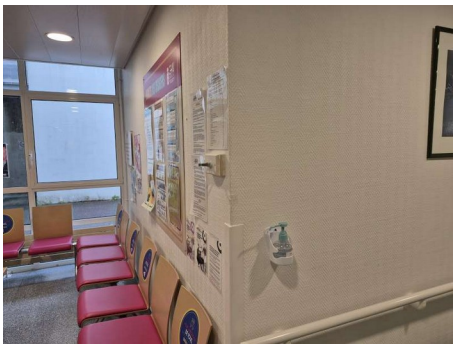

Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture cloisons | Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales

P28	ZPSO 6

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C008 Interpretation



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons

P28	ZPSO 6

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C008 Interpretation



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons

P29	ZPSO 1

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C003 Médecin



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P29	ZPSO 1

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C003 Médecin



Revêtements de sol -> Sous-couches revêtements souples | Colles non bitumineuses | Sols coulés à base ciment

P30	ZPSO 14

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C001 Circulation



Poteaux -> Peintures poteaux | Enduits lissage/ragréage poteaux

P30	ZPSO 14


Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C001 Circulation



Poteaux -> Peintures poteaux | Enduits lissage/ragréage poteaux

P31	ZPSO 15

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C001 Circulation

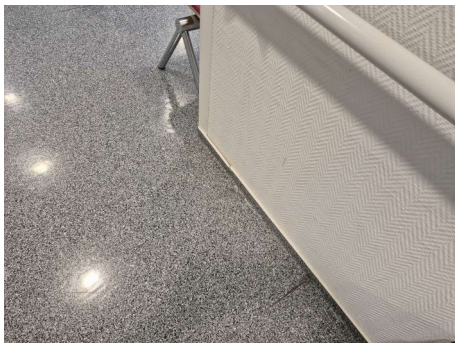

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P31	ZPSO 15

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C001 Circulation



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P33	ZPSO 14

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C001 Circulation



Poteaux -> Peintures poteaux | Enduits lissage/ragréage poteaux

P33	ZPSO 14

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> C001 Circulation



Poteaux -> Peintures poteaux | Enduits lissage/ragréage poteaux

P34	ZPSO 12

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Façades



Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité

P34	ZPSO 12

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Façades



Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité

P35	ZPSO 16

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Façades



Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades

P35	ZPSO 16

Rez-de-chaussée -> Odontologie & radiologie -> Façades



Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades

Copyright BUREAU VERITAS

7.3. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.4. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

JEGOUIC Arnaud

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**12/04/2021**	**11/04/2028**
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**12/04/2021**	**11/04/2028**

Date : 02/04/2021 Numéro de certificat : 9643066

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

7.5. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CARHAIX 14 B Rue du Dr Menguy 29270 CARHAIX PLOUGUER	
Localisation Rez-de-chaussée > Odontologie & radiologie	Date visite	Le 20/05/2026
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	33034019/S1/1
	Planche	1 / 2
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CARHAIX 14 B Rue du Dr Menguy 29270 CARHAIX PLOUGUER	
Localisation 1er étage	Date visite	Le 20/05/2026
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	33034019/S1/1
	Planche	2 / 2
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

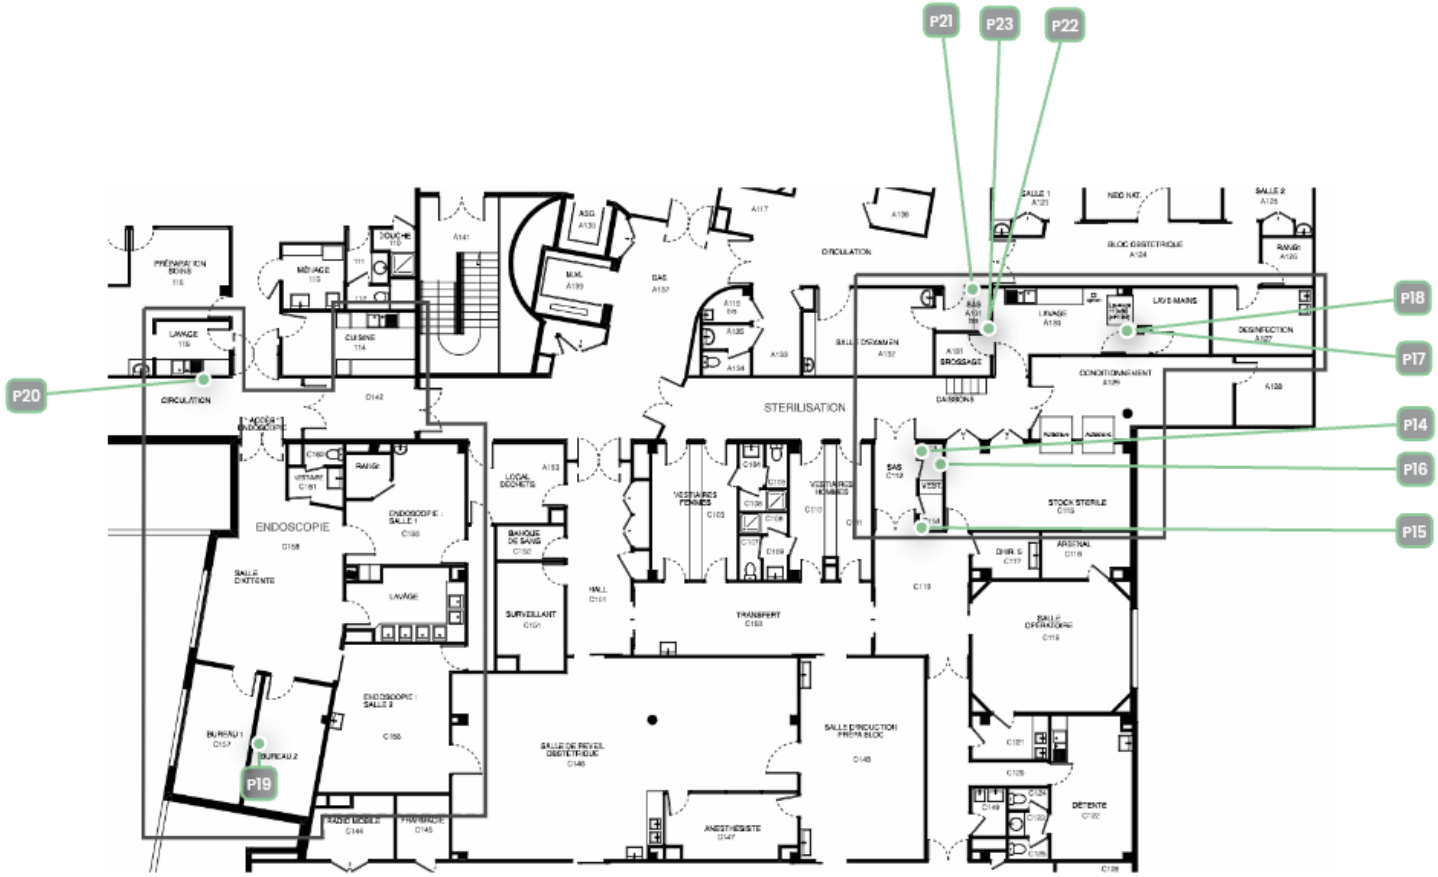

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

Date du rapport : 22/07/2026
Rapport N°:33034019/S1/1

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tel : 0230821209
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6090

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3826-3402 EN DATE DU 20/07/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - BREST 26 Rue de l'Eau Blanche 29200 Brest	Réf. Commande ITGA :	IT3826-3402
		Réf. Commande Client :	1510797476/33034019/S1/1/1_33034019/1/1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/07/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1918	
Réf échantillon client : BV3KT7381 - [Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P1 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C010 Chambre noire Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
1 Revêtement souple vert	META (A) le 17/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK
1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac (1)	META (A) le 17/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1919	
Réf échantillon client : BV3KT7382 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence] - [rel : P2 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C010 Chambre noire Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence]		Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche	
1 Joint cassant blanc	META (A) le 17/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK
Carrelage	---	Non analysé	
1 Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 17/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (5)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1920	
Réf échantillon client : BV3KT7383 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Peinture cloisons / Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales] - [rel : P3 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C010 Chambre noire Cloisons (légères et préfabriquées) : Peinture cloisons / Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
1 Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 17/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1921	
Réf échantillon client : BV3KT7384 - [Plafonds : Peintures plafonds] - [rel : P4 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C018 Radiologie 2 Plafonds : Peintures plafonds]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 17/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1922	
Réf échantillon client : BV3KT7385 - [Plafonds : Peintures plafonds] - [rel : P5 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C015 Echographie Plafonds : Peintures plafonds]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 17/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1923	
Réf échantillon client : BV3KT7386 - [Conduits : Mastics] - [rel : P6 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C009 Conduits : Mastics]		Description ITGA : Matériau gris en vrac	
1 Matériau gris en vrac	META (A) le 17/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1924	
Réf échantillon client : BV3KT7387 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits projetés/talochés cloisons] - [rel : P7 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C009 Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits projetés/talochés cloisons]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 17/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NKK (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1925	
Réf échantillon client : BV3KT7388 - [Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P8 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - A034 Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
1 Revêtement souple gris	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
1 Colle polymère jaune + Ragréage gris en vrac	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1926	
Réf échantillon client : BV3KT7389 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales] - [rel : P9 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - A034 Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
1 Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1927	
Réf échantillon client : BV3KT7390 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Plots de colle cloisons] - [rel : P10 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - A034 Cloisons (légères et préfabriquées) : Plots de colle cloisons]		Description ITGA : Colle blanche en vrac	
1 Colle blanche en vrac	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1928	
Réf échantillon client : BV3KT7391 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Jonctions panneaux] - [rel : P11 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - A034 Cloisons (légères et préfabriquées) : Jonctions panneaux]		Description ITGA : Ruban adhésif jaune / Mousse noire / Peinture	
1 Ruban adhésif jaune non séparable + Mousse noire non séparable + Peinture non séparable (1)	META (B) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (5)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1929	
Réf échantillon client : BV3KT7392 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits projetés/talochés cloisons] - [rel : P12 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - A034 Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits projetés/talochés cloisons]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1930	
Réf échantillon client : BV3KT7393 - [Conduits : Mastics] - [rel : P13 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - A034 Conduits : Mastics]		Description ITGA : Matériau gris en vrac	
1 Matériau gris en vrac	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1931	
Réf échantillon client : BV3KT7394 - [Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P14 1er étage - Stérilisation - C113 Vestiaire Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
1 Revêtement souple bleu	META (A) le 17/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK
1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 17/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1932	
Réf échantillon client : BV3KT7395 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales / Sous couches tissus muraux] - [rel : P15 1er étage - Stérilisation - C114 Vestiaire Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales / Sous couches tissus muraux]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1933	
Réf échantillon client : BV3KT7396 - [Plafonds : Peintures plafonds / Bandes calicot plafonds / Enduits finition plafonds plaques de plâtre] - [rel : P16 1er étage - Stérilisation - C113 Vestiaire Plafonds : Peintures plafonds / Bandes calicot plafonds / Enduits finition plafonds plaques de plâtre]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac	
1 Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1934	
Réf échantillon client : BV3KT7397 - [Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P17 1er étage - Stérilisation - A130 Lavage Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
1 Revêtement souple bleu	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK
1 Colle polymère jaune	META (B) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK
1 Ragréage rose	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1935	
Réf échantillon client : BV3KT7398 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales / Sous couches tissus muraux] - [rel : P18 1er étage - Stérilisation - A130 Lavage Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales / Sous couches tissus muraux]		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
1 Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1936	
Réf échantillon client : BV3KT7399 - [Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P19 1er étage - Endoscopie - Bureau 2 Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
1 Revêtement souple gris	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1937	
Réf échantillon client : BV3KT7400 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Peinture cloisons / Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales] - [rel : P20 1er étage - Endoscopie - Circulation Cloisons (légères et préfabriquées) : Peinture cloisons / Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Papier en vrac	
1 Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1938	
Réf échantillon client : BV3KT7401 - [Plafonds : Peintures plafonds / Bandes calicot plafonds / Enduits finition plafonds plaques de plâtre] - [rel : P21 1er étage - Stérilisation - A131 Sas Plafonds : Peintures plafonds / Bandes calicot plafonds / Enduits finition plafonds plaques de plâtre]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
1 Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1939	
Réf échantillon client : BV3KT7402 - [Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P22 1er étage - Stérilisation - A131 Sas Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau compact beige hétérogène	
1 Revêtement souple bleu	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1940	
Réf échantillon client : BV3KT7403 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Peinture cloisons / Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales] - [rel : P23 1er étage - Stérilisation - A131 Sas Cloisons (légères et préfabriquées) : Peinture cloisons / Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
1 Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1941	
Réf échantillon client : BV3KT7404 - [Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité] - [rel : P24 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - Façades Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité]		Description ITGA : Matériau souple blanc / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène	
1 Matériau souple blanc non séparable + Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable (1)	META (B) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (5)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1942	
Réf échantillon client : BV3KT7405 - [Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité] - [rel : P25 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - Façades Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité]		Description ITGA : Matériau souple blanc en faible quantité / Matériau gris en faible quantité	
1 Matériau souple blanc en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable (1)	META (B) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1943	
Réf échantillon client : BV3KT7406 - [Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P26 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C002 Salle d''attente Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
1 Revêtement souple gris	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1944	
Réf échantillon client : BV3KT7407 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Peinture cloisons / Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales] - [rel : P27 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C002 Salle d''attente Cloisons (légères et préfabriquées) : Peinture cloisons / Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales]		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac	
1 Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1945	
Réf échantillon client : BV3KT7408 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits projetés/talochés cloisons] - [rel : P28 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C008 Interpretation Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits projetés/talochés cloisons]		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1946	
Réf échantillon client : BV3KT7409 - [Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P29 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C003 Médecin Revêtements de sol : Sous-couches revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
1 Revêtement souple vert	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1947	
Réf échantillon client : BV3KT7410 - [Poteaux : Peintures poteaux / Enduits lissage/ragréage poteaux] - [rel : P30 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C001 Circulation Poteaux : Peintures poteaux / Enduits lissage/ragréage poteaux]		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
1 Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 (6)	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1948	
Réf échantillon client : BV3KT7411 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe] - [rel : P31 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C001 Circulation Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe]		Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture / Enduit plâtreux blanc en faible quantité	
1 Colle polymère jaune + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable (1)	META (B) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1949	
Réf échantillon client : BV3KT7412 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe] - [rel : P32 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C012 attente brancard Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe]		Description ITGA : Matériau souple blanc / Colle polymère beige / Matériau fibreux beige / Colle polymère blanche	
1 Matériau souple blanc	META (B) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK
1 Colle polymère beige non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (B) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (5)
1 Colle polymère blanche	META (B) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1950	
Réf échantillon client : BV3KT7413 - [Poteaux : Peintures poteaux / Enduits lissage/ragréage poteaux] - [rel : P33 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - C001 Circulation Poteaux : Peintures poteaux / Enduits lissage/ragréage poteaux]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1951	
Réf échantillon client : BV3KT7414 - [Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades] - [rel : P35 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - Façades Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades]		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène avec poussières	
1 Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
Réf dossier client : 33034019		Réf échantillon ITGA : IT382607-1952	
Réf échantillon client : BV3KT7415 - [Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité] - [rel : P34 Rez-de-chaussée - Odontologie & radiologie - Façades Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité]		Description ITGA : Matériau souple blanc / Matériau compact gris en faible quantité	
1 Matériau souple blanc non séparable + Matériau compact gris en faible quantité non séparable (1)	META (B) le 20/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKK (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
(6) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

1.accréditation n° 1-6090

Validé par : Eline GARNIER Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
