

Extension du CROUS De Nantes - Site Berlioz
Phase DCE - AVRIL 2026

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**DUREE DES ETUDES**	**197 jrs**	**Mar 21/10/25**	**Mer 26/08/26**
2	**APD**	**30 jrs**	**Mar 21/10/25**	**Lun 01/12/25**
3	Rendu APD	0 jr	Mar 21/10/25	Mar 21/10/25
4	Approbation MOA	6 sem.	Mar 21/10/25	Lun 01/12/25
5	**PC**	**114 jrs**	**Mar 21/10/25**	**Ven 10/04/26**
6	Préparation PC	2 sem.	Mar 21/10/25	Lun 03/11/25
7	Dépôt du PC	0 jr	Ven 07/11/25	Ven 07/11/25
8	Instruction	3 m	Lun 10/11/25	Ven 13/02/26
9	Recours des tiers	2 m	Lun 16/02/26	Ven 10/04/26
10	**PRO**	**72 jrs**	**Mar 02/12/25**	**Mer 25/03/26**
11	Etudes PRO	34 jrs	Mar 02/12/25	Ven 30/01/26
12	Rendu PRO	0 jr	Ven 30/01/26	Ven 30/01/26
13	Approbation MOA	2 sem.	Lun 02/02/26	Ven 13/02/26
14	Reprise PRO	15 jrs	Lun 16/02/26	Ven 06/03/26
15	Validation MOA	5 jrs	Jeu 19/03/26	Mer 25/03/26
16	**DCE**	**25 jrs**	**Jeu 26/03/26**	**Mer 29/04/26**
17	Préparation DCE	3 sem.	Jeu 26/03/26	Mer 15/04/26
18	Rendu DCE	0 jr	Mer 15/04/26	Mer 15/04/26
19	Approbation DCE	2 sem.	Jeu 16/04/26	Mer 29/04/26
20	**ACT**	**70 jrs**	**Jeu 30/04/26**	**Mer 26/08/26**
21	APPEL D'OFFRES	6 sem.	Jeu 30/04/26	Mer 10/06/26
22	Remise des offres et ouvertures des plis	0 jr	Mer 10/06/26	Mer 10/06/26
23	RAO Final	4 sem.	Jeu 11/06/26	Mer 08/07/26
24	Jugement - Choix entreprises - Notification	20 jrs	Jeu 09/07/26	Mer 26/08/26
25	**DUREE DU CHANTIER**	**431 jrs**	**Mer 26/08/26**	**Jeu 08/06/28**
26	**Période de préparation**	**45 jrs**	**Mer 26/08/26**	**Mer 28/10/26**
27	O.S Préparation	0 jr	Mer 26/08/26	Mer 26/08/26
28	Préparation de chantier	2 m	Jeu 03/09/26	Mer 28/10/26
29	O.S travaux	0 jr	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26
30	**PHASE 01 - EXISTANT/RACCORDEMENT**	**30 jrs**	**Jeu 17/09/26**	**Mer 28/10/26**
31	Installation chantier	2 sem.	Jeu 17/09/26	Mer 30/09/26
32	Consignation/Neutralisation/dé-réseaux	1 sem.	Jeu 24/09/26	Mer 30/09/26
33	VRD - Préparation de terrain - Terrassement	20 jrs	Jeu 01/10/26	Mer 28/10/26
34	Mise en place des escaliers de secours + dépose des existants	15 jrs	Jeu 08/10/26	Mer 28/10/26
35	**PHASE 02 - CONSTRUCTION EXTENSION**	**386 jrs**	**Jeu 29/10/26**	**Jeu 08/06/28**
36	**Gros-Œuvre**	**220 jrs**	**Jeu 29/10/26**	**Mer 06/10/27**
37	**Batiment 1**	**220 jrs**	**Jeu 29/10/26**	**Mer 06/10/27**
38	Réalisation des pieux	15 jrs	Jeu 29/10/26	Mer 18/11/26
39	**RDC**	**65 jrs**	**Jeu 19/11/26**	**Mer 03/03/27**
40	Fondations	15 jrs	Jeu 19/11/26	Mer 09/12/26
41	Soubassements	10 jrs	Jeu 10/12/26	Mer 06/01/27
42	Réseaux sous-dallage	10 jrs	Jeu 17/12/26	Mer 13/01/27
43	Dallage	10 jrs	Jeu 14/01/27	Mer 27/01/27
44	Elévations	15 jrs	Jeu 28/01/27	Mer 17/02/27
45	Plancher haut	15 jrs	Jeu 11/02/27	Mer 03/03/27
46	**R+1**	**25 jrs**	**Jeu 04/03/27**	**Mer 07/04/27**
47	Elévations	15 jrs	Jeu 04/03/27	Mer 24/03/27
48	Plancher haut	15 jrs	Jeu 18/03/27	Mer 07/04/27
49	**R+2**	**25 jrs**	**Jeu 08/04/27**	**Mer 12/05/27**
50	Elevations	15 jrs	Jeu 08/04/27	Mer 28/04/27
51	Plancher haut	15 jrs	Jeu 22/04/27	Mer 12/05/27
52	**R+3**	**25 jrs**	**Jeu 13/05/27**	**Mer 16/06/27**
53	Elévations	15 jrs	Jeu 13/05/27	Mer 02/06/27
54	Plancher haut	15 jrs	Jeu 27/05/27	Mer 16/06/27
55	**R+4**	**25 jrs**	**Jeu 17/06/27**	**Mer 21/07/27**
56	Elevations	15 jrs	Jeu 17/06/27	Mer 07/07/27
57	Plancher haut	15 jrs	Jeu 01/07/27	Mer 21/07/27
58	**R+5**	**40 jrs**	**Jeu 22/07/27**	**Mer 06/10/27**
59	Elevations	15 jrs	Jeu 22/07/27	Mer 01/09/27
60	Plancher haut	15 jrs	Jeu 26/08/27	Mer 15/09/27
61	Accrotères	10 jrs	Jeu 16/09/27	Mer 29/09/27
62	Finitions diverses	5 jrs	Jeu 30/09/27	Mer 06/10/27
63	**Batiment 2**	**220 jrs**	**Jeu 28/01/27**	**Mer 05/01/28**
64	Réalisation des pieux	15 jrs	Jeu 28/01/27	Mer 17/02/27
65	**RDC**	**65 jrs**	**Jeu 18/02/27**	**Mer 19/05/27**
66	Fondations	15 jrs	Jeu 18/02/27	Mer 10/03/27
67	Soubassements	10 jrs	Jeu 11/03/27	Mer 24/03/27
68	Réseaux sous-dallage	10 jrs	Jeu 18/03/27	Mer 31/03/27
69	Dallage	10 jrs	Jeu 01/04/27	Mer 14/04/27
70	Elévations	15 jrs	Jeu 15/04/27	Mer 05/05/27
71	Plancher haut	15 jrs	Jeu 29/04/27	Mer 19/05/27
72	**R+1**	**25 jrs**	**Jeu 20/05/27**	**Mer 23/06/27**
73	Elévations	15 jrs	Jeu 20/05/27	Mer 09/06/27
74	Plancher haut	15 jrs	Jeu 03/06/27	Mer 23/06/27
75	**R+2**	**25 jrs**	**Jeu 24/06/27**	**Mer 28/07/27**
76	Elevations	15 jrs	Jeu 24/06/27	Mer 14/07/27
77	Plancher haut	15 jrs	Jeu 08/07/27	Mer 28/07/27
78	**R+3**	**25 jrs**	**Jeu 29/07/27**	**Mer 22/09/27**
79	Elévations	15 jrs	Jeu 29/07/27	Mer 08/09/27
80	Plancher haut	15 jrs	Jeu 02/09/27	Mer 22/09/27
81	**R+4**	**25 jrs**	**Jeu 23/09/27**	**Mer 27/10/27**
82	Elevations	15 jrs	Jeu 23/09/27	Mer 13/10/27
83	Plancher haut	15 jrs	Jeu 07/10/27	Mer 27/10/27
84	**R+5**	**40 jrs**	**Jeu 28/10/27**	**Mer 05/01/28**
85	Elevations	15 jrs	Jeu 28/10/27	Mer 17/11/27
86	Plancher haut	15 jrs	Jeu 11/11/27	Mer 01/12/27
87	Accrotères	10 jrs	Jeu 02/12/27	Mer 15/12/27
88	Finitions diverses	5 jrs	Jeu 16/12/27	Mer 05/01/28
89	**Clos couvert**	**155 jrs**	**Jeu 17/06/27**	**Mer 23/02/28**

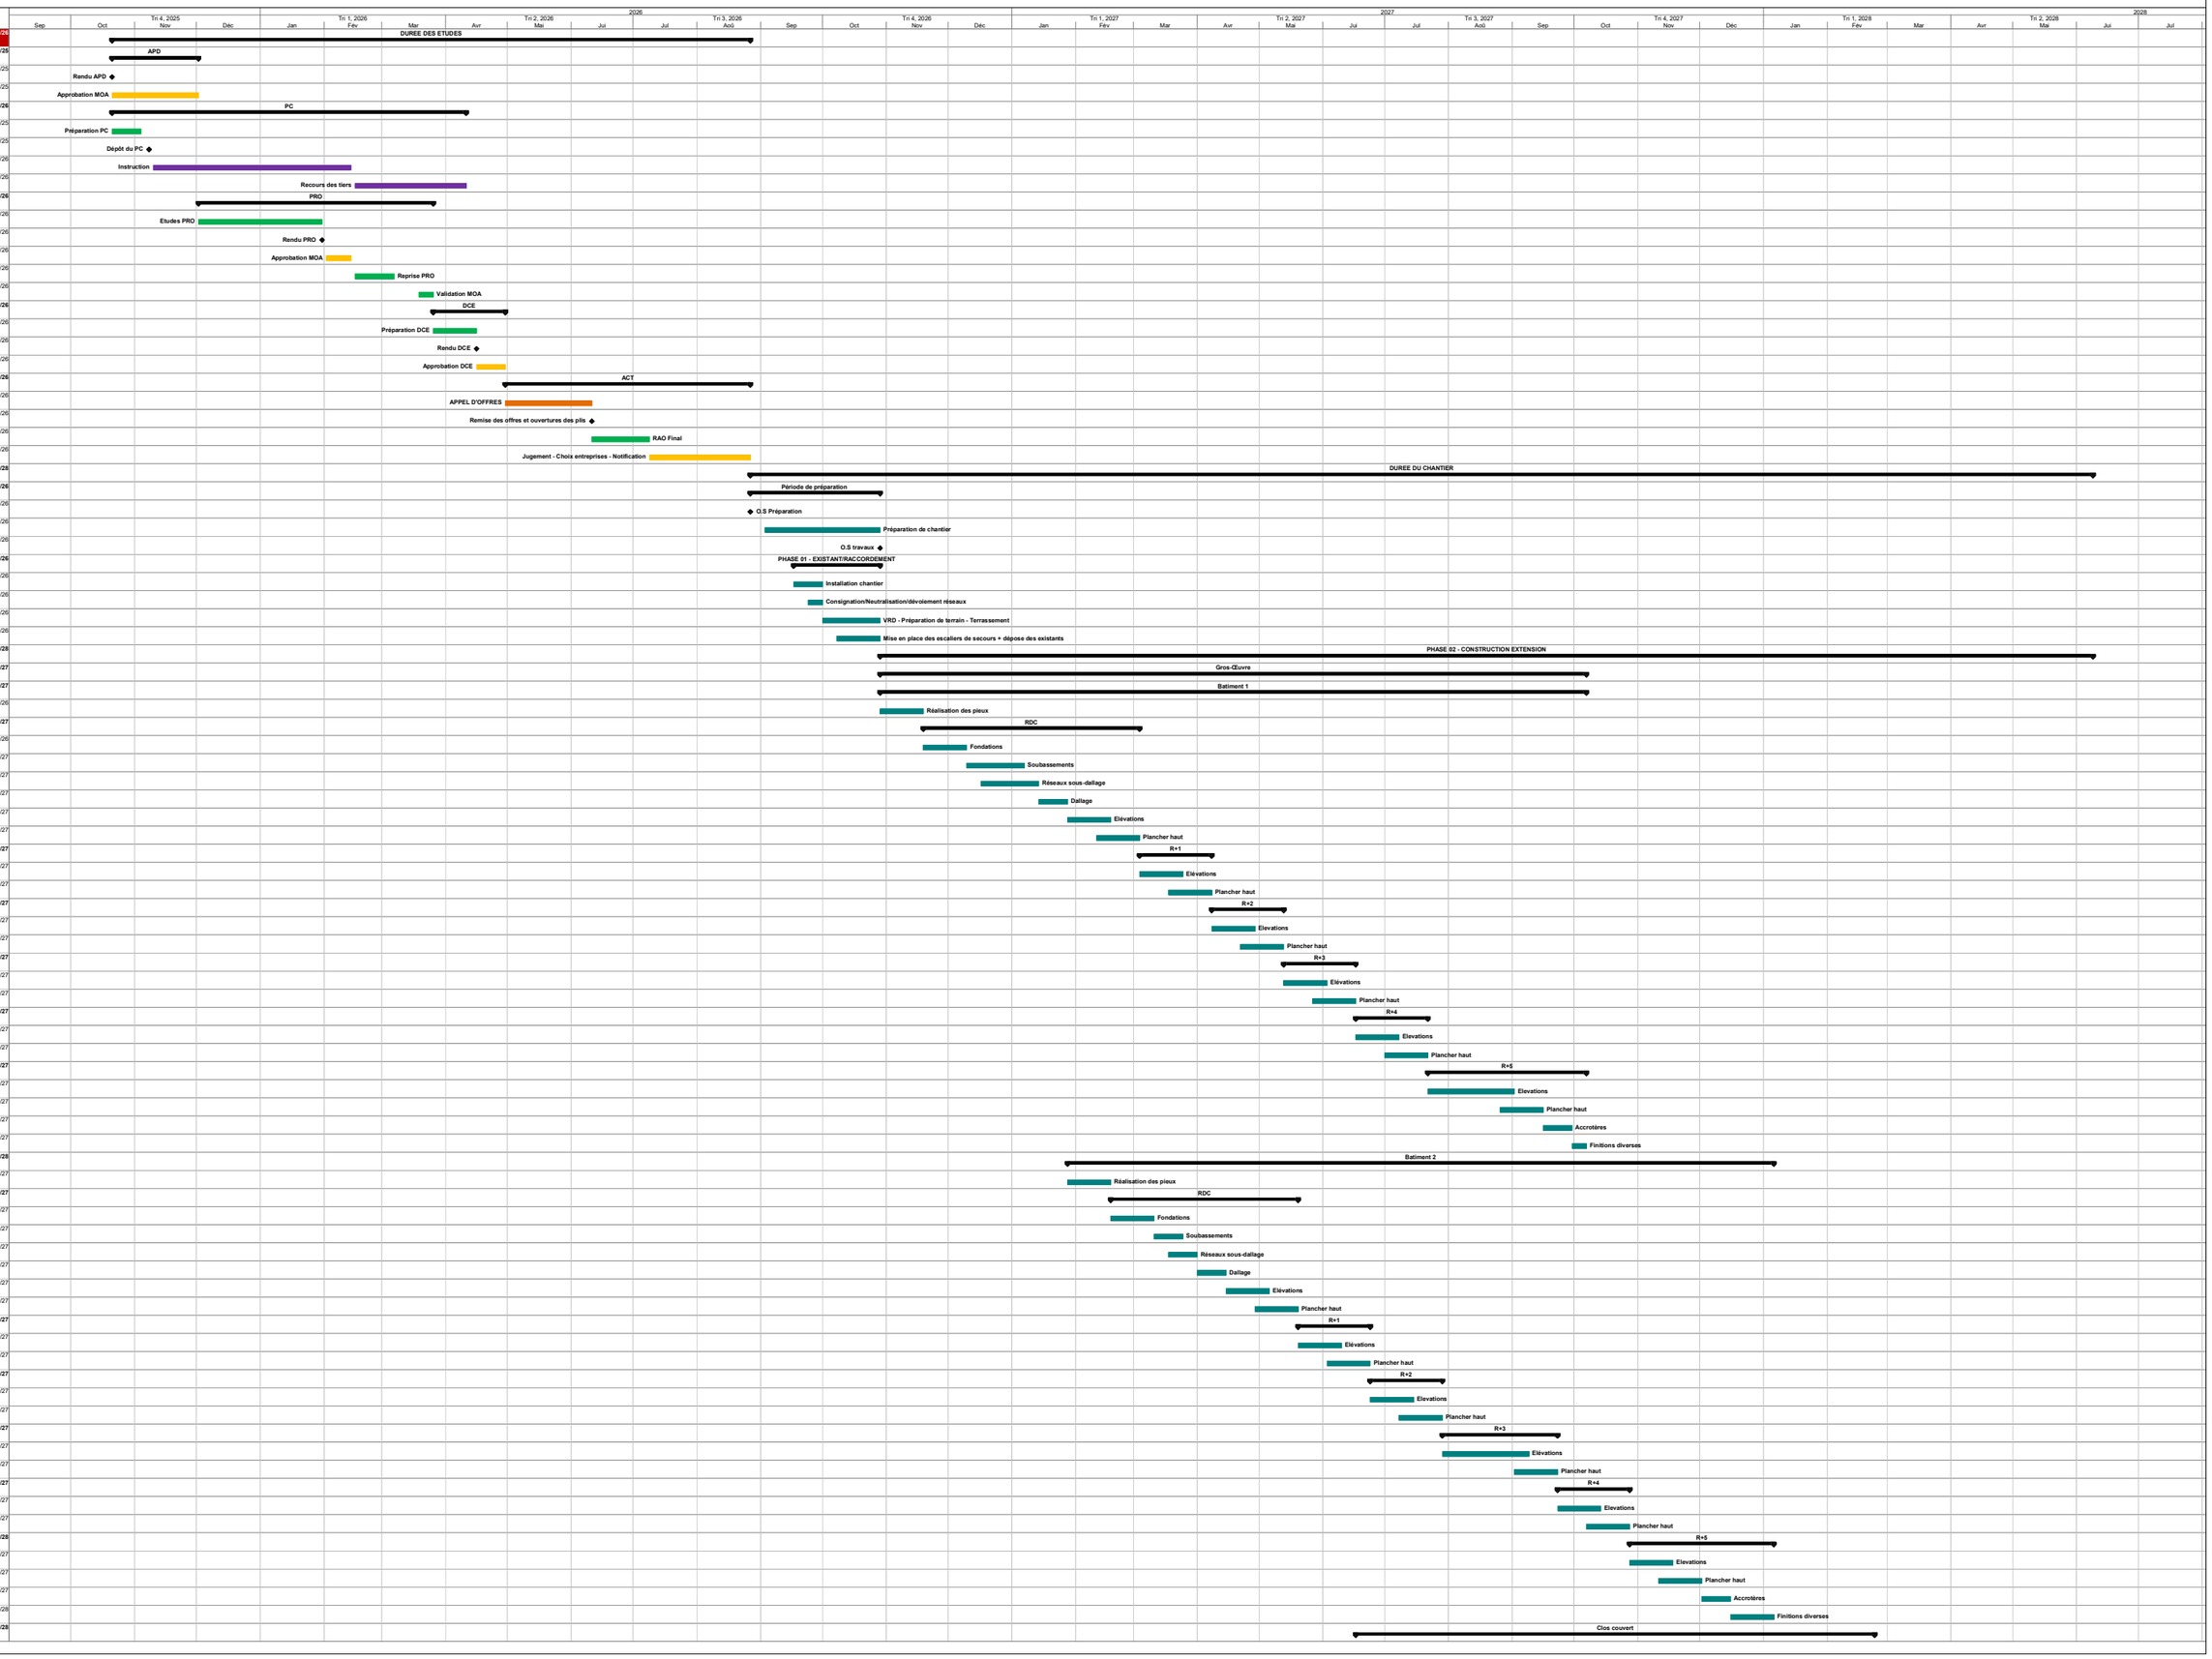

Extension du CROUS De Nantes - Site Berlioz
Phase DCE - AVRIL 2026

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
90	**BAT 1**	**134 jrs**	**Jeu 17/06/27**	**Mar 25/01/28**
91	Etanchéité	3 sem.	Jeu 30/09/27	Mer 20/10/27
92	Panneaux photovoltaique	2 sem.	Jeu 21/10/27	Mer 03/11/27
93	Bardage	60 jrs	Mer 20/10/27	Mar 25/01/28
94	**MEXT**	**74 jrs**	**Jeu 17/06/27**	**Mar 19/10/27**
95	R1	7 jrs	Jeu 17/06/27	Ven 25/06/27
96	R2	7 jrs	Jeu 22/07/27	Ven 30/07/27
97	R3	7 jrs	Jeu 16/09/27	Ven 24/09/27
98	R4	7 jrs	Jeu 30/09/27	Ven 08/10/27
99	R5	7 jrs	Lun 11/10/27	Mar 19/10/27
100	**BAT 2**	**100 jrs**	**Jeu 23/09/27**	**Mer 23/02/28**
101	Etanchéité	5 sem.	Jeu 06/01/28	Mer 09/02/28
102	Panneaux photovoltaique	2 sem.	Jeu 10/02/28	Mer 23/02/28
103	Bardage	60 jrs	Mer 17/11/27	Mar 22/02/28
104	**MEXT**	**82 jrs**	**Jeu 23/09/27**	**Ven 28/01/28**
105	R1	7 jrs	Jeu 23/09/27	Ven 01/10/27
106	R2	7 jrs	Jeu 28/10/27	Ven 05/11/27
107	R3	7 jrs	Jeu 02/12/27	Ven 10/12/27
108	R4	7 jrs	Jeu 06/01/28	Ven 14/01/28
109	R5	10 jrs	Lun 17/01/28	Ven 28/01/28
110	Second Œuvre	**174 jrs**	**Ven 30/07/27**	**Jeu 04/05/28**
111	**Bâtiment 1**	**110 jrs**	**Ven 30/07/27**	**Ven 04/02/28**
112	Appro huisseries	0 jr	Ven 30/07/27	Ven 30/07/27
113	**R+1**	**55 jrs**	**Lun 23/08/27**	**Ven 05/11/27**
114	Doublages/distributior	13 jrs	Lun 23/08/27	Mer 08/09/27
115	Bandes	5 jrs	Jeu 09/09/27	Mer 15/09/27
116	Impression peinture	7 jrs	Jeu 16/09/27	Ven 24/09/27
117	Plinthes	3 jrs	Lun 27/09/27	Mer 29/09/27
118	Pose faience	5 jrs	Jeu 30/09/27	Mer 06/10/27
119	Ragréage	2 jrs	Jeu 07/10/27	Ven 08/10/27
120	Peintures finitions	10 jrs	Lun 11/10/27	Ven 22/10/27
121	Sols Linoleum	10 jrs	Lun 18/10/27	Ven 29/10/27
122	Menuiseries Int	10 jrs	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
123	Appareillages plomberie/ CVC	10 jrs	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
124	Appareillages Electricité	10 jrs	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
125	**R+2**	**55 jrs**	**Lun 27/09/27**	**Ven 10/12/27**
126	Doublages/distributior	13 jrs	Lun 27/09/27	Mer 13/10/27
127	Bandes	5 jrs	Jeu 14/10/27	Mer 20/10/27
128	Impression peinture	7 jrs	Jeu 21/10/27	Ven 29/10/27
129	Plinthes	3 jrs	Lun 01/11/27	Mer 03/11/27
130	Pose faience	5 jrs	Jeu 04/11/27	Mer 10/11/27
131	Ragréage	2 jrs	Jeu 11/11/27	Ven 12/11/27
132	Peintures finitions	10 jrs	Lun 15/11/27	Ven 26/11/27
133	Sols Linoleum	10 jrs	Lun 22/11/27	Ven 03/12/27
134	Menuiseries Int	10 jrs	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
135	Appareillages plomberie/ CVC	10 jrs	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
136	Appareillages Electricité	10 jrs	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
137	**R+3**	**55 jrs**	**Lun 11/10/27**	**Ven 07/01/28**
138	Doublages/distributior	13 jrs	Lun 11/10/27	Mer 27/10/27
139	Bandes	5 jrs	Jeu 28/10/27	Mer 03/11/27
140	Impression peinture	7 jrs	Jeu 04/11/27	Ven 12/11/27
141	Plinthes	3 jrs	Lun 15/11/27	Mer 17/11/27
142	Pose faience	5 jrs	Jeu 18/11/27	Mer 24/11/27
143	Ragréage	2 jrs	Jeu 25/11/27	Ven 26/11/27
144	Peintures finitions	10 jrs	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
145	Sols Linoleum	10 jrs	Lun 06/12/27	Ven 17/12/27
146	Menuiseries Int	10 jrs	Lun 13/12/27	Ven 07/01/28
147	Appareillages plomberie/ CVC	10 jrs	Lun 13/12/27	Ven 07/01/28
148	Appareillages Electricité	10 jrs	Lun 13/12/27	Ven 07/01/28
149	**R+4**	**55 jrs**	**Mer 20/10/27**	**Mar 18/01/28**
150	Doublages/distributior	13 jrs	Mer 20/10/27	Ven 05/11/27
151	Bandes	5 jrs	Lun 08/11/27	Ven 12/11/27
152	Impression peinture	7 jrs	Lun 15/11/27	Mar 23/11/27
153	Plinthes	3 jrs	Mer 24/11/27	Ven 26/11/27
154	Pose faience	5 jrs	Lun 29/11/27	Ven 03/12/27
155	Ragréage	2 jrs	Lun 06/12/27	Mar 07/12/27
156	Peintures finitions	10 jrs	Mer 08/12/27	Mar 04/01/28
157	Sols Linoleum	10 jrs	Mer 15/12/27	Mar 11/01/28
158	Menuiseries Int	10 jrs	Mer 05/01/28	Mar 18/01/28
159	Appareillages plomberie/ CVC	10 jrs	Mer 05/01/28	Mar 18/01/28
160	Appareillages Electricité	10 jrs	Mer 05/01/28	Mar 18/01/28
161	**R+5**	**55 jrs**	**Lun 08/11/27**	**Ven 04/02/28**
162	Doublages/distributior	13 jrs	Lun 08/11/27	Mer 24/11/27
163	Bandes	5 jrs	Jeu 25/11/27	Mer 01/12/27
164	Impression peinture	7 jrs	Jeu 02/12/27	Ven 10/12/27
165	Plinthes	3 jrs	Lun 13/12/27	Mer 15/12/27
166	Pose faience	5 jrs	Jeu 16/12/27	Mer 05/01/28
167	Ragréage	2 jrs	Jeu 06/01/28	Ven 07/01/28
168	Peintures finitions	10 jrs	Lun 10/01/28	Ven 21/01/28
169	Sols Linoleum	10 jrs	Lun 17/01/28	Ven 28/01/28
170	Menuiseries Int	10 jrs	Lun 24/01/28	Ven 04/02/28
171	Appareillages plomberie/ CVC	10 jrs	Lun 24/01/28	Ven 04/02/28
172	Appareillages Electricité	10 jrs	Lun 24/01/28	Ven 04/02/28
173	**Bâtiment 2**	**118 jrs**	**Lun 08/11/27**	**Mer 03/05/28**
174	**R+1**	**55 jrs**	**Lun 08/11/27**	**Ven 04/02/28**
175	Doublages/distributior	13 jrs	Lun 08/11/27	Mer 24/11/27
176	Bandes	5 jrs	Jeu 25/11/27	Mer 01/12/27
177	Impression peinture	7 jrs	Jeu 02/12/27	Ven 10/12/27
178	Plinthes	3 jrs	Lun 13/12/27	Mer 15/12/27

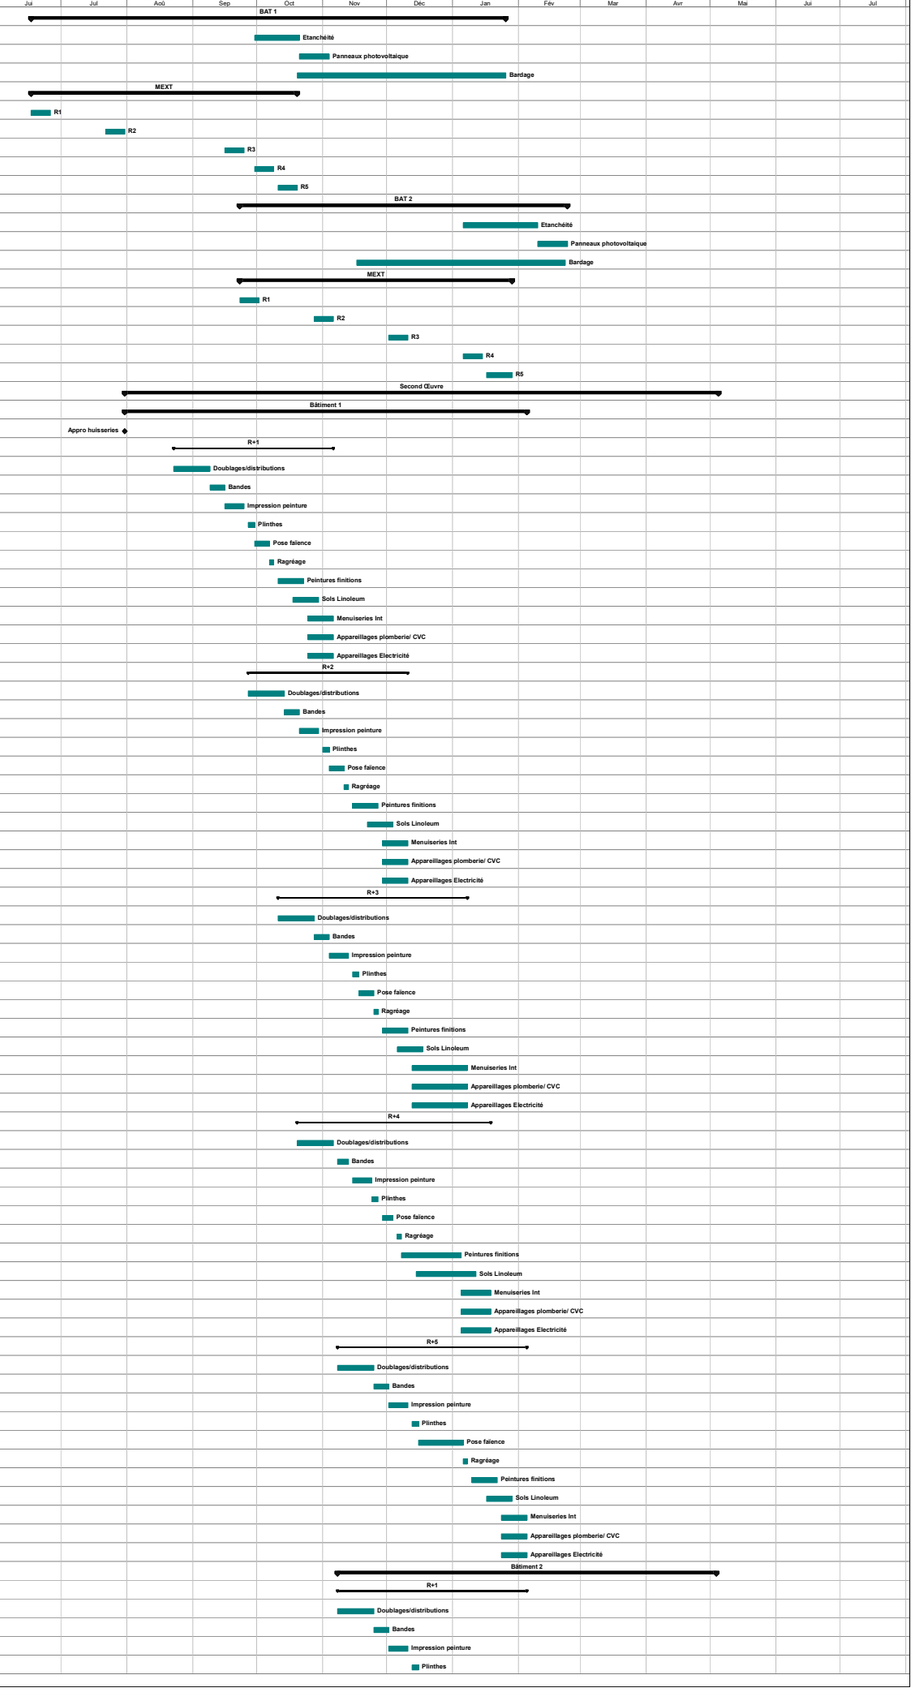

inteco
INGENIERIE - TECHNIQUE - COORDINATION

Extension du CROUS De Nantes - Site Berlioz
Phase DCE - AVRIL 2026

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
179	Pose faience	5 jrs	Jeu 16/12/27	Mer 05/01/28
180	Ragréage	2 jrs	Jeu 06/01/28	Ven 07/01/28
181	Peintures finitions	10 jrs	Lun 10/01/28	Ven 21/01/28
182	Sols Linoleum	10 jrs	Lun 17/01/28	Ven 28/01/28
183	Menuiseries Int	10 jrs	Lun 24/01/28	Ven 04/02/28
184	Appareillages plomberie/ CVC	10 jrs	Lun 24/01/28	Ven 04/02/28
185	Appareillages Electricité	10 jrs	Lun 24/01/28	Ven 04/02/28
186	**R+2**	**55 jrs**	**Lun 13/12/27**	**Ven 10/03/28**
187	Doublages/distribution	13 jrs	Lun 13/12/27	Mer 12/01/28
188	Bandes	5 jrs	Jeu 13/01/28	Mer 19/01/28
189	Impression peinture	7 jrs	Jeu 20/01/28	Ven 28/01/28
190	Plinthes	3 jrs	Lun 31/01/28	Mer 02/02/28
191	Pose faience	5 jrs	Jeu 03/02/28	Mer 09/02/28
192	Ragréage	2 jrs	Jeu 10/02/28	Ven 11/02/28
193	Peintures finitions	10 jrs	Lun 14/02/28	Ven 25/02/28
194	Sols Linoleum	10 jrs	Lun 21/02/28	Ven 03/03/28
195	Menuiseries Int	10 jrs	Lun 28/02/28	Ven 10/03/28
196	Appareillages plomberie/ CVC	10 jrs	Lun 28/02/28	Ven 10/03/28
197	Appareillages Electricité	10 jrs	Lun 28/02/28	Ven 10/03/28
198	**R+3**	**55 jrs**	**Lun 17/01/28**	**Ven 31/03/28**
199	Doublages/distribution	13 jrs	Lun 17/01/28	Mer 02/02/28
200	Bandes	5 jrs	Jeu 03/02/28	Mer 09/02/28
201	Impression peinture	7 jrs	Jeu 10/02/28	Ven 18/02/28
202	Plinthes	3 jrs	Lun 21/02/28	Mer 23/02/28
203	Pose faience	5 jrs	Jeu 24/02/28	Mer 01/03/28
204	Ragréage	2 jrs	Jeu 02/03/28	Ven 03/03/28
205	Peintures finitions	10 jrs	Lun 06/03/28	Ven 17/03/28
206	Sols Linoleum	10 jrs	Lun 13/03/28	Ven 24/03/28
207	Menuiseries Int	10 jrs	Lun 20/03/28	Ven 31/03/28
208	Appareillages plomberie/ CVC	10 jrs	Lun 20/03/28	Ven 31/03/28
209	Appareillages Electricité	10 jrs	Lun 20/03/28	Ven 31/03/28
210	**R+4**	**55 jrs**	**Lun 31/01/28**	**Ven 14/04/28**
211	Doublages/distribution	13 jrs	Lun 31/01/28	Mer 16/02/28
212	Bandes	5 jrs	Jeu 17/02/28	Mer 23/02/28
213	Impression peinture	7 jrs	Jeu 24/02/28	Ven 03/03/28
214	Plinthes	3 jrs	Lun 06/03/28	Mer 08/03/28
215	Pose faience	5 jrs	Jeu 09/03/28	Mer 15/03/28
216	Ragréage	2 jrs	Jeu 16/03/28	Ven 17/03/28
217	Peintures finitions	10 jrs	Lun 20/03/28	Ven 31/03/28
218	Sols Linoleum	10 jrs	Lun 27/03/28	Ven 07/04/28
219	Menuiseries Int	10 jrs	Lun 03/04/28	Ven 14/04/28
220	Appareillages plomberie/ CVC	10 jrs	Lun 03/04/28	Ven 14/04/28
221	Appareillages Electricité	10 jrs	Lun 03/04/28	Ven 14/04/28
222	**R+5**	**55 jrs**	**Jeu 17/02/28**	**Mer 03/05/28**
223	Doublages/distribution	13 jrs	Jeu 17/02/28	Lun 06/03/28
224	Bandes	5 jrs	Mar 07/03/28	Lun 13/03/28
225	Impression peinture	7 jrs	Mar 14/03/28	Mer 22/03/28
226	Plinthes	3 jrs	Jeu 23/03/28	Lun 27/03/28
227	Pose faience	5 jrs	Mar 28/03/28	Lun 03/04/28
228	Ragréage	2 jrs	Mar 04/04/28	Mer 05/04/28
229	Peintures finitions	10 jrs	Jeu 06/04/28	Mer 19/04/28
230	Sols Linoleum	10 jrs	Jeu 13/04/28	Mer 26/04/28
231	Menuiseries Int	10 jrs	Jeu 20/04/28	Mer 03/05/28
232	Appareillages plomberie/ CVC	10 jrs	Jeu 20/04/28	Mer 03/05/28
233	Appareillages Electricité	10 jrs	Jeu 20/04/28	Mer 03/05/28
234	**Parties communes Bat 1 & 2**	**43 jrs**	**Mar 07/03/28**	**Jeu 04/05/28**
235	Doublages/Distributions	13 jrs	Mar 07/03/28	Jeu 23/03/28
236	Bandes	5 jrs	Ven 17/03/28	Jeu 23/03/28
237	Impression peinture	5 jrs	Ven 24/03/28	Jeu 30/03/28
238	Plinthes	5 jrs	Ven 31/03/28	Jeu 06/04/28
239	Pose faience	2 jrs	Ven 07/04/28	Lun 10/04/28
240	Ragréage	3 jrs	Mar 11/04/28	Jeu 13/04/28
241	Peintures finitions	5 jrs	Ven 14/04/28	Jeu 20/04/28
242	Sols Linoleum	5 jrs	Ven 21/04/28	Jeu 27/04/28
243	Menuiseries Int	5 jrs	Ven 28/04/28	Jeu 04/05/28
244	Appareillages plomberie/ CVC	5 jrs	Ven 28/04/28	Jeu 04/05/28
245	Appareillages Electricité	5 jrs	Ven 28/04/28	Jeu 04/05/28
246	**LAVERIE**	**40 jrs**	**Lun 17/01/28**	**Ven 10/03/28**
247	Réhab de la laverie	40 jrs	Lun 17/01/28	Ven 10/03/28
248	**Lots Techniques**	**345 jrs**	**Jeu 19/11/26**	**Mer 03/05/28**
249	Electricité	345 jrs	Jeu 19/11/26	Mer 03/05/28
250	Plomberie	345 jrs	Jeu 19/11/26	Mer 03/05/28
251	**Lot VRD**	**40 jrs**	**Mar 07/03/28**	**Lun 01/05/28**
252	Aménagement extérieur	8 sem.	Mar 07/03/28	Lun 01/05/28
253	Pose des escaliers de secours	5 jrs	Mar 07/03/28	Lun 13/03/28
254	**Réception**	**89 jrs**	**Lun 07/02/28**	**Jeu 08/06/28**
255	Remise en état des chambres neutralisées - BAT 1	15 jrs	Mar 14/03/28	Lun 03/04/28
256	Remise en état des chambres neutralisées - BAT 2	15 jrs	Mar 04/04/28	Lun 24/04/28
257	Dépose des escaliers provisoires	2 jrs	Ven 31/03/28	Lun 03/04/28
258	**Batiment 1**	**89 jrs**	**Lun 07/02/28**	**Jeu 08/06/28**
259	Nettoyage	5 jrs	Lun 07/02/28	Ven 11/02/28
260	OPR	0 jr	Ven 11/02/28	Ven 11/02/28
261	Levée de réserves	20 jrs	Lun 14/02/28	Ven 10/03/28
262	Reception	0 jr	Jeu 08/06/28	Jeu 08/06/28
263	**Batiment 2**	**25 jrs**	**Ven 05/05/28**	**Jeu 08/06/28**
264	Nettoyage	5 jrs	Ven 05/05/28	Jeu 11/05/28
265	OPR	0 jr	Jeu 11/05/28	Jeu 11/05/28
266	Levée de réserves	20 jrs	Ven 12/05/28	Jeu 08/06/28
267	Reception	0 jr	Jeu 08/06/28	Jeu 08/06/28

