Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

4 rue Jean Catelas
80000 AMIENS

Propriétaire
CCI AMIENS PICARDIE SIC
6 Boulevard Belfort
80039 AMIENS

Demandeur
CCI AMIENS PICARDIE SIC - M. Gilles PHILIPOT
6 Boulevard Belfort
80039 AMIENS

Nature des travaux : **Rénovation / Réhabilitation : OUI** **Démolition : NON**

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

Date du rapport : 22/02/2023

Date de visite : 03/02/2023

Nombre de pages : 59

Fait à : 76230 ISNEAUVILLE

Référence du dossier :
2302CHNRO2303007AB - 4 Jean Catelas AMIENS

Le présent rapport est établi par :
Antoine BLOT

dont les compétences sont certifiées par : SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du 08/09/2022 au 07/09/2029
Certificat de compétence :
n° DTI / 1310-009
Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2023

Révision	*Date*	*Objet*
Version initiale	*22/02/2023*	*Établissement du Dossier Technique*

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. CADRE DE LA MISSION 3

1. Objet de la mission 3
2. Références règlementaires et normatives 3
3. Programme des travaux du donneur d'ordre 4
4. Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés) 4
5. Description du bien 5

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE 6

1. Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb 6
2. Stratégie de mesurage 6
3. Présentation des résultats 7

III. PROTOCOLE DU REPERAGE 7

1. Identification des locaux 7
2. Identification des zones 7
3. Identification des revêtements 7
4. Identification des unités de repérage et substrat 8

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE 9

V. DEROULEMENT DE LA MISSION 10

1. Prestations réalisées : 10
2. Personnes présentes lors de la visite : 10
3. Informations complémentaires sur la visite 10
4. Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission 10
5. Plans des parties d'immeuble concernées par la mission 10

VI. RESULTATS DETAILLES 11

Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX 45

Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 53

Annexe 3 - PV ANALYSES 54

Annexe 4 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 55

Annexe 5 - Attestation d'assurance 56

Annexe 6 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF 57

Annexe 7 - NOTICE D'INFORMATION 58

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.
La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été inclue dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

> Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

> Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants

> Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb

> Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Rénovation globale du bâtiment

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	Vol 1
Rez de chaussée	Vol 2
Rez de chaussée	Vol 3
Rez de chaussée	Vol 4
Rez de chaussée	Vol 5
Rez de chaussée	Vol 6
Rez de chaussée	Vol 7
Rez de chaussée	Vol 8
1er étage	Vol 9
1er étage	Vol 10
1er étage	Vol 11
1er étage	Vol 12
1er étage	Vol 13
1er étage	Vol 14
1er étage	Vol 15
1er étage	Vol 16
1er étage	Vol 17
2ème étage	Vol 18
2ème étage	Vol 19
2ème étage	Vol 20
2ème étage	Vol 21
2ème étage	Vol 22
2ème étage	Vol 23
2ème étage	Vol 24
2ème étage	Vol 25
2ème étage	Vol 26
2ème étage	Vol 27
3ème étage	Vol 28
3ème étage	Vol 29
3ème étage	Vol 30
3ème étage	Vol 31
3ème étage	Vol 32
3ème étage	Vol 33
3ème étage	Vol 34
3ème étage	Vol 35
3ème étage	Vol 36
3ème étage	Vol 37
Combles	Vol 38
Combles	Vol 39
Combles	Vol 40
Combles	Vol 41
Combles	Vol 42
Combles	Vol 43
Appentis	Vol 44
Appentis	Vol 45

Sous-Sol	Vol 46
Sous-Sol	Vol 47
Sous-Sol	Vol 48
Sous-Sol	Vol 49
Sous-Sol	Vol 50
Sous-Sol	Vol 51
Sous-Sol	Vol 52
Bâtiment	Façades
Bâtiment	Toiture
Appentis	Façades
Appentis	Toiture

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
Néant	

Eléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
Néant		

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Bureaux
Année de construction : < 1997

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1mg/cm²) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,…).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, …). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :
> La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :
- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction.

III. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :
- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
> chaque palier ;
> chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
> gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.
Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, …) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement

effectuée, leur recherche n'a pas été inclue dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.
Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :
- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :
> l'ensemble des plinthes d'un même local ;
> l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
> une porte et son huisserie dans un même local ;
> une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
> l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :
> les différents murs d'une même pièce ;
> des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
> les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
> des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile… car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
> une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :
> l'ensemble des marches ;
> l'ensemble des contremarches ;
> l'ensemble des balustres ;
> le limon ;
> la crémaillère ;
> la main courante ;
> le plafond.

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**	
Modèle de l'appareil	**FENX**	
N° de série de l'appareil	**2-0456**	
Nature du radionucléide	**Cd109**	
Date du dernier chargement de la source	**16/07/2019 00:00:00**	Activité à cette date et durée de vie : **850 Mbq**
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1er Janvier 2019	**N° T620412**	Date de déclaration **07/02/2022 00:00:00**
	Date de fin de validité de l'autorisation **Déclaration ASN / màj 2022**	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	**DELATTRE Olivier**	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	**LAGARRIGUE Florian**	

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	03/02/2023	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1226	03/02/2023	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.
Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.

☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> M. Gilles PHILIPOT

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Le diagnostic se limite aux zones habitables rendues visibles et accessibles par le propriétaire

4. DOCUMENTS COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
Rez de Chaussée	Rez de Chaussée
1er Etage	1er Etage
2ème Etage	2ème Etage
3ème Etage	3ème Etage
Combles	Combles
Sous-sol	Sous-sol
Façades et toitures	Façades et toitures

VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Rez de chaussée - Vol 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2	Mur	A	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,04		
3	Mur	A	Enduit	Papier peint	Mur (partie haute)	0		
4					Mur (au centre)	0		
5	Mur	B	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,24		
6					Mur (partie haute)	0,39		
7					Mur (au centre)	0,36		
8	Mur	C	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,38		
9					Mur (partie haute)	0,4		
10					Mur (au centre)	0,32		
11	Mur	D	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,12		
12					Mur (partie haute)	0,06		
13					Mur (au centre)	0,28		
14	Mur	E	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,26		
15					Mur (partie haute)	0,12		
16					Mur (au centre)	0,27		
17	Mur	F	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,29		
18					Mur (partie haute)	0,23		
19					Mur (au centre)	0,13		
20	Mur	G	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,1		
21					Mur (partie haute)	0,34		
22					Mur (au centre)	0,06		
23	Mur	H	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,3		
24					Mur (partie haute)	0,09		
25					Mur (au centre)	0,09		
26	Porte extérieure (P1)	A	Métal	Peinture	Porte extérieure (P1) (partie basse)	3,44		
27					Porte extérieure (P1) (partie haute)	2,22		
28	Huisserie Porte extérieure (P1)	A	Métal	Peinture	Huisserie Porte extérieure (P1) (partie basse)	6,7		
29					Huisserie Porte extérieure (P1) (partie haute)	4,34		
30	Porte (P2)	C	Bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,05		
31					Porte (P2) (partie haute)	0,26		
32	Huisserie Porte (P2)	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,27		
33					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,12		
34	Porte (P3)	D	Bois	Peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,01		
35					Porte (P3) (partie haute)	0,01		
36	Huisserie Porte (P3)	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,2		
37					Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,38		
38	Porte (P4)	E	Bois	Peinture	Porte (P4) (partie basse)	0,09		
39					Porte (P4) (partie haute)	0,29		
40	Huisserie Porte (P4)	E	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P4) (partie basse)	0,15		
41					Huisserie Porte (P4) (partie haute)	0,28		
42	Porte (P5)	F	Bois	Peinture	Porte (P5) (partie basse)	0,3		
43					Porte (P5) (partie haute)	0,19		
44	Huisserie Porte (P5)	F	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P5) (partie basse)	0,12		
45					Huisserie Porte (P5) (partie haute)	0,29		
-	Marches	D	Pierre	Brut	Marches (Non mesurée)			
-					Marches (Non mesurée)			
-	Contremarches	D	Pierre	Brut	Contremarches (Non mesurée)			
-					Contremarches (Non mesurée)			

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Marches	E	Pierre	Brut	Marches (Non mesurée)			
-					Marches (Non mesurée)			
-	Contremarches	E	Pierre	Brut	Contremarches (Non mesurée)			
-					Contremarches (Non mesurée)			
46	Porte (P6)	C	Bois	Peinture	Porte (P6) (partie basse)	0,11		
47					Porte (P6) (partie haute)	0,12		
48	Huisserie Porte (P6)	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P6) (partie basse)	0,07		
49					Huisserie Porte (P6) (partie haute)	0,37		
50	Porte (P7)	D	Bois	Peinture	Porte (P7) (partie basse)	0,34		
51					Porte (P7) (partie haute)	0,15		
52	Huisserie Porte (P7)	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P7) (partie basse)	0,27		
53					Huisserie Porte (P7) (partie haute)	0,11		
54	Porte (P8)	E	Bois	Peinture	Porte (P8) (partie basse)	0		
55					Porte (P8) (partie haute)	0,3		
56	Huisserie Porte (P8)	E	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P8) (partie basse)	0,09		
57					Huisserie Porte (P8) (partie haute)	0,28		
58	Porte (P9)	F	Bois	Peinture	Porte (P9) (partie basse)	0,09		
59					Porte (P9) (partie haute)	0,18		
60	Huisserie Porte (P9)	F	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P9) (partie basse)	0,04		
61					Huisserie Porte (P9) (partie haute)	0,27		
62	Porte (P10)	B	Bois	Peinture	Porte (P10) (partie basse)	0,3		
63					Porte (P10) (partie haute)	0,19		
64	Huisserie Porte (P10)	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P10) (partie basse)	0,12		
65					Huisserie Porte (P10) (partie haute)	0,29		
168	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,34		
169					Plafond (mesure 2)	0		
Nombre d'unités de diagnostic : 34								

Rez de chaussée - Vol 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
66	Mur	A	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,15		
67					Mur (partie haute)	0,34		
68					Mur (au centre)	0,15		
69	Mur	B	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,24		
70					Mur (partie haute)	0,1		
71					Mur (au centre)	0,22		
72	Mur	C	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,26		
73					Mur (partie haute)	0,25		
74					Mur (au centre)	0,18		
75	Mur	D	Enduit	Papier peint	Mur (partie basse)	0,24		
76					Mur (partie haute)	0,19		
77					Mur (au centre)	0,28		
170	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,21		
171					Plafond (mesure 2)	0,22		
172	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,18		
173					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,21		
174	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,2		
175					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,13		
176	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,2		
177					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,15		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
178	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,23		
179					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,22		
725	Volets	C	Métal	Peinture	Volets (mesure 1)	7,47		
726					Volets (mesure 2)	2,35		
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

Rez de chaussée - Vol 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
78	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,13		
79					Mur (partie haute)	0,26		
80					Mur (au centre)	0,07		
81	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,38		
82					Mur (partie haute)	0,21		
83					Mur (au centre)	0,03		
84	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,02		
85					Mur (partie haute)	0,27		
86					Mur (au centre)	0,02		
87	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,04		
88					Mur (partie haute)	0,09		
89					Mur (au centre)	0,29		
180	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,08		
181					Plafond (mesure 2)	0,16		
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

Rez de chaussée - Vol 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
90	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,08		
91					Mur (partie haute)	0,26		
92					Mur (au centre)	0,1		
93	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,18		
94					Mur (partie haute)	0,18		
95					Mur (au centre)	0,4		
96	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,17		
97					Mur (partie haute)	0,04		
98					Mur (au centre)	0,11		
99	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,16		
100					Mur (partie haute)	0,25		
101					Mur (au centre)	0,32		
182	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,23		
183					Plafond (mesure 2)	0,26		
184	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,18		
185					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,12		
186	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08		
187					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02		
188	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,13		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
189					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,11		
190	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,29		
191					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03		
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

Rez de chaussée - Vol 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
102	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0		
103					Mur (partie haute)	0,28		
104					Mur (au centre)	0,34		
105	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,11		
106					Mur (partie haute)	0,2		
107					Mur (au centre)	0,16		
108	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,29		
109					Mur (partie haute)	0,4		
110					Mur (au centre)	0,3		
111	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,17		
112					Mur (partie haute)	0,37		
113					Mur (au centre)	0,02		
192	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,28		
193					Plafond (mesure 2)	0,11		
194	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,23		
195					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,39		
196	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,27		
197					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,33		
198	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,1		
199					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,18		
200	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,15		
201					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,28		
727	Volets	D	Métal	Peinture	Volets (mesure 1)	7,22		
728					Volets (mesure 2)	6,26		
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

Rez de chaussée - Vol 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
114	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,1		
115					Mur (partie haute)	0,28		
116					Mur (au centre)	0,39		
117	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,19		
118					Mur (partie haute)	0,05		
119					Mur (au centre)	0,18		
120	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,2		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
121					Mur (partie haute)	0,09		
122					Mur (au centre)	0,02		
123	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,19		
124					Mur (partie haute)	0,14		
125					Mur (au centre)	0,22		
126	Mur	E	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,22		
127					Mur (partie haute)	0,34		
128					Mur (au centre)	0,1		
129	Mur	F	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,38		
130					Mur (partie haute)	0,04		
131					Mur (au centre)	0,1		
202	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,18		
203					Plafond (mesure 2)	0,35		
204	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,12		
205					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04		
206	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,14		
207					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08		
208	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,22		
209					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,19		
210	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,21		
211					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,23		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez de chaussée - Vol 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
132	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,02		
133					Mur (partie haute)	0,23		
134					Mur (au centre)	0,36		
135	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,2		
136					Mur (partie haute)	0,09		
137					Mur (au centre)	0,39		
138	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,18		
139					Mur (partie haute)	0,36		
140					Mur (au centre)	0,18		
141	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,27		
142					Mur (partie haute)	0,13		
143					Mur (au centre)	0,36		
144	Porte (P1)	C	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,18		
145					Porte (P1) (partie haute)	0,14		
146	Huisserie Porte (P1)	C	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,11		
147					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,1		
148	Porte extérieure (P2)	D	Métal	Peinture	Porte extérieure (P2) (partie basse)	5,36		
149					Porte extérieure (P2) (partie haute)	7,22		
150	Huisserie Porte extérieure (P2)	D	Métal	Peinture	Huisserie Porte extérieure (P2) (partie basse)	3,44		
151					Huisserie Porte extérieure (P2) (partie haute)	7,86		
-	Plafond		Dalle de faux-plafond	Brut	Plafond (Non mesurée)			
-					Plafond (Non mesurée)			

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
212	Fenêtre intérieure (F1)	D	Métal	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,39		
213					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,12		
214	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	D	Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,23		
215					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,13		
216	Fenêtre extérieure (F1)	D	Métal	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,4		
217					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,2		
218	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	D	Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,25		
219					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,07		
723	Volets	D	Bois	Vernis	Volets (mesure 1)	0,04		
724					Volets (mesure 2)	0,02		
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

Rez de chaussée - Vol 8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
152	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,31		
153					Mur (partie haute)	0,34		
154					Mur (au centre)	0,12		
155	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,04		
156					Mur (partie haute)	0,14		
157					Mur (au centre)	0,08		
158	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,22		
159					Mur (partie haute)	0,19		
160					Mur (au centre)	0,1		
161	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,12		
162					Mur (partie haute)	0,04		
163					Mur (au centre)	0,25		
164	Porte (P1)	C	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,29		
165					Porte (P1) (partie haute)	0,14		
166	Huisserie Porte (P1)	C	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,3		
167					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,32		
-	Plafond		Dalle de faux-plafond	Brut	Plafond (Non mesurée)			
-					Plafond (Non mesurée)			
220	Fenêtre intérieure (F1)	B	Métal	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,1		
221					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,17		
222	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09		
223					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,3		
224	Fenêtre extérieure (F1)	B	Métal	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,12		
225					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,37		
226	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,24		
227					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,25		
729	Volets	B	Bois	Vernis	Volets (mesure 1)	0,08		
730					Volets (mesure 2)	0,02		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - Vol 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
228	Mur supérieur	A	Enduit	Papier peint	Mur supérieur (partie basse)	0,34		
229					Mur supérieur (partie haute)	0,12		
230					Mur supérieur (au centre)	0,04		
231	Mur supérieur	B	Enduit	Papier peint	Mur supérieur (partie basse)	0,14		
232					Mur supérieur (partie haute)	0,08		
233					Mur supérieur (au centre)	0,22		
234	Mur supérieur	C	Enduit	Papier peint	Mur supérieur (partie basse)	0,19		
235					Mur supérieur (partie haute)	0,1		
236					Mur supérieur (au centre)	0,23		
237	Mur supérieur	D	Enduit	Papier peint	Mur supérieur (partie basse)	0,04		
238					Mur supérieur (partie haute)	0,35		
239					Mur supérieur (au centre)	0,19		
240	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,14		
241					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04		
242	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09		
243					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,21		
244	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,27		
245					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,14		
246	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,13		
247					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,28		
248	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,12		
249					Plafond (mesure 2)	0,33		
272	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,38		
273					Porte (P1) (partie haute)	0,18		
274	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,2		
275					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,04		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

1er étage - Vol 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
250	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,11		
251					Mur (partie haute)	0,37		
252					Mur (au centre)	0,39		
253	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,01		
254					Mur (partie haute)	0,33		
255					Mur (au centre)	0,24		
256	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,08		
257					Mur (partie haute)	0,29		
258					Mur (au centre)	0,28		
259	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,13		
260					Mur (partie haute)	0,29		
261					Mur (au centre)	0,3		
262	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,17		
263					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,21		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
264	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,14		
265					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,1		
266	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05		
267					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,16		
268	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,14		
269					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,32		
270	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,09		
271					Plafond (mesure 2)	0,3		
276	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,27		
277					Porte (P1) (partie haute)	0,34		
278	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,07		
279					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,07		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

1er étage - Vol 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
280	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,21		
281					Mur (partie haute)	0,39		
282					Mur (au centre)	0,1		
283	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,3		
284					Mur (partie haute)	0,16		
285					Mur (au centre)	0,28		
286	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,31		
287					Mur (partie haute)	0,2		
288					Mur (au centre)	0,13		
289	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,3		
290					Mur (partie haute)	0,25		
291					Mur (au centre)	0,33		
292	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,05		
293					Porte (P1) (partie haute)	0,4		
294	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0		
295					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,38		
296	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,02		
297					Plafond (mesure 2)	0,09		
298	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09		
299					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,24		
300	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,2		
301					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,12		
302	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,25		
303					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06		
304	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,37		
305					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,2		
424	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,23		
425					Radiateur (mesure 2)	0,08		
733	Volets	C	Métal	Peinture	Volets (mesure 1)	6,64		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
734					Volets (mesure 2)	7,22		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

1er étage - Vol 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
306	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,4		
307					Mur (partie haute)	0,37		
308					Mur (au centre)	0,15		
309	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,29		
310					Mur (partie haute)	0,36		
311					Mur (au centre)	0,39		
312	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,09		
313					Mur (partie haute)	0,32		
314					Mur (au centre)	0,16		
315	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,03		
316					Mur (partie haute)	0,05		
317					Mur (au centre)	0,18		
318	Mur	E	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,39		
319					Mur (partie haute)	0,3		
320					Mur (au centre)	0,13		
321	Mur	F	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,35		
322					Mur (partie haute)	0,34		
323					Mur (au centre)	0,19		
324	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,29		
325					Plafond (mesure 2)	0,01		
326	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,12		
327					Porte (P1) (partie haute)	0,14		
328	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,16		
329					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,08		
330	Porte (P2)	C	Bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,39		
331					Porte (P2) (partie haute)	0,22		
332	Huisserie Porte (P2)	C	Bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,04		
333					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,03		
334	Porte (P3)	E	Bois	peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,28		
335					Porte (P3) (partie haute)	0,04		
336	Huisserie Porte (P3)	E	Bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,05		
337					Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,4		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

1er étage - Vol 13

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
338	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,38		
339					Mur (partie haute)	0,23		
340					Mur (au centre)	0,09		
341	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,11		
342					Mur (partie haute)	0,24		
343					Mur (au centre)	0,05		
344	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,36		
345					Mur (partie haute)	0,2		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
346					Mur (au centre)	0,01		
347	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,4		
348					Mur (partie haute)	0,25		
349					Mur (au centre)	0,01		
350	Mur	E	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,02		
351					Mur (partie haute)	0,08		
352					Mur (au centre)	0,27		
353	Mur	F	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,35		
354					Mur (partie haute)	0,05		
355					Mur (au centre)	0,17		
356	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,24		
357					Plafond (mesure 2)	0,07		
358	Fenêtre intérieure (F1)	D	Métal	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,28		
359					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,34		
360	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	D	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08		
361					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,08		
362	Fenêtre extérieure (F1)	D	Métal	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09		
363					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,24		
364	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	D	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05		
365					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,09		
366	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,1		
367					Porte (P1) (partie haute)	0,38		
368	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,12		
369					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,2		
426	Radiateur	D	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,28		
427					Radiateur (mesure 2)	0,25		
735	Volets	D	Bois	Vernis	Volets (mesure 1)	0,18		
736					Volets (mesure 2)	0,14		
815	Garde corps	D	Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	3,82		
816					Garde corps (mesure 2)	4,72		
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

1er étage - Vol 14

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
370	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,39		
371					Mur (partie haute)	0,13		
372					Mur (au centre)	0,1		
373	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,12		
374					Mur (partie haute)	0,14		
375					Mur (au centre)	0,06		
376	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,26		
377					Mur (partie haute)	0,21		
378					Mur (au centre)	0,02		
379	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,01		
380					Mur (partie haute)	0,26		
381					Mur (au centre)	0,02		
382	Fenêtre intérieure (F1)	B	Métal	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,29		
383					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,12		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
384	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,16		
385					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04		
386	Fenêtre extérieure (F1)	B	Métal	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,37		
387					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,14		
388	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,39		
389					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,19		
390	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,23		
391					Plafond (mesure 2)	0,26		
392	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,28		
393					Porte (P1) (partie haute)	0,02		
394	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,39		
395					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,3		
428	Radiateur	B	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,14		
429					Radiateur (mesure 2)	0,29		
737	Volets	B	Bois	Vernis	Volets (mesure 1)	0,02		
738					Volets (mesure 2)	0,19		
817	Garde corps	B	Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	5,23		
818					Garde corps (mesure 2)	7,98		
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

1er étage - Vol 15

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
396	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,36		
397					Mur (partie haute)	0,06		
398					Mur (au centre)	0,4		
399	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,14		
400					Mur (partie haute)	0,1		
401					Mur (au centre)	0,12		
402	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,15		
403					Mur (partie haute)	0,06		
404					Mur (au centre)	0,27		
405	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,21		
406					Mur (partie haute)	0,03		
407					Mur (au centre)	0,02		
408	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,02		
409					Plafond (mesure 2)	0,29		
410	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,02		
411					Porte (P1) (partie haute)	0,16		
412	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,36		
413					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,28		
414	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,16		
415					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,38		
416	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,34		
417					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,31		
418	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,3		
419					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,34		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
420	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09		
421					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,13		
422	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,2		
423					Radiateur (mesure 2)	0,05		
731	Volets	C	Métal	Peinture	Volets (mesure 1)	6,96		
732					Volets (mesure 2)	8,3		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

1er étage - Vol 16

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
430	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,07		
431					Mur (partie haute)	0,23		
432					Mur (au centre)	0,24		
433	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,19		
434					Mur (partie haute)	0,09		
435					Mur (au centre)	0,06		
436	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,27		
437					Mur (partie haute)	0,39		
438					Mur (au centre)	0,23		
439	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,13		
440					Mur (partie haute)	0,02		
441					Mur (au centre)	0,21		
442	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,29		
443					Plafond (mesure 2)	0,15		
444	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,16		
445					Porte (P1) (partie haute)	0,28		
446	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,31		
447					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,2		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

1er étage - Vol 17

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
448	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,4		
449					Mur (partie haute)	0,25		
450					Mur (au centre)	0		
451	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,02		
452					Mur (partie haute)	0,07		
453					Mur (au centre)	0,37		
454	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,34		
455					Mur (partie haute)	0,15		
456					Mur (au centre)	0,17		
457	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,01		
458					Mur (partie haute)	0,3		
459					Mur (au centre)	0,3		
460	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,26		
461					Porte (P1) (partie haute)	0,31		
462		A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,13		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
463	Huisserie Porte (P1)				Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09		
464	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,26		
465					Plafond (mesure 2)	0,34		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

2ème étage - Vol 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
466	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,04		
467					Mur (partie haute)	0,32		
468					Mur (au centre)	0,35		
469	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,13		
470					Mur (partie haute)	0,05		
471					Mur (au centre)	0,15		
472	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,08		
473					Mur (partie haute)	0,23		
474					Mur (au centre)	0,2		
475	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,22		
476					Mur (partie haute)	0,24		
477					Mur (au centre)	0,16		
478	Mur	E	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,36		
479					Mur (partie haute)	0,3		
480					Mur (au centre)	0,12		
481	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,34		
482					Plafond (mesure 2)	0,32		
483	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,4		
484					Porte (P1) (partie haute)	0,11		
485	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,2		
486					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,06		
487	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,15		
488					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,16		
489	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,22		
490					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01		
491	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09		
492					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,19		
493	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,32		
494					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,16		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - Vol 19

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
495	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,3		
496					Mur (partie haute)	0,17		
497					Mur (au centre)	0,26		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
498	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,3		
499					Mur (partie haute)	0,06		
500					Mur (au centre)	0,39		
501	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,03		
502					Mur (partie haute)	0,39		
503					Mur (au centre)	0,34		
504	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,34		
505					Mur (partie haute)	0,32		
506					Mur (au centre)	0,2		
507	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09		
508					Porte (P1) (partie haute)	0,4		
509	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,23		
510					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,05		
511	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05		
512					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,18		
513	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,29		
514					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,19		
515	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06		
516					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,26		
517	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,3		
518					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,13		
519	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,26		
520					Plafond (mesure 2)	0		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - Vol 20

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
521	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,33		
522					Mur (partie haute)	0,08		
523					Mur (au centre)	0,12		
524	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,05		
525					Mur (partie haute)	0,01		
526					Mur (au centre)	0,36		
527	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,07		
528					Mur (partie haute)	0,05		
529					Mur (au centre)	0,22		
530	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,36		
531					Mur (partie haute)	0,04		
532					Mur (au centre)	0,06		
533	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,21		
534					Porte (P1) (partie haute)	0,33		
535	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,1		
536					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,37		
537	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,04		
538					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,1		
539	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,06		
540					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,14		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
541	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,13		
542					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,25		
543	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,01		
544					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,29		
545	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,14		
546					Plafond (mesure 2)	0,39		
547	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,3		
548					Radiateur (mesure 2)	0,33		
739	Volets	C	Métal	Peinture	Volets (mesure 1)	4,14		
740					Volets (mesure 2)	3,82		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

2ème étage - Vol 21

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
549	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,38		
550					Mur (partie haute)	0,19		
551					Mur (au centre)	0,28		
552	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,14		
553					Mur (partie haute)	0,26		
554					Mur (au centre)	0,3		
555	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,29		
556					Mur (partie haute)	0,22		
557					Mur (au centre)	0,28		
558	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,23		
559					Mur (partie haute)	0,32		
560					Mur (au centre)	0,31		
561	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,28		
562					Plafond (mesure 2)	0,16		
563	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,38		
564					Porte (P1) (partie haute)	0,37		
565	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,3		
566					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,36		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

2ème étage - Vol 22

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
567	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,33		
568					Mur (partie haute)	0,16		
569					Mur (au centre)	0,09		
570	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,37		
571					Mur (partie haute)	0,22		
572					Mur (au centre)	0,38		
573	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,39		
574					Mur (partie haute)	0,04		
575					Mur (au centre)	0,34		
576	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,32		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
577					Mur (partie haute)	0,12		
578					Mur (au centre)	0,14		
579	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,37		
580					Plafond (mesure 2)	0,13		
581	Fenêtre intérieure (F1)	C	Métal	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,38		
582					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,15		
583	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,13		
584					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,2		
585	Fenêtre extérieure (F1)	C	Métal	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,33		
586					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04		
587	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,34		
588					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,21		
589	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,26		
590					Porte (P1) (partie haute)	0,06		
591	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,32		
592					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,04		
593	Porte (P2)	D	Bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,08		
594					Porte (P2) (partie haute)	0,36		
595	Huisserie Porte (P2)	D	Bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,29		
596					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,06		
597	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,08		
598					Radiateur (mesure 2)	0,12		
743	Volets	C	Bois	Vernis	Volets (mesure 1)	0,15		
744					Volets (mesure 2)	0,28		
819	Garde corps	B	Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	4,02		
820					Garde corps (mesure 2)	7,98		
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

2ème étage - Vol 23

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
599	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,37		
600					Mur (partie haute)	0,38		
601					Mur (au centre)	0,36		
602	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,24		
603					Mur (partie haute)	0,38		
604					Mur (au centre)	0,06		
605	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,38		
606					Mur (partie haute)	0,18		
607					Mur (au centre)	0,01		
608	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,26		
609					Mur (partie haute)	0,12		
610					Mur (au centre)	0,14		
611	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,32		
612					Plafond (mesure 2)	0,31		
613	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,03		
614					Porte (P1) (partie haute)	0,04		
615	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,39		
616					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,29		
617	Porte (P2)	C	Bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,26		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
618					Porte (P2) (partie haute)	0,07		
619	Huisserie Porte (P2)	C	Bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,19		
620					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,03		
621	Porte (P3)	D	Bois	peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,32		
622					Porte (P3) (partie haute)	0,22		
623	Huisserie Porte (P3)	D	Bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,01		
624					Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,2		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - Vol 24

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
625	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,04		
626					Mur (partie haute)	0,03		
627					Mur (au centre)	0,18		
628	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,33		
629					Mur (partie haute)	0,26		
630					Mur (au centre)	0,3		
631	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,26		
632					Mur (partie haute)	0,21		
633					Mur (au centre)	0,21		
634	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,19		
635					Mur (partie haute)	0,37		
636					Mur (au centre)	0,11		
637	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,07		
638					Plafond (mesure 2)	0,2		
639	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,26		
640					Porte (P1) (partie haute)	0,22		
641	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,16		
642					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,25		
643	Porte (P2)	B	Bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,23		
644					Porte (P2) (partie haute)	0		
645	Huisserie Porte (P2)	B	Bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,14		
646					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,22		
647	Fenêtre intérieure (F1)	C	Métal	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,29		
648					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,17		
649	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,1		
650					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,27		
651	Fenêtre extérieure (F1)	C	Métal	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,22		
652					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,31		
653	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,3		
654					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,02		
655	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,07		
656					Radiateur (mesure 2)	0,37		
745	Volets	C	Bois	Vernis	Volets (mesure 1)	0,12		
746					Volets (mesure 2)	0,26		
821	Garde corps	B	Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	2,35		
822					Garde corps (mesure 2)	8,3		
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

2ème étage - Vol 25

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
657	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,12		
658					Mur (partie haute)	0,29		
659					Mur (au centre)	0,17		
660	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,23		
661					Mur (partie haute)	0,29		
662					Mur (au centre)	0,38		
663	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,05		
664					Mur (partie haute)	0,18		
665					Mur (au centre)	0,18		
666	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,19		
667					Mur (partie haute)	0,35		
668					Mur (au centre)	0,15		
669	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,21		
670					Plafond (mesure 2)	0,18		
671	Fenêtre intérieure (F1)	C	Métal	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,12		
672					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,12		
673	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,04		
674					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,11		
675	Fenêtre extérieure (F1)	C	Métal	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06		
676					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,14		
677	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,14		
678					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,26		
679	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,1		
680					Radiateur (mesure 2)	0,14		
747	Volets	C	Bois	Vernis	Volets (mesure 1)	0,39		
748					Volets (mesure 2)	0,12		
823	Garde corps	B	Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	8,3		
824					Garde corps (mesure 2)	7,09		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - Vol 26

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
681	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,33		
682					Mur (partie haute)	0,13		
683					Mur (au centre)	0,36		
684	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,18		
685					Mur (partie haute)	0,05		
686					Mur (au centre)	0,07		
687	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,09		
688					Mur (partie haute)	0,01		
689					Mur (au centre)	0,32		
690	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,15		
691					Mur (partie haute)	0,37		
692					Mur (au centre)	0,36		
693	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,37		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
694					Plafond (mesure 2)	0,23		
695	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,34		
696					Porte (P1) (partie haute)	0,34		
697	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,13		
698					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,31		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

2ème étage - Vol 27

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
699	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,23		
700					Mur (partie haute)	0,21		
701					Mur (au centre)	0,28		
702	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,01		
703					Mur (partie haute)	0,12		
704					Mur (au centre)	0,02		
705	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,29		
706					Mur (partie haute)	0,09		
707					Mur (au centre)	0,14		
708	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,36		
709					Mur (partie haute)	0,32		
710					Mur (au centre)	0,18		
711	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,32		
712					Plafond (mesure 2)	0,37		
713	Fenêtre intérieure (F2)	C	Bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,08		
714					Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,26		
715	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,37		
716					Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,17		
717	Fenêtre extérieure (F2)	C	Bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,03		
718					Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,16		
719	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,18		
720					Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,07		
721	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,12		
722					Radiateur (mesure 2)	0,18		
741	Volets	C	Métal	Peinture	Volets (mesure 1)	2,8		
742					Volets (mesure 2)	5,04		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

3ème étage - Vol 28

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
749	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,28		
750					Mur (partie haute)	0,28		
751					Mur (au centre)	0,02		
752	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,17		
753					Mur (partie haute)	0,11		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
754					Mur (au centre)	0,14		
755	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,11		
756					Mur (partie haute)	0,05		
757					Mur (au centre)	0,06		
758	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,04		
759					Mur (partie haute)	0,32		
760					Mur (au centre)	0,35		
761	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,31		
762					Plafond (mesure 2)	0,09		
763	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,24		
764					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,28		
765	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,16		
766					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,09		
767	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,26		
768					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,22		
769	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,3		
770					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,29		
771	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,23		
772					Porte (P1) (partie haute)	0,07		
773	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,36		
774					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,28		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

3ème étage - Vol 29

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
775	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,05		
776					Mur (partie haute)	0,08		
777					Mur (au centre)	0,08		
778	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0		
779					Mur (partie haute)	0,07		
780					Mur (au centre)	0,02		
781	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,1		
782					Mur (partie haute)	0,1		
783					Mur (au centre)	0,21		
784	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,38		
785					Mur (partie haute)	0,26		
786					Mur (au centre)	0,32		
787	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,4		
788					Plafond (mesure 2)	0,09		
789	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,05		
790					Porte (P1) (partie haute)	0,08		
791	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,04		
792					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,39		
793	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,3		
794					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,16		
795	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,36		
796					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
797	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,24		
798					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,19		
799	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06		
800					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,16		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

3ème étage - Vol 30

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
801	Volets	C	Métal	Peinture	Volets (mesure 1)	6,13		
802					Volets (mesure 2)	3,63		
831	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,36		
832					Mur (partie haute)	0,19		
833					Mur (au centre)	0,22		
834	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,1		
835					Mur (partie haute)	0,03		
836					Mur (au centre)	0,2		
837	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,05		
838					Mur (partie haute)	0,13		
839					Mur (au centre)	0,13		
840	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,24		
841					Mur (partie haute)	0,01		
842					Mur (au centre)	0,28		
843	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,33		
844					Plafond (mesure 2)	0,26		
845	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,34		
846					Porte (P1) (partie haute)	0,21		
847	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,2		
848					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,34		
849	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,06		
850					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,27		
851	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,18		
852					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,01		
853	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,23		
854					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,22		
855	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,07		
856					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,22		
943	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,24		
944					Radiateur (mesure 2)	0,4		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

3ème étage - Vol 37

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
803	Volets	C	Métal	Peinture	Volets (mesure 1)	2,67		
804					Volets (mesure 2)	7,92		
987	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,09		
988					Mur (partie haute)	0,27		
989					Mur (au centre)	0,19		
990	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,29		
991					Mur (partie haute)	0,22		
992					Mur (au centre)	0,37		
993	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,34		
994					Mur (partie haute)	0,25		
995					Mur (au centre)	0,38		
996	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,19		
997					Mur (partie haute)	0,1		
998					Mur (au centre)	0,34		
999	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,08		
1000					Plafond (mesure 2)	0,12		
1001	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,02		
1002					Porte (P1) (partie haute)	0,25		
1003	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,1		
1004					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,36		
1005	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,23		
1006					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,33		
1007	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,24		
1008					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,1		
1009	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,3		
1010					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,35		
1011	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,17		
1012					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,13		
1013	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,17		
1014					Radiateur (mesure 2)	0,3		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

Combles - Vol 40

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
805	Volets	C	Métal	Peinture	Volets (mesure 1)	2,54		
806					Volets (mesure 2)	7,22		
1053	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,38		
1054					Mur (partie haute)	0,3		
1055					Mur (au centre)	0,1		
1056	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,33		
1057					Mur (partie haute)	0,18		
1058					Mur (au centre)	0,04		
1059	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,06		
1060					Mur (partie haute)	0,09		
1061					Mur (au centre)	0		
1062	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,32		
1063					Mur (partie haute)	0,15		
1064					Mur (au centre)	0,37		
1065	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,35		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1066					Porte (P1) (partie haute)	0,3		
1067	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,3		
1068					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,28		
1069	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,06		
1070					Plafond (mesure 2)	0,29		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Combles - Vol 41

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
807	Volets	C	Métal	Peinture	Volets (mesure 1)	3,95		
808					Volets (mesure 2)	6,38		
1071	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,31		
1072					Plafond (mesure 2)	0,29		
1073	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,36		
1074					Mur (partie haute)	0,3		
1075					Mur (au centre)	0,2		
1076	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,18		
1077					Mur (partie haute)	0,38		
1078					Mur (au centre)	0,1		
1079	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,35		
1080					Mur (partie haute)	0,14		
1081					Mur (au centre)	0,14		
1082	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,33		
1083					Mur (partie haute)	0,11		
1084					Mur (au centre)	0,32		
1085	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,11		
1086					Porte (P1) (partie haute)	0,36		
1087	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,04		
1088					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,03		
1089	Radiateur	B	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,38		
1090					Radiateur (mesure 2)	0,36		
1091	Fenêtre intérieure (F2)	B	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,18		
1092					Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,33		
1093	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,34		
1094					Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,4		
1095	Fenêtre extérieure (F2)	B	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,19		
1096					Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,27		
1097	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,37		
1098					Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,1		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

3ème étage - Vol 33

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
809	Volets	C	Bois	Vernis	Volets (mesure 1)	0,27		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
810					Volets (mesure 2)	0,1		
825	Garde corps	B	Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	4,27		
826					Garde corps (mesure 2)	6,83		
901	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,15		
902					Mur (partie haute)	0,33		
903					Mur (au centre)	0,04		
904	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,24		
905					Mur (partie haute)	0,1		
906					Mur (au centre)	0,22		
907	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,25		
908					Mur (partie haute)	0,14		
909					Mur (au centre)	0,07		
910	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,24		
911					Mur (partie haute)	0,19		
912					Mur (au centre)	0,27		
913	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,3		
914					Plafond (mesure 2)	0,1		
915	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,18		
916					Porte (P1) (partie haute)	0,08		
917	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,24		
918					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,15		
927	Fenêtre intérieure (F1)	C	Métal	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,23		
928					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,38		
929	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02		
930					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04		
931	Fenêtre extérieure (F1)	C	Métal	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06		
932					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,38		
933	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,18		
934					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,12		
945	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,28		
946					Radiateur (mesure 2)	0,29		
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

3ème étage - Vol 34

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
811	Volets	C	Bois	Vernis	Volets (mesure 1)	0,22		
812					Volets (mesure 2)	0,19		
827	Garde corps	B	Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	5,55		
828					Garde corps (mesure 2)	8,37		
935	Fenêtre intérieure (F2)	C	Métal	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,05		
936					Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,15		
937	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,27		
938					Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,12		
939	Fenêtre extérieure (F2)	C	Métal	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,01		
940					Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,01		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
941	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,1		
942					Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,38		
947	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,15		
948					Radiateur (mesure 2)	0,19		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

3ème étage - Vol 35

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
813	Volets	C	Bois	Vernis	Volets (mesure 1)	0,3		
814					Volets (mesure 2)	0,16		
829	Garde corps	B	Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	6,38		
830					Garde corps (mesure 2)	5,36		
949	Radiateur	C	Fonte	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,21		
950					Radiateur (mesure 2)	0,08		
951	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,25		
952					Mur (partie haute)	0,2		
953					Mur (au centre)	0,1		
954	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,07		
955					Mur (partie haute)	0,28		
956					Mur (au centre)	0,4		
957	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,24		
958					Mur (partie haute)	0,13		
959					Mur (au centre)	0,3		
960	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,1		
961					Mur (partie haute)	0,28		
962					Mur (au centre)	0,09		
963	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,35		
964					Porte (P1) (partie haute)	0,23		
965	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,29		
966					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,35		
967	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,02		
968					Plafond (mesure 2)	0,3		
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

3ème étage - Vol 31

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
857	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,12		
858					Mur (partie haute)	0,35		
859					Mur (au centre)	0,01		
860	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,28		
861					Mur (partie haute)	0,27		
862					Mur (au centre)	0,01		
863	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,16		
864					Mur (partie haute)	0,1		
865					Mur (au centre)	0,14		
866	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,1		
867					Mur (partie haute)	0,04		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
868					Mur (au centre)	0,05		
869	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,12		
870					Plafond (mesure 2)	0,29		
871	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,38		
872					Porte (P1) (partie haute)	0,32		
873	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,33		
874					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,31		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

3ème étage - Vol 32

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
875	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,02		
876					Mur (partie haute)	0,09		
877					Mur (au centre)	0,15		
878	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,24		
879					Mur (partie haute)	0,31		
880					Mur (au centre)	0,04		
881	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,14		
882					Mur (partie haute)	0,05		
883					Mur (au centre)	0,21		
884	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,12		
885					Mur (partie haute)	0,16		
886					Mur (au centre)	0,28		
887	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,08		
888					Plafond (mesure 2)	0,38		
889	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,28		
890					Porte (P1) (partie haute)	0,1		
891	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,08		
892					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,34		
893	Porte (P2)	C	Bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,09		
894					Porte (P2) (partie haute)	0,1		
895	Huisserie Porte (P2)	C	Bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,05		
896					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,35		
897	Porte (P3)	D	Bois	peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,32		
898					Porte (P3) (partie haute)	0,13		
899	Huisserie Porte (P3)	D	Bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,25		
900					Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,1		
919	Fenêtre intérieure (F1)	C	Métal	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,21		
920					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,28		
921	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,23		
922					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,31		
923	Fenêtre extérieure (F1)	C	Métal	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,3		
924					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,02		
925	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Métal	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,19		
926					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06		
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

3ème étage - Vol 36

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
969	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,38		
970					Mur (partie haute)	0,19		
971					Mur (au centre)	0,28		
972	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,14		
973					Mur (partie haute)	0,37		
974					Mur (au centre)	0		
975	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,29		
976					Mur (partie haute)	0,22		
977					Mur (au centre)	0,39		
978	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,24		
979					Mur (partie haute)	0,32		
980					Mur (au centre)	0,31		
981	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,3		
982					Plafond (mesure 2)	0,33		
983	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0		
984					Porte (P1) (partie haute)	0,23		
985	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,08		
986					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,34		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Combles - Vol 38

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1015	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,4		
1016					Mur (partie haute)	0,02		
1017					Mur (au centre)	0,04		
1018	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,36		
1019					Mur (partie haute)	0,16		
1020					Mur (au centre)	0,1		
1021	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,32		
1022					Mur (partie haute)	0,3		
1023					Mur (au centre)	0,16		
1024	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,31		
1025					Mur (partie haute)	0,33		
1026					Mur (au centre)	0,27		
1027	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,06		
1028					Plafond (mesure 2)	0		
1029	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,13		
1030					Porte (P1) (partie haute)	0,32		
1031	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0		
1032					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,1		
1033	Fenêtre de toit	C	Bois	Vernis	Fenêtre de toit (mesure 1)	0		
1034					Fenêtre de toit (mesure 2)	0		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Combles - Vol 39

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1035	Mur	A	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,3		
1036					Mur (partie haute)	0,08		
1037					Mur (au centre)	0		
1038	Mur	B	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,1		
1039					Mur (partie haute)	0,03		
1040					Mur (au centre)	0,18		
1041	Mur	C	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,14		
1042					Mur (partie haute)	0,06		
1043					Mur (au centre)	0,19		
1044	Mur	D	Enduit	papier peint	Mur (partie basse)	0,4		
1045					Mur (partie haute)	0,31		
1046					Mur (au centre)	0,14		
1047	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,29		
1048					Plafond (mesure 2)	0,14		
1049	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,24		
1050					Porte (P1) (partie haute)	0,18		
1051	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,19		
1052					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,16		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Combles - Vol 42

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1099	Charpente		Bois	Brut	Charpente (mesure 1)	0,31		
1100					Charpente (mesure 2)	0,22		
1101	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,36		
1102					Porte (P1) (partie haute)	0,12		
1103	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,1		
1104					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,17		
-	Menuiseries bois		Bois	Brut	Menuiseries bois (Non mesurée)			
-					Menuiseries bois (Non mesurée)			
1105	Mur	F	Enduit		Mur (partie basse)	0,26		
1106					Mur (partie haute)	0,36		
1107					Mur (au centre)	0,29		
1108	Mur	B	Brique	Brut	Mur (partie basse)	0,17		
1109					Mur (partie haute)	0,18		
1110					Mur (au centre)	0,13		
1111	Mur	C	Brique	Brut	Mur (partie basse)	0,03		
1112					Mur (partie haute)	0		
1113					Mur (au centre)	0,21		
1114	Mur	D	Brique	Brut	Mur (partie basse)	0,34		
1115					Mur (partie haute)	0,2		
1116					Mur (au centre)	0,39		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Combles - Vol 43

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1117	Charpente		Bois	brut	Charpente (mesure 1)	0,15		
1118					Charpente (mesure 2)	0,23		
1119	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,28		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1120					Porte (P1) (partie haute)	0,37		
1121	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,23		
1122					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,06		
1123	Mur	E	Brique	brut	Mur (partie basse)	0,12		
1124					Mur (partie haute)	0,18		
1125					Mur (au centre)	0,32		
1126	Mur	F	Enduit		Mur (partie basse)	0,21		
1127					Mur (partie haute)	0,04		
1128					Mur (au centre)	0,2		
1129	Mur	B	Enduit		Mur (partie basse)	0,08		
1130					Mur (partie haute)	0,14		
1131					Mur (au centre)	0,2		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Apentis - Vol 44

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1132	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,26		
1133					Plafond (mesure 2)	0,2		
1136	Porte extérieure (P2)	A	Bois	Peinture	Porte extérieure (P2) (partie basse)	2,35		
1137					Porte extérieure (P2) (partie haute)	4,98		
1138	Huisserie Porte extérieure (P2)	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte extérieure (P2) (partie basse)	2,99		
1139					Huisserie Porte extérieure (P2) (partie haute)	4,02		
1140	Mur	A	Enduit		Mur (partie basse)	0,22		
1141					Mur (partie haute)	0,22		
1142					Mur (au centre)	0,34		
1143	Mur	B	Enduit		Mur (partie basse)	0,1		
1144					Mur (partie haute)	0,38		
1145					Mur (au centre)	0,04		
1146	Mur	C	Enduit		Mur (partie basse)	0,1		
1147					Mur (partie haute)	0,19		
1148					Mur (au centre)	0,26		
1149	Mur	D	Enduit		Mur (partie basse)	0,39		
1150					Mur (partie haute)	0,1		
1151					Mur (au centre)	0,4		
1164	Fenêtre intérieure (F1)	A	Bois Metal	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,26		
1165					Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,14		
1166	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	A	Bois Metal	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,12		
1167					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,27		
1168	Fenêtre extérieure (F1)	A	Bois Metal	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,02		
1169					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,36		
1170	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	A	Bois Metal	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,39		
1171					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,36		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Apentis - Vol 45

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1134	Plafond		Enduit		Plafond (mesure 1)	0,06		
1135					Plafond (mesure 2)	0,18		
1152	Mur	A	Enduit		Mur (partie basse)	0,06		
1153					Mur (partie haute)	0,36		
1154					Mur (au centre)	0,36		
1155	Mur	B	Enduit		Mur (partie basse)	0,04		
1156					Mur (partie haute)	0,33		
1157					Mur (au centre)	0,04		
1158	Mur	C	Enduit		Mur (partie basse)	0,13		
1159					Mur (partie haute)	0,39		
1160					Mur (au centre)	0,22		
1161	Mur	D	Enduit		Mur (partie basse)	0,25		
1162					Mur (partie haute)	0,14		
1163					Mur (au centre)	0,07		
-	Fenêtre intérieure (F1)	B	PVC	Brut	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			
-					Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	PVC	Brut	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			
-					Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			
-	Fenêtre extérieure (F1)	B	PVC	Brut	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)			
-					Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)			
-	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	PVC	Brut	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)			
-					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)			
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

Sous-Sol - Vol 46

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Brique & Béton	Brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	B	Brique & Béton	Brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	C	Brique & Béton	Brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	D	Brique & Béton	Brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	E	Brique & Béton	Brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	F	Brique & Béton	Brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
1172	Plafond		Ciment	Brut	Plafond (mesure 1)	0,18		
1173					Plafond (mesure 2)	0,31		
1174	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09		
1175					Porte (P1) (partie haute)	0,2		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1176	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,1		
1177					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,37		
1178	Porte (P2)	D	Bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,17		
1179					Porte (P2) (partie haute)	0,22		
1180	Huisserie Porte (P2)	D	Bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,04		
1181					Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,4		
1182	Porte (P3)	E	Bois	peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,37		
1183					Porte (P3) (partie haute)	0,36		
1184	Huisserie Porte (P3)	E	Bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,4		
1185					Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,15		
1186	Porte (P4)	F	Bois	peinture	Porte (P4) (partie basse)	0,19		
1187					Porte (P4) (partie haute)	0,12		
1188	Huisserie Porte (P4)	F	Bois	peinture	Huisserie Porte (P4) (partie basse)	0,08		
1189					Huisserie Porte (P4) (partie haute)	0,03		
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

Sous-Sol - Vol 47

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	B	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	C	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	D	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
1190	Plafond		ciment	brut	Plafond (mesure 1)	0,1		
1191					Plafond (mesure 2)	0,2		
1192	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,29		
1193					Porte (P1) (partie haute)	0,38		
1194	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,24		
1195					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,07		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Vol 48

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	B	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	C	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	D	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	E	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	F	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	G	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
1196	Plafond		ciment	brut	Plafond (mesure 1)	0,4		
1197					Plafond (mesure 2)	0,18		
1198	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,36		
1199					Porte (P1) (partie haute)	0,37		
1200	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,02		
1201					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,32		
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

Sous-Sol - Vol 49

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	B	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	C	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	D	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
1202	Plafond		ciment	brut	Plafond (mesure 1)	0,05		
1203					Plafond (mesure 2)	0,34		
1204	Cuve à fiul		Métal	Peinture	Cuve à fiul (mesure 1)	6		
1205					Cuve à fiul (mesure 2)	7,6		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Sous-Sol - Vol 50

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	B	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	C	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	D	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
1206	Plafond		ciment	brut	Plafond (mesure 1)	0,02		
1207					Plafond (mesure 2)	0,04		
1208	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,28		
1209					Porte (P1) (partie haute)	0,31		
1210	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,27		
1211					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,22		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Vol 51

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	B	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	C	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	D	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
1212	Plafond		ciment	brut	Plafond (mesure 1)	0,06		
1213					Plafond (mesure 2)	0,33		
1214	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,12		
1215					Porte (P1) (partie haute)	0,05		
1216	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01		
1217					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,36		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Vol 52

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	B	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	C	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-	Mur	D	Brique & Béton	brut	Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			
-					Mur (Non mesurée)			

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1218	Plafond		ciment	brut	Plafond (mesure 1)	0,16		
1219					Plafond (mesure 2)	0,08		
1220	Porte (P1)	A	Bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,04		
1221					Porte (P1) (partie haute)	0,22		
1222	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,14		
1223					Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,24		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Batiment - Facades

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1224	Echelle de secours		Métal	Peinture	Echelle de secours (mesure 1)	5,36		
1225					Echelle de secours (mesure 2)	5,42		
Nombre d'unités de diagnostic : 1								


Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /

ANNEXE 1 -
REPERAGE DES LOCAUX

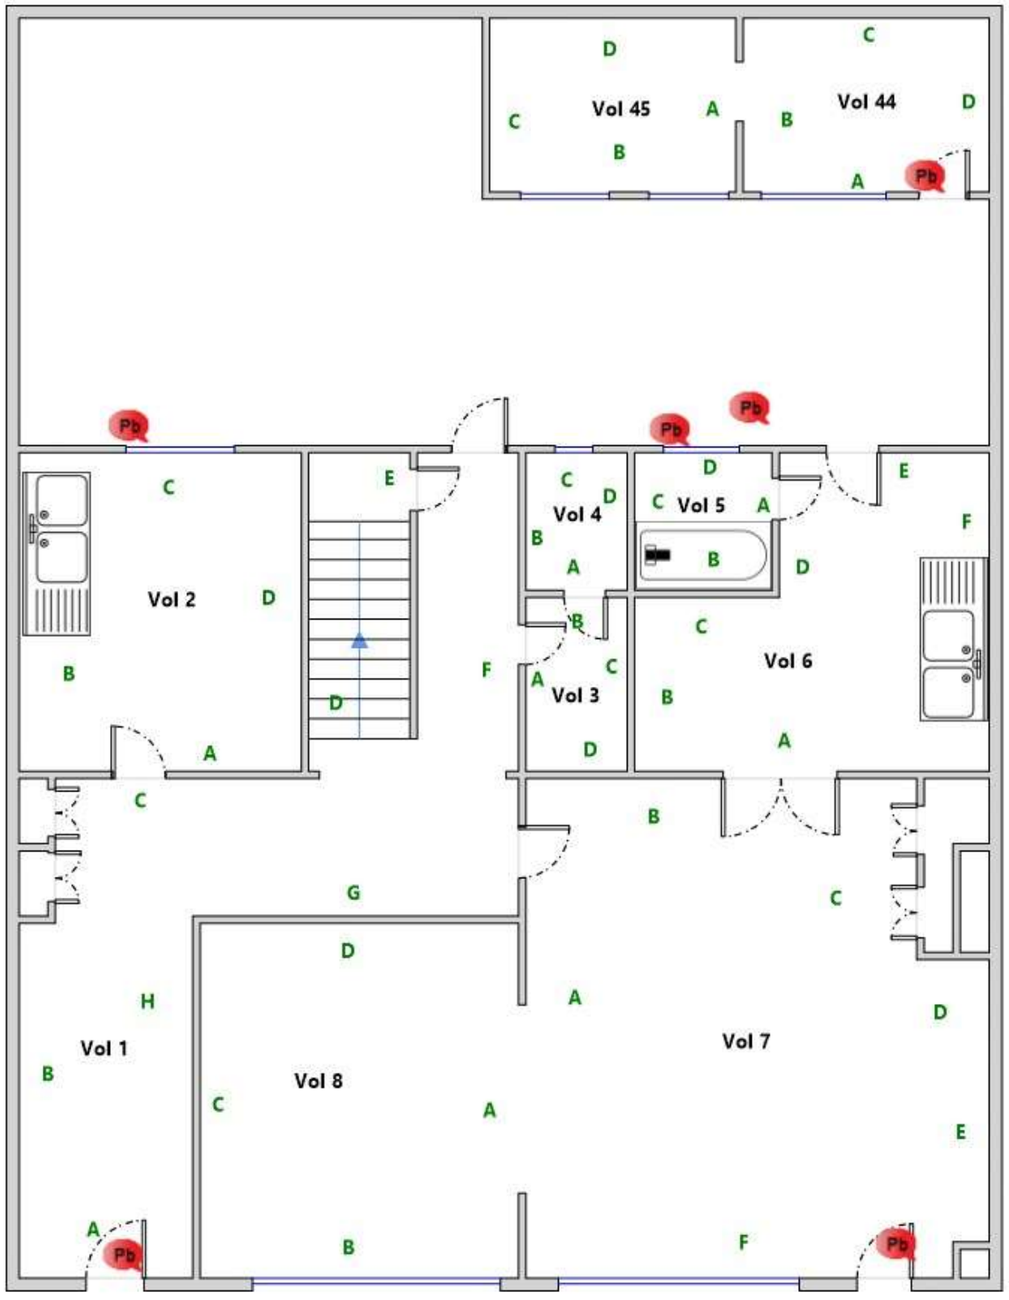

Rez de Chaussée

Planche de repérage technique

N° planche: 1/7

Nom du plan:

Rez de Chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

4 rue Jean Catelas
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2302CHNRO2303007AB - 4 Jean Catelas AMIENS
Rédacteur : Antoine BLOT
Date : 22/02/2023

Commentaires :

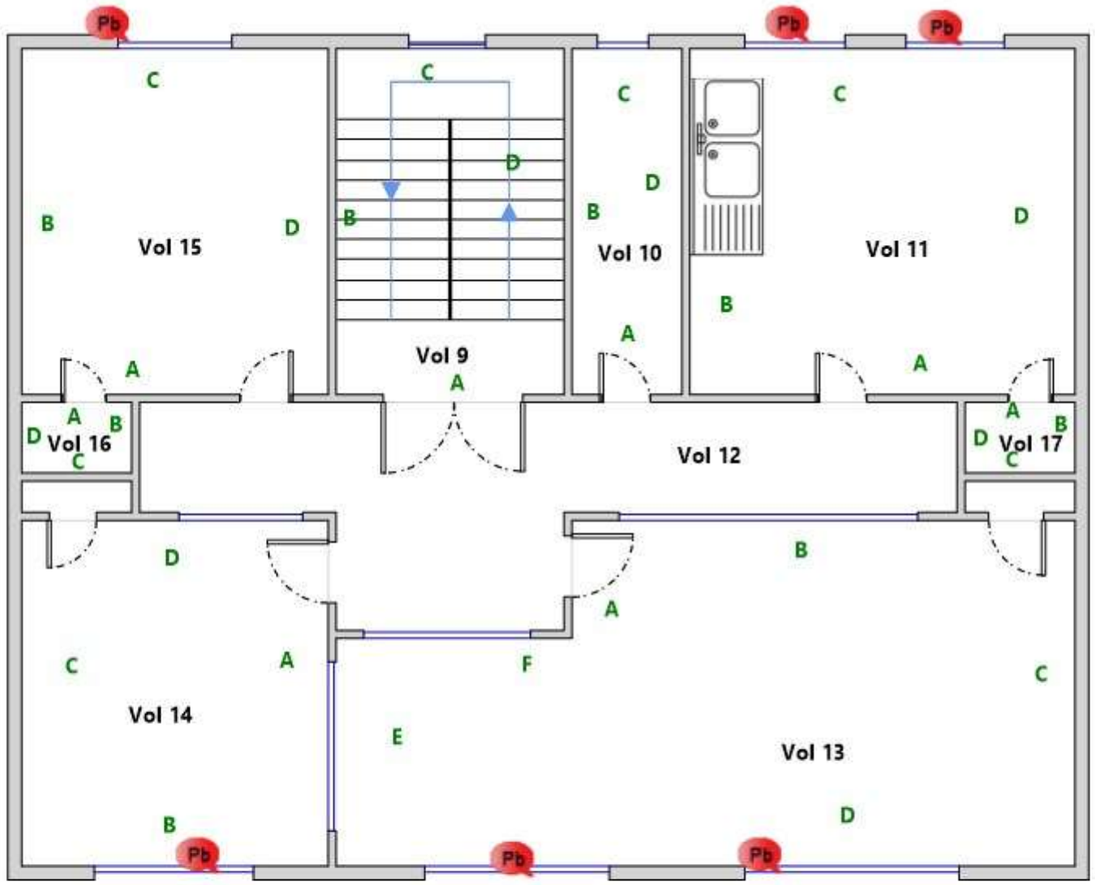

1er Etage

Planche de repérage technique

N° planche: 2/7

Nom du plan:

1er Etage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

4 rue Jean Catelas
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2302CHNRO2303007AB - 4 Jean Catelas AMIENS
Rédacteur : Antoine BLOT
Date : 22/02/2023

Commentaires :

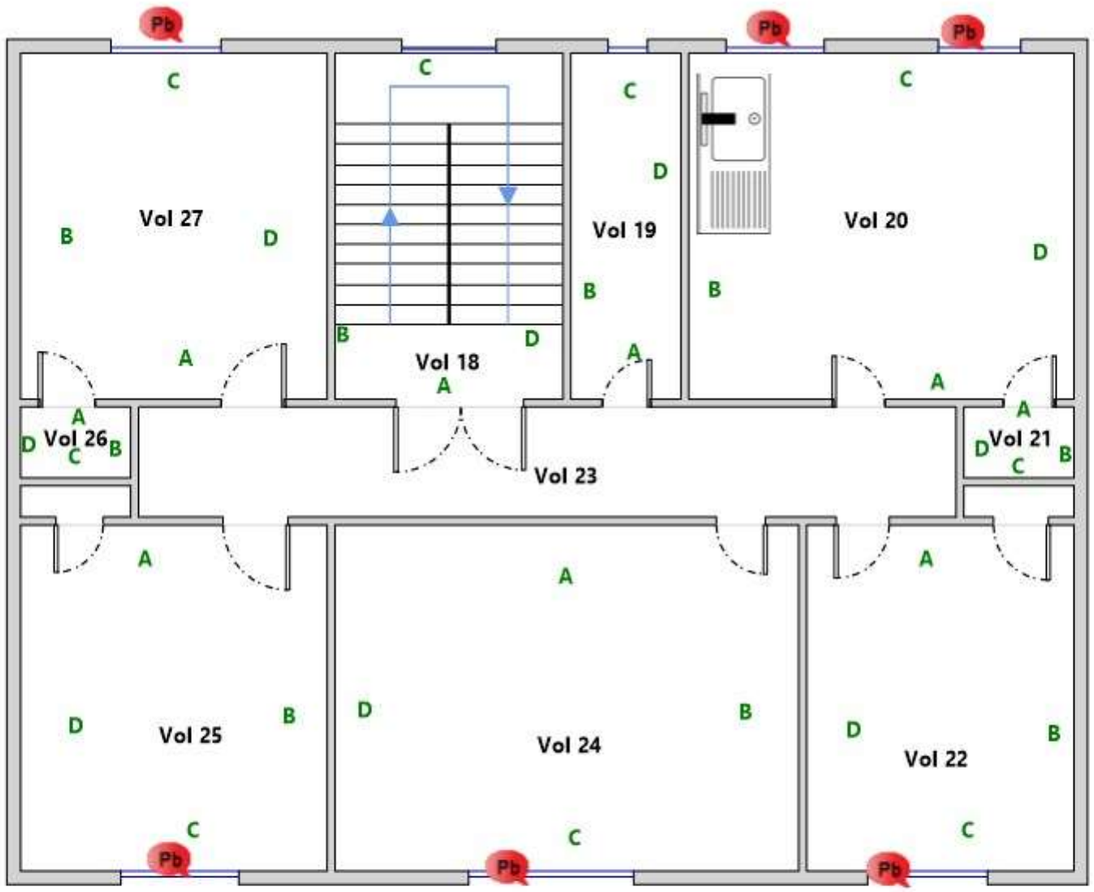

2ème Etage

Planche de repérage technique

N° planche: 3/7

Nom du plan:

2ème Etage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

4 rue Jean Catelas
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2302CHNRO2303007AB - 4 Jean Catelas AMIENS
Rédacteur : Antoine BLOT
Date : 22/02/2023

Commentaires :

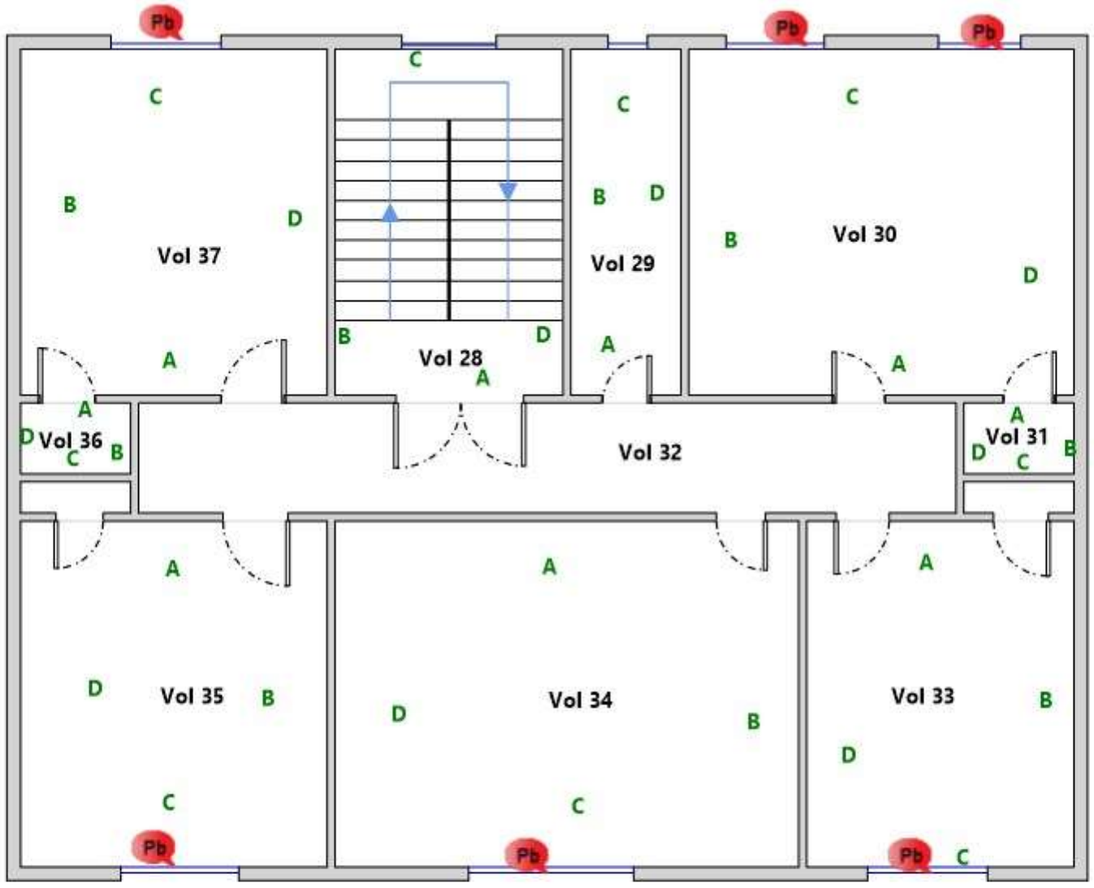

3ème Etage

Planche de repérage technique

N° planche: 4/7

Nom du plan:

3ème Etage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

4 rue Jean Catelas
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2302CHNRO2303007AB - 4 Jean Catelas AMIENS
Rédacteur : Antoine BLOT
Date : 22/02/2023

Commentaires :

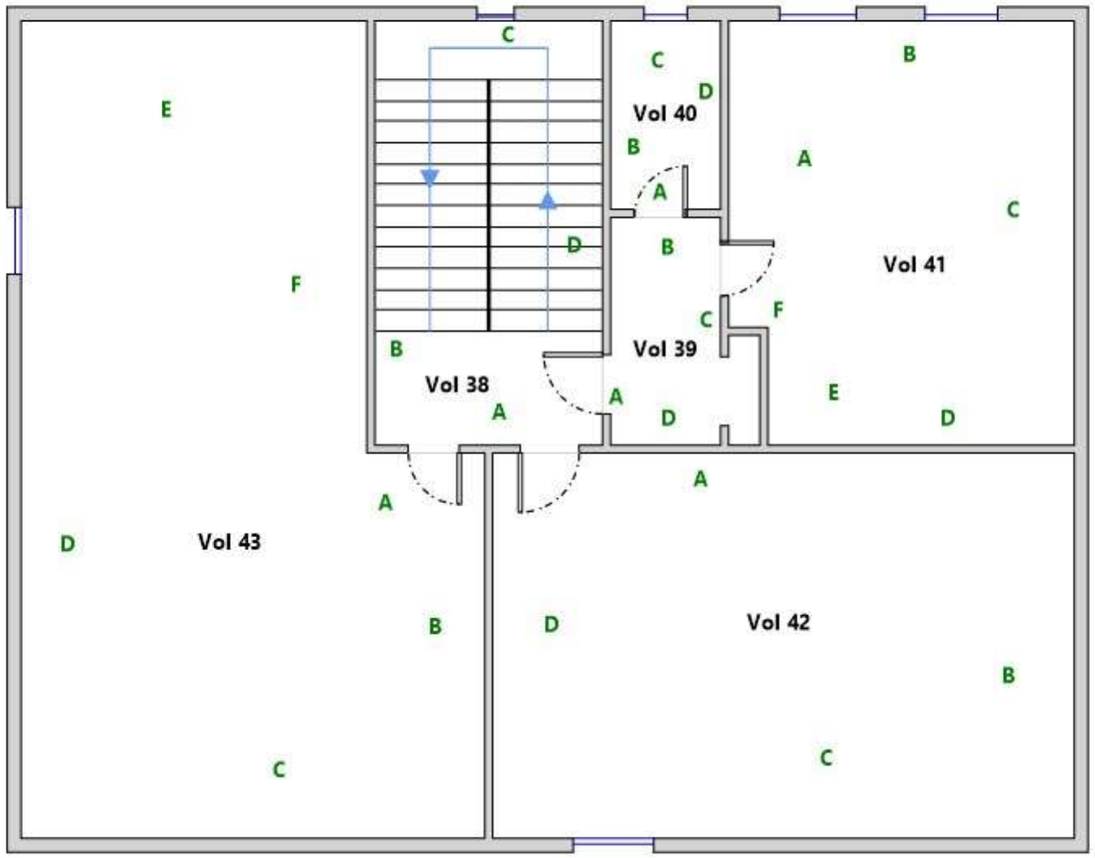

Combles

Planche de repérage technique

N° planche: 5/7

Nom du plan:

Combles

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

4 rue Jean Catelas
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2302CHNRO2303007AB - 4 Jean Catelas AMIENS
Rédacteur : Antoine BLOT
Date : 22/02/2023

Commentaires :

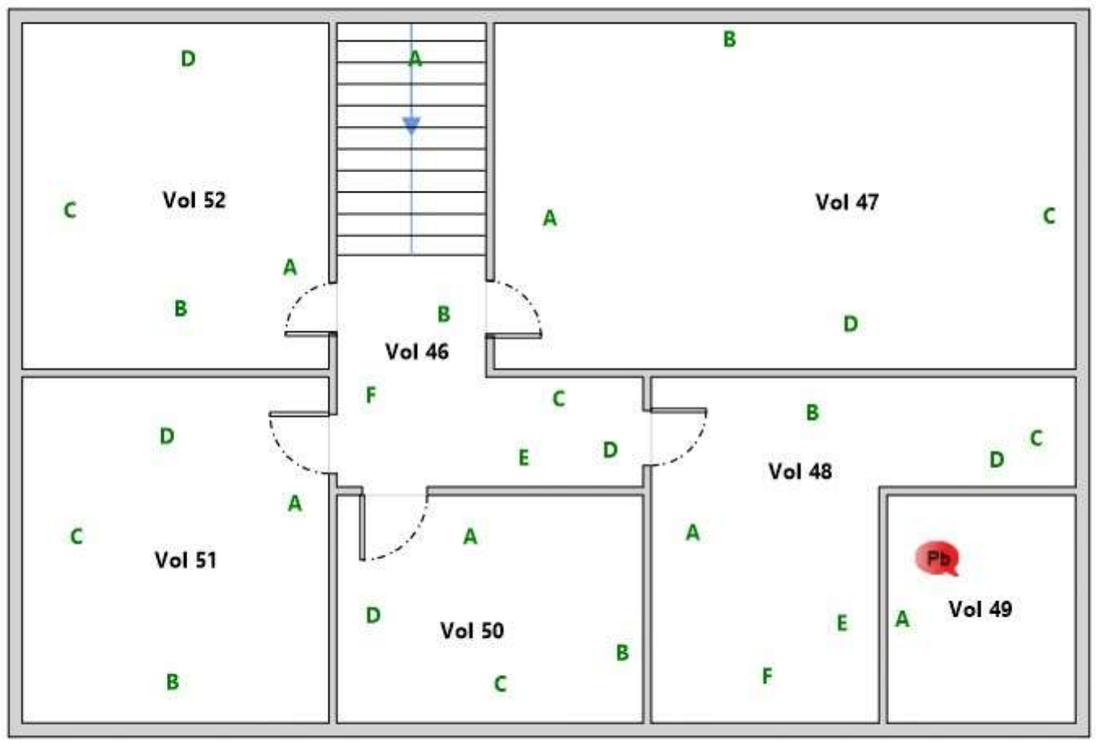

Sous-sol

Planche de repérage technique

N° planche: 6/7

Nom du plan:

Sous-sol

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

4 rue Jean Catelas
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2302CHNRO2303007AB - 4 Jean Catelas AMIENS
Rédacteur : Antoine BLOT
Date : 22/02/2023

Commentaires :

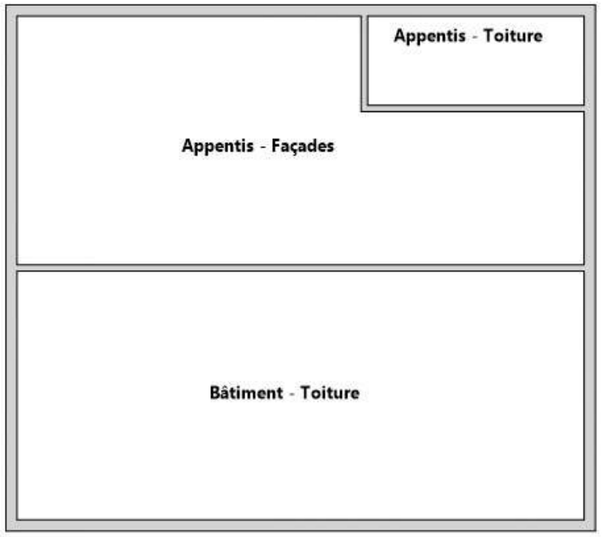

Bâtiment - Façades







Façades et toitures

Planche de repérage technique

N° planche: 7/7

Nom du plan:

Façades et toitures

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

4 rue Jean Catelas
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2302CHNRO2303007AB - 4 Jean Catelas AMIENS
Rédacteur : Antoine BLOT
Date : 22/02/2023

Commentaires :

ANNEXE 2 -
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

Néant

ANNEXE 4 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES

CERTIFICAT INTERNATIONAL
SOCOTEC

CERTIFICAT

N° DTI / 1310-009

Certifie par la présente que :

Antoine BLOT

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	08/09/2022	07/09/2029
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	08/09/2022	07/09/2029
DPE - tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	12/05/2022	11/05/2029

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

cofrac
ACCREDITATION N° 4-0083
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Directeur Général Certification Xavier Daniel

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE– France – SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 309 -www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 5 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
🖷 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 02/12/2022
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° **FR** 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° **FR** 39 775 699 309. **AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° **FR** 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**

ANNEXE 6 -
ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq.** Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC DIAGNOSTIC (AVESNES)	
Modèle de l'analyseur :	FEnX
Numéro de série analyseur :	2-0456
Numéro de série de la source :	RTV-0465-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	16/07/2019
Date de fin de validité de la source :	16/07/2024

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 7 -
NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr

OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr

RSI région Centre
http://www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
  - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
  - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)
