APAVE
AGENCE DE NICE
22/26 avenue Edouard GRINDA
06200 NICE
N° SIRET : 90386907100733

DONNEUR D'ORDRE
CPAM ALPES MARITIMES
48 AVENUE DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE
06180 NICE CEDEX
CONTACT : Madame BERTINO Laury

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre **: 3296148.1 - CPAM Roi Robert - Bâtiment Chagall**
Numéro de contrat : **C26118743**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T241553936**
Date : **15/06/2026**

Lieu d'intervention :

CPAM
Bâtiment Chagall
48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE
06180 NICE CEDEX 2

Destinataire rapport :
CPAM ALPES MARITIMES

Date d'intervention :
Du **07/10//2024** au **20/05/2026**

Intervenant : **Monsieur Cédric DALICHAMP**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 33 pages

APAVE Infrastructures et Construction France
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE CEDEX

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	CPAM 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX 2	Numéro de Lot : Référence Cadastrale : Date du Permis de Construire :	Non communiqué Non communiqué Antérieur au 1er juillet 1997
Étage :	Tous niveaux	Date de construction :	Non communiquée
Bâtiment :	Chagall		
Nature du bâtiment :	Bâtiment		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CPAM ALPES MARITIMES
Adresse :	48 AVENUE DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	CPAM ALPES MARITIMES
Adresse :	48 AVENUE DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	DALICHAMP Cédric	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
N° certification :	CPDI6855	Adresse laboratoire :	75C Avenue de Pascalet 30310 Vergèze
Date d'obtention :	26/05/2023	Numéro d'accréditation :	1-5922
Organisme :	I.CERT		
Adresse :		Organisme d'assurance professionnelle :	Allianz Global Corporate & Specialty SE
		Adresse assurance :	1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex
Date de la commande :	27/03/2026	N° de contrat d'assurance :	FRL003861
Accompagnateur :	Aucun	Date de validité :	31/12/2026

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence :
Nature des travaux envisagés : Remplacement des 2 ascenseurs existants

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES 2
DESIGNATION DU BATIMENT 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 2
EXÉCUTION DE LA MISSION 2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT 2

RESULTATS DU REPERAGE 4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 4

INVESTIGATIONS NON REALISEES 6
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE 6
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE 6

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION 6
OBJECTIF 6
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 6

PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION 7
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 7
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE 7

RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 8

OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI 8

PRECONISATIONS 8

ANNEXE CROQUIS 9

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 15

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES 20

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES 29

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 30

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE 31

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS 32

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Absence

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R-4	Pallier ascenseurs	Plancher	Revêtement de sol peint orange	Résultat d'analyse (P001)		Z003
		Murs	Enduit peint	Résultat d'analyse (P002)		Z001
		Portes palières coté pallier ascenseur A	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P003)		Z002
		Portes palières coté pallier ascenseur B	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z002
		Plafond	Enduit peint	Résultat d'analyse (P010 - idem)		Z006
		Portes palières coté cabine ascenseur B	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
		Portes palières coté cabine ascenseur A	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
RDC	Pallier ascenseurs	Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P006)		
		Murs	Enduit peint	Résultat d'analyse (P007)		
Tous niveaux	Cabine ascenseur A	Plancher	Revêtement de sol noir + colle	Résultat d'analyse (P004)		Z004
		Murs cabine	Moquette + colle	Résultat d'analyse (P005)		Z005
		Portes cabine coté cabine asc A	Inox	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
		Portes cabine coté cabine asc B	Inox	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
R-3	Pallier ascenseurs	Murs	Enduit peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z001
		Portes palières ascenseur B	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z002
		Plancher	Revêtement de sol peint orange	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z003
		Portes palières	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse		Z002

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		ascenseur A		(P003 - idem)		
		Plafond	Enduit peint	Résultat d'analyse (P010)		Z006
R-2	Pallier ascenseurs	Murs	Enduit peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z001
		Portes palières ascenseur B	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z002
		Plancher	Revêtement de sol peint orange	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z003
		Portes palières ascenseur A	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z002
		Plafond	Enduit peint	Résultat d'analyse (P010 - idem)		Z006
R-1	Pallier ascenseurs	Murs	Enduit peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z001
		Portes palières ascenseur B	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z002
		Plancher	Revêtement de sol peint orange	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z003
		Murs	Enduit peint	Résultat d'analyse (P008)		
		Portes palières ascenseur A	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z002
		Plafond	Enduit peint	Résultat d'analyse (P010 - idem)		Z006
R-4	Local machineries ascenseurs	Murs	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
		Plancher	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
		Plafond	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
Tous niveaux	Cage d'ascenceurs	Murs cage d'ascenseur	Enduit	Résultat d'analyse (P009)		
Tous niveaux	Cabines ascenseur B	Murs cabine	Moquette + colle	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Plancher	Revêtement de sol noir + colle	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z004
		Portes cabine coté cabine asc A	Inox	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
		Portes cabine coté cabine asc B	Inox	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
07/10/2024	Visite préalable
07/10/2024	Repérage amiante avant travaux
10/03/2026	Repérage amiante avant travaux
20/05/2026	Repérage amiante avant travaux

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.
Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant
Commentaire : Ascenseur : système hydraulique, moteur changé en 2020. L'enduit mural indiqué dans le rapport correspond aux zones suivantes : le linteau situé au-dessus de la porte palière ainsi qu'aux zones situées de part et d'autre de la porte palière.

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :
Nature des travaux envisagés : Remplacement des 2 ascenseurs existants

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R-4	Pallier ascenseurs	**OUI**	
RDC	Pallier ascenseurs	**OUI**	
Tous niveaux	Cabine ascenseur A	**OUI**	
R-3	Pallier ascenseurs	**OUI**	
R-2	Pallier ascenseurs	**OUI**	
R-1	Pallier ascenseurs	**OUI**	
R-4	Local machineries ascenseurs	**OUI**	
Tous niveaux	Cage d'ascenceurs	**OUI**	
Tous niveaux	Cabines ascenseur B	**OUI**	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Poteaux	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Colles non bitumineuses	M	
	Peintures de sol	M	
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques			
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	
Parois des équipements	Colles	M	

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.


Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

Planche de repérage

Client :	CPAM ALPES MARITIMES	Titre :	Chagall - R-4
N° rapport :	T241553936		
N° planche :	1/5 Version : 0	Lieu d'intervention :	48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX 2
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	27/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	DALICHAMP Cédric	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

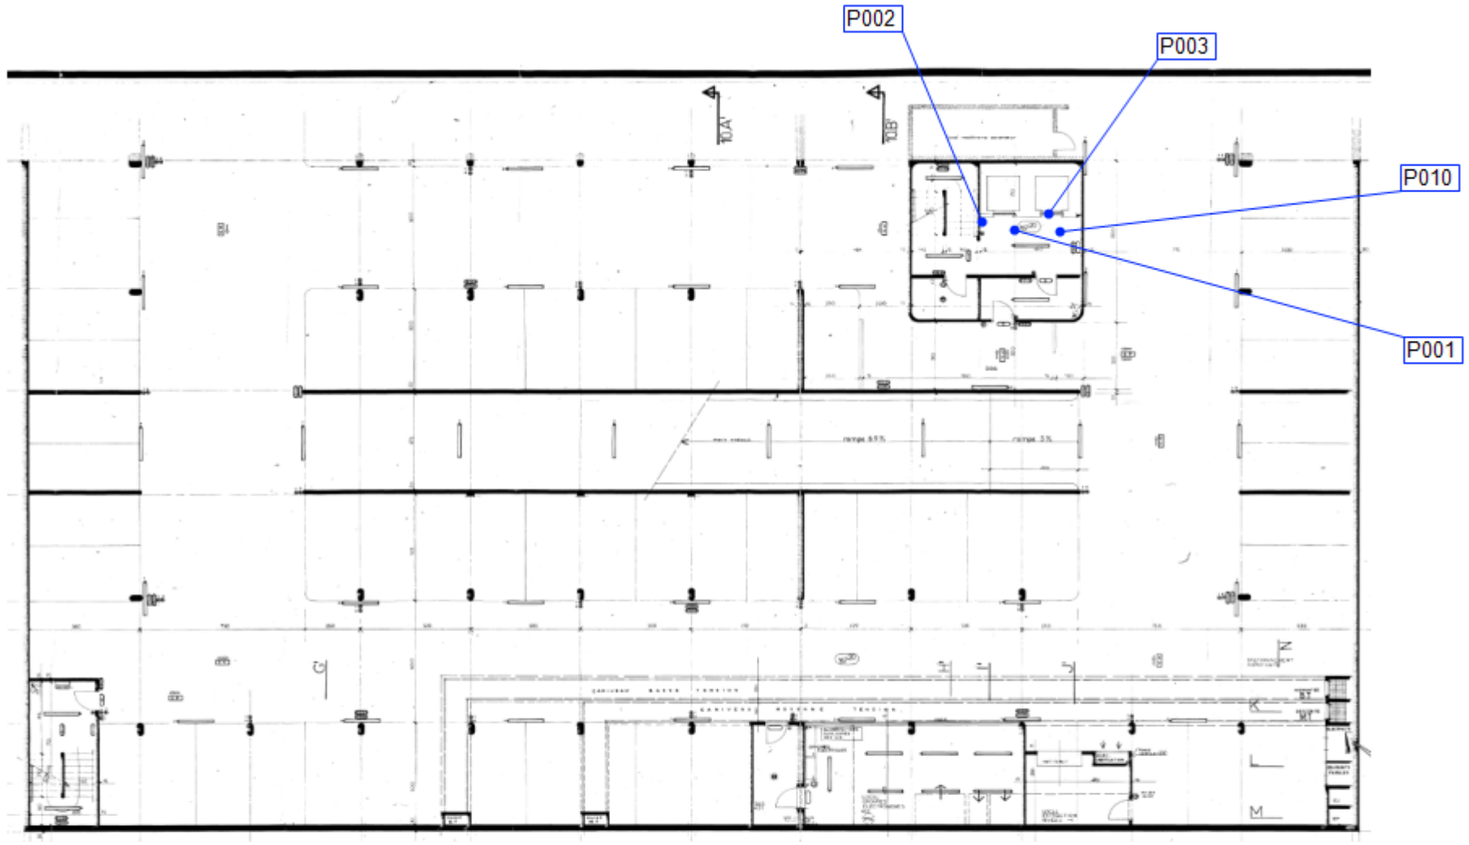


Légende :

P... Prélèvements : absence d'amiante

P... Prélèvements : présence d'amiante

Planche de repérage

Client :	CPAM ALPES MARITIMES	Titre :	Chagall - R-3
N° rapport :	T241553936		
N° planche :	2/5 Version : 0	Lieu d'intervention :	48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX 2
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	27/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	DALICHAMP Cédric	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

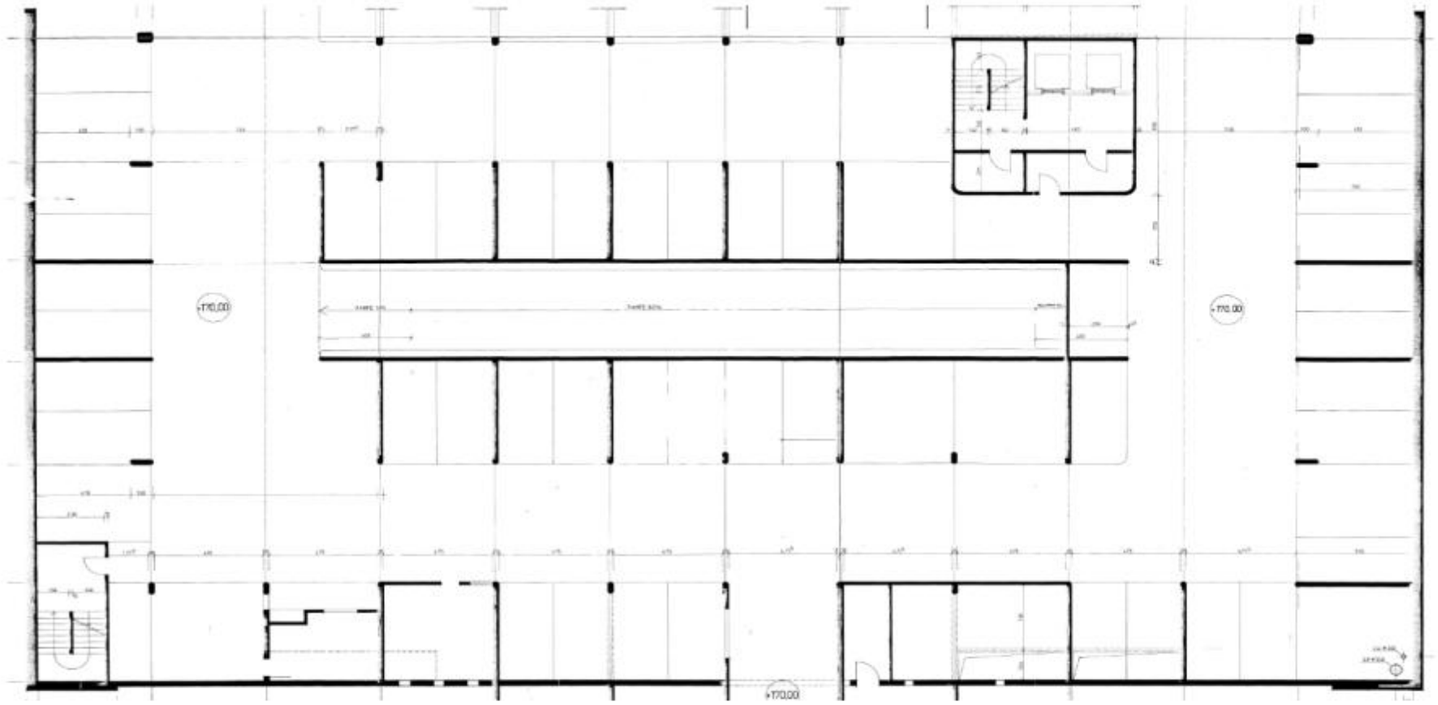


Légende :

P... Prélèvements : absence d'amiante

P... Prélèvements : présence d'amiante

Planche de repérage

Client :	CPAM ALPES MARITIMES	Titre :	Chagall - R-2
N° rapport :	T241553936	Lieu d'intervention :	48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX 2
N° planche :	3/5 Version : 0		
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	27/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	DALICHAMP Cédric	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

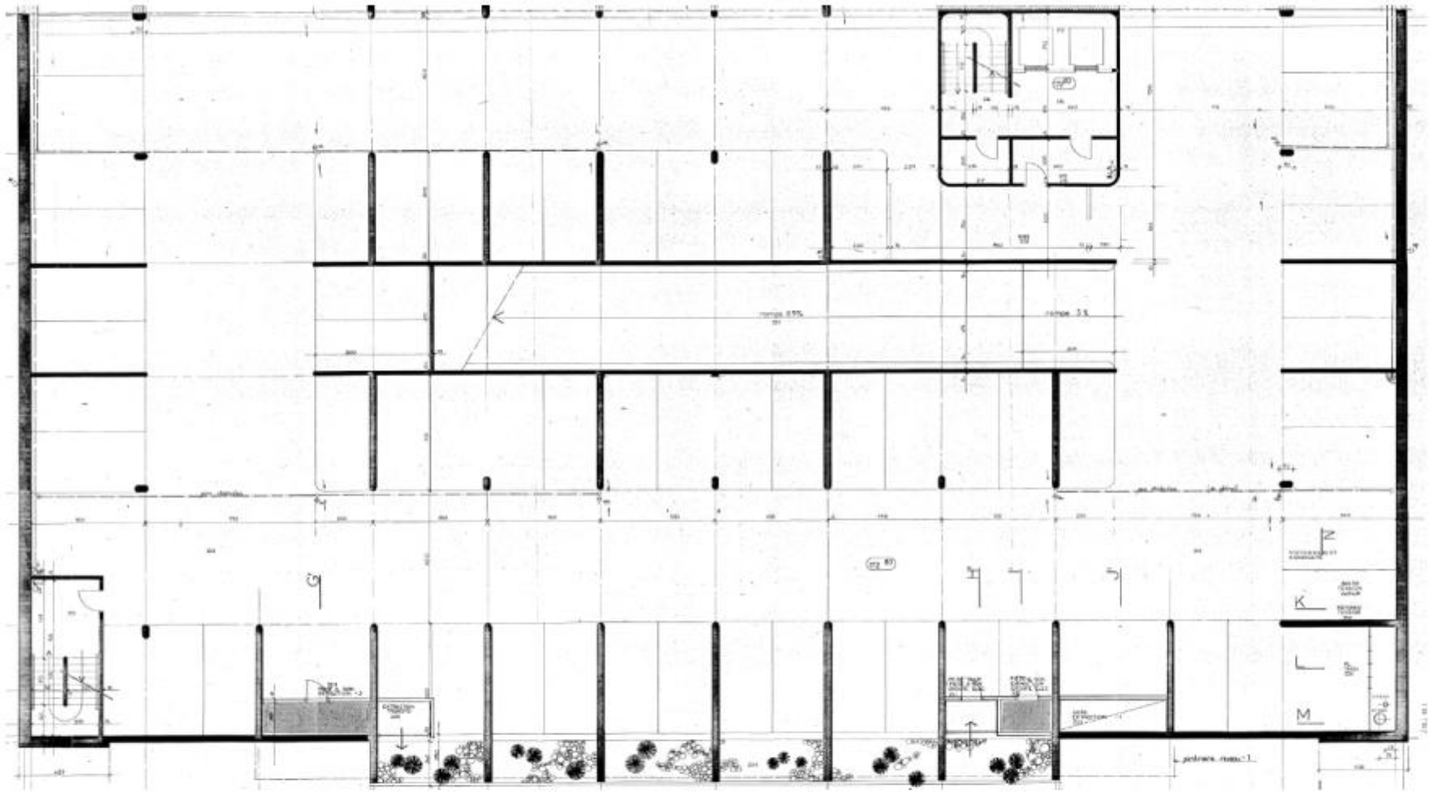


Légende :

P... Prélèvements : absence d'amiante

P... Prélèvements : présence d'amiante

Client :	CPAM ALPES MARITIMES	Titre :	Chagall - R-1
N° rapport :	T241553936		
N° planche :	4/5 Version : 0	Lieu d'intervention :	48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX 2
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	27/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	DALICHAMP Cédric	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

Planche de repérage

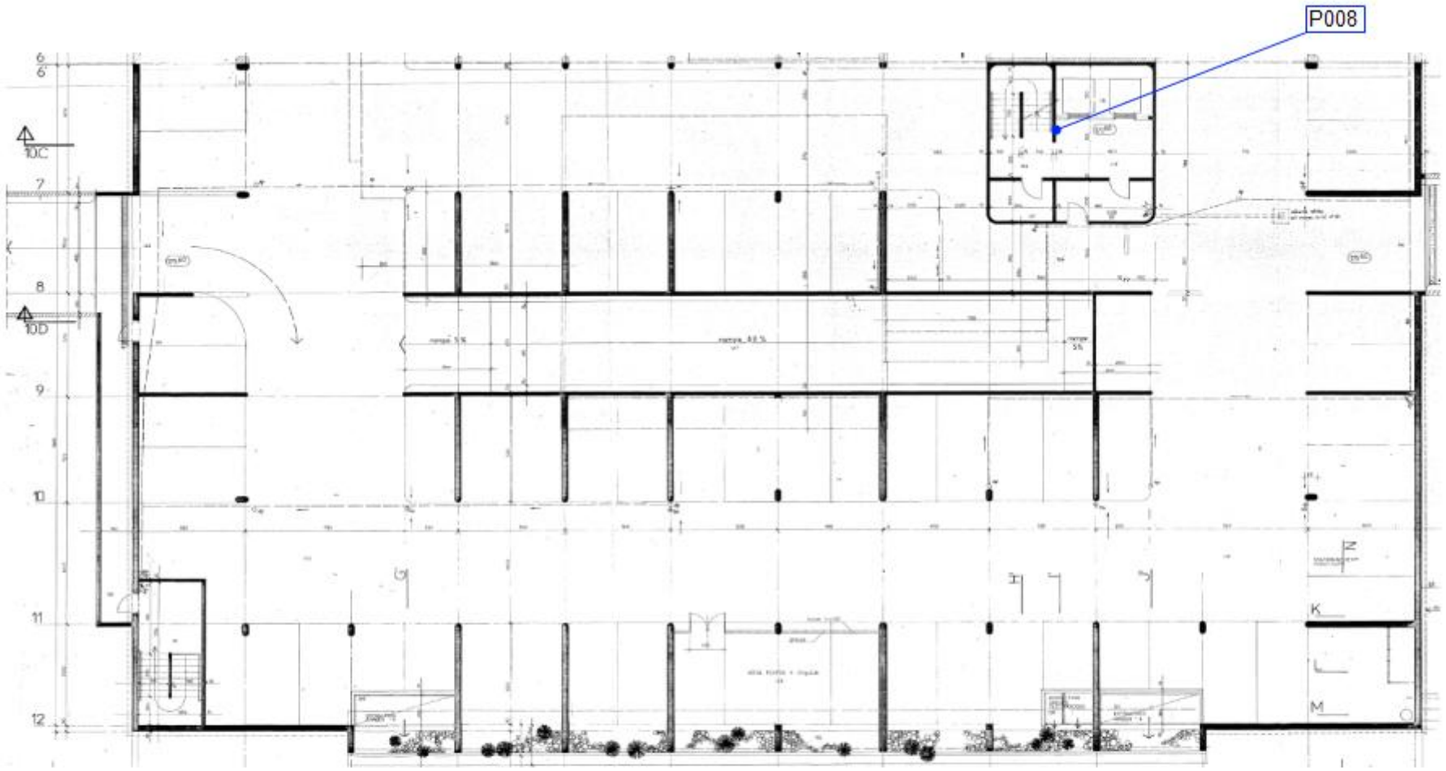

Légende :

P... Prélèvements : absence d'amiante

P... Prélèvements : présence d'amiante

Planche de repérage

Client :	CPAM ALPES MARITIMES	Titre :	Chagall - Rdc
N° rapport :	T241553936		
N° planche :	5/5 Version : 0	Lieu d'intervention :	48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX 2
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	27/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	DALICHAMP Cédric	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

Légende :

P... Prélèvements : absence d'amiante

P... Prélèvements : présence d'amiante



ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Partie d'ouvrage**
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	R-4 - Pallier ascenseurs
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol peint orange	07/10/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Revêtement de sol peint orange

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Partie d'ouvrage**
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	R-4 - Pallier ascenseurs
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit peint	07/10/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit peint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	R-4 - Pallier ascenseurs
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture grise sur métal	07/10/2024	DALICHAMP Cédric

Localisation

Portes palières coté pallier ascenseur A - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture grise sur métal

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples en vrac	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	Tous niveaux - Cabine ascenseur A
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol noir + colle	07/10/2024	DALICHAMP Cédric

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol noir + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Revêtement souple noir + colle polymère jaune avec poussières non séparable	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	Tous niveaux - Cabine ascenseur A
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Moquette + colle	07/10/2024	DALICHAMP Cédric

Localisation

Murs cabine - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Moquette grise + colle polymère jaune non séparable	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDC - Pallier ascenseurs
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle carrelage	07/10/2024	DALICHAMP Cédric

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Non analysé	
Fr2	Colle grise hétérogène	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDC - Pallier ascenseurs
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit peint	07/10/2024	DALICHAMP Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit peint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	R-1 - Pallier ascenseurs
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit peint	07/10/2024	DALICHAMP Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit peint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	Tous niveaux - Cage d'ascenceurs
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit	07/10/2024	DALICHAMP Cédric

Localisation

Murs cage d'ascenseur - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Enduit gris en vrac	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	R-3 - Pallier ascenseurs
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit peint	09/03/2026	DALICHAMP Cédric

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit peint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Peinture non séparable + enduit plâtreux gris en vrac	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3740211.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

E.24412237.0.PDF

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042410-8986 EN DATE DU 15/10/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - NICE
M. Cédric DALICHAMP
22-26 avenue Edouard Grinda
06200 NICE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0424-18464
Echantillon ITGA : IT042410-8986
Reçu au laboratoire le : 11/10/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C24159084-97203-113062-73991-095452967
Dossier client	CPAM ALPES MARITIMES + - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE - 06180 - NICE CEDEX 2
Echantillon	P001 - Revêtement de sol peint orange - R-4 - Chagall - Pallier ascenseur - Sol - Plancher
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 15/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ANK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ludovic LAMON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

E.24412238.0.PDF

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042410-8987 EN DATE DU 15/10/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - NICE
M. Cédric DALICHAMP
22-26 avenue Edouard Grinda
06200 NICE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0424-18464
Echantillon ITGA : IT042410-8987
Reçu au laboratoire le : 11/10/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C24159084-97203-113062-73991-095452967
Dossier client	CPAM ALPES MARITIMES + - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE - 06180 - NICE CEDEX 2
Echantillon	P002 - Enduit peint - R-4 - Chagall - Pallier ascenseur - Murs - Murs
Description ITGA	Peinture / Enduit compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 15/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KSK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ludovic LAMON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

E.24412239.0.PDF

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042410-8988 EN DATE DU 15/10/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - NICE
M. Cédric DALICHAMP
22-26 avenue Edouard Grinda
06200 NICE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0424-18464
Echantillon ITGA : IT042410-8988
Reçu au laboratoire le : 11/10/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C24159084-97203-113062-73991-095452967
Dossier client	CPAM ALPES MARITIMES + - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE - 06180 - NICE CEDEX 2
Echantillon	P003 - Peinture grise sur métal - R-4 - Chagall - Pallier ascenseur - Murs - Portes palières ascenseur
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 15/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KSK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ludovic LAMON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

E.24412240.0.PDF

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042410-8989 EN DATE DU 15/10/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - NICE
M. Cédric DALICHAMP
22-26 avenue Edouard Grinda
06200 NICE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0424-18464
Echantillon ITGA : IT042410-8989
Reçu au laboratoire le : 11/10/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C24159084-97203-113062-73991-095452967
Dossier client	CPAM ALPES MARITIMES + - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE - 06180 - NICE CEDEX 2
Echantillon	P004 - Revêtement de sol noir + colle - Tous niveaux - Chagall - Cabine ascenseur - Sol - Plancher
Description ITGA	Revêtement souple noir / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple noir + Colle polymère jaune avec poussières non séparable	META (A) le 15/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CNB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ludovic LAMON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

E.24412241.0.PDF

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042410-8990 EN DATE DU 15/10/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - NICE
M. Cédric DALICHAMP
22-26 avenue Edouard Grinda
06200 NICE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0424-18464
Echantillon ITGA : IT042410-8990
Reçu au laboratoire le : 11/10/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C24159084-97203-113062-73991-095452967
Dossier client	CPAM ALPES MARITIMES + - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE - 06180 - NICE CEDEX 2
Echantillon	P005 - Moquette + colle - Tous niveaux - Chagall - Cabine ascenseur - Murs - Murs cabine
Description ITGA	Moquette grise / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette grise + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 15/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ANK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ludovic LAMON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

E.24412242.0.PDF

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042410-8991 EN DATE DU 15/10/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - NICE
M. Cédric DALICHAMP
22-26 avenue Edouard Grinda
06200 NICE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0424-18464
Echantillon ITGA : IT042410-8991
Reçu au laboratoire le : 11/10/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C24159084-97203-113062-73991-095452967
Dossier client	CPAM ALPES MARITIMES + - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE - 06180 - NICE CEDEX 2
Echantillon	P006 - Colle carrelage - RDC - Chagall - Pallier ascenseur - Sol - Plancher
Description ITGA	Carrelage / Colle grise hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise hétérogène	META (A) le 15/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KSK

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ludovic LAMON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

E.24412243.0.PDF

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042410-8992 EN DATE DU 15/10/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - NICE
M. Cédric DALICHAMP
22-26 avenue Edouard Grinda
06200 NICE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0424-18464
Echantillon ITGA : IT042410-8992
Reçu au laboratoire le : 11/10/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C24159084-97203-113062-73991-095452967
Dossier client	CPAM ALPES MARITIMES + - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE - 06180 - NICE CEDEX 2
Echantillon	P007 - Enduit peint - RDC - Chagall - Pallier ascenseur - Murs - Murs
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 15/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ANK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ludovic LAMON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

S.3296332.0

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-19250 EN DATE DU 25/10/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - NICE 22-26 avenue Edouard Grinda 06200 NICE	Réf. Commande ITGA : IT0424-19250 Réf. Commande Client : C24159084-97203-113062-74738-150552928

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/10/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CPAM ALPES MARITIMES + - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE - 06180 - NICE CEDEX 2 — Réf échantillon ITGA : IT042410-16821 Réf échantillon client : P008 - Enduit peint - R-1 - Pallier ascenseur n°2 - Murs - Murs — Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac			
‣ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 24/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (2)
Réf dossier client : CPAM ALPES MARITIMES + - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE - 06180 - NICE CEDEX 2 — Réf échantillon ITGA : IT042410-16822 Réf échantillon client : P009 - Enduit - Tous niveaux - Cage d'ascenceur - Murs - Murs cage d'ascenseur — Description ITGA : Enduit gris en vrac			
‣ Enduit gris en vrac	META (A) le 24/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

S.3740211.0.PDF

itga
Innovateur en fiabilité
Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-1029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-15065 EN DATE DU 28/05/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - NICE 22-26 avenue Edouard Grinda 06200 NICE	Réf. Commande ITGA : IT0426-15065 Réf. Commande Client : C26118743-139824-166022-0-162237689

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/05/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : C26118743 A		Réf échantillon ITGA : IT042605-18152	
Réf échantillon client : P010 - R-3 - Pallier ascenseurs - Plafond - Plafond - Enduit peint		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux gris en vrac	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux gris en vrac (1)	META (A) le 28/05/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
1.accréditation n° 1-1029

Validé par : Issam EDDAOUDI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

SANS OBJET

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6855 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DALICHAMP Cédric

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 24/05/2023 - Date d'expiration : 23/05/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 24/05/2023 - Date d'expiration : 23/05/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 17/10/2023 - Date d'expiration : 16/10/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 16/11/2023 - Date d'expiration : 15/11/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 16/11/2023.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE CERTIFICATION DE PERSONNES DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle			
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat.Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : *« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »*

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

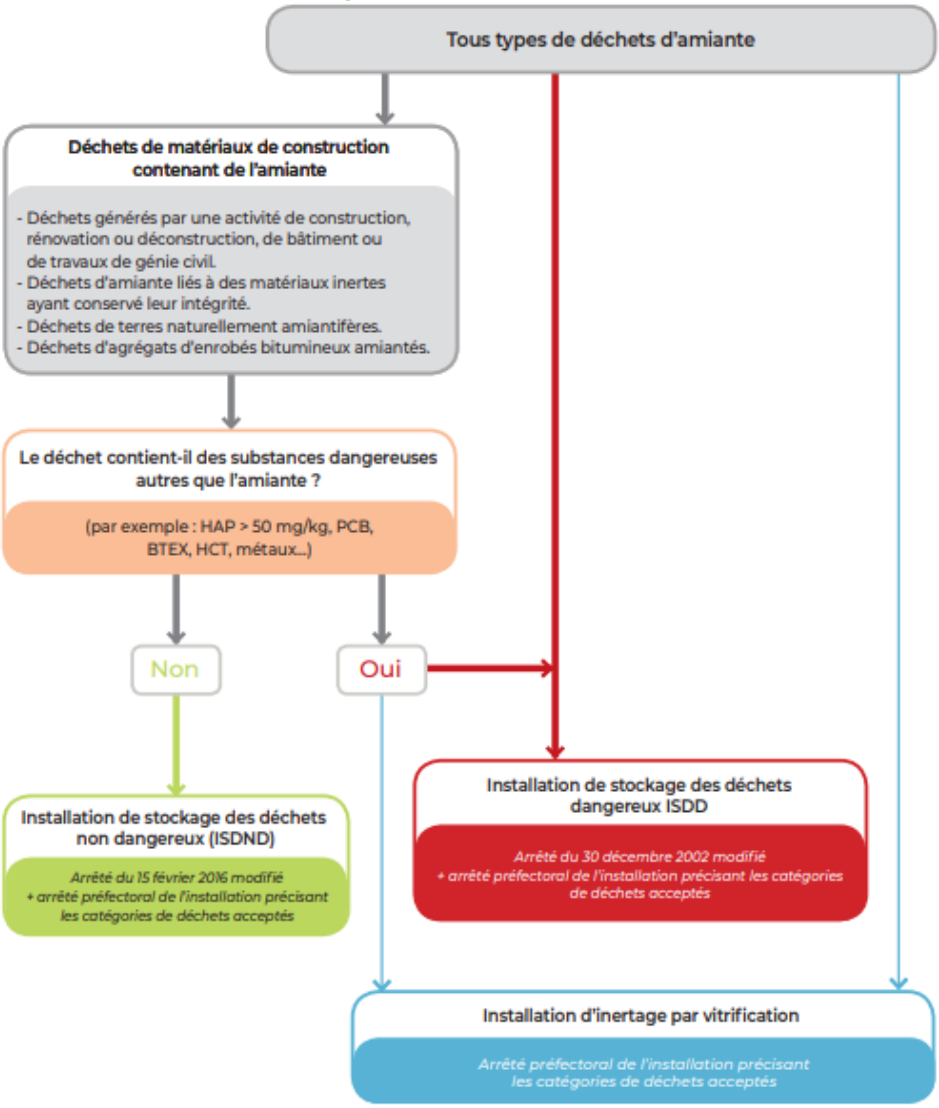

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
