Bureau Veritas Exploitation SAS
PESSAC
BAT A
30 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC France
Téléphone : 05 57 96 24 00
Mail : dorian.chauchet@bureauveritas.com

A l'attention de Mme CASTEL Pascaline

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017

Date(s) du repérage : du 04/05/2022 au 04/05/2022

Nom du site : BATIMENT 68

Immeuble bâti objet du repérage :
BATIMENT 068
CNEFG-SAINT ASTIER
24110 SAINT ASTIER



Numéro d'affaire :
Référence du rapport : 350930436.3.R
Rédigé le : 30/05/2022
Par l'opérateur de repérage : Dorian CHAUCHET
Date de la commande : 28/04/2022

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60, Avenue Général de Gaulle 92046 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 8026828

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	04/05/2018	03/05/2023
Amiante avec mention	07/07/2019	03/05/2023

Ce rapport contient **149** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION....3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre....3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage....3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage....4

2. CONCLUSIONS....5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante....5
2.2. Obligation d'information....7

3. INFORMATIONS GENERALES....8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission....8
3.2. Intervenants....8
3.3. Opérateur(s) de repérage....8
3.4. Laboratoire(s)....8

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE....9
4.1. Textes réglementaires....9
4.2. Méthodologie de la mission....9
4.3. Limites de la mission....9

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE....11
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite....11
5.2. Conditions de visite....11

1. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE....12
1.1. Résultats détaillés....12
1.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante....97

2. ANNEXES....97
2.1. Parties d'immeuble bâti visitées....97
2.2. Croquis de repérage....102
2.3. Photos....113
2.4. Attestation d'assurance....114
2.5. Certificat de compétence....116
2.6. Rapports d'essais de laboratoire....117

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Programme des travaux décrits dans le documents réf FEB 01 03 2018 - réhabilitation légère BAT 068.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.
Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Eléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation, Conduits d'eau pluviale, Garnissage des joints de dilatation, Joints de dilatation, Couvre-joints, Tresses d'étanchéité à l'air, Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.), Jonctions bitumineuses, Solins en fibre ciment, Colle des solins en fibre ciment
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage, Ardoises composites hors fibro ciment, Ardoises en fibro ciment, Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses, Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures), Peintures des bardages métalliques
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits exérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs, Revêtements plastiques épais (RPE), Peintures sur béton, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, imperméabilisants, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Garnissage des joints de dilation, Joints de dilatation, Couvre-joints, Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Eléments associés à la façade	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation, Conduits d'eau (pluviales et usées), Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)
Poteaux	Flocages, Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison, Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), coffrages perdus
Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Flocages, Plots de colle fixant les cloisons au mur, Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac, Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages, Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés), Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Panneaux (fibres-ciment,.), Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation
Poutres et charpentes	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Panneaux (fibres-ciment,.), Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux, Pare vapeur, Isolants posés dans le plenum au-dessus du panneau de faux-plafond, Ecrans de contonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échapement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment, manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus				
N°MPCA	**Localisation**	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
3	RDC / PIECE 2	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 8	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 9	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 14	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 15	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 16	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 21	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 22	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 24	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 27	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 28	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 30	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 31	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 37	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 38	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 42	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	RDC / PIECE 43	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 1	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 8	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 13	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 14	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 15	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 20	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 21	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 23	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 25	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 30	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 31	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 33	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 36	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 42	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 43	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 47	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 48	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 49	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 50	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 51	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+1 / PIECE 52	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus				
N°MPCA	**Localisation**	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
3	R+1 / PIECE 53	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 1	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 13	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 14	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 15	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 21	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 23	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 25	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 30	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 31	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 33	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 35	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 42	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 43	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 47	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 48	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 49	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 50	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 51	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 52	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R+2 / PIECE 53	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 3	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 4	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 5	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 6	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 8	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 9	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 10	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 11	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 12	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 13	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 14	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 15	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / PIECE 16	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
2	R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Conduit	Ruban adhésif	foncé(e)
3	R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
1	R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
2	R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Conduit	Ruban adhésif	foncé(e)
3	R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
1	R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
2	R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Conduit	Ruban adhésif	foncé(e)
3	R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	R-1 / VIDE SANITAIRE 4	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus				
N°MPCA	**Localisation**	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
1	R-1 / CIRCULATION 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
1	R-1 / CIRCULATION 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)
3	R-1 / CHAUFFERIE	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
3	EXTERIEUR / FACADES	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)
4	EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	compact, clair(e)
4	EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	compact, clair(e)
3	COMBLES / COMBLES	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)

2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Copyright BUREAU VERITAS

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: BATIMENT 068
CNEFG-SAINT ASTIER
24110 SAINT ASTIER

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
BATIMENT 068	Autre	Immeuble de travail <= 300 personnes	1978	2016. (Travaux de création de ventilation mécanique).

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UGAP Mme Pascaline CASTEL	/	pascaline.castel@interieur.gouv.fr
Propriétaire	SECRETARIATS GEN ADMINIS	89 COURS DUPRE DE SAINT MAUR 33041 BORDEAUX CEDEX	/
Accompagnateur	SECRETARIATS GEN ADMINIS Mr SIMEOS	89 COURS DUPRE DE SAINT MAUR 33041 BORDEAUX CEDEX	0646660043

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 790 184 675 00268	DORIAN CHAUCHET	BUREAU VERITAS CERTIFICATION	8026828	04/05/2018	03/05/2023

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest	1-5840	4 Chemin des MauresCS 60134 33172 GRADIGNAN CEDEXFrance	+33 5 56 01 84 03

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.
Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Cette inspection peut être suivie :

d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
de sondages,
de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.
En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.
Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.
La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.
En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.
En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer

un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : du 04/05/2022 au 04/05/2022

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
E06/49117/Bâtiment 068	31/01/2007	Véronique LAFFERIERRE - IEEB	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
FEB réhabilitation légère BAT 068 plans	BAT 068	Plan
FEB 01 03 2018 - réhabilitation légère BAT 068	BAT 068	Programme des travaux

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

1. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

1.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px
S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P043	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P044	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P045	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P046	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P047	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P047	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P048	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P048	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P049	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P049	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P050	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P050	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P052	Résultat d'analyse	/	NON
RDC	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P052	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 1	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P069	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 1	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P088	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 1	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P089	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 1	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Plénum.	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie technique.	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 2	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P069	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P070	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	P071	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Mur	Enduit	compact, clair(e)	P072	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Gaine technique.	P073	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P074	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	P075	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	P076	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P088	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P089	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 2	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Plénum.	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie technique.	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P065	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Mur	Enduit	clair(e)	idem P066	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P067	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P068	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P069	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P065	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Mur	Enduit	clair(e)	idem P066	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P067	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P068	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P069	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 4	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P063	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P065	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 5	Mur	Enduit	clair(e)	idem P066	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P067	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P068	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 5	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P069	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 5	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 5	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 5	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 5	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 5	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 5	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P065	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Mur	Enduit	clair(e)	idem P066	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P067	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P068	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P069	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	P063	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, foncé(e), Sanitaires.	P064	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	P065	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Mur	Enduit	clair(e)	P066	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P067	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P068	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P069	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	P085	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 8	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 8	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 8	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P065	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 8	Mur	Enduit	clair(e)	idem P066	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 8	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P069	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 8	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 8	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 8	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 8	Gaine horizontale	Enduit	compact, clair(e)	P108	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 8	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 8	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 8	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 9	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / PIECE 9	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 9	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P065	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 9	Mur	Enduit	clair(e)	idem P066	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 9	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P069	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 9	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 9	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 9	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 9	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 9	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 9	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 10	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 10	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P065	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 10	Mur	Enduit	clair(e)	idem P066	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 10	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P069	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 10	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 10	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 10	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 10	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 10	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 10	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 11	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 11	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P065	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 11	Mur	Enduit	clair(e)	idem P066	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 11	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P069	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 11	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 11	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 11	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 14	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 14	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 14	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 14	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 14	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 14	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 14	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 14	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 14	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 14	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 14	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P047	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P048	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P049	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	P050	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	P051	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	P052	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P056	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P057	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P058	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P059	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P060	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 15	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 15	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 16	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 16	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 18	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 18	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 18	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 18	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 18	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 18	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 18	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 18	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 18	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 18	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 18	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 20	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	Conduit d'aération en façade.	**OUI**
RDC / PIECE 21	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 22	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 22	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P047	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P048	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P049	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P050	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P052	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	idem P055	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P056	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P057	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P058	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P059	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P060	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P047	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P048	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P049	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P050	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P052	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	P055	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P056	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P057	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P058	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P059	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P060	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 24	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	P029	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P030	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 25	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 27	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P047	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P048	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P049	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P050	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P052	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	idem P055	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P056	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P057	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	P058	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	P059	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P060	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 28	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P047	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P048	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P049	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P050	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P052	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	idem P055	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P056	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P057	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P058	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P059	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P060	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P047	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P048	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P049	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P050	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P052	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P056	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P057	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P058	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P059	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P060	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 30	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 30	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 31	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 31	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 31	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Mur	Enduit	plâtre, rose	P036	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 32	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 33	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Mur	Enduit	plâtre, rose	P037	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 33	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 36	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P047	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P048	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P049	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P050	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P052	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 37	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 37	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 37	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 38	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 38	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 38	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 38	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 38	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 38	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 38	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 38	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 38	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 38	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 38	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 38	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 40	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 41	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 41	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 41	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 41	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 41	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 41	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 41	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 41	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 41	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	S	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 41	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 41	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 42	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P047	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P048	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 42	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P049	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P050	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 42	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P052	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 42	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 42	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 42	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 42	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 42	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 42	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 42	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 42	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 42	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 42	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / PIECE 43	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 43	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P038	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P039	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P040	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	P041	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Mur	Enduit	compact, clair(e)	P042	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P043	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 44	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P044	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P045	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P046	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P053	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Dans gaine technique sanitaire.	idem P054	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P092	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	idem P093	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P114	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P115	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P116	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P117	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P118	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 44	Mur	Enduit	ciment, clair(e), Galerie technique.	idem P119	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P038	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P039	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P040	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P041	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P042	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P043	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P044	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 46	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P045	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P046	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P053	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Dans gaine technique sanitaire.	idem P054	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P092	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	idem P093	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P114	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P115	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P116	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P117	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P118	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 46	Mur	Enduit	ciment, clair(e), Galerie technique.	idem P119	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P038	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P039	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P040	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P041	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P042	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P043	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P044	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	P045	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit	compact, clair(e)	P046	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / PIECE 48	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P053	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Dans gaine technique sanitaire.	P054	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	P061	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P092	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	idem P093	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P114	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P115	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P116	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P117	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P118	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / PIECE 48	Mur	Enduit	ciment, clair(e), Galerie technique.	idem P119	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P070	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P071	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P072	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Gaine technique.	idem P073	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P074	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	idem P075	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P076	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P086	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P087	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 1	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	P088	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Mur	Enduit	compact, clair(e)	P089	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Plénum.	P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie technique.	P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 3	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 3	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 3	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 3	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 3	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 3	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 5	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 5	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 5	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 5	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 5	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 5	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 6	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 6	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 6	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 6	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 6	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 6	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 6	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 6	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 7	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 7	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 7	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 7	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 7	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 7	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 7	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 7	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 8	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 8	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 9	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 9	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 9	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 9	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 9	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 9	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 9	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 9	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 9	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 9	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 9	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 9	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P070	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P071	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P072	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Gaine technique.	idem P073	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P074	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	idem P075	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P076	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P088	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P089	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Plénum.	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 10	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie technique.	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 11	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 11	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 11	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 11	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 11	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 11	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 11	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 11	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 11	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P070	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P071	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P072	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Gaine technique.	idem P073	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P074	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	idem P075	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P076	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P088	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P089	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Plénum.	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 12	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie technique.	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 13	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 13	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 13	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 13	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 13	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 13	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 13	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 13	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 13	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 13	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 13	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 14	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	S	OUI
R+1 / PIECE 14	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 14	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 14	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 14	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 14	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 14	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 14	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 14	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 15	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / PIECE 15	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 15	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 15	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 15	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 16	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 16	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 16	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 16	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 16	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 17	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 17	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 17	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 18	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 18	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 18	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 18	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 18	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 19	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 19	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 19	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 19	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 19	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 20	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 20	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 20	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 20	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 20	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 20	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 21	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	S	**OUI**
R+1 / PIECE 21	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 21	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 21	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 21	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 21	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 22	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 22	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 22	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 23	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 23	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 23	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 24	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 24	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 25	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 25	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 25	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 25	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 25	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 25	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 25	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 25	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 25	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 26	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 26	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 26	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 26	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 26	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 27	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 27	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 27	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 27	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 27	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 28	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 28	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 29	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 29	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 30	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 30	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 30	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 30	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 30	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 31	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 31	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 31	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 31	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 31	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 31	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 31	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 31	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 31	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 31	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 31	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 32	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 32	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 32	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 32	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 32	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 32	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 32	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 32	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 32	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 32	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 33	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 33	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 33	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 33	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 33	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 33	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 33	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 33	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 33	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 33	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 33	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 34	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 34	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 34	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 34	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 34	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 35	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 35	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 35	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 35	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 35	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 36	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	S	**OUI**
R+1 / PIECE 36	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 36	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 36	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 36	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 36	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 37	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 37	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 37	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 37	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 37	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 38	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 38	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 38	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 38	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 38	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 39	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 39	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 39	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 39	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 39	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 40	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 40	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 40	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 40	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 40	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 41	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 41	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 41	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 41	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 41	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 42	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	S	**OUI**
R+1 / PIECE 42	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 42	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / PIECE 42	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 43	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / PIECE 43	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 43	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 43	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 43	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 43	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 44	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 44	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 44	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 44	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 44	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 44	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 44	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 44	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 44	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 45	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 45	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 45	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 45	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 45	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 45	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 45	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 45	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 45	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 46	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 46	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 46	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 46	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 46	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 46	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 46	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 46	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 46	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 47	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 47	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 47	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 47	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 47	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 47	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 47	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 47	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 47	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 47	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 47	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 47	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 48	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 48	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 48	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 48	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P101	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 48	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 48	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 48	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	Galerie technique	**OUI**
R+1 / PIECE 49	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P092	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	idem P093	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P114	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P115	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P116	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P117	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P118	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 49	Mur	Enduit	ciment, clair(e), Galerie technique.	idem P119	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 50	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	Galerie Technique.	**OUI**
R+1 / PIECE 50	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P092	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 50	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	idem P093	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 50	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 50	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 50	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 50	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	Galerie technique.	**OUI**
R+1 / PIECE 51	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P092	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	P093	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P094	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	P095	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Mur	Enduit	compact, clair(e)	P096	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P097	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P114	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P115	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P116	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P117	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P118	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 51	Mur	Enduit	ciment, clair(e), Galerie technique.	idem P119	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 52	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	Galerie Technique.	**OUI**
R+1 / PIECE 53	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / PIECE 53	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P092	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 53	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	idem P093	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 53	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 53	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 53	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 53	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 53	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P114	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 53	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P115	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 53	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P116	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / PIECE 53	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P117	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 53	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P118	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / PIECE 53	Mur	Enduit	ciment, clair(e), Galerie technique.	idem P119	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P070	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P071	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P072	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Gaine technique.	idem P073	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P074	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	idem P075	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P076	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P088	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P089	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Plénum.	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie technique.	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	P130	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Mur	Enduit	compact, clair(e)	P131	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P132	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	P133	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	P134	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 2	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 2	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 2	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 2	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 2	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 2	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 2	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 2	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 2	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 4	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 4	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 4	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 4	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 4	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 4	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 4	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 4	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 6	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 6	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 6	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 6	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 6	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 6	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 6	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 6	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 6	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 8	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 8	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 8	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 8	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 8	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 8	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 8	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 8	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 8	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 8	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 8	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 8	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 9	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P070	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P071	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P072	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Gaine technique.	idem P073	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P074	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	idem P075	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P076	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 10	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P088	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P089	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Plénum.	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 10	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie technique.	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 11	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P077	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 11	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 11	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e), Sanitaires.	idem P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 11	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 11	Pied de cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 11	Cloison	Joint	souple, foncé(e)	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 11	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 11	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P126	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 11	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 11	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	P128	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 11	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P129	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P070	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P071	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P072	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Gaine technique.	idem P073	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P074	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 12	Plafond	Faux plafond	fibreux, clair(e)	idem P075	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Dans plénum.	idem P076	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P088	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P089	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e), Plénum.	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 12	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie technique.	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 13	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 13	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 13	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 13	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 13	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 13	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 13	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 13	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 13	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 13	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 13	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 14	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 14	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 14	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 14	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 14	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 14	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 14	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 14	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 14	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 15	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 15	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 15	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 15	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 15	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 16	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 16	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 16	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 16	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 16	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 17	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 17	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 17	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 18	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 18	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 18	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 18	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 18	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 19	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 19	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 19	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 19	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 19	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 20	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 20	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 20	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 20	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 20	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 21	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 21	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 21	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 21	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 21	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 21	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 22	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 22	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 22	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 23	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 23	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 23	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 24	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 24	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 25	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 25	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	S	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 25	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 25	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 25	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 25	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 25	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 25	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 25	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 26	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 26	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 26	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 26	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 26	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 27	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 27	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 27	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 27	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 27	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 28	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 28	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P109	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 28	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 29	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 29	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 29	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 30	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 30	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 30	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 30	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 30	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 30	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 30	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 31	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 31	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 31	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 31	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 31	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 31	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 31	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 31	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 31	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 31	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 31	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 32	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 32	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 32	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 32	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 32	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 32	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 32	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 32	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 32	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 32	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 33	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 33	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 33	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 33	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 33	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 33	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 33	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 33	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 33	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 33	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 33	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 34	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 34	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 34	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 34	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 34	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 34	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 35	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 35	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 35	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 35	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 35	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 35	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 35	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 36	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 36	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 36	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 36	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 36	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 36	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 37	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 37	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 37	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 37	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 37	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 37	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 38	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 38	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 38	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 38	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 38	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 38	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 39	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 39	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 39	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 39	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 39	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 39	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 40	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 40	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 40	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 40	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 40	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 40	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 41	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 41	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 41	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 41	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 41	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 41	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 42	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 42	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 42	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 42	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 42	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 42	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 42	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 42	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 43	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 43	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 43	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 43	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 43	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 43	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 43	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 43	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 43	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 43	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 43	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 44	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 44	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 44	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 44	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 44	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 44	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 44	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 44	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 44	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 45	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 45	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 45	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 45	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 45	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 45	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 45	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 45	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P112	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 45	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 46	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 46	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 46	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 46	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 46	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 46	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 46	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P111	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 46	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 46	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 47	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+2 / PIECE 47	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 47	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 47	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 47	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 47	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 47	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 47	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 47	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 47	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 47	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 48	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	S	**OUI**
R+2 / PIECE 48	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P098	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P099	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 48	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P100	Résultat d'analyse	S	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 48	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, clair(e)	idem P102	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 48	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P120	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 48	Mur	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P122	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 48	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P123	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / PIECE 48	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	Galerie Technique.	**OUI**
R+2 / PIECE 49	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P092	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	idem P093	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	P114	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	P115	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	P116	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	P117	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Mur	Enduit	compact, clair(e)	P118	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 49	Mur	Enduit	ciment, clair(e), Galerie technique.	P119	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 50	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	Galerie Technique.	**OUI**
R+2 / PIECE 51	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	Galerie Technique.	**OUI**
R+2 / PIECE 51	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P092	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 51	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	idem P093	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 51	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / PIECE 51	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 51	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 51	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 51	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P114	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 51	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P115	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 51	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P116	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 51	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P117	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 51	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P118	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 51	Mur	Enduit	ciment, clair(e), Galerie technique.	idem P119	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 52	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	Galerie Technique.	**OUI**
R+2 / PIECE 53	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	Galerie Technique.	**OUI**
R+2 / PIECE 53	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P092	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 53	Mur	Enduit	ciment, foncé(e), Galerie Technique.	idem P093	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 53	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 53	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 53	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 53	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 53	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, clair(e)	idem P114	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 53	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, clair(e)	idem P115	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 53	Plafond	Enduit	plâtre, clair(e)	idem P116	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 53	Mur	Enduit lissé	plâtre, clair(e)	idem P117	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 53	Mur	Enduit	compact, clair(e)	idem P118	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / PIECE 53	Mur	Enduit	ciment, clair(e), Galerie technique.	idem P119	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / PIECE 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / PIECE 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 3	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / PIECE 3	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 3	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	S	NON
R-1 / PIECE 3	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 3	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 3	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	S	NON
R-1 / PIECE 3	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 3	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 4	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / PIECE 4	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 4	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 4	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 4	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 4	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 4	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 4	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 5	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / PIECE 5	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 5	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / PIECE 5	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 5	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 5	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 5	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 5	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 6	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / PIECE 6	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 6	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 6	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 6	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 6	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 6	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 6	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 7	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 7	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 7	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 7	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 8	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / PIECE 8	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 8	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	S	NON
R-1 / PIECE 8	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 8	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 8	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	S	NON
R-1 / PIECE 8	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 8	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / PIECE 9	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	OUI
R-1 / PIECE 9	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 9	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 9	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 9	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 9	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 9	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 9	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 10	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	OUI
R-1 / PIECE 10	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 10	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 10	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 10	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 10	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 10	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 10	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 11	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	OUI
R-1 / PIECE 11	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 11	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 11	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 11	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 11	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 11	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 11	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 12	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / PIECE 12	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 12	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 12	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 12	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 12	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 12	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 12	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 13	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / PIECE 13	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 13	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 13	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 13	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 13	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 13	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 13	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 14	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / PIECE 14	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 14	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 14	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 14	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 14	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 14	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 14	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 15	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / PIECE 15	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / PIECE 15	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	S	NON
R-1 / PIECE 15	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 15	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	S	NON
R-1 / PIECE 15	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 15	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 15	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 16	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / PIECE 16	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 16	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	S	NON
R-1 / PIECE 16	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 16	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 16	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 16	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / PIECE 16	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Conduit	Calorifugeage	mousse, foncé(e)	idem P007	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, foncé(e)	idem P008	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Conduit	Ruban adhésif	foncé(e)	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Plafond	Rebouchage	plâtreux, clair(e)	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Plafond	Rebouchage	plâtreux, clair(e)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Conduit	Calorifugeage	mousse, foncé(e)	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, foncé(e)	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Conduit	Ruban adhésif	foncé(e)	idem P023	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	OUI
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Conduit	Calorifugeage	mousse, foncé(e)	P007	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, foncé(e)	P008	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Conduit	Ruban adhésif	foncé(e)	P009	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Plafond	Rebouchage	plâtreux, clair(e)	P010	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Plafond	Rebouchage	plâtreux, clair(e)	P011	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Conduit	Calorifugeage	mousse, foncé(e)	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, foncé(e)	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Conduit	Ruban adhésif	foncé(e)	idem P023	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	OUI
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Conduit	Calorifugeage	mousse, foncé(e)	idem P007	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, foncé(e)	idem P008	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Conduit	Ruban adhésif	foncé(e)	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Plafond	Rebouchage	plâtreux, clair(e)	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Plafond	Rebouchage	plâtreux, clair(e)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Conduit	Calorifugeage	mousse, foncé(e)	P021	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, foncé(e)	P022	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Conduit	Ruban adhésif	foncé(e)	P023	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / VIDE SANITAIRE 4	Conduit	Calorifugeage	mousse, foncé(e)	idem P007	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 4	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, foncé(e)	idem P008	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 4	Conduit	Ruban adhésif	foncé(e)	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / VIDE SANITAIRE 4	Plafond	Rebouchage	plâtreux, clair(e)	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 4	Plafond	Rebouchage	plâtreux, clair(e)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 4	Conduit	Calorifugeage	mousse, foncé(e)	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 4	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, foncé(e)	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / VIDE SANITAIRE 4	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R-1 / CIRCULATION 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / CIRCULATION 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 1	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Gros conduit.	P003	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 1	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Gros conduit.	P004	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 1	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 1	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 1	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Gros conduit.	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 1	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Gros conduit.	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 1	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 1	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 1	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P001	Résultat d'analyse	Rebouchage autour fenêtre et portes.	**OUI**
R-1 / CIRCULATION 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Gros conduit.	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Gros conduit.	idem P004	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Gros conduit.	P012	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Gros conduit.	P013	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / CIRCULATION 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	P014	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, clair(e), Petit conduit.	P015	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	P016	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Mur	Enduit	ciment, foncé(e)	P017	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Plafond	Plaque	fibreux, foncé(e), Fibralites dans gaine technique.	P018	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CIRCULATION 2	Plafond	Plaque	fibreux, foncé(e), Fibralites dans gaine technique.	P020	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CHAUFFERIE	Mur	Enduit	ciment, clair(e)	P024	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CHAUFFERIE	Mur	Enduit	ciment, clair(e)	P025	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / CHAUFFERIE	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
EXTERIEUR / FACADES	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	compact, clair(e)	P137	Résultat d'analyse	/	**OUI**
EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	compact, clair(e)	P138	Résultat d'analyse	/	**OUI**
EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	lissé, clair(e)	P139	Résultat d'analyse	/	NON
EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	lissé, clair(e)	P140	Résultat d'analyse	/	NON
EXTERIEUR / TOIT TERRASSE	Mur	Enduit	ciment, clair(e)	P135	Résultat d'analyse	/	NON
EXTERIEUR / TOIT TERRASSE	Mur	Enduit	ciment, clair(e)	P136	Résultat d'analyse	/	NON
COMBLES / COMBLES	Conduit	Conduit	fibre-ciment, foncé(e)	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

1.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Mur	Enduit	Surface : 300 m2
1	Conduit	Ruban adhésif	Unite : 6
3	Conduit	Conduit	Surface : 1000 m2
4	Façade	Enduit	Surface : 1000 m2

2. ANNEXES

2.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	*Commentaires*
RDC / PIECE 1	/
RDC / PIECE 2	/
RDC / PIECE 3	/
RDC / PIECE 4	/
RDC / PIECE 5	/
RDC / PIECE 6	/
RDC / PIECE 7	/
RDC / PIECE 8	/
RDC / PIECE 9	/
RDC / PIECE 10	/
RDC / PIECE 11	/
RDC / PIECE 12	/
RDC / PIECE 13	/
RDC / PIECE 14	/
RDC / PIECE 15	/
RDC / PIECE 16	/
RDC / PIECE 17	/
RDC / PIECE 18	/
RDC / PIECE 19	/
RDC / PIECE 20	/
RDC / PIECE 21	/
RDC / PIECE 22	/
RDC / PIECE 23	/
RDC / PIECE 24	/
RDC / PIECE 25	/
RDC / PIECE 26	/
RDC / PIECE 27	/
RDC / PIECE 28	/
RDC / PIECE 29	/
RDC / PIECE 30	/
RDC / PIECE 31	/

Localisation	*Commentaires*
RDC / PIECE 32	/
RDC / PIECE 33	/
RDC / PIECE 34	/
RDC / PIECE 35	/
RDC / PIECE 36	/
RDC / PIECE 37	/
RDC / PIECE 38	/
RDC / PIECE 39	/
RDC / PIECE 40	/
RDC / PIECE 41	/
RDC / PIECE 42	/
RDC / PIECE 43	/
RDC / PIECE 44	/
RDC / PIECE 45	/
RDC / PIECE 46	/
RDC / PIECE 47	/
RDC / PIECE 48	/
R+1 / PIECE 1	/
R+1 / PIECE 2	/
R+1 / PIECE 3	/
R+1 / PIECE 4	/
R+1 / PIECE 5	/
R+1 / PIECE 6	/
R+1 / PIECE 7	/
R+1 / PIECE 8	/
R+1 / PIECE 9	/
R+1 / PIECE 10	/
R+1 / PIECE 11	/
R+1 / PIECE 12	/
R+1 / PIECE 13	/
R+1 / PIECE 14	/
R+1 / PIECE 15	/
R+1 / PIECE 16	/
R+1 / PIECE 17	/
R+1 / PIECE 18	/
R+1 / PIECE 19	/
R+1 / PIECE 20	/
R+1 / PIECE 21	/
R+1 / PIECE 22	/
R+1 / PIECE 23	/
R+1 / PIECE 24	/
R+1 / PIECE 25	/
R+1 / PIECE 26	/
R+1 / PIECE 27	/
R+1 / PIECE 28	/
R+1 / PIECE 29	/

Localisation	*Commentaires*
R+1 / PIECE 30	/
R+1 / PIECE 31	/
R+1 / PIECE 32	/
R+1 / PIECE 33	/
R+1 / PIECE 34	/
R+1 / PIECE 35	/
R+1 / PIECE 36	/
R+1 / PIECE 37	/
R+1 / PIECE 38	/
R+1 / PIECE 39	/
R+1 / PIECE 40	/
R+1 / PIECE 41	/
R+1 / PIECE 42	/
R+1 / PIECE 43	/
R+1 / PIECE 44	/
R+1 / PIECE 45	/
R+1 / PIECE 46	/
R+1 / PIECE 47	/
R+1 / PIECE 48	/
R+1 / PIECE 49	/
R+1 / PIECE 50	/
R+1 / PIECE 51	/
R+1 / PIECE 52	/
R+1 / PIECE 53	/
R+2 / PIECE 1	/
R+2 / PIECE 2	/
R+2 / PIECE 3	/
R+2 / PIECE 4	/
R+2 / PIECE 5	/
R+2 / PIECE 6	/
R+2 / PIECE 7	/
R+2 / PIECE 8	/
R+2 / PIECE 9	/
R+2 / PIECE 10	/
R+2 / PIECE 11	/
R+2 / PIECE 12	/
R+2 / PIECE 13	/
R+2 / PIECE 14	/
R+2 / PIECE 15	/
R+2 / PIECE 16	/
R+2 / PIECE 17	/
R+2 / PIECE 18	/
R+2 / PIECE 19	/
R+2 / PIECE 20	/
R+2 / PIECE 21	/
R+2 / PIECE 22	/

Localisation	*Commentaires*
R+2 / PIECE 23	/
R+2 / PIECE 24	/
R+2 / PIECE 25	/
R+2 / PIECE 26	/
R+2 / PIECE 27	/
R+2 / PIECE 28	/
R+2 / PIECE 29	/
R+2 / PIECE 30	/
R+2 / PIECE 31	/
R+2 / PIECE 32	/
R+2 / PIECE 33	/
R+2 / PIECE 34	/
R+2 / PIECE 35	/
R+2 / PIECE 36	/
R+2 / PIECE 37	/
R+2 / PIECE 38	/
R+2 / PIECE 39	/
R+2 / PIECE 40	/
R+2 / PIECE 41	/
R+2 / PIECE 42	/
R+2 / PIECE 43	/
R+2 / PIECE 44	/
R+2 / PIECE 45	/
R+2 / PIECE 46	/
R+2 / PIECE 47	/
R+2 / PIECE 48	/
R+2 / PIECE 49	/
R+2 / PIECE 50	/
R+2 / PIECE 51	/
R+2 / PIECE 52	/
R+2 / PIECE 53	/
R-1 / PIECE 2	/
R-1 / PIECE 3	/
R-1 / PIECE 4	/
R-1 / PIECE 5	/
R-1 / PIECE 6	/
R-1 / PIECE 7	/
R-1 / PIECE 8	/
R-1 / PIECE 9	/
R-1 / PIECE 10	/
R-1 / PIECE 11	/
R-1 / PIECE 12	/
R-1 / PIECE 13	/
R-1 / PIECE 14	/
R-1 / PIECE 15	/
R-1 / PIECE 16	/

Localisation	*Commentaires*
R-1 / VIDE SANITAIRE 1	/
R-1 / VIDE SANITAIRE 2	/
R-1 / VIDE SANITAIRE 3	/
R-1 / VIDE SANITAIRE 4	/
R-1 / PALIER 1	/
R-1 / PALIER 2	/
R-1 / CIRCULATION 1	/
R-1 / CIRCULATION 2	/
R-1 / CHAUFFERIE	/
EXTERIEUR / FACADES	/
EXTERIEUR / TOIT TERRASSE	/
COMBLES / COMBLES	/

2.2. Croquis de repérage

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNFEG 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante		
RDC	Date de visite	04/05/2022	S → Sondage		
	Auteur	D.CHAUCHET			
	N° Dossier	14659073-1			
	Planche	2			
Plan/Elevation	Indice	0			

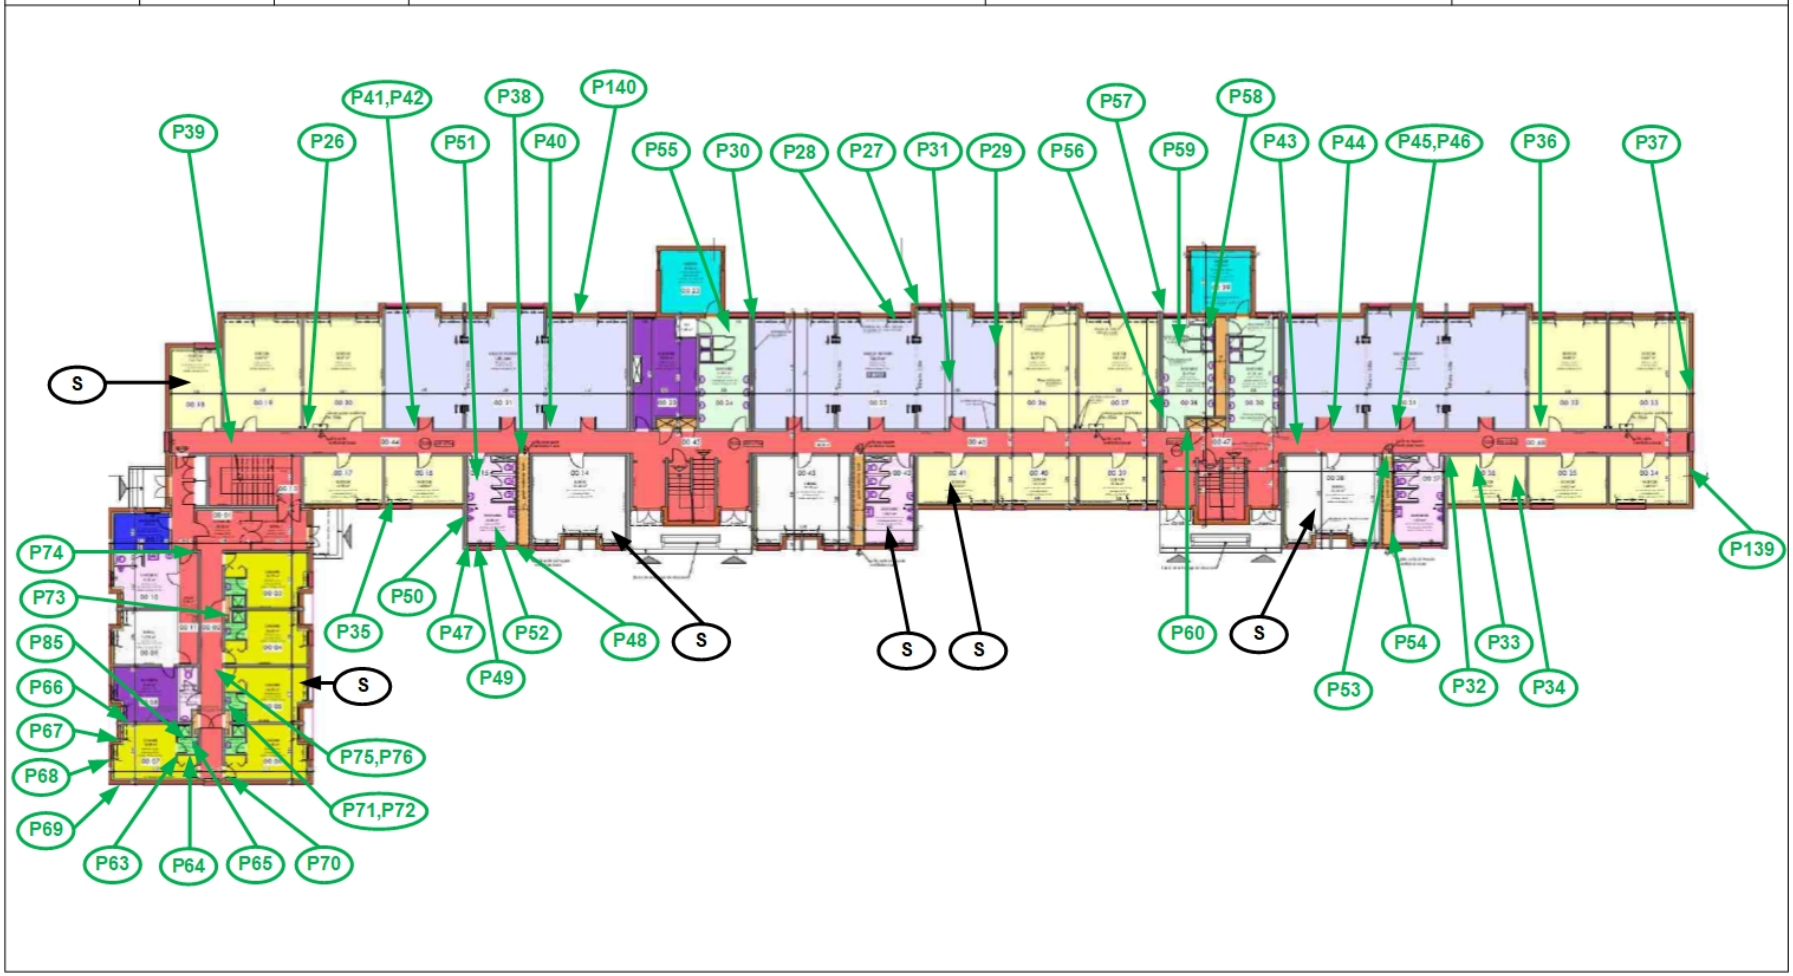


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : BATIMENT 068	Adresse : CNEFG-SAINT ASTIER 24110 SAINT ASTIER	Localisation : RDC
Réalisé par : Dorian CHAUCHET	N° de planche : 1 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNFEG 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante	▬ Conduits contenant de l'amiante	
RDC	Date de visite	04/05/2022			
	Auteur	D.CHAUCHET			
	N° Dossier	14659073-1			
	Planche	7			
Plan/Elevation	Indice	0			

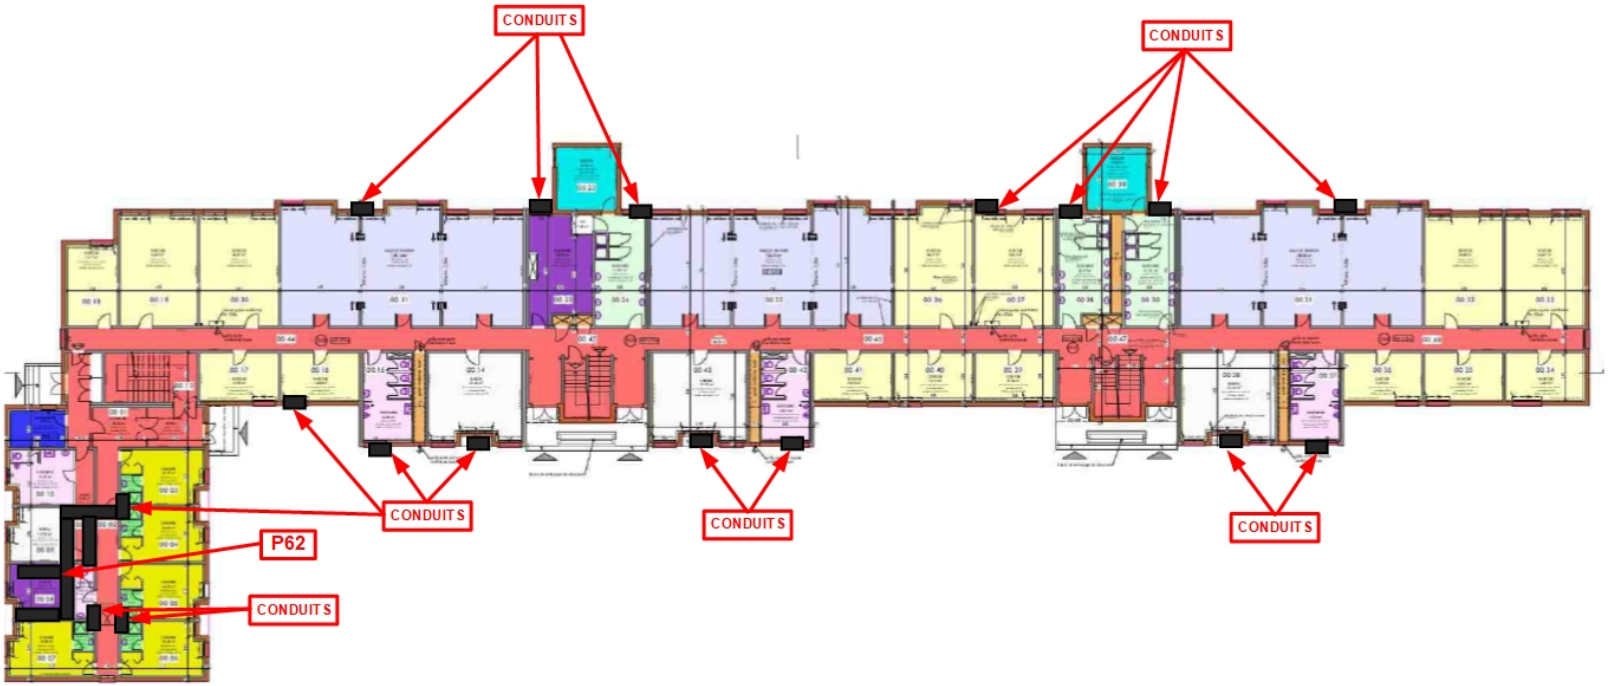


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : BATIMENT 068	Adresse : CNEFG-SAINT ASTIER 24110 SAINT ASTIER	Localisation : RDC
Réalisé par : Dorian CHAUCHET	N° de planche : 2 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNFEG 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante		
R+1	Date de visite	04/05/2022	S → Sondage		
	Auteur	D.CHAUCHET			
	N° Dossier	14659073-1			
	Planche	3			
Plan/Elevation	Indice	0			

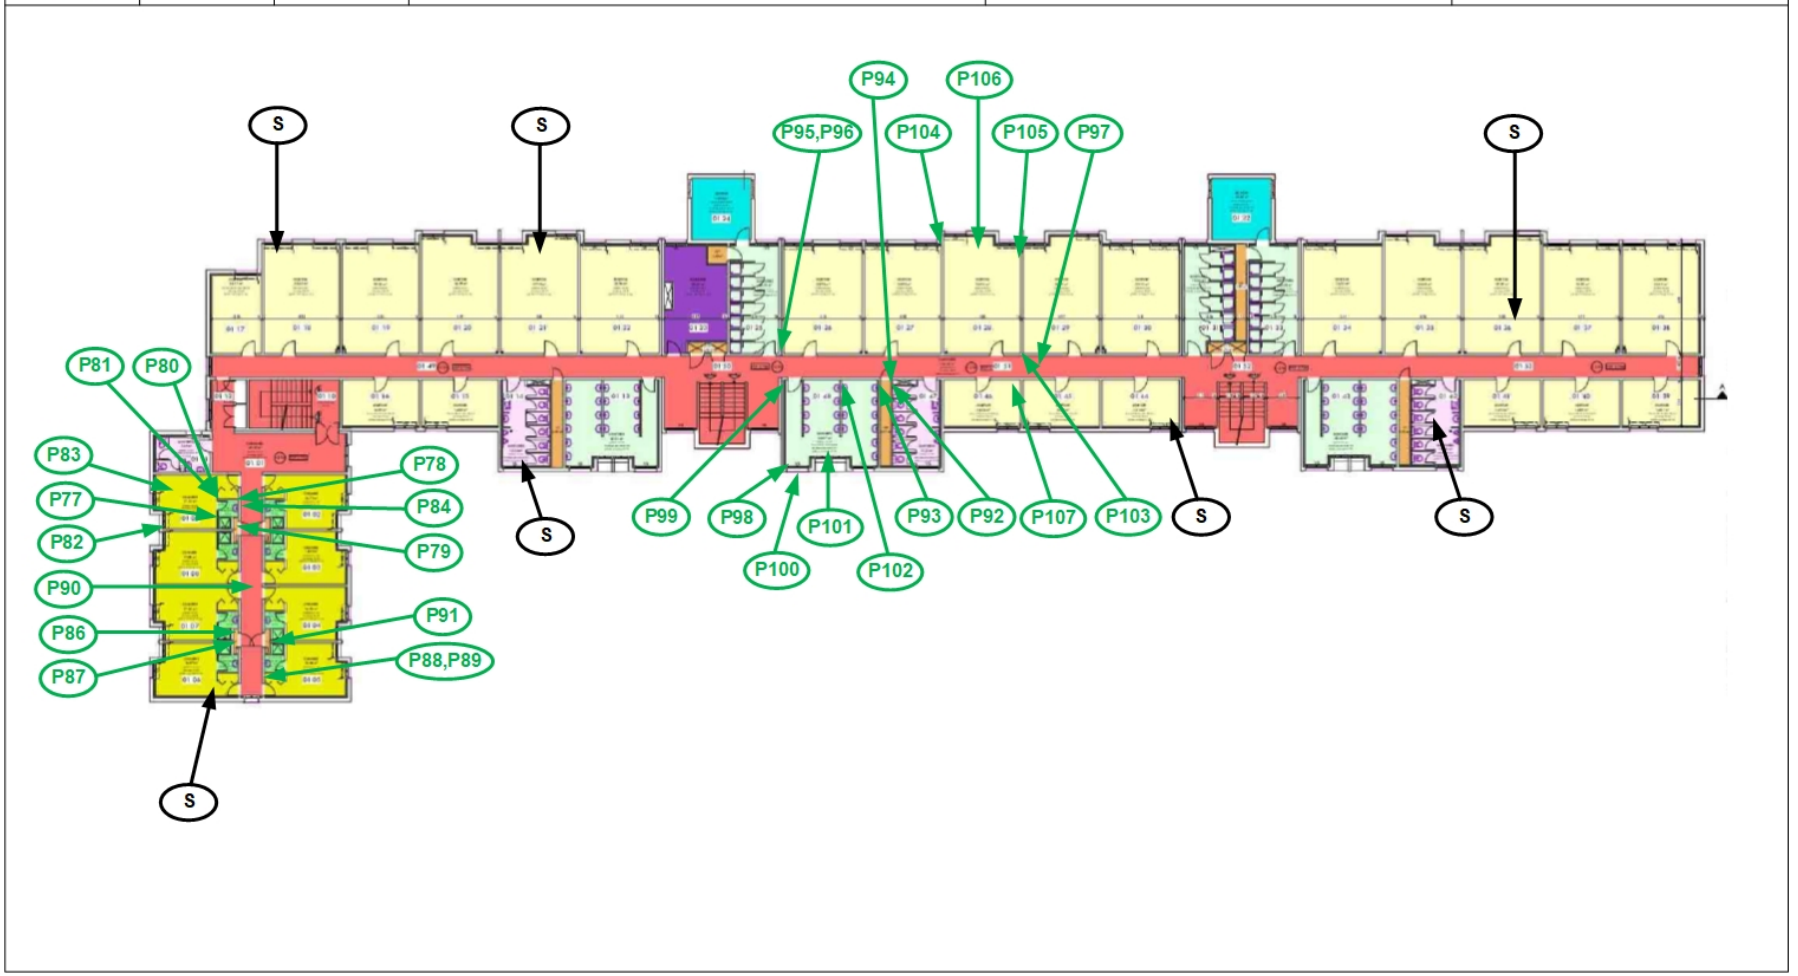


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : BATIMENT 068	Adresse : CNEFG-SAINT ASTIER 24110 SAINT ASTIER	Localisation : R+1
Réalisé par : Dorian CHAUCHET	N° de planche : 3 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNFEG 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante	▬ Conduits contenant de l'amiante	
R+1	Date de visite	04/05/2022			
	Auteur	D.CHAUCHET			
	N° Dossier	14659073-1			
	Planche	8			
Plan/Elevation	Indice	0			

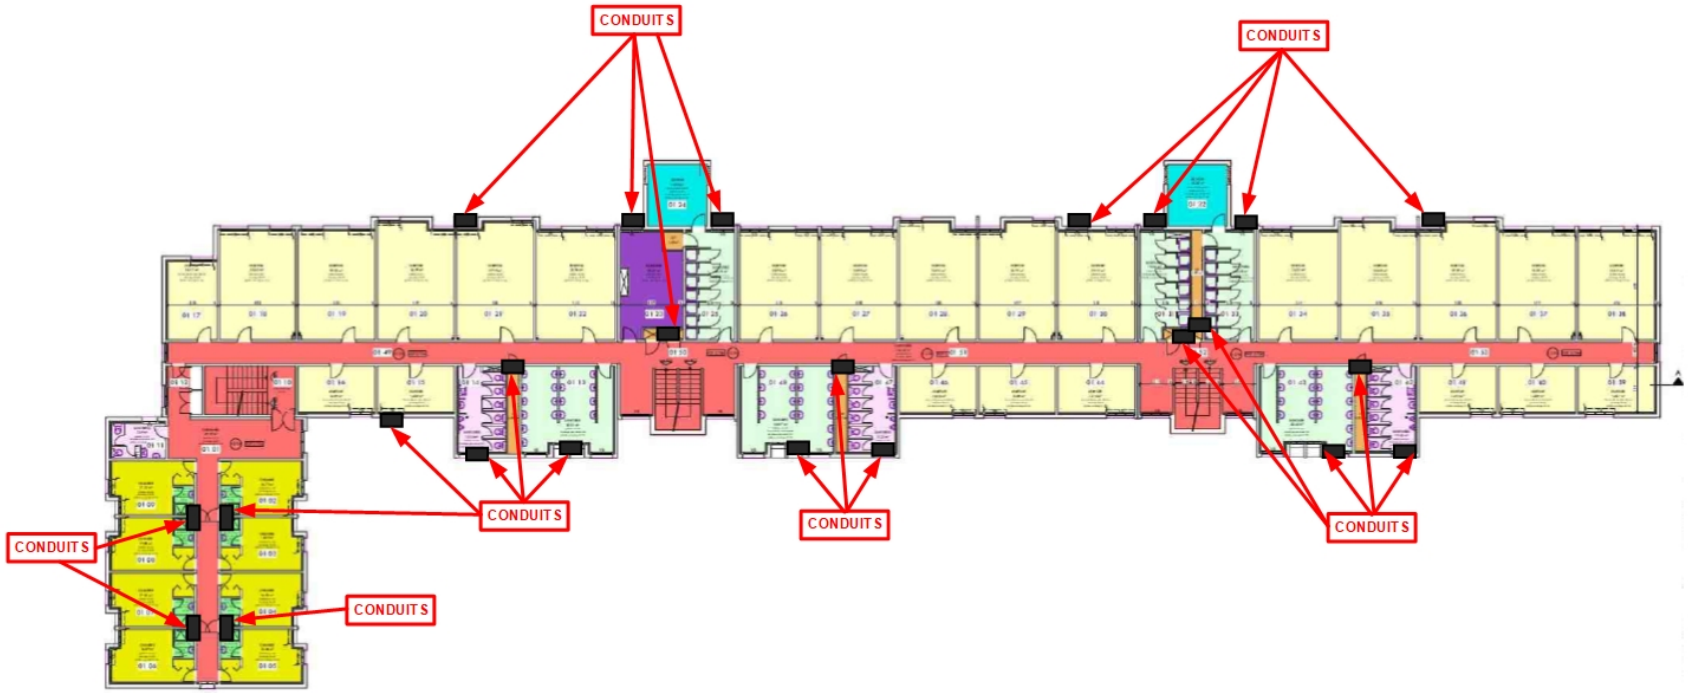


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : BATIMENT 068	Adresse : CNEFG-SAINT ASTIER 24110 SAINT ASTIER	Localisation : R+1
Réalisé par : Dorian CHAUCHET	N° de planche : 4 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNFEG 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante	▬ Conduits contenant de l'amiante	
R+2	Date de visite	04/05/2022			
	Auteur	D.CHAUCHET			
	N° Dossier	14659073-1			
	Planche	9			
Plan/Elevation	Indice	0			

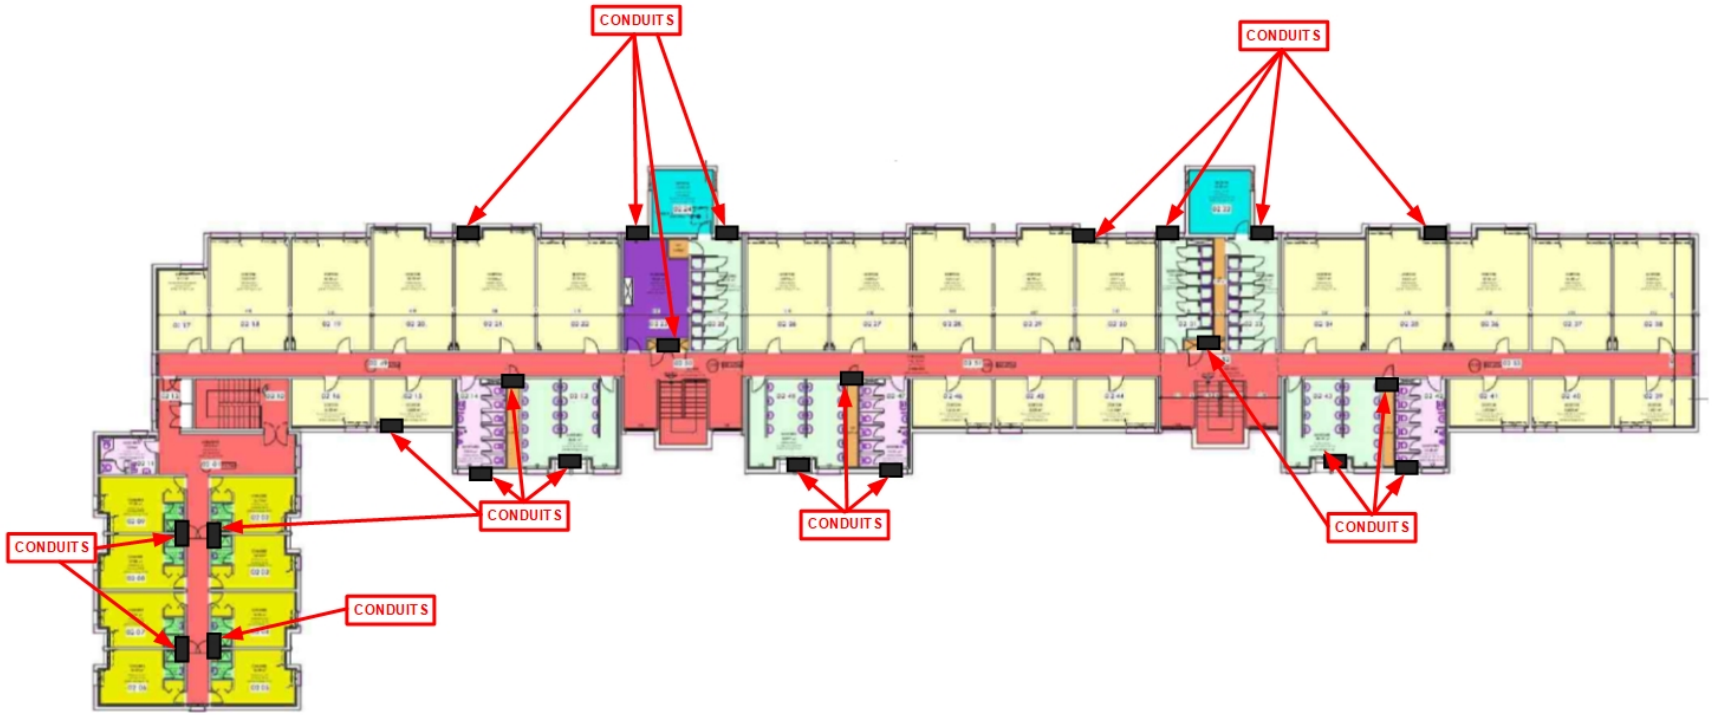


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : BATIMENT 068	Adresse : CNEFG-SAINT ASTIER 24110 SAINT ASTIER	Localisation : R+2
Réalisé par : Dorian CHAUCHET	N° de planche : 5 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNFEG 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage		
R+2	Date de visite	04/05/2022			
	Auteur	D.CHAUCHET			
	N° Dossier	14659073-1			
	Planche	4			
Plan/Elevation	Indice	0			

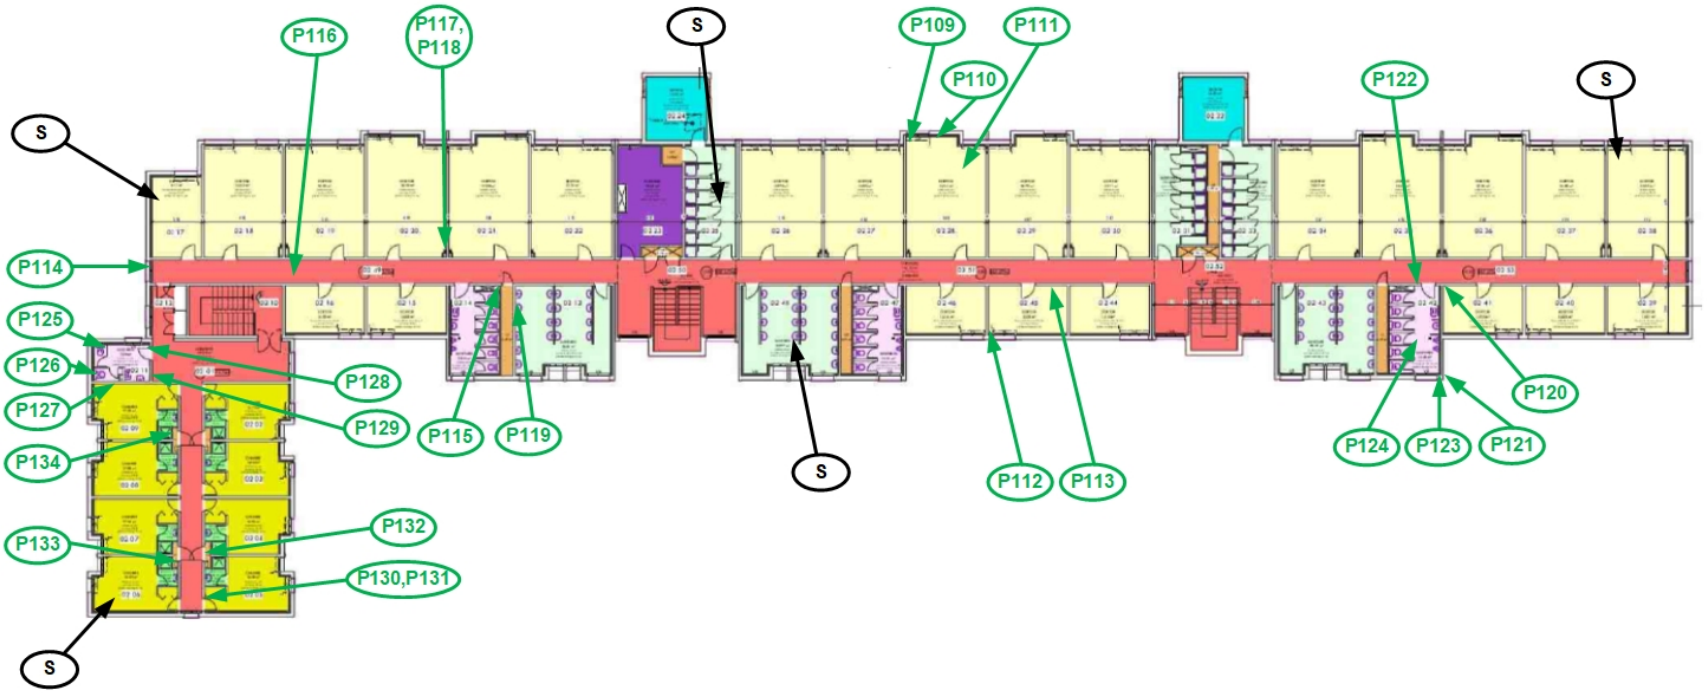


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : BATIMENT 068	Adresse : CNEFG-SAINT ASTIER 24110 SAINT ASTIER	Localisation : R+2
Réalisé par : Dorian CHAUCHET	N° de planche : 6 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNFEG 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage		
SOUS-SOL	Date de visite	04/05/2022			
	Auteur	D.CHAUCHET			
	N° Dossier	14659073-1			
	Planche	1			
Plan/Elevation	Indice	0			

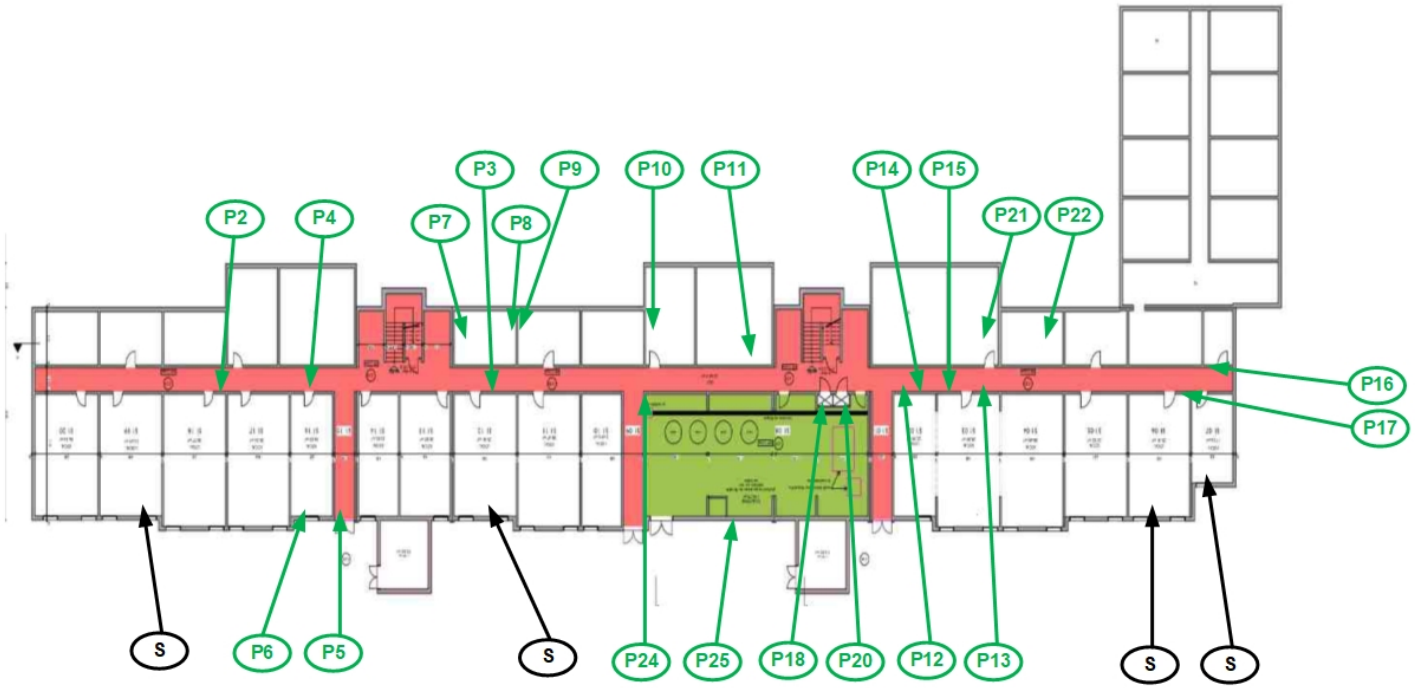


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : BATIMENT 068	Adresse : CNEFG-SAINT ASTIER 24110 SAINT ASTIER	Localisation : R-1
Réalisé par : Dorian CHAUCHET	N° de planche : 7 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNFEG 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Rhuban adhésif sur conduits contenant de l'amiante Conduits contenant de l'amiante Enduit ciment en entourage de porte ou fenêtres (rebouchage)	
SOUS-SOL	Date de visite	04/05/2022			
	Auteur	D.CHAUCHET			
	N° Dossier	14659073-1			
	Planche	6			
Plan/Elevation	Indice	0			



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : BATIMENT 068	Adresse : CNEFG-SAINT ASTIER 24110 SAINT ASTIER	Localisation : R-1
Réalisé par : Dorian CHAUCHET	N° de planche : 8 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNFEG 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Conduits contenant de l'amiante	
R+1	Date de visite	04/05/2022	S → Sondage		
	Auteur	D.CHAUCHET			
	N° Dossier	14659073-1			
	Planche	10			
Plan/Elevation	Indice	0			

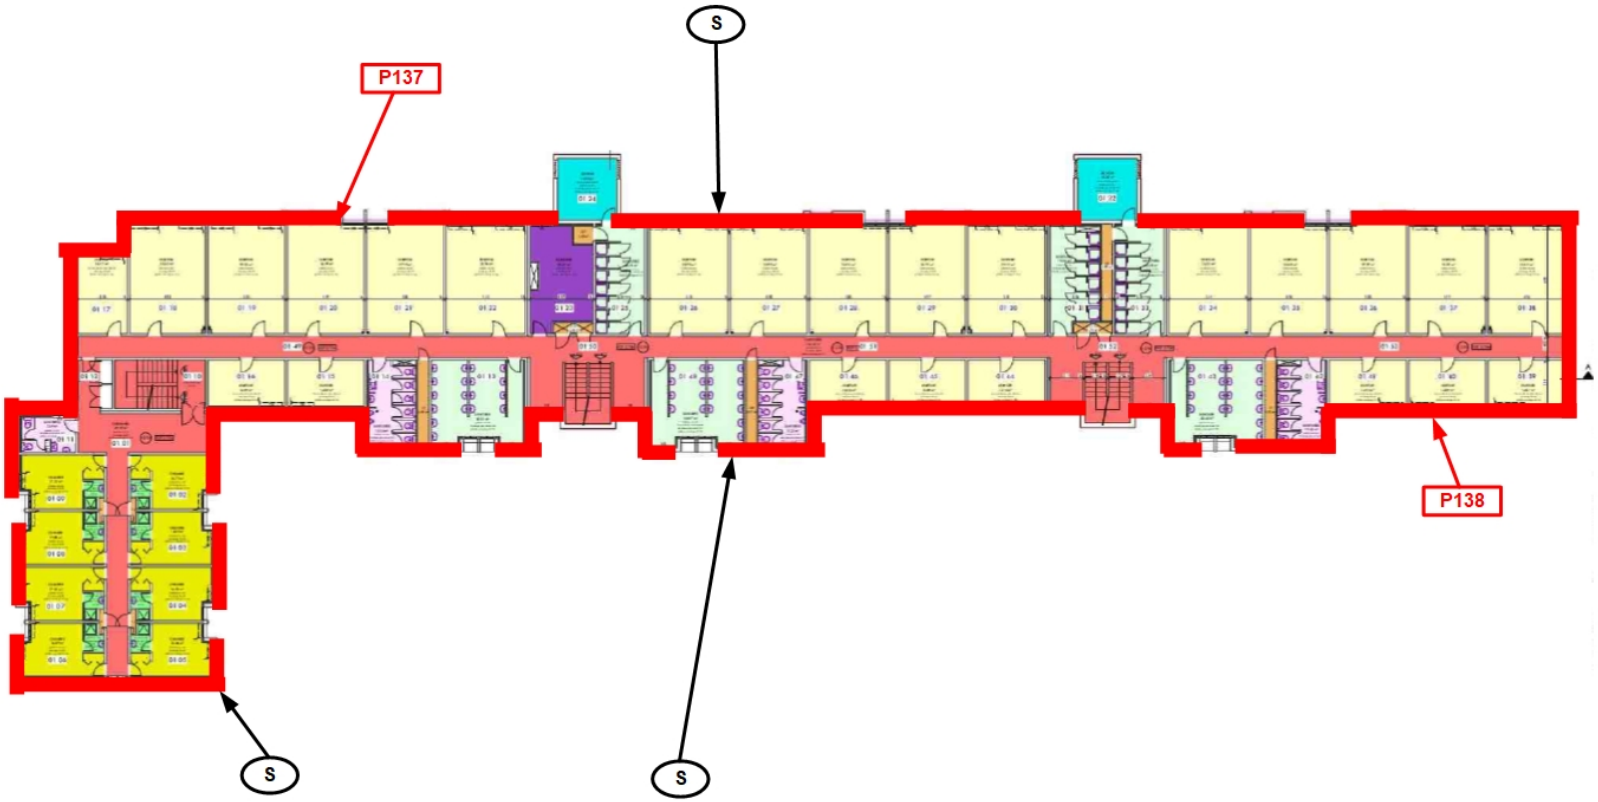


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : BATIMENT 068	Adresse : CNEFG-SAINT ASTIER 24110 SAINT ASTIER	Localisation : EXTERIEUR
Réalisé par : Dorian CHAUCHET	N° de planche : 9 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNFEG 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	Conduits contenant de l'amiante	
COMBLES	Date de visite	04/05/2022			
	Auteur	D.CHAUCHET			
	N° Dossier	14659073-1			
	Planche	5			
Plan/Elevation	Indice	0			

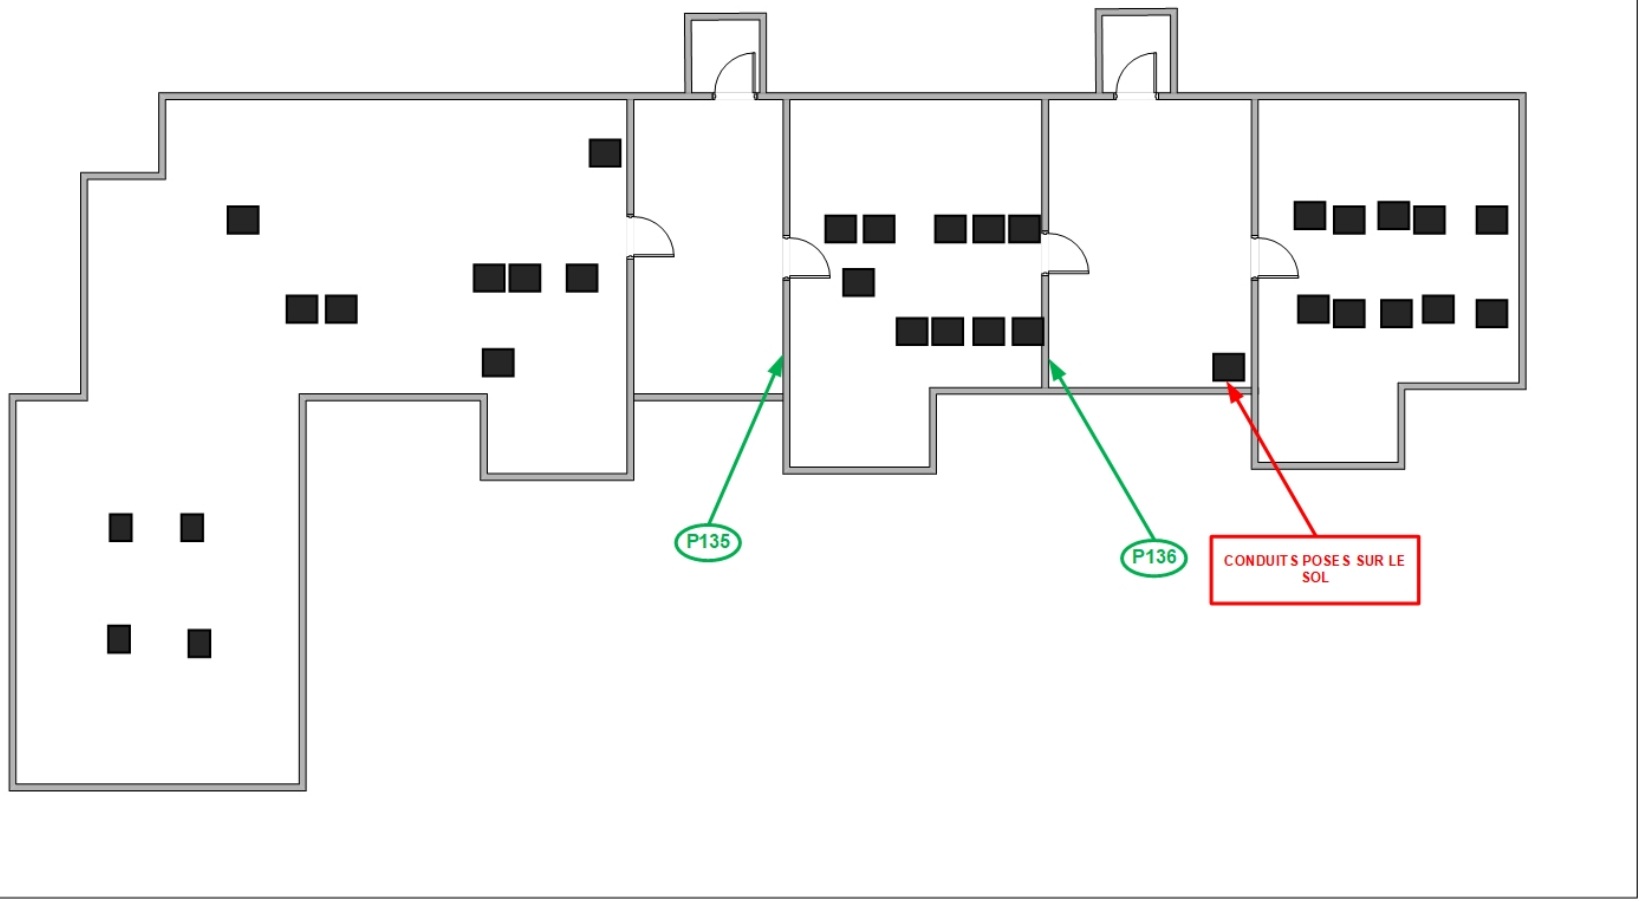


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : BATIMENT 068	Adresse : CNEFG-SAINT ASTIER 24110 SAINT ASTIER	Localisation : COMBLES
Réalisé par : Dorian CHAUCHET	N° de planche : 10 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

2.3. Photos




Prélèvement - P001 : R-1 / PIECE 5 - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P023 : R-1 / VIDE SANITAIRE 3 - Ruban adhésif - (Présence d'amiante)



Prélèvement - P062 : RDC / PIECE 8 - Conduit- (Présence d'amiante)

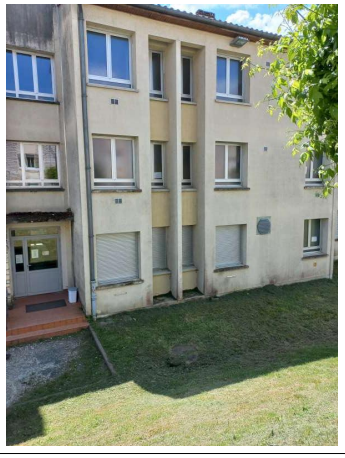

Prélèvement - P137 : EXTERIEUR / FACADES - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P138 : EXTERIEUR / FACADES - Enduit- (Présence d'amiante)

2.4. Attestation d'assurance

MSIG
Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière
  - ERP
  - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**

4) **Conseil en performance énergétique.**

5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil**.

6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**

7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 00037 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

2.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Monsieur Dorian CHAUCHET

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	04/05/2018	03/05/2023
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	07/07/2019	03/05/2023
Electricite	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	04/05/2018	03/05/2023
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	20/04/2018	19/04/2023
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	04/05/2018	03/05/2023

Date : 07/07/2019 Numéro de certificat : 8026828

Jacques MATILLON, Président

RECYCLÉ
Papier fait à partir de matériaux recyclés
FSC® C124913

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

2.6. Rapports d’essais de laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Dorian CHAUCHET
30 Avenue Gustave Eiffel
33615 PESSAC CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 |
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3GU7263 Réf. prél : P001 R-1/ PIECE 5/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e))	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	BV3GU7264 Réf. prél : P002 R-1/ CIRCULATION 1/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e))	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3GU7265 Réf. prél : P003 R-1/ CIRCULATION 1/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/clair(e)/Gros conduit.)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	BV3GU7266 Réf. prél : P004 R-1/ CIRCULATION 1/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/clair(e)/Gros conduit.)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	BV3GU7267 Réf. prél : P005 R-1/ CIRCULATION 1/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/clair(e)/Petit conduit.)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page2/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type mousse (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3GU7268 Réf. prél : P006 R-1/ PIECE 5/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/clair(e)/Petit conduit.)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (blanc)(i)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	BV3GU7271 Réf. prél : P007 R-1/ VIDE SANITAIRE 2/Conduit - Calorifugeage - (mousse/foncé(e))	Matériau semi-dur (noir) (bitumineux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	BV3GU7272 Réf. prél : P008 R-1/ VIDE SANITAIRE 2/Conduit - Calorifugeage - (laine de verre/foncé(e))	Matériau (noir) (bitumineux) ; matériau de type maillage de fibres (marron)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page3/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	**MOLP** * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
009	BV3GU7273 Réf. prél : P009 R-1/ VIDE SANITAIRE 2/Conduit - Ruban adhésif - (foncé(e))	Matériau souple (noir) (bitumineux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	BV3GU7274 Réf. prél : P010 R-1/ VIDE SANITAIRE 2/Plafond - Rebouchage - (plâtreux/clair(e))	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	BV3GU7275 Réf. prél : P011 R-1/ VIDE SANITAIRE 2/Plafond - Rebouchage - (plâtreux/clair(e))	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	BV3GU7276 Réf. prél : P012 R-1/ CIRCULATION 2/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/clair(e)/Gros conduit.)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (marron) ; matériau de type mousse (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	BV3GU7277 Réf. prél : P013 R-1/ CIRCULATION 2/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/clair(e)/Gros conduit.)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (marron)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page4/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type mousse (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	BV3GU7278 Réf. prél : P014 R-1/ CIRCULATION 2/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/clair(e)/Petit conduit.)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	BV3GU7279 Réf. prél : P015 R-1/ CIRCULATION 2/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/clair(e)/Petit conduit.) + Réf. prél : P016 R-1/ CIRCULATION 2/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) (polymérisé) ; matériau de type mousse (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	BV3GU7281 Réf. prél : P017 R-1/ CIRCULATION 2/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e))	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	BV3GU7282 Réf. prél : P018 R-1/ CIRCULATION 2/Plafond - Plaque - (fibreux/foncé(e)/Fibralies dans gaine technique.)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type polystyrène	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page5/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	BV3GU7283 Réf. prél : P020 R-1/ CIRCULATION 2/Plafond - Plaque - (fibreux/foncé(e)/Fibrali es dans gaine technique.)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type polystyrène	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	BV3GU7285 Réf. prél : P022 R-1/ VIDE SANITAIRE 3/Conduit - Calorifugeage - (laine de verre/foncé(e))	Matériau (noir) (bitumineux) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
020	BV3GU7286 Réf. prél : P023 R-1/ VIDE SANITAIRE 3/Conduit - Ruban adhésif - (foncé(e))	Matériau souple (noir) (bitumineux)(ii)	**MET** * / ZL6A	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021	BV3GU7287 Réf. prél : P024 R-1/ CHAUFFERIE/Mur - Enduit - (ciment/clair(e))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	BV3GU7288 Réf. prél : P025 R-1/ CHAUFFERIE/Mur - Enduit - (ciment/clair(e))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page6/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	BV3GU7289 Réf. prél : P026 RDC/ PIECE 20/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	BV3GU7290 Réf. prél : P027 RDC/ PIECE 25/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	BV3GU7291 Réf. prél : P028 RDC/ PIECE 25/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	BV3GU7292 Réf. prél : P029 RDC/ PIECE 25/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e))	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	BV3GU7293 Réf. prél : P030 RDC/ PIECE 25/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	BV3GU7294 Réf. prél : P031 RDC/ PIECE 25/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page7/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	BV3GU7295 Réf. prél : P032 RDC/ PIECE 36/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau semi-dur de type joint (gris) (foncé)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	BV3GU7296 Réf. prél : P033 RDC/ PIECE 36/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (orange) + (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	BV3GU7297 Réf. prél : P034 RDC/ PIECE 36/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	BV3GU7298 Réf. prél : P035 RDC/ PIECE 16/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page8/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	BV3GU7299 Réf. prél : P036 RDC/ PIECE 32/Mur - Enduit - (plâtre/rose)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	BV3GU7300 Réf. prél : P037 RDC/ PIECE 33/Mur - Enduit - (plâtre/rose)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	BV3GU7301 Réf. prél : P038 RDC/ PIECE 44/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (rose)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036	BV3GU7302 Réf. prél : P039 RDC/ PIECE 44/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	BV3GU7303 Réf. prél : P040 RDC/ PIECE 44/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page9/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
038	BV3GU7304 Réf. prél : P041 RDC/ PIECE 44/Mur - Enduit lissé - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	BV3GU7305 Réf. prél : P042 RDC/ PIECE 44/Mur - Enduit - (compact/clair(e))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
040	BV3GU7306 Réf. prél : P043 RDC/ PIECE 48/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
041	BV3GU7308 Réf. prél : P045 RDC/ PIECE 48/Mur - Enduit lissé - (plâtre/clair(e)) + Réf. prél : P044 RDC/ PIECE 48/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page10/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	BV3GU7309 Réf. prél : P046 RDC/ PIECE 48/Mur - Enduit - (compact/clair(e))	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
043	BV3GU7310 Réf. prél : P047 RDC/ PIECE 15/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
044	BV3GU7311 Réf. prél : P048 RDC/ PIECE 15/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau semi-dur de type joint (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
045	BV3GU7312 Réf. prél : P049 RDC/ PIECE 15/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
046	BV3GU7313 Réf. prél : P050 RDC/ PIECE 15/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page11/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047	BV3GU7314 Réf. prél : P051 RDC/ PIECE 15/Plafond - Faux plafond - (fibreux/clair(e))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048	BV3GU7315 Réf. prél : P052 RDC/ PIECE 15/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e)/Dans plénum.)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
049	BV3GU7316 Réf. prél : P053 RDC/ PIECE 48/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
050	BV3GU7317 Réf. prél : P054 RDC/ PIECE 48/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e)/Dans gaine technique sanitaire.)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051	BV3GU7318 Réf. prél : P055 RDC/ PIECE 24/Plafond - Faux plafond - (fibreux/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page12/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
052	BV3GU7319 Réf. prél : P056 RDC/ PIECE 28/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
053	BV3GU7320 Réf. prél : P057 RDC/ PIECE 28/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
054	BV3GU7321 Réf. prél : P058 RDC/ PIECE 28/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
055	BV3GU7322 Réf. prél : P059 RDC/ PIECE 28/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e)/Dans plénum.)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
056	BV3GU7323 Réf. prél : P060 RDC/ PIECE 28/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page13/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
057	BV3GU7324 Réf. prél : P061 RDC/ PIECE 48/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e)/Galerie Technique.)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)(iii)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
058	BV3GU7325 Réf. prél : P062 RDC/ PIECE 8/Conduit - Conduit - (fibre-ciment/foncé(e))	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
059	BV3GU7326 Réf. prél : P063 RDC/ PIECE 7/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e)/Sanitaires.)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
060	BV3GU7327 Réf. prél : P064 RDC/ PIECE 7/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/foncé(e)/Sanitaires.)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
061	BV3GU7328 Réf. prél : P065 RDC/ PIECE 7/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/clair(e)/Sanitaires.)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page14/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	BV3GU7329 Réf. prél : P066 RDC/ PIECE 7/Mur - Enduit - (clair(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
063	BV3GU7330 Réf. prél : P067 RDC/ PIECE 7/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
064	BV3GU7331 Réf. prél : P068 RDC/ PIECE 7/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
065	BV3GU7332 Réf. prél : P069 RDC/ PIECE 7/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
066	BV3GU7333 Réf. prél : P070 RDC/ PIECE 2/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
067	BV3GU7334 Réf. prél : P071 RDC/ PIECE 2/Mur - Enduit lissé - (plâtre/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page15/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
068	BV3GU7335 Réf. prél : P072 RDC/ PIECE 2/Mur - Enduit - (compact/clair(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
069	BV3GU7336 Réf. prél : P073 RDC/ PIECE 2/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e)/Gaine technique.)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
070	BV3GU7337 Réf. prél : P074 RDC/ PIECE 2/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
071	BV3GU7338 Réf. prél : P075 RDC/ PIECE 2/Plafond - Faux plafond - (fibreux/clair(e))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
072	BV3GU7339 Réf. prél : P076 RDC/ PIECE 2/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e)/Dans plénum.)					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page16/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
073	BV3GU7340 Réf. prél : P077 R+1/ PIECE 9/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e)/Sanitaires.)	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
074	BV3GU7341 Réf. prél : P078 R+1/ PIECE 9/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e)/Sanitaires.)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (jaune) + (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
075	BV3GU7342 Réf. prél : P079 R+1/ PIECE 9/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/clair(e)/Sanitaires.)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (orange) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page17/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076	BV3GU7343 Réf. prél : P080 R+1/ PIECE 9/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
077	BV3GU7344 Réf. prél : P082 R+1/ PIECE 9/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau (gris) + (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
078	BV3GU7345 Réf. prél : P081 R+1/ PIECE 9/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
079	BV3GU7346 Réf. prél : P083 R+1/ PIECE 9/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (gris) + (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
080	BV3GU7347 Réf. prél : P084 R+1/ PIECE 9/Pied de cloison - Joint - (souple/foncé(e)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
081	BV3GU7348 Réf. prél : P085 RDC/ PIECE 7/Cloison - Joint - (souple/foncé(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page18/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type joint (noir)(iii)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
082	BV3GU7349 Réf. prél : P086 R+1/ PIECE 1/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
083	BV3GU7350 Réf. prél : P087 R+1/ PIECE 1/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
084	BV3GU7351 Réf. prél : P088 R+1/ PIECE 1/Mur - Enduit lissé - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
085	BV3IZ7502 Réf. prél : P089 R+1/ PIECE 1/Mur - Enduit - (compact/clair(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
086	BV3IZ7503 Réf. prél : P090 R+1/ PIECE 1/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e)/Plénum.					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page19/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
087	BV3IZ7504 Réf. prél : P091 R+1/ PIECE 1/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e)/Galerie technique.)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
088	BV3IZ7505 Réf. prél : P092 R+1/ PIECE 51/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
089	BV3IZ7510 Réf. prél : P093 R+1/ PIECE 51/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e)/Galerie Technique.)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) + (beige) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
090	BV3IZ7511 Réf. prél : P094 R+1/ PIECE 51/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
091	BV3IZ7513 Réf. prél : P095 R+1/ PIECE 51/Mur - Enduit lissé - (plâtre/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page20/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
092 (1)	BV3IZ7514 Réf. prél : P096 R+1/ PIECE 51/Mur - Enduit - (compact/clair(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
093	BV3IZ7515 Réf. prél : P097 R+1/ PIECE 51/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
094	BV3IZ7516 Réf. prél : P098 R+1/ PIECE 48/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
095	BV3IZ7517 Réf. prél : P099 R+1/ PIECE 48/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
096	BV3IZ7518 Réf. prél : P100 R+1/ PIECE 48/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page21/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
097 (1)	BV3IZ7519 Réf. prél : P101 R+1/ PIECE 48/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
098	BV3IZ7520 Réf. prél : P102 R+1/ PIECE 48/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
099	BV3IZ7521 Réf. prél : P103 R+1/ PIECE 28/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
100	BV3IZ7522 Réf. prél : P104 R+1/ PIECE 28/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
101	BV3IZ7523 Réf. prél : P105 R+1/ PIECE 28/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page22/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
102	BV3IZ7524 Réf. prél : P106 R+1/ PIECE 28/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
103	BV3IZ7525 Réf. prél : P107 R+1/ PIECE 46/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
104	BV3IZ7526 Réf. prél : P108 RDC/ PIECE 8/Gaine horizontale - Enduit - (compact/clair(e))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
105	BV3IZ7527 Réf. prél : P109 R+2/ PIECE 28/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page23/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
106	BV3IZ7528 Réf. prél : P110 R+2/ PIECE 28/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
107	BV3IZ7529 Réf. prél : P111 R+2/ PIECE 28/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau semi-dur de type enduit (beige)(iii)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
108	BV3IZ7530 Réf. prél : P112 R+2/ PIECE 45/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
109	BV3IZ7531 Réf. prél : P113 R+2/ PIECE 45/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page24/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (vert)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
110	BV3IZ7532 Réf. prél : P114 R+2/ PIECE 49/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
111	BV3IZ7533 Réf. prél : P115 R+2/ PIECE 49/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
112	BV3IZ7534 Réf. prél : P116 R+2/ PIECE 49/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
113	BV3IZ7535 Réf. prél : P117 R+2/ PIECE 49/Mur - Enduit lissé - (plâtre/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page25/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
114	BV3IZ7536 Réf. prél : P118 R+2/ PIECE 49/Mur - Enduit - (compact/clair(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / ZV8V	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
115	BV3IZ7537 Réf. prél : P119 R+2/ PIECE 49/Mur - Enduit - (ciment/clair(e)/Galerie technique.)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
116	BV3IZ7538 Réf. prél : P120 R+2/ PIECE 42/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
117	BV3IZ7539 Réf. prél : P121 R+2/ PIECE 42/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
118	BV3IZ7540 Réf. prél : P122 R+2/ PIECE 42/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page26/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (bleu) + (jaune)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
119	BV3IZ7541 Réf. prél : P123 R+2/ PIECE 42/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
120	BV3IZ7542 Réf. prél : P124 R+2/ PIECE 42/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
121	BV3IZ7543 Réf. prél : P125 R+2/ PIECE 11/Plafond - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page27/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
122	BV3IZ7544 Réf. prél : P126 R+2/ PIECE 11/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
123	BV3IZ7545 Réf. prél : P127 R+2/ PIECE 11/Mur - Enduit - (plâtre/clair(e))	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) (clair) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
124	BV3IZ7546 Réf. prél : P128 R+2/ PIECE 11/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (orange) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
125	BV3IZ7547 Réf. prél : P129 R+2/ PIECE 11/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
126	BV3IZ7548 Réf. prél : P130 R+2/ PIECE 1/Mur - Enduit lissé - (plâtre/clair(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
127	BV3IZ7549 Réf. prél : P131 R+2/ PIECE 1/Mur - Enduit - (compact/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page28/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
128	BV3IZ7550 Réf. prél : P132 R+2/ PIECE 1/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier/clair(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
129	BV3IZ7551 Réf. prél : P133 R+2/ PIECE 1/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
130	BV3IZ7552 Réf. prél : P134 R+2/ PIECE 1/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e)/Galerie Technique.)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
131	BV3IZ7553 Réf. prél : P135 EXTERIEUR/ TOIT TERRASSE/Mur - Enduit - (ciment/clair(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
132	BV3IZ7554 Réf. prél : P136 EXTERIEUR/ TOIT TERRASSE/Mur - Enduit - (ciment/clair(e))					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page29/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
133	BV3IZ7555 Réf. prél : P137 EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (compact/clair(e))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
134	BV3IZ7556 Réf. prél : P138 EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (compact/clair(e))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
135	BV3IZ7557 Réf. prél : P139 EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (lissé/clair(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / W2TK	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
136	BV3IZ7558 Réf. prél : P140 EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (lissé/clair(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027120-01 | Date d'émission de rapport : 12/05/2022 18:25 | Page30/30
Dossier N° : 22K012904 | Date de réception : 10/05/2022 | Date d'analyse : 11/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

(iii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Océane Melle
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 30 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Dorian CHAUCHET
30 Avenue Gustave Eiffel
33615 PESSAC CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027468-01 | Date d'émission de rapport : 13/05/2022 15:09 |
Dossier N° : 22K013011 | Date de réception : 11/05/2022 | Date d'analyse : 12/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3GU7280 Réf. prél : P016 R-1/ CIRCULATION 2/Mur - Enduit - (ciment/foncé(e))	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) ; matériau de type poussières	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3GU7284 Réf. prél : P021 R-1/ VIDE SANITAIRE 3/Conduit - Calorifugeage - (mousse/foncé(e))	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type poussières	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3GU7307 Réf. prél : P044 RDC/ PIECE 48/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/clair(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-027468-01 | Date d'émission de rapport : 13/05/2022 15:09 |
Dossier N° : 22K013011 | Date de réception : 11/05/2022 | Date d'analyse : 12/05/2022
Référence dossier Client:1510797383/350930436/2

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Océane Melle
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
