BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Réglementaire Nouvelle Aquitaine
30 avenue Gustave Eiffel

33600 PESSAC

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 32859592/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 17/08/2026

Référence au programme de travaux :
CNEFG ST ASTIER BAT68 - Demande MAJ Repérage amiante avant travaux Mail réalisé le 01/06/2026 par M. RAMOS

DONNEUR D'ORDRE

SGAMI SO
Julien RAMOS
89 COURS DUPRE DE ST MAUR
BP 30091
33041 BORDEAUX CEDEX

SITE D'INTERVENTION

CNEFG SAINT ASTIER

24110 ST ASTIER

Batiment 68

Date(s) d'intervention(s) :
Le 02/07/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Steven DAILLY	Diagnostiqueur	Certification N° 18735301	Steven DAILLY

Le présent rapport comporte 53 pages, dont 29 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION 3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS 6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 6
2.2. Remarque(s) complémentaire(s) 8
2.3. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux 9
2.4. Obligations réglementaires 10

3. INFORMATIONS GENERALES 11
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 11
3.2. Parties prenantes 11

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE 11
4.1. Références réglementaires 11

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 12
5.1. Date(s) de visite(s) 12
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 12
5.3. Conditions spécifiques 12
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 12

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 13
6.1. Matériaux et produits repérés 13
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 24

7. ANNEXES 25
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 25
7.2. Photos prélèvements antérieurs 29
7.3. Photos inaccessibilités 30
7.4. Attestation d'assurance 32
7.5. Certificat de compétence 34
7.6. Croquis de repérage 35
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire 42

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
•« Réaliser un repérage sur les gaines techniques et façades » Il y a un doute sur l'exhaustivité des conduits repérés en façade et dans les gaines techniques sur les plans, de plus le tableau estimatif ne correspond pas. Bien qu'il ne soit qu'estimatif il est mentionné « 1000m² » dans le tableau des quantités 1.2. Le diagnostic fait foi en cas de litige l'entreprise indiquera s'être basé sur le diagnostic. •« Effectuer des prélèvements complémentaires sur les enduits du sous-sol » Il y a un doute sur l'exhaustivité des enduits. Cependant dans la mesure ou les travaux ne prévoit pas de travaux sur les murs et ou porte du sous-sol nous pouvons laisser en l'état. Des percements pour les réseaux sont nécessaire et potentiellement la ventilation du sous-sol. •Effectuer des prélèvements complémentaires sur les menuiseries extérieures (y compris joint de compression entre dormant et maçonnerie) A minima la présence de joint de compression doit être vérifier et analysé sur les fenêtres. Nous intervenons sur les séchoirs et principalement les menuiseries des sas d'entrée de la partie hébergement, sur les menuiseries en bout de circulation et sur le remplacement de l'ensemble des fenêtres haute du R-1. •Effectuer des prélèvements complémentaires afin de clarifier les matériaux ou produits contenant de l'amiante : Ruban Adhesif. Il est mentionné du ruban adhésif alors que la photo et le Pv d'analyse laisse à penser qu'il s'agit de l'enveloppe de calorifugeage ; descriptifs laboratoire : Matériau souple (noir) (bitumineux)(ii) •Effectuer des repérages et sondages complémentaires sur les parties du bâtiment impactées par les travaux : •oToiture En attente du rapport. oLocaux techniques - complétude de la localisation des gaines de ventilation amianté à confirmer selon e-mail du 01/06/2026 de M. RAMOS

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits de fumée, Conduits eaux pluviales, Conduits eaux usées
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels (façade)
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bacs fibrociment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis fenêtres fibrociment, Coffrages perdus, Colle, Colles carrelage, Colles faïence, Colles pâte de verre, Couvre-joints, Enduits pelliculaires façades, Enduits projetés/crépis façades, Garnissage joints dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints carrelage, Joints dilatation, Joints faïence, Joints pâte de verre, Maçonnerie silico-calcaire, Peintures façades, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés sous bardage, Flocages sous bardage
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Plinthes	Peintures plinthes
Portes	Peintures
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs portes, Joints bandes portes, Joints portes, Joints tresses portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements clapets CF, Clapets CF, Joints clapets CF, Lames clapets CF, Rebouchages clapets CF, Tunnels clapets CF
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité trappes, Vidoirs en fibrociment
Volets coupe-feu	Calfeutrements volets CF, Ossature volets CF, Rebouchages volets CF, Volets CF

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

CNEFG : BATIMENT 068 : Sous sol, RDC, R+1, R+2, R+3, Extérieur

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
De plus, des investigations complémentaires doivent être réalisées en cours de travaux.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
19	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Compact	Clair
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S102	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S103				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S104				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S105				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S106				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S107				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S110				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S111				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S112				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S113				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S114				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S116				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S117				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S118	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S119				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S120				
12	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Dégagement				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Gaine technique 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Gaine technique 2				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Gaine technique 3				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0002				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0008				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0011				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Local technique 1				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 1				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 2				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 3				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 4				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 4				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 5				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 1				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 2				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 3				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Nord/Ouest Partie 1				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Nord/Ouest Partie 2				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Nord/Ouest Partie 3				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Sud/Est Partie 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Sud/Est Partie 2				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Sud/Est Partie 3				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façades				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+3 -> COMBLES				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 1				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 2				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 3				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 4				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 1				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 2				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 3				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 4				
18	Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> 0123				

2.2. Remarque(s) complémentaire(s)

Le ruban adhésif dans les vides sanitaires 1,2 et 3 a fait l'objet de 5 échantillons. Seul l'échantillon n°P23 du rapport référencé 350930436 du 30/05/2022 situé dans le vide sanitaire n°3 montre la présence d'amiante avec une teneur en limite de détection.
Bien que la présence d'amiante soit avérée, en considération de la norme NF ISO 22262-1, de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, nous concluons à l'absence d'amiante intrinsèque dans le ruban adhésif , les traces d'amiantes relevées sur l'échantillon P23 du rapport référencé 350930436 (ruban ahésif) du 30/05/2022 étant considérées comme issues d'un résidu ou d'une pollution.
Conformément à la note de la Direction Générale du Travail du 5 décembre 2017, une pollution ou un résidu ne confère pas à ce ruban ahésif la propriété de matériau ou produit contenant de l'amiante (MPCA) et est donc hors champ réglementaire du repérage. A ce titre, en cas de travaux, y compris de retrait, sur la zone de prélèvement de l'échantillons P23 du rapport référencé 350930436 (ruban ahésif) du 30/05/2022, les mesures de prévention et de protection relative à la réglementation SS4 du code du travail doivent être mises en oeuvre.

Notre mission complémentaire du 02 Juillet 2026 consiste à localiser et quantifier les matériaux amiantés mentionnées dans l'e-mail du 02/06/2026 de M. RAMOS, donneur d'ordre de la SGAMI SO.
Notre mission consiste également à établir rapport de synthèse des matériaux et produits contenant de l'amiante en reprenant les conclusions des rapports en annexe
Rapport amiante avant travaux - CNEFG Bâtiment 68 - n°350930436.3.R du 30/05/2022 - par Dorian CHAUCHET - (Bureau Veritas)
Le rapport mentionné est indissociable du présent rapport.

2.3. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC (IC 2)	Gaines de ventilation	Destruction lourde	Prévoir une visite complémentaire pendant la phase des travaux
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 (IC 3)	Gaines de ventilation	Destruction lourde	Prévoir une visite complémentaire pendant la phase des travaux
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Nord/Ouest Partie 1 (IC 5)	Menuiseries extérieures	Destruction lourde	Prévoir une visite complémentaire pendant la phase des travaux
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 (IC 4)	Gaines de ventilation	Destruction lourde	Prévoir une visite complémentaire pendant la phase des travaux

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CNEFG SAINT ASTIER

24110 ST ASTIER

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CNEFG SAINT ASTIER	Autres	/	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Julien RAMOS	Donneur d'ordre	SGAMI SO	89 COURS DUPRE DE ST MAUR BP 30091 33041 BORDEAUX CEDEX	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 02/07/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / CNEFG ST ASTIER BAT68 - Demande MAJ Repérage amiante avant travaux	M. RAMOS	01/06/2026	Mail	/
Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	BUREAUVERITAS	28/04/2022	350930436.3.R	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S102	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S102	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P18	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	P17* N	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non

Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S103	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12 (i)	P19* N	/	AN	Joint ciment autour des portes	*Oui*
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	P18* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S104	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S104	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P18	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S105	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S105	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P18	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S106	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S106	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P 18	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de	***Oui***

sol -> Local S107									travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S107	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P 18	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S110	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12 (i)	P20 N	/	AN	Joint ciment autour des portes	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S110	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P 18	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S111	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S111	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P 18	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S112	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	P15 N	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S112	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	P16 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S113	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S113	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P 18	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S114	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S114	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P 18	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S116	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	P1_ant P	/	AN	Joint ciment autour des portes Prélèvement antérieur : P1 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*

	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S116	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P 18	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S117	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	P13 N	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	P14 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S118	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S118	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P 18	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S119	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S119	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P 18	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S120	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S120	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux	Blanc	11	Idem P 18	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	13	P21* N	/	AN	Enduit autour portes vide sanitaire	Non

Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Dégagement	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	13	P22 N	/	AN	Enduit autour portes vide sanitaire	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	13	P23 N	/	AN	Enduit autour portes vide sanitaire	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	10	Idem P 17	/	AN	Joint ciment autour fenêtres	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Vide sanitaire 1	Conduits	Rubans adhésifs	Bitumineux	Noir	14	P24* N	/	AN	Scotch autour conduit	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	15	P25* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Vide sanitaire 2	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	15	P26 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Rubans adhésifs	Epais	Noir	16	P27* N	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Vide sanitaire 3	Conduits	Rubans adhésifs	Epais	Noir	16	P28 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	15	P29 N	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0023	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin, Plâtre	Blanc	17	P30* N	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Gaine technique 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Gaine technique 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Gaine technique 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0002	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0008	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	P062_antP	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022 Prélèvement antérieur : P062	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0011	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Local technique 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	S1	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0029	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin, Plâtre	Blanc	17	Idem P 30	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> 0224	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin, Plâtre	Blanc	17	P31N	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 5	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> 0232	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin, Plâtre	Blanc	17	Idem P 30	/	AN	/	Non
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Nord/Ouest Partie 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Nord/Ouest Partie 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Nord/Ouest Partie 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Sud/Est Partie 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Sud/Est Partie 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Sud/Est Partie 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Compact	Clair	19	P137_antP	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022 Prélèvement antérieur : P137	*Oui*
	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+3 -> COMBLES	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 1	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 3	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 4	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	*Oui*
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> 0132	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin, Plâtre	Blanc	17	Idem P 30	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> 0123	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 28/04/2022	***Oui***
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> 0124	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Fin, Plâtre	Blanc	17	Idem P 30	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	10 m²
19	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	2000 m²
18	Conduits	Conduits	330 ml

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Caserne Saint Astier	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> S101	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S102	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S103	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S104	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S105	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S106	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S107	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> S109	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S110	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S111	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S112	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S113	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S114	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> S115	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S116	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S117	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S118	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S119	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S120	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Dégagement	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Vide sanitaire 1	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Vide sanitaire 2	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Vide sanitaire 3	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0023	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Gaine technique 1	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Gaine technique 2	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Gaine technique 3	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0002	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0008	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0011	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0015	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0042	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0037	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> Local technique 1	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0029	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0028	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0022	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> 0224	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 1	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 2	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 3	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 4	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 4	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Gaine technique 5	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> 0214	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 1	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 2	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> Local technique 3	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> 0223	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> 0231	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> 0247	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2 -> 0232	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Nord/Ouest Partie 1	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Nord/Ouest Partie 2	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Nord/Ouest Partie 3	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Sud/Est Partie 1	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Sud/Est Partie 2	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Sud/Est Partie 3	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façades	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+3	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+3 -> COMBLES	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 1	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 2	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 3	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Gaine technique 4	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> 0114	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 1	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 2	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 3	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> Local technique 4	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> 0147	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> 0132	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> 0131	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> 0123	/
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1 -> 0124	/

7.2. Photos prélèvements antérieurs

P1_ant	ZPSO 12
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Sous-sol -> Local S116	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P062_ant	ZPSO 18
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC -> 0008	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P137_ant	ZPSO 19
Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

7.3. Photos inaccessibilités

Investigation(s) complémentaire(s) à réaliser juste avant les travaux ou entre les différentes étapes de travaux

Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> RDC	IC 2
Gaines de ventilation	
Destruction lourde	
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :
	Prévoir une visite complémentaire pendant la phase des travaux

Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+2	IC 3
Gaines de ventilation	
Destruction lourde	
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :
	Prévoir une visite complémentaire pendant la phase des travaux

Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> R+1	IC 4
Gaines de ventilation	
Destruction lourde	
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :
	Prévoir une visite complémentaire pendant la phase des travaux

Caserne Saint Astier -> Bâtiment 068 -> Extérieur -> Façade Nord/Ouest Partie 1	IC 5
Menuiseries extérieures	
Destruction lourde	
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :
	Prévoir une visite complémentaire pendant la phase des travaux

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat attribué à

Steven DAILLY

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Termites metropole	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	27/11/2020	26/11/2027
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	04/01/2021	03/01/2028
Gaz	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	27/11/2020	26/11/2027
Électricité	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	04/01/2021	03/01/2028
DPE avec mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	04/01/2021	03/01/2028
DPE sans mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	04/01/2021	03/01/2028
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	27/11/2020	26/11/2027
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	27/11/2020	26/11/2027

Date : 02/10/2024
Numéro du certificat : **18735301**

Samuel DUPRIEU - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

7.6. Croquis de repérage

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante Px → Prélèvement antérieur n°X contenant de l'amiante S → Sondage	**Matériaux et produits contenant de l'amiante :** **Enduit ciment en autourage des portes (rebouchage)** **Conduits en fibres-ciment**	
Sous sol	Date de visite	02/07/2026			
	Auteur	S.DAILLY			
	N° Dossier	32859592			
	Planche	1			
Plan/Elevation	Indice	1			

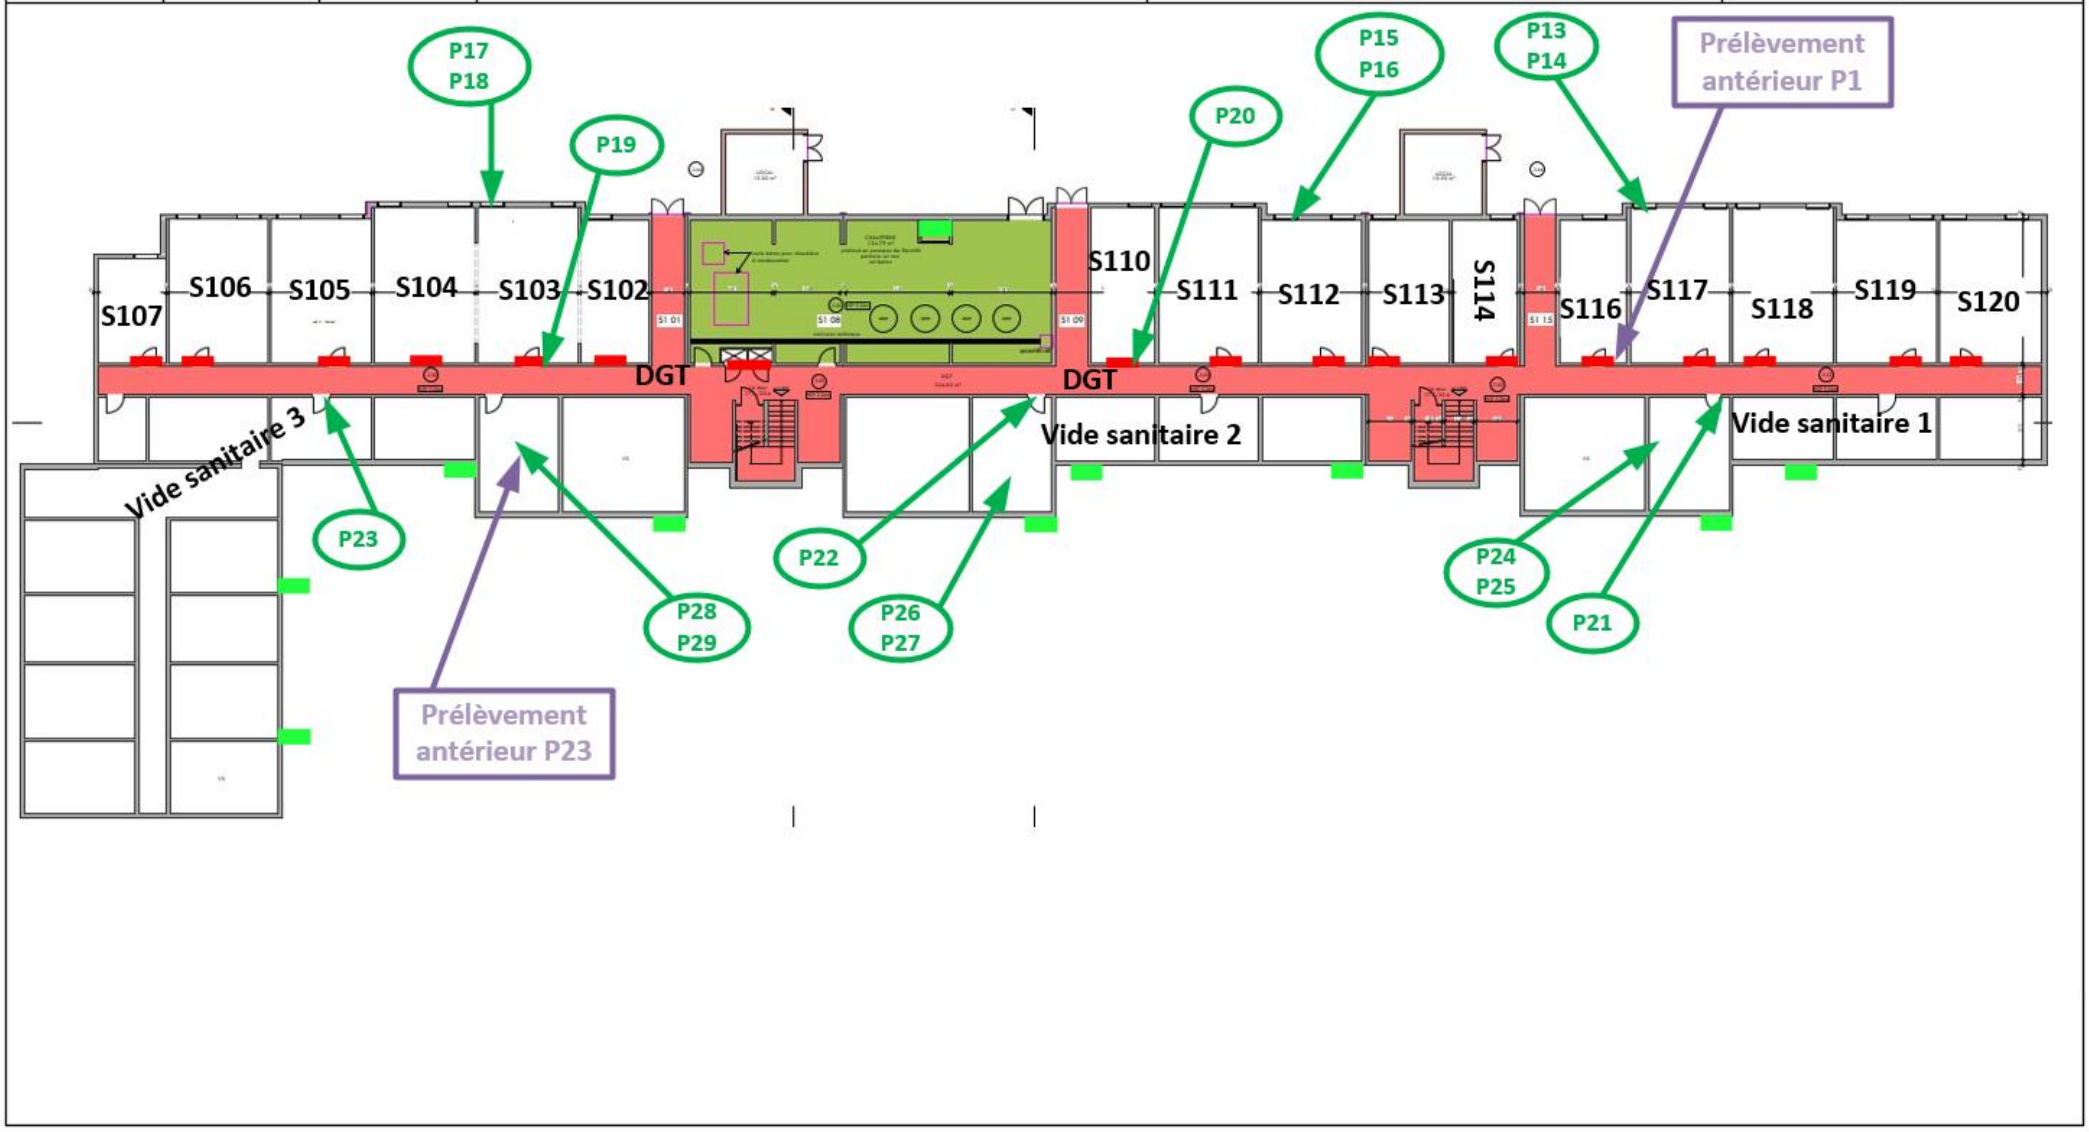


Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	**CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER**		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante Px → Prélèvement antérieur n°X contenant de l'amiante IC → Investigation complémentaire S → Sondage	**Matériaux et produits contenant de l'amiante :** **Conduits en fibres-ciment**	
RDC	Date de visite	02/07/2026			
	Auteur	S.DAILLY			
	N° Dossier	32859592			
	Planche	1			
Plan/Elevation	Indice	1			

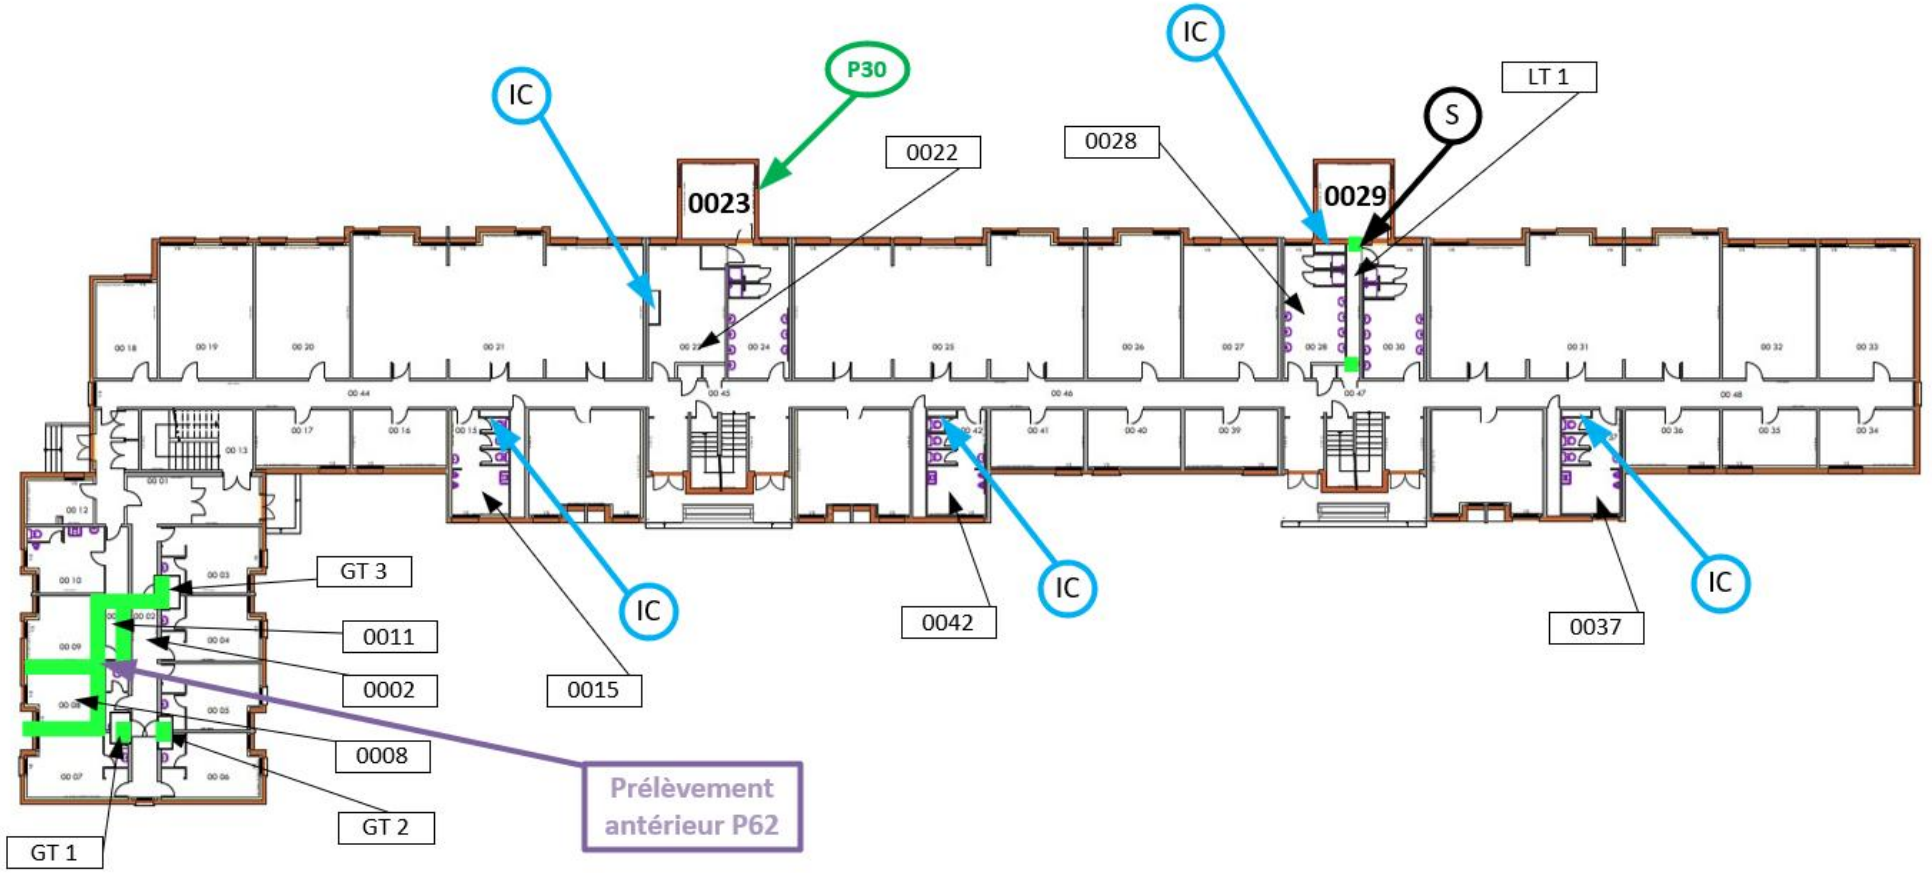


Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER		IC → Investigation complémentaire	**Matériaux et produits contenant de l'amiante :** **Conduits en fibres-ciment**	
R+1	Date de visite	02/07/2026			
	Auteur	S.DAILLY			
	N° Dossier	32859592			
	Planche	1			
Plan/Elevation	Indice	1			

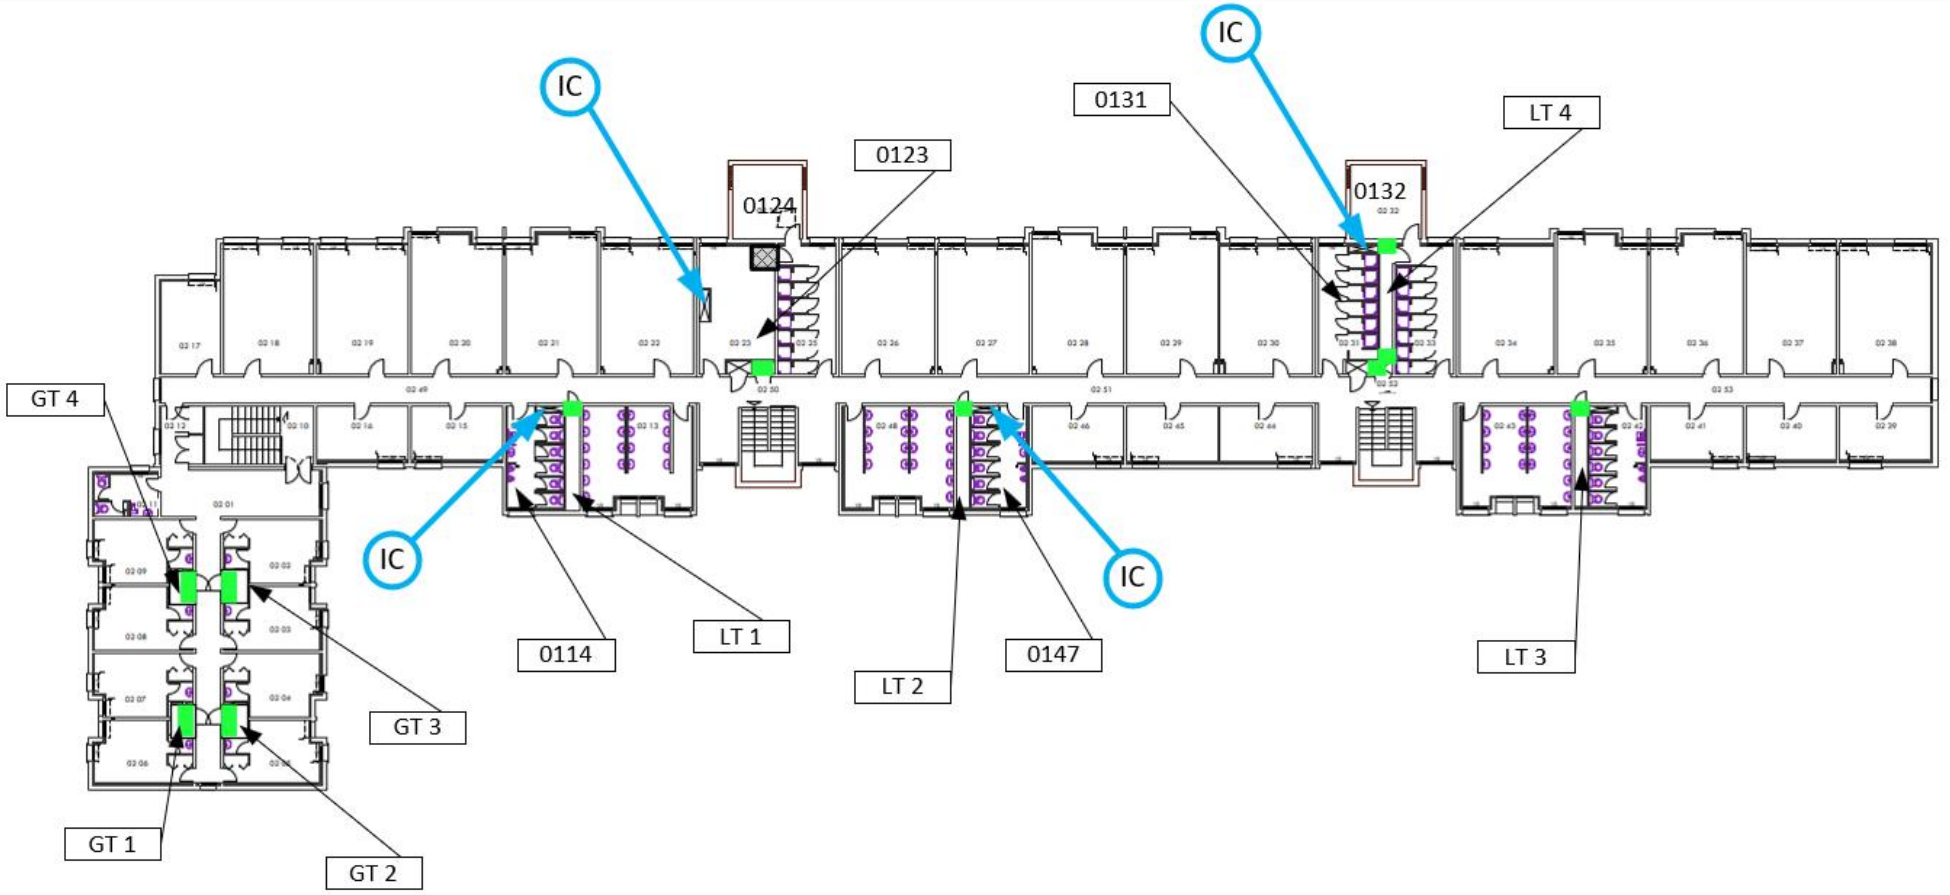


Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante IC → Investigation complémentaire	**Matériaux et produits contenant de l'amiante :** **Conduits en fibres-ciment**	
R+2	Date de visite	02/07/2026			
	Auteur	S.DAILLY			
	N° Dossier	32859592			
	Planche	1			
Plan/Elevation	Indice	1			



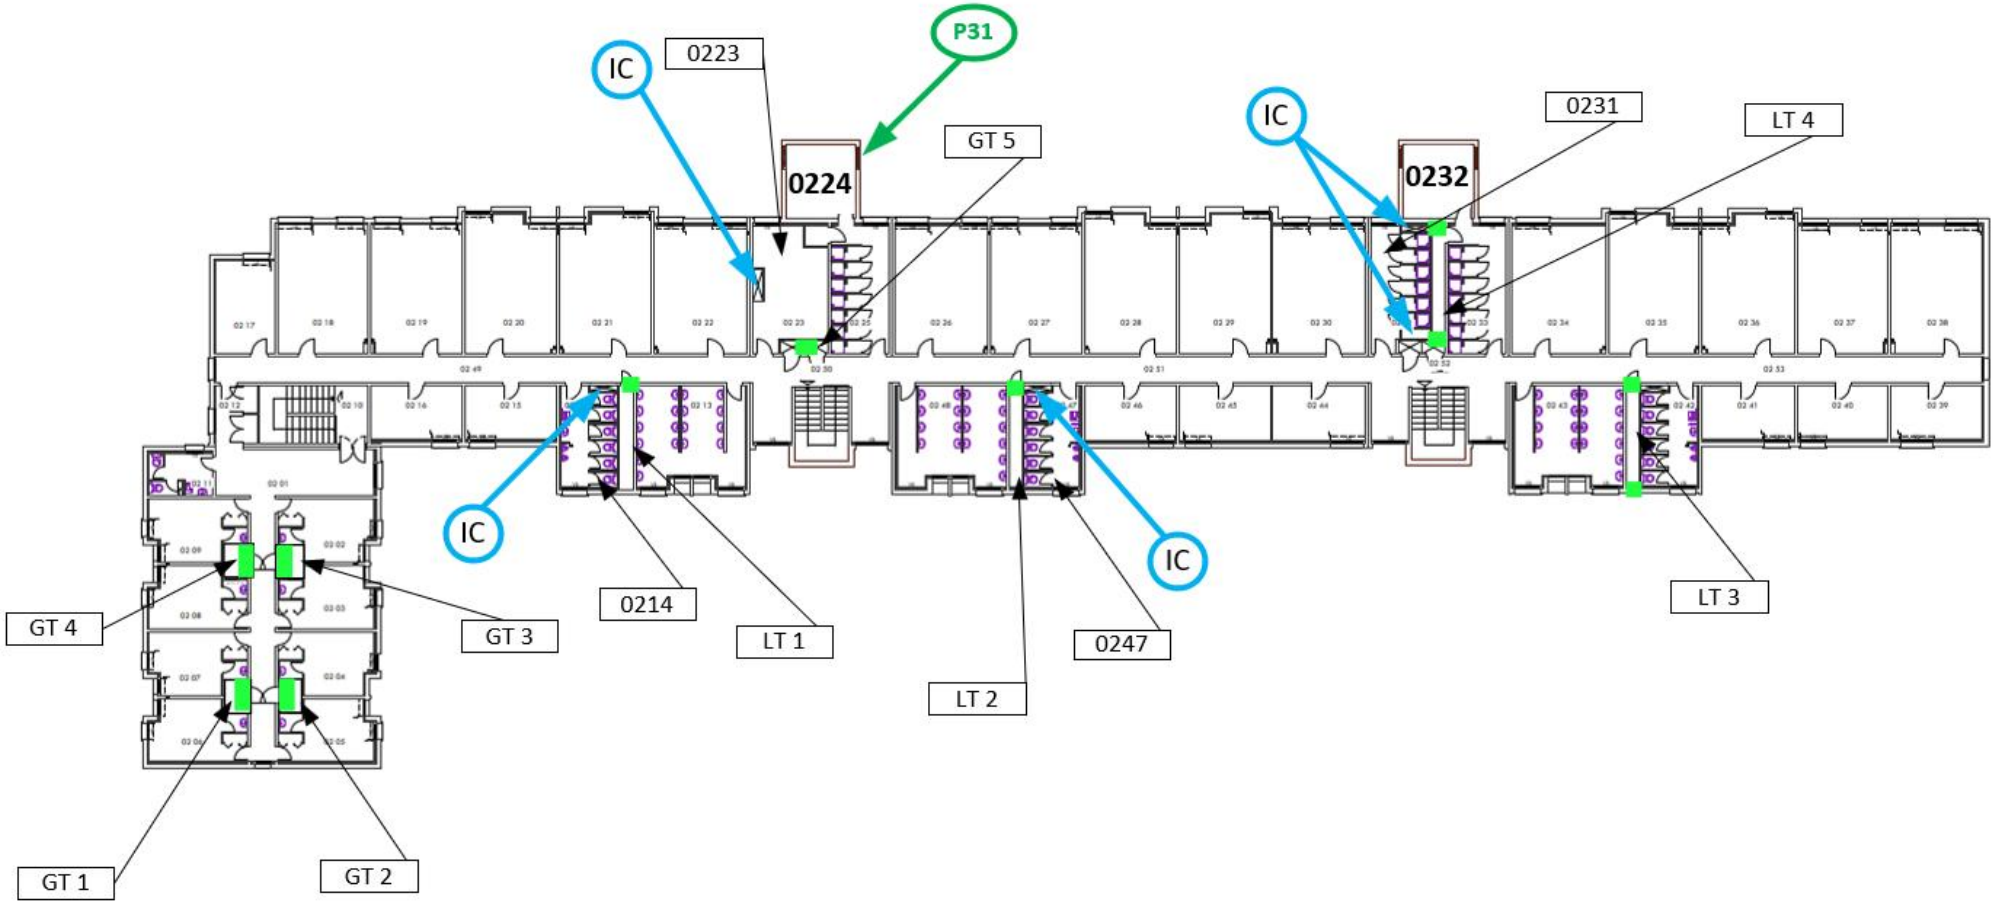


Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	**CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER**		**Matériaux et produits contenant de l'amiante :** **Conduits en fibres-ciment**	
R+3	Date de visite	02/07/2026		
	Auteur	S.DAILLY		
	N° Dossier	32859592		
	Planche	1		
Plan/Elevation	Indice	1		

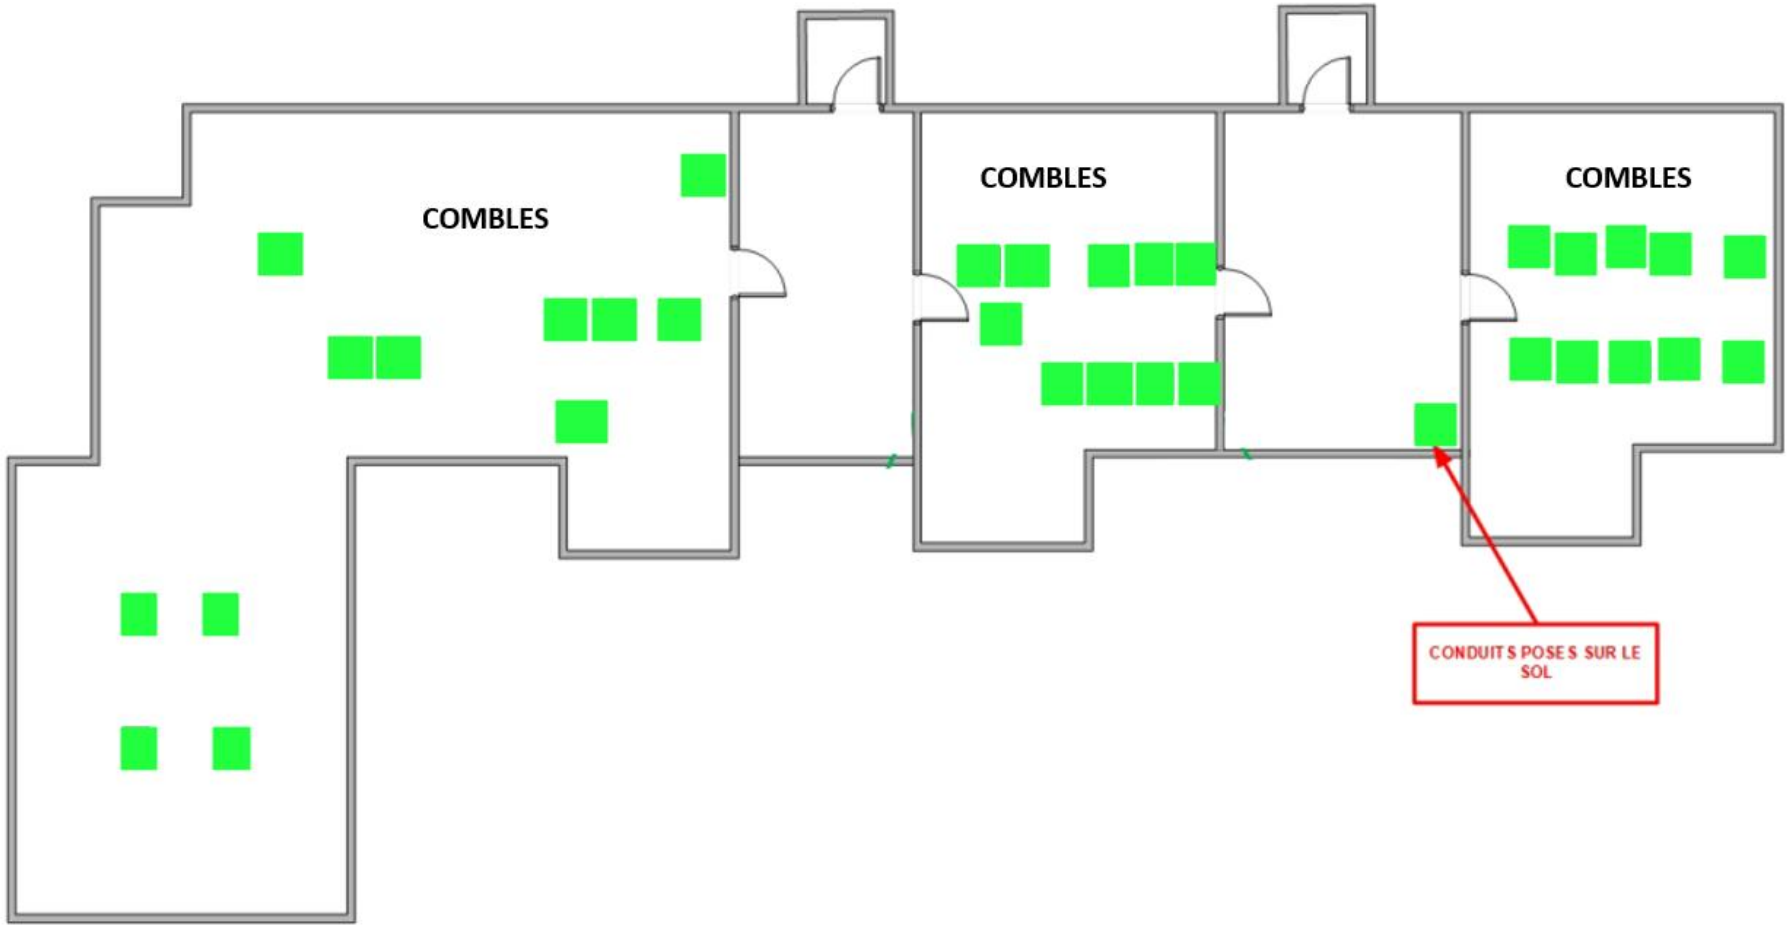


Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	**CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER**		Px → Prélèvement antérieur n°X contenant de l'amiante	**Matériaux et produits contenant de l'amiante :** **Enduit façade**	
Extérieur	Date de visite	02/07/2026			
	Auteur	S.DAILLY			
	N° Dossier	32859592			
	Planche	1			
Plan/Elevation	Indice	1			

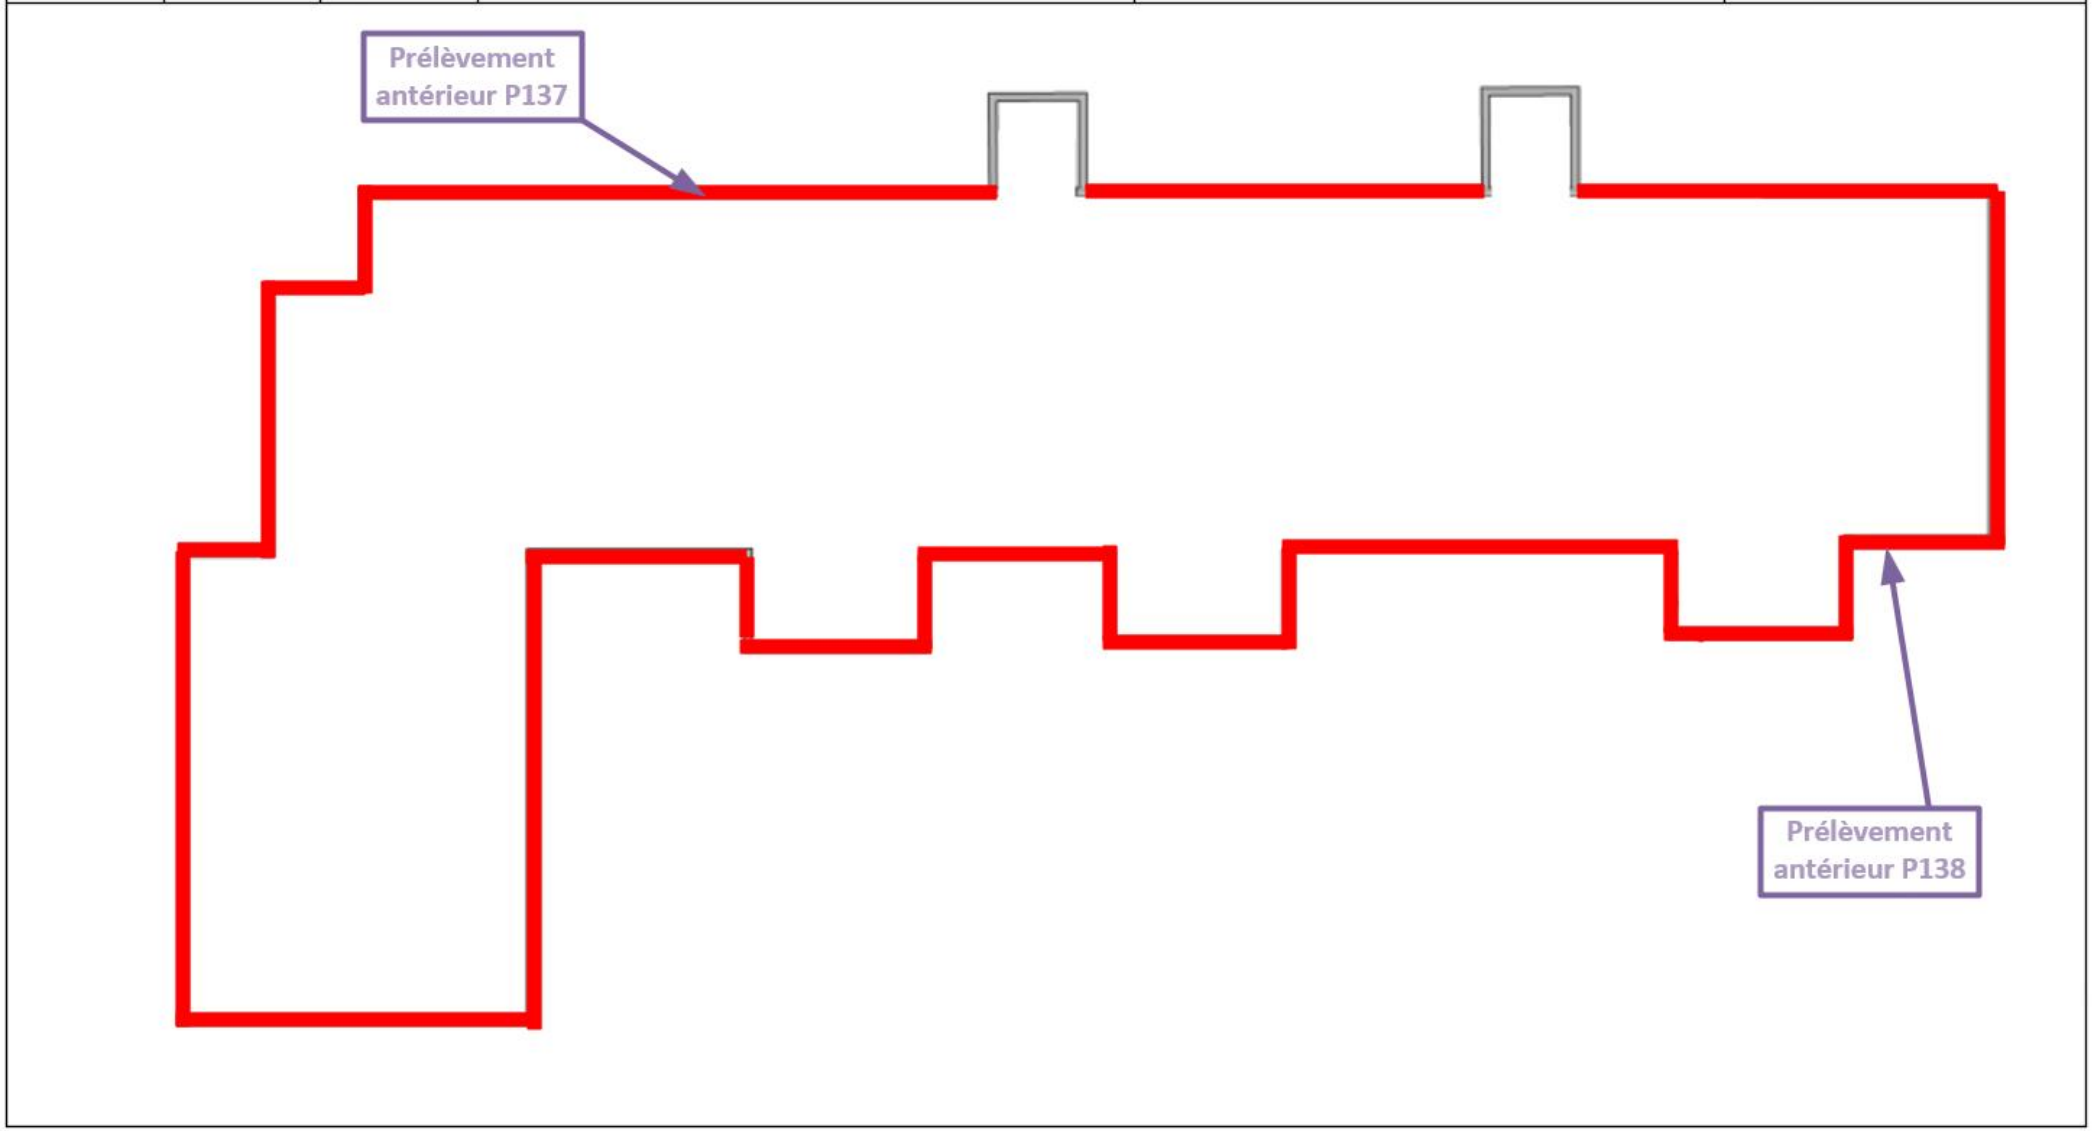

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	**CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER**		IC → Investigation complémentaire	**Matériaux et produits contenant de l'amiante :** **Conduits ventilation en fibres-ciment**	
Façade	Date de visite	02/07/2026			
	Auteur	S.DAILLY			
	N° Dossier	32859592			
	Planche	1			
Plan/Elevation	Indice	1			

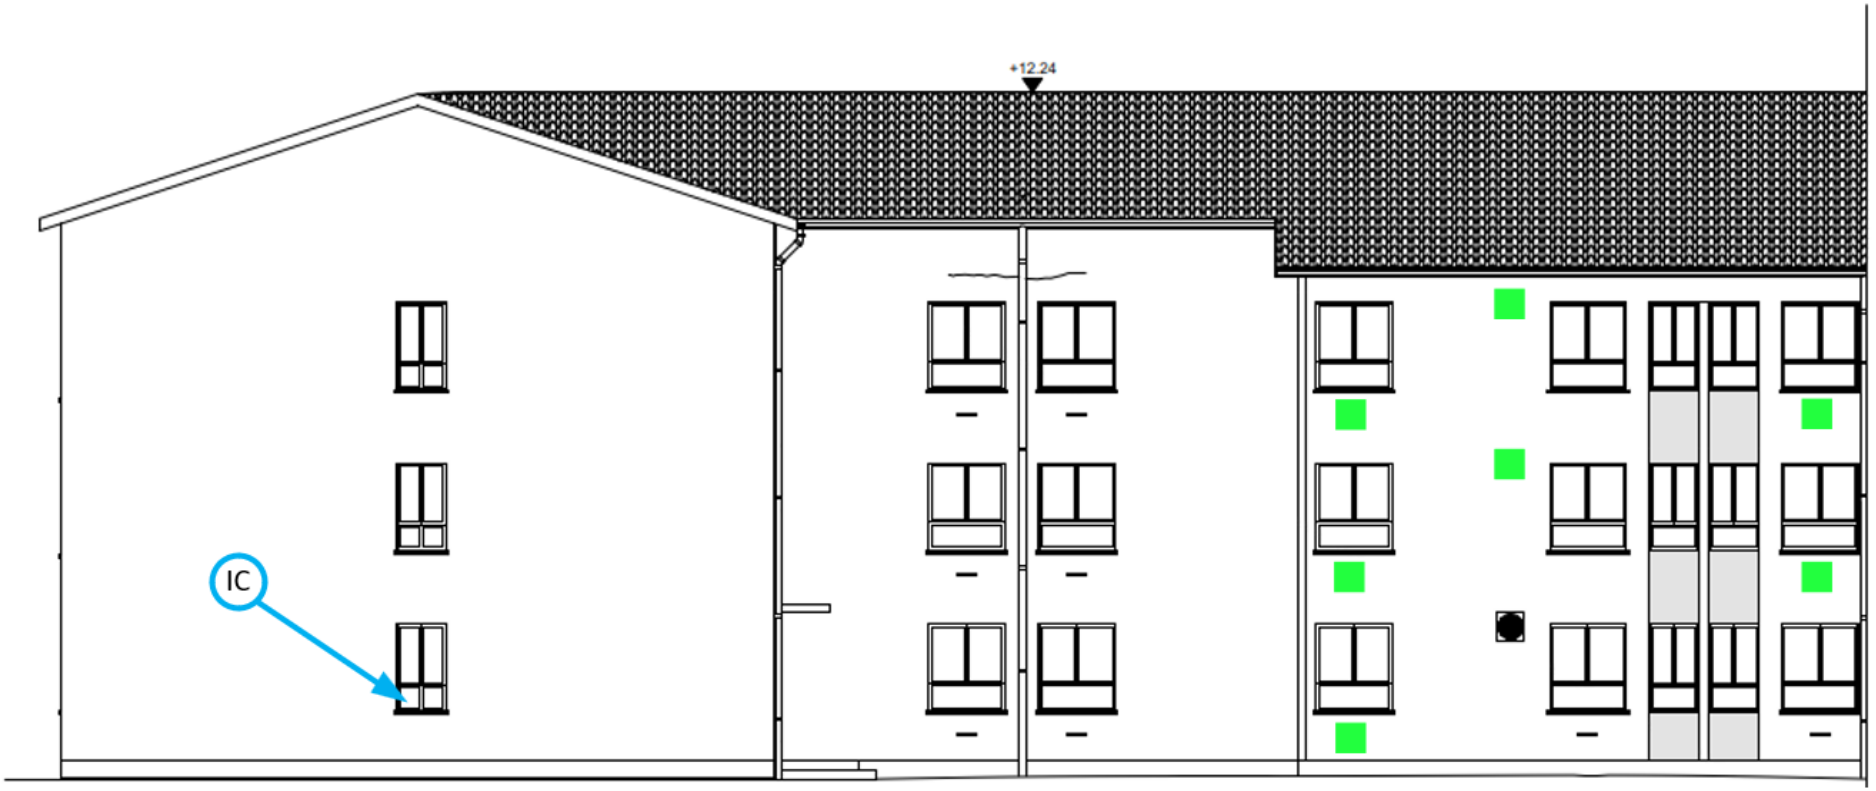

Façade Nord/Ouest Partie 1

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	**CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER**			**Matériaux et produits contenant de l'amiante :** **Conduits ventilation en fibres-ciment**	
Façade	Date de visite	02/07/2026			
	Auteur	S.DAILLY			
	N° Dossier	32859592			
	Planche	1			
Plan/Elevation	Indice	1			



Façade Nord/Ouest Partie 2

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	**CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER**			
Façade	Date de visite	02/07/2026		
	Auteur	S.DAILLY		
	N° Dossier	32859592		
	Planche	1		
Plan/Elevation	Indice	1		

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Conduits ventilation en fibres-ciment



Façade Nord/Ouest Partie 3

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	**CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER**			
Façade	Date de visite	02/07/2026		
	Auteur	S.DAILLY		
	N° Dossier	32859592		
	Planche	1		
Plan/Elevation	Indice	1		

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Conduits ventilation en fibres-ciment




Façade SUD/Est Partie 1

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	**CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER**			**Matériaux et produits contenant de l'amiante :** **Conduits ventilation en fibres-ciment**	
Façade	Date de visite	02/07/2026			
	Auteur	S.DAILLY			
	N° Dossier	32859592			
	Planche	1			
Plan/Elevation	Indice	1			



Façade SUD/Est Partie 2

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	CNEFG – BATIMENT 068 24110 SAINT ASTIER			**Matériaux et produits contenant de l'amiante :** **Conduits ventilation en fibres-ciment**	
Façade	Date de visite	02/07/2026			
	Auteur	S.DAILLY			
	N° Dossier	32859592			
	Planche	1			
Plan/Elevation	Indice	1			

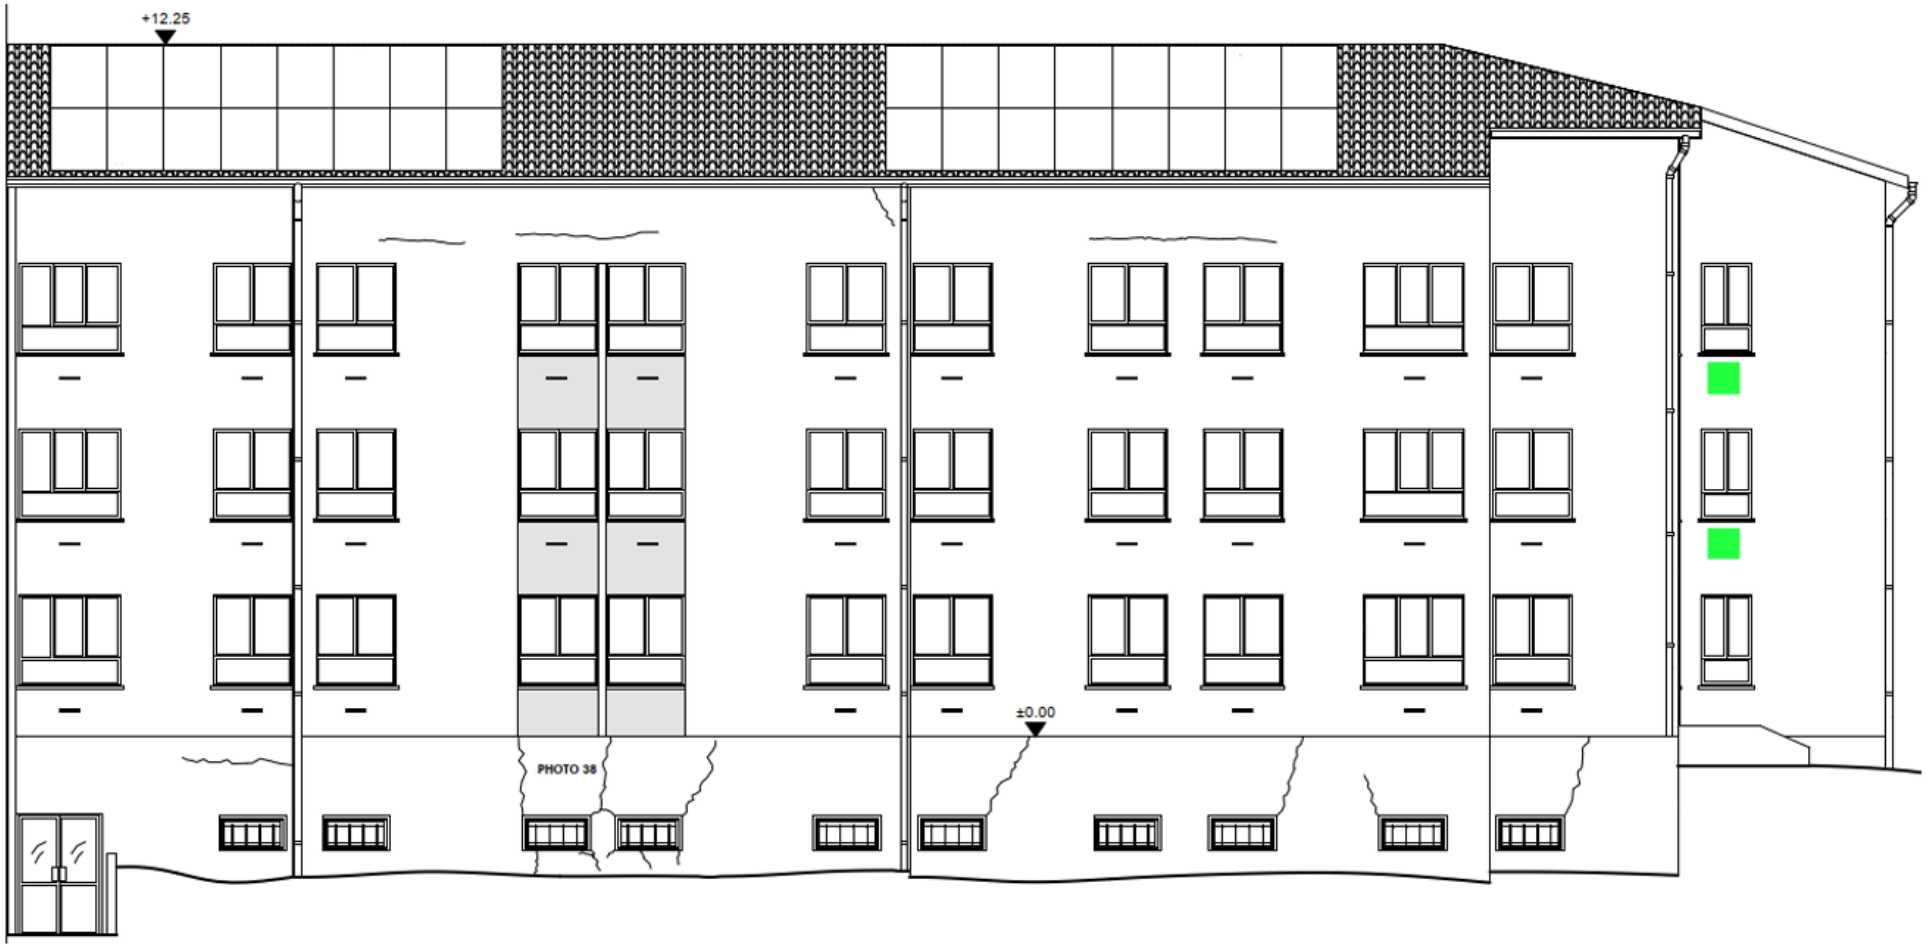

Façade SUD/Est Partie 3

Copyright BUREAU VERITAS

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Steven DAILLY
30 Avenue Gustave Eiffel
33615 PESSAC CEDEX

Notre référence : AR-26-KC-043918-01

Numéro de dossier : 26K025130
Référence de dossier : 1510797383/32859592/S1/1/3_32859592/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26K025130-001 - Référence *EUROFINS250000276217 Réf. Prel : P13 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S117/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-002 - Référence *EUROFINS250000276216 Réf. Prel : P14 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S117/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-003 - Référence *EUROFINS250000276215 Réf. Prel : P15 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S112/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-004 - Référence *EUROFINS250000276220 Réf. Prel : P16 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S112/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-005 - Référence *EUROFINS250000276213 Réf. Prel : P17 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S103/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-006 - Référence *EUROFINS250000276218 Réf. Prel : P18 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S103/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-007 - Référence *EUROFINS250000276219 Réf. Prel : P19 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S103/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-008 - Référence *EUROFINS250000276214 Réf. Prel : P20 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-009 - Référence *EUROFINS250000276222 Réf. Prel : P21 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Dégagement/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-010 - Référence *EUROFINS250000276221 Réf. Prel : P22 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Dégagement/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-011 - Référence *EUROFINS250000276223 Réf. Prel : P23 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Dégagement/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-012 - Référence *EUROFINS250000276224 Réf. Prel : P24 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 1/Conduits : Rubans adhésifs - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-013 - Référence *EUROFINS250000276253 Réf. Prel : P25 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 1/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-014 - Référence *EUROFINS250000276249 Réf. Prel : P26 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 2/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-015 - Référence *EUROFINS250000276261 Réf. Prel : P27 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 2/Conduits : Rubans adhésifs - (Epais/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-016 - Référence *EUROFINS250000276260 Réf. Prel : P28 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 3/Conduits : Rubans adhésifs - (Epais/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-017 - Référence *EUROFINS250000276262 Réf. Prel : P29 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 3/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-018 - Référence *EUROFINS250000276228 Réf. Prel : P30 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - RDC - 0023/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Fin, Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26K025130-019 - Référence *EUROFINS250000276225 Réf. Prel : P31 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - R+2 - 0224/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Fin, Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD OUEST
Analyses Bordeaux
4 Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-048417-01
Référence laboratoire N° : 26RI047645
Reçu au laboratoire le : 14/07/2026
Date d'analyse : 15/07/2026
Référence dossier Client:26K025130 - 1510797383/32859592/S1/1/3_32859592/1/1

Date d'émission de rapport : 16/07/2026 15:38
Référence de suivi du dossier N° : 26K025130
Date de réception :14/07/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26K025130-001 - EUROFINS250000276 17 Réf. Prel : P13 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S117/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26K025130-002 - EUROFINS250000276 16 Réf. Prel : P14 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S117/Menuiseries extérieures : Joints d''étanchéité - (Fibreux/Blanc)	Matériau (beige) ; matériau de type mousse (blanc)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-048417-01
Référence laboratoire N° : 26RI047645
Reçu au laboratoire le : 14/07/2026
Date d'analyse : 15/07/2026
Référence dossier Client:26K025130 - 1510797383/32859592/S1/1/3_32859592/1/1

Date d'émission de rapport : 16/07/2026 15:38
Référence de suivi du dossier N° : 26K025130
Date de réception :14/07/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	26K025130-003 - EUROFINS250000276 15 Réf. Prel : P15 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S112/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26K025130-004 - EUROFINS250000276 20 Réf. Prel : P16 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S112/Menuiseries extérieures : Joints d"étanchéité - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26K025130-005 - EUROFINS250000276 13 Réf. Prel : P17 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S103/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-048417-01
Référence laboratoire N° : 26RI047645
Reçu au laboratoire le : 14/07/2026
Date d'analyse : 15/07/2026
Référence dossier Client:26K025130 - 1510797383/32859592/S1/1/3_32859592/1/1

Date d'émission de rapport : 16/07/2026 15:38
Référence de suivi du dossier N° : 26K025130
Date de réception :14/07/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	26K025130-006 - EUROFINS250000276 18 Réf. Prel : P18 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S103/Menuiseries extérieures : Joints d''étanchéité - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type mousse (blanc)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	26K025130-007 - EUROFINS250000276 19 Réf. Prel : P19 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S103/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26K025130-008 - EUROFINS250000276 14 Réf. Prel : P20 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Local S110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) (foncé)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-048417-01
Référence laboratoire N° : 26RI047645
Reçu au laboratoire le : 14/07/2026
Date d'analyse : 15/07/2026
Référence dossier Client:26K025130 - 1510797383/32859592/S1/1/3_32859592/1/1

Date d'émission de rapport : 16/07/2026 15:38
Référence de suivi du dossier N° : 26K025130
Date de réception :14/07/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	26K025130-009 - EUROFINS25000027622 Réf. Prel : P21 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Dégagement/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26K025130-010 - EUROFINS25000027621 Réf. Prel : P22 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Dégagement/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	26K025130-011 - EUROFINS25000027623 Réf. Prel : P23 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Dégagement/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-048417-01
Référence laboratoire N° : 26RI047645
Reçu au laboratoire le : 14/07/2026
Date d'analyse : 15/07/2026
Référence dossier Client:26K025130 - 1510797383/32859592/S1/1/3_32859592/1/1

Date d'émission de rapport : 16/07/2026 15:38
Référence de suivi du dossier N° : 26K025130
Date de réception :14/07/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	26K025130-012 - EUROFINS25000027624 Réf. Prel : P24 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 1/Conduits : Rubans adhésifs - (Bitumineux/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26K025130-013 - EUROFINS25000027653 Réf. Prel : P25 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 1/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26K025130-014 - EUROFINS25000027649 Réf. Prel : P26 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 2/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-048417-01
Référence laboratoire N° : 26RI047645
Reçu au laboratoire le : 14/07/2026
Date d'analyse : 15/07/2026
Référence dossier Client:26K025130 - 1510797383/32859592/S1/1/3_32859592/1/1

Date d'émission de rapport : 16/07/2026 15:38
Référence de suivi du dossier N° : 26K025130
Date de réception :14/07/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	26K025130-015 - EUROFINS25000027661 Réf. Prel : P27 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 2/Conduits : Rubans adhésifs - (Epais/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	26K025130-016 - EUROFINS25000027660 Réf. Prel : P28 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 3/Conduits : Rubans adhésifs - (Epais/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017 (1)	26K025130-017 - EUROFINS25000027662 Réf. Prel : P29 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - Sous-sol - Vide sanitaire 3/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreux) (vert)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-048417-01
Référence laboratoire N° : 26RI047645
Reçu au laboratoire le : 14/07/2026
Date d'analyse : 15/07/2026
Référence dossier Client:26K025130 - 1510797383/32859592/S1/1/3_32859592/1/1

Date d'émission de rapport : 16/07/2026 15:38
Référence de suivi du dossier N° : 26K025130
Date de réception :14/07/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	26K025130-018 - EUROFINS25000027628 Réf. Prel : P30 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - RDC - 0023/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Fin, Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	26K025130-019 - EUROFINS25000027625 Réf. Prel : P31 Caserne Saint Astier - Bâtiment 068 - R+2 - 0224/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Fin, Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)
(1) Echantillon mouillé.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-048417-01
Référence laboratoire N° : 26RI047645
Reçu au laboratoire le : 14/07/2026
Date d'analyse : 15/07/2026
Référence dossier Client:26K025130 - 1510797383/32859592/S1/1/3_32859592/1/1

Date d'émission de rapport : 16/07/2026 15:38
Référence de suivi du dossier N° : 26K025130
Date de réception :14/07/2026

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Malgorzata Tomala
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
