Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035



Numéro de rapport	**30852397 SAINT ASTIER BAT 068 P**
Propriétaire	**Centre national d'entrainement des forces de gendarmerie**
Donneur d'ordre	**SGAMI SUD OUEST**
Adresse de l'immeuble	**Route du val de l'Isle 24110 SAINT-ASTIER**
Bâtiment ou installation	**Immeuble**
Date de la commande	**29/01/2026**
Date(s) de la visite	**02/03/2026**
Date d'édition du rapport de repérage	**05/03/2026**
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	**95**

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise

Opérateur de repérage :

Monsieur PIRES FERNANDES Michael
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 30, avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC
Le **05/03/2026**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 36 315 050 € - RCS Nanterre B 790 184 675
Siège social: Le Triangle de l'Arche – 4 Place des Saisons – 92400 COURBEVOIE - © Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1

DESCRIPTION DE LA MISSION 3

OBJET DE LA MISSION : 3

IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 3

IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 3

IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : 3

LISTE DES DOCUMENTS REMIS : 3

PROGRAMME DE TRAVAUX 4

ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE 4

PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 5

L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X 8

VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS) 9

IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE 9

METHODOLOGIE EMPLOYEE 9

INTERPRETATION DES RESULTATS 12

RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 12

RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES 12

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 88

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE 94

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptible d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.
Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission :

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**Centre national d'entrainement des forces de gendarmerie**
Demeurant :	**Route du val de l'Isle 24110 SAINT-ASTIER**
Représenté par :	**/**
Donneur d'ordre du repérage :	**SGAMI SUD OUEST**
Demeurant :	**BP 30091 89 RUE DUPRE DE SAINT MAUR 33041 BORDEAUX CEDEX**
Représenté par :	**Monsieur RAMOS Julien**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur PIRES FERNANDES Michael**
Nom et adresse de l'entreprise :	**BUREAU VERITAS EXPLOITATION 30, avenue Gustave Eiffel 33600 PESSAC**
N° de Siret :	**79018467501324**
RCP-compagnie-n° de police :	**ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - FRL001575**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**BATIMENT 68**
Adresse complète :	**Route du val de l'Isle 24110 SAINT-ASTIER**
Référence Cadastrale :	**NC**

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**	Construction : **Non communiquée**
Fonction principale du bâtiment :	**Immeuble Hébergement et Bureaux**	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	**Bâtiment 068**	

1.5 Liste des documents remis :

<[Absence de document remis]>

Type de document
Plans

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Réfection des salles de bain des chambres de la partie hôtel et rénovation globale de tout le bâtiment 068, sous-sol, RDC, R+1 et R+2.

3 Elément de la mission de repérage

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

3.1	Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Étage	Visité	Justification de non-visite
Local	R-1	OUI	
Local S102	R-1	OUI	
Local S103	R-1	OUI	
Local S104	R-1	OUI	
Local S105	R-1	OUI	
Local S106	R-1	OUI	
Local S107	R-1	OUI	
Local S110	R-1	OUI	
Local S111	R-1	OUI	
Local S112	R-1	OUI	
Local S113	R-1	OUI	
Local S114	R-1	OUI	
Local S116	R-1	OUI	
Circulation 00 44	R-1	OUI	
Circulation 00 48	R-1	OUI	
Local S117	R-1	OUI	
Local S118	R-1	OUI	
Local S119	R-1	OUI	
Local S120	R-1	OUI	
Local S109	R-1	OUI	
Local S115	R-1	OUI	
Chaufferie S1 08	R-1	OUI	
SDB Chambre 00 03	RDC	OUI	
SDB Chambre 00 04	RDC	OUI	
SDB Chambre 00 05	RDC	OUI	
SDB Chambre 00 06	RDC	OUI	
SDB Chambre 00 07	RDC	OUI	
Dortoir 00 16	RDC	OUI	
Dortoir 00 17	RDC	OUI	
Dortoir 00 18	RDC	OUI	
Dortoir 00 19	RDC	OUI	
Dortoir 00 20	RDC	OUI	
Dortoir 00 26	RDC	OUI	
Dortoir 00 27	RDC	OUI	
Dortoir 00 32	RDC	OUI	
Dortoir 00 33	RDC	OUI	
Dortoir 00 34	RDC	OUI	
Dortoir 00 35	RDC	OUI	
Dortoir 00 36	RDC	OUI	
Dortoir 00 39	RDC	OUI	
Dortoir 00 40	RDC	OUI	
Dortoir 00 41	RDC	OUI	
Sanitaire 00 15	RDC	OUI	
Sanitaire 00 42	RDC	OUI	
Bureau 00 14	RDC	OUI	
Bureau 00 43	RDC	OUI	
Bureau 00 38	RDC	OUI	
Sanitaire 00 22	RDC	OUI	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Sanitaire 00 24	RDC	OUI	
Sanitaire 00 28	RDC	OUI	
Sanitaire 00 30	RDC	OUI	
Sanitaire 00 37	RDC	OUI	
Salle de réunion 00 21	RDC	OUI	
Salle de réunion 00 25	RDC	OUI	
Salle de réunion 00 31	RDC	OUI	
Gaine Technique 1	RDC	OUI	
Gaine Technique 2	RDC	OUI	
Gaine Technique 3	RDC	OUI	
Circulation 00 45	RDC	OUI	
Circulation 00 46	RDC	OUI	
Circulation 00 47	RDC	OUI	
Séchoir 00 23	RDC	OUI	
Séchoir 00 29	RDC	OUI	
SDB Chambre 01 02	R+1	OUI	
SDB Chambre 01 03	R+1	OUI	
SDB Chambre 01 04	R+1	OUI	
SDB Chambre 01 05	R+1	OUI	
SDB Chambre 01 06	R+1	OUI	
SDB Chambre 01 07	R+1	OUI	
SDB Chambre 01 08	R+1	OUI	
SDB Chambre 01 09	R+1	OUI	
Dortoir 01 15	R+1	OUI	
Dortoir 01 16	R+1	OUI	
Dortoir 01 17	R+1	OUI	
Dortoir 01 18	R+1	OUI	
Dortoir 01 19	R+1	OUI	
Dortoir 01 20	R+1	OUI	
Dortoir 01 21	R+1	OUI	
Dortoir 01 22	R+1	OUI	
Dortoir 01 26	R+1	OUI	
Dortoir 01 27	R+1	OUI	
Dortoir 01 28	R+1	OUI	
Dortoir 01 29	R+1	OUI	
Dortoir 01 30	R+1	OUI	
Dortoir 01 34	R+1	OUI	
Dortoir 01 35	R+1	OUI	
Dortoir 01 36	R+1	OUI	
Dortoir 01 37	R+1	OUI	
Dortoir 01 38	R+1	OUI	
Dortoir 01 39	R+1	OUI	
Dortoir 01 40	R+1	OUI	
Dortoir 01 41	R+1	OUI	
Dortoir 01 44	R+1	OUI	
Dortoir 01 45	R+1	OUI	
Dortoir 01 47	R+1	OUI	
Dortoir 01 48	R+1	OUI	
Dortoir 01 49	R+1	OUI	
Dortoir 01 50	R+1	OUI	
Dortoir 01 46	R+1	OUI	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Circulation 01 49	R+1	OUI	
Circulation 01 50	R+1	OUI	
Circulation 01 51	R+1	OUI	
Circulation 01 52	R+1	OUI	
Circulation 01 53	R+1	OUI	
Gaine Technique 1	R+1	OUI	
Gaine Technique 2	R+1	OUI	
Gaine Technique 3	R+1	OUI	
Séchoir 01 24	R+1	OUI	
Séchoir 01 32	R+1	OUI	
Sanitaire 01 14	R+1	OUI	
Sanitaire 01 13	R+1	OUI	
Buanderie 01 23	R+1	OUI	
Sanitaire 01 25	R+1	OUI	
Sanitaire 01 48	R+1	OUI	
Sanitaire 01 47	R+1	OUI	
Sanitaire 01 31	R+1	OUI	
Sanitaire 01 33	R+1	OUI	
Sanitaire 01 43	R+1	OUI	
SDB Chambre 02 02	R+2	OUI	
SDB Chambre 02 03	R+2	OUI	
SDB Chambre 02 04	R+2	OUI	
SDB Chambre 02 05	R+2	OUI	
SDB Chambre 02 06	R+2	OUI	
SDB Chambre 02 07	R+2	OUI	
SDB Chambre 02 08	R+2	OUI	
SDB Chambre 02 09	R+2	OUI	
Dortoir 02 15	R+2	OUI	
Dortoir 02 16	R+2	OUI	
Dortoir 02 17	R+2	OUI	
Dortoir 02 18	R+2	OUI	
Dortoir 02 19	R+2	OUI	
Dortoir 02 20	R+2	OUI	
Dortoir 02 21	R+2	OUI	
Dortoir 02 22	R+2	OUI	
Dortoir 02 26	R+2	OUI	
Dortoir 02 27	R+2	OUI	
Dortoir 02 28	R+2	OUI	
Dortoir 02 29	R+2	OUI	
Dortoir 02 30	R+2	OUI	
Dortoir 02 34	R+2	OUI	
Dortoir 02 35	R+2	OUI	
Dortoir 02 36	R+2	OUI	
Dortoir 02 37	R+2	OUI	
Dortoir 02 38	R+2	OUI	
Dortoir 02 39	R+2	OUI	
Dortoir 02 40	R+2	OUI	
Dortoir 02 41	R+2	OUI	
Dortoir 02 44	R+2	OUI	
Dortoir 02 45	R+2	OUI	
Dortoir 02 46	R+2	OUI	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Circulation 02 49	R+2	OUI	
Circulation 02 50	R+2	OUI	
Circulation 02 51	R+2	OUI	
Circulation 02 52	R+2	OUI	
Circulation 02 53	R+2	OUI	
Gaine Technique 1	R+2	OUI	
Gaine Technique 2	R+2	OUI	
Gaine Technique 3	R+2	OUI	
Séchoir 02 24	R+2	OUI	
Sanitaire 02 14	R+2	OUI	
Sanitaire 02 13	R+2	OUI	
Buanderie 02 23	R+2	OUI	
Sanitaire 02 25	R+2	OUI	
Sanitaire 02 48	R+2	OUI	
Sanitaire 02 47	R+2	OUI	
Sanitaire 02 31	R+2	OUI	
Sanitaire 02 33	R+2	OUI	
Sanitaire 02 43	R+2	OUI	
Façade Nord	/	OUI	
Façade Sud	/	OUI	
Façade Est	/	OUI	
Façade Ouest	/	OUI	
Local S101	R+1	OUI	
Dortoir 01 51	R+1	OUI	
Dortoir 01 52	R+1	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X

Marque :	**Niton**
Modèle :	**XLP S**
Numéro de série :	**95193**
Date de changement de source :	**21/09/2023**
Nature du radionucléide :	**Cadmium 109**
Activité de la source :	**850 Mbq**
Limite de quantification de l'appareil	**0,31 mg/cm²**

Étalon 1	**Étalon 2**
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)

N° de mesure	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm²)	Date	Observation
1	0,29	0,11	02/03/2026	Vérification de justesse de début de diagnostic
2	0,72	0,14	02/03/2026	Vérification de justesse de fin de diagnostic
909	0,26	0,08	02/03/2026	Vérification de justesse de début de diagnostic
910	0,77	0,15	02/03/2026	Vérification de justesse de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique

Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Méthodologie Employée

Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X
Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission
L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
– chaque palier ;
– chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;


Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local

Identification des zones
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».

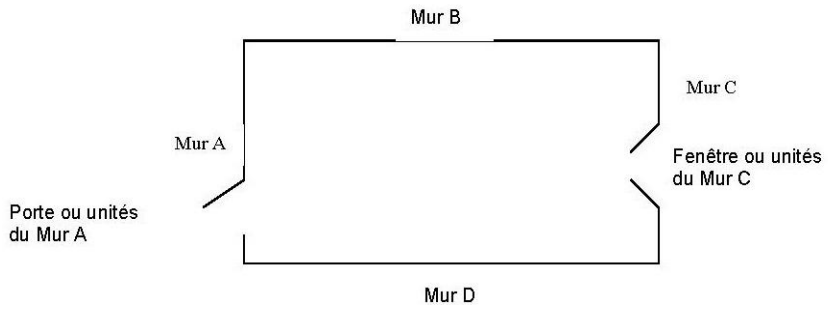

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements
Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :
- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :
- Niveau (rez de chaussée, étage X…) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.
Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :
– les différents murs d'une même pièce ;
– des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
– les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
– une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :
– l'ensemble des plinthes d'un même local ;
– l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :
- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

- Le polystyrène
- Les carrelages, faïences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.
Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.
Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :

- Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- Lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », «C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre.
- La zone « plafond » est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

Local S102 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,08	0,08	
4	Toutes zones	UR2 Huisseries	Métal	Peinture	C	0,03	0,07	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
5	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,1	0,07	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Local S103 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
6	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,14	0,06	
8	Toutes zones	UR2 Huisseries	Métal	Peinture	C	0,03	0,05	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
9	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,15	0,06	
7	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,13	0,07	

Commentaire sur le local	Néant

Local S104 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
10	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,08	0,03	
11	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,13	0,04	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
12	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,11	0,03	

Commentaire sur le local	Néant

Local S105 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
13	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,06	0,03	
15	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,1	0,05	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
16	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,05	0,08	
14	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,2	0,05	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local S106 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
17	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,1	0,03	
19	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,2	0,07	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
20	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,18	0,07	
18	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,08	0,07	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local S107 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
21	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,15	0,06	
23	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,03	0,07	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
24	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,14	0,03	
22	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,17	0,05	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local S110 (R-1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
25	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,03	0,02	
26	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,14	0,07	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
27	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,15	0,03	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local S111 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
28	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,03	0,04	
30	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,07	0,07	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
31	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,07	0,07	
29	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,16	0,04	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local S112 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
32	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,03	0,04	
34	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,06	0,03	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
35	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,05	0,06	
33	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,05	0,05	

Commentaire sur le local	Néant

Local S113 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
36	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,08	0,06	
38	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,03	0,03	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
39	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,17	0,03	
37	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,05	0,04	

Commentaire sur le local	Néant

Local S114 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
40	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,03	0,03	
42	Toutes zones	UR2 Huisseries	Métal	Peinture	C	0,2	0,07	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
43	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,15	0,05	
41	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,06	0,07	

Commentaire sur le local	Néant

Local S116 (R-1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
44	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,07	0,06	
46	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,12	0,07	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
47	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,05	0,08	
45	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,13	0,04	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local S117 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
50	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,06	0,05	
52	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,07	0,02	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
53	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,11	0,06	
51	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,09	0,04	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local S118 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
54	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,17	0,05	
56	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,12	0,07	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
57	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,18	0,03	
55	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,05	0,02	

Commentaire sur le local	Néant

Local S119 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
58	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,16	0,04	
60	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,11	0,04	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
61	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,07	0,08	
59	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,12	0,03	

Commentaire sur le local	Néant

Local S120 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
62	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,08	0,04	
64	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,18	0,05	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
65	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,14	0,08	
63	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,04	0,03	

Commentaire sur le local	Néant

Local S109 (R-1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
66	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,05	0,08	
68	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,19	0,03	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
67	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,15	0,08	
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local S115 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
69	Toutes zones	UR1 Fenêtre	Bois	Peinture	C	0,11	0,07	
71	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Peinture	C	0,1	0,07	
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
72	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture	C	0,09	0,02	
70	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Peinture	A	0,05	0,06	
Commentaire sur le local			**Néant**					

Facade Sud (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
906	Toutes zones	UR22 Crépi	Béton	Enduit		0,08	0,08	
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local S101 (R-1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR2 Huisseries	métal	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR3 Sol	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Circulation 00 44 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
268	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,2	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
279	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,16	0,03	
291	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,15	0,07	
301	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,05	0,05	
310	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,2	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
48	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture		0,06	0,04	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Circulation 00 48 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
269	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,03	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
280	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,11	0,02	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
292	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,1	0,05	
302	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,11	0,05	
311	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,15	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
49	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture		0,09	0,04	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Chaufferie S1 08 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
74	Toutes zones	UR10 Murs	Béton	Peinture		0,05	0,05	
75	Toutes zones	UR11 Plafond	Béton	Fibralith		0,18	0,02	
	Toutes zones	UR2 Huisseries	Métal	Brut				Non peint
	Toutes zones	UR8 Porte	Métal	Brut				Non peint
73	Toutes zones	UR9 Sol	Béton	Peinture		0,03	0,03	
Commentaire sur le local		**Néant**						

SDB Chambre 00 03 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
76	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,05	0,06	
77	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,12	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
78	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,12	0,04	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
79	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,1	0,08	
80	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,07	0,05	
81	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,18	0,07	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 00 04 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
82	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,14	0,04	
83	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,19	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
84	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,05	0,06	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
85	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,17	0,08	
86	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,17	0,05	
87	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,04	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 00 05 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
88	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,17	0,04	
89	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,09	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
90	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,17	0,07	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
91	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,12	0,05	
92	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,1	0,04	
93	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,03	0,04	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 00 06 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
94	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,16	0,05	
95	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,1	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
96	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,16	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
97	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,02	
98	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,03	0,07	
99	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,1	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 00 07 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
100	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,13	0,04	
101	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,05	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
102	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,11	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
103	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,18	0,07	
104	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,05	0,07	
105	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,19	0,08	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

Dortoir 00 016 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
106	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,04	0,03	
116	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,12	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
126	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,18	0,04	
136	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,16	0,03	
146	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,19	0,04	
156	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,18	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

Dortoir 00 017 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
107	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,09	0,06	
117	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,02	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
127	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,05	0,08	
137	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	0,06	
147	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,19	0,07	
157	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,05	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Dortoir 00 018 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
108	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,06	0,08	
118	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,05	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
128	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,15	0,05	
138	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,16	0,03	
148	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,03	
158	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,02	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 00 019 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
109	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,19	0,06	
119	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,04	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
129	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,17	0,05	
139	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,18	0,03	
149	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,06	
159	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,12	0,08	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 00 020 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
110	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,03	0,03	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
120	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,13	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
130	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,11	0,07	
140	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,09	0,08	
150	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,11	0,07	
160	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,12	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 00 026 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
111	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,06	0,03	
121	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,07	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
131	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,16	0,04	
141	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,15	0,04	
151	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	0,02	
161	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,17	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 00 027 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
112	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,04	0,07	
122	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,13	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
132	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,1	0,03	
142	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,04	
152	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,03	
162	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,14	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 00 032 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
113	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,02	0,07	
123	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,11	0,08	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
133	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,15	0,06	
143	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,04	
153	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,13	0,06	
163	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,08	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 00 033 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
114	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,14	0,07	
124	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,03	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
134	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,13	0,07	
144	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,19	0,03	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
154	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	0,02	
164	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,16	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 00 034 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
115	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,18	0,04	
125	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,08	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
135	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,08	0,03	
145	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,11	0,05	
155	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,12	0,03	
165	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,14	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 00 035 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
166	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,14	0,06	
167	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,09	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
168	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,08	0,06	
169	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,2	0,02	
170	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,06	
171	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,08	0,04	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

Dortoir 00 036 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
172	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,1	0,08	
173	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,2	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
174	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,15	0,05	
175	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,17	0,07	
176	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,11	0,08	
177	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,1	0,08	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

Dortoir 00 039 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
178	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,2	0,08	
179	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,15	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
180	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,1	0,05	
181	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	0,06	
182	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,05	0,04	
183	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,02	0,08	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 00 040 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
184	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,03	0,06	
185	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,19	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
186	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,08	0,06	
187	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,07	
188	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,03	0,07	
189	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,04	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 00 041 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
190	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,03	0,06	
191	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,13	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
192	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,11	0,06	
193	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,1	0,07	
194	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,04	
195	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,05	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 00 15 (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
196	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,12	0,04	
197					A	0,04	0,06	
198	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,09	0,02	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
199	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,14	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
200	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,16	0,08	
201	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,16	0,05	
202	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,04	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 00 42 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
203	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,11	0,04	
204					A	0,1	0,05	
205	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,14	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
206	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,13	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
207	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,09	0,06	
208	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,19	0,07	
209	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,14	0,08	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Bureau 00 14 (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
210	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,1	0,06	
211	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,14	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
212	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,17	0,04	
213	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,1	0,02	
214	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,05	0,06	
215	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,11	0,08	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Bureau 00 43 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
216	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,03	0,07	
217	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,03	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
218	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,2	0,06	
219	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,09	0,02	
220	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,05	
221	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,07	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Bureau 00 38 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
222	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,19	0,02	
223	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,06	0,02	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
224	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,13	0,06	
225	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,04	
226	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,12	0,06	
227	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,18	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Sanitaire 00 22 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
228	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,11	0,04	
229					A	0,13	0,07	
230	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,08	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
231	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,18	0,05	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
232	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,05	0,07	
233	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,05	
234	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,15	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Sanitaire 00 24 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
235	Toutes	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,14	0,06	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
236	zones				A	0,1	0,04	
237	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,2	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
238	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,1	0,05	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
239	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,11	0,08	
240	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,05	
241	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,07	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 00 28 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
242	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,07	0,05	
243					A	0,06	0,03	
244	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,16	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
245	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,03	0,07	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
246	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,07	
247	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,02	
248	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,11	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 00 30 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
249	Toutes	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,11	0,06	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
250	zones				A	0,03	0,08	
251	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,08	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
252	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,17	0,07	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
253	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,02	
254	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,18	0,04	
255	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,04	0,08	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 00 37 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
256	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,08	0,05	
257					A	0,14	0,05	
264	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,16	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
273	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,09	0,08	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
285	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,04	0,04	
297	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,03	0,04	
306	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,17	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Salle de réunion 00 21 (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
258	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,21	0,05	
265	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,07	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
274	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,43	0,16	
286	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,28	0,14	
298	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,34	0,14	
307	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,23	0,12	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Salle de réunion 00 25 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
259	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,89	0,26	
266	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,96	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
275	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		3,88	0,26	
287	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		1,54	0,36	
299	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	1,35	0,27	
308	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,58	0,17	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Salle de réunion 00 31 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
260	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,09	0,04	
267	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,02	0,03	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
276	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,09	0,05	
288	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,15	0,06	
300	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,02	
309	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,13	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Gaine Technique 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
261	Toutes zones	UR12 Porte	Métal	Peinture	A	0,14	0,08	
	Toutes zones	UR3 Sol		Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton					Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Gaine Technique 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
262	Toutes zones	UR12 Porte	Métal	Peinture	A	0,16	0,04	
	Toutes zones	UR3 Sol		Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton					Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Gaine Technique 3 (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
263	Toutes zones	UR12 Porte	Métal	Peinture	A	0,07	0,06	
	Toutes zones	UR3 Sol		Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton					Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton					Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Circulation 00 45 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
270	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,15	0,02	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
281	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,09	0,02	
293	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,04	
303	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,12	0,05	
312	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,08	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Circulation 00 46 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
271	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,11	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
282	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,16	0,05	
294	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,12	0,06	
304	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,15	0,06	
313	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,19	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Circulation 00 47 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
272	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,19	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
283	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,2	0,06	
295	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,13	0,03	
305	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,11	0,04	
314	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,19	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Séchoir 00 23 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR12 Porte	Métal					Non peint
	Toutes zones	UR14 Sol		Brut				Non peint
277	Toutes zones	UR16 Murs	Béton	Peinture		0,18	0,08	
289	Toutes zones	UR18 Plafond	Béton	Peinture		0,16	0,06	

Commentaire sur le local	Néant

Séchoir 00 29 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR12 Porte	Métal					Non peint
	Toutes zones	UR14 Sol		Brut				Non peint
278	Toutes zones	UR16 Murs	Béton	Peinture		0,03	0,05	
290	Toutes zones	UR18 Plafond	Béton	Peinture		0,06	0,02	

Commentaire sur le local	Néant

Facade Nord (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
905	Toutes zones	UR22 Crépi	Béton	Enduit		0,05	0,07	

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 01 02 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
284	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,11	0,06	
296	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,19	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
315	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,13	0,04	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
316	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,05	0,02	
317	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,1	0,05	
318	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,11	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 01 03 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
319	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,07	0,04	
320	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,03	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
321	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,04	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
322	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,05	
323	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,09	0,07	
324	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,08	0,03	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 01 04 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
325	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,17	0,02	
326	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,09	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
327	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,11	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
328	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,16	0,03	
329	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,05	0,04	
330	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,14	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 01 05 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
331	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,19	0,03	
332	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,17	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
333	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,17	0,02	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
334	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,04	
335	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,11	0,03	
336	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,17	0,03	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 01 06 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
337	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,04	0,05	
338	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,17	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
339	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,06	0,04	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
340	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,11	0,06	
341	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,12	0,05	
342	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,03	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 01 07 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
343	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,16	0,05	
344	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,11	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
345	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,04	0,04	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
346	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,16	0,03	
347	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,1	0,04	
348	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,15	0,03	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 01 08 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
349	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,17	0,04	
350	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,16	0,08	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
351	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,18	0,08	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
352	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,16	0,06	
353	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,07	0,07	
354	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,18	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 01 09 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
355	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,03	0,04	
356	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,13	0,08	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
357	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,06	0,07	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
358	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,03	
359	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,09	0,07	
360	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,05	0,07	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

Dortoir 01 15 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
361	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,04	0,06	
362	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,11	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
363	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,1	0,07	
364	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,08	0,03	
365	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,05	0,07	
366	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,17	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

Dortoir 01 16 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
367	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,02	0,07	
368	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,16	0,08	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
369	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,11	0,07	
370	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,2	0,06	
371	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,18	0,05	
372	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,13	0,02	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Dortoir 01 17 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
373	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,18	0,04	
374	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,06	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
375	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,09	0,05	
376	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,07	0,05	
377	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,05	
378	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,2	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 18 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
379	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,16	0,02	
380	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,06	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
381	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,17	0,07	
382	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,16	0,05	
383	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	0,05	
384	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,09	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 19 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
385	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,19	0,04	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
386	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,19	0,02	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
387	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,08	0,04	
388	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,06	
389	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,19	0,07	
390	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,2	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 20 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
391	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,09	0,02	
392	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,12	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
393	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,08	0,06	
394	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,15	0,06	
395	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,12	0,06	
396	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,1	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 21 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
397	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,05	0,04	
398	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,2	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
399	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,14	0,03	
400	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,16	0,04	
401	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,03	0,06	
402	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,05	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 22 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
403	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,07	0,04	
404	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,11	0,02	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
405	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,16	0,02	
406	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	0,02	
407	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,05	0,04	
408	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,13	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 26 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
409	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,03	0,03	
410	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,09	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
411	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,15	0,03	
412	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,1	0,03	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
413	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,05	0,07	
414	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,04	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 27 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
415	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,12	0,06	
416	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,11	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
417	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,12	0,05	
418	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,08	
419	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,03	
420	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,17	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 28 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
421	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,09	0,07	
422	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,16	0,02	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
423	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,07	0,04	
424	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,17	0,05	
425	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,19	0,08	
426	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,14	0,05	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Dortoir 01 29 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
427	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,06	0,04	
428	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,19	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
429	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,2	0,03	
430	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,05	
431	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,15	0,06	
432	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,08	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Dortoir 01 30 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
433	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,14	0,06	
434	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,04	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
435	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,1	0,08	
436	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,02	
437	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,11	0,05	
438	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,05	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 34 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
439	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,11	0,04	
440	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,08	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
441	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,05	0,06	
442	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,19	0,06	
443	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,08	
444	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,02	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 35 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
445	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,04	0,04	
446	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,09	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
447	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,09	0,07	
448	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,17	0,04	
449	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,15	0,05	
450	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,19	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 36 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
451	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,14	0,04	
452	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,18	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
453	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,04	0,05	
454	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,08	
455	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,13	0,05	
456	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,16	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 37 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
457	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,16	0,05	
458	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,04	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
459	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,05	0,06	
460	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,16	0,07	
461	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	0,07	
462	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,1	0,02	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 38 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
463	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,11	0,04	
464	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,12	0,06	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
465	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,09	0,08	
466	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,12	0,03	
467	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,07	
468	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,15	0,02	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 39 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
469	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,05	0,04	
470	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,1	0,08	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
471	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,14	0,05	
472	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,11	0,05	
473	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,05	
474	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,2	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 40 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
475	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,17	0,04	
476	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,2	0,08	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
477	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,04	0,04	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
478	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,06	
479	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,17	0,04	
480	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,11	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Dortoir 01 41 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
481	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,15	0,04	
482	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,03	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
483	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,16	0,06	
484	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,1	0,04	
485	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,02	
486	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,07	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Dortoir 01 44 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
487	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,15	0,04	
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Dortoir 01 45 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
493	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,15	0,05	
488	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,03	0,08	
494					A	0,09	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
495	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,17	0,02	
496	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,04	0,02	
497	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,05	
498	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,18	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 47 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
489	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,16	0,06	

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 48 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
490	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,17	0,06	

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 49 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
491	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,18	0,05	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Dortoir 01 50 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
492	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,2	0,08	

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 46 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
499	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,06	0,06	
500	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,06	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
501	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,06	0,04	
502	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,08	0,06	
503	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,17	0,06	
504	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,06	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Circulation 01 49 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
505	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,06	0,02	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
506	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,12	0,07	
507	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,17	0,05	
508	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,04	
509	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,19	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
510	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture		0,04	0,03	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Circulation 01 50 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
511	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,12	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
512	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,12	0,04	
513	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,09	0,04	
514	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,07	
515	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,2	0,02	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
516	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture		0,05	0,05	

Commentaire sur le local	Néant

Circulation 01 51 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
517	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,18	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
518	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,09	0,05	
519	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,13	0,06	
520	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,02	0,04	
521	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,14	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Circulation 01 52 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
522	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,1	0,02	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
523	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,16	0,07	
524	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	0,07	
525	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,12	0,04	
526	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,06	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Circulation 01 53 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
527	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,18	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
528	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,04	0,06	
529	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,17	0,05	
530	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,2	0,04	
531	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,11	0,02	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Gaine Technique 1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
532	Toutes zones	UR12 Porte	Métal	Peinture	A	0,16	0,05	
	Toutes zones	UR3 Sol		Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton					Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton					Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Gaine Technique 2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
533	Toutes zones	UR12 Porte	Métal	Peinture	A	0,19	0,04	
	Toutes zones	UR3 Sol		Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton					Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Gaine Technique 3 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
534	Toutes zones	UR12 Porte	Métal	Peinture	A	0,12	0,04	
	Toutes zones	UR3 Sol		Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton					Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Séchoir 01 24 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR12 Porte	Métal					Non peint
	Toutes zones	UR14 Sol		Brut				Non peint
535	Toutes zones	UR16 Murs	Béton	Peinture		0,15	0,03	
536	Toutes zones	UR18 Plafond	Béton	Peinture		0,17	0,03	

Commentaire sur le local	Néant

Séchoir 01 32 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR12 Porte	Métal					Non peint
	Toutes zones	UR14 Sol		Brut				Non peint
537	Toutes zones	UR16 Murs	Béton	Peinture		0,07	0,05	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
538	Toutes zones	UR18 Plafond	Béton	Peinture		0,11	0,07	

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 01 14 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
539	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,15	0,03	
540					A	0,03	0,02	
541	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,16	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
542	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,17	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
543	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,09	0,03	
544	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,04	
545	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,1	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 01 13 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
546	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,13	0,03	
547					A	0,09	0,03	
548	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,16	0,02	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
549	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,04	0,04	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
550	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,04	0,03	
551	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,03	
552	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,04	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

Buanderie 01 23 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
553	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,07	0,06	
554					A	0,1	0,04	
555	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,06	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
556	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,12	0,05	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
557	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,09	0,06	
558	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,02	0,05	
559	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,04	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

Sanitaire 01 25 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
560	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,04	0,04	
561					A	0,12	0,03	
562	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,04	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
563	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,07	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
564	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,19	0,04	
565	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,13	0,08	
566	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,05	0,08	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

Sanitaire 01 48 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
567	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,09	0,06	
568					A	0,11	0,07	
569	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,2	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
570	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,18	0,04	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
571	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,2	0,08	
572	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,19	0,07	
573	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,15	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

Sanitaire 01 47 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
574	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,05	0,07	
575					A	0,09	0,07	
602					A B C D	0,17	0,04	
603					A	0,08	0,06	
576	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,08	0,06	
604					A	0,11	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
577	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,16	0,03	
605						0,19	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
578	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,2	0,07	
606						0,2	0,02	
579	Toutes	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,1	0,03	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
607	zones				C	0,13	0,05	
580	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,16	0,07	
608					C	0,08	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 01 31 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
581	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,19	0,06	
582					A	0,07	0,07	
583	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,1	0,08	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
584	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,09	0,07	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
585	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,17	0,06	
586	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,12	0,05	
587	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,16	0,02	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 01 33 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
588	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,17	0,04	
589					A	0,07	0,04	
590	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,08	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
591	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,1	0,05	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
592	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,05	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
593	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,02	0,04	
594	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,05	0,02	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Sanitaire 01 43 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
595	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,12	0,06	
596					A	0,02	0,07	
597	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,11	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
598	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,08	0,05	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
599	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,04	0,04	
600	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,12	0,04	
601	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,1	0,02	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Facade Ouest (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
908	Toutes zones	UR22 Crépi	Béton	Enduit			0,01	
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Dortoir 01 51 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 01 52 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 02 02 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
609	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,19	0,06	
610	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,14	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
611	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,1	0,06	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
612	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,12	0,04	
613	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,07	0,03	
614	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,04	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

SDB Chambre 02 03 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
615	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,12	0,04	
616	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,08	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
617	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,19	0,07	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
618	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,2	0,04	
619	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,13	0,02	
620	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,17	0,02	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

SDB Chambre 02 04 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
621	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,14	0,02	
622	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,03	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
623	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,03	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
624	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,1	0,03	
625	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,2	0,06	
626	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,04	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

SDB Chambre 02 05 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
627	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,15	0,03	
628	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,06	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
629	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,16	0,07	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
630	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,15	0,06	
631	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,11	0,05	
632	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,05	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

SDB Chambre 02 06 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
633	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,13	0,08	
634	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	1,62	0,19	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
635	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,18	0,06	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
636	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,07	0,07	
637	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,04	0,02	
638	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,13	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

SDB Chambre 02 07 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
639	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,09	0,05	
640	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,06	0,08	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
641	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,18	0,05	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
642	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,18	0,04	
643	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,06	0,04	
644	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,11	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

SDB Chambre 02 08 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
645	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,11	0,05	
646	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,06	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
647	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,12	0,05	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
648	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,19	0,06	
649	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,18	0,05	
650	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,08	0,08	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

SDB Chambre 02 09 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
651	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,1	0,02	
652	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,15	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR15 Murs		Faïence				Non peint
653	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,06	0,07	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïence				Non peint
654	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,04	
655	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture		0,17	0,06	
656	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture		0,08	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Dortoir 02 15 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
657	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,07	0,06	
658	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,04	0,08	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
659	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,05	0,03	
660	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,04	
661	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,07	
662	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,14	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Dortoir 02 16 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
663	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,18	0,04	
664	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,15	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
665	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,06	0,06	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
666	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,04	
667	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,15	0,06	
668	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,04	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 17 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
669	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,1	0,08	
670	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,09	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
671	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,19	0,04	
672	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,18	0,05	
673	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,12	0,03	
674	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,15	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 18 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
675	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,18	0,07	
676	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,02	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
677	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,12	0,02	
678	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,09	0,04	
679	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,06	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
680	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,05	0,08	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 19 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
681	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,05	0,03	
682	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,12	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
683	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,11	0,02	
684	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,2	0,04	
685	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,17	0,08	
686	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,08	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 20 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
687	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,07	0,05	
688	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,05	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
689	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,07	0,06	
690	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	0,04	
691	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,08	
692	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,06	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

Dortoir 02 21 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
693	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,19	0,06	
694	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,17	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
695	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,17	0,06	
696	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,19	0,04	
697	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,19	0,03	
698	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,03	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

Dortoir 02 22 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
699	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,08	0,04	
700	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,03	0,02	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
701	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,12	0,03	
702	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,02	0,04	
703	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,08	
704	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,19	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Dortoir 02 26 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
705	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,17	0,06	
706	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,14	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
707	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,13	0,08	
708	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,05	
709	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,03	
710	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,18	0,02	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 27 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
711	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,02	0,02	
712	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,14	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
713	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,11	0,06	
714	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,07	0,06	
715	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,04	
716	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,15	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 28 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
717	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,1	0,06	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
718	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,19	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
719	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,09	0,06	
720	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,12	0,02	
721	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,17	0,07	
722	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,15	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 29 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
723	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,03	0,04	
724	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,07	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
725	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,17	0,03	
726	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,05	0,06	
727	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,04	
728	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,02	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 30 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
729	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,09	0,07	
730	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,1	0,02	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
731	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,16	0,05	
732	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,05	0,05	
733	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,19	0,05	
734	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,18	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Dortoir 02 34 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
735	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,11	0,04	
736	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,06	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
737	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,1	0,02	
738	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,05	0,07	
739	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,13	0,07	
740	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,12	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Dortoir 02 35 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
741	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,2	0,04	
742	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,07	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
743	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,14	0,06	
744	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,05	0,05	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
745	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,04	
746	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,05	0,02	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Dortoir 02 36 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
747	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,05	0,05	
748	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,04	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
749	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,1	0,04	
750	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,13	0,03	
751	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,03	0,03	
752	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,18	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Dortoir 02 37 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
753	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,05	0,07	
754	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,09	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
755	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,11	0,02	
756	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,13	0,03	
757	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,12	0,03	
758	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,1	0,03	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

Dortoir 02 38 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
759	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,11	0,04	
760	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,18	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
761	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,04	0,03	
762	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,12	0,03	
763	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,03	0,02	
764	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,03	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

Dortoir 02 39 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
765	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,06	0,03	
766	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,19	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
767	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,14	0,05	
768	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	0,06	
769	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,04	
770	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,07	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 40 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
771	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,05	0,05	
772	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,1	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
773	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,14	0,05	
774	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,08	0,04	
775	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,04	
776	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,09	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 41 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
777	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,18	0,04	
778	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,1	0,03	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
779	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,05	0,04	
780	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,09	0,08	
781	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,02	0,08	
782	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,12	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Dortoir 02 44 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
783	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,12	0,07	
784	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,1	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
785	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,1	0,04	
786	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,18	0,08	
787	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,16	0,07	
788	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,19	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 45 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
789	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,13	0,07	
790	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,12	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
791	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,12	0,06	
792	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,18	0,03	
793	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,02	0,07	
794	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,13	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Dortoir 02 46 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
795	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A	0,1	0,07	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
796	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,03	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
797	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,08	0,07	
798	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,17	0,08	
799	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,11	0,07	
800	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,11	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Circulation 02 49 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
801	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,07	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
802	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,17	0,02	
803	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,18	0,04	
804	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,16	0,04	
805	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,09	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
806	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture		0,03	0,05	

Commentaire sur le local	Néant

Circulation 02 50 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
807	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,06	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
808	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,11	0,04	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
809	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,07	0,02	
810	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,02	0,06	
811	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,15	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
812	Toutes zones	UR7 Grille	Métal	Peinture		0,16	0,05	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Circulation 02 51 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
813	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,14	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
814	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,09	0,04	
815	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,2	0,04	
816	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,19	0,02	
817	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,09	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Circulation 02 52 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
818	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,1	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
819	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,17	0,07	
820	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,18	0,03	
821	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,14	0,02	
822	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,15	0,05	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

Circulation 02 53 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
823	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,13	0,06	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
824	Toutes zones	UR16 Murs	Plâtre	Peinture		0,11	0,06	
825	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,14	0,06	
826	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,06	
827	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,19	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

Gaine Technique 1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
828	Toutes zones	UR12 Porte	Métal	Peinture	A	0,16	0,03	
	Toutes zones	UR3 Sol		Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton					Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton					Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

Gaine Technique 2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
829	Toutes zones	UR12 Porte	Métal	Peinture	A	0,19	0,03	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR3 Sol		Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton					Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Gaine Technique 3 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
830	Toutes zones	UR12 Porte	Métal	Peinture	A	0,03	0,04	
	Toutes zones	UR3 Sol		Brut				Non peint
	Toutes zones	UR4 Murs	Béton					Non peint
	Toutes zones	UR5 Plafond	Béton					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Séchoir 02 24 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	UR12 Porte	Métal					Non peint
	Toutes zones	UR14 Sol		Brut				Non peint
831	Toutes zones	UR16 Murs	Béton	Peinture		0,16	0,06	
833						0,13	0,04	
832	Toutes zones	UR18 Plafond	Béton	Peinture		0,06	0,07	
834						0,09	0,02	

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 02 14 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
835	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,09	0,02	
836					A	0,12	0,02	
837	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,19	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
838	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,16	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
839	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,02	0,03	
840	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,06	
841	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,03	0,03	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Sanitaire 02 13 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
842	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,19	0,03	
843					A	0,15	0,07	
844	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,08	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
845	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,03	0,06	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
846	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,11	0,05	
847	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,11	0,05	
848	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,03	0,08	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Buanderie 02 23 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
849	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,14	0,03	
850					A	0,09	0,06	
851	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,08	0,07	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
852	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,02	0,02	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
853	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,1	0,04	
854	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,15	0,05	
855	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,18	0,08	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 02 25 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
856	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,05	0,05	
857					A	0,02	0,04	
858	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,11	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
859	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,04	0,03	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
860	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,16	0,05	
861	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,06	
862	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,13	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 02 48 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
863	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,1	0,06	
864					A	0,03	0,05	
865	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,08	0,08	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
866	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,18	0,02	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
867	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,11	0,05	
868	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,16	0,07	
869	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,02	0,04	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

Sanitaire 02 47 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
870	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,06	0,06	
871					A	0,03	0,06	
898					A B C D	0,05	0,02	
899					A	0,06	0,04	
872	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,18	0,06	
900					A	0,11	0,08	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
873	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,1	0,08	
901						0,05	0,05	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
874	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,13	0,03	
902						0,09	0,05	
875	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,04	
903					C	0,1	0,05	
876	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,06	0,07	
904					C	0,09	0,06	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Sanitaire 02 31 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
877	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,18	0,07	
878					A	0,03	0,04	
879	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,08	0,05	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
880	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,15	0,06	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
881	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,1	0,04	
882	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,11	0,06	
883	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,19	0,05	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 02 33 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
884	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,09	0,08	
885					A	0,18	0,05	
886	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,03	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
887	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,08	0,05	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
888	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,18	0,03	
889	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,06	
890	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,11	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire 02 43 (R+2)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
891	Toutes zones	UR12 Porte	Bois	Peinture	A B C D	0,16	0,07	
892					A	0,18	0,02	
893	Toutes zones	UR13 Huisseries	Bois	Peinture	A	0,04	0,04	
	Toutes zones	UR14 Sol		Carrelage				Non peint
894	Toutes zones	UR16 Murs	Toile de verre	Peinture		0,07	0,06	
	Toutes zones	UR17 Murs		Faïences				Non peint
895	Toutes zones	UR18 Plafond	Plâtre	Peinture		0,07	0,08	
896	Toutes zones	UR19 Radiateur	Métal	Peinture	C	0,16	0,03	
897	Toutes zones	UR20 Tuyauterie	Métal	Peinture	C	0,15	0,07	
	Toutes zones	UR21 Plinthes		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	UR22 Fenêtre	Aluminium	Brut				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Facade Est (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
907	Toutes zones	UR22 Crépi	Béton	Enduit		0,11	0,03	


Commentaire sur le local	Néant

LEGENDE			
Localisation de la mesure	**HG :** en Haut à Gauche	**HC :** en Haut au Centre	**HD :** en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	**C :** au Centre	**MD :** au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	**BC :** en Bas au Centre	**BD :** en Bas à Droite

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	route du val de l'isle 24110 SAINT-ASTIER
N° dossier :	30852397 SAINT ASTIER BAT 068				
N° planche :	1/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+2

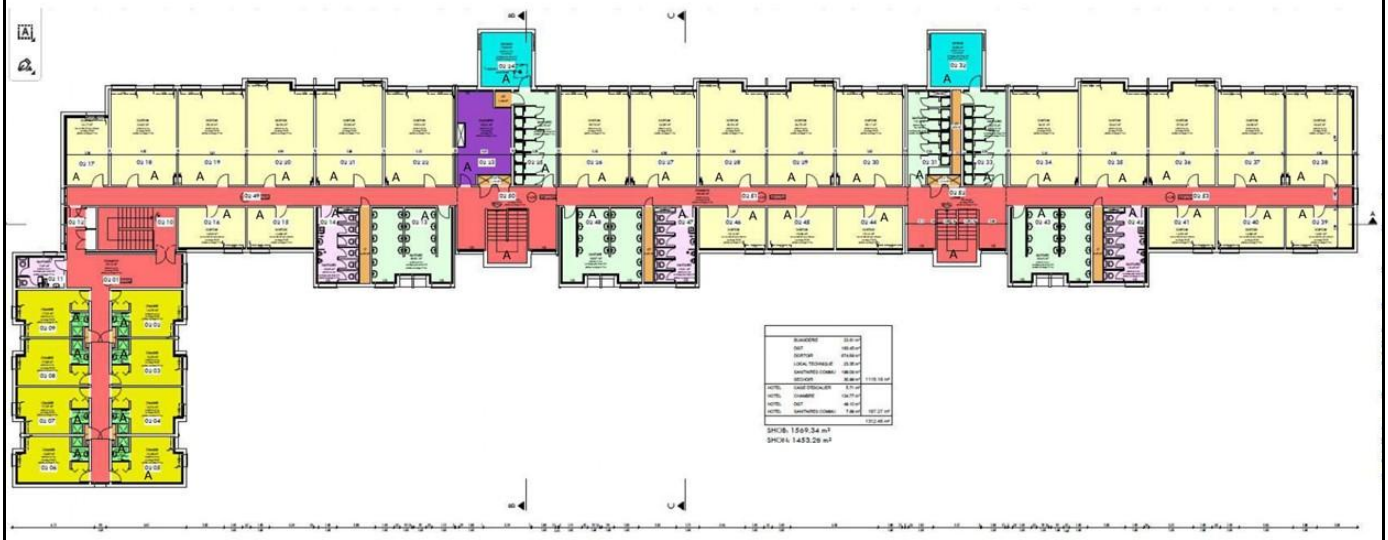

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	30852397 SAINT ASTIER BAT 068			Adresse de l'immeuble :	route du val de l'isle 24110 SAINT-ASTIER
N° planche :	2/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+1




© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	30852397 SAINT ASTIER BAT 068			Adresse de l'immeuble :	route du val de l'isle 24110 SAINT-ASTIER
N° planche :	3/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	30852397 SAINT ASTIER BAT 068			Adresse de l'immeuble :	route du val de l'isle 24110 SAINT-ASTIER
N° planche :	4/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R-1

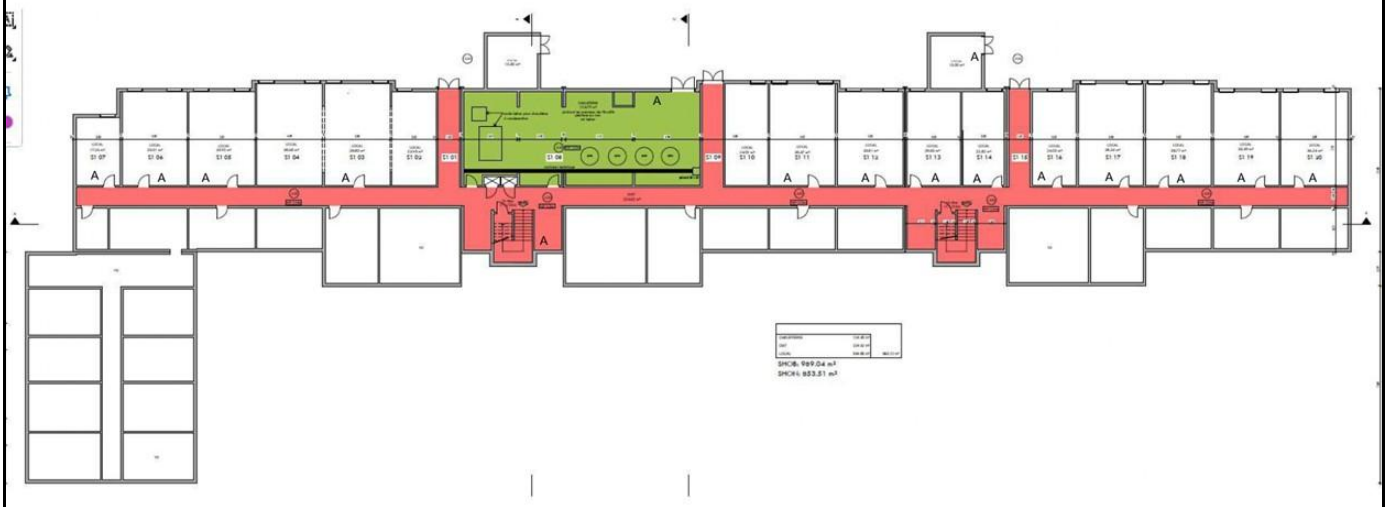

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1er mars 2011 signé par Dr. Björn Klaue

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,
Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :
Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit **75 MBq**.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 1480 MBq cette valeur limite est atteinte après 64 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.
Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.
Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb nous statuons que :
Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : [valeur cible — 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm2].
Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à ±0,1 mg/cm² dans un intervalle de confiance de 95% (2σ).

Nom de la société : BUREAU VERITAS	
Modèle de l'analyseur :	XLP S
Numéro de série analyseur :	95193
Numéro de série de la source :	RTV-2045-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	25/09/2023
Date de fin de validité de la source :	25/02/2028

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

ThermoFisher SCIENTIFIC

The world leader in serving science

Niton Europe GmbH · Joseph-Dollinger-Bogen 9 · 80807 München · Germany

01.03.2011

Maximum Usage Time for Cd-109 Sources in Thermo Scientific Niton XRF Analyzers

To Whom It May Concern

With regard to the instrument performance of Cd-109 isotope source based handheld Thermo Scientific Niton XRF analyzers designed for lead-in-paint applications we state the following:

Based on the established physical half-life of Cd-109 of 462.6 days, the maximum use for a Cd-109 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios, which is 75 MBq.

- **For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of 370 MBq this limit is reached after 36 months.**
- **For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of 1480 MBq this limit is reached after 64 months.**

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ration decreases even further because the electronic noise sources become more dominant. At an activity below 75 MBq the required analysis times increase to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

The stated maximum usage times of 36 (370 MBq source) and 64 months (1480 MBq source) prior to the inevitable resourcing are simply based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become practically useless within only few weeks. The maximum re-sourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Niton analyzer on a sample containing 1 mg/cm² of lead, we state the following:

Beyond the time limits stated above (i.e. : 36 months or 64 months depending on the initial activity of the source), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than +/- 0.1 mg/cm² with a confidence interval of 95% (2σ).

Sincerely

Dr. Björn Klaue
General Manager
Director Technical Support and Applications
Radiation Safety Officer

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9 · D-80807 München
Tel. +49-89-3681380 · Fax +49-89-36813830
E-mail: europe@niton.com

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9
80807 München
Germany

Tel. +49-(0)89-36 81 38-0
Fax +49-(0)89-36 81 38-30
E-mail niton.eur@thermofisher.com

Bankverbindung
Commerzbank AG
Kto-Nr. 8218000
BLZ 763 400 61
IBAN DE 56 7634 0061 0821 8000 00
SWIFT COBADEFF763

Geschäftsführer:
Dr. Olaf Haupt, Dr. Björn Klaue
James R.E. Coley, Piet van der Zande
Amtsgericht München HRB 129790
Ust-ID-Nr.: DE 205 372 303

www.thermofisher.com

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite
