
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesse
1	**PLANNING DCE - RENOVATION ENERGETIQUE DU SIEGE DE LA CAF 56 - VANNES**	**155,5 j**	**Jeu 26/11/26**	**Jeu 08/07/27**	
2	**Préparation de chantier**	**25 j**	Jeu 26/11/26	Jeu 31/12/26	
3	**LOT 01 - GROS OEUVRE - SECOND OEUVRE**	**70,5 j**	**Mer 06/01/27**	**Jeu 15/04/27**	
4	Local CTA 1 et 2 salles 202-203	5 j	Mer 06/01/27	Mar 12/01/27	16
5	Isolation rampants salles 202 et 203	9 j	Mer 13/01/27	Lun 25/01/27	4
6	Baie de brassage accueil	0,5 j	Mar 26/01/27	Mar 26/01/27	5
7	Local CTA 3 bât Admin	4 j	Mar 26/01/27	Lun 01/02/27	6
8	Option n°1 : Isolation combles et cheminements	11 j	Lun 01/02/27	Mar 16/02/27	7
9	Sofite salles 202-203	2 j	Mar 16/02/27	Jeu 18/02/27	18;8
10	Dépose Cloison/Plaf : Equilibrage Réseau ventilation CTA 3	1 j	Mer 10/03/27	Mer 10/03/27	
11	Sofite escalier CTA 3	1 j	Jeu 11/03/27	Jeu 11/03/27	21
12	Repose Cloison/Plaf : Equilibrage Réseau ventilation CTA 3	1 j	Lun 05/04/27	Mar 06/04/27	22
13	Dépose Plaf : Calorifuge tuyaux : Sous-sol	0,5 j	Mar 06/04/27	Mar 06/04/27	12
14	Repose Plaf : Calorifuge tuyaux : Sous-sol	0,5 j	Jeu 15/04/27	Jeu 15/04/27	26
15	**LOT 02 - CHAUFFAGE VENTILATION GTB ELECTRICITE**	**110,5 j**	**Lun 04/01/27**	**Jeu 10/06/27**	
16	Installation de chantier	2 j	Lun 04/01/27	Mar 05/01/27	2
17	CTA 1 et 2 salles 202-203	17 j	Mer 13/01/27	Jeu 04/02/27	4
18	Gainables salles 202-203	5,5 j	Ven 05/02/27	Ven 12/02/27	17
19	Destratificateurs salles 202 et 203	1,5 j	Ven 12/02/27	Lun 15/02/27	18
20	Remplacement luminaires salle 202	4 j	Mar 16/02/27	Ven 19/02/27	19
21	CTA 3 bât Admin	13 j	Lun 22/02/27	Mer 10/03/27	20;7;8
22	Equilibrage Réseau ventilation CTA 3	9 j	Jeu 11/03/27	Mar 23/03/27	21;10
23	Echangeur By-pass Change over	0,5 j	Mer 24/03/27	Mer 24/03/27	22
24	Calorifuge tuyaux : Extérieur	2,5 j	Mer 24/03/27	Ven 26/03/27	23
25	Calorifuge tuyaux : Chaufferie	6 j	Mar 30/03/27	Mar 06/04/27	24
26	Calorifuge tuyaux : Sous-sol	6 j	Mer 07/04/27	Mer 14/04/27	25;13
27	Remplacement Automate GTB	29 j	Jeu 15/04/27	Jeu 27/05/27	26
28	Ballon tampon PAC	2 j	Ven 28/05/27	Lun 31/05/27	27
29	Optimisation CTA Accueil	0,5 j	Mar 01/06/27	Mar 01/06/27	28
30	Equilibrage réseaux secondaires	3 j	Mar 01/06/27	Ven 04/06/27	29
31	Robinet Thermostatique GTB	4 j	Ven 04/06/27	Jeu 10/06/27	30
32	**OPR**	**1 j**	Jeu 10/06/27	Ven 11/06/27	15
33	**Levée des réserves**	**8 j**	Ven 11/06/27	Mer 23/06/27	32
34	**Réception**	**1 j**	Mer 23/06/27	Jeu 24/06/27	33
35	// Décalage \\ Option n°2 : Remplacement régulation LonWorks Gainable/CTA Accueil	10 j	Jeu 10/06/27	Jeu 24/06/27	31
36	**// Décalage \\ Option n°2 réception**	**10 j**	Jeu 24/06/27	Jeu 08/07/27	35

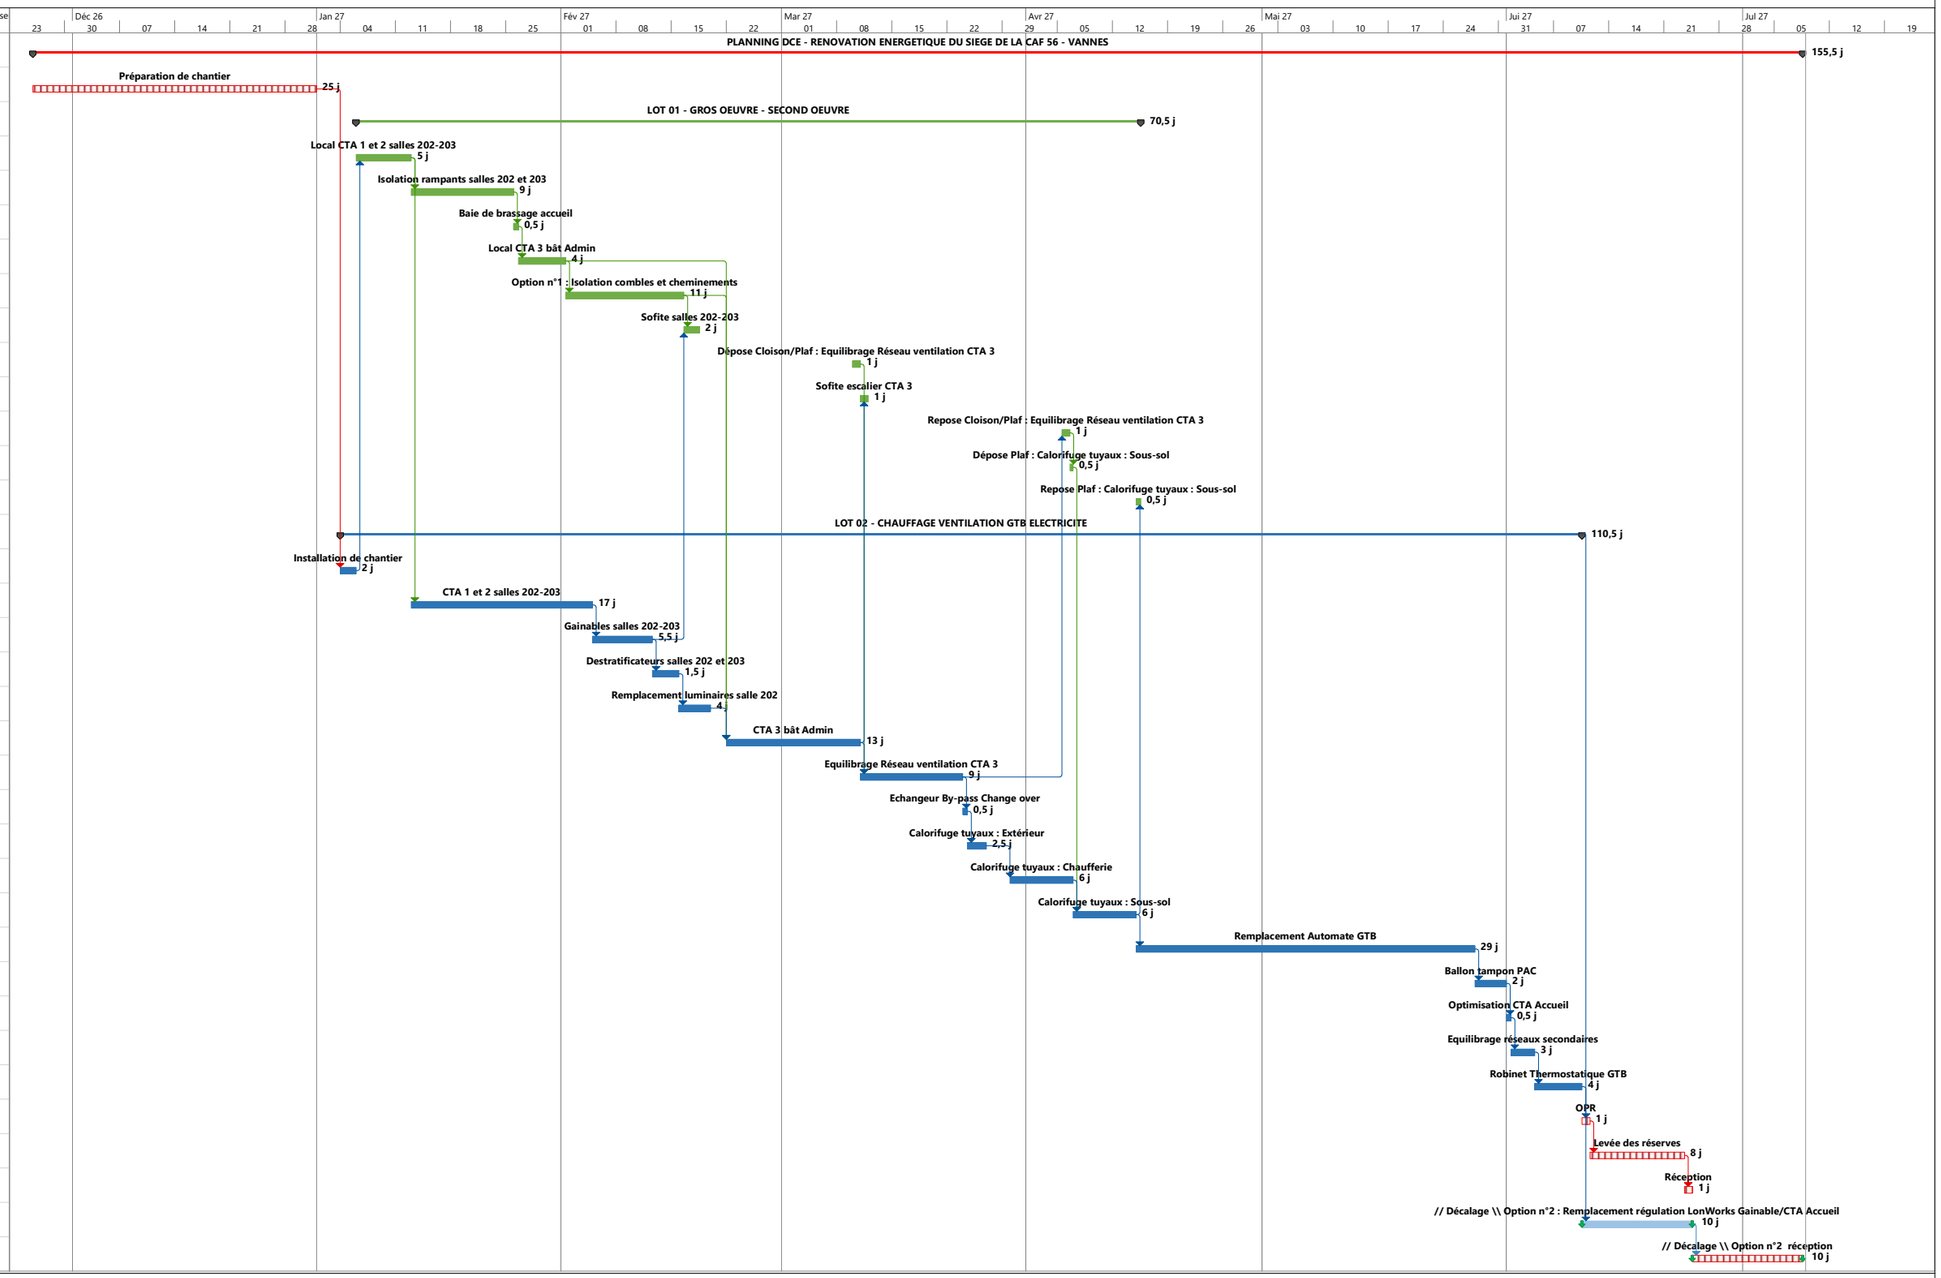

Rénovation énergétique du siège de la CAF 56 - VANNES

19	26	Aoû 27	02	09	16	23	Sep 27	30	06	13	20	27	Oct 27	04	11	18	25	Nov 27	01	08	15	22	Déc 27	29	06	13	20	27	Jan 28	03	10	17	24	Fév 28	31	07	14	21	Mar 28	28	06	13	20	27	Avr 28	03	10	17	24	Mai 28	01	08	15
