
grandparis aménagement — GRAND PARIS SUD AMÉNAGEMENT — ARTELIA

ZAC PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER
PLANNING GENERAL DES TRAVAUX DU SECTEUR _PARC AUX LIEVRES


N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	MOA	Prédécesseurs
1	**SECTEUR PARC AUX LIEVRES**	**153,75 m**	**Lun 02/09/19**	**Ven 13/06/31**		
2	**ETUDES DE MOE ESPACES PUBLICS - SPLA-IN**	**77,75 m**	**Lun 03/07/23**	**Lun 18/06/29**		
3	**Phase 1B (Pôle équipement)**	**12 m**	**Lun 03/07/23**	**Ven 31/05/24**		
4	DCE	4 m	Lun 03/07/23	Ven 20/10/23	SPLA-IN	
5	Consultation travaux	8 m	Lun 23/10/23	Ven 31/05/24	SPLA-IN	4
6	Notification de l'entreprise de travaux	0 m	Ven 31/05/24	Ven 31/05/24	SPLA-IN	5
7	**Phase 1B - Nouveau marché aménagement rues Sand/Nanteuil**	**6 m**	**Mer 01/04/26**	**Mar 15/09/26**	SPLA-IN	
8	PRO/DCE	3 m	Mer 01/04/26	Mar 23/06/26	SPLA-IN	
9	Consultation travaux	3 m	Mer 24/06/26	Mar 15/09/26	SPLA-IN	8
10	Notification de l'entreprise de travaux	0 m	Mar 15/09/26	Mar 15/09/26	SPLA-IN	9
11	**Phase 2A (Pasteur, Debussy, Tassigny)**	**14,1 m**	**Lun 30/09/24**	**Mar 28/10/25**		
12	PRO/DCE	4 m	Lun 30/09/24	Ven 17/01/25	SPLA-IN	
13	Consultation travaux	5 m	Lun 20/01/25	Ven 06/06/25	SPLA-IN	12
14	Notification de l'entreprise de travaux	0 m	Mar 02/09/25	Mar 02/09/25	SPLA-IN	13FD+3,1 m
15	Période de préparation	2 m	Mer 03/09/25	Mar 28/10/25	SPLA-IN	14
16	**Phase 2B (Giratoire Leclerc / D93)**	**16,5 m**	**Lun 07/07/25**	**Ven 09/10/26**		
17	PRO	6 m	Lun 07/07/25	Ven 19/12/25	SPLA-IN	
18	Avis collectivités	2 m	Lun 22/12/25	Ven 13/02/26	SPLA-IN	17
19	DCE	3 m	Lun 16/02/26	Ven 08/05/26	SPLA-IN	18
20	Consultation travaux	5,5 m	Lun 11/05/26	Ven 09/10/26	SPLA-IN	19
21	Notification de l'entreprise travaux	0 m	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26	SPLA-IN	53DF;20
22	**Phase 3**	**21 m**	**Lun 08/11/27**	**Lun 18/06/29**		
23	AVP	5 m	Lun 08/11/27	Lun 27/03/28	SPLA-IN	24DF
24	PRO	4 m	Lun 27/03/28	Lun 17/07/28	SPLA-IN	25DF
25	Avis collectivités	2 m	Lun 17/07/28	Lun 11/09/28	SPLA-IN	26DF
26	DCE	4 m	Lun 11/09/28	Lun 01/01/29	SPLA-IN	27DF
27	Consultation travaux	6 m	Lun 01/01/29	Lun 18/06/29	SPLA-IN	28DF
28	Notification de l'entreprise de travaux	0 m	Lun 18/06/29	Lun 18/06/29	SPLA-IN	214DF
29	**EQUIPEMENTS LA FONTAINE**	**46,6 m**	**Lun 04/09/23**	**Mar 30/03/27**		
30	**Espaces publics phase 1B (pôle équipements) - SPLA-IN**	**36,85 m**	**Lun 03/06/24**	**Mar 30/03/27**		
31	Phase préparatoire	5 m	Lun 03/06/24	Ven 18/10/24	SPLA-IN	6
32	Amorce raccordement giratoire, parking Pagode Est	6,5 m	Lun 21/10/24	Ven 18/04/25	SPLA-IN	31
33	GC réseau télécom rues Nanteuil, Sand et Chopin	1 m	Lun 03/02/25	Ven 28/02/25	SPLA-IN	
34	Parking Pagode Ouest	2,5 m	Lun 21/04/25	Ven 27/06/25	SPLA-IN	32
35	Réaménagement Mauriac Sud et imp Satie	2 m	Lun 30/06/25	Ven 22/08/25	SPLA-IN	34
36	Réaménagement rue Mauriac Nord	2,5 m	Lun 13/10/25	Ven 19/12/25	SPLA-IN	
37	Aménagement rue Chopin	1,5 m	Lun 22/12/25	Ven 30/01/26	SPLA-IN	36
38	Période de préparation	1 m	Mer 16/09/26	Mar 13/10/26	SPLA-IN	10
39	Assainissement + aménagement rues Nanteuil/Sand	6 m	Mer 14/10/26	Mar 30/03/27	SPLA-IN	38;45
40	**Rénovation - restructuration GS La Fontaine Mauriac - Ville d'Evry-Courcouronnes**	**31,3 m**	**Lun 04/09/23**	**Lun 26/01/26**		
41	Travaux rénovation Mauriac	13 m	Lun 04/09/23	Ven 30/08/24	Ville	
42	Dépose modulaires	3 jrs	Lun 25/08/25	Mer 27/08/25	Ville	
43	Désamiantage logement/restaurant	3 m	Mar 01/07/25	Lun 22/09/25	Ville	
44	Démolition logement/restaurant	1,5 m	Mar 23/09/25	Lun 03/11/25	Ville	43
45	Aménagements extérieurs	3 m	Mar 04/11/25	Lun 26/01/26	Ville	44
46	**JEAN MOULIN / SAINT-EXUPERY**	**41,25 m**	**Lun 06/01/25**	**Ven 03/03/28**		
47	**Résidentialisation tranche 1 (Saint-Exupéry - Jean Moulin) - Essonne Habitat (planning à confirmer EH)**	**41,25 m**	**Lun 06/01/25**	**Ven 03/03/28**		
48	Concertation	12 m	Lun 06/01/25	Ven 05/12/25	EH	
49	Etudes et conception	12 m	Lun 02/06/25	Ven 01/05/26	EH	
50	Marchés travaux	6 m	Lun 04/05/26	Ven 16/10/26	EH	49
51	Travaux de résidentialisation tranche 1	18 m	Lun 19/10/26	Ven 03/03/28	EH	50
52	**Espaces publics phase 2B (giratoire Leclerc / D93) - SPLA-IN**	**8 m**	**Lun 21/09/26**	**Ven 30/04/27**		
53	Période de préparation	2 m	Lun 21/09/26	Lun 16/11/26	SPLA-IN	54DF
54	Travaux giratoire	6 m	Lun 16/11/26	Ven 30/04/27	SPLA-IN	82FD+1 m
55	Mise en service nouvelle branche du giratoire	0 m	Ven 30/04/27	Ven 30/04/27	SPLA-IN	54
56	**LES PLACETTES**	**117,3 m**	**Lun 02/09/19**	**Lun 28/08/28**		
58	**Réhabilitation les Placettes - Essonne Habitat**	**51,55 m**	**Lun 01/05/23**	**Lun 12/04/27**		
59	Travaux de réhabilitation - tranches 3/4	12 m	Lun 01/05/23	Ven 29/03/24	EH	
60	Travaux de réhabilitation - tranche 2 (planning à confirmer EH)	8 m	Mar 01/09/26	Lun 12/04/27	EH	59;75
61	**Résidentialisation Les Placettes - Essonne Habitat**	**18 m**	**Mar 13/04/27**	**Lun 28/08/28**		

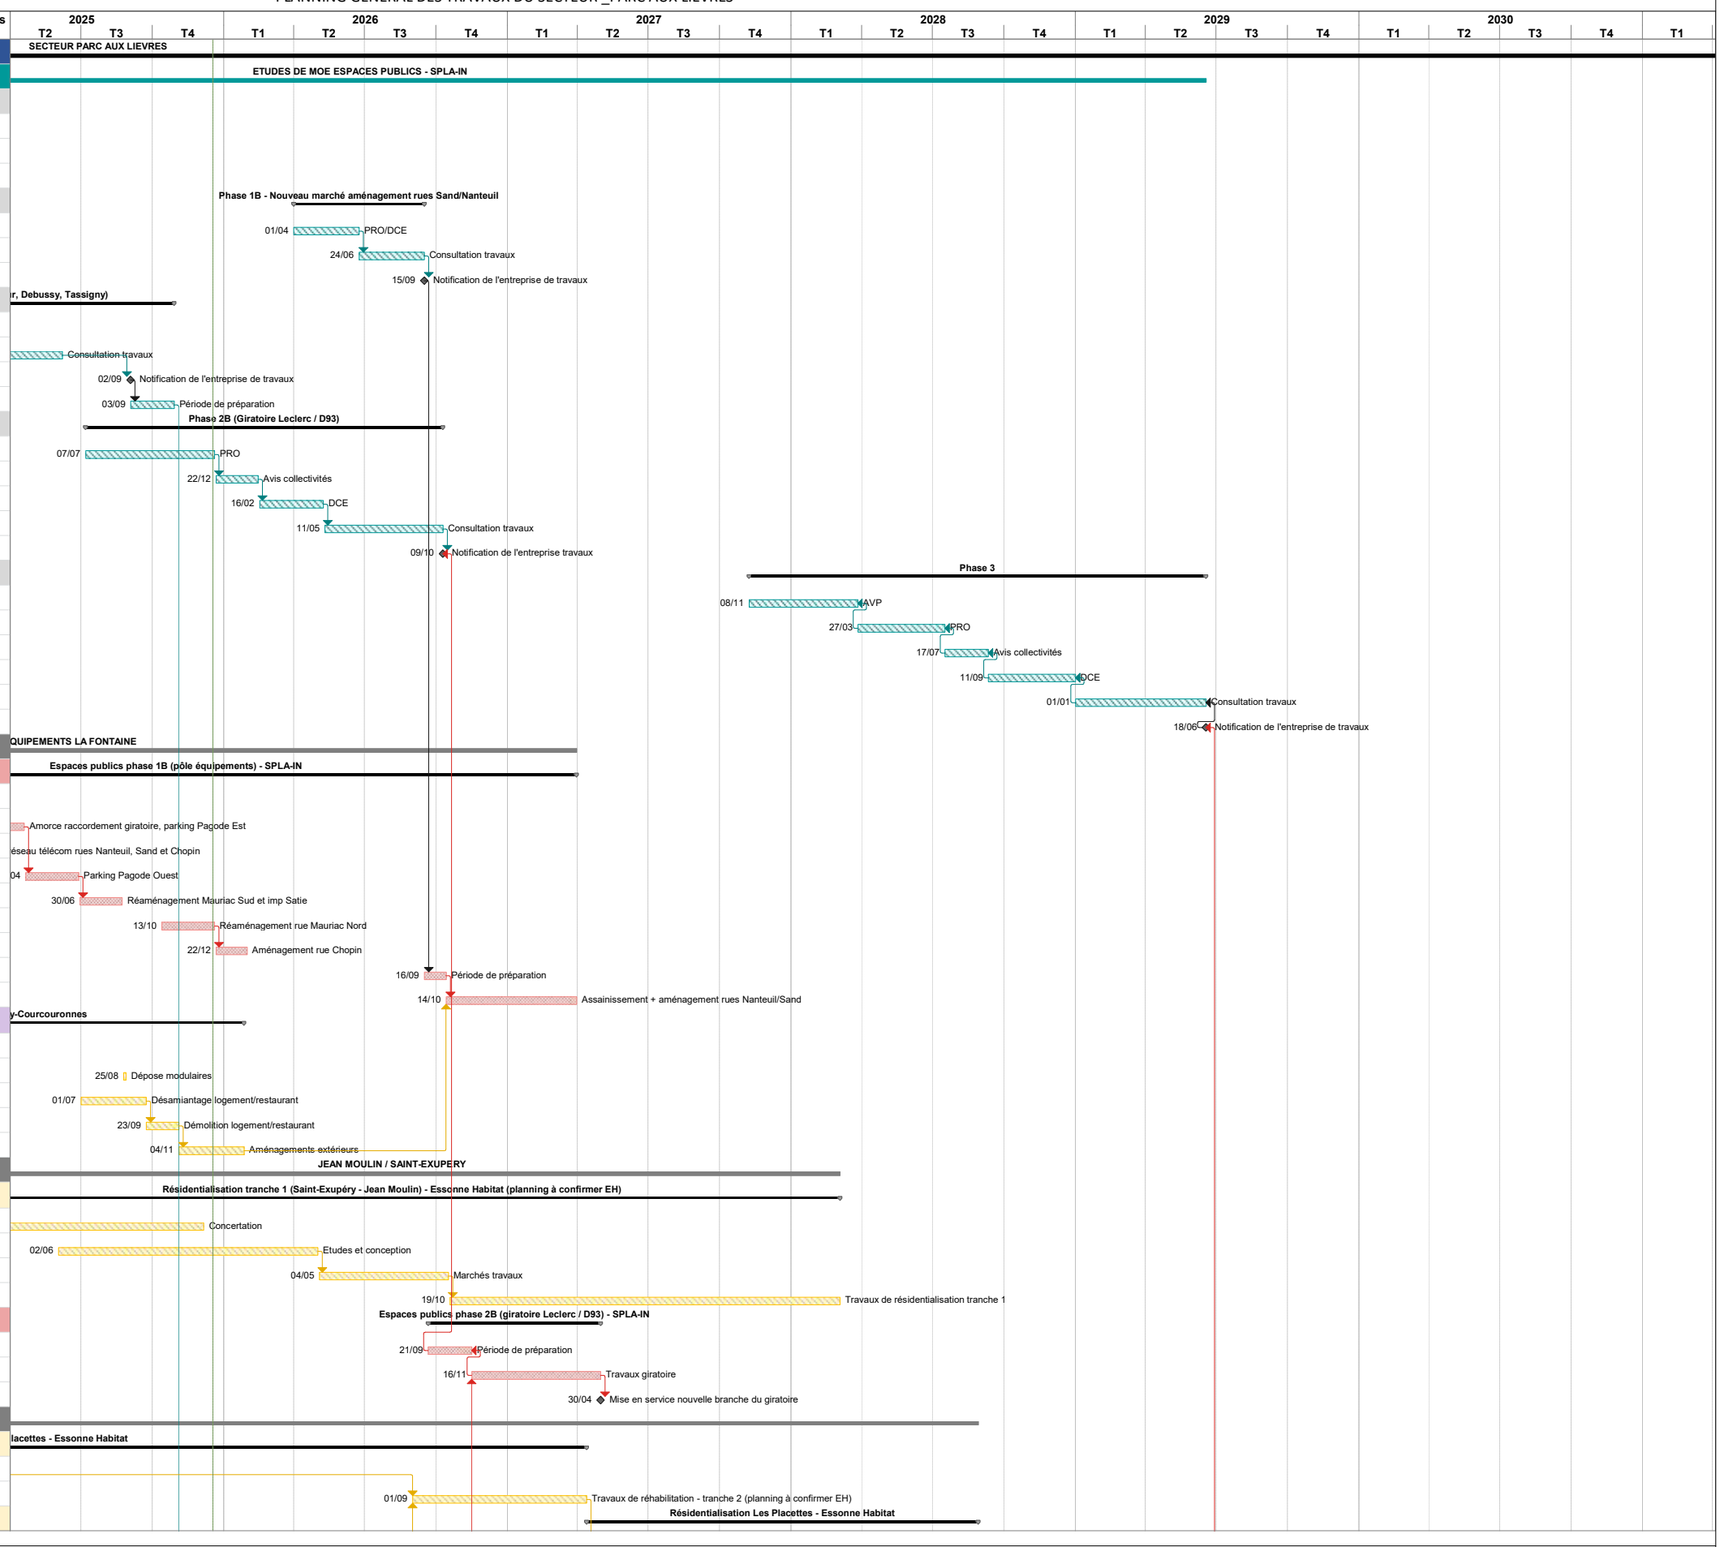

PROCEDURES — ETUDES — TRAVAUX LOTS — TRAVAUX INFRA/VRD — TRAVAUX SPLA-IN

V16 du 18/12/2025

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	MOA	Prédécesseurs
62	Travaux de résidentialisation - tranche 2	18 m	Mar 13/04/27	Lun 28/08/28	EH	60
63	**LES TOURS / PARVIS**	**98,4 m**	**Lun 09/10/23**	**Mer 23/04/31**		
64	**Démolition les Tours / Dalle / Parvis- Essonne Habitat (planning à confirmer EH)**	**33 m**	**Lun 09/10/23**	**Ven 17/04/26**		
65	Période appel offre suite mise en demeure entreprise	6 m	Lun 09/10/23	Ven 22/03/24	EH	
66	OS Travaux	0 jr	Ven 22/03/24	Ven 22/03/24	EH	65
67	Période de préparation	3,5 m	Lun 25/03/24	Ven 28/06/24	EH	66
68	Travaux de démolition dalle - Fermerture Bd du Maréchal Leclerc	1 m	Lun 29/07/24	Ven 23/08/24	EH	67FD+1 mé
69	Curage/Désamiantage/Démolition Tranche 1 (zone Est)	15 m	Lun 26/08/24	Ven 17/10/25	EH	68
70	Préparation et concassage des béton in-situ	5,5 m	Lun 18/08/25	Ven 16/01/26	EH	
71	Démolition mur Bd + pose clôtures chantier	2 sem.	Lun 17/11/25	Ven 28/11/25	EH	
72	Livraison Tranche 1	10 jrs	Lun 19/01/26	Ven 30/01/26	EH	70
73	Abandon poste GITE (date à affiner par ENEDIS)	1 sem.	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26	EH	
74	Curage/Désamiantage/Démolition Tranche 2 (zone Ouest)	12 m	Lun 07/04/25	Ven 06/03/26	EH	
75	Talutage + repli chantier	2,5 m	Lun 09/02/26	Ven 17/04/26	EH	74FD-1 m
76	**Espaces publics phase 2A - SPLA-IN**	**12,65 m**	**Mer 29/10/25**	**Ven 16/10/26**		
77	Installation base-vie et enrobés provisoires	1 m	Mer 29/10/25	Mar 25/11/25	SPLA-IN	15
78	Phase 1 : Travaux réseaux et voirie Bd Tassigny Ouest + Bd Leclerc Est + rue Debussy	3,5 m	Lun 01/12/25	Ven 06/03/26	SPLA-IN	77;71
79	Phase 2A : Travaux réseaux et voirie Bd Leclerc + rue Debussy / Réalisation rue Pasteur / Démolition Bd Tassigny Est + réalisation parvis pharmacie	2 m	Lun 09/03/26	Ven 01/05/26	SPLA-IN	78
80	Phase 2B : Démolition Bd Leclerc Ouest / Réalisation rue Pasteur / Démolition Bd Tassigny Est + réalisation parvis pharmacie / Réalisation rue Chopin	3 m	Lun 04/05/26	Ven 24/07/26	SPLA-IN	79
81	Phase 3 : Démolition Bd Leclerc Ouest / Réalisation rue Chopin	3 m	Lun 27/07/26	Ven 16/10/26	SPLA-IN	80
82	Phase 4 : Réalisation tapis définitifs carrefours	1 sem.	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26	SPLA-IN	81FF
83	TO : Travaux provisoires allées Est et Ouest	7 m	Lun 06/04/26	Ven 16/10/26	SPLA-IN	81FF
84	**Lot D3 - AFL**	**53,25 m**	**Mer 01/07/26**	**Mar 30/07/30**		
85	Mise au point du dossier de consultation et projet de CPI	3 m	Mer 01/07/26	Mar 22/09/26		
86	Consultation d'opérateurs immobiliers	3 m	Mer 23/09/26	Mar 15/12/26		85
87	Analyse des candidatures et sélection des candidats	2 m	Mer 16/12/26	Mar 09/02/27		86
88	Consultation des candidats - Phase offres n°1	3 m	Mer 10/02/27	Mar 04/05/27		87
89	Analyse des offres n°1	1 m	Mer 05/05/27	Mar 01/06/27		88
90	Auditions et négociations	1 sem.	Mer 02/06/27	Mar 08/06/27		89
91	Consultation des candidats - Phase offres n°2	2 m	Mer 09/06/27	Mar 03/08/27		90
92	Analyse des offres n°2	1 m	Mer 04/08/27	Mar 31/08/27		91
93	Sélection de l'opérateur et signature CPI	0 m	Mar 31/08/27	Mar 31/08/27		92
94	Etudes / Elaboration PC	7 m	Mer 01/09/27	Mar 14/03/28		93
95	Mise au point PUV	4 m	Mer 24/11/27	Mar 14/03/28		94FF
96	Signature PUV	0 m	Mar 28/03/28	Mar 28/03/28		95FD+2 sem.
97	Dépôt PC	0 m	Mar 11/04/28	Mar 11/04/28		96FD+10 jrs
98	Instruction PC	5 m	Mer 12/04/28	Mar 29/08/28		97
99	Obtention PC	0 m	Mar 29/08/28	Mar 29/08/28		98
100	Affichage PC	0 m	Mar 12/09/28	Mar 12/09/28		98FD+2 sem.
101	Délais recours	2 m	Mer 13/09/28	Mar 07/11/28		100
102	Délai de retrait éventuel du PC	3 m	Mer 30/08/28	Mar 21/11/28		99
103	PC purgé	0 m	Mar 21/11/28	Mar 21/11/28		101;102
104	Commercialisation	6 m	Mer 22/11/28	Mar 08/05/29		103
105	Signature Acte de Vente	0 m	Mar 21/11/28	Mar 21/11/28		103
106	Construction lot D3	18 m	Mer 14/03/29	Mar 30/07/30		103;105FD+4 m
107	**Espaces publics phase 2A - Abords lot D3 - SPLA-IN**	**4 m**	**Mer 10/04/30**	**Mar 30/07/30**		
108	Raccordement réseaux + aménagements définitifs abords	4 m	Mer 10/04/30	Mar 30/07/30	SPLA-IN	106FF
109	**Lot B2B - AFL**	**53 m**	**Jeu 01/04/27**	**Mer 23/04/31**		
110	Mise au point du dossier de consultation et projet de CPI	3 m	Jeu 01/04/27	Mer 23/06/27		
111	Consultation d'opérateurs immobiliers	3 m	Jeu 24/06/27	Mer 15/09/27		110
112	Analyse des candidatures et sélection des candidats	2 m	Jeu 16/09/27	Mer 10/11/27		111
113	Consultation des candidats - Phase offres n°1	3 m	Jeu 11/11/27	Mer 02/02/28		112
114	Analyse des offres n°1	1 m	Jeu 03/02/28	Mer 01/03/28		113
115	Auditions et négociations	1 sem.	Jeu 02/03/28	Mer 08/03/28		114
116	Consultation des candidats - Phase offres n°2	2 m	Jeu 09/03/28	Mer 03/05/28		115
117	Analyse des offres n°2	1 m	Jeu 04/05/28	Mer 31/05/28		116
118	Sélection de l'opérateur et signature CPI	0 m	Mer 31/05/28	Mer 31/05/28		117
119	Etudes / Elaboration PC	7 m	Jeu 01/06/28	Mer 13/12/28		118
120	Mise au point PUV	4 m	Jeu 24/08/28	Mer 13/12/28		119FF

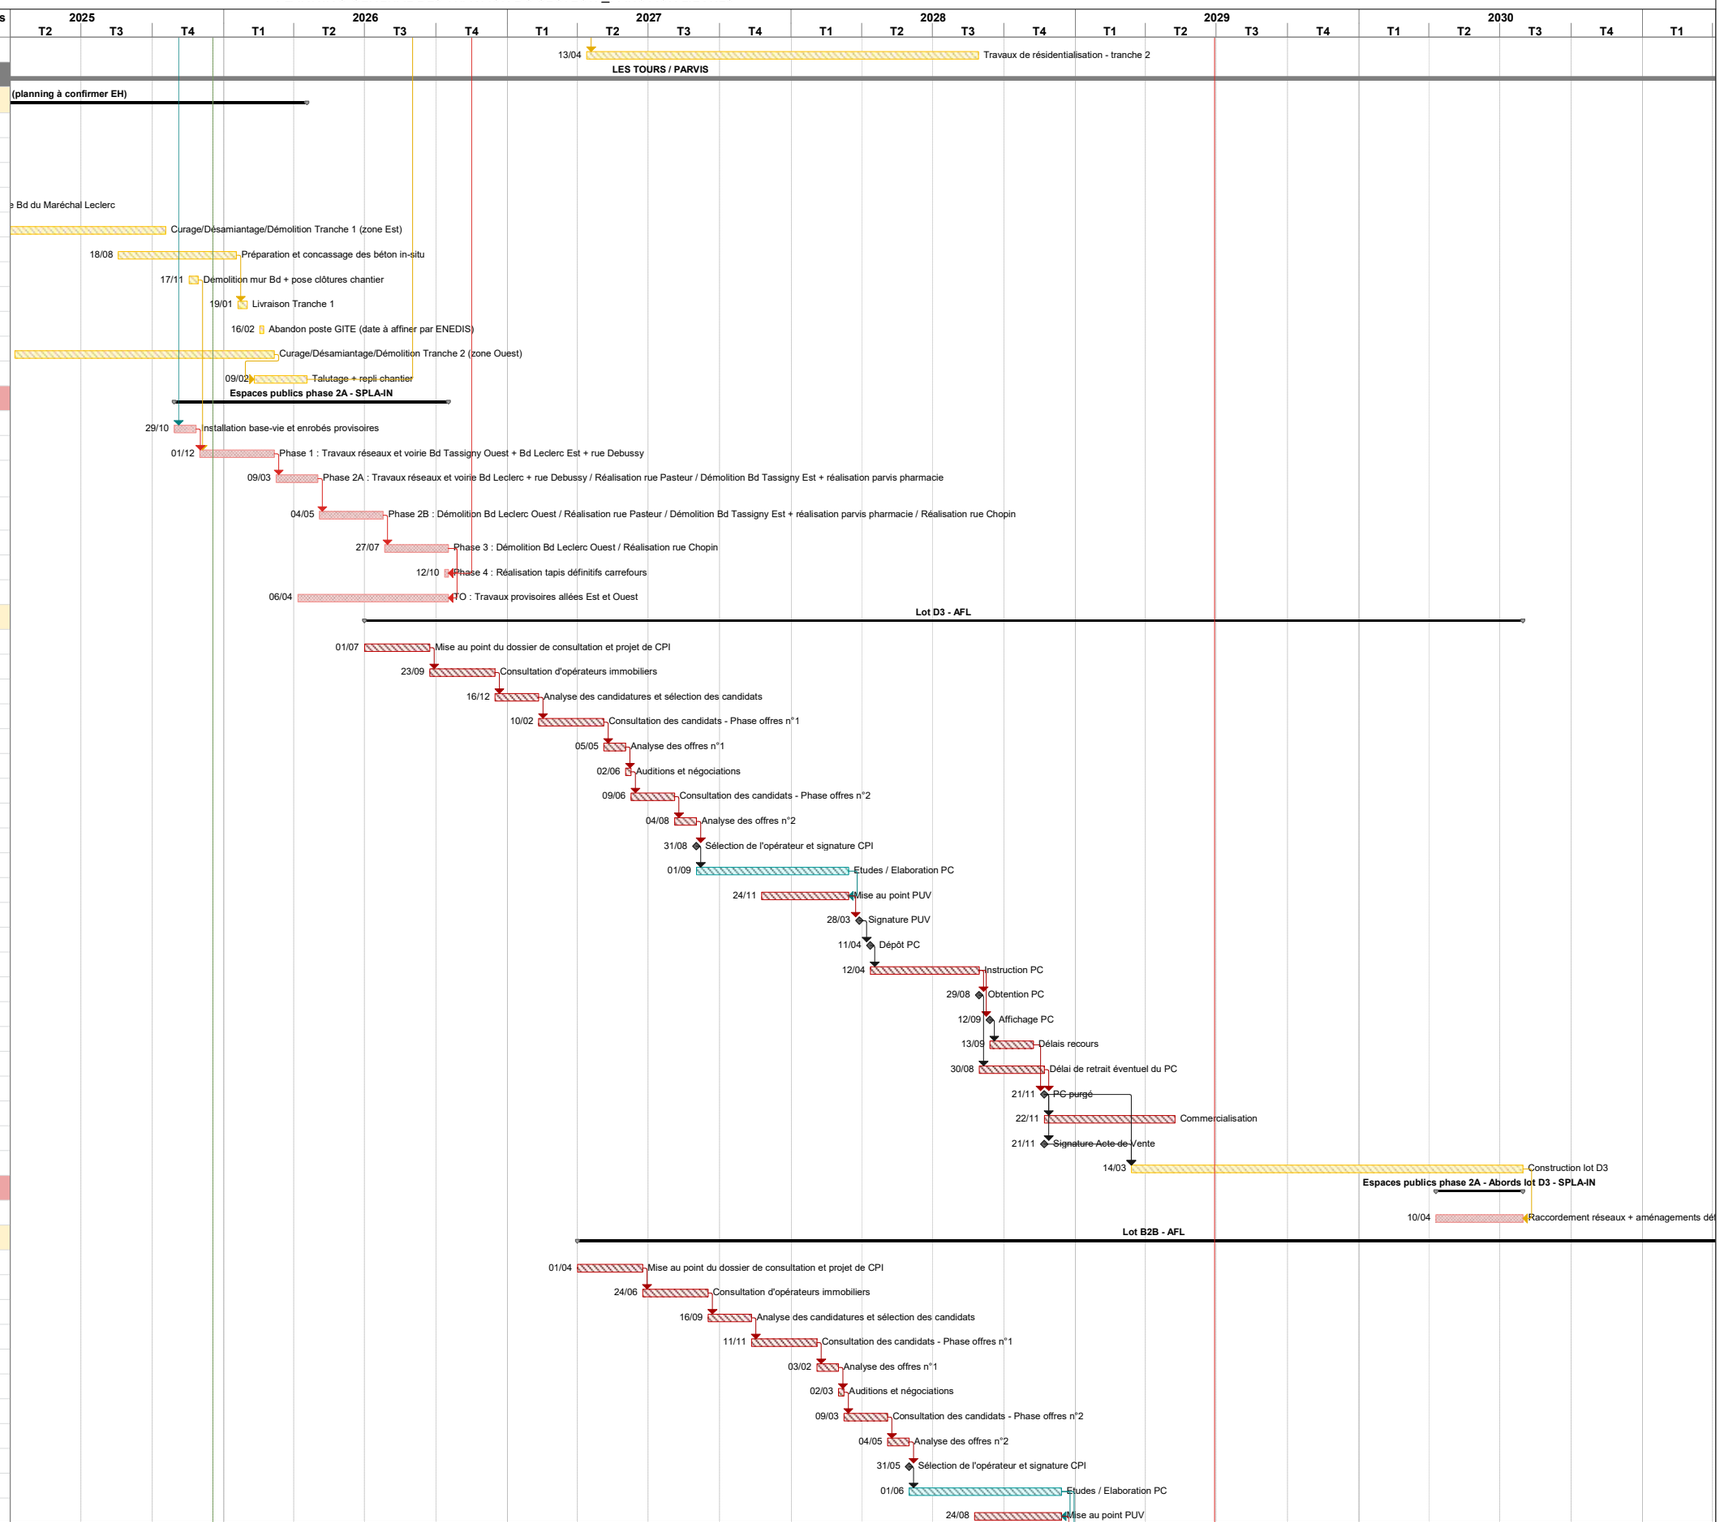


PROCEDURES | ETUDES | TRAVAUX LOTS | TRAVAUX INFRA/VRD | TRAVAUX SPLA-IN

grandparis aménagement — GRAND PARIS SUD AMÉNAGEMENT

ZAC PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER
PLANNING GENERAL DES TRAVAUX DU SECTEUR _PARC AUX LIEVRES

ARTELIA

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	MOA	Prédécesseurs
121	Signature PUV	0 m	Mer 27/12/28	Mer 27/12/28		120FD+2 sem.
122	Dépôt PC	0 m	Mer 03/01/29	Mer 03/01/29		119FD+3 sem.
123	Instruction PC	5 m	Jeu 04/01/29	Mer 23/05/29		122
124	Obtention PC	0 m	Mer 23/05/29	Mer 23/05/29		123
125	Affichage PC	0 m	Mer 06/06/29	Mer 06/06/29		123FD+2 sem.
126	Délais recours	2 m	Jeu 07/06/29	Mer 01/08/29		125
127	Délai de retrait éventuel du PC	3 m	Jeu 24/05/29	Mer 15/08/29		124
128	PC purgé	0 m	Mer 15/08/29	Mer 15/08/29		126;127
129	Commercialisation	6 m	Jeu 16/08/29	Mer 30/01/30		128
130	Signature Acte de Vente	0 m	Mer 15/08/29	Mer 15/08/29		128
131	Construction lot B2B	18 m	Jeu 06/12/29	Mer 23/04/31		128;130FD+4 m
132	**Espaces publics phase 2A - Abords lots B2B - SPLA-IN**	**6 m**	**Jeu 07/11/30**	**Mer 23/04/31**		
133	Raccordement réseaux + aménagements définitifs abords	6 m	Jeu 07/11/30	Mer 23/04/31	SPLA-IN	131FF
134	**Lots B2A / B3**	**46,9 m**	**Lun 23/12/24**	**Mer 26/07/28**		
135	**Etudes / Marché**	**14 m**	**Lun 23/12/24**	**Ven 16/01/26**		
136	Consultation promoteur	2 m	Lun 23/12/24	Ven 14/02/25		
137	Analyse offres	2 m	Lun 17/02/25	Ven 11/04/25		136
138	Désignation promoteur	0 m	Ven 11/04/25	Ven 11/04/25		137
139	Etudes promoteur / Elaboration PC	10 m	Lun 14/04/25	Ven 16/01/26		138
140	Signature Promesse de Vente	0 m	Lun 22/12/25	Lun 22/12/25		
141	**PC**	**8 m**	**Ven 02/01/26**	**Ven 14/08/26**		
142	Dépôt PC	0 m	Ven 02/01/26	Ven 02/01/26		140FD+10 jrs
143	Instruction PC	5 m	Lun 05/01/26	Ven 22/05/26		142
144	Obtention PC	0 m	Ven 22/05/26	Ven 22/05/26		143
145	Délais recours	3 m	Lun 25/05/26	Ven 14/08/26		144
146	PC purgé	0 m	Ven 14/08/26	Ven 14/08/26		145
147	Commercialisation	6 m	Lun 17/08/26	Ven 29/01/27		146
148	Signature Acte de Vente	0 m	Jeu 17/12/26	Jeu 17/12/26		140FD+12 mé;146
149	Construction lots B2A / B3	20 m	Jeu 14/01/27	Mer 26/07/28		146;148FD+1 m
150	**Lot B4**	**47,25 m**	**Lun 20/01/25**	**Ven 01/09/28**		
151	**Etudes / Marché**	**14 m**	**Lun 20/01/25**	**Ven 13/02/26**		
152	Consultation promoteur	2 m	Lun 20/01/25	Ven 14/03/25		
153	Analyse offres	2 m	Lun 17/03/25	Ven 09/05/25		152
154	Désignation promoteur	0 m	Ven 09/05/25	Ven 09/05/25		153
155	Etudes promoteur / Elaboration PC	10 m	Lun 12/05/25	Ven 13/02/26		154
156	Signature Promesse de Vente	0 m	Ven 30/01/26	Ven 30/01/26		
157	**PC**	**8 m**	**Jeu 12/02/26**	**Jeu 24/09/26**		
158	Dépôt PC	0 m	Jeu 12/02/26	Jeu 12/02/26		156FD+10 jrs
159	Instruction PC	5 m	Ven 13/02/26	Jeu 02/07/26		158
160	Obtention PC	0 m	Jeu 02/07/26	Jeu 02/07/26		159
161	Délais recours	3 m	Ven 03/07/26	Jeu 24/09/26		160
162	PC purgé	0 m	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26		161
163	Commercialisation	6 m	Ven 25/09/26	Jeu 11/03/27		162
164	Signature Acte de Vente	0 m	Lun 25/01/27	Lun 25/01/27		162;156FD+12 mé
165	Construction lot B4	20 m	Lun 22/02/27	Ven 01/09/28		162;164FD+1 m
166	**Espaces publics phase 2A - Abords lots B2A / B3 / B4 - SPLA-IN**	**6 m**	**Lun 20/03/28**	**Ven 01/09/28**		
167	Raccordement réseaux + aménagements définitifs abords	6 m	Lun 20/03/28	Ven 01/09/28	SPLA-IN	149FF;165FF
168	**Lots B1A / B1B**	**43 m**	**Lun 16/02/26**	**Ven 01/06/29**		
169	**Etudes / Marché**	**11 m**	**Lun 16/02/26**	**Ven 18/12/26**		
170	Consultation promoteur	2 m	Lun 16/02/26	Ven 10/04/26		
171	Analyse offres	2 m	Lun 13/04/26	Ven 05/06/26		170
172	Désignation promoteur	0 m	Ven 05/06/26	Ven 05/06/26		171
173	Etudes promoteur / Elaboration PC	7 m	Lun 08/06/26	Ven 18/12/26		172
174	VEFA places de stationnement EH + signature PV	0 m	Mar 30/06/26	Mar 30/06/26		
175	**PC**	**8 m**	**Ven 18/12/26**	**Ven 30/07/27**		
176	Dépôt PC	0 m	Ven 18/12/26	Ven 18/12/26		173
177	Instruction PC	5 m	Lun 21/12/26	Ven 07/05/27		176
178	Obtention PC	0 m	Ven 07/05/27	Ven 07/05/27		177
179	Délais recours	3 m	Lun 10/05/27	Ven 30/07/27		178
180	PC purgé	0 m	Ven 30/07/27	Ven 30/07/27		179

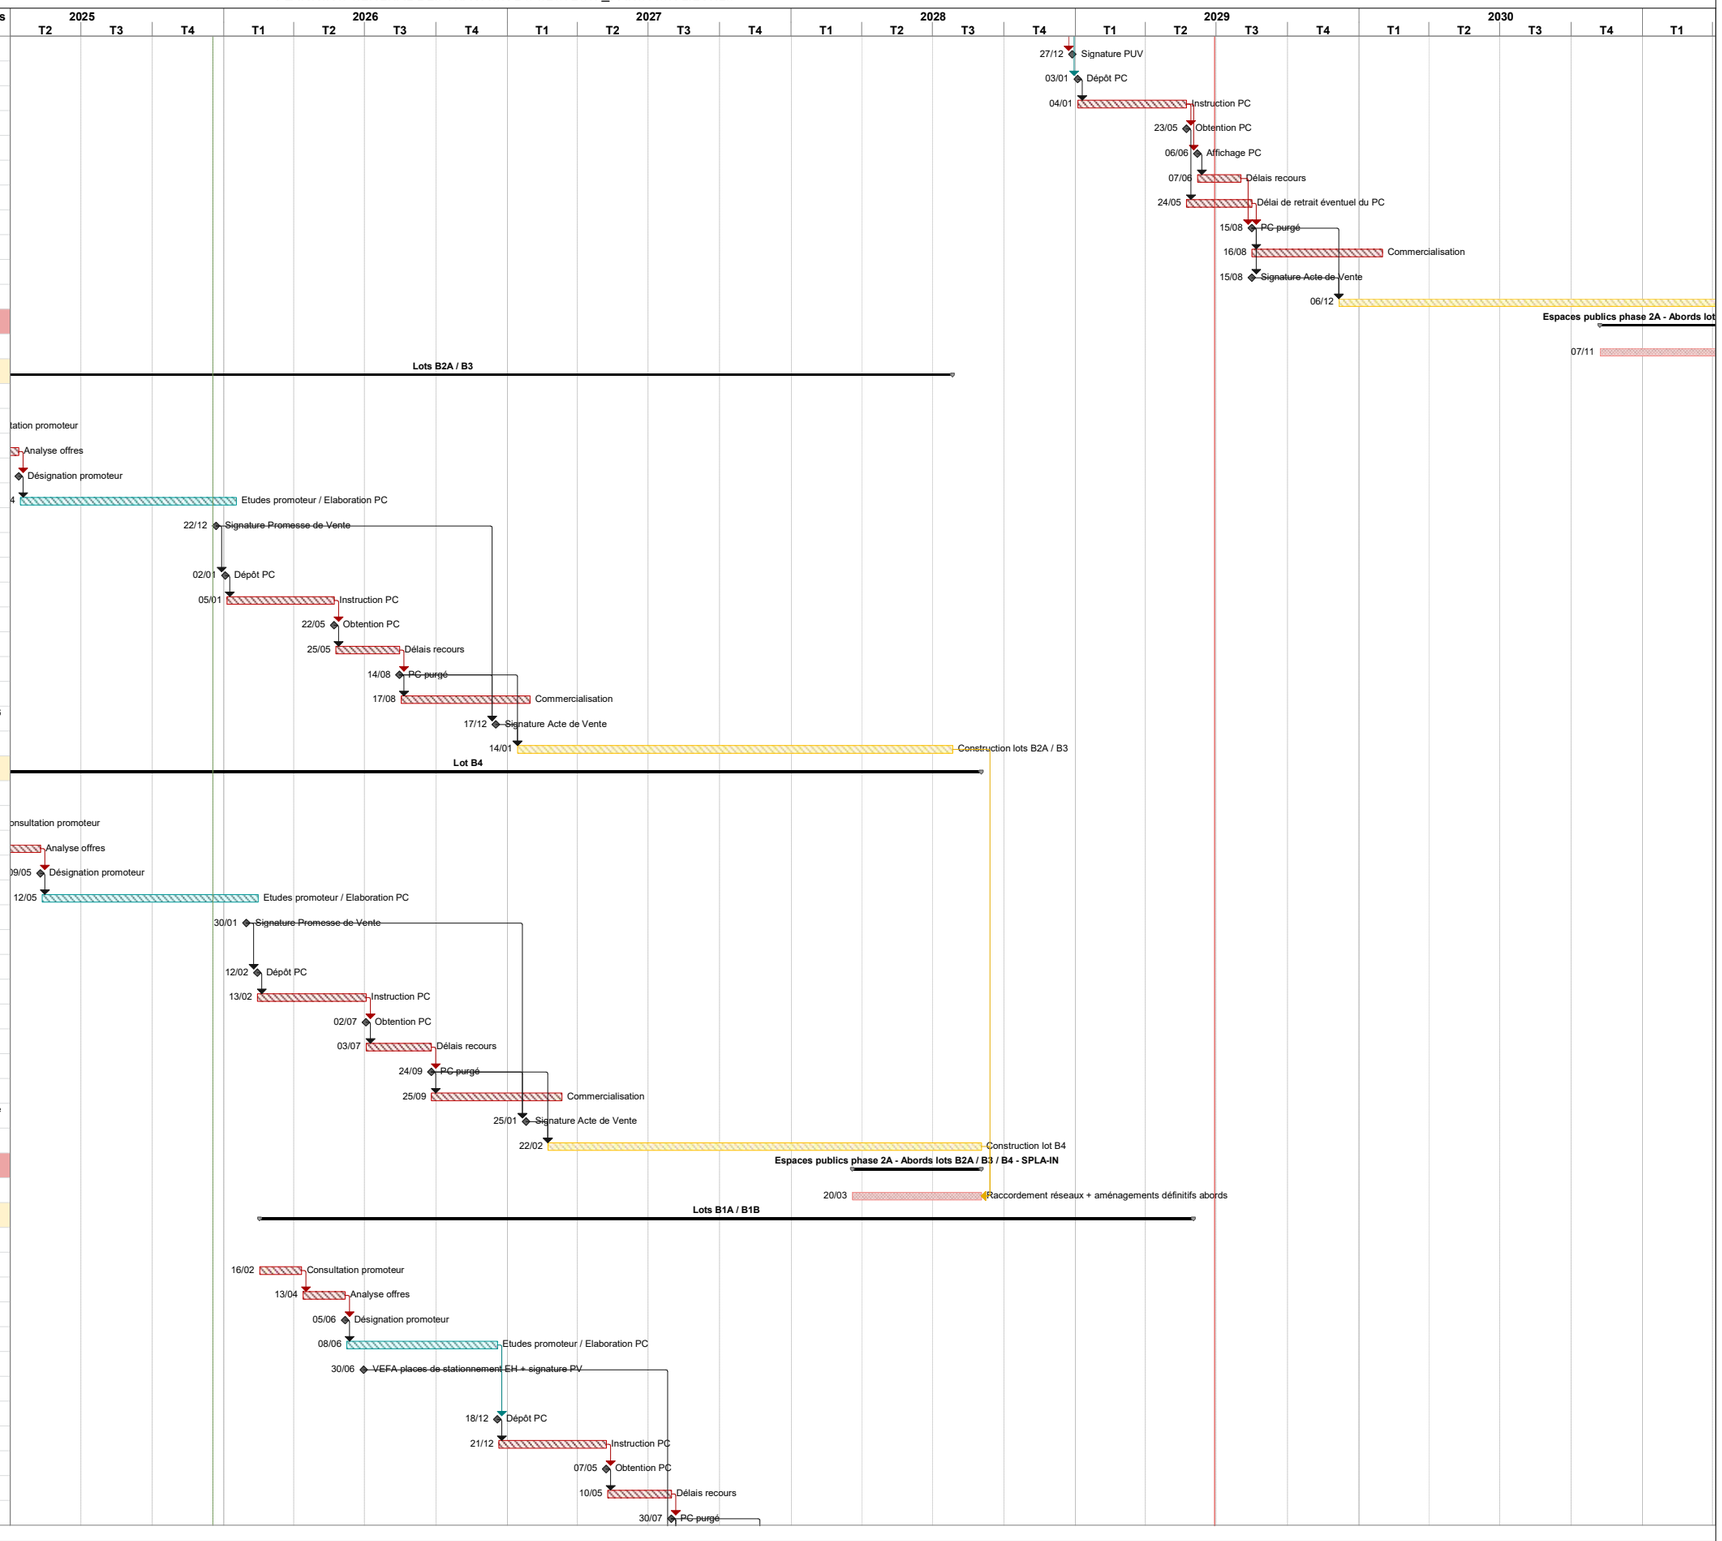


PROCEDURES ETUDES TRAVAUX LOTS TRAVAUX INFRA/VRD TRAVAUX SPLA-IN

V16 du 18/12/2025

ZAC PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER

PLANNING GENERAL DES TRAVAUX DU SECTEUR _PARC AUX LIEVRES

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	MOA	Prédécesseurs
181	Commercialisation	6 m	Lun 02/08/27	Ven 14/01/28		180
182	Signature Acte de Vente	0 m	Ven 30/07/27	Ven 30/07/27		180;174FD+12 mé
183	Construction lots B1A / B1B	20 m	Lun 22/11/27	Ven 01/06/29		180;182FD+4 m
184	**Espaces publics phase 2A - Abords lots B1A / B1B - SPLA-IN**	**6 m**	**Lun 18/12/28**	**Ven 01/06/29**		
185	Raccordement réseaux + aménagements définitifs abords	6 m	Lun 18/12/28	Ven 01/06/29	SPLA-IN	183FF
186	**MOUSSEAU / RIG**	**53,25 m**	**Lun 10/02/25**	**Ven 09/03/29**		
187	**Lot D2B - AFL**	**53,25 m**	**Lun 10/02/25**	**Ven 09/03/29**		
188	Mise au point du dossier de consultation et projet de CPI	3 m	Lun 10/02/25	Ven 02/05/25		
189	Consultation d'opérateurs immobiliers	3 m	Lun 05/05/25	Ven 25/07/25		188
190	Analyse des candidatures et sélection des candidats	2 m	Lun 28/07/25	Ven 19/09/25		189
191	Consultation des candidats - Phase offres n°1	3 m	Lun 22/09/25	Ven 12/12/25		190
192	Analyse des offres n°1	1 m	Lun 15/12/25	Ven 09/01/26		191
193	Auditions et négociations	1 sem.	Lun 12/01/26	Ven 16/01/26		192
194	Consultation des candidats - Phase offres n°2	2 m	Lun 19/01/26	Ven 13/03/26		193
195	Analyse des offres n°2	1 m	Lun 16/03/26	Ven 10/04/26		194
196	Sélection de l'opérateur et signature CPI	0 m	Ven 10/04/26	Ven 10/04/26		195
197	Etudes / Elaboration PC	7 m	Lun 13/04/26	Ven 23/10/26		196
198	Mise au point PUV	4 m	Lun 06/07/26	Ven 23/10/26		197FF
199	Signature PUV	0 m	Ven 06/11/26	Ven 06/11/26		198FD+2 sem.
200	Dépôt PC	0 m	Ven 20/11/26	Ven 20/11/26		199FD+10 jrs
201	Instruction PC	5 m	Lun 23/11/26	Ven 09/04/27		200
202	Obtention PC	0 m	Ven 09/04/27	Ven 09/04/27		201
203	Affichage PC	0 m	Ven 23/04/27	Ven 23/04/27		201FD+2 sem.
204	Délais recours	2 m	Lun 26/04/27	Ven 18/06/27		203
205	Délai de retrait éventuel du PC	3 m	Lun 12/04/27	Ven 02/07/27		202
206	PC purgé	0 m	Ven 02/07/27	Ven 02/07/27		204;205
207	Commercialisation	6 m	Lun 05/07/27	Ven 17/12/27		206
208	Signature Acte de Vente	0 m	Ven 02/07/27	Ven 02/07/27		206
209	Construction lot D2B	18 m	Lun 25/10/27	Ven 09/03/29		206;208FD+4 m
210	**Espaces publics phase 2A - Abords lot D2B - SPLA-IN**	**4 m**	**Lun 20/11/28**	**Ven 09/03/29**		
211	Raccordement réseaux + aménagements définitifs abords	4 m	Lun 20/11/28	Ven 09/03/29	SPLA-IN	209FF
212	**LOT G**	**55,25 m**	**Lun 22/03/27**	**Ven 13/06/31**		
213	**Espaces publics phase 3 - Debussy / Pasteur - SPLA-IN**	**6 m**	**Lun 18/06/29**	**Lun 03/12/29**		
214	Aménagement Debussy + Pasteur (dévoiement réseaux, voirie provisoire, réhab assainissement)	6 m	Lun 18/06/29	Lun 03/12/29	SPLA-IN	237DF
215	**Lot G - SEQUENS**	**55,25 m**	**Lun 22/03/27**	**Ven 13/06/31**		
216	Mise au point du dossier de consultation et projet de CPI	3 m	Lun 22/03/27	Ven 11/06/27		
217	Consultation d'opérateurs immobiliers	3 m	Lun 14/06/27	Ven 03/09/27		216
218	Analyse des candidatures et sélection des candidats	2 m	Lun 06/09/27	Ven 29/10/27		217
219	Consultation des candidats - Phase offres n°1	3 m	Lun 01/11/27	Ven 21/01/28		218
220	Analyse des offres n°1	1 m	Lun 24/01/28	Ven 18/02/28		219
221	Auditions et négociations	1 sem.	Lun 21/02/28	Ven 25/02/28		220
222	Consultation des candidats - Phase offres n°2	2 m	Lun 28/02/28	Ven 21/04/28		221
223	Analyse des offres n°2	1 m	Lun 24/04/28	Ven 19/05/28		222
224	Sélection de l'opérateur et signature CPI	0 m	Ven 19/05/28	Ven 19/05/28		223
225	Etudes / Elaboration PC	7 m	Lun 22/05/28	Ven 01/12/28		224
226	Mise au point PUV	4 m	Lun 14/08/28	Ven 01/12/28		225FF
227	Signature PUV	0 m	Ven 15/12/28	Ven 15/12/28		226FD+2 sem.
228	Dépôt PC	0 m	Ven 29/12/28	Ven 29/12/28		227FD+10 jrs
229	Instruction PC	5 m	Lun 01/01/29	Ven 18/05/29		228
230	Obtention PC	0 m	Ven 18/05/29	Ven 18/05/29		229
231	Affichage PC	0 m	Ven 01/06/29	Ven 01/06/29		229FD+2 sem.
232	Délais recours	2 m	Lun 04/06/29	Ven 27/07/29		231
233	Délai de retrait éventuel du PC	3 m	Lun 21/05/29	Ven 10/08/29		230
234	PC purgé	0 m	Ven 10/08/29	Ven 10/08/29		232;233
235	Commercialisation	6 m	Lun 13/08/29	Ven 25/01/30		234
236	Signature Acte de Vente	0 m	Ven 10/08/29	Ven 10/08/29		234
237	Construction lot G	20 m	Lun 03/12/29	Ven 13/06/31		236FD+4 m
238	**Espaces publics phase 3 - Abords lot G - SPLA-IN**	**6 m**	**Lun 30/12/30**	**Ven 13/06/31**		
239	Raccordement réseaux + aménagements définitifs abords	6 m	Lun 30/12/30	Ven 13/06/31	SPLA-IN	237FF

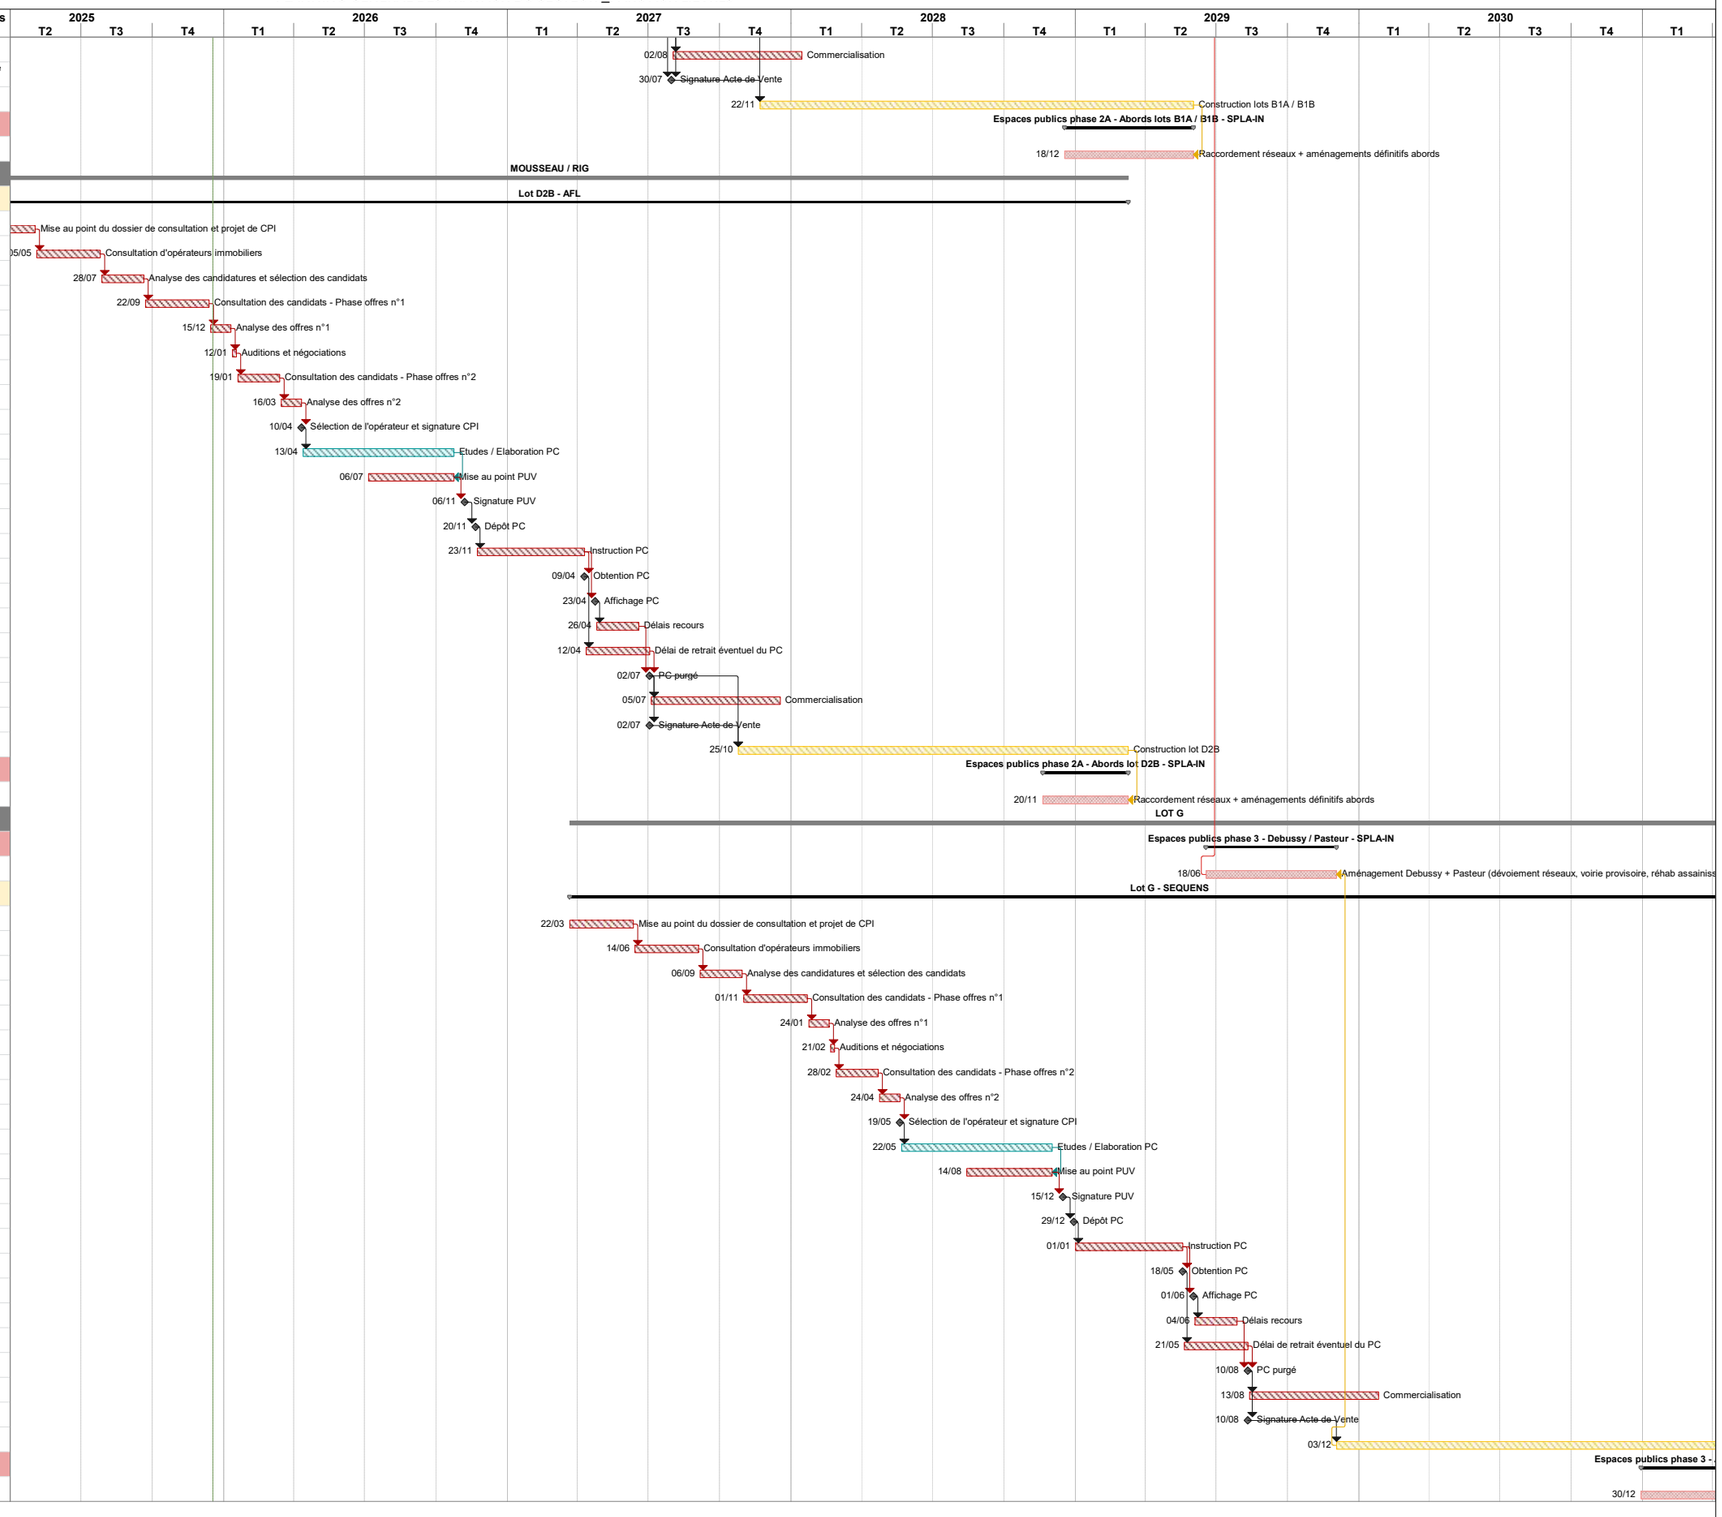

PROCEDURES ETUDES TRAVAUX LOTS TRAVAUX INFRA/VRD TRAVAUX SPLA-IN

V16 du 18/12/2025
