Calendrier général d'exécution

Life Ingénierie



UPEC - Plateforme CRITISC - bat. P

P25-016-PG-DCE-COM-001-C

Tous lots

UPEC
UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL DE MARNE
Connaissance · Action


REVISION DU DOCUMENT

Indice	Date	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
A	07/05/2026	Première émission	MMT	NMR	PCN
B	27/05/2026	Mise à jour suite retour client	MMT	NMR	PCN
C	15/06/2026	Mise à jour suite retour client	NMR	LDT	PCN

Life Ingénierie

Planning projet Plateforme CRITSC

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Projet CRITSC**	**547 jours**	**Lun 02/06/25**	**Ven 04/08/28**
2	Offre	0 jour	Lun 02/06/25	Lun 02/06/25
3	Commande	0 jour	Jeu 03/07/25	Jeu 03/07/25
4	**Etudes**	**322 jours**	**Mar 23/07/25**	**Ven 30/10/26**
5	Relevés sur site	1 jour	Mar 23/07/25	Mar 23/07/25
6	Fermeture UPEC	23 jours	Jeu 28/07/25	Ven 15/08/25
7	Diagnostique	27 jours	Jeu 24/07/25	Ven 29/08/25
8	Validation diagnostique	10 jours	Lun 01/09/25	Ven 12/09/25
9	Etude APS	22 jours	Lun 15/09/25	Mar 14/10/25
10	Validation APS	23 jours	Mer 15/10/25	Ven 14/11/25
11	Fermeture UPEC	5 jours	Lun 22/12/25	Ven 02/01/26
12	Etude APD	45 jours	Lun 17/11/25	Mar 27/01/26
13	Validation APD	23 jours	Mer 28/01/26	Ven 27/02/26
14	Etude PRO	30 jours	Lun 02/03/26	Ven 10/04/26
15	Validation PRO	11 jours	Lun 13/04/26	Lun 27/04/26
16	Elaboration DCE	8 jours	Mar 28/04/26	Lun 11/05/26
17	Préparation Achat pour publication	21 jours	Mar 12/05/26	Mar 10/06/26
18	Consultation entreprises	47 jours	Mer 10/06/26	Ven 14/08/26
19	Fermeture UPEC	24 jours	Jeu 27/08/26	Mar 14/09/26
20	Ouverture des plis	5 jours	Lun 17/08/26	Ven 21/08/26
21	Analyse des offres V1	5 jours	Lun 24/08/26	Ven 28/08/26
22	Questions aux candidats	10 jours	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26
23	Analyse des offres V2	10 jours	Lun 14/09/26	Ven 25/09/26
24	Passation des marchés	20 jours	Lun 28/09/26	Ven 23/10/26
25	Réunion de lancement tous lots	0 jour	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
26	**Travaux**	**388 jours**	**Lun 02/11/26**	**Ven 04/08/28**
27	Etudes d'exécution	39 jours	Lun 02/11/26	Ven 08/01/27
28	Fermeture UPEC	2 jours	Lun 21/12/26	Mar 05/01/27
29	**Travaux Moyen d'essais**	**115 jours**	**Lun 14/12/26**	**Ven 04/06/27**
30	Mise à disposition locaux moyen d'essais dépollués	0 jour	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26
31	Livraison cave thermique (Hors missions)	6 semaines	Lun 01/03/27	Ven 26/03/27
32	Démolition zone moyen d'essais	2 semaines	Lun 14/12/26	Ven 08/01/27
33	**Lot GO**	**77 jours**	**Lun 11/01/27**	**Mar 27/04/27**
34	Réalisation du dallage béton armé, salle essais thermique, socle désolidarisé pour	3 semaines	Lun 11/01/27	Ven 29/01/27
35	Terrassement zone extérieur	1 semaine	Lun 11/01/27	Ven 15/01/27
36	Réalisation dallage extérieur	1 semaine	Lun 18/01/27	Ven 22/01/27
37	Réalisation grillage et portes extérieur	1 semaine	Lun 25/01/27	Ven 29/01/27
38	Réalisation des enrobés	1 semaine	Lun 25/01/27	Ven 29/01/27
39	Rebouchage aggilo du mur	1 mois	Lun 29/03/27	Ven 23/04/27
40	Réalisation finition mur extérieur	2 jours	Lun 26/04/27	Mar 27/04/27
41	**Lot Second Œuvre**	**64 jours**	**Lun 01/02/27**	**Jeu 29/04/27**
42	Cloisons	2 semaines	Lun 01/02/27	Ven 12/02/27
43	Plafonds	1 semaine	Mar 24/02/27	Mar 02/03/27
44	Portes	1 semaine	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27
45	Résine	3 jours	Mer 17/03/27	Lun 22/03/27
46	Réalisation finition mur intérieur	4 jours	Lun 26/04/27	Jeu 29/04/27
47	**Lot Chauffage Ventilation climatisation**	**75 jours**	**Lun 14/12/26**	**Ven 09/04/27**
48	Approvisionnement CTA	10 semaines	Lun 14/12/26	Ven 05/03/27
49	Mise en place des réseaux aérauliques	3 semaines	Lun 01/02/27	Ven 19/02/27
50	Mise en place unité extérieur traitement thermique	1 semaine	Lun 11/01/27	Ven 15/01/27
51	Mise en place unités intérieures	2 semaines	Mer 03/03/27	Mar 17/03/27
52	Mise en place des terminaux	1 semaine	Mer 03/03/27	Mer 10/03/27
53	Réalisation liaison électrique	1 semaine	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27
54	Raccordement terminaux	1 semaine	Mer 10/03/27	Mer 17/03/27
55	Réalisation des alimentions Eau chaude/Eau froide/EU	2 semaines	Lun 15/02/27	Ven 26/02/27
56	Mise en place de la cuve inox	2 jours	Lun 22/03/27	Mar 24/03/27
57	Mise en place CTA	1 semaine	Lun 08/03/27	Ven 12/03/27
58	Test & Mise en service	2 semaines	Lun 29/03/27	Ven 09/04/27
59	**Lot CFO/CFA**	**55 jours**	**Lun 11/01/27**	**Ven 26/03/27**
60	Fabrication armoire	1 mois	Lun 11/01/27	Ven 05/02/27
61	Mise en place armoire électrique	1 semaine	Lun 08/02/27	Ven 12/02/27
62	Mise en place des réseaux (chemin de câble & liaison électrique)	2 semaines	Lun 11/01/27	Ven 22/01/27
63	Mise en place terminaux	1 semaine	Mer 03/03/27	Mer 10/03/27
64	Raccordement CFO/CFA	1 semaine	Mer 10/03/27	Mer 17/03/27
65	Mise en service	1,5 semaines	Mer 17/03/27	Ven 26/03/27
66	**Lot Fluides spéciaux**	**8,5 jours**	**Lun 15/02/27**	**Jeu 25/02/27**
67	Mise en place des attentes d'air comprimé	1,5 semaines	Lun 15/02/27	Mer 24/02/27
68	Raccordement sur réseau existant	1 jour	Mer 24/02/27	Jeu 25/02/27
69	**AOR**	**40 jours**	**Lun 12/04/27**	**Ven 04/06/27**
70	OPR	10 jours	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27
71	Réception & levée de réserves	30 jours	Lun 26/04/27	Ven 04/06/27
72	**Travaux Salle blanche**	**129 jours**	**Lun 14/12/26**	**Jeu 24/06/27**
73	Mise à disposition locaux salles blanches dépollués	0 jour	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26
74	Dépose	3 semaines	Lun 14/12/26	Ven 15/01/27
75	Menuiseries / vitrages extérieur	2 semaines	Lun 18/01/27	Ven 29/01/27
76	Création Ouverture Mur porteur	4 jours	Lun 18/01/27	Jeu 21/01/27
77	Renforcement de plancher (équipements toiture)	2 semaines	Ven 22/01/27	Jeu 04/02/27
78	Création trémie + dôcule en toiture	2 semaines	Ven 05/02/27	Jeu 18/02/27
79	Reprise étanchéité	1 semaine	Ven 19/02/27	Jeu 25/02/27
80	**Lot Second Œuvre**	**47 jours**	**Ven 19/02/27**	**Lun 24/05/27**
81	Plafonds	1 semaine	Ven 19/02/27	Jeu 25/02/27
82	Cloisons	2 semaines	Ven 26/02/27	Jeu 08/04/27
83	Pose châssis vitrés effleurants	1 semaine	Ven 09/04/27	Jeu 15/04/27
84	Pose portes salle blanche	3 jours	Ven 16/04/27	Mar 20/04/27
85	Mise en place interlock des portes	1 semaine	Mer 21/04/27	Mar 27/04/27
86	Pose grilles de transfert	2 jours	Mer 28/04/27	Jeu 29/04/27
87	Installation FFU encastrés	1 semaine	Ven 30/04/27	Jeu 06/05/27
88	Installation passe-plats	2 jours	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27
89	Mise en place mobilier de sas	3 jours	Mar 13/04/27	Jeu 15/04/27
90	Réflection murs (toile de verre + peinture)	2,5 jours	Ven 16/04/27	Mar 20/04/27
91	Sols	2 semaines	Mar 11/05/27	Lun 24/05/27
92	Jointement cloisons & plafonds	2 jours	Ven 07/05/27	Lun 10/05/27
93	**Lot CVC**	**90 jours**	**Ven 19/02/27**	**Jeu 24/06/27**
94	Production calorifique	1 semaine	Ven 26/02/27	Jeu 04/03/27
95	Production frigorifique	1 semaine	Ven 05/03/27	Jeu 11/03/27
96	CTA salle blanche	2 semaines	Ven 12/03/27	Jeu 25/03/27
97	Extractions spécifiques	1 semaine	Ven 26/03/27	Jeu 01/04/27
98	Distribution aéraulique et hydraulique	4 semaines	Ven 19/02/27	Jeu 18/03/27
99	Electricité	2 semaines	Ven 19/02/27	Jeu 04/03/27
100	Mise en place terminaux	1 semaine	Ven 26/03/27	Jeu 01/04/27
101	Raccordement	2 semaines	Ven 02/04/27	Jeu 15/04/27
102	Plomberie / sanitaire	2 semaines	Ven 26/03/27	Jeu 08/04/27
103	Régulation / supervision	4 semaines	Ven 16/04/27	Jeu 13/05/27
104	Test & mise en service	2 semaines	Mar 01/06/27	Lun 14/06/27
105	Mise en place des filtres terminaux	2 jours	Mer 16/06/27	Jeu 17/06/27
106	Finalisation mise en service	1 semaine	Ven 18/06/27	Jeu 24/06/27
107	**Lot Electricité CFO/CFA**	**81 jours**	**Ven 19/02/27**	**Ven 11/06/27**
108	Intégration Départ TGBT	1 jour	Ven 21/05/27	Ven 21/05/27
109	Distribution électrique salle blanche	3 semaines	Ven 19/02/27	Jeu 11/03/27
110	Mise en place terminaux & raccordement terminaux	2 semaines	Ven 26/03/27	Jeu 08/04/27
111	Mise en service	1 semaine	Lun 24/05/27	Ven 28/05/27
112	Interfaçage supervision	2 semaines	Lun 31/05/27	Ven 11/06/27
113	**Lot Fluides spécifiques**	**30 jours**	**Ven 19/02/27**	**Jeu 01/04/27**
114	Réseaux fluides spécifiques salle blanche	4 semaines	Ven 19/02/27	Jeu 18/03/27
115	Raccordement terminaux	2 semaines	Ven 19/03/27	Jeu 01/04/27
116	**Mobilier laboratoire**	**12 jours**	**Mar 25/05/27**	**Mer 09/06/27**
117	Sorbonnes	3 jours	Mar 25/05/27	Jeu 27/05/27
118	Bras de captation	2 jours	Ven 28/05/27	Lun 31/05/27
119	Paillasses	3 jours	Mar 01/06/27	Jeu 03/06/27
120	Flux laminaire	2 jours	Ven 04/06/27	Lun 07/06/27
121	Armoires de stockage	2 jours	Mar 08/06/27	Mer 09/06/27
122	**AOR**	**56 jours**	**Jeu 20/05/27**	**Ven 06/08/27**
123	Mise à gris / Mise à blanc	4 jours	Jeu 10/06/27	Mer 15/06/27
124	OPR	15 jours	Jeu 20/05/27	Mer 09/06/27
125	Réception & levées de réserves	30 jours	Ven 25/06/27	Ven 06/08/27

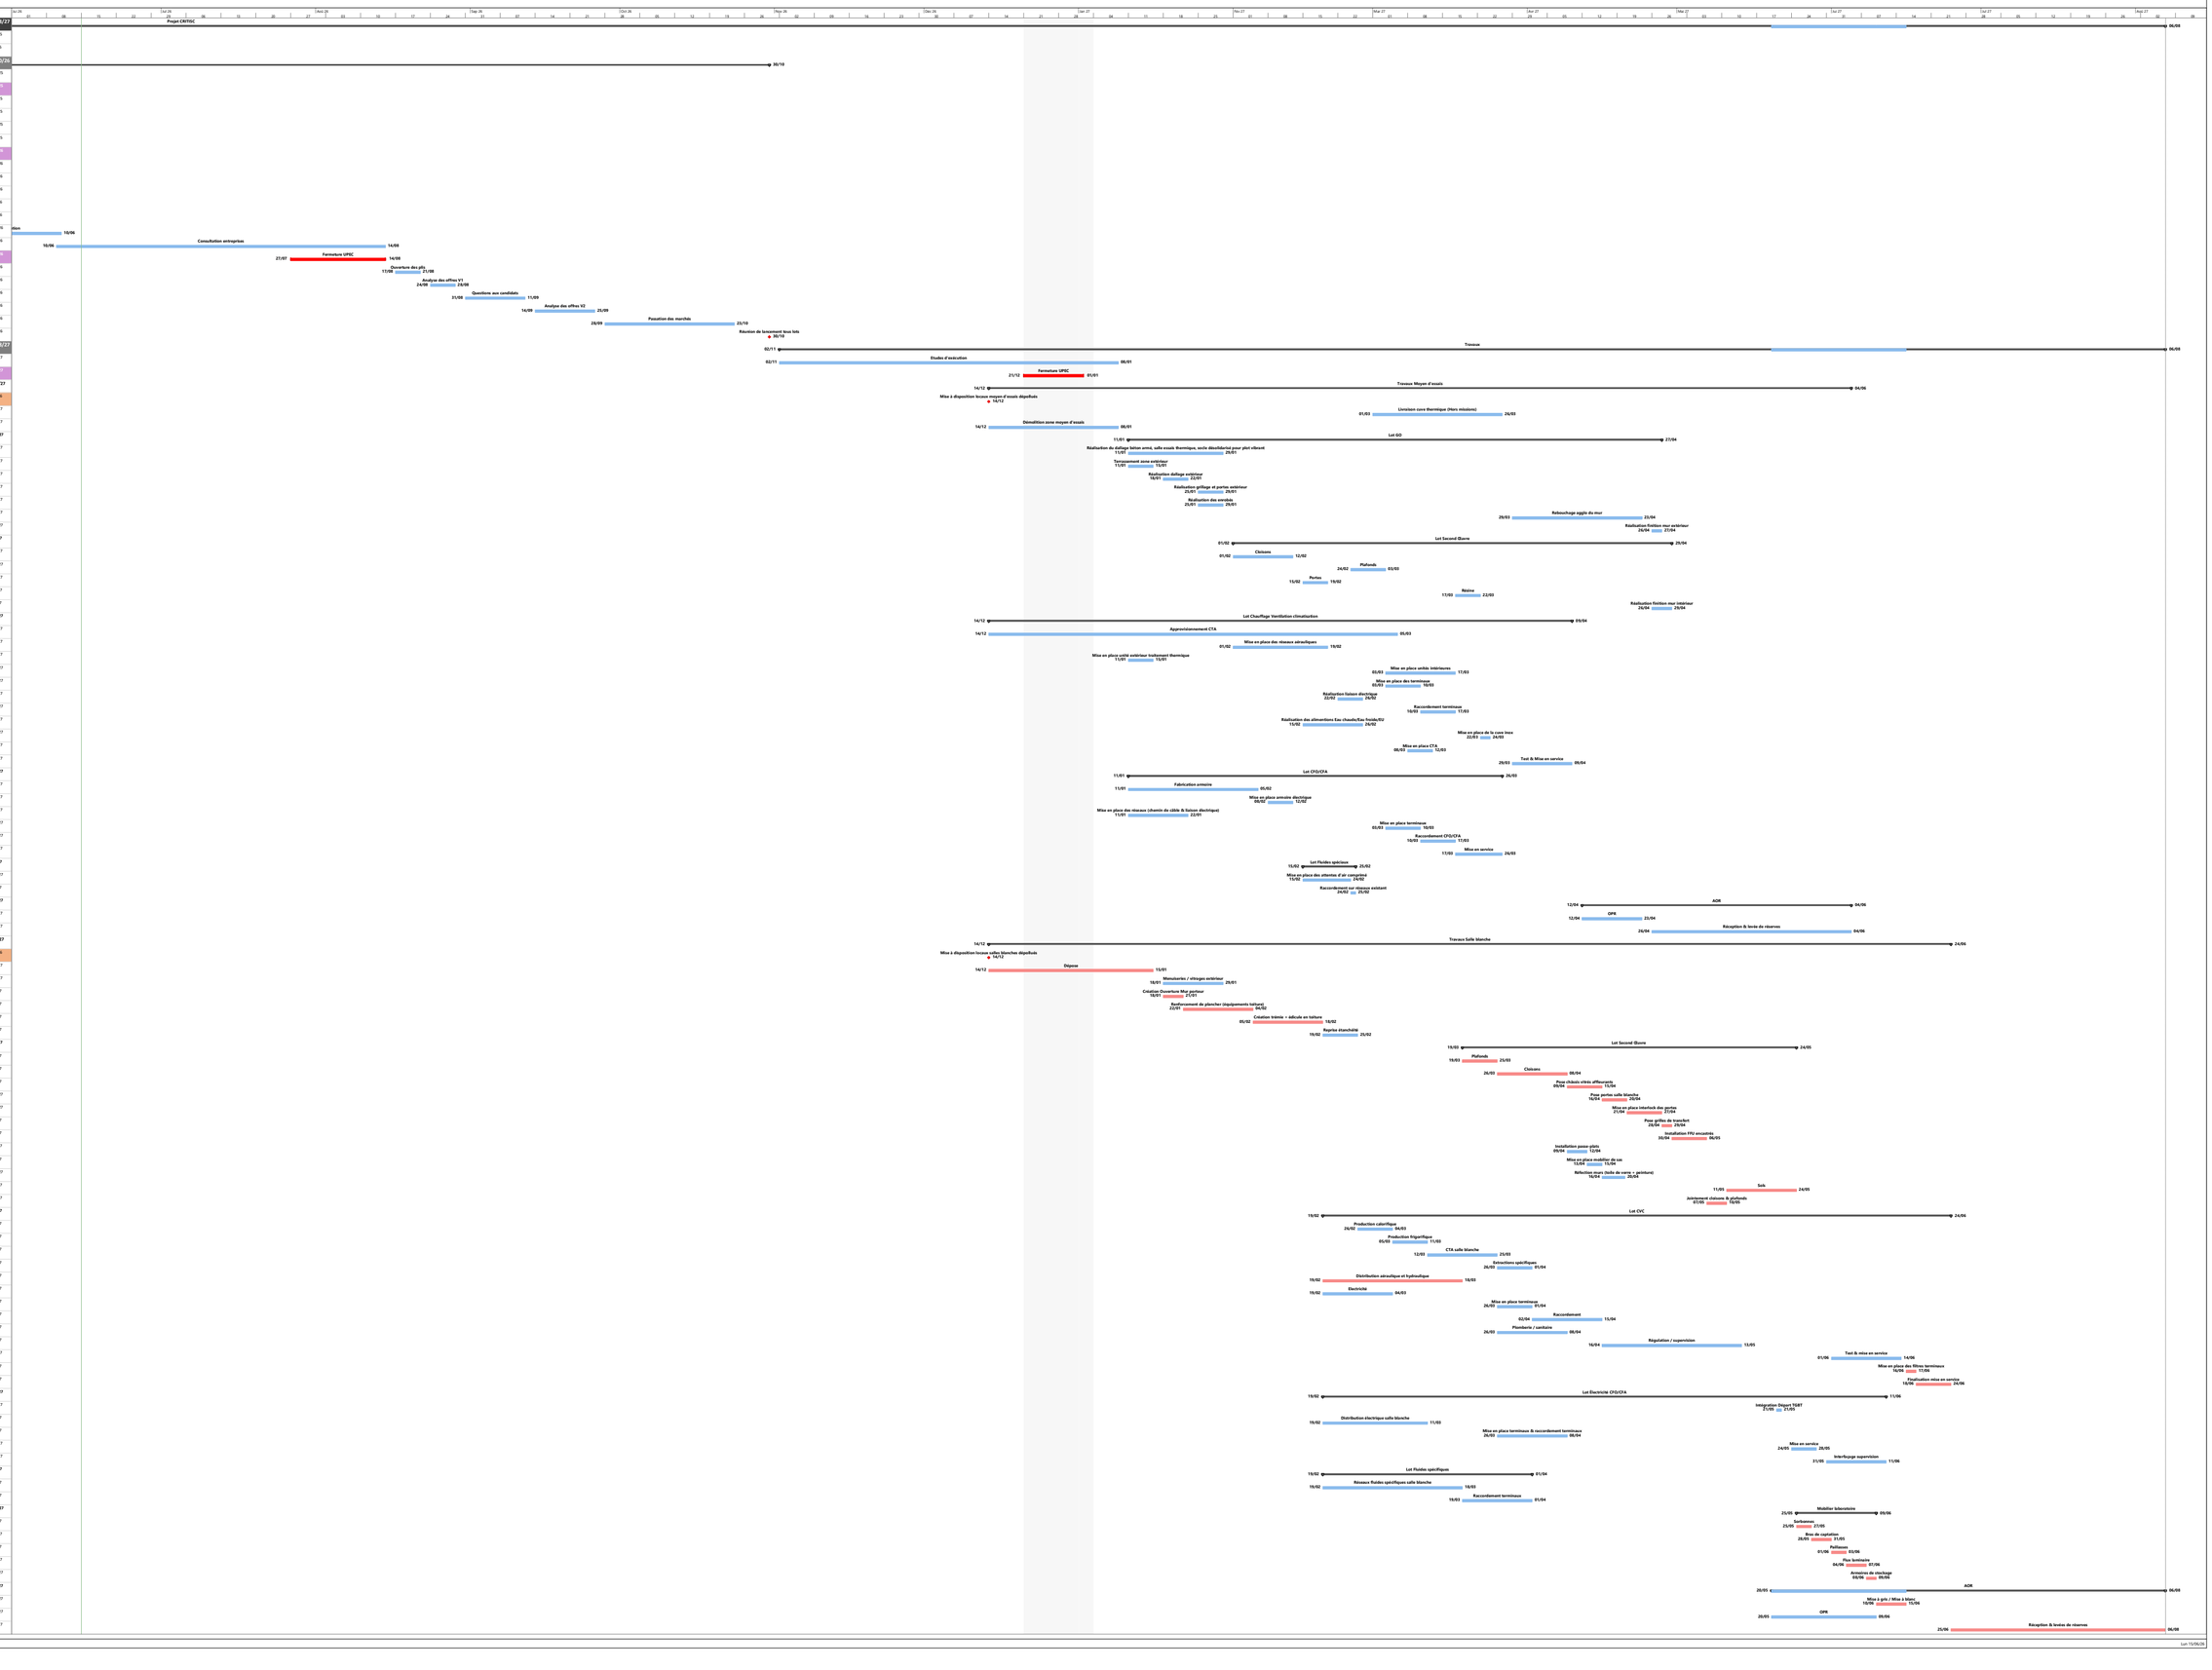

Planning projet Plateforme CRITISC


N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Projet CRITISC**	**547 jours**	**Lun 02/06/25**	**Ven 06/08/27**
2	Offre	0 jour	Lun 02/06/25	Lun 02/06/25
3	Commande	0 jour	Jeu 03/07/25	Jeu 03/07/25
4	**Etudes**	**322 jours**	**Mer 23/07/25**	**Ven 30/10/26**
5	Relevés sur site	1 jour	Mer 23/07/25	Mer 23/07/25
6	**Fermeture UPEC**	**15 jours**	**Lun 28/07/25**	**Ven 15/08/25**
7	Diagnostique	27 jours	Jeu 24/07/25	Ven 29/08/25
8	Validation diagnostique	10 jours	Lun 01/09/25	Ven 12/09/25
9	Etude APS	22 jours	Lun 15/09/25	Mar 14/10/25
10	Validation APS	23 jours	Mer 15/10/25	Ven 14/11/25
11	**Fermeture UPEC**	**3 jours**	**Lun 22/12/25**	**Ven 02/01/26**
12	Etude APD	45 jours	Lun 17/11/25	Mar 27/01/26
13	Validation APD	23 jours	Mer 28/01/26	Ven 27/02/26
14	Etude PRO	30 jours	Lun 02/03/26	Ven 10/04/26
15	Validation PRO	11 jours	Lun 13/04/26	Lun 27/04/26
16	Elaboration DCE	8 jours	Mar 28/04/26	Lun 11/05/26
17	Préparation Achat pour publication	21 jours	Mar 12/05/26	Mer 10/06/26
18	Consultation entreprises	47 jours	Mer 10/06/26	Ven 14/08/26
19	**Fermeture UPEC**	**15 jours**	**Lun 27/07/26**	**Ven 14/08/26**
20	Ouverture des plis	5 jours	Lun 17/08/26	Ven 21/08/26
21	Analyse des offres V1	5 jours	Lun 24/08/26	Ven 28/08/26




Life Ingénierie

Planning projet Plateforme CRITISC

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
22	Questions aux candidats	10 jours	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26
23	Analyse des offres V2	10 jours	Lun 14/09/26	Ven 25/09/26
24	Passation des marchés	20 jours	Lun 28/09/26	Ven 23/10/26
25	Réunion de lancement tous lots	0 jour	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
26	**Travaux**	**188 jours**	**Lun 02/11/26**	**Ven 06/08/27**
27	Etudes d'exécution	39 jours	Lun 02/11/26	Ven 08/01/27
28	**Fermeture UPEC**	**2 jours**	**Lun 21/12/26**	**Ven 01/01/27**
29	**Travaux Moyen d'essais**	**115 jours**	**Lun 14/12/26**	**Ven 04/06/27**
30	Mise à disposition locaux moyen d'essais dépollués	0 jour	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26
31	Livraison cuve thermique (Hors missions)	4 semaines	Lun 01/03/27	Ven 26/03/27
32	Démolition zone moyen d'essais	2 semaines	Lun 14/12/26	Ven 08/01/27
33	**Lot GO**	**77 jours**	**Lun 11/01/27**	**Mar 27/04/27**
34	Réalisation du dallage béton armé, salle essais thermique, socle désolidarisé pour plot vibrant	3 semaines	Lun 11/01/27	Ven 29/01/27
35	Terrassement zone extérieur	1 semaine	Lun 11/01/27	Ven 15/01/27
36	Réalisation dallage extérieur	1 semaine	Lun 18/01/27	Ven 22/01/27
37	Réalisation grillage et portes extérieur	1 semaine	Lun 25/01/27	Ven 29/01/27
38	Réalisation des enrobés	1 semaine	Lun 25/01/27	Ven 29/01/27
39	Rebouchage agglo du mur	1 mois	Lun 29/03/27	Ven 23/04/27
40	Réalisation finition mur extérieur	2 jours	Lun 26/04/27	Mar 27/04/27
41	**Lot Second Œuvre**	**64 jours**	**Lun 01/02/27**	**Jeu 29/04/27**
42	Cloisons	2 semaines	Lun 01/02/27	Ven 12/02/27

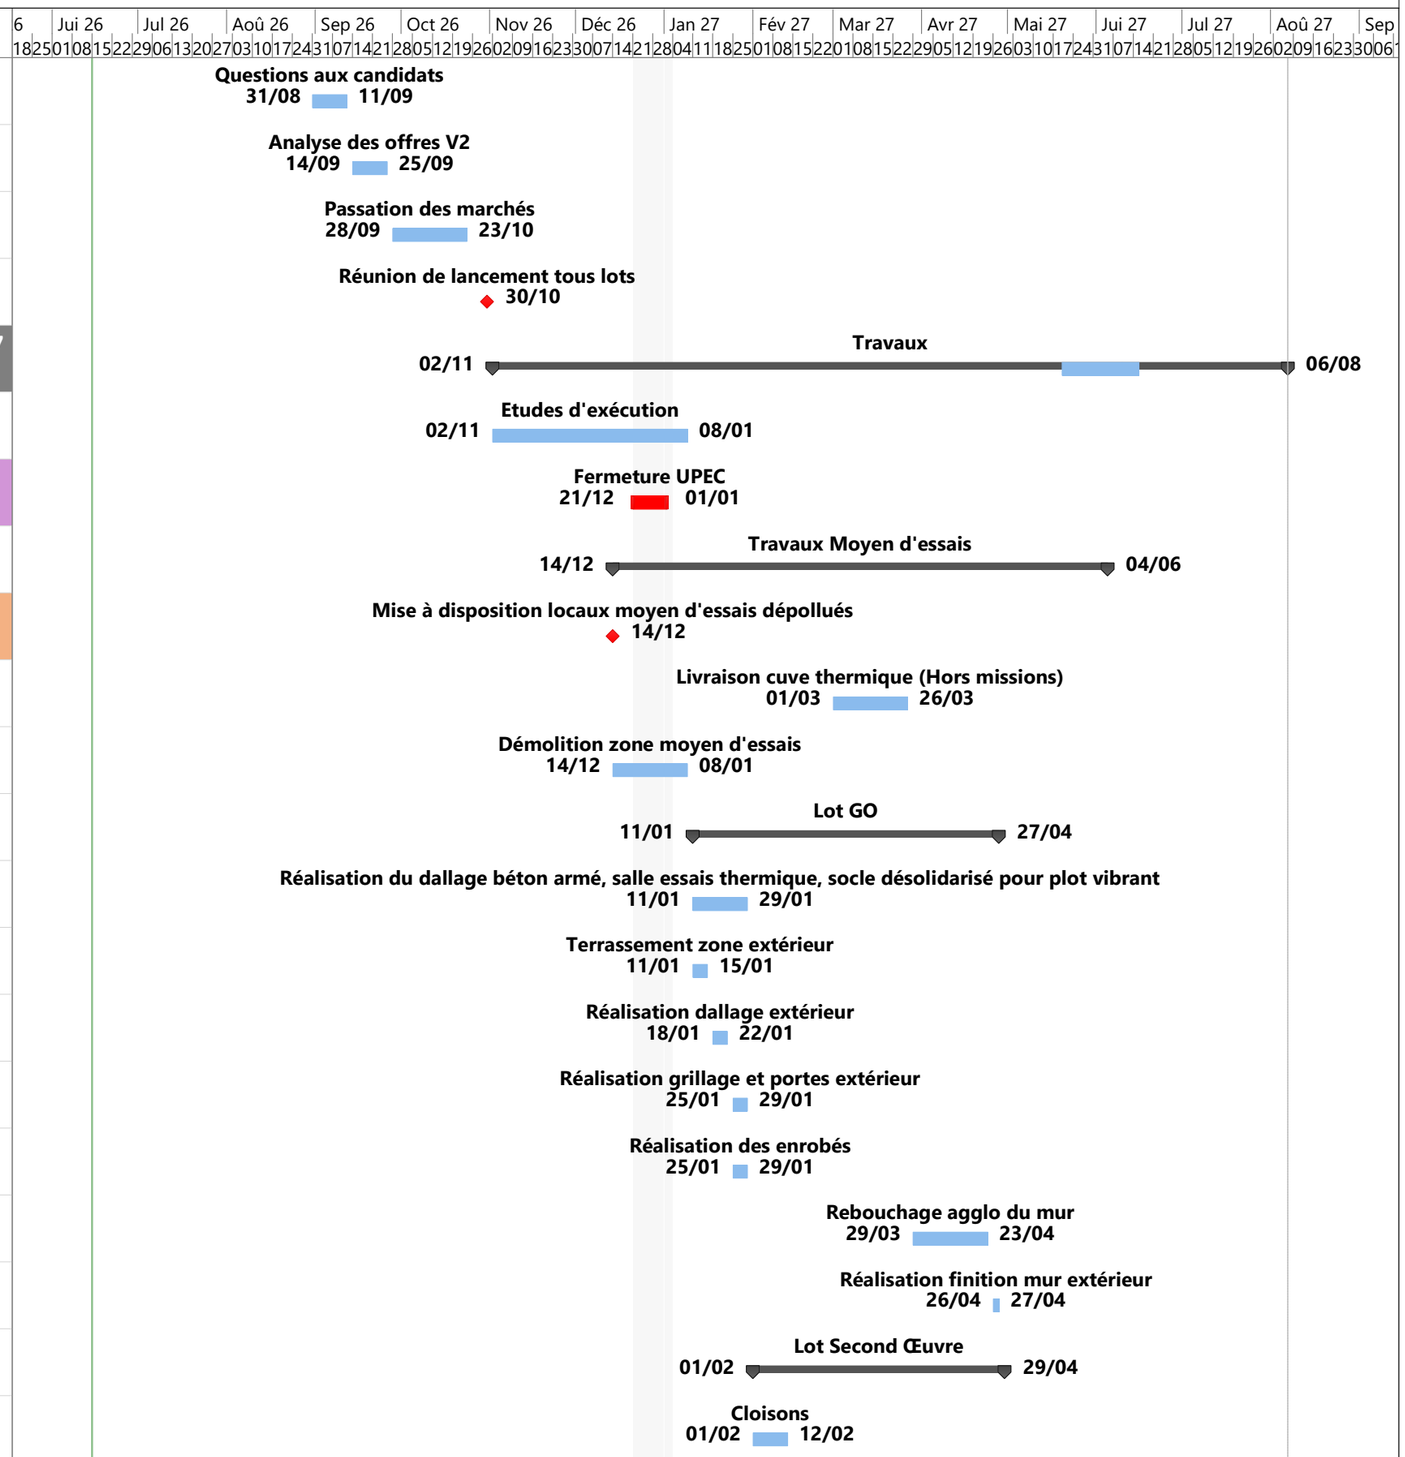


N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
43	Plafonds	1 semaine	Mer 24/02/27	Mer 03/03/27
44	Portes	1 semaine	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27
45	Résine	3 jours	Mer 17/03/27	Lun 22/03/27
46	Réalisation finition mur intérieur	4 jours	Lun 26/04/27	Jeu 29/04/27
47	**Lot Chauffage Ventilation climatisation**	**75 jours**	**Lun 14/12/26**	**Ven 09/04/27**
48	Approvisionnement CTA	10 semaines	Lun 14/12/26	Ven 05/03/27
49	Mise en place des réseaux aérauliques	3 semaines	Lun 01/02/27	Ven 19/02/27
50	Mise en place unité extérieur traitement thermique	1 semaine	Lun 11/01/27	Ven 15/01/27
51	Mise en place unités intérieures	2 semaines	Mer 03/03/27	Mer 17/03/27
52	Mise en place des terminaux	1 semaine	Mer 03/03/27	Mer 10/03/27
53	Réalisation liaison électrique	1 semaine	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27
54	Raccordement terminaux	1 semaine	Mer 10/03/27	Mer 17/03/27
55	Réalisation des alimentions Eau chaude/Eau froide/EU	2 semaines	Lun 15/02/27	Ven 26/02/27
56	Mise en place de la cuve inox	2 jours	Lun 22/03/27	Mer 24/03/27
57	Mise en place CTA	1 semaine	Lun 08/03/27	Ven 12/03/27
58	Test & Mise en service	2 semaines	Lun 29/03/27	Ven 09/04/27
59	**Lot CFO/CFA**	**55 jours**	**Lun 11/01/27**	**Ven 26/03/27**
60	Fabrication armoire	1 mois	Lun 11/01/27	Ven 05/02/27
61	Mise en place armoire électrique	1 semaine	Lun 08/02/27	Ven 12/02/27
62	Mise en place des réseaux (chemin de câble & liaison électrique)	2 semaines	Lun 11/01/27	Ven 22/01/27
63	Mise en place terminaux	1 semaine	Mer 03/03/27	Mer 10/03/27

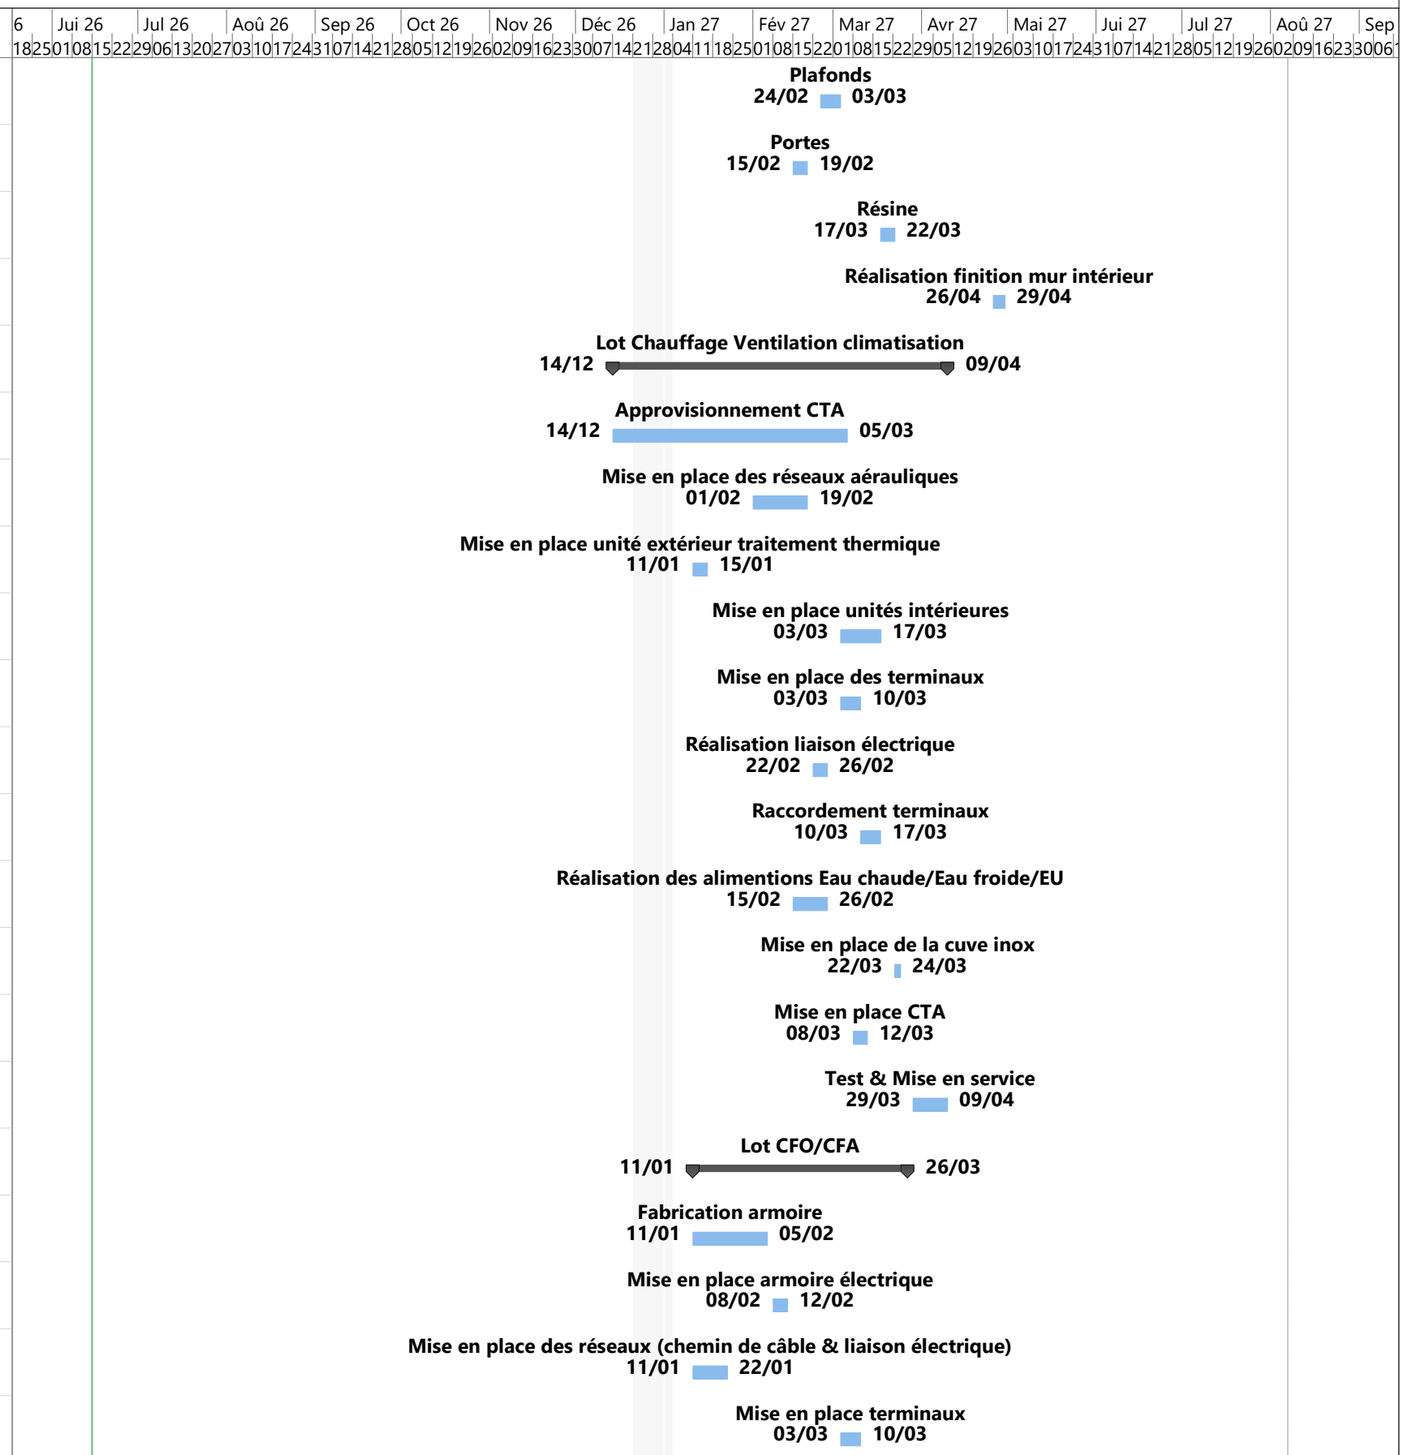


Planning projet Plateforme CRITISC

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
64	Raccordement CFO/CFA	1 semaine	Mer 10/03/27	Mer 17/03/27
65	Mise en service	1,5 semaines	Mer 17/03/27	Ven 26/03/27
66	**Lot Fluides spéciaux**	**8,5 jours**	**Lun 15/02/27**	**Jeu 25/02/27**
67	Mise en place des attentes d'air comprimé	1,5 semaines	Lun 15/02/27	Mer 24/02/27
68	Raccordement sur réseaux existant	1 jour	Mer 24/02/27	Jeu 25/02/27
69	**AOR**	**40 jours**	**Lun 12/04/27**	**Ven 04/06/27**
70	OPR	10 jours	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27
71	Réception & levée de réserves	30 jours	Lun 26/04/27	Ven 04/06/27
72	**Travaux Salle blanche**	**129 jours**	**Lun 14/12/26**	**Jeu 24/06/27**
73	Mise à disposition locaux salles blanches dépollués	0 jour	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26
74	Dépose	3 semaines	Lun 14/12/26	Ven 15/01/27
75	Menuiseries / vitrages extérieur	2 semaines	Lun 18/01/27	Ven 29/01/27
76	Création Ouverture Mur porteur	4 jours	Lun 18/01/27	Jeu 21/01/27
77	Renforcement de plancher (équipements toiture)	2 semaines	Ven 22/01/27	Jeu 04/02/27
78	Création trémie + édicule en toiture	2 semaines	Ven 05/02/27	Jeu 18/02/27
79	Reprise étanchéité	1 semaine	Ven 19/02/27	Jeu 25/02/27
80	**Lot Second Œuvre**	**47 jours**	**Ven 19/03/27**	**Lun 24/05/27**
81	Plafonds	1 semaine	Ven 19/03/27	Jeu 25/03/27
82	Cloisons	2 semaines	Ven 26/03/27	Jeu 08/04/27
83	Pose châssis vitrés affleurants	1 semaine	Ven 09/04/27	Jeu 15/04/27
84	Pose portes salle blanche	3 jours	Ven 16/04/27	Mar 20/04/27

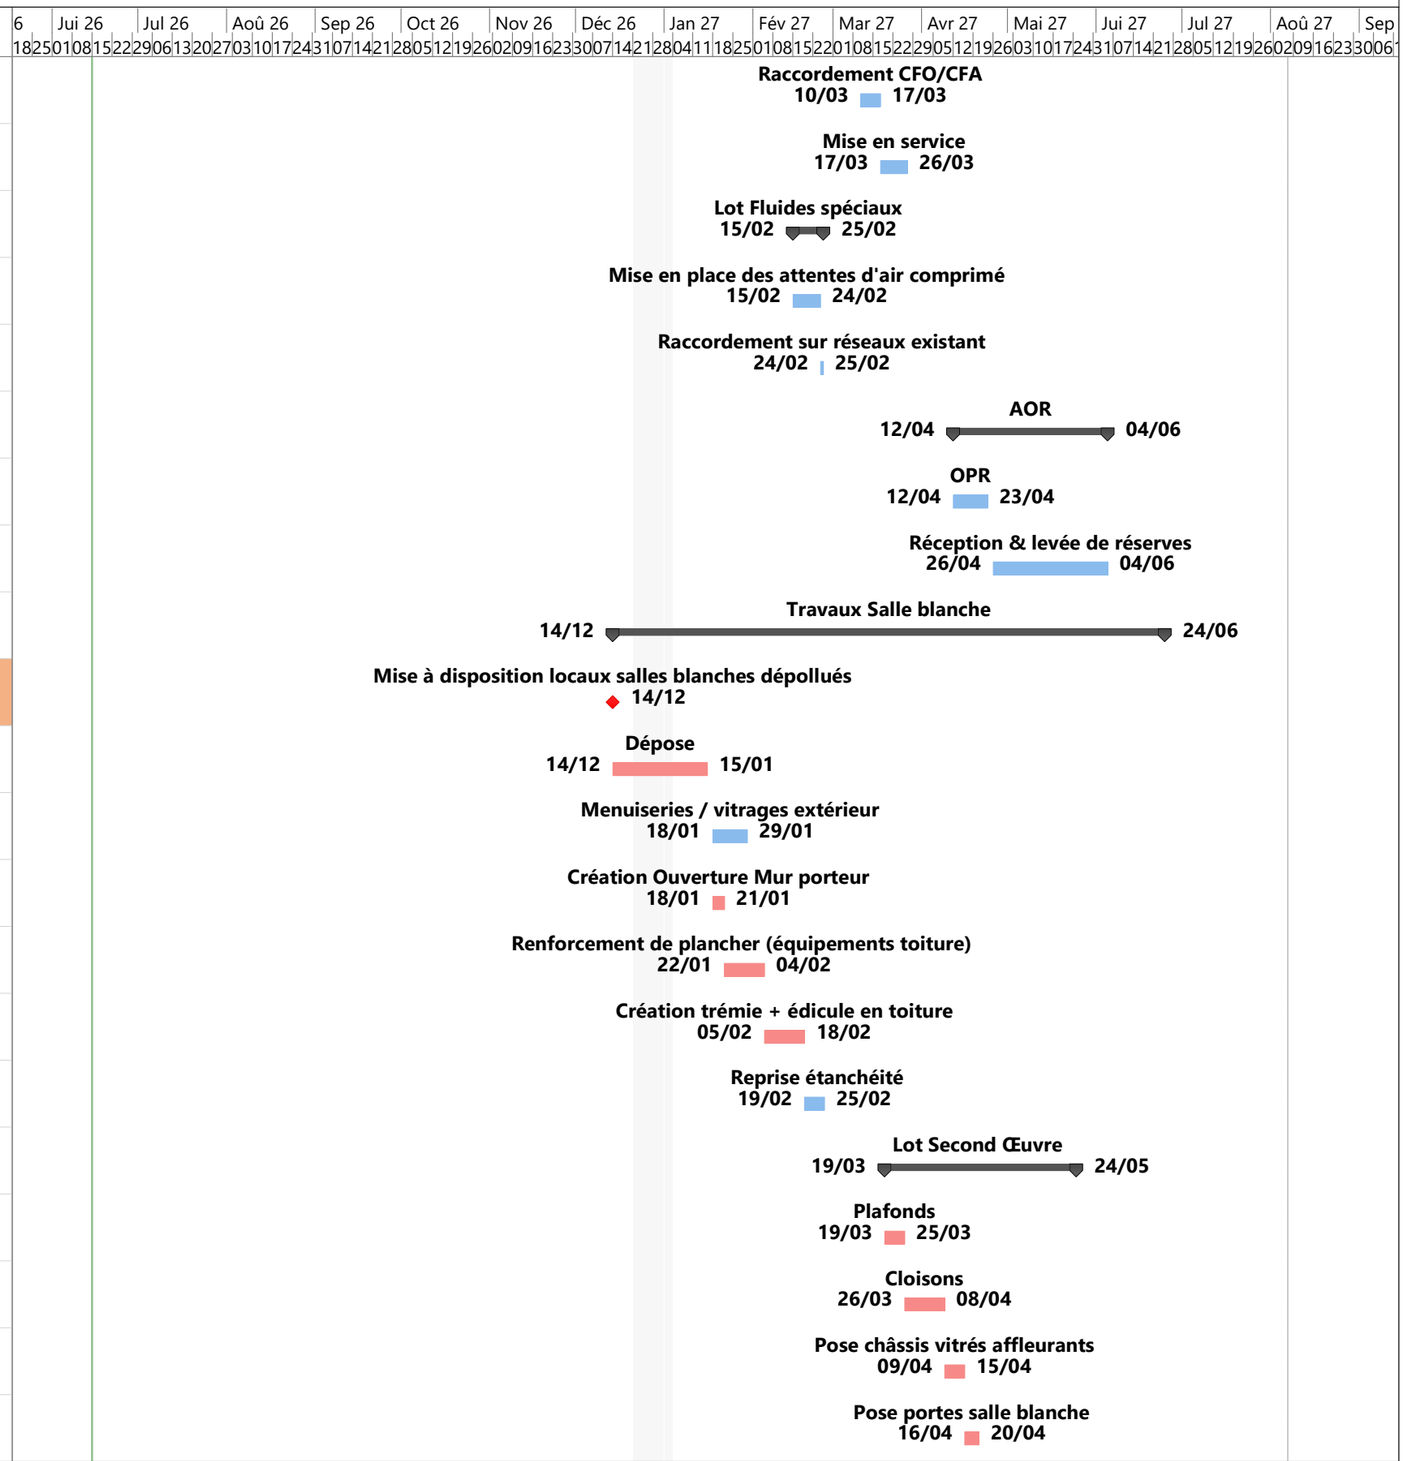

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
85	Mise en place interlock des portes	1 semaine	Mer 21/04/27	Mar 27/04/27
86	Pose grilles de transfert	2 jours	Mer 28/04/27	Jeu 29/04/27
87	Installation FFU encastrés	1 semaine	Ven 30/04/27	Jeu 06/05/27
88	Installation passe-plats	2 jours	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27
89	Mise en place mobilier de sas	3 jours	Mar 13/04/27	Jeu 15/04/27
90	Réfection murs (toile de verre + peinture)	2,5 jours	Ven 16/04/27	Mar 20/04/27
91	Sols	2 semaines	Mar 11/05/27	Lun 24/05/27
92	Jointement cloisons & plafonds	2 jours	Ven 07/05/27	Lun 10/05/27
93	**Lot CVC**	**90 jours**	**Ven 19/02/27**	**Jeu 24/06/27**
94	Production calorifique	1 semaine	Ven 26/02/27	Jeu 04/03/27
95	Production frigorifique	1 semaine	Ven 05/03/27	Jeu 11/03/27
96	CTA salle blanche	2 semaines	Ven 12/03/27	Jeu 25/03/27
97	Extractions spécifiques	1 semaine	Ven 26/03/27	Jeu 01/04/27
98	Distribution aéraulique et hydraulique	4 semaines	Ven 19/02/27	Jeu 18/03/27
99	Electricité	2 semaines	Ven 19/02/27	Jeu 04/03/27
100	Mise en place terminaux	1 semaine	Ven 26/03/27	Jeu 01/04/27
101	Raccordement	2 semaines	Ven 02/04/27	Jeu 15/04/27
102	Plomberie / sanitaire	2 semaines	Ven 26/03/27	Jeu 08/04/27
103	Régulation / supervision	4 semaines	Ven 16/04/27	Jeu 13/05/27
104	Test & mise en service	2 semaines	Mar 01/06/27	Lun 14/06/27
105	Mise en place des filtres terminaux	2 jours	Mer 16/06/27	Jeu 17/06/27

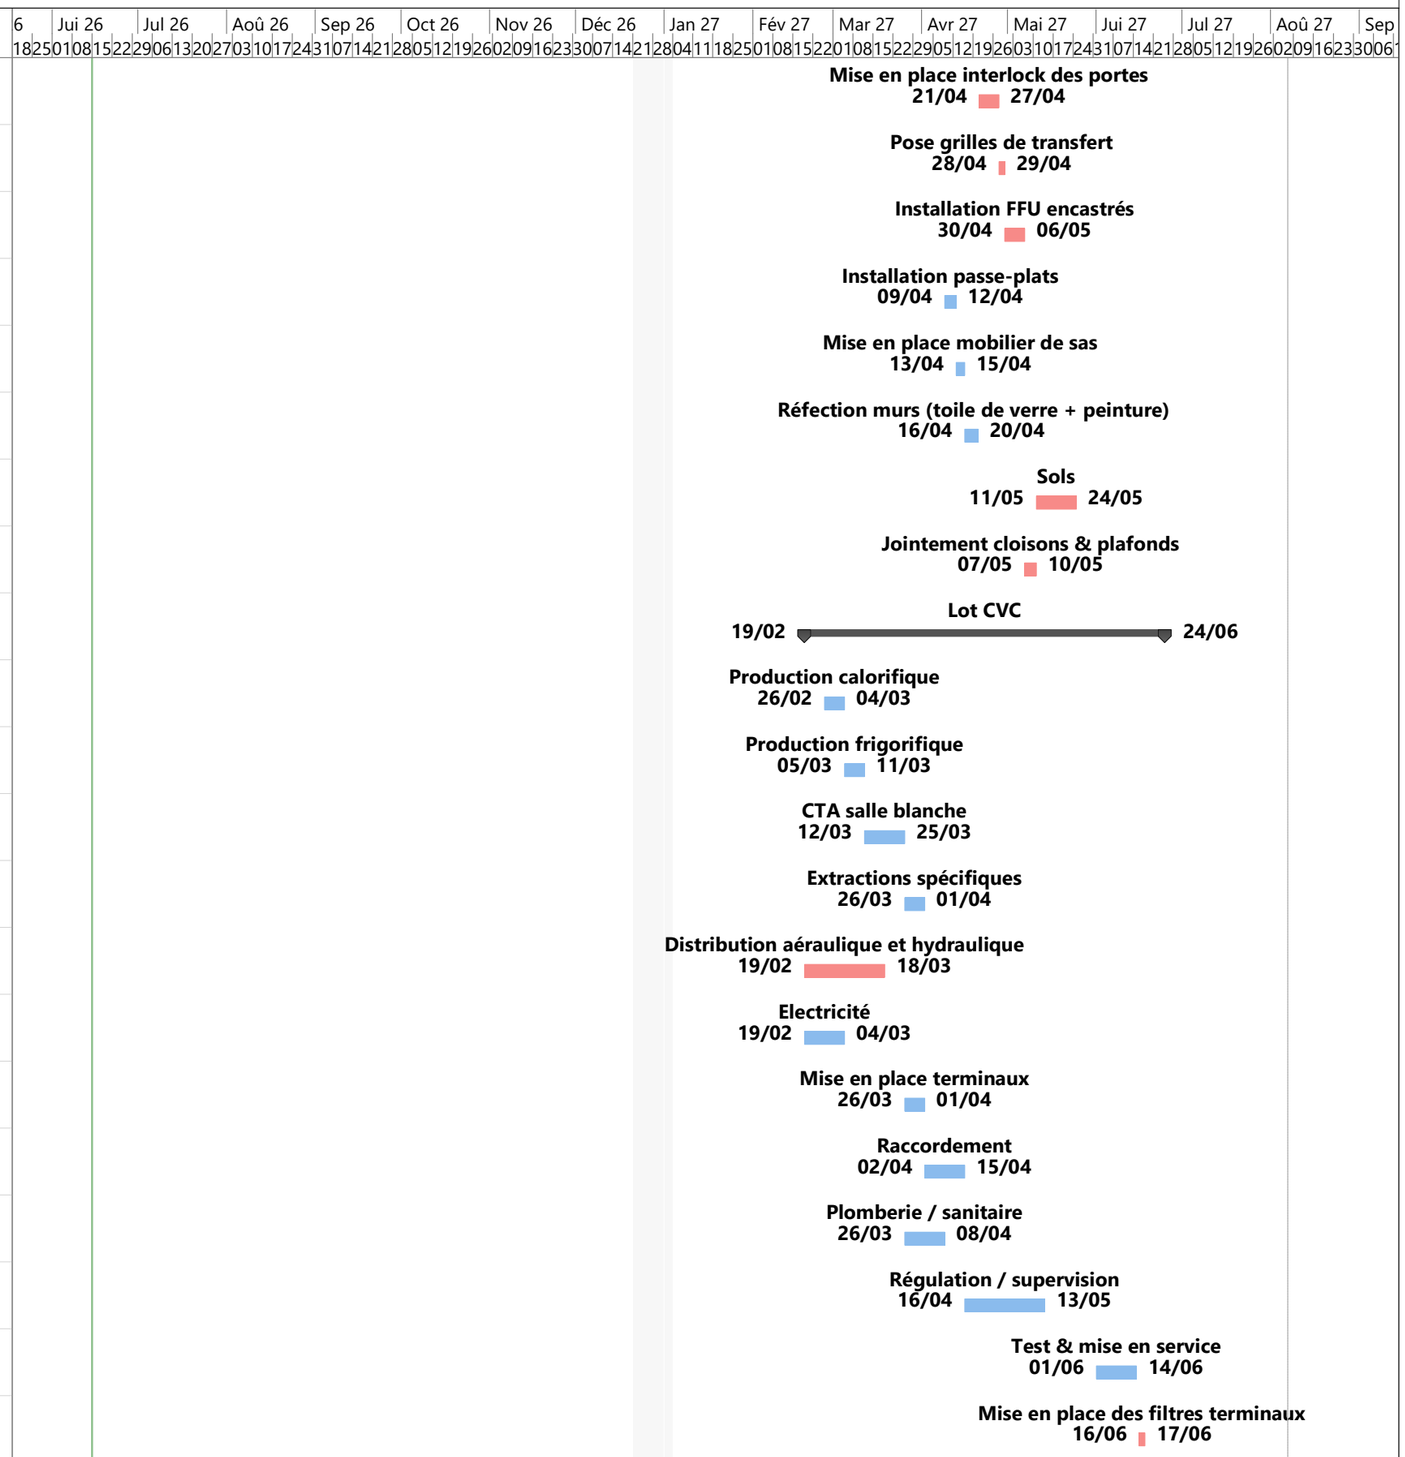

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
106	Finalisation mise en service	1 semaine	Ven 18/06/27	Jeu 24/06/27
107	**Lot Électricité CFO/CFA**	**81 jours**	**Ven 19/02/27**	**Ven 11/06/27**
108	Intégration Départ TGBT	1 jour	Ven 21/05/27	Ven 21/05/27
109	Distribution électrique salle blanche	3 semaines	Ven 19/02/27	Jeu 11/03/27
110	Mise en place terminaux & raccordement terminaux	2 semaines	Ven 26/03/27	Jeu 08/04/27
111	Mise en service	1 semaine	Lun 24/05/27	Ven 28/05/27
112	Interfaçage supervision	2 semaines	Lun 31/05/27	Ven 11/06/27
113	**Lot Fluides spécifiques**	**30 jours**	**Ven 19/02/27**	**Jeu 01/04/27**
114	Réseaux fluides spécifiques salle blanche	4 semaines	Ven 19/02/27	Jeu 18/03/27
115	Raccordement terminaux	2 semaines	Ven 19/03/27	Jeu 01/04/27
116	**Mobilier laboratoire**	**12 jours**	**Mar 25/05/27**	**Mer 09/06/27**
117	Sorbonnes	3 jours	Mar 25/05/27	Jeu 27/05/27
118	Bras de captation	2 jours	Ven 28/05/27	Lun 31/05/27
119	Paillasses	3 jours	Mar 01/06/27	Jeu 03/06/27
120	Flux laminaire	2 jours	Ven 04/06/27	Lun 07/06/27
121	Armoires de stockage	2 jours	Mar 08/06/27	Mer 09/06/27
122	**AOR**	**56 jours**	**Jeu 20/05/27**	**Ven 06/08/27**
123	Mise à gris / Mise à blanc	4 jours	Jeu 10/06/27	Mar 15/06/27
124	OPR	15 jours	Jeu 20/05/27	Mer 09/06/27
125	Réception & levées de réserves	30 jours	Ven 25/06/27	Ven 06/08/27

