
optima CONSTRUCTION

CALENDRIER PREVISIONNEL ETUDES ET TRAVAUX

Construction d'un réfectoire à Bures-sur-Yvette

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Lots
1	**DATES CLES**	**138 jrs**	**Lun 07/12/26**	**Mar 29/06/27**	
2	Notification des marchés	10 jrs	Lun 07/12/26	Ven 18/12/26	MOA
3	Ordre de service	0 jr	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27	MOA
4	Préparation de chantier	20 jrs	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27	TCE
5	Fin du Gros Œuvre	0 jr	Ven 12/03/27	Ven 12/03/27	Lot 1
6	Hors d'eau	0 jr	Mar 13/04/27	Mar 13/04/27	Lot 2
7	Hors d'air	0 jr	Mar 13/04/27	Mar 13/04/27	Lot 3
8	Fin des réseaux CET	0 jr	Mar 04/05/27	Mar 04/05/27	
9	OPR	15 jrs	Mar 25/05/27	Lun 14/06/27	TCE
10	Réception	0 jr	Mar 15/06/27	Mar 15/06/27	TCE
11	Levée des réserves	10 jrs	Mer 16/06/27	Mar 29/06/27	TCE
12	**INSTALLATIONS DE CHANTIER**	**112 jrs**	**Mar 05/01/27**	**Mar 15/06/27**	
13	Plan d'installation de chantier	5 jrs	Mar 05/01/27	Lun 11/01/27	Lot 1
14	Installation clôtures et portails	5 jrs	Lun 18/01/27	Ven 22/01/27	Lot 1
15	Mise en places des bungalows compris raccordement	5 jrs	Lun 25/01/27	Ven 29/01/27	Lot 1
16	Mise en place des coffrets de chantier	2 jrs	Jeu 28/01/27	Ven 29/01/27	Lot 1
17	Repli des installations de chantier	5 jrs	Mar 08/06/27	Mar 15/06/27	Lot 1
18	**ETUDES D'EXECUTION**	**80 jrs**	**Mar 05/01/27**	**Mar 27/04/27**	
19	**Lot 01 - Fondations / Gros Œuvre / VRD**	**30 jrs**	**Mar 05/01/27**	**Lun 15/02/27**	
20	Etude géotechnique G3	2 sem.	Mar 05/01/27	Lun 18/01/27	Lot 1
21	Etudes d'exécution démarrage	3 sem.	Mar 05/01/27	Lun 25/01/27	Lot 1
22	Validation MOE études exécution démarrage	1 sem.	Mar 26/01/27	Lun 01/02/27	MOE
23	Etudes d'exécution structure	4 sem.	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	Lot 1
24	Etudes d'exécution VRD	4 sem.	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	Lot 1
25	Diffusion dossier FT	1 sem.	Mar 26/01/27	Lun 01/02/27	Lot 1
26	Validation MOE	2 sem.	Mar 02/02/27	Lun 15/02/27	MOE
27	**Lot 2 - Charpente / Ossatures bois / Couverture**	**50 jrs**	**Mar 05/01/27**	**Lun 15/03/27**	
28	Etudes d'exécution	4 sem.	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	Lot 2
29	Dossier de FT	2 sem.	Mar 12/01/27	Lun 25/01/27	Lot 2
30	Présentation échantillons	1 sem.	Mar 02/02/27	Lun 08/02/27	Lot 2
31	Validation MOE	2 sem.	Mar 02/02/27	Lun 15/02/27	MOE
32	Approvisionnements / Fabrication	4 sem.	Mar 16/02/27	Lun 15/03/27	Lot 2
33	**Lot 3 - Menuiseries extérieures / Métallerie / Serrurerie**	**60 jrs**	**Mar 05/01/27**	**Mar 30/03/27**	
34	Etudes d'exécution MEX	4 sem.	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	Lot 3
35	Dossier de FT	2 sem.	Mar 12/01/27	Lun 25/01/27	Lot 3
36	Présentation échantillons	1 sem.	Mar 26/01/27	Lun 01/02/27	Lot 3
37	Validation MOE	2 sem.	Mar 02/02/27	Lun 15/02/27	MOE
38	Approvisionnement MEX et des portes	6 sem.	Mar 16/02/27	Mar 30/03/27	Lot 3
39	**Lot 4 - Revêtements de façades**	**70 jrs**	**Mar 05/01/27**	**Mar 13/04/27**	
40	Etudes d'exécution	4 sem.	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	Lot 4
41	Dossier de FT	2 sem.	Mar 12/01/27	Lun 25/01/27	Lot 4
42	Présentation échantillons	1 sem.	Mar 02/02/27	Lun 08/02/27	Lot 4
43	Validation MOE	10 jrs	Mar 02/02/27	Lun 15/02/27	MOE
44	Approvisionnement	8 sem.	Mar 16/02/27	Mar 13/04/27	Lot 4
45	**Lot 5 - Menuiserie Intérieure**	**60 jrs**	**Mar 05/01/27**	**Mar 30/03/27**	
46	Etudes d'exécution	4 sem.	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	Lot 5
47	Dossier de FT	2 sem.	Mar 12/01/27	Lun 25/01/27	Lot 5
48	Présentation échantillons	5 jrs	Mar 02/02/27	Lun 08/02/27	Lot 5
49	Validation MOE	10 jrs	Mar 02/02/27	Lun 15/02/27	MOE
50	Approvisionnement menuiserie intérieure	6 sem.	Mar 16/02/27	Mar 30/03/27	Lot 5
51	**Lot 6 - Cloisons / Plafonds**	**30 jrs**	**Mar 05/01/27**	**Lun 15/02/27**	
52	Etudes d'exécution	4 sem.	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	Lot 6
53	Dossier de FT	2 sem.	Mar 12/01/27	Lun 25/01/27	Lot 6
54	Validation MOE	10 jrs	Mar 02/02/27	Lun 15/02/27	MOE
55	**Lot 7 - Revêtements de sols / Faïences**	**50 jrs**	**Mar 05/01/27**	**Lun 15/03/27**	
56	Etudes d'exécution	4 sem.	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	Lot 7
57	Dossier de FT	2 sem.	Mar 12/01/27	Lun 25/01/27	Lot 7
58	Présentation échantillons	1 sem.	Mar 02/02/27	Lun 08/02/27	Lot 7
59	Validation MOE	10 jrs	Mar 02/02/27	Lun 15/02/27	MOE
60	Approvisionnement carrelage / faïence	4 sem.	Mar 16/02/27	Lun 15/03/27	Lot 7
61	**Lot 9 - Electricité CFO / cfa**	**70 jrs**	**Mar 12/01/27**	**Mar 20/04/27**	
62	Etudes d'exécution	4 sem.	Mar 12/01/27	Lun 08/02/27	Lot 9
63	Dossier de FT	1 sem.	Mar 19/01/27	Lun 25/01/27	Lot 9
64	Validation MOE	2 sem.	Mar 09/02/27	Lun 22/02/27	MOE
65	Approvisionnement appareillages / luminaires	8 sem.	Mar 23/02/27	Mar 20/04/27	Lot 9
66	Approvisionnement TD	8 sem.	Mar 23/02/27	Mar 20/04/27	Lot 9
67	**Lot 10 - Plomberie / Chauffage / Ventilation**	**70 jrs**	**Mar 12/01/27**	**Mar 20/04/27**	
68	Etudes d'exécution	4 sem.	Mar 12/01/27	Lun 08/02/27	Lot 10
69	Dossier de FT	1 sem.	Mar 26/01/27	Lun 01/02/27	Lot 10
70	Validation MOE	2 sem.	Mar 09/02/27	Lun 22/02/27	MOE
71	Approvisionnement de la CTA	8 sem.	Mar 23/02/27	Mar 20/04/27	Lot 10
72	Approvisionnement des radiateurs	4 sem.	Mar 23/03/27	Mar 20/04/27	Lot 10
73	Approvisionnement des équipements sanitaires	4 sem.	Mar 23/03/27	Mar 20/04/27	Lot 10
74	**Lot 11 - Equipements de cuisine**	**80 jrs**	**Mar 05/01/27**	**Mar 27/04/27**	
75	Etudes d'exécution	4 sem.	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	Lot 11
76	Dossier de FT	2 sem.	Mar 12/01/27	Lun 25/01/27	Lot 11

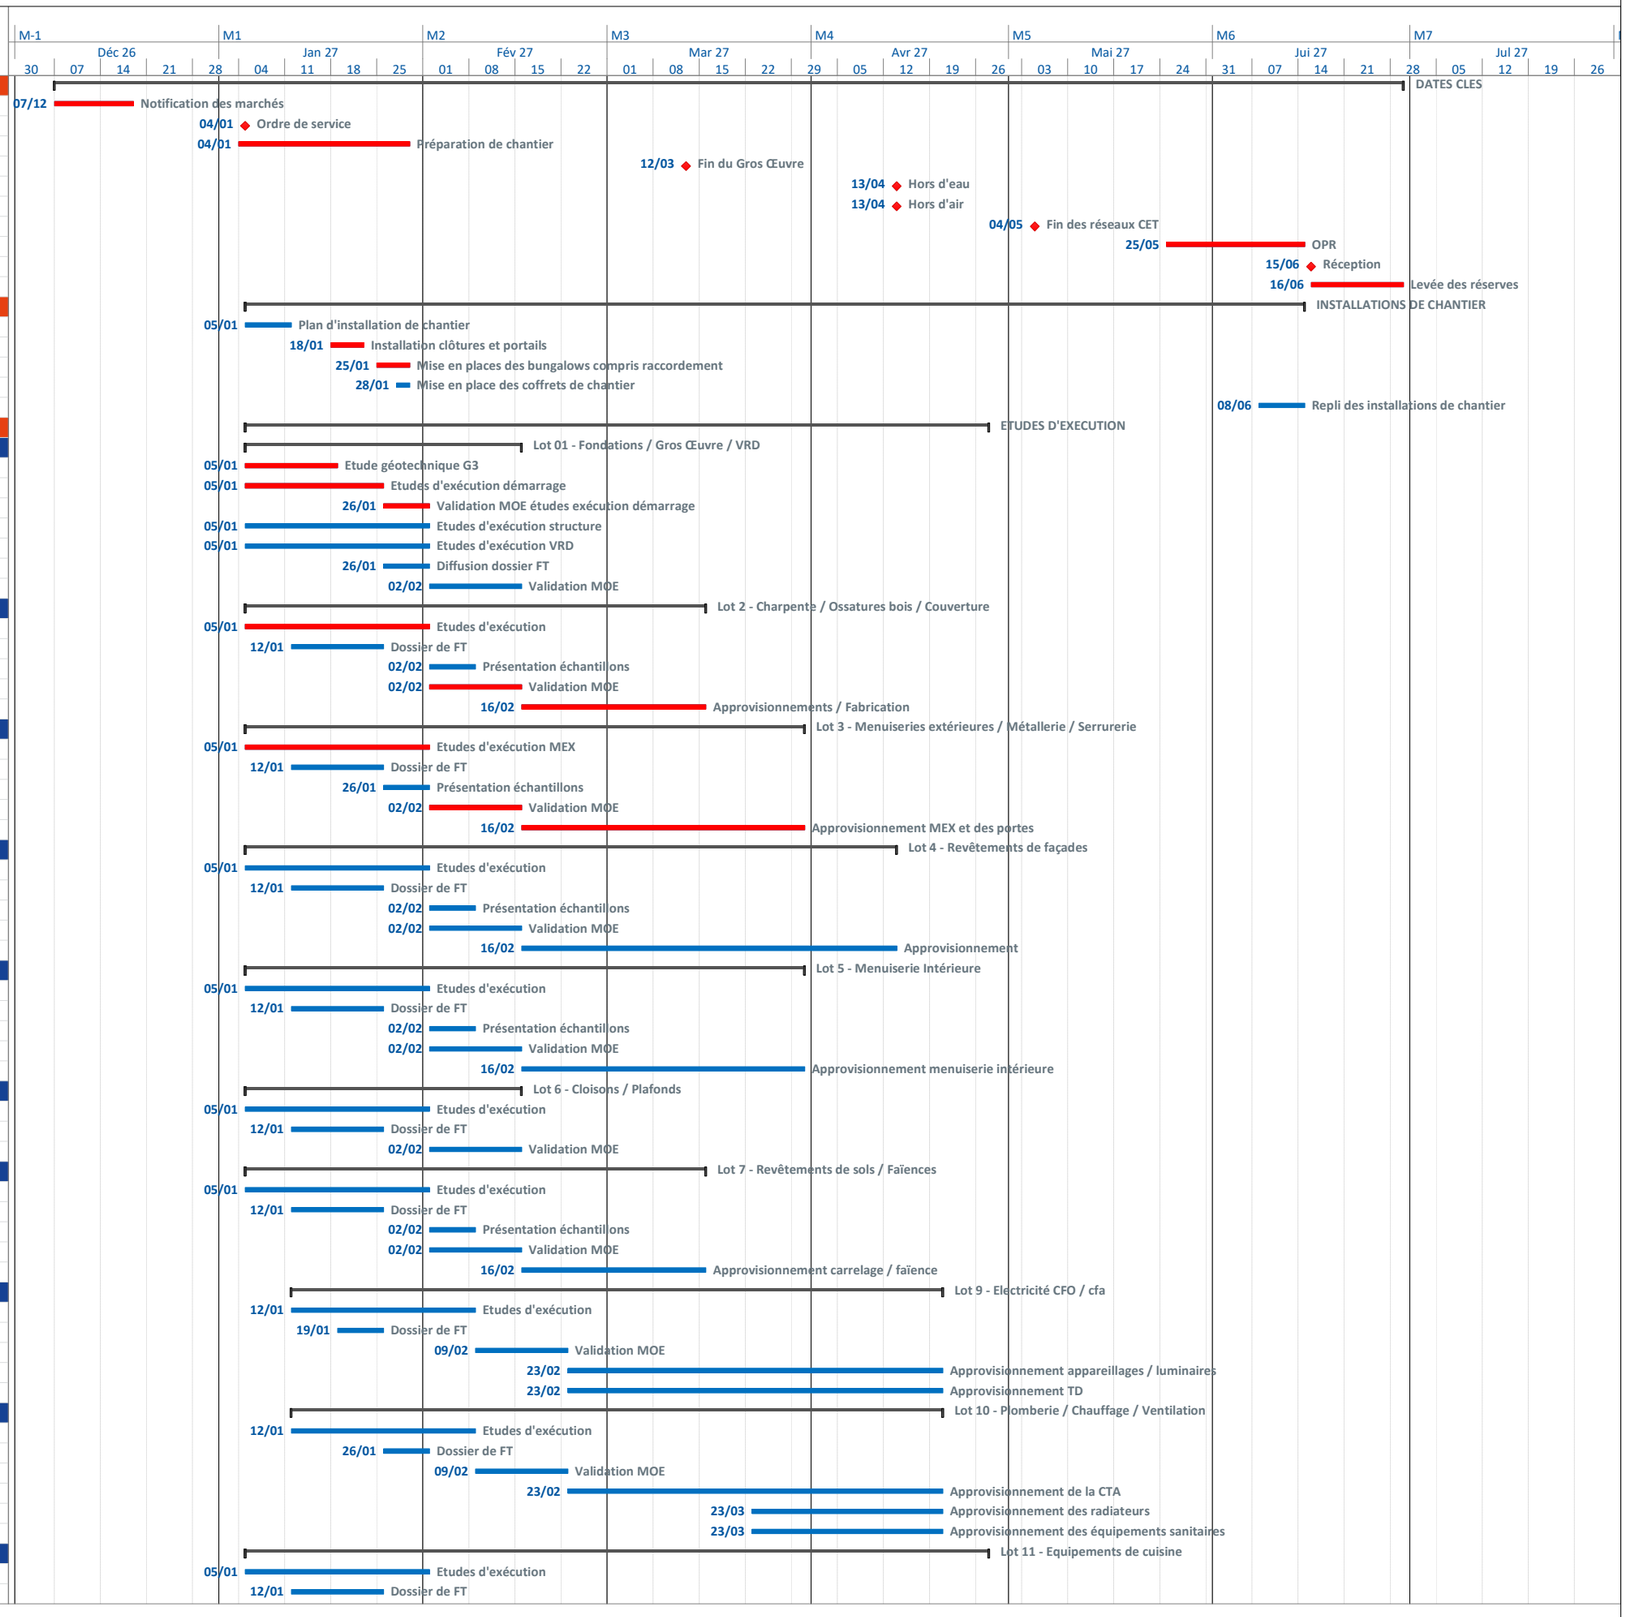

optima CONSTRUCTION

CALENDRIER PREVISIONNEL ETUDES ET TRAVAUX

Construction d'un réfectoire à Bures-sur-Yvette

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Lots
77	Validation MOE	10 jrs	Mar 02/02/27	Lun 15/02/27	MOE
78	Approvisionnement des équipements de cuisine	10 sem.	Mar 16/02/27	Mar 27/04/27	Lot 11
79	**TRAVAUX TCE**	**88 jrs**	**Lun 01/02/27**	**Lun 07/06/27**	
80	**Lot 01 - Fondations / Gros Œuvre / VRD**	**71 jrs**	**Lun 01/02/27**	**Mer 12/05/27**	
81	**Fondations / GO**	**30 jrs**	**Lun 01/02/27**	**Ven 12/03/27**	
82	Préparation / Terrassement vide sanitaire	5 jrs	Lun 01/02/27	Ven 05/02/27	Lot 1
83	Pieux vissés	5 jrs	Lun 08/02/27	Ven 12/02/27	Lot 1
84	Réseaux sous dallage	5 jrs	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27	Lot 1
85	Recépages, massifs et longrines	10 jrs	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27	Lot 1
86	Plancher bas hourdis compris surbots	5 jrs	Lun 08/03/27	Ven 12/03/27	Lot 1
87	Mise à disposition emprise réfectoire pour le lot 2	0 jr	Ven 12/03/27	Ven 12/03/27	Lot 1
88	**Terrasse RDC**	**10 jrs**	**Mer 14/04/27**	**Mar 27/04/27**	
89	Plancher bas terrasse	5 jrs	Mer 14/04/27	Mar 20/04/27	Lot 1
90	Solivage + lames bois terrasse	5 jrs	Mer 21/04/27	Mar 27/04/27	Lot 1
91	**VRD**	**25 jrs**	**Mer 07/04/27**	**Mer 12/05/27**	
92	Pose bac à graisse	5 jrs	Mer 07/04/27	Mar 13/04/27	Lot 1
93	Tranchées, création noue et raccordement réseaux	10 jrs	Mer 07/04/27	Mar 20/04/27	Lot 1
94	Murets de soutènement et remblaiement	5 jrs	Mer 21/04/27	Mar 27/04/27	Lot 1
95	Création voirie et cheminements piétons	10 jrs	Mer 28/04/27	Mer 12/05/27	Lot 1
96	Mise en oeuvre des clôtures de sécurité	5 jrs	Mer 05/05/27	Mer 12/05/27	Lot 1
97	**Lot 2 - Charpente / Ossatures bois / Couverture**	**21 jrs**	**Lun 15/03/27**	**Mar 13/04/27**	
98	Pose des poteaux bois et poteau métallique	2 jrs	Lun 15/03/27	Mar 16/03/27	Lot 2
99	Pose des murs MOB	5 jrs	Mar 16/03/27	Lun 22/03/27	Lot 2
100	Pose de la charpente bois (pannes, contreventements, supports de chéneaux)	5 jrs	Mar 23/03/27	Mar 30/03/27	Lot 2
101	Pose des panneaux sandwich	5 jrs	Mer 31/03/27	Mar 06/04/27	Lot 2
102	Chéneaux et accessoires toiture	5 jrs	Mer 07/04/27	Mar 13/04/27	Lot 2
103	Hors d'eau	0 jr	Mar 13/04/27	Mar 13/04/27	Lot 2
104	**Lot 3 - Menuiseries extérieures / Métallerie / Serrurerie**	**15 jrs**	**Mer 31/03/27**	**Mar 20/04/27**	
105	Pose des MEX et des portes	10 jrs	Mer 31/03/27	Mar 13/04/27	Lot 3
106	Hors d'air	0 jr	Mar 13/04/27	Mar 13/04/27	Lot 3
107	Finitions ouvrages	5 jrs	Mer 14/04/27	Mar 20/04/27	Lot 3
108	**Lot 4 - Revêtements de façades**	**20 jrs**	**Mer 21/04/27**	**Jeu 20/05/27**	
109	Pose bardages façades	15 jrs	Mer 21/04/27	Mer 12/05/27	Lot 4
110	Finitions façades	5 jrs	Jeu 13/05/27	Jeu 20/05/27	Lot 4
111	**Lot 5 - Menuiserie Intérieure**	**30 jrs**	**Mer 14/04/27**	**Jeu 27/05/27**	
112	Pose des blocs portes	2 jrs	Mer 14/04/27	Jeu 15/04/27	Lot 5
113	Façades de gaines, trappes	5 jrs	Mer 05/05/27	Mer 12/05/27	Lot 5
114	Pose des portes et tablettes	5 jrs	Jeu 13/05/27	Jeu 20/05/27	Lot 5
115	Pose des équipements et mobiliers	5 jrs	Ven 21/05/27	Jeu 27/05/27	Lot 5
116	**Lot 6 - Cloisons / Plafonds**	**32 jrs**	**Mer 14/04/27**	**Lun 31/05/27**	
117	Pose doublage / cloisons	5 jrs	Mer 14/04/27	Mar 20/04/27	Lot 6
118	Bandes et finitions	5 jrs	Mer 21/04/27	Mar 27/04/27	Lot 6
119	Pose ossatures faux-plafond	5 jrs	Jeu 13/05/27	Jeu 20/05/27	Lot 6
120	Blanchiment	2 jrs	Ven 28/05/27	Lun 31/05/27	Lot 6
121	**Lot 7 - Revêtements de sols / Faïences**	**15 jrs**	**Mer 21/04/27**	**Mer 12/05/27**	
122	Fourniture des siphons	1 jr	Mer 21/04/27	Mer 21/04/27	Lot 1
123	Pose des platines siphons	2 jrs	Mer 21/04/27	Jeu 22/04/27	Lot 7
124	Chape	5 jrs	Mer 21/04/27	Mar 27/04/27	Lot 7
125	Pose du carrelage / faïence	10 jrs	Mer 28/04/27	Mer 12/05/27	Lot 7
126	**Lot 8 - Peinture / Nettoyage**	**22 jrs**	**Mer 05/05/27**	**Lun 07/06/27**	
127	Enduits préparation peinture	5 jrs	Mer 05/05/27	Mer 12/05/27	Lot 3
128	Peinture	5 jrs	Jeu 13/05/27	Jeu 20/05/27	Lot 3
129	Nettoyage de fin de chantier	2 jrs	Ven 04/06/27	Lun 07/06/27	Lot 3
130	**Lot 9 - Electricité CFO / cfa**	**30 jrs**	**Mer 14/04/27**	**Jeu 27/05/27**	
131	Mise à la terre siphons	1 jr	Ven 23/04/27	Ven 23/04/27	Lot 9
132	Incorporations	5 jrs	Mer 14/04/27	Mar 20/04/27	Lot 9
133	Distribution réseaux CFO/cfa	10 jrs	Mer 21/04/27	Mar 04/05/27	Lot 9
134	Pose et raccordement des TD	5 jrs	Jeu 13/05/27	Jeu 20/05/27	Lot 9
135	Pose des appareillages et terminaux	5 jrs	Ven 21/05/27	Jeu 27/05/27	Lot 9
136	**Lot 10 - Plomberie / Chauffage / Ventilation**	**40 jrs**	**Mer 07/04/27**	**Jeu 03/06/27**	
137	Pose des descentes EP et raccordement	5 jrs	Mer 07/04/27	Mar 13/04/27	Lot 2
138	Réseaux chauffage / ventilation	10 jrs	Mer 14/04/27	Mar 27/04/27	Lot 10
139	Pose et raccordement des équipements techniques	10 jrs	Mer 21/04/27	Mar 04/05/27	Lot 10
140	Réseaux plomberie EF/ECS	5 jrs	Mer 28/04/27	Mar 04/05/27	Lot 10
141	Pose des ballons d'eau chaude	2 jrs	Lun 03/05/27	Mar 04/05/27	Lot 10
142	Pose des terminaux	5 jrs	Ven 21/05/27	Jeu 27/05/27	Lot 10
143	Pose des équipements et raccordements	5 jrs	Ven 28/05/27	Jeu 03/06/27	Lot 10
144	**Lot 11 - Equipements de cuisine**	**17 jrs**	**Mer 05/05/27**	**Lun 31/05/27**	
145	Réseaux frigorifiques	5 jrs	Mer 05/05/27	Jeu 13/05/27	Lot 11
146	Pose des équipements de cuisine	7 jrs	Ven 21/05/27	Lun 31/05/27	Lot 11
147	**PERIODE DE RECEPTION**	**27 jrs**	**Lun 24/05/27**	**Mar 29/06/27**	
148	OPR Extérieurs	5 jrs	Lun 24/05/27	Ven 28/05/27	TCE
149	Essais et mise en service	5 jrs	Ven 28/05/27	Jeu 03/06/27	Lot 9
150	OPR Intérieur	5 jrs	Mar 08/06/27	Lun 14/06/27	TCE
151	Réception	0 jr	Mar 15/06/27	Mar 15/06/27	TCE
152	Levée des réserves	10 jrs	Mer 16/06/27	Mar 29/06/27	TCE

