
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
0		**Planning SSR NUTRITION**	**1546 jours**	**Mar 18/11/25**	**Mar 21/10/**
1		**Phase Consultation**	**344 jours**	**Mar 18/11/25**	**Ven 12/03/2**
2		Phase de programmation	140 jours	Mar 18/11/25	Lun 01/06/26
3		Appel à candidature	0 jour	Ven 11/09/26	Ven 11/09/26
4		Limite question candidats	0 jour	Jeu 22/10/26	Jeu 22/10/26
5		Dépôt des candidatures	0 jour	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
6		Analyse candidatures	26 jours	Ven 30/10/26	Ven 04/12/26
7		Choix des candidats	0 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26
8		Consultation de 3 candidats	0 jour	Lun 07/12/26	Lun 07/12/26
9		Phase offres candidats	35 jours	Lun 14/12/26	Ven 29/01/27
10		**Rendu offres**	0 jour	Ven 29/01/27	Ven 29/01/27
11		Analyse des offres	20 jours	Lun 01/02/27	Ven 26/02/27
12		Choix de la MOE retenue	0 jour	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27
13		Négociation compris mise au point offre	15 jours	Lun 22/02/27	Ven 12/03/27
14		Notification du marché de M	0 jour	Ven 12/03/27	Ven 12/03/27
15		**Phase études**	**359 jours**	**Lun 15/03/27**	**Jeu 27/07/28**
16		Phase diagnostic	20 jours	Lun 15/03/27	Ven 09/04/27
17		Analyse diagnostic par CH	15 jours	Lun 12/04/27	Ven 30/04/27
18		APS	30 jours	Lun 03/05/27	Ven 11/06/27
19		Rendu APS	0 jour	Ven 11/06/27	Ven 11/06/27
20		Examen APS par CH	20 jours	Lun 14/06/27	Ven 09/07/27
21		Validation APS	0 jour	Ven 09/07/27	Ven 09/07/27
22		APD	30 jours	Lun 12/07/27	Ven 20/08/27
23		**Dépôt de permis de constru**	0 jour	Lun 09/08/27	Lun 09/08/27
24		Première validation APD et chiffrage par CH	15 jours	Lun 23/08/27	Ven 10/09/27
25		Réunion revue de conception avec ARS	0 jour	Ven 10/09/27	Ven 10/09/27
26		Revue APD suite à revue de conception avec ARS	5 jours	Lun 13/09/27	Ven 17/09/27
27		PRO/DCE	40 jours	Lun 20/09/27	Ven 12/11/27
28		Instruction permis de constr	110 jours	Lun 09/08/27	Ven 07/01/28
29		Mise au point pièces pour la consultations entreprises et attente retour permis de construire	15 jours	Lun 10/01/28	Ven 28/01/28
30		Validation PRO-DCE par CH	30 jours	Lun 31/01/28	Ven 10/03/28
31		**Lancement consultations entreprises**	0 jour	Ven 10/03/28	Ven 10/03/28
32		Etudes et offres entreprises	40 jours	Lun 13/03/28	Ven 05/05/28
33		Remise des offres entreprise	0 jour	Ven 05/05/28	Ven 05/05/28
34		Analyse des offres des entreprises	40 jours	Lun 08/05/28	Ven 30/06/28
35		Négociations avec entreprises (MAPA)	19 jours	Lun 03/07/28	Jeu 27/07/28
36		**Notification marchés entreprises**	0 jour	Jeu 27/07/28	Jeu 27/07/28
37		**Phase Travaux - réception**	**351 jours**	**Mar 01/08/28**	**Mar 04/12/2**
38		Fin des travaux SMR Marie Laval	0 jour	Mer 15/11/28	Mer 15/11/28



N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
39		Préparation de chantier - plan de retrait amiante	25 jours	Mer 11/10/28	Mar 14/11/28
40		démarrage travaux	0 jour	Mer 15/11/28	Mer 15/11/2
41		Fondation - structrure nouvel acsenseur - escaliers	45 jours	Mer 15/11/28	Mar 16/01/29
42		Installation ascenseur et mise en service	40 jours	Mer 15/11/28	Mar 09/01/29
43		Changement vitrages	110 jours	Mer 15/11/28	Mar 17/04/2
44		Toiture	44 jours	Mer 15/11/28	Lun 15/01/29
45		Neutralisation Août	23 jours	Mar 01/08/28	Jeu 31/08/28
46		ITE - finitions façades	80 jours	Mer 28/03/29	Mar 17/07/2
47		Lots second oeuvre	210 jours	Mer 15/11/28	Mar 04/09/2
48		Lots techniques hors gros oeuvre	225 jours	Mer 15/11/28	Mar 25/09/29
49		Opération préalables à la réception et commission de sécurité	25 jours	Mer 19/09/29	Mar 23/10/29
50		Proposition de réception	0 jour	Mar 23/10/29	Mar 23/10/2
51		Levée des réserves	30 jours	Mer 24/10/29	Mar 04/12/2
52		**Réception**	0 jour	Mar 23/10/29	Mar 23/10/2
53		**Déménagement - garantie**	**520 jours**	**Mer 24/10/29**	**Mar 21/10/3**
54		Mobilier - déménagement	20 jours	Mer 24/10/29	Mar 20/11/2
55		**Inauguration**	0 jour	Mar 20/11/29	Mar 20/11/2
56		Garantie de parfait achèvement (y compris performances	520 jours	Mer 24/10/29	Mar 21/10/31
57		**Fin de la garantie de parfait achèvement**	0 jour	Mar 21/10/31	Mar 21/10/31

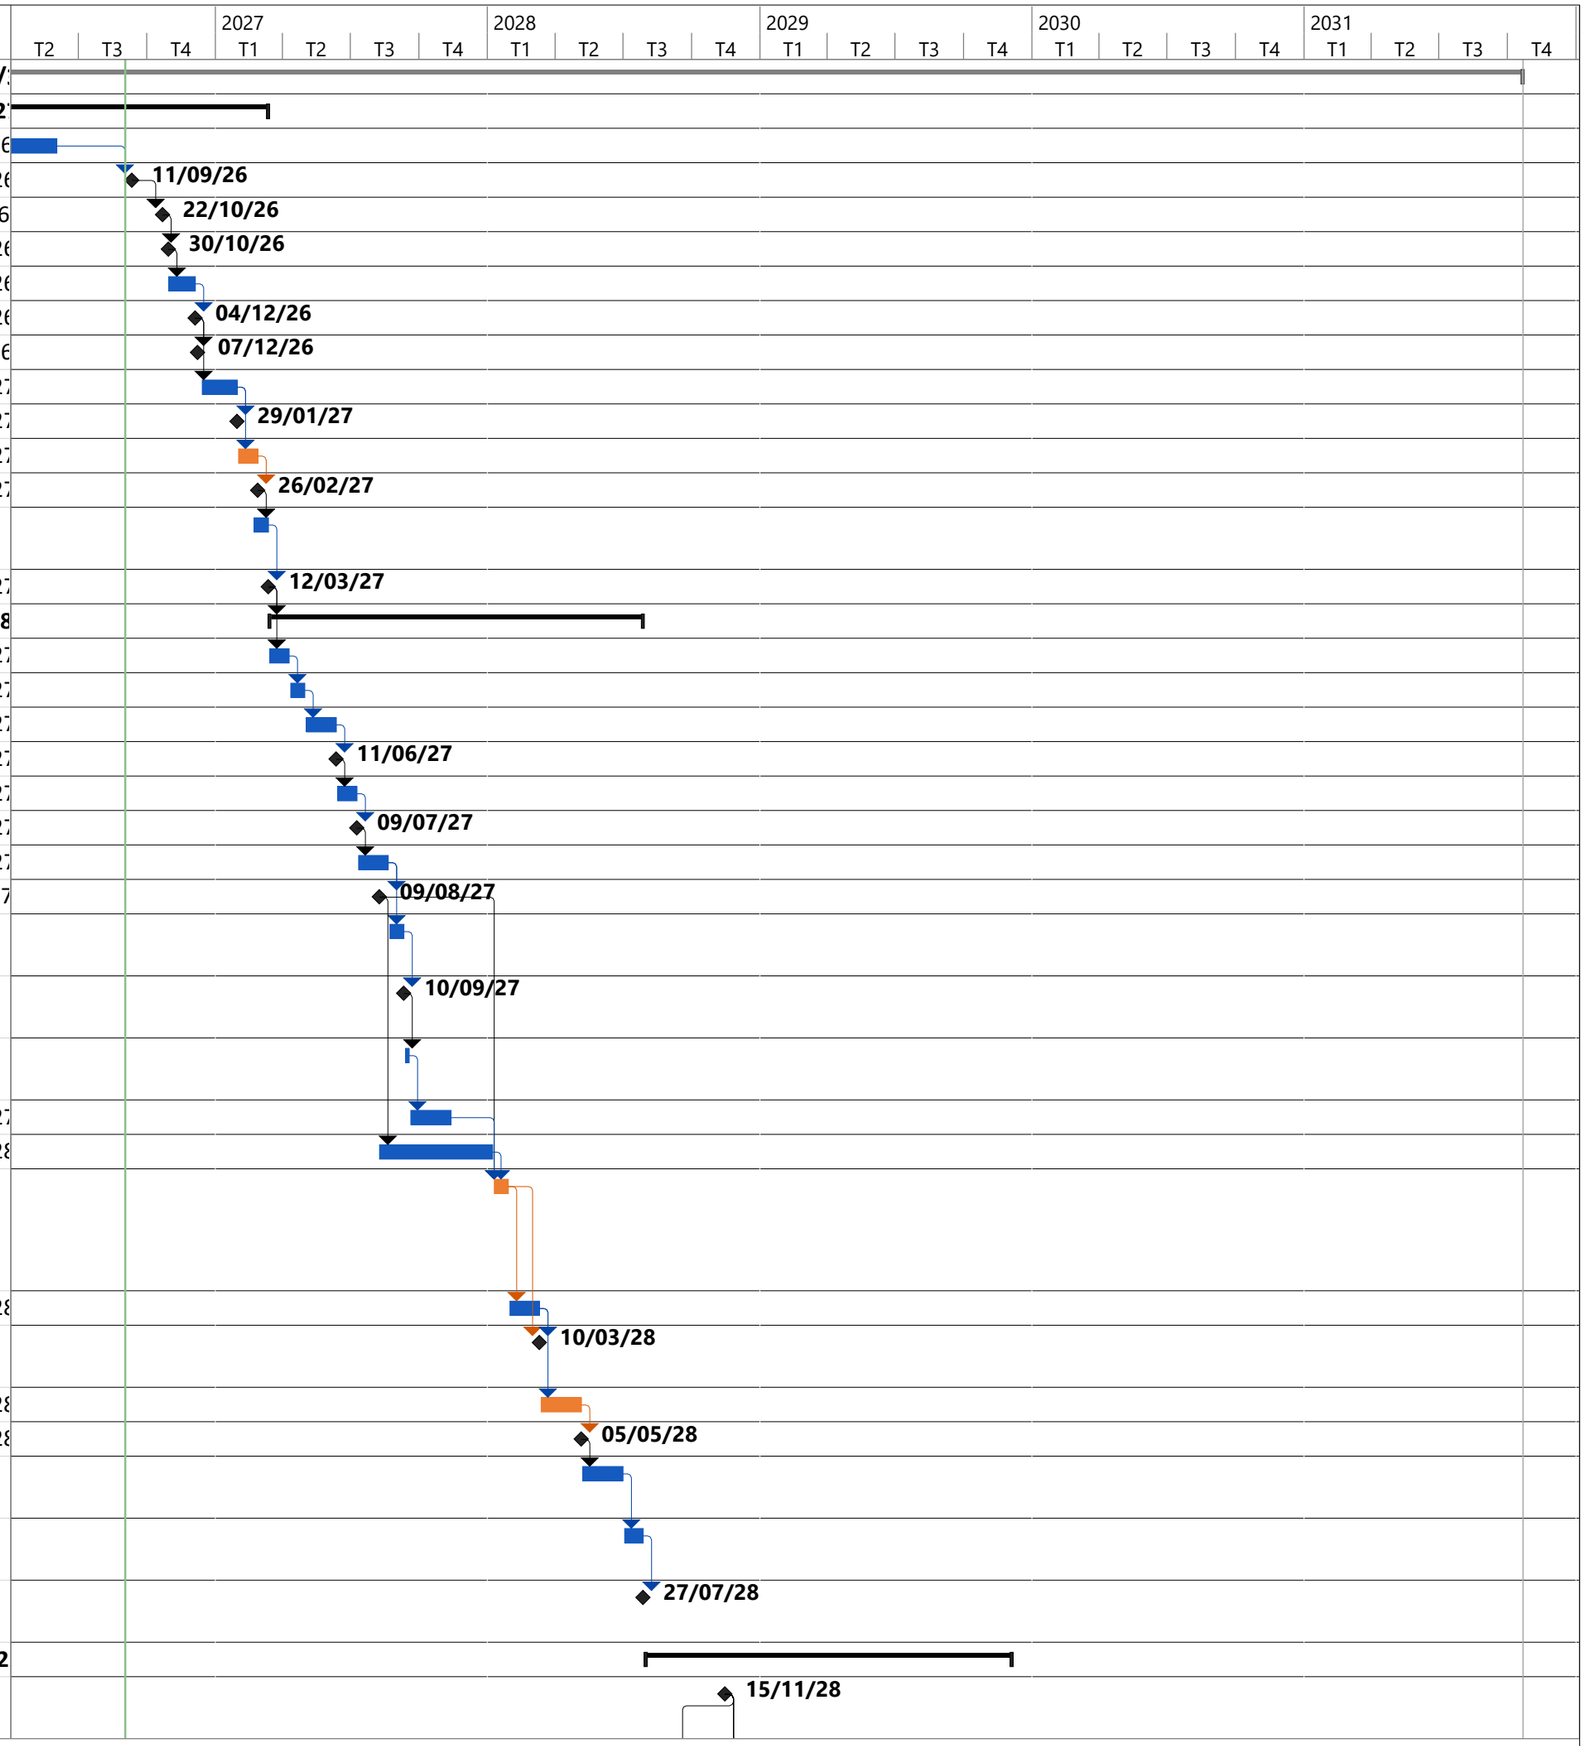
