
DRFIP
REINSTALLATION DES SERVICES ET REAMENAGEMENT DE LA COUR NTERIEURE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE STRASBOURG
35 avenue des Vosges 67 000 Strasbourg

PRINCIPE DE CALENDRIER D'EXECUTION

PHASE DCE-Ind0

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**PHASE 2 - BUREAUX - ESPACE DETENTE ET AMENAGEMENTS DE COUR EXTERIEURE**			
2	PERMIS DE CONSTRUIRE	120 jrs	Lun 15/06/26	Ven 27/11/26
3	OBTENTION DU PC - PURGE DES RECOURS	6 m	Lun 15/06/26	Ven 27/11/26
4	**PREPATION DE CHANTIER**			
5	OS DE DEMARRAGE	1 jr	Mar 01/09/26	Mar 01/09/26
6	**PREPARATION DE CHANTIER**	15 jrs	Mer 02/09/26	Mar 22/09/26
7	Installations de chantier	2 sem.	Mer 02/09/26	Mar 15/09/26
8	Consignation des réseaux	1 sem.	Mer 16/09/26	Mar 22/09/26
9				
10	**SOUS-SOL TRAVAUX ESPACE COURRIER**			
11	DEPOSE DES CLOISONS ET ADAPTATION DES FAUX-PLAFOND AU DROIT DES CLOISONS DEPOSEES	3 jrs	Mer 23/09/26	Ven 25/09/26
12	**NOUVELLES CLOISONS**	9 jrs	Lun 28/09/26	Jeu 08/10/26
13	POSE DE L'OSSATURE ET 1ER PEAU	4 jrs	Lun 28/09/26	Jeu 01/10/26
14	PASSAGE DES FOURREAUX ET RESEAUX DANS CLOISONS ET FAUX-PLAFOND	3 jrs	Ven 02/10/26	Mar 06/10/26
15	POSE DE LA 2EME PEAU	2 jrs	Mer 07/10/26	Jeu 08/10/26
16	POSE DE BLOCS-PORTES	1 jr	Mer 07/10/26	Mer 07/10/26
17	DEVOIEMENT DE RESEAUX EU/EC - EF	2 jrs	Jeu 08/10/26	Ven 09/10/26
18	INTERVENTION SUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - POSTE DE TRAVAIL - ECLAIRAGE - SECURITE INCENDIE ET BAES	5 jrs	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
19	INTERVENTION SUR FAUX-PLAFONDS	4 jrs	Lun 19/10/26	Jeu 22/10/26
20	MISE EN PEINTURE DES LOCAUX	5 jrs	Ven 23/10/26	Jeu 29/10/26
21	REFECTION DES SOLS	5 jrs	Ven 30/10/26	Jeu 05/11/26
22	FINITIONS PEINTURE	3 jrs	Ven 06/11/26	Mar 10/11/26
23	ESSAIS ET MISES EN SERVICE	1 jr	Mer 11/11/26	Mer 11/11/26
24	OPR	1 jr	Jeu 12/11/26	Jeu 12/11/26
25	LEVEES DES RESERVES	3 jrs	Ven 13/11/26	Mar 17/11/26
26	LIBERATION DE LA ZONE	1 jr	Mer 18/11/26	Mer 18/11/26
27				
28	**RDC - BUREAUX THUS**			
29	DEMOLITION - CURAGE	2 jrs	Mer 30/09/26	Jeu 01/10/26
30	**NOUVELLES CLOISONS**	9 jrs	Ven 02/10/26	Mer 14/10/26
31	POSE DE L'OSSATURE ET 1ER PEAU	4 jrs	Ven 02/10/26	Mer 07/10/26
32	PASSAGE DES FOURREAUX ET RESEAUX DANS CLOISONS ET FAUX-PLAFOND	3 jrs	Jeu 08/10/26	Lun 12/10/26
33	POSE DE LA 2EME PEAU	2 jrs	Mar 13/10/26	Mer 14/10/26
34	POSE DE BLOCS-PORTES ET ENSEMBLES MENUISES INTERIEURES	3 jrs	Jeu 15/10/26	Lun 19/10/26
35	DEVOIEMENT DE RESEAUX EU/EC - EF	2 jrs	Mar 20/10/26	Mer 21/10/26
36	DEPLACEMENT DE RADIATEUR Y COMPRIS MODIFICATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE AR	2 jrs	Jeu 22/10/26	Ven 23/10/26
37	VENTILATION DES LOCAUX A POLLUTION SPECIFIQUE	5 jrs	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26
38	INTERVENTION SUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - POSTE DE TRAVAIL - ECLAIRAGE - SECURITE INCENDIE ET BAES	20 jrs	Lun 26/10/26	Ven 20/11/26
39	MISE EN PEINTURE DES LOCAUX - PREPARATION DES SUPPORTS	15 jrs	Mar 20/10/26	Lun 09/11/26
40	FAUX-PLAFONDS	5 jrs	Mar 10/11/26	Lun 16/11/26
41	REFECTION DES SOLS	5 jrs	Mar 17/11/26	Lun 23/11/26
42	FINITION PEINTURE	10 jrs	Mar 24/11/26	Lun 07/12/26
43	ESSAIS ET MISES EN SERVICE	1 jr	Mar 08/12/26	Mar 08/12/26
44	OPR	1 jr	Mer 09/12/26	Mer 09/12/26
45	LEVEES DES RESERVES	2 jrs	Jeu 10/12/26	Ven 11/12/26
46	LIBERATION DE LA ZONE	1 jr	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26
47				
48	**R+1- BUREAUX**			
49	DEMOLITION - CURAGE	1 jr	Lun 05/10/26	Lun 05/10/26
50	DEPLACEMENT DE RADIATEUR Y COMPRIS MODIFICATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE AR	1 jr	Mar 06/10/26	Mar 06/10/26
51	INTERVENTION SUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - POSTE DE TRAVAIL - ECLAIRAGE - SECURITE INCENDIE ET BAES	1 jr	Mer 07/10/26	Mer 07/10/26
52	MISE EN PEINTURE DES LOCAUX - PREPARATION DES SUPPORTS	15 jrs	Jeu 08/10/26	Mer 28/10/26
53	FAUX-PLAFONDS	7 jrs	Jeu 29/10/26	Ven 06/11/26
54	REFECTION DES SOLS	5 jrs	Lun 09/11/26	Ven 13/11/26
55	FINITION PEINTURE	10 jrs	Lun 16/11/26	Ven 27/11/26
56	ESSAIS ET MISES EN SERVICE	1 jr	Lun 30/11/26	Lun 30/11/26
57	OPR	1 jr	Mar 01/12/26	Mar 01/12/26
58	LEVEES DES RESERVES	2 jrs	Mer 02/12/26	Jeu 03/12/26
59	LIBERATION DE LA ZONE	1 jr	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26
60				
61	**SOUS-SOL - TRAVAUX LOCAL MENAGE - SANITAIRE PMR - ESPACE DETENTE - LOCAL ARCHIVES - LOCAL CTA - DEGAGEMENT 9**			
62	DEMOLITION - CURAGE	4 jrs	Ven 18/12/26	Mer 23/12/26
63	REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES (pm : plans d'exécution et frabication à engager dès la diffusion de l'OS de démarrage)	3 jrs	Jeu 24/12/26	Lun 28/12/26
64	**INTERVENTION LOCAL CTA**	12 jrs	Mar 29/12/26	Mer 13/01/27
65	MUR PARPAING CF1H LOCAL CTA	10 jrs	Mar 29/12/26	Lun 11/01/27
66	POSE DE BLOC-PORTE	1 jr	Mar 12/01/27	Mar 12/01/27
67	INTERVENTIONS ELECTRIQUES - SSI	1 jr	Mer 13/01/27	Mer 13/01/27
68	**NOUVELLES CLOISONS**	9 jrs	Jeu 24/12/26	Mar 05/01/27
69	POSE DE L'OSSATURE ET 1ER PEAU	4 jrs	Jeu 24/12/26	Mar 29/12/26
70	PASSAGE DES FOURREAUX ET RESEAUX DANS CLOISONS ET FAUX-PLAFOND	3 jrs	Mer 30/12/26	Ven 01/01/27
71	POSE DE LA 2EME PEAU	2 jrs	Lun 04/01/27	Mar 05/01/27
72	FLOCAGE ACOUSTIQUE - THERMIQUE ET COUPE-FEU DES LOCAUX	1 jr	Mer 06/01/27	Mer 06/01/27
73	MISE EN PEINTURE DES LOCAUX - PREPARATION DES SUPPORTS	15 jrs	Jeu 07/01/27	Mer 27/01/27
74	REFECTION DES SOL	5 jrs	Jeu 28/01/27	Mer 03/02/27
75	POSE DE BLOCS-PORTES ET ENSEMBLES MENUISES INTERIEURES	3 jrs	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27
76	DEVOIEMENT DE RESEAUX EU/EC - EF	2 jrs	Mar 09/02/27	Mer 10/02/27
77	DEPLACEMENT DE RADIATEUR Y COMPRIS MODIFICATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE AR	2 jrs	Jeu 11/02/27	Ven 12/02/27
78	VENTILATION DES LOCAUX A POLLUTION SPECIFIQUE	2 jrs	Lun 15/02/27	Mar 16/02/27
79	INTERVENTION SUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - POSTE DE TRAVAIL - ECLAIRAGE - SECURITE INCENDIE ET BAES	5 jrs	Mer 17/02/27	Mar 23/02/27
80	FAUX - PLAFONDS	5 jrs	Mer 24/02/27	Mar 02/03/27
81	INSTALLATION DU MOBILIER INTERIEUR	3 jrs	Mer 03/03/27	Ven 05/03/27
82	FAIENCE DE CREDENCE ET SANITAIRES	4 jrs	Lun 08/03/27	Jeu 11/03/27
83	FINITION PEINTURE	5 jrs	Ven 12/03/27	Jeu 18/03/27
84	ESSAIS ET MISES EN SERVICE	1 jr	Ven 19/03/27	Ven 19/03/27
85	OPR	1 jr	Lun 22/03/27	Lun 22/03/27
86	LEVEES DES RESERVES	3 jrs	Mar 23/03/27	Jeu 25/03/27
87	LIBERATION DE LA ZONE	1 jr	Ven 26/03/27	Ven 26/03/27
88				
89	**TRAVAUX EXTERIEURS - VRD - RAVALEMENTS DE FACADE**		Lun 30/11/26	
90	RAVALEMENTS DE FACADE / SERRURERIE	47 jrs	Lun 30/11/26	Mar 02/02/27
91	Travaux de ravalement	47 jrs	Lun 30/11/26	Mar 02/02/27
92	Mise en place des échafaudages	2 jrs	Lun 30/11/26	Mar 01/12/26
93	Dégarnissage des façades	2 jrs	Lun 07/12/26	Mar 08/12/26
94	Travaux de ravalements	2 m	Mer 09/12/26	Mar 02/02/27
95	ETUDE DE SOL ET FOUILLES ARCHEOLOGIQUES	15 jrs	Mer 02/09/26	Ven 23/10/26
96	**TRAVAUX EXTERIEURS - VRD**	83 jrs?	Lun 30/11/26	Mer 24/03/27
97	TERRASSEMENTS	10 jrs	Lun 30/11/26	Ven 11/12/26
98	**EPMR**	51 jrs	Lun 14/12/26	Lun 22/02/27
99	GAINE BETON EPMR EXTERIEUR	10 jrs	Lun 14/12/26	Ven 25/12/26
100	FABIRCATION EPMR	6 sem.	Lun 28/12/26	Ven 05/02/27
101	MISE EN PLACE EPMR	10 jrs	Lun 08/02/27	Ven 19/02/27
102	ESSAIS ET MISES EN SERVICE	1 jr	Lun 22/02/27	Lun 22/02/27
103	TERRASSE EN BETON - FACON DE GRADIN ET EMMARCHEMENTS EXTERIEURS	2 m	Lun 14/12/26	Ven 05/02/27
104	LOCAUX EXTERIEURS - CHEMINEMENTS - ECLAIRAGE	2 m	Lun 14/12/26	Ven 05/02/27
105	PLANTATIONS	10 jrs	Lun 08/02/27	Ven 19/02/27
106	RECEPTION DES TRAVAUX			
107	OPR	5 jrs	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27
108	Levée des réserves	10 jrs	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27
109	Vérification des levées de réserves	1 jr	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
110				
111	**PHASE DE RECEPTION FINALE DU CHANTIER**	13 jrs	Lun 08/03/27	Mer 24/03/27
112	OPR	2 jrs	Lun 08/03/27	Mar 09/03/27
113	LEVEES DES RESERVES	5 jrs	Mer 10/03/27	Mar 16/03/27
114	VERIFICATION DES LEVEES DE RESERVES	5 jrs	Mer 17/03/27	Mar 23/03/27
115	RECEPTION	1 jr	Mer 24/03/27	Mer 24/03/27

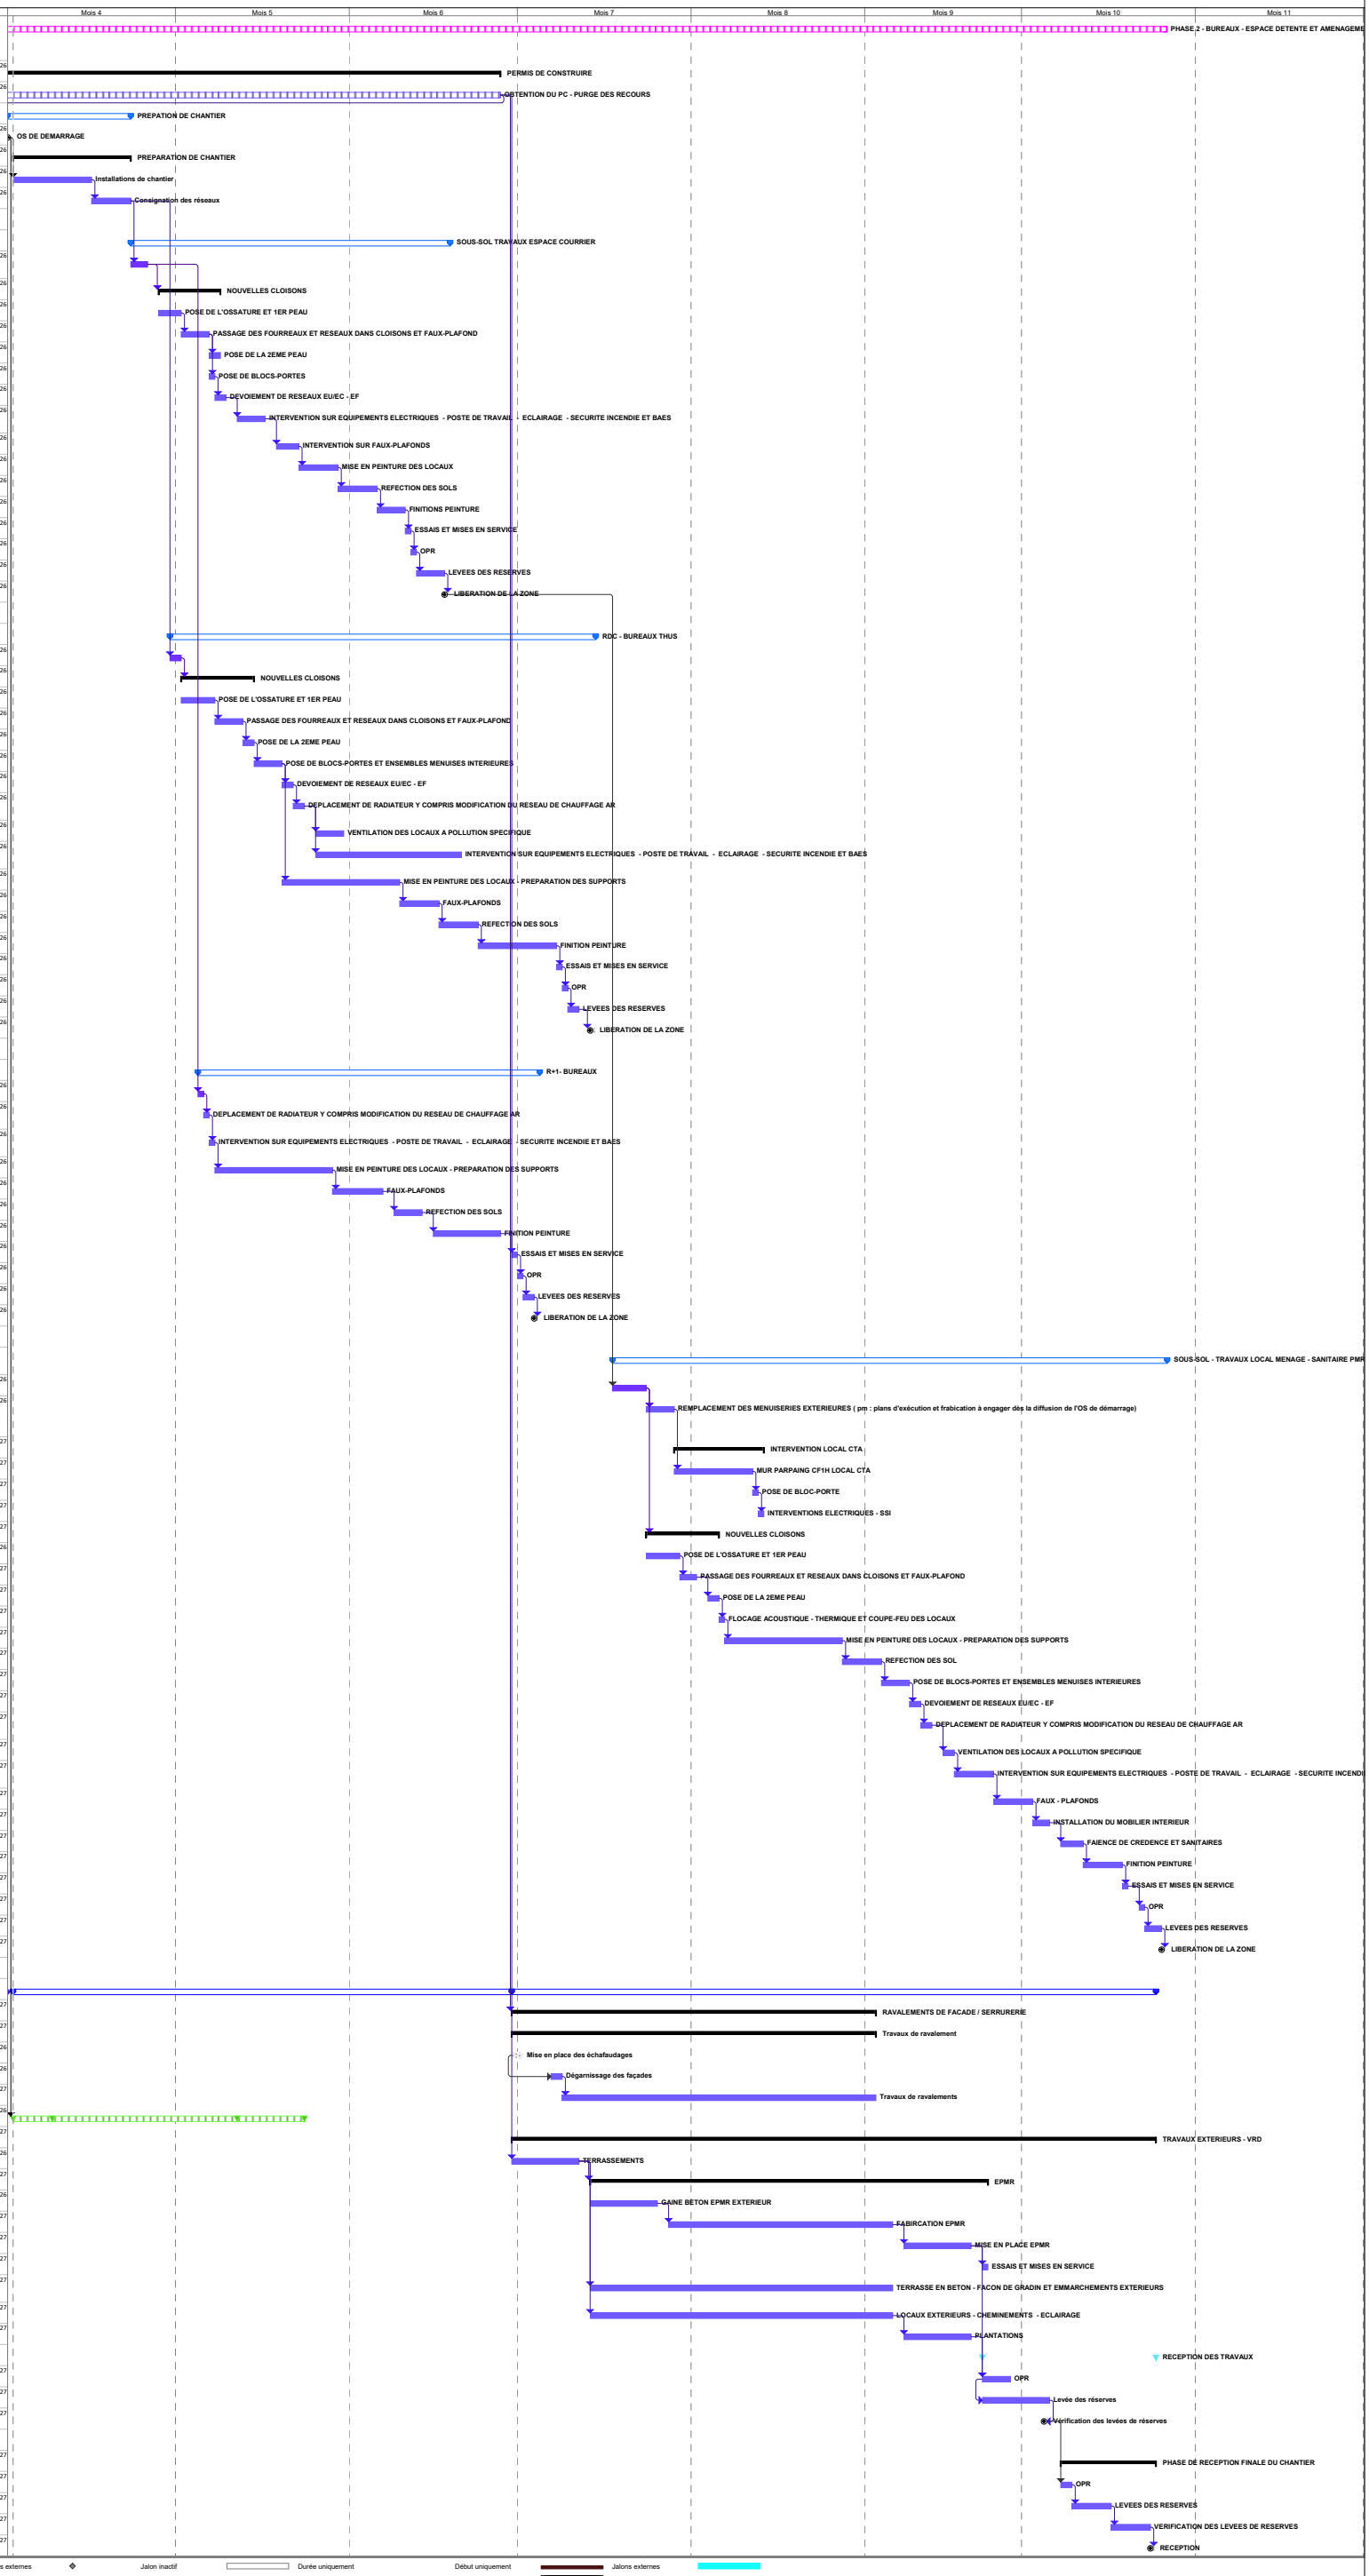

Projet : PLANNING VOSGES_35-DCE
Date : Mer 02/09/26

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâches externes · Jalons externes · Tâche inactive · Jalon inactif · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Avancement · Échéance
