
SGAMI OUEST

Aménagement d'une nouvelle soute à munitions

N°	Nom de la tâche	Durée
1	OS ENTRPRISES	0 jour
2	Préparation de chantier	42 jours
3	VISAS	10 jours
4	Elaboration plan de retrait	5 jours
5	Dépôt plan de retrait	35 jours
6	Déménagement (MOA)	5 jours
7	**Chantier**	**95 jours**
8	**LOT 01 DESAMIANTAGE**	**20 jours**
9	Confinement	5 jours
10	Dépose de la couverture	10 jours
11	Repli confinement et analyse	5 jours
12	**LOT 02 VRD phase 1**	**10 jours**
13	Dépose des bornes de protection en beton	2 jours
14	Reprise du réseau EP	10 jours
15	**LOT 03 DEMOLITION - GROS OEUVRE**	**65 jours**
16	Installation base vie	5 jours
17	Démolition/curage	10 jours
18	Ouverture de baies	3 jours
19	Bouchement de baies	15 jours
20	Traitement des facades	10 jours
21	Ravalement	25 jours
22	Nettoyage du dallage	5 jours
23	**LOT 04 COUVERTURE - DESENFUMAGE**	**75 jours**
24	Echafaudage	75 jours
25	Pose des filets de sécurité	10 jours
26	Couverture simple peau	20 jours
27	Désenfumage + commande	10 jours
28	Ecran de cantonnement	3 jours
29	Gouttieres	10 jours
30	Descentes EP+dauphins fonte	5 jours
31	Plan d'évacuation	1 jour
32	**LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES**	**45 jours**
33	Depose des portes pietonnes	1 jour
34	Pose des portes sectionnelles	5 jours
35	Pose des portes piétonnes	3 jours
36	Grilles de ventilations	2 jours
37	**LOT 06 ELECTRICITE**	**25 jours**
38	Terre et liaisons équiotentielles	2 jours
39	Chemin de câble et câblage CF/Cf	10 jours
40	Eclairage	5 jours
41	Eclairage de sécurité	5 jours
42	Appareillage	5 jours
43	TGBT	5 jours
44	SSI	10 jours
45	Alarme intrusion	5 jours
46	**LOT 02 VRD phase 1**	**14 jours**
47	Clotures et portails	10 jours
48	Remise en état des EV	5 jours
49	OPR	0 jour
50	Levée des réserves	10 jours
51	**Réception**	**0 jour**

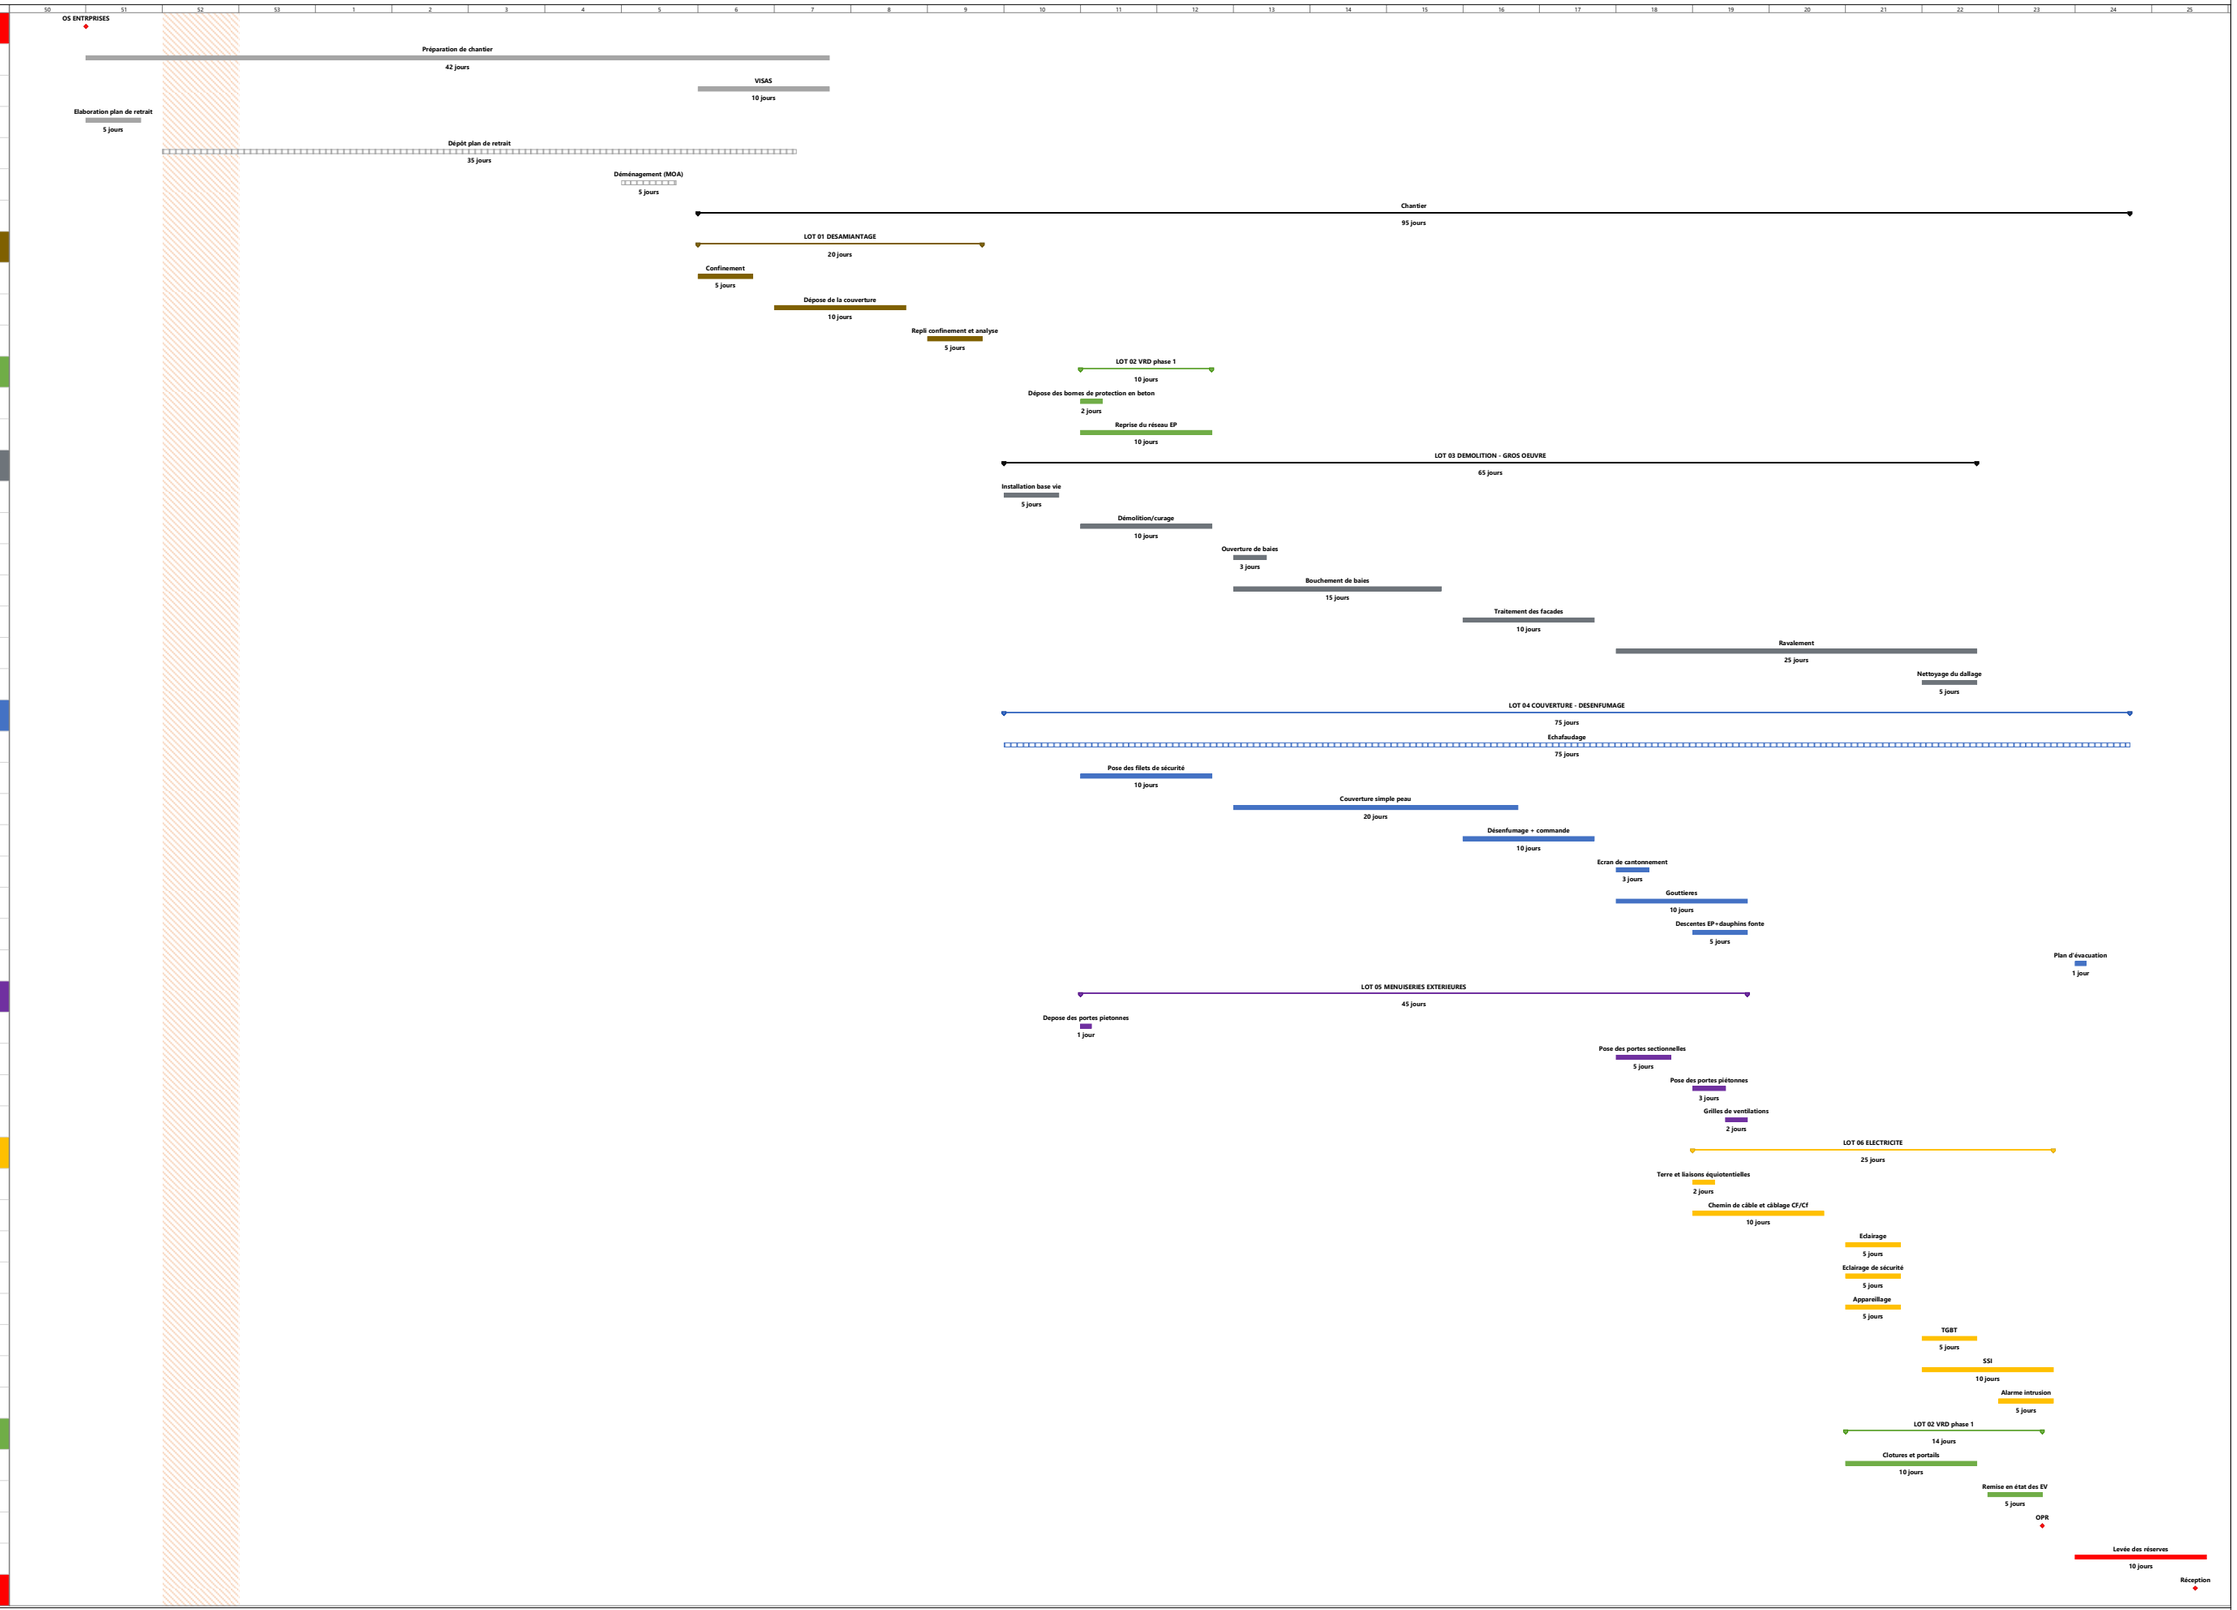

VOLUME Architectes
60, Rue des Hacquets
76230 QUINCAMPOIX
