
Faculté des métiers - Ker Lann - BRUZ

PLANNNG DCE - COMPRIS CONGES PAYES HORS INTEMPERIES

N°	Mode de la Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**Délai global**	**282 jrs**	**Jeu 15/10/26**	**Ven 17/12/27**
2		**Administratif**	**22 jrs**	**Jeu 15/10/26**	**Ven 13/11/26**
3		OS ETUDES	0 jr	Jeu 15/10/26	Jeu 15/10/26
4		Période de préparation	22 jrs	Jeu 15/10/26	Ven 13/11/26
5		OS TRAVAUX	0 jr	Ven 13/11/26	Ven 13/11/26
6		**TRAVAUX**	**260 jrs**	**Lun 16/11/26**	**Ven 17/12/27**
7		**Barette 1 Sud - PHASE 1**	**27 jrs**	**Lun 16/11/26**	**Mar 05/01/27**
8		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26
9		Dépose des équipements technique en toiture	15 jrs	Lun 23/11/26	Ven 11/12/26
10		Réfection étanchéité (dépose - repose)	15 jrs	Mer 25/11/26	Mar 15/12/26
11		Dépose / Repose des équipements technique en toiture	5 jrs	Mar 01/12/26	Lun 07/12/26
12		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Mer 16/12/26	Mar 05/01/27
13		**Barrette 1 Nord - PHASE 2**	**22 jrs**	**Mer 06/01/27**	**Jeu 04/02/27**
14		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Mer 06/01/27	Mar 12/01/27
15		Dépose des équipements technique en toiture	10 jrs	Mer 13/01/27	Mar 26/01/27
16		Réfection étanchéité (dépose - repose)	10 jrs	Ven 15/01/27	Jeu 28/01/27
17		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Ven 29/01/27	Jeu 04/02/27
18		**Barrette 2 Nord - PHASE 3**	**22 jrs**	**Ven 05/02/27**	**Lun 08/03/27**
19		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Ven 05/02/27	Jeu 11/02/27
20		Dépose des équipements technique en toiture	10 jrs	Ven 12/02/27	Jeu 25/02/27
21		Réfection étanchéité (dépose - repose)	10 jrs	Mar 16/02/27	Lun 01/03/27
22		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Mar 02/03/27	Lun 08/03/27
23		**Barrette 3 Nord - PHASE 4**	**20 jrs**	**Mar 09/03/27**	**Lun 05/04/27**
24		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Mar 09/03/27	Lun 15/03/27
25		Dépose des équipements technique en toiture	8 jrs	Mar 16/03/27	Jeu 25/03/27
26		Réfection étanchéité (dépose - repose)	8 jrs	Jeu 18/03/27	Lun 29/03/27
27		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Mar 30/03/27	Lun 05/04/27
28		**Barrette 4 Nord - PHASE 5**	**20 jrs**	**Mar 06/04/27**	**Lun 03/05/27**
29		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Mar 06/04/27	Lun 12/04/27
30		Dépose des équipements technique en toiture	8 jrs	Mar 13/04/27	Jeu 22/04/27
31		Réfection étanchéité (dépose - repose)	8 jrs	Jeu 15/04/27	Lun 26/04/27
32		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Mar 27/04/27	Lun 03/05/27
33		**Barrette 5 Nord - PHASE 6**	**20 jrs**	**Mar 04/05/27**	**Lun 31/05/27**
34		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Mar 04/05/27	Lun 10/05/27
35		Dépose des équipements technique en toiture	8 jrs	Mar 11/05/27	Jeu 20/05/27
36		Réfection étanchéité (dépose - repose)	8 jrs	Jeu 13/05/27	Lun 24/05/27
37		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Mar 25/05/27	Lun 31/05/27
38		**Barrette 6 Nord - PHASE 7**	**20 jrs**	**Mar 01/06/27**	**Lun 19/07/27**
39		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Mar 01/06/27	Lun 07/06/27
40		Dépose des équipements technique en toiture	8 jrs	Mar 08/06/27	Jeu 08/07/27
41		Réfection étanchéité (dépose - repose)	8 jrs	Jeu 10/06/27	Lun 12/07/27
42		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Mar 13/07/27	Lun 19/07/27

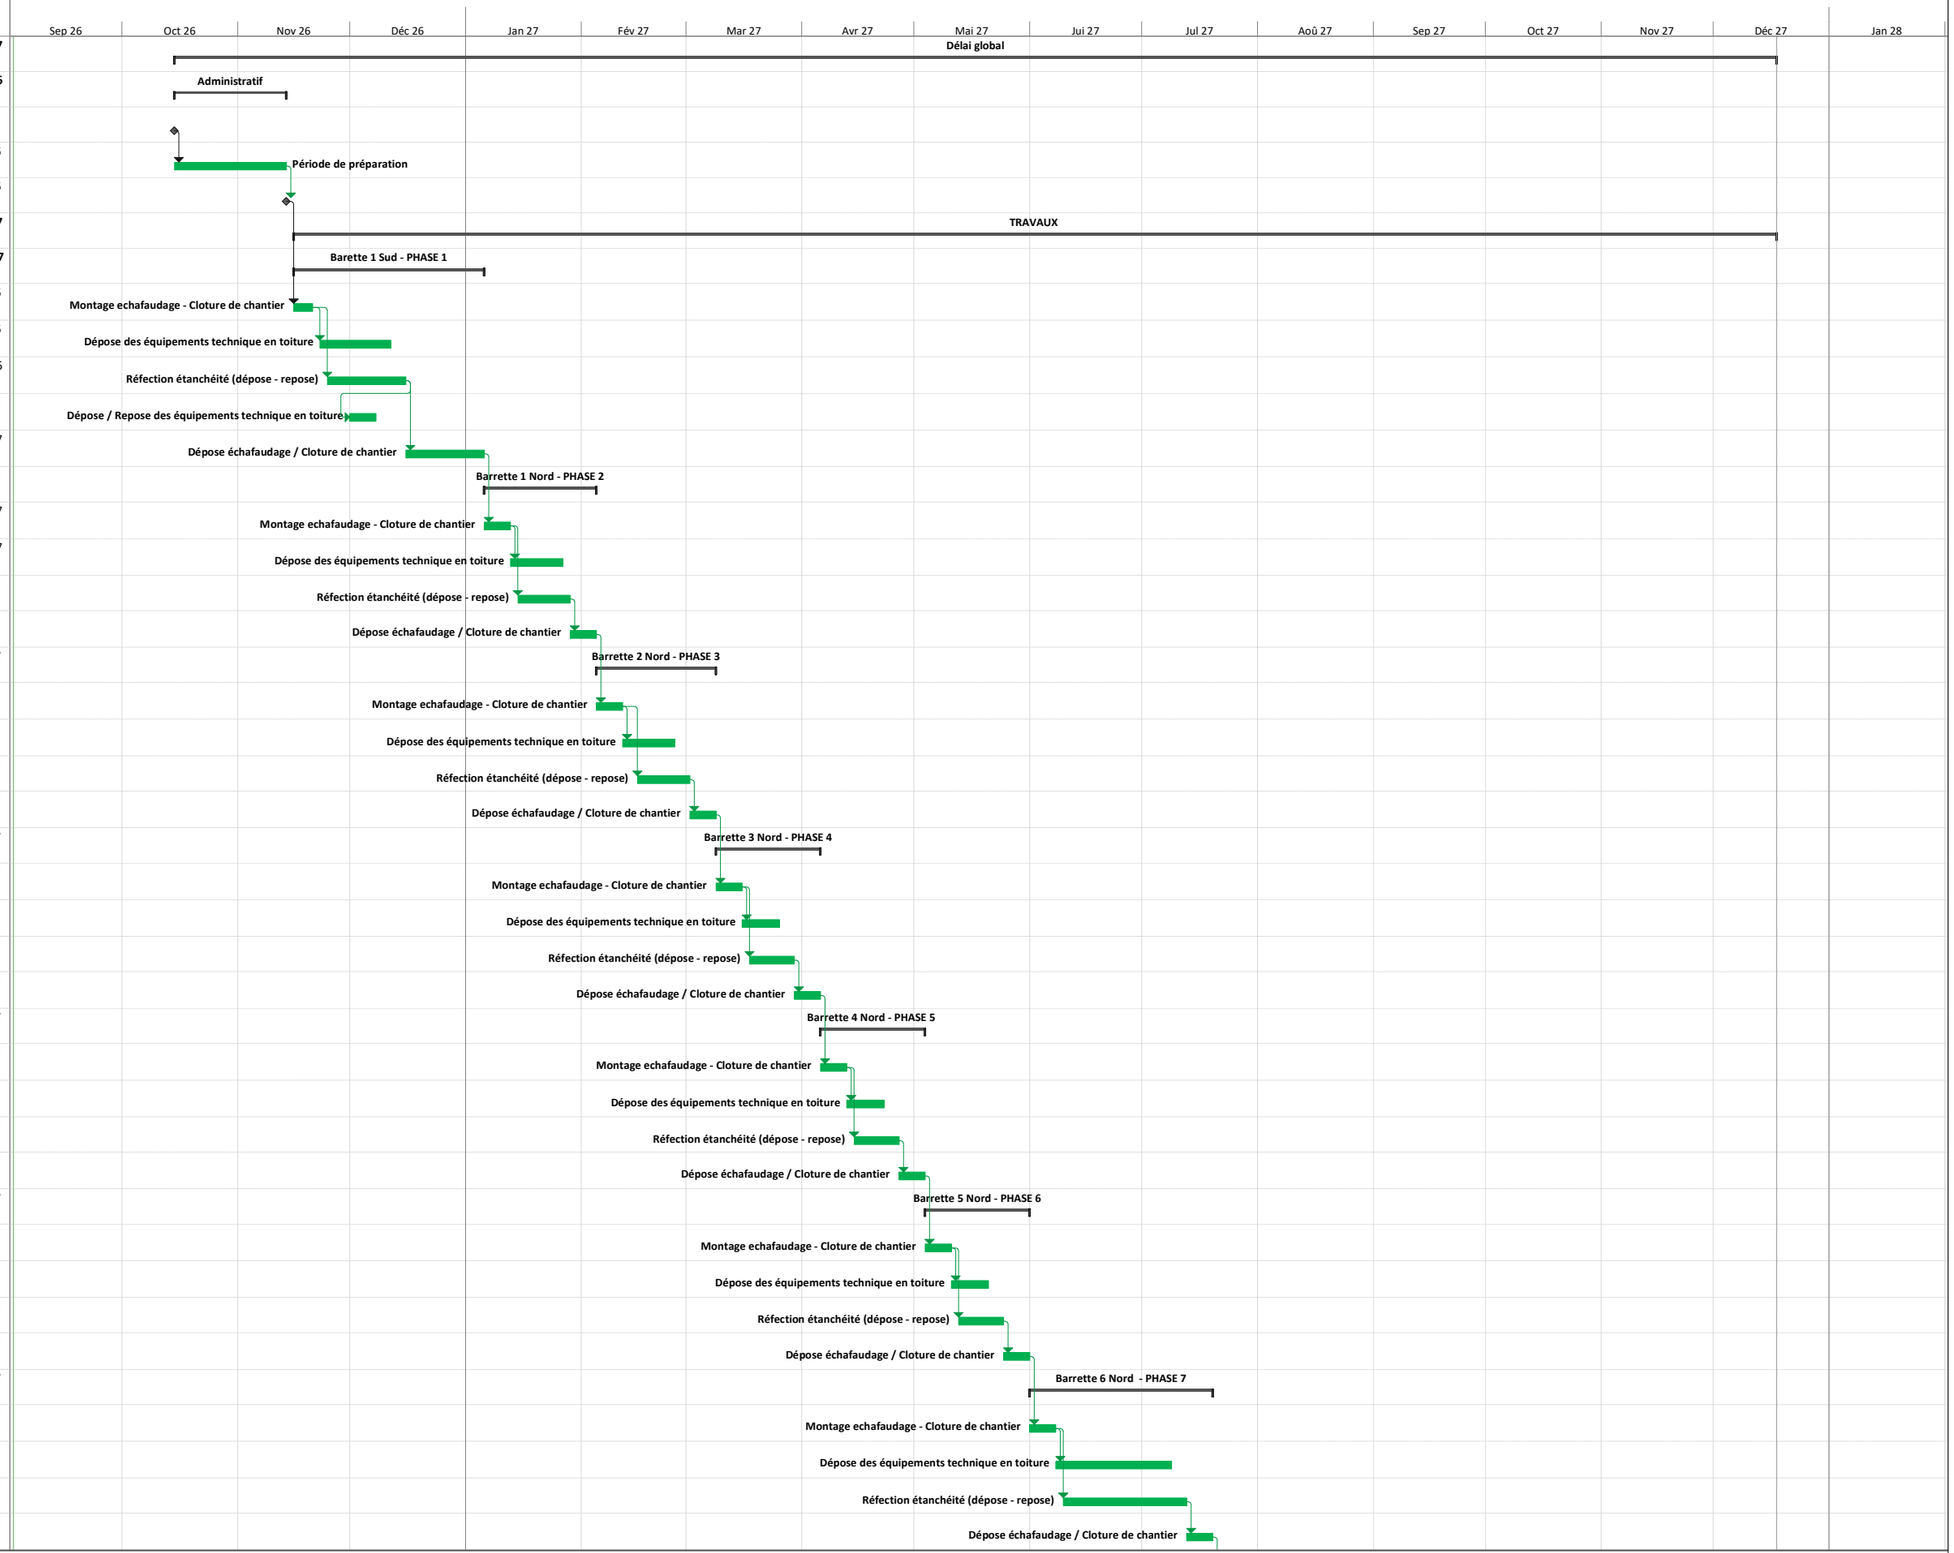

Faculté des métiers - Ker Lann - BRUZ

PLANNNG DCE - COMPRIS CONGES PAYES HORS INTEMPERIES

N°	Mode de Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
43		**Barrette 7 Nord - PHASE 8**	**21 jrs**	**Mar 20/07/27**	**Mar 17/08/27**
44		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Mar 20/07/27	Lun 26/07/27
45		Dépose des équipements technique en toiture	9 jrs	Mar 27/07/27	Ven 06/08/27
46		Réfection étanchéité (dépose - repose)	9 jrs	Jeu 29/07/27	Mar 10/08/27
47		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Mer 11/08/27	Mar 17/08/27
48		**Barrette 7 Sud - PHASE 9**	**21 jrs**	**Mer 18/08/27**	**Mer 15/09/27**
49		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Mer 18/08/27	Mar 24/08/27
50		Dépose des équipements technique en toiture	9 jrs	Mer 25/08/27	Lun 06/09/27
51		Réfection étanchéité (dépose - repose)	9 jrs	Ven 27/08/27	Mer 08/09/27
52		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Jeu 09/09/27	Mer 15/09/27
53		**Barrette 6 Sud - PHASE 10**	**24 jrs**	**Jeu 16/09/27**	**Mar 19/10/27**
54		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Jeu 16/09/27	Mer 22/09/27
55		Dépose des équipements technique en toiture	12 jrs	Jeu 23/09/27	Ven 08/10/27
56		Réfection étanchéité (dépose - repose)	12 jrs	Lun 27/09/27	Mar 12/10/27
57		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Mer 13/10/27	Mar 19/10/27
58		**Barrette 5 Sud - PHASE 11**	**22 jrs**	**Mer 20/10/27**	**Jeu 18/11/27**
59		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Mer 20/10/27	Mar 26/10/27
60		Dépose des équipements technique en toiture	10 jrs	Mer 27/10/27	Mar 09/11/27
61		Réfection étanchéité (dépose - repose)	10 jrs	Ven 29/10/27	Jeu 11/11/27
62		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Ven 12/11/27	Jeu 18/11/27
63		**Barrette 4 Sud - PHASE 12**	**21 jrs**	**Ven 19/11/27**	**Ven 17/12/27**
64		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Ven 19/11/27	Jeu 25/11/27
65		Dépose des équipements technique en toiture	9 jrs	Ven 26/11/27	Mer 08/12/27
66		Réfection étanchéité (dépose - repose)	9 jrs	Mar 30/11/27	Ven 10/12/27
67		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Lun 13/12/27	Ven 17/12/27
68		**Barrette centrale haute - PHASE 10 à 12**	**52 jrs**	**Mar 27/07/27**	**Mer 06/10/27**
69		Pose garde corps	5 jrs	Mar 27/07/27	Lun 02/08/27
70		Dépose des équipements technique en toiture	40 jrs	Mar 03/08/27	Lun 27/09/27
71		Réfection étanchéité (dépose - repose)	40 jrs	Jeu 05/08/27	Mer 29/09/27
72		Dépose repose équipement	40 jrs	Jeu 05/08/27	Mer 29/09/27
73		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Jeu 30/09/27	Mer 06/10/27
74		**Barrette 3 Sud - PHASE 13**	**21 jrs**	**Jeu 07/10/27**	**Jeu 04/11/27**
75		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Jeu 07/10/27	Mer 13/10/27
76		Dépose des équipements technique en toiture	9 jrs	Jeu 14/10/27	Mar 26/10/27
77		Réfection étanchéité (dépose - repose)	9 jrs	Lun 18/10/27	Jeu 28/10/27
78		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Ven 29/10/27	Jeu 04/11/27
79		**Barrette 2 Sud - PHASE 14**	**24 jrs**	**Ven 05/11/27**	**Mer 08/12/27**
80		Montage echafaudage - Cloture de chantier	5 jrs	Ven 05/11/27	Jeu 11/11/27
81		Dépose des équipements technique en toiture	12 jrs	Ven 12/11/27	Lun 29/11/27
82		Réfection étanchéité (dépose - repose)	12 jrs	Mar 16/11/27	Mer 01/12/27
83		Dépose échafaudage / Cloture de chantier	5 jrs	Jeu 02/12/27	Mer 08/12/27

