Repérage Plomb Avant Travaux

Réf. : DIA-BZR04-2407-023



Propriétaire : Caisse d'Allocations Familiales de la Hte Garonne
Adresse du bien : 41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE
Nature du bien : Bureaux
Localisation du bien : Etage R+1, R+3, R+4, R+5, R+7, SS-1
Numéro de lot : Sans objet
Date du permis de construire : De 1949 au 01/07/1997
Date limite de validité : Validité illimitée (sauf travaux)
Référence client :

Plomb

Présence de revêtements contenant du plomb. Des dispositions particulières doivent être mises en oeuvre pour protéger les travailleurs et les occupants.

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.
Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle.
*pour le cas où il est indiqué validité illimitée d'un des diagnostics, un rapport n'est plus valide en cas : de travaux, de changement de réglementation, dans le cas de diagnostic amiante pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des grilles d'évaluation d'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante ainsi que le contenu desdites grilles.

Les intervenants du dossier

Propriétaire : Caisse d'Allocations Familiales de la Hte Garonne

41 rue de l'Etoile, 31046 TOULOUSE CEDEX 9

Votre cabinet : DIAGAMTER TOULOUSE SUD

55 avenue Louis Bréguet, 31400 TOULOUSE

05 32 09 79 09 thierry.bizouarne@aleacontroles.com

Technicien : Monsieur Thomas GARRIGOU

05 32 09 79 09 thomas.garrigou@aleacontroles.com

Monsieur Thomas GARRIGOU
Diagnostiqueur certifié

Synthèse dossier
Réf. : DIA-BZR04-2407-023

Sommaire

Rapport Plomb	4
Attestation d'assurance Aléa du dossier	72

Rapport de repérage du plomb avant travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements, matériaux ou produits contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation, de démolition, de travaux de maintenance ou d'entretien définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

Ce rapport n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.
Le présent document s'applique aux immeubles bâtis et ne vise pas les équipements de procédés industriels.
Il ne s'applique pas non plus aux poussières (par exemple, résultant de travaux antérieurs ou d'une pollution environnementale).

Donneur d'ordre

Caisse d'Allocations Familiales, Madame Helene LESTANG
41 rue de l'Etoile, 31046 TOULOUSE CEDEX 9
Collectivité territoriale

Propriétaire

Caisse d'Allocations Familiales de la Hte Garonne
41 rue de l'Etoile, 31046 TOULOUSE CEDEX 9

Identification de l'immeuble bâti

Adresse du bien	41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE
Description Sommaire	Bureaux
Localisation lot principal	Etage R+1, R+3, R+4, R+5, R+7, SS-1
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Section : 821 AC, N° parcelle(s) : 150
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien non indépendant
Permis de construire délivré en	De 1949 au 01/07/1997
Nature des travaux	Rénovation/Réhabilitation
Référence du programme de travaux	Sans objet

Références de la mission

Commande effectuée le	30/07/2024
Visite réalisée le	31/07/2024 à 09:00
Opérateur de repérage et certification	Monsieur Thomas GARRIGOU. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QUALIXPERT 17 rue Borrel - 81100 CASTRES (Réf : C2131)
Assurances	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 345 145 € (litige) / 2.000.000 € (an) - Date de validité : 31/12/2024
Laboratoire accrédité (analyse)	EUROFINS ANALYSE POUR BATIMENT EABSO,
Sous-traitance	Sans objet

Synthèse du repérage plomb avant travaux


Présence de Plomb

La présence de plomb est détectée
Le plomb est à prendre en compte dans l'évaluation des risques avant la réalisation des travaux. Des mesures de préventions spécifiques pour le plomb seront à mettre en œuvre s'il existe un risque d'exposition.

NB : Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelage peuvent contenir du plomb. Cependant, leur recherche n'a pas été effectuée (hors champs de recherche d'après la norme NF X 46-035).

Fait à TOULOUSE, le 31/07/2024

Monsieur Thomas GARRIGOU
Opérateur de repérage certifié



Objet de la mission

L'objet de ce document est d'identifier les revêtements, matériaux, produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux et susceptible d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation, de démolition, de travaux de maintenance ou d'entretien définis préalablement à la mission.

L'altération de ces peintures, matériaux, composants ou produits de construction et de décoration peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences. Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

NOTA :

Le présent document s'applique aux immeubles bâtis.

Le présent document ne vise pas les équipements de procédés industriels.

Le présent document ne s'applique pas aux poussières (par exemple, résultant de travaux antérieurs ou d'une pollution environnementale).

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelage peuvent contenir du plomb. Cependant, leur recherche n'a pas été jugée pertinente lors des travaux de la commission au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectués.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Textes règlementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- Articles 2, 3, 4 et Annexes 1 et 2 de l'Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

- Préconisation pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux (hors champs code de la santé publique) - DIRECCTE CENTRE / Mars 2014
- Norme NF X 46035 juin 2021 Repérage plomb — Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction

Documentation disponible

Type de document technique	Nom du document technique	Date	Opérateur et société	Utilisable
Destination des ouvrages ou terrains (actuelles et passées)	CCP (EL05.24) reçu par mail le 01/07/2024	01/07/2024	Mme LESTANG	Oui
Eléments d'information nécessaire à l'accès aux différentes parties de l'ouvrage en toute sécurité	CCP (EL05.24) reçu par mail le 01/07/2024	01/07/2024	Mme LESTANG	Oui
Liste des ouvrages concernés	CCP (EL05.24) reçu par mail le 01/07/2024	01/07/2024	Mme LESTANG	Oui partiellement Ajout lors de la visite sur site de la toiture terrasse au R+5 et d'une intervention au sous-sol-1
Plans ou croquis à jour du ou des ouvrages	Plan "DTA"	01/07/2024	Mme LESTANG	Oui partiellement Modification de certaines cloisons et bureaux
Programme projeté des travaux sur tous les ouvrages	CCP (EL05.24) reçu par mail le 01/07/2024	01/07/2024	Mme LESTANG	Oui partiellement Ajout lors de la visite sur site de la toiture terrasse au R+5 et d'une intervention au sous-sol-1
Rapports antérieurs plomb				Non fourni

Programme de travaux du donneur d'ordre

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur les informations du périmètre des travaux via un tableau synthétique (voir ci-dessous). Une description détaillée est demandée au donneur d'ordre à propos des travaux, de leur localisation et s'ils sont déjà connus, le nom et l'adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesure.

Référence du document décrivant le programme des travaux transmis par le donneur d'ordre : Sans objet

Description détaillée du programme des travaux :

Rénovation/Réhabilitation
Curages des revêtements, cloisons et équipements au R+1, R+3, R+4, R+5, R+7 de la partie CAF. Les sanitaires, placard techniques, locaux ménages dans les paliers sont hors périmètre.

Périmètre de la mission de repérage

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés :
R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101
R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion
R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417
R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Circulation 5-2, Palier 5, Bureau 517 - Réunion, Toiture terrasse
R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7
Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1, Poste P1

Sont exclus du repérage :
Sanitaires paliers R+1, R+3, R+4, R+5, R+7
Placards et locaux ménages paliers R+1, R+3, R+4, R+5, R+7
Roof top R+5
Cages d'escaliers
Revêtements derrière doublages briques, pignons bâtiment Riquet et bâtiment ilot dauriac
Joint vitrage dans doublage Bureau 108 au R+1 (joint coté opposé, dégradation du vitrage non autorisé par donneur d'ordre)

Programme de la mission de repérage

Revêtements de sol : Colle non bitumineuse et sol souple, colle de carrelage, dalle de moquette, dalle de sol, ragréages

Murs et cloisons : Enduit plâtres, Enduits ciments, Enduits tissés, enduits de jointement plaques de plâtres, Plots de colles, Calicot, Colle de faïence, reboucheages, flocages, panneaux, Enduits poteaux

Plafonds : Faux-plafonds, Enduits poutres, Mastics gaines aéroliques, enduit de jointement plaques visé, plaques visé, rebouchage joints de dilatation, rebouchages, calorifugeages

Autres observations

Sans objet

Moyens de mesure utilisés

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. L'opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Marque	Modèle	N° série	Nature du radionucléide	Date de chargement	Activité initiale	Durée de validité
Fondis Electronic	FEnX2	22-1090	Cadmium	03/08/2022	850 MBq	60 mois

Nom du titulaire de la déclaration ASN (DGSNR) : BIZOUARNE
Nom de la personne compétente en radioactivité : BIZOUARNE
Numéro de déclaration ASN : T310534
Date de la déclaration ASN : Sans objet

Valeurs d'étalonnages :

	NIST SRM2575 (0.31mg/cm²)		NIST SRM2574 (0.71mg/cm²)	
Date	Initiale	Finale	Initiale	Finale
31/07/2024 09:00	0,31	0,31	0,71	0,71
01/08/2024 09:00	0,31	0,31	0,71	0,71

Stratégie de mesures

- **Stratégie de mesurage**

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

- **Analyse physico-chimique**


Lorsque l'opérateur de repérage ne peut pas réaliser de mesures in situ par fluorescence X, il effectue un prélèvement pour une analyse chimique. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. Il est analysé en laboratoire pour la recherche du plomb total.

- **Hors champs de recherche ou de mesure :**

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelage peuvent contenir du plomb. Cependant, leur recherche n'a pas été jugée pertinente lors des travaux de la commission au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectués.

- **Relevés des mesures**

L'ensemble des mesures, des constats visuels, des résultats échantillonnage est récapitulé dans un tableau. En l'absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure n'a pas été effectuée est indiquée. Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées.

Repérage dans la pièce (Rep.)		Localisation des mesures		
A l'intérieur de chaque pièce, les mesures sont effectuées sur les unités de repérage dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la cloison ou le mur correspondant à la porte d'entrée dans la pièce (Rep. A).		HG G gauche BG	H haut C centre B bas	HD D droite BD

En règle générale, et sauf indication contraire, la description des pièces est faite dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale.
Concernant l'interprétation des mesures, voir conditions particulières d'exécution.

Nombre total d'unités de repérage	2663
Nombre total de mesures	3876

Abréviations :

N°	Numéro de la mesure
nm	Non mesuré

R+1 : Cage d'escalier (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1	Contremarches		Béton / Sol plastique	Au centre	0	0,010	
2	Marches		Béton / Sol plastique	Au centre	0	0,010	
3	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
4	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
5	Balustres	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
6	Limon	A	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
7	Rampe	A	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
8	Garde corps	B	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
9	Rampe	B	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
10	Balustres	C	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
11	Garde corps	C	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
12	Limon	C	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
13	Rampe	C	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
14	Balustres	D	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
15	Garde corps	D	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
16	Limon	D	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
17	Rampe	D	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
18	Balustres	E	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
19	Limon	E	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
20	Rampe	E	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 19

R+1 : Circulation 1-1 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
21	Balustres		Alu / NC	Au centre	0	0,010	
22	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
23	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
24	Mur	A	Béton / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
25	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
26	Plinthes	ABCD	PVC / NC	-	nm	-	
27	Mur	B	Béton / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
28	Poteau	B1	Ciment / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
29	Poteau	B2	Ciment / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
30	Poteau	B3	Ciment / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
31	Mur	C	Béton / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
32	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
33	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
34	Fenêtre Int. et huisserie	D	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
35	Mur	D	Béton / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
36	Porte et huisserie	D	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
37	Poteau	D1	Ciment / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
38	Poteau	D2	Ciment / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
39	Poteau	D3	Ciment / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 19

R+1 : Bureau 113 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
40	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
41	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
42	Placard	A	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
43	Porte de placard Ext. et huisserie	A	Bois / NC	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
44	Porte de placard Int. et huisserie	A	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
45	Porte et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
46	Poteau	A1	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
47	Poteau	A2	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
48	Poteau	A3	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
49	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
50	Poteau	Au centre	Béton / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
51	Poutre	Au plafond	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
52	Retombée	Au plafond	Bois / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
53	Mur	B	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
54	Porte et huisserie	B	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
55	Mur	C	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
56	Mur	D	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
57	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
58	Mur	E	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
59	Poteau	E	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
60	Mur	F	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
61	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
62	Mur	G	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
63	Mur	H	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
64	Placard	H	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
65	Porte de placard Ext. et huisserie	H	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
66	Porte de placard Int. et huisserie	H	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
67	Porte et huisserie	H1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
68	Porte et huisserie	H2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
69	Porte et huisserie	H3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 30

R+1 : Bureau 119 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
70	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
71	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
72	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
73	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois / Peinture**	**Au centre**	**0,7**	**0,010**	
74	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
75	Poteau	Au centre	Béton /	Au centre	0	0,010	
76	Poutre	Au plafond	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
77	Mur	B	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
78	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
79	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
80	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
81	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
82	Mur	C	Briques / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
83	Mur	D	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 14

R+1 : Bureau 114 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
84	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
85	Poteau		Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
86	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
87	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
88	Retombée	A	Bois / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
89	**Porte et huisserie**	**A1**	**Bois / Peinture**	**Au centre**	**0,2**	**0,010**	
90	**Porte et huisserie**	**A2**	**Bois / Peinture**	**Au centre**	**0,2**	**0,010**	
91	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
92	Mur	B	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
93	Allège	C	Béton / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
94	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
95	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
96	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
97	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
98	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
99	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
100	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
101	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
102	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
103	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
104	Mur	E	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
105	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
106	Mur	F	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 23

R+1 : Bureau 117 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
107	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
108	Poteau		Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
109	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
110	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
111	Retombée	A	Bois / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
112	**Porte et huisserie**	**A1**	**Bois / Peinture**	**Au centre**	**0,3**	**0,010**	
113	**Porte et huisserie**	**A2**	**Bois / Peinture**	**Au centre**	**0,6**	**0,010**	
114	Poutre	Au plafond	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
115	Mur	B	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
116	Mur	C	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
117	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
118	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
119	Allège	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
120	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
121	Fenêtre Ext. et huisserie	E1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
122	Fenêtre Int. et huisserie	E1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
123	Fenêtre Ext. et huisserie	E2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
124	Fenêtre Int. et huisserie	E2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
125	Fenêtre Ext. et huisserie	E3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
126	Fenêtre Int. et huisserie	E3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
127	Fenêtre Ext. et huisserie	E4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
128	Fenêtre Int. et huisserie	E4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
129	Mur	F	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 23

R+1 : Bureau 118 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
130	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
131	Poteau		Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
132	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
133	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
134	Placard	A	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
135	Porte de placard Ext. et huisserie	A	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
136	Porte de placard Int. et huisserie	A	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
137	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0,5	0,010	
138	Poutre	Au plafond	Béton /	Au centre	0	0,010	
139	Mur	B	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
140	Allège	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
141	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
142	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
143	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
144	Poteau	E	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
145	Retombée	En haut	Bois / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
146	Mur	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
147	Placard	F	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
148	Porte de placard Ext. et huisserie	F	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
149	Porte de placard Int. et huisserie	F	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
150	Poteau	F	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 21

R+1 : Circulation 1-2 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
151	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
152	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
153	Mur	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
154	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
155	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
156	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
157	Poteau	B	Béton / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
158	Porte et huisserie	B1	Bois / Peinture	Au centre	0,5	0,010	
159	Porte et huisserie	B2	Bois / Peinture	Au centre	0,6	0,010	
160	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
161	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
162	Mur	D	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
163	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	Au centre	0,3	0,010	
164	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	Au centre	0,3	0,010	

Nombre Total d'UR : 14

R+1 : Bureau 110 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
165	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
166	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
167	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
168	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0,2	0,010	
169	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
170	Mur	B	Cloison métal / Peinture	Au centre	0,2	0,010	
171	Coffrage	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
172	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0,2	0,010	
173	Allège	C1	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
174	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
175	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
176	Allège	C2	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
177	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
178	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
179	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 15

R+1 : Bureau 109 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
180	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
181	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
182	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
183	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0,3	0,010	
184	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
185	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
186	Coffrage	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
187	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
188	Allège	C1	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
189	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
190	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
191	Allège	C2	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
192	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
193	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
194	Mur	D	Cloison métal / Peinture	Au centre	0,2	0,010	

Nombre Total d'UR : 15

R+1 : Palier 1 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
195	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
196	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
197	Mur	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
198	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
199	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0,2	0,010	
200	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
201	Porte et huisserie	B	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
202	Cornière d'angle	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
203	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
204	Porte et huisserie	C	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
205	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
206	Placard	D1	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
207	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
208	Placard	D2	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
209	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
210	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
211	Mur	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
212	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
213	Mur	G	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
214	Porte et huisserie	G	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
215	Mur	H	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
216	Placard	H	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
217	Porte et huisserie	H	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
218	Porte et huisserie	H1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
219	Porte et huisserie	H2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
220	Mur	I	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
221	Placard	J	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
222	Porte et huisserie	J1	Bois / Peinture	Au centre	0,7	0,010	
223	Porte et huisserie	J2	Bois / Peinture	Au centre	0,5	0,010	
224	Porte et huisserie	J3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 30

R+1 : Circulation 1-3 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
225	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
226	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
227	Mur	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
228	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
229	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
230	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
231	Mur	C	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
232	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
233	Mur	D	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
234	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
235	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
236	Mur	E	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
237	Porte et huisserie	E1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
238	Porte et huisserie	E2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
239	Mur	F	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
240	Mur	G	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
241	Porte et huisserie	G1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
242	Porte et huisserie	G2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
243	Porte et huisserie	G3	Bois / Peinture	Au centre	0,4	0,010	
244	Mur	H	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
245	Porte et huisserie	H	Bois / Peinture	Au centre	0,8	0,010	

Nombre Total d'UR : 21

R+1 : Cave (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
246	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
247	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
248	Coffrage	A	Bois / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
249	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
250	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
251	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
252	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
253	Mur	C	Bois / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
254	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
255	Mur	D	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
256	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 11

R+1 : Bureau 108 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
257	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
258	Poteau		Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
259	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
260	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
261	Poteau	A	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
262	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
263	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
264	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
265	Retombée	Au plafond	Bois / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
266	Mur	B	Bois / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
267	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
268	Coffrage	C	Bois / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
269	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
270	Mur	D	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
271	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 15

R+1 : Bureau 107 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
272	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
273	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
274	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
275	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
276	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
277	Mur	B	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
278	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
279	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
280	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
281	Allège	D1	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
282	Canalisation	D1	Métal / NC	Au centre	0	0,010	
283	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
284	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
285	Radiateur	D1	Métal /	Au centre	0	0,010	
286	Allège	D2	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
287	Canalisation	D2	Métal / NC	Au centre	0	0,010	
288	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
289	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
290	Radiateur	D2	Métal /	Au centre	0	0,010	
291	Allège	D3	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
292	Canalisation	D3	Métal / NC	Au centre	0	0,010	
293	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
294	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
295	Radiateur	D3	Métal /	Au centre	0	0,010	
296	Allège	D4	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
297	Canalisation	D4	Métal / NC	Au centre	0	0,010	
298	Fenêtre Ext. et huisserie	D4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
299	Fenêtre Int. et huisserie	D4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
300	Radiateur	D4	Métal /	Au centre	0	0,010	
301	Allège	D5	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
302	Canalisation	D5	Métal / NC	Au centre	0	0,010	
303	Fenêtre Int. et huisserie	D5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
304	Radiateur	D5	Métal /	Au centre	0	0,010	
305	Mur	E	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
306	Mur	F	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 35

R+1 : Bureau 104 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
307	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
308	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
309	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
310	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
311	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
312	Mur	B	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
313	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
314	Allège	C1	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
315	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
316	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
317	Allège	C2	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
318	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
319	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
320	Mur	D	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 14

R+1 : Bureau 103 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
321	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
322	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
323	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
324	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
325	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
326	Mur	B	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
327	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
328	Allège	C1	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
329	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
330	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
331	Allège	C2	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
332	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
333	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
334	Mur	D	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 14

R+1 : Bureau 102 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
335	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
336	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
337	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
338	**Porte et huisserie**	**A1**	**Bois / Peinture**	**Au centre**	**0,4**	**0,010**	
339	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
340	Plinthes	ABCD	PVC / NC	-	nm	-	
341	Mur	B	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
342	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
343	Allège	C1	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
344	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
345	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
346	Allège	C2	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
347	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
348	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
349	Allège	C3	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
350	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
351	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
352	Allège	C4	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
353	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
354	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
355	Allège	C5	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
356	Fenêtre Ext. et huisserie	C5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
357	Fenêtre Int. et huisserie	C5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
358	Allège	C6	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
359	Fenêtre Ext. et huisserie	C6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
360	Fenêtre Int. et huisserie	C6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
361	Allège	C7	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
362	Fenêtre Ext. et huisserie	C7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
363	Fenêtre Int. et huisserie	C7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
364	Mur	D	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 30

R+1 : Bureau 100 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
365	Mur		Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
366	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
367	Sol		Dalles moquette /	Au centre	0	0,010	
368	Mur	A	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
369	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
370	Plinthes	ABCDEFGH	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
371	Poutre	Au plafond	Béton / Goutelette	Au centre	0	0,010	
372	Retombée	Au plafond	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
373	Mur	B	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
374	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
375	Mur	C	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
376	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
377	Allège	D1	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
378	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
379	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
380	**Radiateur**	**D1**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**9,43**	**0,010**	
381	Allège	D2	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
382	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
383	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
384	**Radiateur**	**D2**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**8**	**0,010**	
385	Allège	D3	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
386	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
387	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
388	**Radiateur**	**D3**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**10,1**	**0,010**	
389	Allège	D4	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
390	Fenêtre Ext. et huisserie	D4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
391	Fenêtre Int. et huisserie	D4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
392	**Radiateur**	**D4**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**10,9**	**0,010**	
393	Allège	D5	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
394	Fenêtre Ext. et huisserie	D5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
395	Fenêtre Int. et huisserie	D5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
396	**Radiateur**	**D5**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**6,5**	**0,010**	
397	Allège	D6	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
398	Fenêtre Ext. et huisserie	D6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
399	Fenêtre Int. et huisserie	D6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
400	**Radiateur**	**D6**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**8,66**	**0,010**	
401	Allège	D7	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
402	Fenêtre Ext. et huisserie	D7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
403	Fenêtre Int. et huisserie	D7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
404	**Radiateur**	**D7**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**7,46**	**0,010**	
405	Allège	D8	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
406	Fenêtre Ext. et huisserie	D8	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
407	Fenêtre Int. et huisserie	D8	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
408	**Radiateur**	**D8**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**8,63**	**0,010**	
409	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
410	Mur	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
411	Mur	G	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
412	Porte et huisserie	G	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
413	Mur	H	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
414	Allège	H1	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
415	Fenêtre Ext. et huisserie	H1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
416	Fenêtre Int. et huisserie	H1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
417	Radiateur	H1	Métal / Peinture	Au centre	8,77	0,010	
418	Allège	H2	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
419	Fenêtre Ext. et huisserie	H2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
420	Fenêtre Int. et huisserie	H2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
421	Radiateur	H2	Métal / Peinture	Au centre	8,22	0,010	
422	Allège	H3	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
423	Fenêtre Ext. et huisserie	H3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
424	Fenêtre Int. et huisserie	H3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
425	Radiateur	H3	Métal / Peinture	Au centre	7,9	0,010	
426	Allège	H4	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
427	Fenêtre Ext. et huisserie	H4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
428	Fenêtre Int. et huisserie	H4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
429	Radiateur	H4	Métal / Peinture	Au centre	8,7	0,010	
430	Allège	H5	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
431	Fenêtre Ext. et huisserie	H5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
432	Fenêtre Int. et huisserie	H5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
433	Radiateur	H5	Métal / Peinture	Au centre	9,27	0,010	
434	Allège	H6	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
435	Fenêtre Ext. et huisserie	H6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
436	Fenêtre Int. et huisserie	H6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
437	Radiateur	H6	Métal / Peinture	Au centre	6,966	0,010	
438	Allège	H7	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
439	Fenêtre Ext. et huisserie	H7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
440	Fenêtre Int. et huisserie	H7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
441	Radiateur	H7	Métal / Peinture	Au centre	7,66	0,010	
442	Allège	H8	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
443	Fenêtre Ext. et huisserie	H8	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
444	Fenêtre Int. et huisserie	H8	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
445	Radiateur	H8	Métal / Peinture	Au centre	8,7	0,010	
446	Imposte	I	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
447	Mur	I	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
448	Imposte	J	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
449	Mur	J	Cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
450	Mur	K	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 86

R+1 : Bureau 101 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
451	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
452	Sol		Dalles moquette /	Au centre	0	0,010	
453	Imposte	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
454	Mur	A	Cloison métal / NC	Au centre	0	0,010	
455	Porte et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
456	Imposte	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
457	Mur	B	Cloison métal / NC	Au centre	0	0,010	
458	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
459	Allège	C1	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
460	Canalisation	C1	Métal / NC	Au centre	0	0,010	
461	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
462	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
463	Radiateur	C1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
464	Allège	C2	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
465	Canalisation	C2	Métal / NC	Au centre	0	0,010	
466	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
467	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
468	Radiateur	C2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
469	Plinthes	CD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
470	Mur	D	Cloison métal / NC	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 20

R+3 : Circulation 3-1 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
471	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
472	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
473	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
474	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
475	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
476	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
477	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
478	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
479	Plinthes	ABCDEFGHIJKL	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
480	Plinthes	ABCDEFGHIJKL	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
481	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
482	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
483	Porte et huisserie	B	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
484	Porte et huisserie	B	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
485	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
486	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
487	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
488	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
489	Porte et huisserie	D	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
490	Porte et huisserie	D	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
491	Mur	E	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
492	Mur	E	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
493	Mur	F	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
494	Mur	F	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
495	Porte et huisserie	F	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
496	Porte et huisserie	F	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
497	Mur	G	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
498	Mur	G	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
499	Porte et huisserie	G	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
500	Porte et huisserie	G	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
501	Mur	H	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
502	Mur	H	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
503	Mur	I	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
504	Mur	I	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
505	Mur	J	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
506	Mur	J	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
507	Mur	K	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
508	Mur	K	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
509	Porte et huisserie	K	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
510	Porte et huisserie	K	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
511	Mur	L	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
512	Mur	L	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
513	Porte et huisserie	L1	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
514	Porte et huisserie	L1	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
515	Porte et huisserie	L2	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
516	Porte et huisserie	L2	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 23

R+3 : Bureau 310 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
517	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
518	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
519	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
520	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
521	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
522	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
523	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
524	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
525	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
526	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
527	Porte et huisserie	A	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
528	Porte et huisserie	A	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
529	Poutre	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
530	Poutre	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
531	Plinthes	ABCDEFGH	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
532	Plinthes	ABCDEFGH	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
533	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
534	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
535	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
536	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
537	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
538	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
539	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
540	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
541	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**8,9**	**0,010**	
542	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
543	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
544	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
545	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
546	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,5**	**0,010**	
547	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
548	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
549	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
550	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
551	**Radiateur**	**C3**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,5**	**0,010**	
552	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu /	Au centre	0	0,010	
553	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu /	En haut	0	0,010	
554	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu /	Au centre	0	0,010	
555	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu /	En haut	0	0,010	
556	**Radiateur**	**C4**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,4**	**0,010**	
557	Fenêtre Ext. et huisserie	C5	Alu /	Au centre	0	0,010	
558	Fenêtre Ext. et huisserie	C5	Alu /	En haut	0	0,010	
559	Fenêtre Int. et huisserie	C5	Alu /	Au centre	0	0,010	
560	Fenêtre Int. et huisserie	C5	Alu /	En haut	0	0,010	
561	**Radiateur**	**C5**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,9**	**0,010**	
562	Fenêtre Ext. et huisserie	C6	Alu /	Au centre	0	0,010	
563	Fenêtre Ext. et huisserie	C6	Alu /	En haut	0	0,010	
564	Fenêtre Int. et huisserie	C6	Alu /	Au centre	0	0,010	
565	Fenêtre Int. et huisserie	C6	Alu /	En haut	0	0,010	
566	**Radiateur**	**C6**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,8**	**0,010**	
567	Fenêtre Ext. et huisserie	C7	Alu /	Au centre	0	0,010	
568	Fenêtre Ext. et huisserie	C7	Alu /	En haut	0	0,010	
569	Fenêtre Int. et huisserie	C7	Alu /	Au centre	0	0,010	
570	Fenêtre Int. et huisserie	C7	Alu /	En haut	0	0,010	
571	**Radiateur**	**C7**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,0**	**0,010**	
572	Fenêtre Ext. et huisserie	C8	Alu /	Au centre	0	0,010	
573	Fenêtre Ext. et huisserie	C8	Alu /	En haut	0	0,010	
574	Fenêtre Int. et huisserie	C8	Alu /	Au centre	0	0,010	
575	Fenêtre Int. et huisserie	C8	Alu /	En haut	0	0,010	
576	**Radiateur**	**C8**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**10,1**	**0,010**	
577	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
578	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
579	Fenêtre Ext. et huisserie	E	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
580	Fenêtre Ext. et huisserie	E	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
581	Fenêtre Int. et huisserie	E	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
582	Fenêtre Int. et huisserie	E	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
583	Mur	E	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
584	Mur	E	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
585	Porte et huisserie	E	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
586	Porte et huisserie	E	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
587	Poutre	E	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
588	Poutre	E	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
589	Mur	F	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
590	Mur	F	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
591	Fenêtre Ext. et huisserie	G	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
592	Fenêtre Ext. et huisserie	G	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
593	Fenêtre Int. et huisserie	G	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
594	Fenêtre Int. et huisserie	G	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
595	Mur	G	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
596	Mur	G	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
597	Mur	H	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
598	Mur	H	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 45

R+3 : Bureau 309 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
599	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
600	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
601	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
602	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
603	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
604	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
605	Poutre	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
606	Poutre	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
607	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
608	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
609	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
610	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
611	Porte et huisserie	A1	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
612	Porte et huisserie	A1	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
613	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
614	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
615	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
616	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
617	Porte et huisserie	A2	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
618	Porte et huisserie	A2	Bois / Vernis	En haut	0	0,010	
619	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
620	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
621	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
622	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
623	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
624	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
625	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
626	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
627	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
628	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
629	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,5**	**0,010**	
630	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
631	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
632	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
633	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
634	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
635	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
636	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
637	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
638	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
639	**Radiateur**	**C3**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,5**	**0,010**	
640	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu /	Au centre	0	0,010	
641	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu /	En haut	0	0,010	
642	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu /	Au centre	0	0,010	
643	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu /	En haut	0	0,010	
644	**Radiateur**	**C4**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,9**	**0,010**	
645	Fenêtre Ext. et huisserie	C5	Alu /	Au centre	0	0,010	
646	Fenêtre Ext. et huisserie	C5	Alu /	En haut	0	0,010	
647	Fenêtre Int. et huisserie	C5	Alu /	Au centre	0	0,010	
648	Fenêtre Int. et huisserie	C5	Alu /	En haut	0	0,010	
649	**Radiateur**	**C5**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,5**	**0,010**	
650	Fenêtre Ext. et huisserie	C6	Alu /	Au centre	0	0,010	
651	Fenêtre Ext. et huisserie	C6	Alu /	En haut	0	0,010	
652	Fenêtre Int. et huisserie	C6	Alu /	Au centre	0	0,010	
653	Fenêtre Int. et huisserie	C6	Alu /	En haut	0	0,010	
654	**Radiateur**	**C6**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,4**	**0,010**	
655	Fenêtre Ext. et huisserie	C7	Alu /	Au centre	0	0,010	
656	Fenêtre Ext. et huisserie	C7	Alu /	En haut	0	0,010	
657	Fenêtre Int. et huisserie	C7	Alu /	Au centre	0	0,010	
658	Fenêtre Int. et huisserie	C7	Alu /	En haut	0	0,010	
659	**Radiateur**	**C7**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
660	Fenêtre Ext. et huisserie	C8	Alu /	Au centre	0	0,010	
661	Fenêtre Ext. et huisserie	C8	Alu /	En haut	0	0,010	
662	Fenêtre Int. et huisserie	C8	Alu /	Au centre	0	0,010	
663	Fenêtre Int. et huisserie	C8	Alu /	En haut	0	0,010	
664	**Radiateur**	**C8**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,4**	**0,010**	
665	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
666	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 38

R+3 : Pièce (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
667	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
668	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
669	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
670	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
671	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
672	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
673	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
674	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
675	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
676	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
677	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
678	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
679	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
680	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
681	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
682	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En haut	0	0,010	
683	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
684	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
685	Mur	E	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
686	Mur	E	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
687	Mur	F	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
688	Mur	F	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
689	Mur	G	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
690	Mur	G	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 12

R+3 : Palier 3 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
691	Plafond		Faux plafond / NC	A gauche	0	0,010	
692	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
693	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
694	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
695	Mur	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
696	Mur	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
697	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
698	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
699	Plinthes	ABCDEFGHJI	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
700	Plinthes	ABCDEFGHJI	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
701	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
702	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
703	Porte et huisserie	B	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
704	Porte et huisserie	B	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	
705	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
706	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
707	Porte et huisserie	C	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
708	Porte et huisserie	C	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	
709	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
710	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
711	Placard	D1	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
712	Placard	D1	Béton / NC	En haut	0	0,010	
713	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
714	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
715	Placard	D2	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
716	Placard	D2	Béton / NC	En haut	0	0,010	
717	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
718	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
719	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
720	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
721	Mur	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
722	Mur	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
723	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
724	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
725	Mur	G	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
726	Mur	G	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
727	Porte et huisserie	G	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
728	Porte et huisserie	G	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
729	Mur	H	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
730	Mur	H	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
731	Placard	H	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
732	Placard	H	Béton / NC	En haut	0	0,010	
733	Porte et huisserie	H	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
734	Porte et huisserie	H	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
735	Porte et huisserie	H1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
736	Porte et huisserie	H1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
737	Porte et huisserie	H2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
738	Porte et huisserie	H2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
739	Cornière d'angle	I	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
740	Cornière d'angle	I	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
741	Mur	I	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
742	Mur	I	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
743	Mur	J	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
744	Mur	J	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
745	Placard	J	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
746	Placard	J	Béton / NC	En haut	0	0,010	
747	Porte et huisserie	J1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
748	Porte et huisserie	J1	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
749	Porte et huisserie	J2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
750	Porte et huisserie	J2	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
751	Porte et huisserie	J3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
752	Porte et huisserie	J3	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 31

R+3 : Circulation 3-2 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
753	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
754	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
755	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
756	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
757	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
758	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
759	Porte et huisserie	A1	Bois et métal / Peinture	Au centre	0,33	0,010	
760	Porte et huisserie	A2	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
761	Porte et huisserie	A2	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	
762	Plinthes	ABD	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
763	Plinthes	ABD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
764	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
765	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
766	**Porte et huisserie**	**B**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,68**	**0,010**	
767	Mur	C	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
768	Mur	C	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
769	**Porte et huisserie**	**C1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,36**	**0,010**	
770	**Porte et huisserie**	**C2**	**Bois et métal / Peinture**	**Au centre**	**0,32**	**0,010**	
771	**Porte et huisserie**	**C3**	**Bois et métal / Peinture**	**Au centre**	**0,29**	**0,010**	
772	**Porte et huisserie**	**C4**	**Bois et métal / Peinture**	**Au centre**	**0,34**	**0,010**	
773	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
774	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
775	**Porte et huisserie**	**D**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,7**	**0,010**	

Nombre Total d'UR : 15

R+3 : Bureau 300 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
776	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
777	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
778	Poteau		Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
779	Poteau		Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
780	Poutre		Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
781	Poutre		Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
782	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
783	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
784	Mur	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
785	Mur	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
786	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**Au centre**	**0,53**	**0,010**	
787	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
788	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
789	Plinthes	BCDEF	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
790	Plinthes	BCDEF	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
791	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
792	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
793	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
794	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
795	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Alu /	Au centre	0	0,010	
796	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Alu /	En haut	0	0,010	
797	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Alu /	Au centre	0	0,010	
798	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Alu /	En haut	0	0,010	
799	**Radiateur**	**D1**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**8,9**	**0,010**	
800	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Alu /	Au centre	0	0,010	
801	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Alu /	En haut	0	0,010	
802	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Alu /	Au centre	0	0,010	
803	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Alu /	En haut	0	0,010	
804	**Radiateur**	**D2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,6**	**0,010**	
805	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Alu /	Au centre	0	0,010	
806	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Alu /	En haut	0	0,010	
807	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Alu /	Au centre	0	0,010	
808	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Alu /	En haut	0	0,010	
809	**Radiateur**	**D3**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,5**	**0,010**	
810	Fenêtre Ext. et huisserie	D4	Alu /	Au centre	0	0,010	
811	Fenêtre Ext. et huisserie	D4	Alu /	En haut	0	0,010	
812	Fenêtre Int. et huisserie	D4	Alu /	Au centre	0	0,010	
813	Fenêtre Int. et huisserie	D4	Alu /	En haut	0	0,010	
814	**Radiateur**	**D4**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,9**	**0,010**	
815	Fenêtre Ext. et huisserie	D5	Alu /	Au centre	0	0,010	
816	Fenêtre Ext. et huisserie	D5	Alu /	En haut	0	0,010	
817	Fenêtre Int. et huisserie	D5	Alu /	Au centre	0	0,010	
818	Fenêtre Int. et huisserie	D5	Alu /	En haut	0	0,010	
819	**Radiateur**	**D5**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,2**	**0,010**	
820	Fenêtre Ext. et huisserie	D6	Alu /	Au centre	0	0,010	
821	Fenêtre Ext. et huisserie	D6	Alu /	En haut	0	0,010	
822	Fenêtre Int. et huisserie	D6	Alu /	Au centre	0	0,010	
823	Fenêtre Int. et huisserie	D6	Alu /	En haut	0	0,010	
824	**Radiateur**	**D6**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**9,3**	**0,010**	
825	Fenêtre Ext. et huisserie	D7	Alu /	Au centre	0	0,010	
826	Fenêtre Ext. et huisserie	D7	Alu /	En haut	0	0,010	
827	Fenêtre Int. et huisserie	D7	Alu /	Au centre	0	0,010	
828	Fenêtre Int. et huisserie	D7	Alu /	En haut	0	0,010	
829	**Radiateur**	**D7**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**8,4**	**0,010**	
830	Fenêtre Ext. et huisserie	D8	Alu /	Au centre	0	0,010	
831	Fenêtre Ext. et huisserie	D8	Alu /	En haut	0	0,010	
832	Fenêtre Int. et huisserie	D8	Alu /	Au centre	0	0,010	
833	Fenêtre Int. et huisserie	D8	Alu /	En haut	0	0,010	
834	**Radiateur**	**D8**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,4**	**0,010**	
835	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
836	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
837	Placard	E	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
838	Placard	E	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
839	Mur	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
840	Mur	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
841	Fenêtre Ext. et huisserie	F1	Alu /	Au centre	0	0,010	
842	Fenêtre Ext. et huisserie	F1	Alu /	En haut	0	0,010	
843	Fenêtre Int. et huisserie	F1	Alu /	Au centre	0	0,010	
844	Fenêtre Int. et huisserie	F1	Alu /	En haut	0	0,010	
845	**Radiateur**	**F1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,9**	**0,010**	
846	Fenêtre Ext. et huisserie	F2	Alu /	Au centre	0	0,010	
847	Fenêtre Ext. et huisserie	F2	Alu /	En haut	0	0,010	
848	Fenêtre Int. et huisserie	F2	Alu /	Au centre	0	0,010	
849	Fenêtre Int. et huisserie	F2	Alu /	En haut	0	0,010	
850	**Radiateur**	**F2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,9**	**0,010**	
851	Fenêtre Ext. et huisserie	F3	Alu /	Au centre	0	0,010	
852	Fenêtre Ext. et huisserie	F3	Alu /	En haut	0	0,010	
853	Fenêtre Int. et huisserie	F3	Alu /	Au centre	0	0,010	
854	Fenêtre Int. et huisserie	F3	Alu /	En haut	0	0,010	
855	**Radiateur**	**F3**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**8,8**	**0,010**	
856	Fenêtre Ext. et huisserie	F4	Alu /	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
857	Fenêtre Ext. et huisserie	F4	Alu /	En haut	0	0,010	
858	Fenêtre Int. et huisserie	F4	Alu /	Au centre	0	0,010	
859	Fenêtre Int. et huisserie	F4	Alu /	En haut	0	0,010	
860	Radiateur	F4	Métal / Peinture	En haut	8,9	0,010	
861	Fenêtre Ext. et huisserie	F5	Alu /	Au centre	0	0,010	
862	Fenêtre Ext. et huisserie	F5	Alu /	En haut	0	0,010	
863	Fenêtre Int. et huisserie	F5	Alu /	Au centre	0	0,010	
864	Fenêtre Int. et huisserie	F5	Alu /	En haut	0	0,010	
865	Radiateur	F5	Métal / Peinture	En haut	7,6	0,010	
866	Fenêtre Ext. et huisserie	F6	Alu /	Au centre	0	0,010	
867	Fenêtre Ext. et huisserie	F6	Alu /	En haut	0	0,010	
868	Fenêtre Int. et huisserie	F6	Alu /	Au centre	0	0,010	
869	Fenêtre Int. et huisserie	F6	Alu /	En haut	0	0,010	
870	Radiateur	F6	Métal / Peinture	En haut	9,4	0,010	
871	Fenêtre Ext. et huisserie	F7	Alu /	Au centre	0	0,010	
872	Fenêtre Ext. et huisserie	F7	Alu /	En haut	0	0,010	
873	Fenêtre Int. et huisserie	F7	Alu /	Au centre	0	0,010	
874	Fenêtre Int. et huisserie	F7	Alu /	En haut	0	0,010	
875	Mur	G	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
876	Mur	G	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
877	Mur	H	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
878	Mur	H	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
879	Porte et huisserie	H	Bois et métal / Peinture	Au centre	0,32	0,010	

Nombre Total d'UR : 60

R+3 : Bureau 301 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
880	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
881	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
882	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
883	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
884	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
885	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
886	Porte et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	Au centre	0,32	0,010	
887	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
888	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
889	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
890	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
891	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
892	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
893	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
894	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
895	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
896	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
897	Radiateur	C1	Métal / Peinture	Au centre	9,5	0,010	
898	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
899	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
900	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
901	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
902	Radiateur	C2	Métal / Peinture	En haut	8,6	0,010	
903	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
904	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 14

R+3 : Bureau 302 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
905	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
906	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
907	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
908	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
909	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
910	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
911	Porte et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	Au centre	0,36	0,010	
912	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
913	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
914	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
915	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
916	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
917	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
918	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
919	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
920	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
921	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
922	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
923	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
924	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
925	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
926	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
927	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
928	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
929	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
930	Radiateur	C1	Métal / Peinture	En haut	8,9	0,010	
931	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
932	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
933	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
934	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
935	Radiateur	C2	Métal / Peinture	En haut	9,2	0,010	
936	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
937	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
938	Porte et huisserie	D	Bois et métal / Peinture	En haut	0,19	0,010	

Nombre Total d'UR : 19

R+3 : Bureau 303 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
939	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
940	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
941	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
942	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
943	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
944	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / NC	En haut	0	0,010	
945	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
946	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / NC	En haut	0	0,010	
947	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
948	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
949	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**Au centre**	**0,18**	**0,010**	
950	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
951	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
952	**Porte et huisserie**	**B**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,23**	**0,010**	
953	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
954	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
955	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
956	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
957	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
958	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
959	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
960	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
961	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
962	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
963	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
964	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
965	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
966	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,5**	**0,010**	
967	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
968	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	En haut	0	0,010	
969	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
970	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	En haut	0	0,010	
971	**Radiateur**	**C3**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,4**	**0,010**	
972	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
973	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
974	**Porte et huisserie**	**D**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,23**	**0,010**	

Nombre Total d'UR : 21

R+3 : Bureau 304 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
975	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
976	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
977	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
978	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
979	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
980	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
981	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,33**	**0,010**	
982	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
983	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
984	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
985	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
986	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
987	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
988	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
989	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
990	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
991	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
992	**Porte et huisserie**	**B**	**Bois et métal / Peinture**	**Au centre**	**0,2**	**0,010**	
993	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
994	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
995	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
996	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
997	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
998	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
999	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1000	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1001	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,9**	**0,010**	
1002	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1003	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1004	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1005	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1006	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,5**	**0,010**	
1007	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1008	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 19

R+3 : Bureau 305 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1009	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
1010	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
1011	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
1012	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1013	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1014	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1015	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1016	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1017	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1018	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1019	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,33**	**0,010**	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1020	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1021	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1022	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1023	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1024	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
1025	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1026	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1027	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1028	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1029	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1030	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,1**	**0,010**	
1031	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1032	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1033	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1034	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1035	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**10,3**	**0,010**	
1036	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1037	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1038	**Porte et huisserie**	**D**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,2**	**0,010**	

Nombre Total d'UR : 17

R+3 : Bureau 306 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1039	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
1040	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
1041	Poteau		Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
1042	Poteau		Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
1043	Poutre		Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
1044	Poutre		Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
1045	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
1046	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1047	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1048	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1049	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1050	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1051	Mur	A	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1052	Mur	A	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1053	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,69**	**0,010**	
1054	Plinthes	ADEFGHIJ	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
1055	Plinthes	ADEFGHIJ	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1056	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1057	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1058	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Alu /	Au centre	0	0,010	
1059	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Alu /	En haut	0	0,010	
1060	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1061	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1062	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Alu /	Au centre	0	0,010	
1063	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Alu /	En haut	0	0,010	
1064	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1065	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1066	**Porte et huisserie**	**B1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,44**	**0,010**	
1067	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Alu /	Au centre	0	0,010	
1068	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Alu /	En haut	0	0,010	
1069	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Alu /	Au centre	0	0,010	
1070	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Alu /	En haut	0	0,010	
1071	Porte et huisserie	B2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1072	Porte et huisserie	B2	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
1073	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Alu /	Au centre	0	0,010	
1074	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Alu /	En haut	0	0,010	
1075	Fenêtre Int. et huisserie	C	Alu /	Au centre	0	0,010	
1076	Fenêtre Int. et huisserie	C	Alu /	En haut	0	0,010	
1077	Mur	C	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1078	Mur	C	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1079	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1080	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1081	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Alu /	Au centre	0	0,010	
1082	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Alu /	En haut	0	0,010	
1083	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Alu /	Au centre	0	0,010	
1084	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Alu /	En haut	0	0,010	
1085	**Radiateur**	**D1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,3**	**0,010**	
1086	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Alu /	Au centre	0	0,010	
1087	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Alu /	En haut	0	0,010	
1088	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Alu /	Au centre	0	0,010	
1089	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Alu /	En haut	0	0,010	
1090	**Radiateur**	**D2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,6**	**0,010**	
1091	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Alu /	Au centre	0	0,010	
1092	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Alu /	En haut	0	0,010	
1093	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Alu /	Au centre	0	0,010	
1094	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Alu /	En haut	0	0,010	
1095	**Radiateur**	**D3**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
1096	Fenêtre Ext. et huisserie	D4	Alu /	Au centre	0	0,010	
1097	Fenêtre Ext. et huisserie	D4	Alu /	En haut	0	0,010	
1098	Fenêtre Int. et huisserie	D4	Alu /	Au centre	0	0,010	
1099	Fenêtre Int. et huisserie	D4	Alu /	En haut	0	0,010	
1100	**Radiateur**	**D4**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,5**	**0,010**	
1101	Fenêtre Ext. et huisserie	D5	Alu /	Au centre	0	0,010	
1102	Fenêtre Ext. et huisserie	D5	Alu /	En haut	0	0,010	
1103	Fenêtre Int. et huisserie	D5	Alu /	Au centre	0	0,010	
1104	Fenêtre Int. et huisserie	D5	Alu /	En haut	0	0,010	
1105	**Radiateur**	**D5**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
1106	Fenêtre Ext. et huisserie	D6	Alu /	Au centre	0	0,010	
1107	Fenêtre Ext. et huisserie	D6	Alu /	En haut	0	0,010	
1108	Fenêtre Int. et huisserie	D6	Alu /	Au centre	0	0,010	
1109	Fenêtre Int. et huisserie	D6	Alu /	En haut	0	0,010	
1110	**Radiateur**	**D6**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,4**	**0,010**	
1111	Mur	E	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1112	Mur	E	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1113	Mur	F	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1114	Mur	F	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1115	Mur	G	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1116	Mur	G	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1117	Porte et huisserie	G	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1118	Porte et huisserie	G	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
1119	Mur	H	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1120	Mur	H	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1121	Fenêtre Ext. et huisserie	H1	Alu /	Au centre	0	0,010	
1122	Fenêtre Ext. et huisserie	H1	Alu /	En haut	0	0,010	
1123	Fenêtre Int. et huisserie	H1	Alu /	Au centre	0	0,010	
1124	Fenêtre Int. et huisserie	H1	Alu /	En haut	0	0,010	
1125	**Radiateur**	**H1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,6**	**0,010**	
1126	Fenêtre Ext. et huisserie	H2	Alu /	Au centre	0	0,010	
1127	Fenêtre Ext. et huisserie	H2	Alu /	En haut	0	0,010	
1128	Fenêtre Int. et huisserie	H2	Alu /	Au centre	0	0,010	
1129	Fenêtre Int. et huisserie	H2	Alu /	En haut	0	0,010	
1130	**Radiateur**	**H2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
1131	Fenêtre Ext. et huisserie	H3	Alu /	Au centre	0	0,010	
1132	Fenêtre Ext. et huisserie	H3	Alu /	En haut	0	0,010	
1133	Fenêtre Int. et huisserie	H3	Alu /	Au centre	0	0,010	
1134	Fenêtre Int. et huisserie	H3	Alu /	En haut	0	0,010	
1135	**Radiateur**	**H3**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,4**	**0,010**	
1136	Fenêtre Ext. et huisserie	H4	Alu /	Au centre	0	0,010	
1137	Fenêtre Ext. et huisserie	H4	Alu /	En haut	0	0,010	
1138	Fenêtre Int. et huisserie	H4	Alu /	Au centre	0	0,010	
1139	Fenêtre Int. et huisserie	H4	Alu /	En haut	0	0,010	
1140	**Radiateur**	**H4**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,4**	**0,010**	
1141	Fenêtre Ext. et huisserie	H5	Alu /	Au centre	0	0,010	
1142	Fenêtre Ext. et huisserie	H5	Alu /	En haut	0	0,010	
1143	Fenêtre Int. et huisserie	H5	Alu /	Au centre	0	0,010	
1144	Fenêtre Int. et huisserie	H5	Alu /	En haut	0	0,010	
1145	**Radiateur**	**H5**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,5**	**0,010**	
1146	Fenêtre Ext. et huisserie	H6	Alu /	Au centre	0	0,010	
1147	Fenêtre Ext. et huisserie	H6	Alu /	En haut	0	0,010	
1148	Fenêtre Int. et huisserie	H6	Alu /	Au centre	0	0,010	
1149	Fenêtre Int. et huisserie	H6	Alu /	En haut	0	0,010	
1150	**Radiateur**	**H6**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,6**	**0,010**	
1151	Fenêtre Ext. et huisserie	H7	Alu /	Au centre	0	0,010	
1152	Fenêtre Ext. et huisserie	H7	Alu /	En haut	0	0,010	
1153	Fenêtre Int. et huisserie	H7	Alu /	Au centre	0	0,010	
1154	Fenêtre Int. et huisserie	H7	Alu /	En haut	0	0,010	
1155	**Radiateur**	**H7**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,5**	**0,010**	
1156	Fenêtre Ext. et huisserie	H8	Alu /	Au centre	0	0,010	
1157	Fenêtre Ext. et huisserie	H8	Alu /	En haut	0	0,010	
1158	Fenêtre Int. et huisserie	H8	Alu /	Au centre	0	0,010	
1159	Fenêtre Int. et huisserie	H8	Alu /	En haut	0	0,010	
1160	**Radiateur**	**H8**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,3**	**0,010**	
1161	Mur	I	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1162	Mur	I	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1163	Mur	J	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1164	Mur	J	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1165	Mur	K	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1166	Mur	K	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1167	Mur	L	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1168	Mur	L	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 73

R+3 : Bureau 307 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1169	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
1170	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
1171	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
1172	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1173	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1174	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1175	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1176	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1177	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1178	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1179	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,38**	**0,010**	
1180	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1181	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1182	Porte et huisserie	B	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1183	Porte et huisserie	B	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1184	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1185	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1186	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
1187	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1188	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1189	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1190	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1191	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1192	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,4**	**0,010**	
1193	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1194	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1195	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1196	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1197	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
1198	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1199	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 17

R+3 : Bureau 307bis (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1200	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
1201	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
1202	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
1203	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1204	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu /	Au centre	0	0,010	
1205	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu /	En haut	0	0,010	
1206	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu /	Au centre	0	0,010	
1207	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu /	En haut	0	0,010	
1208	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1209	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1210	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1211	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
1212	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1213	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1214	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1215	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1216	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
1217	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1218	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
1219	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
1220	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
1221	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
1222	Radiateur	C1	Métal / Peinture	En haut	9,5	0,010	
1223	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
1224	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
1225	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
1226	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
1227	Radiateur	C2	Métal / Peinture	En haut	9,3	0,010	
1228	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Alu /	Au centre	0	0,010	
1229	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Alu /	En haut	0	0,010	
1230	Fenêtre Int. et huisserie	D	Alu /	Au centre	0	0,010	
1231	Fenêtre Int. et huisserie	D	Alu /	En haut	0	0,010	
1232	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1233	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 18

R+3 : Bureau 308 - Réunion (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1234	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
1235	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
1236	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
1237	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1238	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1239	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1240	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1241	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1242	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1243	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1244	Porte et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	En haut	0,33	0,010	
1245	Poutre	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
1246	Poutre	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
1247	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1248	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1249	Plinthes	BCD	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
1250	Plinthes	BCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1251	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1252	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1253	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1254	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1255	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1256	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1257	Radiateur	C1	Métal / Peinture	En haut	8,3	0,010	
1258	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1259	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1260	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1261	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
1262	Radiateur	C2	Métal / Peinture	En haut	7,6	0,010	
1263	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1264	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 17

R+4 : Circulation 4-1 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1265	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1266	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1267	Mur	A	Cloison bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1268	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1269	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1270	Mur	B	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1271	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1272	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1273	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1274	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1275	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1276	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1277	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1278	Mur	C	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1279	Mur	D	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1280	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1281	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1282	Mur	E	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1283	Mur	F	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1284	Placard	F	Plaques de platre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1285	Porte de placard Ext. et huisserie	F	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1286	Porte de placard Int. et huisserie	F	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1287	Fenêtre Ext. et huisserie	G	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
1288	Fenêtre Int. et huisserie	G	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
1289	Huisserie Fenêtre Ext. et huisserie	G	Bois / Peinture	Au centre	0,27	0,010	
1290	Huisserie Fenêtre Int. et huisserie	G	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1291	Huisserie Fenêtre Int. et huisserie	G	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
1292	Huisserie Porte	G	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
1293	Mur	G	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1294	Porte	G	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
1295	Mur	H	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1296	Porte et huisserie	H1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1297	Porte et huisserie	H2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1298	Porte et huisserie	H3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1299	Porte et huisserie	H4	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 34

R+4 : Bureau 422 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1300	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1301	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1302	Coffrage	A	Plaques de platre / Peinture	Au centre	0	0,010	
1303	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1304	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1305	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1306	Mur	B	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1307	Mur	C	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1308	Mur	D	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1309	Mur	E	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1310	Allège	E1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1311	Fenêtre Ext. et huisserie	E1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1312	Fenêtre Int. et huisserie	E1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1313	Allège	E2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1314	Fenêtre Ext. et huisserie	E2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1315	Fenêtre Int. et huisserie	E2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1316	Allège	E3	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1317	Fenêtre Ext. et huisserie	E3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1318	Fenêtre Int. et huisserie	E3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1319	Allège	E4	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1320	Fenêtre Ext. et huisserie	E4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1321	Fenêtre Int. et huisserie	E4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1322	Mur	F	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1323	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1324	Mur	G	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1325	Mur	H	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1326	Mur	I	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 27

R+4 : Bureau 423 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1327	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1328	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1329	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1330	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1331	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1332	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1333	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1334	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1335	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1336	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1337	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1338	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1339	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1340	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1341	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 15

R+4 : Bureau 424 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1342	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1343	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1344	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1345	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1346	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1347	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1348	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1349	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1350	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1351	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1352	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1353	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1354	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1355	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1356	Mur	E	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1357	Mur	F	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+4 : Bureau 418 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1358	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1359	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1360	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1361	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1362	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1363	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1364	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1365	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1366	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1367	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1368	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1369	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1370	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1371	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1372	Fenêtre Int. et huisserie	D	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1373	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+4 : Bureau 419 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1374	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1375	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1376	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1377	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1378	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1379	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1380	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1381	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1382	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1383	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1384	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1385	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1386	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1387	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1388	Fenêtre Int. et huisserie	D	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1389	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1390	Mur	E	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1391	Mur	F	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1392	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 19

R+4 : Bureau 420 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1393	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1394	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1395	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1396	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1397	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1398	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1399	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1400	Mur	C	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1401	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1402	Mur	E	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1403	Allège	E1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1404	Fenêtre Ext. et huisserie	E1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1405	Fenêtre Int. et huisserie	E1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1406	Allège	E2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1407	Fenêtre Ext. et huisserie	E2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1408	Fenêtre Int. et huisserie	E2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1409	Fenêtre Ext. et huisserie	F	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1410	Fenêtre Int. et huisserie	F	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1411	Mur	F	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 19

R+4 : Bureau 421 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1412	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1413	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1414	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1415	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1416	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1417	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1418	Fenêtre Int. et huisserie	B	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1419	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1420	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1421	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1422	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1423	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1424	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1425	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1426	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1427	Mur	D	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+4 : Palier 4 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1428	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1429	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1430	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1431	Porte et huisserie	A	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
1432	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1433	Mur	B	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
1434	Porte et huisserie	B	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
1435	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1436	Porte et huisserie	C	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1437	Mur	D	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1438	Mur	E	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1439	Mur	F	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1440	Mur	G	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1441	**Porte et huisserie**	**G**	**Bois / Vernis**	**Au centre**	**0,4**	**0,010**	
1442	Mur	H	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1443	Porte et huisserie	H1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1444	Porte et huisserie	H2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1445	Mur	I	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1446	Mur	J	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1447	Porte et huisserie	J1	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1448	Porte et huisserie	J2	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1449	Porte et huisserie	J3	Bois / NC	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 22

R+4 : Bureau 425 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1450	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1451	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1452	Mur	A	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
1453	Porte et huisserie	A	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
1454	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1455	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1456	Allège	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1457	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1458	Fenêtre Int. et huisserie	C	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1459	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1460	Coffrage	D	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1461	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 12

R+4 : Circulation 4-3 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1462	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1463	Poteau		Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1464	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1465	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1466	Porte et huisserie	A	Bois / Vernis	Au centre	0	0,010	
1467	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1468	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1469	Mur	C	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1470	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1471	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1472	Porte et huisserie	C1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1473	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1474	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1475	Porte et huisserie	C2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1476	Mur	D	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1477	Mur	E	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1478	Mur	F	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1479	Placard	F	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1480	Porte de placard Ext. et huisserie	F	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1481	Porte de placard Int. et huisserie	F	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1482	Mur	G	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1483	Mur	H	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1484	Porte et huisserie	H	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1485	Mur	I	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1486	Fenêtre Ext. et huisserie	I1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1487	Fenêtre Int. et huisserie	I1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1488	Porte et huisserie	I1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1489	Fenêtre Ext. et huisserie	I2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1490	Fenêtre Int. et huisserie	I2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1491	Porte et huisserie	I2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1492	Fenêtre Ext. et huisserie	I3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1493	Fenêtre Int. et huisserie	I3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1494	Mur	J	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1495	Mur	K	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1496	Mur	L	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1497	Mur	M	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1498	Porte et huisserie	M1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1499	Porte et huisserie	M2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1500	Mur	N	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1501	Allège	O	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1502	Fenêtre Ext. et huisserie	O	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1503	Fenêtre Int. et huisserie	O	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1504	Mur	O	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1505	Mur	P	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1506	Fenêtre Ext. et huisserie	Q	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1507	Fenêtre Int. et huisserie	Q	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1508	Mur	Q	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1509	Porte et huisserie	Q	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1510	Mur	R	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1511	Porte et huisserie	R	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 50

R+4 : Bureau 400 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1512	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1513	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1514	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1515	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1516	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1517	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1518	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1519	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1520	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1521	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1522	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1523	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1524	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1525	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1526	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1527	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+4 : Bureau 401 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1528	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1529	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1530	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1531	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1532	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1533	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1534	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1535	Mur	C	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1536	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1537	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1538	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1539	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1540	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1541	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1542	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1543	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+4 : Bureau 402-403 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1544	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1545	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1546	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1547	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1548	Mur	B	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1549	Mur	C	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1550	Mur	D	cloison métal / NC	Au centre	0	0,010	
1551	Porte et huisserie	D	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1552	Retombée	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1553	Placard	D1	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1554	Porte de placard Ext. et huisserie	D1	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1555	Porte de placard Int. et huisserie	D1	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1556	Placard	D2	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1557	Porte de placard Ext. et huisserie	D2	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1558	Porte de placard Int. et huisserie	D2	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1559	Placard	D3	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1560	Porte de placard Ext. et huisserie	D3	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1561	Porte de placard Int. et huisserie	D3	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1562	Placard	D4	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1563	Porte de placard Ext. et huisserie	D4	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1564	Porte de placard Int. et huisserie	D4	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1565	Mur	E	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1566	Mur	F	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1567	Allège	F1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1568	Fenêtre Ext. et huisserie	F1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1569	Fenêtre Int. et huisserie	F1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1570	Allège	F2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1571	Fenêtre Ext. et huisserie	F2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1572	Fenêtre Int. et huisserie	F2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1573	Allège	F3	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1574	Fenêtre Ext. et huisserie	F3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1575	Fenêtre Int. et huisserie	F3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1576	Allège	F4	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1577	Fenêtre Ext. et huisserie	F4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1578	Fenêtre Int. et huisserie	F4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1579	Mur	G	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1580	Mur	H	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 37

R+4 : Centre Ressources Techniques (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1581	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1582	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1583	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1584	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1585	Mur	A	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1586	Retombée	Au plafond	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1587	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1588	Mur	B	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1589	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1590	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1591	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1592	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1593	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1594	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1595	Allège	C3	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1596	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1597	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1598	Allège	C4	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1599	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1600	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1601	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1602	Placard	D1	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1603	Porte de placard Ext. et huisserie	D1	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1604	Porte de placard Int. et huisserie	D1	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1605	Placard	D2	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1606	Porte de placard Ext. et huisserie	D2	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1607	Porte de placard Int. et huisserie	D2	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1608	Placard	D3	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1609	Porte de placard Ext. et huisserie	D3	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1610	Porte de placard Int. et huisserie	D3	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1611	Placard	D4	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1612	Porte de placard Ext. et huisserie	D4	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1613	Porte de placard Int. et huisserie	D4	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1614	Placard	D5	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1615	Porte de placard Ext. et huisserie	D5	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1616	Porte de placard Int. et huisserie	D5	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1617	Placard	D6	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1618	Porte de placard Ext. et huisserie	D6	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1619	Porte de placard Int. et huisserie	D6	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1620	Placard	D7	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1621	Porte de placard Ext. et huisserie	D7	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1622	Porte de placard Int. et huisserie	D7	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1623	Mur	E	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1624	Mur	E	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1625	Placard	E	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1626	Porte de placard Ext. et huisserie	E	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1627	Porte de placard Int. et huisserie	E	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1628	Mur	F	Bois / NC	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 48

R+4 : Bureau 404 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1629	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1630	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1631	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1632	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1633	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1634	Mur	B	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1635	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1636	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1637	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1638	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1639	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1640	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1641	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1642	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 14

R+4 : Bureau 405 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1643	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1644	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1645	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1646	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1647	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1648	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1649	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1650	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1651	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1652	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1653	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1654	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1655	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1656	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1657	Mur	E	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1658	Mur	F	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+4 : Bureau 406 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1659	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1660	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1661	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1662	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1663	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1664	Mur	B	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1665	Mur	C	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1666	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1667	Mur	E	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1668	Allège	E1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1669	Fenêtre Ext. et huisserie	E1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1670	Fenêtre Int. et huisserie	E1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1671	Allège	E2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1672	Fenêtre Ext. et huisserie	E2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1673	Fenêtre Int. et huisserie	E2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1674	Mur	F	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+4 : Bureau 407 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1675	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1676	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1677	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1678	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1679	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1680	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1681	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1682	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1683	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1684	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1685	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1686	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1687	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1688	Mur	D	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 14

R+4 : Bureau 409 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1689	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1690	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1691	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1692	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1693	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1694	Mur	B	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1695	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1696	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1697	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1698	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1699	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1700	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1701	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1702	Allège	C3	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1703	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1704	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1705	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 17

R+4 : Circulation 4-4 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1706	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1707	Poteau		Béton / Bois	Au centre	0	0,010	
1708	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1709	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1710	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1711	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1712	Mur	B	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1713	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1714	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1715	Porte et huisserie	B1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1716	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1717	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1718	Porte et huisserie	B2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1719	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1720	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1721	Porte et huisserie	B3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1722	Fenêtre Ext. et huisserie	B4	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1723	Fenêtre Int. et huisserie	B4	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1724	Embrasure	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1725	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1726	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1727	Mur	C	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1728	Mur	D	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1729	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1730	Fenêtre Ext. et huisserie	E	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1731	Fenêtre Int. et huisserie	E	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1732	Mur	E	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1733	Fenêtre Ext. et huisserie	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1734	Fenêtre Int. et huisserie	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1735	Mur	F	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1736	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1737	Mur	G	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1738	Fenêtre Ext. et huisserie	H	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1739	Fenêtre Int. et huisserie	H	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1740	Mur	H	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1741	Mur	I	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1742	Mur	J	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1743	Placard	J	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1744	Porte de placard Ext. et huisserie	J	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1745	Porte de placard Int. et huisserie	J	Bois / NC	Au centre	0	0,010	
1746	Fenêtre Ext. et huisserie	J1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1747	Fenêtre Int. et huisserie	J1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1748	Porte et huisserie	J1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1749	Fenêtre Ext. et huisserie	J2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1750	Fenêtre Int. et huisserie	J2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1751	Porte et huisserie	J2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 46

R+4 : Bureau 410 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1752	Fenêtre Ext. et huisserie		Matériaux de synthèse /	Au centre	0	0,010	
1753	Fenêtre Int. et huisserie		Matériaux de synthèse /	Au centre	0	0,010	
1754	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1755	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1756	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1757	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1758	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1759	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1760	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1761	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1762	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1763	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1764	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1765	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1766	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1767	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1768	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1769	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 18

R+4 : Bureau 411 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1770	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1771	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1772	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1773	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1774	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1775	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1776	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1777	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1778	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1779	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1780	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1781	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1782	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1783	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1784	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1785	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+4 : Bureau 412 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1786	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1787	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1788	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1789	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1790	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1791	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1792	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1793	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1794	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1795	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1796	Placard	B	Bois / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1797	Porte de placard Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1798	Porte de placard Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1799	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1800	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1801	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1802	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1803	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1804	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1805	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1806	Allège	C3	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1807	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1808	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1809	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1810	Placard	D	Bois / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1811	Porte de placard Ext. et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1812	Porte de placard Int. et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1813	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 28

R+4 : Circulation 4-5 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1814	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1815	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1816	Embrasure	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1817	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1818	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1819	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1820	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1821	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1822	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1823	Mur	B	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1824	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1825	Mur	C	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1826	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1827	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1828	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1829	Mur	D	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1830	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 17

R+4 : Bureau 413 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1831	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1832	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1833	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1834	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1835	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1836	Mur	B	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1837	Mur	C	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1838	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1839	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1840	Mur	E	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1841	Mur	F	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1842	Mur	G	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1843	Mur	H	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1844	Mur	I	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1845	Allège	I1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1846	Fenêtre Ext. et huisserie	I1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1847	Fenêtre Int. et huisserie	I1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1848	Allège	I2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1849	Fenêtre Ext. et huisserie	I2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1850	Fenêtre Int. et huisserie	I2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1851	Allège	I3	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1852	Fenêtre Ext. et huisserie	I3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1853	Fenêtre Int. et huisserie	I3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1854	Allège	I4	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1855	Fenêtre Ext. et huisserie	I4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1856	Fenêtre Int. et huisserie	I4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1857	Mur	J	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 27

R+4 : Bureau 414 - Réunion (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1858	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1859	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1860	Coffrage	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
1861	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1862	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1863	Mur	B	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1864	Mur	C	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1865	Mur	D	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1866	Fenêtre Ext. et huisserie	E	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1867	Fenêtre Int. et huisserie	E	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1868	Mur	E	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1869	Porte et huisserie	E	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1870	Mur	F	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1871	Mur	G	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1872	Allège	G1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1873	Fenêtre Ext. et huisserie	G1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1874	Fenêtre Int. et huisserie	G1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1875	Allège	G2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1876	Fenêtre Ext. et huisserie	G2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1877	Fenêtre Int. et huisserie	G2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1878	Allège	G3	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1879	Fenêtre Ext. et huisserie	G3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1880	Fenêtre Int. et huisserie	G3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1881	Fenêtre Ext. et huisserie	H	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1882	Fenêtre Int. et huisserie	H	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1883	Mur	H	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 26

R+4 : Bureau 415 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1884	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1885	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1886	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1887	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1888	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1889	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1890	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1891	Mur	B	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1892	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1893	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1894	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1895	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1896	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1897	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1898	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1899	Allège	C3	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1900	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1901	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1902	Mur	D	cloison métal / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1903	Fenêtre Ext. et huisserie	E	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1904	Fenêtre Int. et huisserie	E	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1905	Mur	E	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1906	Mur	F	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 23

R+4 : Bureau 416 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1907	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1908	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1909	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1910	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1911	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1912	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1913	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1914	Mur	B	cloison métal /	Au centre	0	0,010	
1915	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1916	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1917	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1918	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1919	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1920	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1921	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1922	Mur	D	cloison métal /	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+4 : Bureau 417 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1923	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
1924	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1925	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1926	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1927	Mur	A	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1928	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1929	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
1930	Mur	B	cloison métal /	Au centre	0	0,010	
1931	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1932	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1933	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1934	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1935	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1936	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1937	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
1938	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1939	Mur	E	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1940	Mur	F	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1941	Mur	G	Plaques de plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	
1942	Mur	H	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 20

R+5 : Circulation 5-1 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
1943	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
1944	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
1945	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
1946	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
1947	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
1948	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
1949	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1950	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1951	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1952	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1953	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1954	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1955	**Porte et huisserie**	**B1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,16**	**0,010**	
1956	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1957	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1958	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1959	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1960	**Porte et huisserie**	**B2**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,3**	**0,010**	
1961	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1962	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1963	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1964	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1965	**Porte et huisserie**	**B3**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,29**	**0,010**	
1966	Fenêtre Ext. et huisserie	B4	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1967	Fenêtre Ext. et huisserie	B4	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1968	Fenêtre Int. et huisserie	B4	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1969	Fenêtre Int. et huisserie	B4	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1970	**Porte et huisserie**	**B4**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,27**	**0,010**	
1971	**Porte et huisserie**	**B5**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,26**	**0,010**	
1972	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
1973	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
1974	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
1975	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
1976	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1977	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1978	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1979	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1980	**Porte et huisserie**	**D1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,27**	**0,010**	
1981	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1982	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1983	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1984	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1985	**Porte et huisserie**	**D2**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,35**	**0,010**	
1986	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1987	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1988	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1989	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1990	**Porte et huisserie**	**D3**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,19**	**0,010**	
1991	Fenêtre Ext. et huisserie	D4	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1992	Fenêtre Ext. et huisserie	D4	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1993	Fenêtre Int. et huisserie	D4	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1994	Fenêtre Int. et huisserie	D4	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1995	**Porte et huisserie**	**D4**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,46**	**0,010**	
1996	Fenêtre Ext. et huisserie	D5	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1997	Fenêtre Ext. et huisserie	D5	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
1998	Fenêtre Int. et huisserie	D5	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
1999	Fenêtre Int. et huisserie	D5	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
2000	**Porte et huisserie**	**D5**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,36**	**0,010**	
2001	Fenêtre Ext. et huisserie	D6	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
2002	Fenêtre Ext. et huisserie	D6	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
2003	Fenêtre Int. et huisserie	D6	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
2004	Fenêtre Int. et huisserie	D6	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
2005	**Porte et huisserie**	**D6**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,33**	**0,010**	
2006	Fenêtre Ext. et huisserie	D7	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
2007	Fenêtre Ext. et huisserie	D7	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
2008	Fenêtre Int. et huisserie	D7	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
2009	Fenêtre Int. et huisserie	D7	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
2010	**Porte et huisserie**	**D7**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,32**	**0,010**	

Nombre Total d'UR : 40

R+5 : Bureau 511.1 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2011	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2012	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2013	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2014	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2015	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2016	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2017	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,15**	**0,010**	
2018	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2019	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2020	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2021	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2022	Placard	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2023	Placard	C	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2024	Placard	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2025	Placard	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2026	Mur	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2027	Mur	F	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2028	Fenêtre Ext. et huisserie	F1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2029	Fenêtre Ext. et huisserie	F1	Alu /	En haut	0	0,010	
2030	Fenêtre Int. et huisserie	F1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2031	Fenêtre Int. et huisserie	F1	Alu /	En haut	0	0,010	
2032	**Radiateur**	**F1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**10,6**	**0,010**	
2033	Fenêtre Ext. et huisserie	F2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2034	Fenêtre Ext. et huisserie	F2	Alu /	En haut	0	0,010	
2035	Fenêtre Int. et huisserie	F2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2036	Fenêtre Int. et huisserie	F2	Alu /	En haut	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2037	Radiateur	F2	Métal / Peinture	En haut	9,3	0,010	
2038	Mur	G	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2039	Mur	G	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2040	Plinthes	G	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2041	Plinthes	G	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2042	Mur	H	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2043	Mur	H	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 18

R+5 : Bureau 511.2 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2044	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2045	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2046	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2047	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2048	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2049	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2050	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2051	Fenêtre Int. et huisserie	A	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2052	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2053	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2054	Porte et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	En haut	0,3	0,010	
2055	Poutre	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2056	Poutre	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2057	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2058	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2059	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2060	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2061	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2062	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2063	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2064	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2065	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2066	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2067	Radiateur	C1	Métal / Peinture	En haut	9,6	0,010	
2068	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2069	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2070	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2071	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2072	Radiateur	C2	Métal / Peinture	En haut	8,6	0,010	
2073	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2074	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 17

R+5 : Bureau 512 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2075	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2076	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2077	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2078	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2079	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2080	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2081	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2082	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2083	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2084	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2085	Porte et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	En haut	0,29	0,010	
2086	Poutre	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2087	Poutre	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2088	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2089	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2090	Plinthes	BCDG	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2091	Plinthes	BCDG	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2092	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2093	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2094	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2095	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2096	Mur	E	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2097	Mur	E	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2098	Fenêtre Ext. et huisserie	F1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2099	Fenêtre Ext. et huisserie	F1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2100	Fenêtre Int. et huisserie	F1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2101	Fenêtre Int. et huisserie	F1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2102	Radiateur	F1	Métal / Peinture	En haut	8,6	0,010	
2103	Fenêtre Ext. et huisserie	F2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2104	Fenêtre Ext. et huisserie	F2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2105	Fenêtre Int. et huisserie	F2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2106	Fenêtre Int. et huisserie	F2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2107	Radiateur	F2	Métal / Peinture	En haut	9,4	0,010	
2108	Fenêtre Ext. et huisserie	F3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2109	Fenêtre Ext. et huisserie	F3	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2110	Fenêtre Int. et huisserie	F3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2111	Fenêtre Int. et huisserie	F3	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2112	Mur	G	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2113	Mur	G	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2114	Mur	H	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2115	Mur	H	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 22

R+5 : Bureau 512-1 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2116	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2117	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2118	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2119	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2120	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2121	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2122	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2123	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2124	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2125	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2126	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2127	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2128	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2129	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2130	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,27**	**0,010**	
2131	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2132	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2133	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2134	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2135	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2136	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2137	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2138	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2139	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,6**	**0,010**	
2140	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2141	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2142	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2143	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2144	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,4**	**0,010**	
2145	Plinthes	CDEF	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2146	Plinthes	CDEF	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2147	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2148	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2149	Mur	E	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2150	Mur	E	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2151	Mur	F	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2152	Mur	F	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 20

R+5 : Bureau 513 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2153	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2154	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2155	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2156	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2157	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2158	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2159	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,26**	**0,010**	
2160	Poutre	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2161	Poutre	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2162	Plinthes	BCDEFGHI	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2163	Plinthes	BCDEFGHI	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2164	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2165	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2166	Fenêtre Ext. et huisserie	E	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2167	Fenêtre Ext. et huisserie	E	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2168	Fenêtre Int. et huisserie	E	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2169	Fenêtre Int. et huisserie	E	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2170	Mur	H	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2171	Mur	H	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2172	Mur	I	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2173	Mur	I	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2174	Fenêtre Ext. et huisserie	I1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2175	Fenêtre Ext. et huisserie	I1	Alu /	En haut	0	0,010	
2176	Fenêtre Int. et huisserie	I1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2177	Fenêtre Int. et huisserie	I1	Alu /	En haut	0	0,010	
2178	**Radiateur**	**I1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,5**	**0,010**	
2179	Fenêtre Ext. et huisserie	I2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2180	Fenêtre Ext. et huisserie	I2	Alu /	En haut	0	0,010	
2181	Fenêtre Int. et huisserie	I2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2182	Fenêtre Int. et huisserie	I2	Alu /	En haut	0	0,010	
2183	**Radiateur**	**I2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,6**	**0,010**	
2184	Fenêtre Ext. et huisserie	I3	Alu /	Au centre	0	0,010	
2185	Fenêtre Ext. et huisserie	I3	Alu /	En haut	0	0,010	
2186	Fenêtre Int. et huisserie	I3	Alu /	Au centre	0	0,010	
2187	Fenêtre Int. et huisserie	I3	Alu /	En haut	0	0,010	
2188	**Radiateur**	**I3**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,5**	**0,010**	
2189	Fenêtre Ext. et huisserie	I4	Alu /	Au centre	0	0,010	
2190	Fenêtre Ext. et huisserie	I4	Alu /	En haut	0	0,010	
2191	Fenêtre Int. et huisserie	I4	Alu /	Au centre	0	0,010	
2192	Fenêtre Int. et huisserie	I4	Alu /	En haut	0	0,010	
2193	**Radiateur**	**I4**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,9**	**0,010**	
2194	Fenêtre Ext. et huisserie	I5	Alu /	Au centre	0	0,010	
2195	Fenêtre Ext. et huisserie	I5	Alu /	En haut	0	0,010	
2196	Fenêtre Int. et huisserie	I5	Alu /	Au centre	0	0,010	
2197	Fenêtre Int. et huisserie	I5	Alu /	En haut	0	0,010	
2198	**Radiateur**	**I5**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,8**	**0,010**	
2199	Mur	J	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2200	Mur	J	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 27

R+5 : Bureau 514 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2201	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2202	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2203	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2204	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2205	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2206	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2207	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2208	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2209	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2210	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2211	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,27**	**0,010**	
2212	Poutre	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2213	Poutre	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2214	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2215	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2216	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2217	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2218	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2219	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2220	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2221	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2222	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2223	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2224	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,9**	**0,010**	
2225	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2226	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2227	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2228	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2229	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,8**	**0,010**	
2230	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2231	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 17

R+5 : Bureau 515 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2232	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2233	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2234	Poutre		Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2235	Poutre		Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2236	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2237	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2238	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2239	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2240	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,34**	**0,010**	
2241	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2242	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2243	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2244	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2245	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2246	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2247	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,9**	**0,010**	
2248	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2249	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2250	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2251	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2252	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
2253	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2254	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2255	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2256	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2257	**Radiateur**	**C3**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,4**	**0,010**	
2258	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2259	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2260	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2261	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2262	**Radiateur**	**C4**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,9**	**0,010**	
2263	Fenêtre Ext. et huisserie	C5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2264	Fenêtre Ext. et huisserie	C5	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2265	Fenêtre Int. et huisserie	C5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2266	Fenêtre Int. et huisserie	C5	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2267	**Radiateur**	**C5**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,9**	**0,010**	
2268	Fenêtre Ext. et huisserie	C6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2269	Fenêtre Ext. et huisserie	C6	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2270	Fenêtre Int. et huisserie	C6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2271	Fenêtre Int. et huisserie	C6	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2272	**Radiateur**	**C6**	**Métal / Peinture**	**Au centre**	**8,69**	**0,010**	
2273	Fenêtre Ext. et huisserie	C7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2274	Fenêtre Ext. et huisserie	C7	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2275	Fenêtre Int. et huisserie	C7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2276	Fenêtre Int. et huisserie	C7	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2277	**Radiateur**	**C7**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,9**	**0,010**	
2278	Fenêtre Ext. et huisserie	C8	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2279	Fenêtre Ext. et huisserie	C8	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2280	Fenêtre Int. et huisserie	C8	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2281	Fenêtre Int. et huisserie	C8	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2282	**Radiateur**	**C8**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,1**	**0,010**	
2283	Fenêtre Ext. et huisserie	C9	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2284	Fenêtre Ext. et huisserie	C9	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2285	Fenêtre Int. et huisserie	C9	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2286	Fenêtre Int. et huisserie	C9	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2287	**Radiateur**	**C9**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,2**	**0,010**	
2288	Plinthes	CDFGHJKL	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2289	Plinthes	CDFGHJKL	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2290	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2291	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2292	Mur	E	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2293	Mur	E	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2294	**Porte et huisserie**	**E**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,37**	**0,010**	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2295	Mur	F	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2296	Mur	F	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2297	Mur	G	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2298	Mur	G	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2299	Mur	H	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2300	Mur	H	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2301	Mur	I	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2302	Mur	I	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2303	Fenêtre Ext. et huisserie	I1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2304	Fenêtre Ext. et huisserie	I1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2305	Fenêtre Int. et huisserie	I1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2306	Fenêtre Int. et huisserie	I1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2307	Fenêtre Ext. et huisserie	I2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2308	Fenêtre Ext. et huisserie	I2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2309	Fenêtre Int. et huisserie	I2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2310	Fenêtre Int. et huisserie	I2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2311	Mur	J	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2312	Mur	J	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2313	Mur	K	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2314	Mur	K	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2315	Mur	L	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2316	Mur	L	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 48

R+5 : Bureau 500 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2317	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2318	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2319	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2320	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2321	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2322	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2323	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2324	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2325	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2326	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2327	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,32**	**0,010**	
2328	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2329	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2330	Plinthes	BC	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2331	Plinthes	BC	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2332	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2333	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2334	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2335	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2336	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2337	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2338	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,5**	**0,010**	
2339	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2340	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2341	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2342	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2343	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
2344	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2345	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+5 : Bureau 501 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2346	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2347	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2348	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2349	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2350	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2351	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2352	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2353	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2354	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2355	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2356	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,2**	**0,010**	
2357	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2358	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2359	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2360	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2361	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2362	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2363	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2364	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2365	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2366	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2367	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,2**	**0,010**	
2368	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2369	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2370	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2371	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2372	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**6,9**	**0,010**	
2373	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2374	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+5 : Bureau 502 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2375	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2376	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2377	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2378	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2379	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2380	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2381	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2382	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2383	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2384	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2385	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,33**	**0,010**	
2386	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2387	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2388	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2389	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2390	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2391	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2392	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2393	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2394	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2395	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2396	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,5**	**0,010**	
2397	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2398	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2399	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2400	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2401	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**6,6**	**0,010**	
2402	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2403	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+5 : Bureau 503 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2404	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2405	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2406	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2407	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2408	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2409	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2410	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2411	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2412	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2413	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2414	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,36**	**0,010**	
2415	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2416	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2417	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2418	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2419	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2420	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2421	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2422	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2423	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2424	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2425	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,4**	**0,010**	
2426	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2427	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2428	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2429	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2430	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,8**	**0,010**	
2431	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
2432	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
2433	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
2434	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
2435	**Radiateur**	**C3**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,9**	**0,010**	
2436	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2437	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 19

R+5 : Bureau 504 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2438	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2439	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2440	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2441	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2442	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2443	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2444	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2445	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2446	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2447	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2448	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,4**	**0,010**	
2449	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2450	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2451	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2452	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2453	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2454	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2455	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2456	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2457	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2458	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2459	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,99**	**0,010**	
2460	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2461	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2462	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2463	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2464	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
2465	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2466	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+5 : Bureau 505 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2467	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2468	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2469	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2470	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2471	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2472	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2473	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2474	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2475	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2476	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2477	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,27**	**0,010**	
2478	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2479	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2480	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2481	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2482	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2483	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2484	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2485	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2486	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2487	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2488	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
2489	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2490	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2491	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2492	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2493	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,9**	**0,010**	
2494	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2495	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2496	Placard	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2497	Placard	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2498	Porte et huisserie	D	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2499	Porte et huisserie	D	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 18

R+5 : Bureau 506 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2500	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2501	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2502	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2503	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2504	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2505	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2506	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2507	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2508	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2509	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2510	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,35**	**0,010**	
2511	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2512	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2513	Placard	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2514	Placard	B	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2515	Porte et huisserie	B	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2516	Porte et huisserie	B	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2517	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2518	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2519	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2520	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2521	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2522	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2523	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2524	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2525	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,0**	**0,010**	
2526	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2527	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2528	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2529	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2530	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,5**	**0,010**	
2531	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2532	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 18

R+5 : Bureau 507 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2533	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2534	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2535	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2536	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2537	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2538	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2539	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2540	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2541	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2542	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2543	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,19**	**0,010**	
2544	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2545	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2546	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2547	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2548	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2549	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2550	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2551	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2552	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2553	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2554	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**6,9**	**0,010**	
2555	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2556	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2557	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2558	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2559	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,0**	**0,010**	
2560	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2561	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2562	Porte et huisserie	D	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2563	Porte et huisserie	D	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 17

R+5 : Bureau 508 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2564	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2565	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2566	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2567	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2568	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2569	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2570	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2571	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2572	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2573	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2574	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,46**	**0,010**	
2575	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2576	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2577	Porte et huisserie	B	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2578	Porte et huisserie	B	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2579	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2580	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2581	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2582	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2583	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2584	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2585	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2586	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2587	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
2588	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2589	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2590	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2591	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2592	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,3**	**0,010**	
2593	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2594	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2595	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2596	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 18

R+5 : Bureau 509 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2597	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2598	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2599	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2600	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2601	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2602	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2603	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2604	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2605	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2606	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2607	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,36**	**0,010**	
2608	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2609	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2610	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2611	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2612	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2613	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2614	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2615	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2616	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2617	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2618	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2619	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2620	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,7**	**0,010**	
2621	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2622	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2623	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2624	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2625	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**9,8**	**0,010**	
2626	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2627	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 17

R+5 : Bureau 510 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2628	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2629	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2630	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2631	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2632	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2633	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2634	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2635	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2636	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2637	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2638	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,33**	**0,010**	
2639	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2640	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2641	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2642	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2643	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2644	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2645	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2646	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2647	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2648	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2649	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,49**	**0,010**	
2650	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2651	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2652	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2653	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2654	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,1**	**0,010**	
2655	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2656	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2657	Placard	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2658	Placard	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2659	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2660	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 18

R+5 : Bureau 511 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2661	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2662	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2663	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2664	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2665	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2666	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2667	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2668	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2669	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2670	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2671	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,32**	**0,010**	
2672	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2673	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2674	Placard	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2675	Placard	B	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2676	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2677	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2678	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2679	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2680	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2681	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2682	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2683	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2684	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
2685	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
2686	**Radiateur**	**C1**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**7,9**	**0,010**	
2687	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2688	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2689	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
2690	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
2691	**Radiateur**	**C2**	**Métal / Peinture**	**En haut**	**8,6**	**0,010**	
2692	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2693	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 18

R+5 : Circulation 5-2 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2694	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2695	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2696	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2697	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2698	Mur	A	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2699	Mur	A	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2700	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2701	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2702	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2703	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2704	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2705	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2706	**Porte et huisserie**	**B1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,47**	**0,010**	
2707	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2708	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2709	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2710	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2711	**Porte et huisserie**	**B2**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,37**	**0,010**	
2712	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2713	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2714	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2715	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2716	**Porte et huisserie**	**B3**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,44**	**0,010**	
2717	Fenêtre Ext. et huisserie	B4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2718	Fenêtre Ext. et huisserie	B4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2719	Fenêtre Int. et huisserie	B4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2720	Fenêtre Int. et huisserie	B4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2721	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2722	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2723	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2724	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2725	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2726	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2727	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2728	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2729	**Porte et huisserie**	**D1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,44**	**0,010**	
2730	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2731	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2732	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2733	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2734	**Porte et huisserie**	**D2**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,45**	**0,010**	
2735	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2736	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2737	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2738	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2739	**Porte et huisserie**	**D3**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,33**	**0,010**	
2740	Fenêtre Ext. et huisserie	D4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2741	Fenêtre Ext. et huisserie	D4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2742	Fenêtre Int. et huisserie	D4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2743	Fenêtre Int. et huisserie	D4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2744	**Porte et huisserie**	**D4**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,18**	**0,010**	
2745	Fenêtre Ext. et huisserie	D5	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2746	Fenêtre Ext. et huisserie	D5	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2747	Fenêtre Int. et huisserie	D5	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2748	Fenêtre Int. et huisserie	D5	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2749	**Porte et huisserie**	**D5**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,32**	**0,010**	

Nombre Total d'UR : 32

R+5 : Palier 5 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2750	Plafond		Faux plafond / NC	A gauche	0	0,010	
2751	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
2752	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2753	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2754	Mur	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2755	Mur	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
2756	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2757	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2758	Plinthes	ACDEGIJKL	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2759	Plinthes	ACDEGIJKL	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2760	Porte et huisserie	B	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2761	Porte et huisserie	B	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2762	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
2763	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
2764	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
2765	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
2766	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
2767	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
2768	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
2769	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
2770	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
2771	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
2772	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
2773	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	
2774	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2775	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
2776	Porte et huisserie	C	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2777	Porte et huisserie	C	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2778	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2779	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
2780	Placard	D1	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
2781	Placard	D1	Béton / NC	En haut	0	0,010	
2782	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2783	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2784	Placard	D2	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
2785	Placard	D2	Béton / NC	En haut	0	0,010	
2786	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2787	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2788	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2789	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
2790	Mur	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2791	Mur	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
2792	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2793	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2794	Mur	G	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2795	Mur	G	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
2796	Porte et huisserie	G	Bois et vitrage / Vernis	Au centre	0	0,010	
2797	Porte et huisserie	G	Bois et vitrage / Vernis	En haut	0	0,010	
2798	Placard	H	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
2799	Placard	H	Béton / NC	En haut	0	0,010	
2800	Porte et huisserie	H1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2801	Porte et huisserie	H1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2802	Porte et huisserie	H2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2803	Porte et huisserie	H2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2804	Mur	I	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2805	Mur	I	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
2806	Mur	J	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2807	Mur	J	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
2808	Placard	J	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
2809	Placard	J	Béton / NC	En haut	0	0,010	
2810	Porte et huisserie	J1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2811	Porte et huisserie	J1	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2812	**Porte et huisserie**	**J2**	**Bois / Peinture**	**En haut**	**0,53**	**0,010**	
2813	**Porte et huisserie**	**J3**	**Bois / Peinture**	**En haut**	**0,51**	**0,010**	
2814	Mur	K	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2815	Mur	K	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
2816	Mur	L	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2817	Mur	L	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 35

R+5 : Bureau 517 - Réunion (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2818	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2819	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2820	Porte et huisserie	A	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2821	Porte et huisserie	A	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2822	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2823	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2824	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2825	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2826	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2827	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2828	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2829	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2830	Fenêtre Ext. et huisserie	A3	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2831	Fenêtre Ext. et huisserie	A3	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2832	Fenêtre Int. et huisserie	A3	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2833	Fenêtre Int. et huisserie	A3	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2834	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2835	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2836	Plinthes	BCD	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2837	Plinthes	BCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2838	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2839	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2840	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2841	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2842	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2843	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2844	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2845	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2846	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2847	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2848	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2849	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2850	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Métal et vitrage / Peinture	Au centre	0	0,010	
2851	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Métal et vitrage / Peinture	En haut	0	0,010	
2852	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2853	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2854	Poteau	D	Alu / Peinture	Au centre	0	0,010	
2855	Poteau	D	Alu / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 19

R+5 : Toiture terrasse (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2856	Mur		Béton / NC	Au centre	0	0,010	
2857	Mur		Béton / NC	En haut	0	0,010	
2858	plaques		gazal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2859	plaques		gazal / Peinture	En haut	0	0,010	
2860	Sol		Graviers /	A gauche	0	0,010	
2861	Sol		Graviers /	Au centre	0	0,010	
2862	Sol		revêtements bitumineux /	A gauche	0	0,010	
2863	Sol		revêtements bitumineux /	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 4

R+7 : Circulation 7-1 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2864	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2865	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2866	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2867	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2868	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2869	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2870	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2871	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2872	Plinthes	ABCEF	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2873	Plinthes	ABCEF	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2874	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2875	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2876	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2877	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2878	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2879	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2880	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2881	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2882	Mur	E	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2883	Mur	E	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2884	Mur	F	Cloison bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2885	Mur	F	Cloison bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2886	Mur	F	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2887	Mur	F	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2888	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2889	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2890	**Porte et huisserie**	**F**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,76**	**0,010**	
2891	Mur	G	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2892	Mur	G	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2893	Porte et huisserie	G	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2894	Porte et huisserie	G	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2895	Mur	H	Cloison bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2896	Mur	H	Cloison bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2897	**Porte et huisserie**	**H1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,33**	**0,010**	
2898	**Porte et huisserie**	**H2**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,29**	**0,010**	
2899	**Porte et huisserie**	**H3**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,45**	**0,010**	
2900	**Porte et huisserie**	**H4**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,36**	**0,010**	
2901	**Porte et huisserie**	**H5**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,28**	**0,010**	
2902	**Porte et huisserie**	**H6**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,43**	**0,010**	

Nombre Total d'UR : 23

R+7 : Sanitaires 7-1 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2903	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2904	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2905	Sol		Carrelage /	-	nm	-	
2906	Mur	A	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	
2907	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2908	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2909	Mur	B	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	
2910	Mur	C	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	
2911	Porte et huisserie	C1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2912	Porte et huisserie	C1	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2913	Porte et huisserie	C2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2914	Porte et huisserie	C2	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2915	Mur	D	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	

Nombre Total d'UR : 9

R+7 : WC 7-1 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2916	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2917	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2918	Sol		Carrelage /	-	nm	-	
2919	Mur	A	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	
2920	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2921	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2922	Mur	B	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	
2923	Mur	D	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	
2924	Mur	E	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	
2925	Mur	F	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	

Nombre Total d'UR : 8

R+7 : WC 7-2 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2926	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2927	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2928	Sol		Carrelage /	-	nm	-	
2929	Mur	A	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	
2930	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2931	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2932	Mur	B	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	
2933	Mur	C	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	
2934	Mur	D	Plâtre / Carrelage	-	nm	-	

Nombre Total d'UR : 7

R+7 : Bureau 713 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
2935	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
2936	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
2937	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
2938	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
2939	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2940	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2941	Poutre	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2942	Poutre	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2943	**Porte et huisserie**	**A1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,7**	**0,010**	
2944	Poteau	A1	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2945	Poteau	A1	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2946	**Porte et huisserie**	**A2**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,2**	**0,010**	
2947	Poteau	A2	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2948	Poteau	A2	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2949	Poteau	A3	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2950	Poteau	A3	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2951	Plinthes	ABCDEF	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
2952	Plinthes	ABCDEF	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2953	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2954	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2955	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2956	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2957	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2958	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2959	Mur	E	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2960	Mur	E	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2961	Mur	F	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2962	Mur	F	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2963	Poutre	I	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
2964	Poutre	I	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
2965	Mur	K	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
2966	Mur	K	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
2967	Porte et huisserie	L	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
2968	Porte et huisserie	L	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
2969	Mur	M	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
2970	Mur	M	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
2971	Fenêtre Ext. et huisserie	M1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2972	Fenêtre Ext. et huisserie	M1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2973	Fenêtre Int. et huisserie	M1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2974	Fenêtre Int. et huisserie	M1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2975	Fenêtre Ext. et huisserie	M10	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2976	Fenêtre Ext. et huisserie	M10	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2977	Fenêtre Int. et huisserie	M10	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2978	Fenêtre Int. et huisserie	M10	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2979	Fenêtre Ext. et huisserie	M11	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2980	Fenêtre Ext. et huisserie	M11	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2981	Fenêtre Int. et huisserie	M11	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2982	Fenêtre Int. et huisserie	M11	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2983	Fenêtre Ext. et huisserie	M12	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2984	Fenêtre Ext. et huisserie	M12	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2985	Fenêtre Int. et huisserie	M12	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2986	Fenêtre Int. et huisserie	M12	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2987	Fenêtre Ext. et huisserie	M13	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2988	Fenêtre Ext. et huisserie	M13	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2989	Fenêtre Int. et huisserie	M13	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2990	Fenêtre Int. et huisserie	M13	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2991	Fenêtre Ext. et huisserie	M2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2992	Fenêtre Ext. et huisserie	M2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2993	Fenêtre Int. et huisserie	M2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2994	Fenêtre Int. et huisserie	M2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2995	Fenêtre Ext. et huisserie	M3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2996	Fenêtre Ext. et huisserie	M3	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2997	Fenêtre Int. et huisserie	M3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
2998	Fenêtre Int. et huisserie	M3	Alu / NC	En haut	0	0,010	
2999	Fenêtre Ext. et huisserie	M4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3000	Fenêtre Ext. et huisserie	M4	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3001	Fenêtre Int. et huisserie	M4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3002	Fenêtre Int. et huisserie	M4	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3003	Fenêtre Ext. et huisserie	M5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3004	Fenêtre Ext. et huisserie	M5	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3005	Fenêtre Int. et huisserie	M5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3006	Fenêtre Int. et huisserie	M5	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3007	Fenêtre Ext. et huisserie	M6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3008	Fenêtre Ext. et huisserie	M6	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3009	Fenêtre Int. et huisserie	M6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3010	Fenêtre Int. et huisserie	M6	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3011	Fenêtre Ext. et huisserie	M7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3012	Fenêtre Ext. et huisserie	M7	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3013	Fenêtre Int. et huisserie	M7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3014	Fenêtre Int. et huisserie	M7	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3015	Fenêtre Ext. et huisserie	M8	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3016	Fenêtre Ext. et huisserie	M8	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3017	Fenêtre Int. et huisserie	M8	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3018	Fenêtre Int. et huisserie	M8	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3019	Fenêtre Ext. et huisserie	M9	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3020	Fenêtre Ext. et huisserie	M9	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3021	Fenêtre Int. et huisserie	M9	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3022	Fenêtre Int. et huisserie	M9	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3023	Porte et huisserie	O	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3024	Porte et huisserie	O	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3025	Mur	P	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3026	Mur	P	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3027	Mur	Q	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3028	Mur	Q	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3029	Mur	R	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3030	Mur	R	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3031	Mur	S	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3032	Mur	S	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3033	Mur	X	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3034	Mur	X	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 51

R+7 : Bureau 713-1 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3035	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3036	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3037	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3038	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3039	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3040	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3041	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3042	Fenêtre Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3043	Mur	A	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3044	Mur	A	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3045	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3046	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3047	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3048	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3049	Plinthes	BEF	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3050	Plinthes	BEF	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3051	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3052	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3053	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3054	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3055	Mur	E	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3056	Mur	E	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3057	Mur	F	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3058	Mur	F	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3059	Fenêtre Ext. et huisserie	F1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3060	Fenêtre Ext. et huisserie	F1	Alu /	En haut	0	0,010	
3061	Fenêtre Int. et huisserie	F1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3062	Fenêtre Int. et huisserie	F1	Alu /	En haut	0	0,010	
3063	Fenêtre Ext. et huisserie	F2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3064	Fenêtre Ext. et huisserie	F2	Alu /	En haut	0	0,010	
3065	Fenêtre Int. et huisserie	F2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3066	Fenêtre Int. et huisserie	F2	Alu /	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+7 : Bureau 714 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3067	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3068	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3069	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3070	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3071	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3072	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3073	Porte et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3074	Porte et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3075	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3076	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3077	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3078	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3079	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3080	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3081	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3082	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3083	Fenêtre Ext. et huisserie	A3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3084	Fenêtre Ext. et huisserie	A3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3085	Fenêtre Int. et huisserie	A3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3086	Fenêtre Int. et huisserie	A3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3087	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3088	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3089	Fenêtre Int. et huisserie	B	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3090	Fenêtre Int. et huisserie	B	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3091	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3092	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3093	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3094	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3095	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3096	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3097	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3098	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3099	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3100	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3101	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3102	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3103	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3104	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3105	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3106	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 20

R+7 : Circulation 7-2 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3107	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3108	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3109	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3110	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3111	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3112	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/ constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3113	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3114	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3115	Plinthes	AE	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3116	Plinthes	AE	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3117	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3118	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3119	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3120	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3121	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3122	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3123	**Porte et huisserie**	**B1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,21**	**0,010**	
3124	Fenêtre Ext. et huisserie	B10	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3125	Fenêtre Ext. et huisserie	B10	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3126	Fenêtre Int. et huisserie	B10	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3127	Fenêtre Int. et huisserie	B10	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3128	Fenêtre Ext. et huisserie	B11	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3129	Fenêtre Ext. et huisserie	B11	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3130	Fenêtre Int. et huisserie	B11	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3131	Fenêtre Int. et huisserie	B11	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3132	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3133	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3134	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3135	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3136	**Porte et huisserie**	**B2**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,14**	**0,010**	
3137	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3138	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3139	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3140	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3141	**Porte et huisserie**	**B3**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,54**	**0,010**	
3142	Fenêtre Ext. et huisserie	B4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3143	Fenêtre Ext. et huisserie	B4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3144	Fenêtre Int. et huisserie	B4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3145	Fenêtre Int. et huisserie	B4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3146	**Porte et huisserie**	**B4**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,13**	**0,010**	
3147	Fenêtre Ext. et huisserie	B5	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3148	Fenêtre Ext. et huisserie	B5	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3149	Fenêtre Int. et huisserie	B5	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3150	Fenêtre Int. et huisserie	B5	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3151	**Porte et huisserie**	**B5**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,27**	**0,010**	
3152	Fenêtre Ext. et huisserie	B6	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3153	Fenêtre Ext. et huisserie	B6	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3154	Fenêtre Int. et huisserie	B6	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3155	Fenêtre Int. et huisserie	B6	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3156	Fenêtre Ext. et huisserie	B7	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3157	Fenêtre Ext. et huisserie	B7	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3158	Fenêtre Int. et huisserie	B7	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3159	Fenêtre Int. et huisserie	B7	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3160	Fenêtre Ext. et huisserie	B8	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3161	Fenêtre Ext. et huisserie	B8	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3162	Fenêtre Int. et huisserie	B8	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3163	Fenêtre Int. et huisserie	B8	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3164	Fenêtre Ext. et huisserie	B9	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3165	Fenêtre Ext. et huisserie	B9	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3166	Fenêtre Int. et huisserie	B9	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3167	Fenêtre Int. et huisserie	B9	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3168	Mur	C	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3169	Mur	C	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3170	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3171	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3172	Fenêtre Int. et huisserie	D	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3173	Fenêtre Int. et huisserie	D	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3174	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3175	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3176	**Porte et huisserie**	**D**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,21**	**0,010**	
3177	Mur	E	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3178	Mur	E	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3179	Porte et huisserie	E	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3180	Porte et huisserie	E	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3181	Mur	F	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3182	Mur	F	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3183	Fenêtre Ext. et huisserie	F1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3184	Fenêtre Ext. et huisserie	F1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3185	Fenêtre Int. et huisserie	F1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3186	Fenêtre Int. et huisserie	F1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3187	**Porte et huisserie**	**F1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,35**	**0,010**	
3188	Fenêtre Ext. et huisserie	F2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3189	Fenêtre Ext. et huisserie	F2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3190	Fenêtre Int. et huisserie	F2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3191	Fenêtre Int. et huisserie	F2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3192	**Porte et huisserie**	**F2**	**Bois et métal / Peinture**	**Au centre**	**0,28**	**0,010**	
3193	Fenêtre Ext. et huisserie	F3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3194	Fenêtre Ext. et huisserie	F3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3195	Fenêtre Int. et huisserie	F3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3196	Fenêtre Int. et huisserie	F3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3197	**Porte et huisserie**	**F3**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,38**	**0,010**	
3198	Fenêtre Ext. et huisserie	F4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3199	Fenêtre Ext. et huisserie	F4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3200	Fenêtre Int. et huisserie	F4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3201	Fenêtre Int. et huisserie	F4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3202	**Porte et huisserie**	**F4**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,26**	**0,010**	
3203	Fenêtre Ext. et huisserie	F5	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3204	Fenêtre Ext. et huisserie	F5	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3205	Fenêtre Int. et huisserie	F5	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3206	Fenêtre Int. et huisserie	F5	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3207	**Porte et huisserie**	**F5**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,28**	**0,010**	
3208	Fenêtre Ext. et huisserie	F6	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3209	Fenêtre Ext. et huisserie	F6	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3210	Fenêtre Int. et huisserie	F6	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3211	Fenêtre Int. et huisserie	F6	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3212	Porte et huisserie	F6	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3213	**Porte et huisserie**	**F6**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,66**	**0,010**	
3214	Fenêtre Ext. et huisserie	F7	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3215	Fenêtre Ext. et huisserie	F7	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3216	Fenêtre Int. et huisserie	F7	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3217	Fenêtre Int. et huisserie	F7	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3218	Fenêtre Ext. et huisserie	F8	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3219	Fenêtre Ext. et huisserie	F8	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3220	Fenêtre Int. et huisserie	F8	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3221	Fenêtre Int. et huisserie	F8	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3222	Fenêtre Ext. et huisserie	F9	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3223	Fenêtre Ext. et huisserie	F9	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3224	Fenêtre Int. et huisserie	F9	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3225	Fenêtre Int. et huisserie	F9	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 65

R+7 : Bureau 715 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3226	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3227	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3228	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3229	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3230	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3231	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3232	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**Au centre**	**0,14**	**0,010**	
3233	Poteau	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3234	Poteau	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3235	Poutre	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3236	Poutre	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3237	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3238	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3239	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3240	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3241	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3242	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3243	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3244	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3245	Fenêtre Ext. et huisserie	A3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3246	Fenêtre Ext. et huisserie	A3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3247	Fenêtre Int. et huisserie	A3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3248	Fenêtre Int. et huisserie	A3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3249	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3250	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3251	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3252	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3253	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3254	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3255	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3256	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3257	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3258	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3259	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3260	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3261	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3262	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3263	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
3264	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
3265	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
3266	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
3267	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3268	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3269	Placard	D	PVC / Peinture	-	nm	-	
3270	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3271	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 24

R+7 : Bureau 716/717 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3272	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3273	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3274	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3275	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3276	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3277	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3278	Poteau	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3279	Poteau	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3280	Poutre	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3281	Poutre	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3282	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3283	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3284	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3285	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3286	**Porte et huisserie**	**A1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,54**	**0,010**	
3287	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3288	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3289	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3290	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3291	**Porte et huisserie**	**A2**	**Bois et métal / Peinture**	**Au centre**	**0,13**	**0,010**	
3292	Fenêtre Ext. et huisserie	A3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3293	Fenêtre Ext. et huisserie	A3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3294	Fenêtre Int. et huisserie	A3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3295	Fenêtre Int. et huisserie	A3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3296	Fenêtre Ext. et huisserie	A4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3297	Fenêtre Ext. et huisserie	A4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3298	Fenêtre Int. et huisserie	A4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3299	Fenêtre Int. et huisserie	A4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3300	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3301	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3302	Placard	B	PVC / Peinture	-	nm	-	
3303	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3304	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3305	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3306	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3307	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3308	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3309	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3310	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3311	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3312	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3313	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3314	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3315	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3316	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3317	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
3318	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
3319	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
3320	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
3321	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu /	Au centre	0	0,010	
3322	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu /	En haut	0	0,010	
3323	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu /	Au centre	0	0,010	
3324	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu /	En haut	0	0,010	
3325	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3326	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 29

R+7 : Bureau 718 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3327	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3328	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3329	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3330	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3331	Mur	A	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3332	Mur	A	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3333	Placard	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3334	Placard	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3335	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**Au centre**	**0,27**	**0,010**	
3336	Poteau	A1	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3337	Poteau	A1	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3338	Poteau	A2	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3339	Poteau	A2	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3340	Mur	B	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3341	Mur	B	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3342	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3343	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3344	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3345	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3346	Mur	D	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3347	Mur	D	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3348	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3349	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3350	Fenêtre Ext. et huisserie	E1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3351	Fenêtre Ext. et huisserie	E1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3352	Fenêtre Int. et huisserie	E1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3353	Fenêtre Int. et huisserie	E1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3354	Fenêtre Ext. et huisserie	E2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3355	Fenêtre Ext. et huisserie	E2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3356	Fenêtre Int. et huisserie	E2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3357	Fenêtre Int. et huisserie	E2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3358	Fenêtre Ext. et huisserie	E3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3359	Fenêtre Ext. et huisserie	E3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3360	Fenêtre Int. et huisserie	E3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3361	Fenêtre Int. et huisserie	E3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 18

R+7 : Bureau 719 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3362	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3363	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3364	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3365	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3366	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3367	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3368	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3369	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3370	Mur	A	Cloison plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3371	Mur	A	Cloison plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3372	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**Au centre**	**0,19**	**0,010**	
3373	Mur	B	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3374	Mur	B	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3375	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3376	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3377	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3378	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3379	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3380	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3381	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3382	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3383	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3384	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3385	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3386	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3387	Plinthes	CD	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3388	Plinthes	CD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3389	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3390	Mur	D	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 15

R+7 : Bureau 700 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3391	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3392	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3393	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3394	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3395	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3396	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3397	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3398	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3399	Mur	A	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3400	Mur	A	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3401	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,35**	**0,010**	
3402	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3403	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3404	Plinthes	BC	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3405	Plinthes	BC	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3406	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3407	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3408	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3409	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3410	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3411	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3412	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3413	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3414	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3415	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3416	Mur	D	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3417	Mur	D	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 14

R+7 : Bureau 701 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3418	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3419	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3420	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3421	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3422	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3423	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3424	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3425	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3426	Mur	A	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3427	Mur	A	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3428	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,28**	**0,010**	
3429	Mur	B	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3430	Mur	B	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3431	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3432	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3433	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3434	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3435	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3436	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3437	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3438	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3439	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3440	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3441	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3442	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3443	Mur	D	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3444	Mur	D	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 14

R+7 : Bureau 702 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3445	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3446	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3447	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3448	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3449	Mur	A	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3450	Mur	A	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3451	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,38**	**0,010**	
3452	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3453	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3454	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3455	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3456	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3457	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3458	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3459	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3460	Fenêtre Ext. et huisserie	A3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3461	Fenêtre Ext. et huisserie	A3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3462	Fenêtre Int. et huisserie	A3	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3463	Fenêtre Int. et huisserie	A3	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3464	Fenêtre Ext. et huisserie	A4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3465	Fenêtre Ext. et huisserie	A4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3466	Fenêtre Int. et huisserie	A4	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3467	Fenêtre Int. et huisserie	A4	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3468	Mur	B	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3469	Mur	B	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3470	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3471	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3472	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3473	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3474	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3475	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3476	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3477	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3478	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3479	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3480	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3481	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3482	Mur	D	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3483	Mur	D	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3484	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3485	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 21

R+7 : Bureau 705 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3486	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3487	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3488	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3489	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3490	Mur	A	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3491	Mur	A	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3492	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3493	Fenêtre Ext. et huisserie	A1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3494	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3495	Fenêtre Int. et huisserie	A1	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3496	**Porte et huisserie**	**A1**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,38**	**0,010**	
3497	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3498	Fenêtre Ext. et huisserie	A2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3499	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3500	Fenêtre Int. et huisserie	A2	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3501	**Porte et huisserie**	**A2**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,28**	**0,010**	
3502	**Porte et huisserie**	**A3**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,66**	**0,010**	
3503	Mur	B	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3504	Mur	B	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3505	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3506	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3507	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3508	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3509	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3510	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3511	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3512	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3513	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3514	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3515	Fenêtre Ext. et huisserie	C10	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3516	Fenêtre Ext. et huisserie	C10	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3517	Fenêtre Int. et huisserie	C10	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3518	Fenêtre Int. et huisserie	C10	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3519	Fenêtre Ext. et huisserie	C11	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3520	Fenêtre Ext. et huisserie	C11	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3521	Fenêtre Int. et huisserie	C11	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3522	Fenêtre Int. et huisserie	C11	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3523	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3524	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3525	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3526	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3527	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3528	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3529	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3530	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3531	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3532	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3533	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3534	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3535	Fenêtre Ext. et huisserie	C5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3536	Fenêtre Ext. et huisserie	C5	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3537	Fenêtre Int. et huisserie	C5	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3538	Fenêtre Int. et huisserie	C5	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3539	Fenêtre Ext. et huisserie	C6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3540	Fenêtre Ext. et huisserie	C6	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3541	Fenêtre Int. et huisserie	C6	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3542	Fenêtre Int. et huisserie	C6	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3543	Fenêtre Ext. et huisserie	C7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3544	Fenêtre Ext. et huisserie	C7	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3545	Fenêtre Int. et huisserie	C7	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3546	Fenêtre Int. et huisserie	C7	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3547	Fenêtre Ext. et huisserie	C8	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3548	Fenêtre Ext. et huisserie	C8	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3549	Fenêtre Int. et huisserie	C8	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3550	Fenêtre Int. et huisserie	C8	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3551	Fenêtre Ext. et huisserie	C9	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3552	Fenêtre Ext. et huisserie	C9	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3553	Fenêtre Int. et huisserie	C9	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3554	Fenêtre Int. et huisserie	C9	Alu / NC	En haut	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3555	Mur	D	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3556	Mur	D	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3557	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3558	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 38

R+7 : Réserve (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3559	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3560	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3561	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3562	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3563	Mur	A	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3564	Mur	A	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3565	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3566	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3567	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3568	Mur	B	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3569	Plinthes	B	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3570	Plinthes	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3571	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3572	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3573	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3574	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3575	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3576	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3577	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3578	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3579	Mur	C	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3580	Mur	C	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	
3581	Mur	D	Cloison metal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3582	Mur	D	Cloison metal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 12

R+7 : Bureau 706 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3583	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3584	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3585	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3586	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3587	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3588	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3589	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3590	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3591	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3592	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3593	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,33**	**0,010**	
3594	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3595	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3596	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3597	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3598	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3599	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3600	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3601	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3602	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3603	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3604	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3605	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3606	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3607	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3608	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3609	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3610	Placard	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3611	Placard	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3612	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3613	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+7 : Bureau 707 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3614	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3615	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3616	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3617	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3618	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3619	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3620	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3621	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3622	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3623	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3624	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,29**	**0,010**	
3625	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3626	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3627	Placard	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3628	Placard	B	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3629	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3630	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3631	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3632	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3633	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3634	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3635	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3636	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3637	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3638	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3639	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3640	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3641	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3642	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3643	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3644	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

R+7 : Bureau 708 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3645	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3646	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3647	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3648	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3649	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3650	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3651	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3652	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3653	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3654	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3655	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,45**	**0,010**	
3656	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3657	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3658	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3659	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3660	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3661	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3662	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3663	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3664	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3665	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3666	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3667	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3668	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3669	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3670	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3671	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3672	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3673	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 15

R+7 : Bureau 709 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3674	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3675	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3676	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3677	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3678	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3679	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3680	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3681	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3682	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3683	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3684	**Porte et huisserie**	**A**	**Bois et métal / Peinture**	**En haut**	**0,36**	**0,010**	
3685	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3686	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3687	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3688	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3689	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3690	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3691	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3692	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3693	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3694	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3695	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3696	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3697	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3698	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3699	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3700	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3701	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
3702	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
3703	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
3704	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
3705	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3706	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 17

R+7 : Bureau 710 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3707	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3708	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3709	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3710	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3711	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3712	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3713	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3714	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3715	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3716	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3717	Porte et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	En haut	0,28	0,010	
3718	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3719	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3720	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3721	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3722	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3723	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3724	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3725	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3726	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3727	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3728	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3729	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3730	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3731	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3732	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3733	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 14

R+7 : Bureau 711 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3734	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,010	
3735	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,010	
3736	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3737	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3738	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3739	Fenêtre Ext. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3740	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3741	Fenêtre Int. et huisserie	A	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3742	Mur	A	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3743	Mur	A	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3744	Porte et huisserie	A	Bois et métal / Peinture	En haut	0,43	0,010	
3745	Mur	B	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3746	Mur	B	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3747	Porte et huisserie	B	Bois et métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3748	Porte et huisserie	B	Bois et métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3749	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3750	Mur	C	Plâtre / Toile de verre peinte	En haut	0	0,010	
3751	Plinthes	C	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	
3752	Plinthes	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3753	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3754	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3755	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	Au centre	0	0,010	
3756	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Alu /	En haut	0	0,010	
3757	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3758	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3759	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	Au centre	0	0,010	
3760	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Alu /	En haut	0	0,010	
3761	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
3762	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
3763	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	Au centre	0	0,010	
3764	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Alu /	En haut	0	0,010	
3765	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu /	Au centre	0	0,010	
3766	Fenêtre Ext. et huisserie	C4	Alu /	En haut	0	0,010	
3767	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu /	Au centre	0	0,010	
3768	Fenêtre Int. et huisserie	C4	Alu /	En haut	0	0,010	
3769	Fenêtre Ext. et huisserie	C5	Alu /	Au centre	0	0,010	
3770	Fenêtre Ext. et huisserie	C5	Alu /	En haut	0	0,010	
3771	Fenêtre Int. et huisserie	C5	Alu /	Au centre	0	0,010	
3772	Fenêtre Int. et huisserie	C5	Alu /	En haut	0	0,010	
3773	Fenêtre Ext. et huisserie	C6	Alu /	Au centre	0	0,010	
3774	Fenêtre Ext. et huisserie	C6	Alu /	En haut	0	0,010	
3775	Fenêtre Int. et huisserie	C6	Alu /	Au centre	0	0,010	
3776	Fenêtre Int. et huisserie	C6	Alu /	En haut	0	0,010	
3777	Fenêtre Ext. et huisserie	C7	Alu /	Au centre	0	0,010	
3778	Fenêtre Ext. et huisserie	C7	Alu /	En haut	0	0,010	
3779	Fenêtre Int. et huisserie	C7	Alu /	Au centre	0	0,010	
3780	Fenêtre Int. et huisserie	C7	Alu /	En haut	0	0,010	
3781	Mur	D	cloison métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3782	Mur	D	cloison métal / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 25

R+7 : Palier 7 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3783	Plafond		Faux plafond / NC	A gauche	0	0,010	
3784	Plafond		Faux plafond / NC	Au centre	0	0,010	
3785	Sol		Sol plastique /	A gauche	0	0,010	
3786	Sol		Sol plastique /	Au centre	0	0,010	
3787	Mur	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3788	Mur	A	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
3789	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3790	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3791	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A gauche	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3792	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3793	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3794	Mur	B	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
3795	Porte et huisserie	B	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3796	Porte et huisserie	B	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3797	Cornière d'angle	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3798	Cornière d'angle	C	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3799	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3800	Mur	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
3801	Porte et huisserie	C	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3802	Porte et huisserie	C	Métal / Peinture	En haut	0	0,010	
3803	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3804	Mur	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
3805	Placard	D1	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3806	Placard	D1	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3807	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3808	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3809	Placard	D2	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3810	Placard	D2	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3811	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3812	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3813	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3814	Mur	E	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
3815	Mur	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3816	Mur	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
3817	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3818	Porte et huisserie	F	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3819	Mur	G	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3820	Mur	G	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
3821	Porte et huisserie	G	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3822	Porte et huisserie	G	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3823	Mur	H	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3824	Mur	H	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
3825	Placard	H	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3826	Placard	H	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3827	**Porte et huisserie**	**H**	**Bois / Peinture**	**En haut**	**0,16**	**0,010**	
3828	Porte et huisserie	H1	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3829	Porte et huisserie	H1	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3830	Porte et huisserie	H2	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3831	Porte et huisserie	H2	Alu / NC	En haut	0	0,010	
3832	Mur	I	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3833	Mur	I	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
3834	Mur	J	Plâtre / Fibre de verre peinte	Au centre	0	0,010	
3835	Mur	J	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0	0,010	
3836	Placard	J	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,010	
3837	Placard	J	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,010	
3838	**Porte et huisserie**	**J1**	**Bois / Peinture**	**En haut**	**0,83**	**0,010**	
3839	Porte et huisserie	J2	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3840	Porte et huisserie	J2	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	
3841	Porte et huisserie	J3	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3842	Porte et huisserie	J3	Bois / Peinture	En haut	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 31

Sous-sol -1 : Local (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3843	Plafond		Béton / Flocage	Au centre	0	0,010	
3844	Sol		Béton peint /	Au centre	0	0,010	
3845	Mur	A	Briques / Ciment	Au centre	0	0,010	
3846	Mur	A	Parpaings / NC	Au centre	0	0,010	
3847	Trappe	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3848	Rebouchage	A1	Ciment / NC	Au centre	0	0,010	
3849	Rebouchage	A1	Plâtre / NC	Au centre	0	0,010	
3850	Rebouchage	A2	Ciment / NC	Au centre	0	0,010	
3851	Rebouchage	A2	Plâtre / NC	Au centre	0	0,010	
3852	Conduit	Au plafond	Métal / NC	Au centre	0	0,010	
3853	Conduit	Au plafond	Métal / Isolant	Au centre	0	0,010	
3854	Passage de cables	Au plafond	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3855	Mur	B	Briques / Ciment	Au centre	0	0,010	
3856	Mur	B	Parpaings / NC	Au centre	0	0,010	
3857	Rebouchage	B	Ciment / NC	Au centre	0	0,010	
3858	Rebouchage	B	Plâtre / NC	Au centre	0	0,010	
3859	Mur	C	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
3860	Mur	D	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
3861	Mur	E	Béton / NC	Au centre	0	0,010	
3862	Mur	F	Briques / Ciment	Au centre	0	0,010	
3863	Rebouchage	F1	Plâtre / NC	Au centre	0	0,010	
3864	Rebouchage	F2	Plâtre / NC	Au centre	0	0,010	
3865	Rebouchage	F3	Plâtre / NC	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 23

Sous-sol -1 : Dégagement (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3866	Plafond		Béton / Flocage	Au centre	0	0,010	
3867	Plafond		Béton / Peinture	Au centre	0	0,010	
3868	Sol		Béton peint /	Au centre	0	0,010	
3869	Mur	A	Béton / Peinture	Au centre	0	0,010	
3870	Conduit	Au plafond	Métal / NC	Au centre	0	0,010	
3871	Conduit	Au plafond	Métal / Isorel	Au centre	0	0,010	
3872	Mur	B	Béton / Peinture	Au centre	0	0,010	
3873	Mur	C	Béton / Peinture	Au centre	0	0,010	
3874	Mur	D	Béton / Peinture	Au centre	0	0,010	
3875	Mur	D	Briques / Ciment peint	Au centre	0	0,010	
3876	Rebouchage	D	Ciment / NC	Au centre	0	0,010	

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3877	Trappe	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3878	Mur	E	Briques / Ciment peint	Au centre	0	0,010	
3879	Trappe	E	Bois / Peinture	Au centre	0	0,010	
3880	Mur	F	Briques / Ciment peint	Au centre	0	0,010	
3881	Mur	G	Béton cellulaire / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 16

Sous-sol -1 : Parking -1 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3882	Plafond		Béton / Flocage	Au centre	0	0,010	
3883	Mur	A	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
3884	Passage de cables	A	Alu / NC	Au centre	0	0,010	
3885	Porte et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	


Nombre Total d'UR : 4

Sous-sol -1 : Poste P1 (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge d'erreur	Travaux Envisagés
3886	Plafond		Béton / NC	Au centre	0	0,010	
3887	Sol		Béton /	Au centre	0	0,010	
3888	Embrasure	A	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
3889	Mur	A	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
3890	Porte et huisserie	A	Métal / Peinture	Au centre	0	0,010	
3891	Poteau	Au centre	Béton / Peinture	Au centre	0	0,010	
3892	Mur	B	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
3893	Mur	C	Béton / Peinture	Au centre	0	0,010	
3894	Gaine	D	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
3895	Mur	D	Ciment / Peinture	Au centre	0	0,010	
3896	Poteau	D	Béton / Peinture	Au centre	0	0,010	

Nombre Total d'UR : 11

Schéma du repérage plomb avant travaux

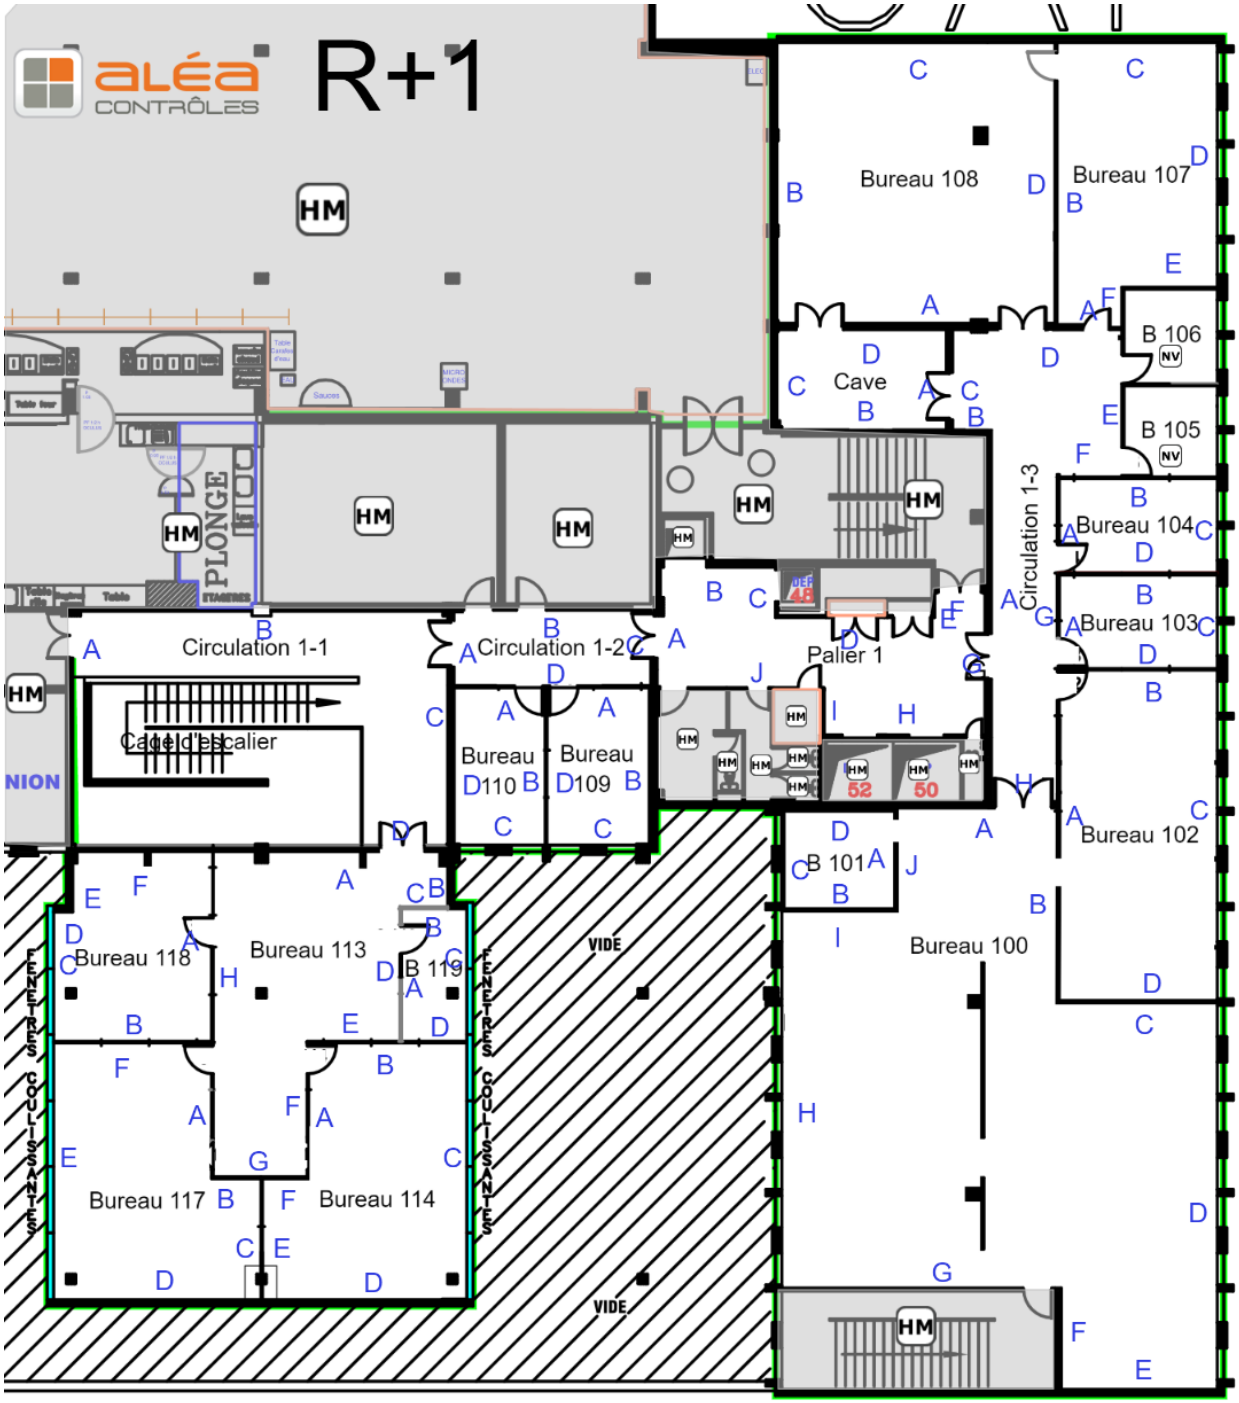

Repère des parois


NV Locaux non visités

HM Hors périmètre mission

Hors périmètre mission

Réf : DIA-BZR04-2407-023	R+1 CAF		Planche de repérage technique
41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	Indice 1	Auteur : Monsieur Thomas GARRIGOU	Plomb avant travaux


R+3

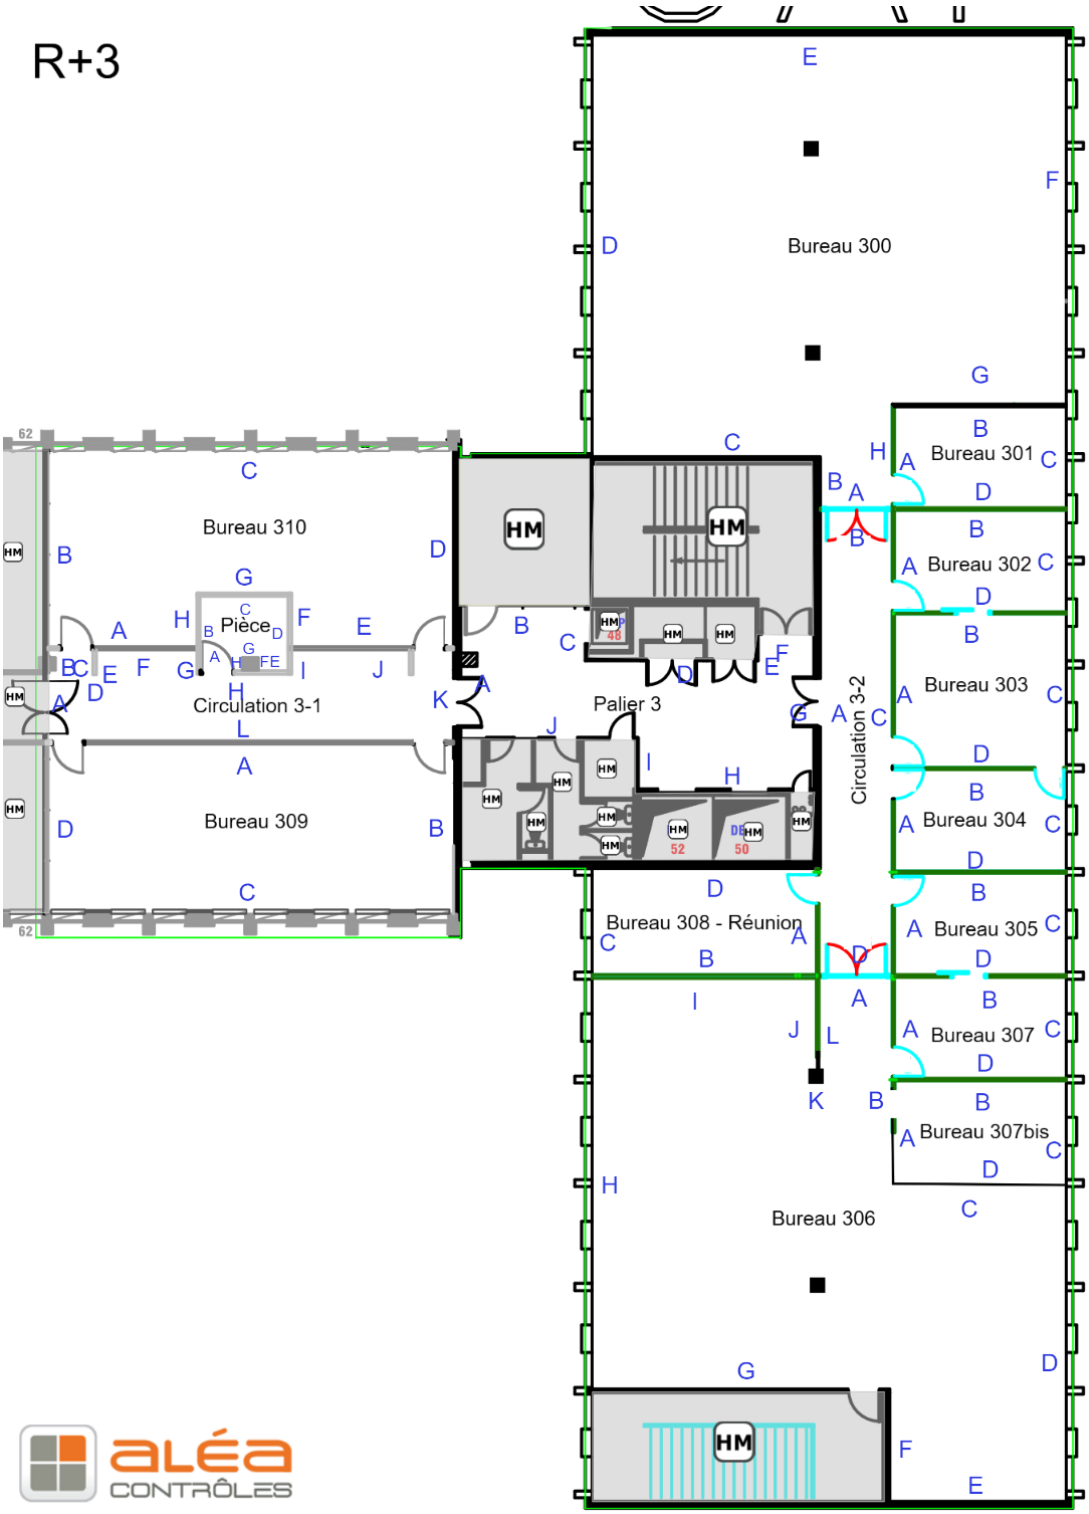

Repère des parois | HM Hors périmètre mission | Hors périmètre mission

Réf : DIA-BZR04-2407-023	R+3 CAF		Planche de repérage technique
41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	Indice 1	Auteur : Monsieur Thomas GARRIGOU	Plomb avant travaux


R+4

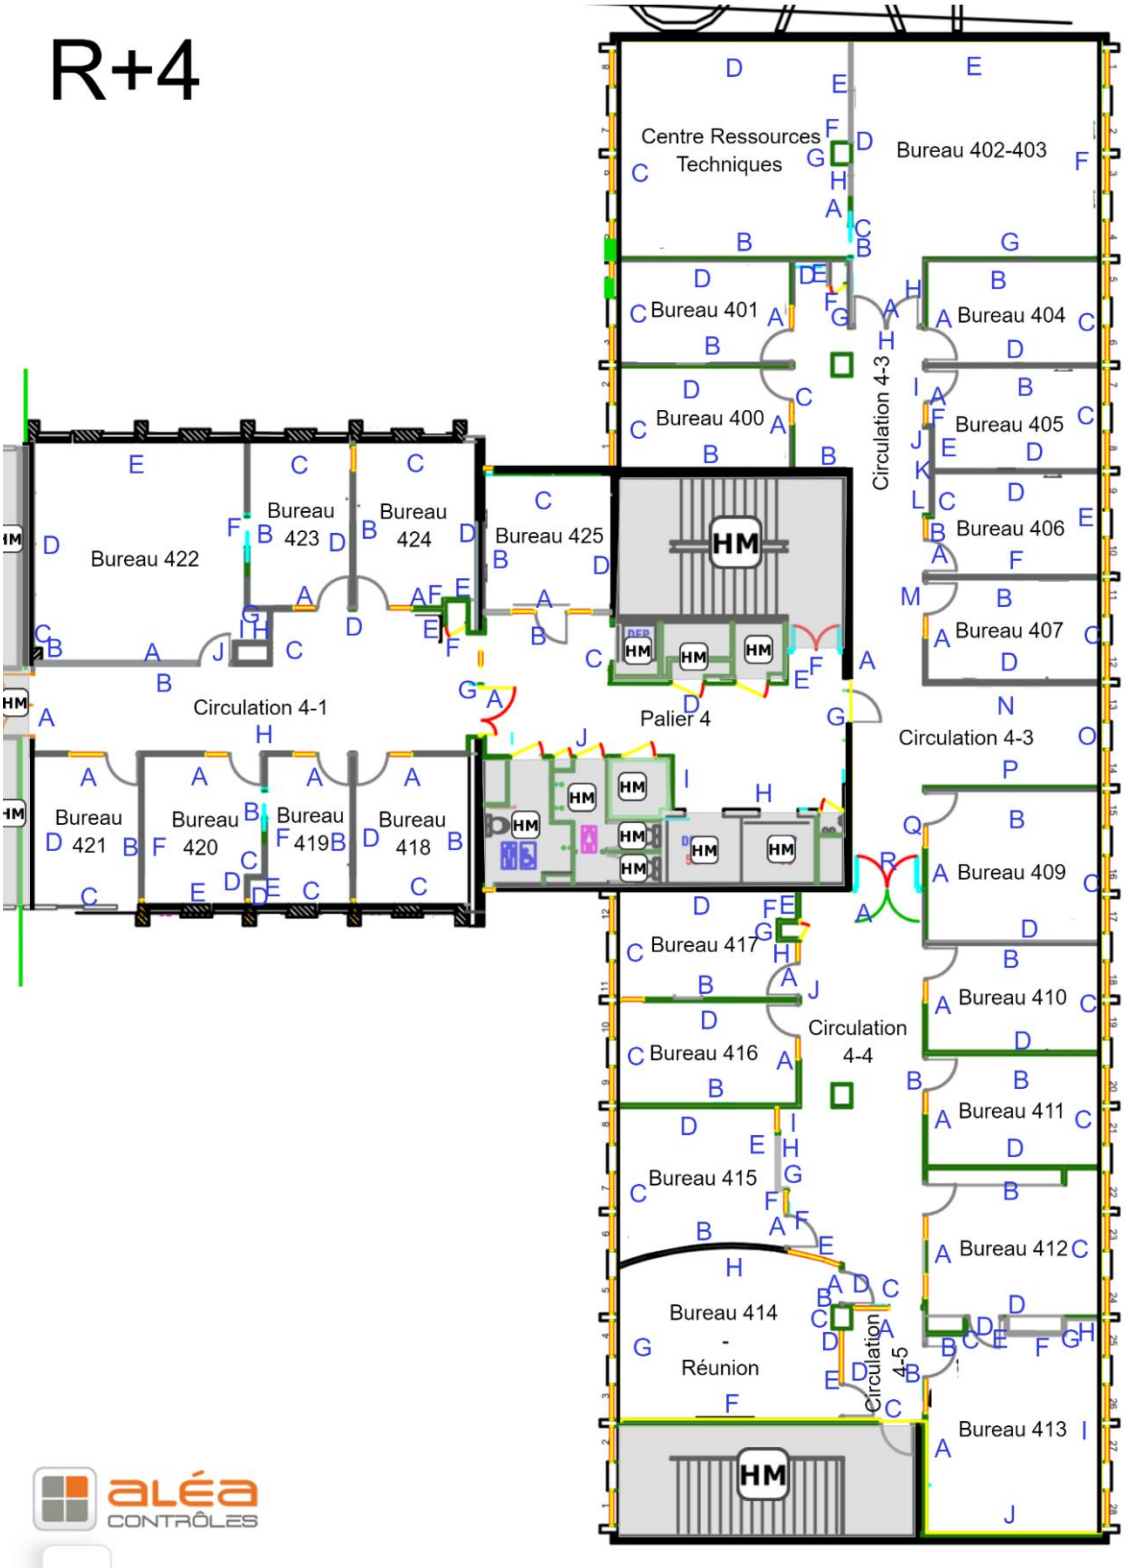

Repère des parois HM Hors périmètre mission Hors périmètre mission

Réf : DIA-BZR04-2407-023	R+4 CAF		Planche de repérage technique
41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	Indice 1	Auteur : Monsieur Thomas GARRIGOU	Plomb avant travaux


R+5

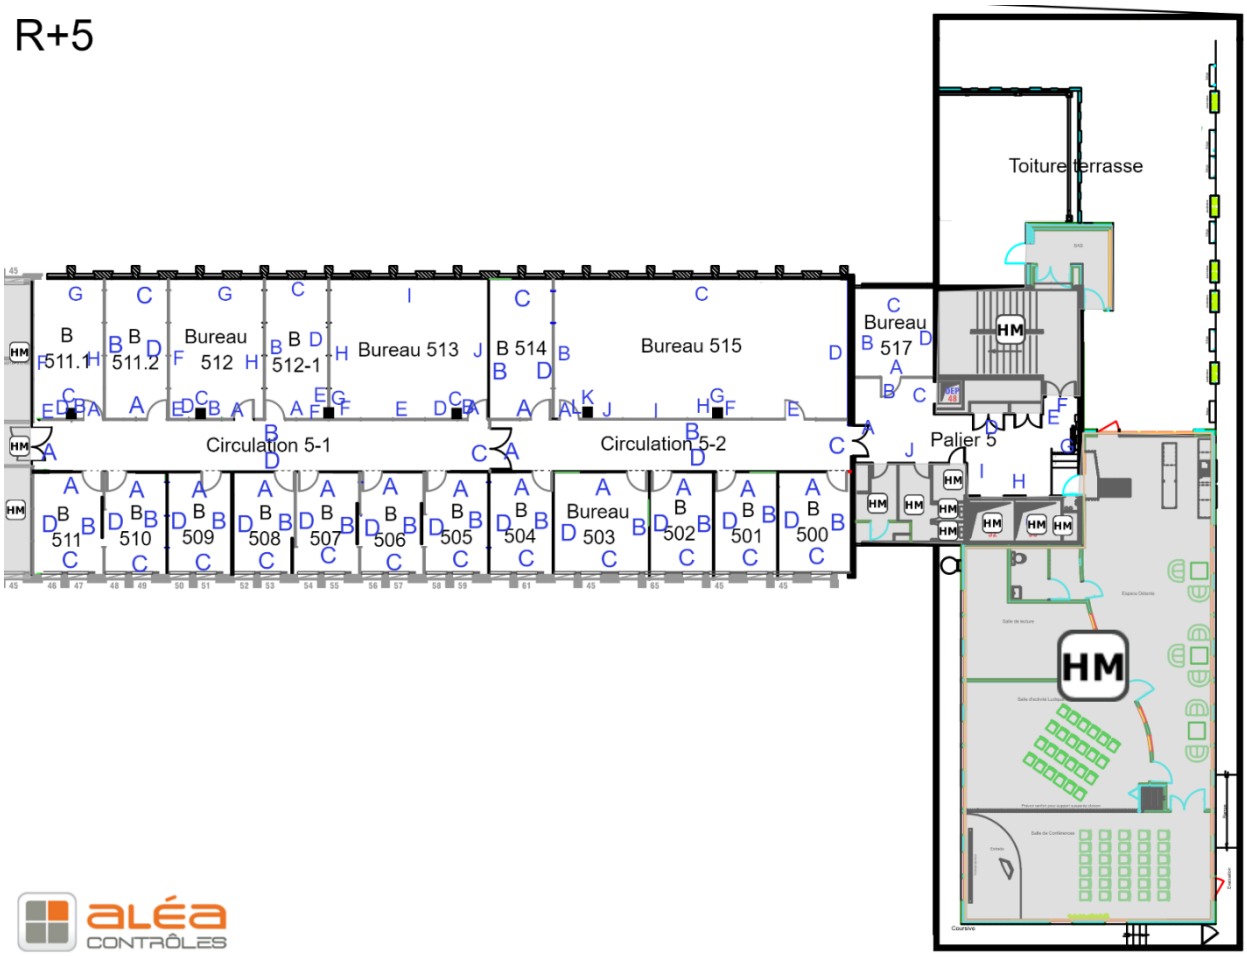

Repère des parois HM Hors périmètre mission Hors périmètre mission


Réf : DIA-BZR04-2407-023	R+5 CAF		Planche de repérage technique
41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	Indice 1	Auteur : Monsieur Thomas GARRIGOU	Plomb avant travaux

R+7

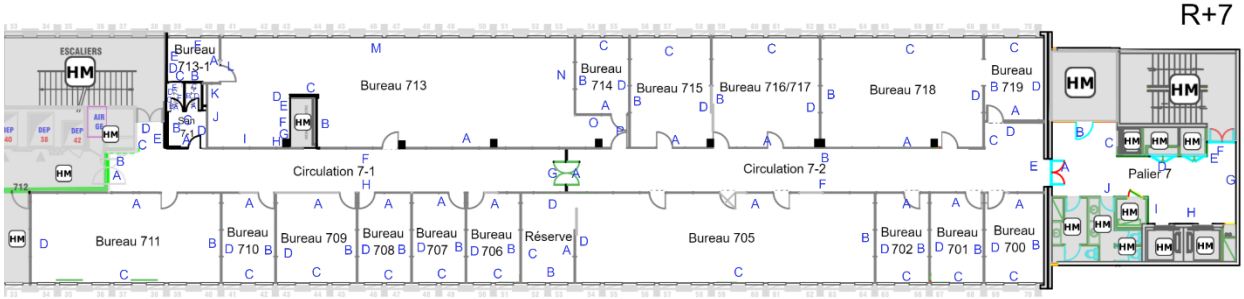

Repère des parois HM Hors périmètre mission Hors périmètre mission

Réf : DIA-BZR04-2407-023	R+7 CAF		Planche de repérage technique
41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	Indice 1	Auteur : Monsieur Thomas GARRIGOU	Plomb avant travaux

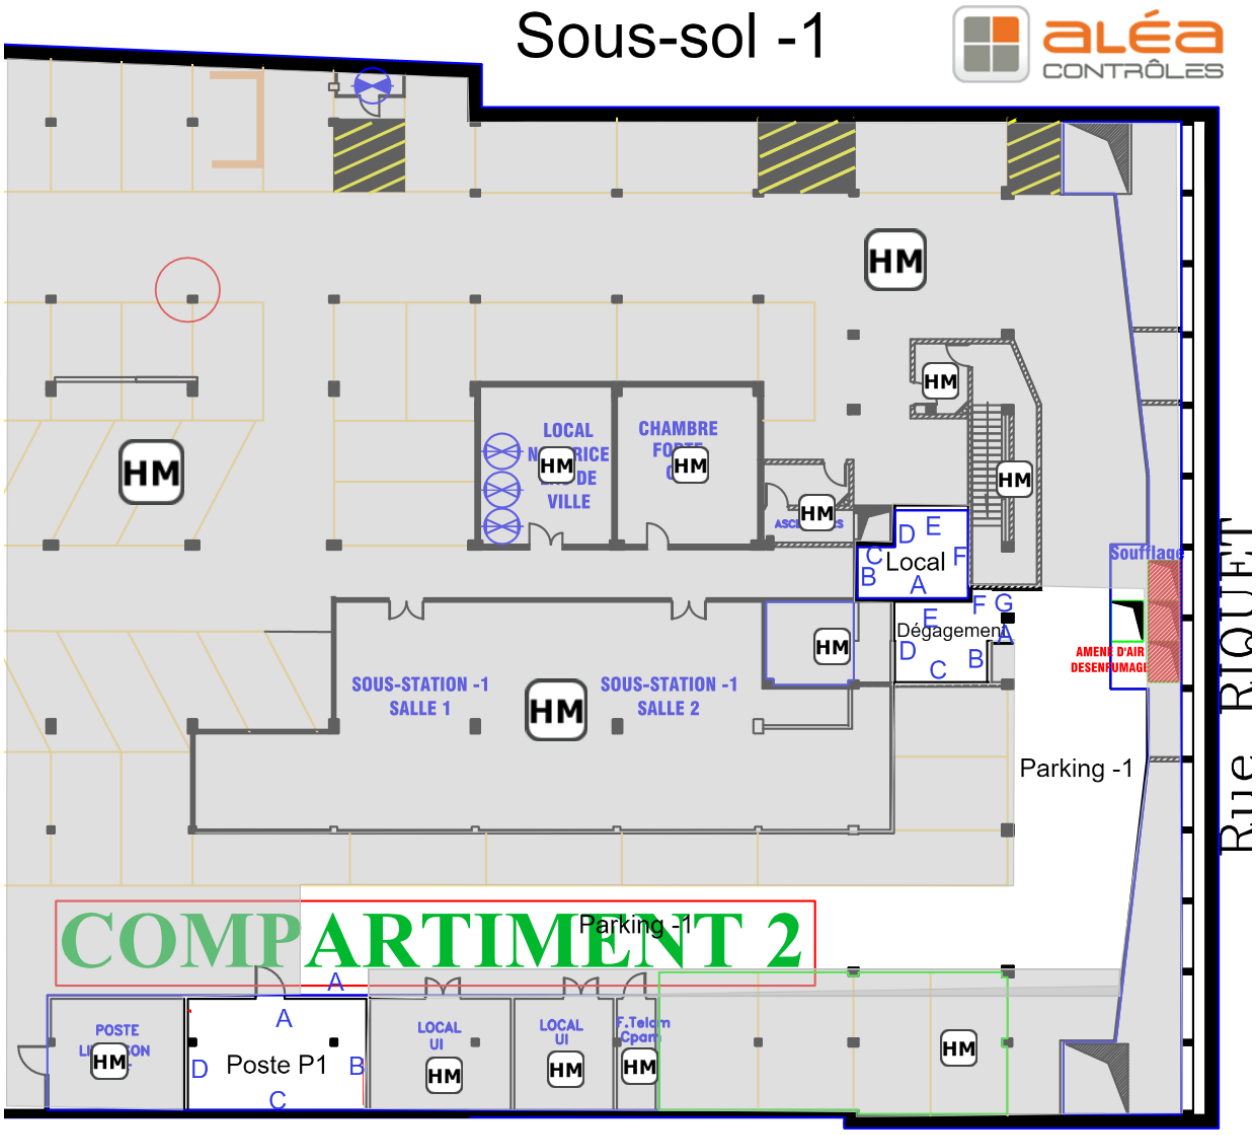

Repère des parois HM Hors périmètre mission Hors périmètre travaux

Réf : DIA-BZR04-2407-023	Sous-sol -1		Planche de repérage technique
41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	Indice 1	Auteur : Monsieur Thomas GARRIGOU	Plomb avant travaux

Analyses

Aucune analyse n'a été effectuée.

Méthodologie du repérage

Les modalités du repérage avant intervention dans les ouvrages concernés par la présence de peintures au plomb ne sont pas définies réglementairement. Cependant, le respect des principes généraux de prévention, du risque chimique et de la réglementation relative à la protection des travailleurs exposés au plomb justifie que la recherche de plomb dans les peintures du bâti ancien soit effectuée dans le cadre de l'évaluation des risques à travers un diagnostic plomb.
La méthodologie respecte les prérogatives de la norme NF X 46-035 de juin 2021 sur les travaux dans les interventions sur les ouvrages anciens :

- Visite préalable, état des lieux,
- Identification de tous les éléments de construction susceptibles d'être revêtus de peinture au plomb ou contenant du plomb,
- Réalisation de mesures à l'aide d'un analyseur portable à fluorescence X sur tous les éléments unitaires,
- Établissement d'une cartographie,
- Rédaction d'un compte-rendu de diagnostic suivi d'un descriptif des dispositions à mettre en œuvre sur le chantier le cas échéant.

Descriptif des dispositions à mettre en œuvre sur le chantier

Préparation de chantier :

- Compte tenu de la nature particulière des travaux, un protocole doit être établi, avant le démarrage de chaque chantier. Ce protocole est destiné à formaliser les règles à respecter pour que la réalisation du chantier soit conduite dans des conditions de sécurité optimales, tant pour les habitants de l'immeuble concerné et le voisinage, que pour les salariés des entreprises intervenantes.
- Les travaux devront être réalisés en l'absence d'occupants et plus particulièrement des enfants mineurs et des femmes enceintes, notamment au cours des phases dites « à risques ».
- Il convient également de :
  - Examiner le présent diagnostic en détail,
  - Choisir la technique d'intervention la moins polluante possible, notamment vis-à-vis de la concentration en plomb,
  - Informer le médecin du travail et le CHSCT ou les délégués du personnel (le cas échéant),
  - Choisir les protections collectives,
  - Choisir les équipements de protection individuelle adaptés à la technique,
  - Informer les salariés sur le risque plomb,
  - Former les salariés (technique employée, équipements de protection, nettoyage de chantier, évacuation des déchets, entrée et sortie de la zone de travail, hygiène générale, interdictions) ; le formateur doit être compétent vis-à-vis du risque plomb,
  - Prévoir l'installation des locaux vestiaires, sanitaires et réfectoires,
  - Choisir les modes de tri, de stockage et d'élimination des déchets, et mettre en place la procédure de cheminement et d'évacuation,
  - Définir les moyens d'aide aux manutentions,
  - Repérer les différents réseaux à l'intérieur de l'immeuble afin d'organiser la neutralisation de ceux pouvant présenter un risque lors des travaux,
  - Réaliser, si possible en premier lieu, les creusements de saignées (pour électricité ou plomberie) dans les mêmes conditions que les travaux de traitement des peintures,
  - Intégrer l'analyse des risques et les mesures de prévention retenues dans les éventuels documents réglementaires (PPSPS, plan de prévention,...) ou dans un document spécifique, puis les commenter aux salariés,

- Approvisionner tous les matériels et installations nécessaires, les sacs pour les déchets et les équipements de protection individuelle.

Avant de démarrer les travaux, il convient de :

- En cas d'emprise sur la voie publique, signaler le chantier et aménager des passages pour les piétons,
- Rendre le chantier inaccessible au public,
- Délimiter et signaliser les zones de travaux à risques,
- Indiquer au maître d'ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contrôle initial d'empoussièrement surfacique sur le sol,
- En fonction de la technique employée, prévoir éventuellement un isolement de la zone, un sas d'accès, une extraction d'air,...
- Aménager un local inaccessible au public pour stocker les déchets,
- Mettre à disposition des opérateurs, sur le chantier :
  - Un point d'eau équipé de savon et de brosses à ongles,
  - Une douche équipée : cabine pouvant être fermée avec espace de déshabillage et patère, callebotis au sol, eau à température réglable, chauffage, aération,...,
  - Un local avec des armoires vestiaires à deux compartiments distincts (vêtements de travail, vêtements de ville),
  - Des toilettes,
  - Un local à usage de réfectoire.
- Disposer des protections collectives contre le risque de chute de hauteur à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments,
- Mettre à disposition des plates-formes individuelles roulantes légères ou des échafaudages adaptés à la configuration des lieux (escaliers,...),
- Faire mettre hors service les installations existantes (gaz, électricité,...) situées dans la zone de travail et pouvant présenter des risques pour les intervenants,
- Mettre en œuvre des coffrets électriques avec disjoncteur différentiel (sensibilité 30 mA),
- Eclairer la zone de travail à l'aide d'appareils de classe II (double isolation) : projecteur mobile IP 447, baladeuse IP45 munie d'une protection mécanique (verrine ou grille métallique).

Pendant les travaux, il convient de :

- Mettre à disposition des salariés, sur le chantier, les documents décrivant l'organisation de la prévention (PPSPS, plan de prévention, document spécifique,...),
- Maintenir les moyens mis en place pour rendre le chantier inaccessible,
- Appliquer à toute personne présente sur le chantier – en particulier lors des visites de chantier – les dispositions prévues pour les intervenants,
- Commencer par les travaux les plus polluants,
- Assurer un nettoyage régulier de la zone de travail,
- Proscrire le balayage,
- Ramasser régulièrement les déchets, les stocker dans un local inaccessible au public,
- Ne jamais faire brûler du bois recouvert de peinture au plomb,
- Organiser des pauses en fonction des conditions de travail des opérateurs (température, humidité,...) et des équipements de protection respiratoire choisis.

Après les travaux, il convient de :

- Réaliser un nettoyage complet des zones de travail et des accès à l'aide d'un aspirateur avec filtre de très haute capacité, proscrire le balayage,
- Indiquer au maître d'ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contrôle d'empoussièrement surfacique sur le sol,
- Fournir au maître d'ouvrage un plan indiquant les parois ou éléments contenant du plomb après recouvrement ou encoffrement.

Gestion des déchets :

- Les déchets générés sur les chantiers de réhabilitation/Démolition de biens revêtus de peintures au plomb peuvent être classés en plusieurs catégories selon leur charge polluante déterminante pour le choix d'une filière d'élimination. La détermination de cette filière d'élimination s'effectue en fonction de la nature des déchets et de la teneur en plomb lixiviable :
  - Matériaux inertes : classe 3,
  - Éléments non déstructurés en bois ou métalliques, éléments en plâtre, revêtus de peinture au plomb : classe 2 ou en filière de valorisation ou en filière plâtre avec alvéoles mono-matériaux,
  - Débris et poussières de peinture au plomb avec teneur en plomb lixiviable inférieure à 50 mg/kg : classe 1,
  - Débris et poussières de peinture au plomb avec teneur en plomb lixiviable supérieure à 50 mg/kg : traitement spécial puis classe.

Principales solutions techniques de traitement des peintures au plomb

Les principales solutions techniques de traitement des peintures au plomb sont :

- Le recouvrement :
  - Par de la peinture : application d'un film mince de peinture formant barrière à la peinture au plomb existante,
  - Par des revêtements : application sur les surfaces à traiter de produits adhérents afin de recouvrir complètement les anciennes peintures (vernis, résines en phase solvant, tissus, toile de verre, fibres minérales ou végétales),
  - Par du doublage : recouvrement des surfaces à traiter à l'aide de produits rigides appliqués directement séparés par une lame d'air ventilé en cas d'humidité des habitations, supprimant l'accès à ces surfaces et formant barrière à la peinture au plomb existante.
- Le retrait :
  - Par décapage thermique : génération d'air chaud par une résistance électrique en vue d'obtenir le ramollissement des liants organiques des peintures et leur décollement à l'aide de couteaux de peintre et grattoirs (brûleur à flamme interdit),
  - Par décapage chimique : les couches de peinture sont dissoutes ou hydrolysées par des décapants chimiques organiques ou minéraux,
  - Par décapage par grenaillage avec aspiration à la source (principalement pour ouvrages métalliques et hors site pour des pièces démontables résistant au grenaillage : le principe repose sur le retrait des peintures par abrasion à l'aide de particules abrasives métalliques ou autres. Le procédé nécessite une aspiration en continu par un dispositif adapté permettant d'évacuer les poussières de peinture et de récupérer les grenailles (projection de sable très fin),
  - Par technique de remplacement : certaines parties d'ouvrages démontables peuvent être remplacées par des éléments neufs.

Conditions particulières d'exécution

Textes de référence

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- DIRECCTE Centre – mars 2014 - Préconisations pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux (Hors champ code de la santé publique)
- Norme NF X 46 035 de juin 2021

Précisions :
Limite du repérage plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.
La norme NF X46-035 de juin 2021 demande d'identifier toute surface comportant un revêtement, un matériau ou un produit avec présence de plomb. Les mesures faites présentent deux types de limitation :

- **Limitation due à l'échantillonnage :** Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de repérage (UR) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UR et de la nature des travaux.
- **Limitation due à la technique de mesure dans le cas des mesures faites par appareil portatif :** Les mesures sont faites par émission d'un rayonnement γ produit par une source radioactive et analyse spectrale du rayonnement de fluorescence X réémis en retour par les atomes de plomb. Les différents rayonnements peuvent subir des altérations dues aux différentes couches de revêtement situées entre le plomb et la surface. **De ce fait, les mesures du plomb en profondeur peuvent présenter des dispersions importantes.**
- En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb. Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail. Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. **Les valeurs faibles (< 1mg/cm²) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,).**

Précisions OPPBTP (mai 2008) : « Les modalités du diagnostic avant intervention dans les ouvrages concernés par la présence de peintures au plomb ne sont pas définies réglementairement. Cependant le respect des principes généraux de prévention, du risque chimique et de la réglementation relative à la protection des travailleurs exposés au plomb justifie que la recherche de plomb dans les peintures du bâti ancien soit effectuée avant tous travaux de réhabilitation lors de l'évaluation des risques réglementaire ».

Ce repérage est réalisé dans le cadre de la protection de salariés susceptibles d'altérer des revêtements, matériaux ou produits de la construction, notamment les éléments et revêtements extérieurs contenant du plomb lors de travaux, réhabilitation, déconstruction et démolition. Il n'a pas de durée de validité et peut être réalisé pour tout type de bien : à usage d'habitation ou non, construit avant 1949 ou non...

Ce repérage est réalisé dans le cadre de la protection de salariés susceptibles d'altérer des revêtements, produits ou matériaux contenant du plomb lors de travaux. Il n'a pas de durée de validité et peut être réalisé pour tout type de bien : à usage d'habitation ou non, construit avant 1949 ou non...

Notice d'information des salaries

Le Code du Travail prévoit que l'employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur susceptible d'être exposé au plomb qui l'informe sur les dangers du plomb, les risques liés au poste de travail et les moyens de prévention (voir exemple de document en annexe à compléter le cas échéant par l'employeur).



A LIRE ATTENTIVEMENT

Lieu : Date :

Nom du responsable du chantier : Tél. :

DANGERS PRESENTES PAR L'EXPOSITION AU PLOMB ET CEUX PRESENTES PAR LE POSTE DE TRAVAIL :

- Risques généraux :

  Présence du plomb dans les peintures :

  - La céruse (hydrocarbonate de plomb) a été très couramment employée dans les mélanges pour la fabrication des peintures et enduits. Elle a été très utilisée en raison de ses nombreux avantages (blanc parfait, résistance, imperméabilité,...). Elle servait à la réalisation d'impressions, rebouchages, enduits, peinture et décoration (faux bois, faux marbres) sur plusieurs supports tels que plâtre, fer et bois. En conséquence, de très nombreuses peintures encore en place aujourd'hui ont une très forte probabilité de contenir du plomb.
  - L'absorption de plomb peut provoquer de graves atteintes à la santé.

- Risques pour la santé :

  L'intoxication par le plomb, dénommée saturnisme, se rencontre encore chez les salariés du bâtiment. Connu de longue date, le saturnisme peut donner des manifestations cliniques variées traduisant les effets biologiques et toxiques sur l'organisme :

  - Effets biologiques :
    - Une altération de la synthèse de l'hémoglobine au niveau de la moelle osseuse,
    - Une perturbation de la fabrication des globules rouges (anémie) et une fragilisation des globules rouges favorisant leur destruction précoce,
    - Une atteinte tardive et progressive de la fonction rénale, signe d'une imprégnation importante.
  - Effets toxiques :
    - Aigus :
      - Troubles neuropsychiques,
      - Douleurs abdominales (coliques de plomb),
    - Chroniques :
      - Atteinte du système nerveux central (syndrome psycho-organique),
      - Atteinte du système nerveux périphérique (paralysie radiale),
      - Atteinte de la moelle osseuse et du sang,
      - Hypertension artérielle.

  - Risques sur le poste de travail : rayer les techniques non utilisées

    - Préparation de surfaces, recouvrement, petits travaux :
      - Emission limitée de poussières et de particules chargées en plomb.

- Grattage, ponçage, piochage :
    - Dans le cas d'un travail à sec, il y a une émission très importante de poussières chargées en plomb. Lorsqu'on peut travailler à l'humide, cette émission est considérablement réduite.

- Décapage thermique :
    - Poussières, brûlures et incendie.

- Décapage chimique caustique :
    - Risque de brûlures graves aux niveaux cutané et oculaire, nécessitant des soins immédiats pour éviter des effets irréversibles. Il faut donc éviter toute exposition de la peau et des yeux des salariés pendant l'application du produit, son maintien en place et son enlèvement. Cette exposition n'est pas facile à détecter du fait que la brûlure chimique n'entraîne pas une douleur immédiate.
    - Risque d'exposition aux poussières peu important.
    - Cette technique engendre une production importante de déchets chimiques et la pollution des eaux de rinçage. Elle nécessite le stockage des produits chimiques et des déchets dans un local inaccessible au public et aéré.

- Décapage chimique par produits à base de solvants :
    - En cas d'inhalation, le chlorure de méthylène (ou dichlorométhane) peut entraîner des troubles de vigilance, des vertiges, des maux de tête. En outre, il est suspecté d'être cancérogène. Son contact avec la peau provoque des brûlures douloureuses. En cas de contact avec les yeux, il y a un risque de détérioration de la cornée.
    - Par ailleurs, le chlorure de méthylène passe facilement à travers la peau en provoquant les mêmes malaises que par inhalation. Il faut noter que peu de gants restent longtemps imperméables à ce produit.
    - Risques d'incendie et d'explosion.
    - Risque d'exposition aux poussières peu important.
    - Cette technique engendre une production importante de déchets. Elle nécessite le stockage des produits chimiques et des déchets dans un local inaccessible au public et aéré.

- Sablage :
    - Emission importante de poussières plombifères et silicieuses (selon de matériau de sablage utilisé).

- Démolition partielle en intérieure :
    - Emission très importante de poussières et de particules chargées en plomb.
    - Manutention de grandes quantités de gravats.
    - Incendie, explosion, électrisation (présence de canalisations de fluides et de conducteurs électriques).
    - Affaiblissement de la structure du bâtiment.

- Démolition totale à l'air libre :

- Emission de poussières pouvant contenir du plomb, sur un grand périmètre.
- Manutention et transport de grandes quantités de gravats.

- Autre :

MOYENS COLLECTIFS MIS EN ŒUVRE POUR PREVENIR CES DANGERS ET PRECAUTIONS A PRENDRE EN CE QUI CONCERNE LE PORT ET L'EMPLOI D'EQUIPEMENTS ET DE VETEMENTS DE PROTECTION :

- Méthodes de travail offrant les meilleures garanties d'hygiène :
- Mesures d'hygiène :
  - Ne pas manger, boire, fumer et mâcher de la gomme sur les lieux de travail,
  - Après le travail, avant chaque repas et avant chaque pause (toilettes, boisson ou cigarette), nettoyer soigneusement avec du savon toutes les parties du corps non protégées, se rincer la bouche, se brosser les mains et surtout les ongles,
  - En plus, en fin de journée, prendre une douche avant de quitter le chantier,
  - Ne pas rapporter de vêtements de travail souillés au domicile,

- Protections collectives :
  - Utiliser la technique la moins polluante possible,
  - Isoler la zone de travail, utiliser si présence le sas d'entrée et de sortie,
  - Capter les poussières et les fumées au plus près possible de la source d'émission,
  - Nettoyer régulièrement la zone de travail sans balayage,
  - Utiliser un aspirateur avec filtre à très haute efficacité.

- Protections individuelles :
  - Obligation de porter les équipements de protection respiratoire,
  - Obligation de porter les vêtements de travail et autres équipements de protection individuelle (gants, chaussures de sécurité,...),
  - Entretenir ses équipements.

- Nécessité de se soumettre aux examens médicaux périodiques :
  - Se faire examiner préalablement avant toute exposition au plomb (examens cliniques et biologiques par le médecin du travail),
  - Si nécessaire, obtenir une fiche d'aptitude renouvelable tous les 6 mois.

QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

- Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes
- Choisir un mode opératoire le moins polluant
- En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)
- Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,....) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.
- Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
  - des conseils dans le choix des protections,
  - une aide à l'information et à la formation,
  - une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr

OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr

RSI région Centre
http://www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26

- Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre : www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre
- Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé, des documents vous informent :
  - le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
  - la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
  - Les guides de prévention :
    - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
    - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

Attestation de durée de vie de la source

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq.** Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : HABITAT CONSEIL DIAGNOSTIC (31)	
Modèle de l'analyseur :	FEnX2
Numéro de série analyseur :	A venir
Numéro de série de la source :	RTV-1586-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	03/08/2022
Date de fin de validité de la source :	03/08/2027

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

Attestation d'assurance

GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES
21 Place Dupuy
31000 TOULOUSE
Tel. 05 62 73 09 09
email. agence.galeylabauthe@axa.fr
n° Orias 10 053 214

ATTESTATION D'ASSURANCE

La société AXA FRANCE représentée par la *SARL GALEY – LABAUTHE ASSURANCES* atteste que l'entreprise **HABITAT CONSEIL DIAGNOSTIC** représentée par **Monsieur Thierry BIZOUARNE,** domiciliée **55 avenue Louis Bréguet - Bâtiment HERMES 31400 TOULOUSE** est titulaire du contrat suivant, en cours pour la période du 01/01/2024 au 30/04/2024 couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile suivant les dispositions des conditions générales et particulières :

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE N° 1148866204 Contrat « Groupe »
Pour les activités désignées ci-dessous, telles que décrites aux conditions particulières du contrat ci-dessus référencés et exercées conformément aux dispositions des décrets et lois en vigueur :

Plan 2D/3D
Photo 360 et visite virtuelle
CQV (Certificat de qualité de vie)
Diagnostic de Performance Energétique sans mention
Diagnostic de Performance Energétique avec Mention
Constat Amiante Vente sans mention
Dossier Technique Amiante sans mention
Dossier Technique Amiante avec mention
Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes)
Contrôle périodique amiante
Diagnostic défiscalisation ancien
Normes surface et d'habitabilité
Logement décent
Dossier Amiante Parties Privatives
Etat des installations intérieures d'Electricité
Etat des installations intérieures de Gaz
Etat des Risques et Pollutions
Etat des Risques de pollution des sols (ERPS)
Argiles
ENSA (Etat des Nuisances Sonores Aériennes)
Etat parasitaire
Etat relatif à la présence de Termites dans le bati
Mérules
Etats des lieux
Superficie Carrez/Habitable et autres
Amiante avant démolition
Mérules avant démolition
Amiante génie civil
Audit énergétique logement individuel
Audit énergétique logement individuel pour des travaux énergétiques
Amiante avant travaux immeubles bâtis
Contrôle plomb après ou lors de travaux
Plomb avant travaux
Plomb avant démolition
Termites avant démolition
Etat descriptif de division (EDD)
Diagnostic Technique Global (DTG)
Sécurité piscine
Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
Repérage HAP sur enrobé avant travaux
Prestation de recueil de données et prise de mesures pour établissement d'un certificat de luminosité
Radon suivant le code du travail
Radon suivant le code de la santé publique

Extrait du tableau des garanties spécifiques à l'assuré désigné ci-dessus et par Cabinet de diagnostics :

1. *Tous dommages corporels matériels et immatériels consécutifs confondus : 12 000 000 € par sinistre*
2. *Faute inexcusable (dommages corporels) 1.000.000 € par sinistre et 2.000.000 € par année d'assurance*
3. *Atteinte à l'environnement :*
   - *Tous dommages confondus : 1 000 000 € par année d'assurance*
4. *Dommages immatériels non consécutifs : 2.000.000 € par année d'assurance*
5. *Dommages aux biens confiés : 350 000 € par sinistre*
6. *Défense : inclus dans la garantie mise en jeu*
7. *Recours : 28.354 € par litige*

La présente attestation ne peut engager la compagnie AXA FRANCE en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel il se réfère.

Fait à Toulouse, le 14 décembre 2023

GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES

GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES
21 place Dupuy - 31000 TOULOUSE
Tel : 05 62 73 09 09
Mail : agence.galeylabauthe@axa.fr
RCS Toulouse 518 883 527
ORIAS 10053214

AXA France IARD S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460• **AXA Assurances IARD Mutuelle.** Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex • **Entreprises régies par le Code des Assurances.** Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances
